

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6901-0224

Report No.W 6901-0258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6901-0827
SAMPLING DATE^{/3} : 20/01/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 01.36 PM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 2-176-จ-0006)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ตามจอคริล ดีก C)	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.28	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	7.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	96	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	290	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2-176

3. ^{/3} : Information received from customer

Examined by

(MS. SIRIRAT NITESNOPAKUL)

2-176-จ-0002

04/02/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 2-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

2-176-ค-0003

04/02/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6901-0827
SAMPLING DATE^{/3} : 20/01/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 01.36 PM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ค่าผ่านการบำบัด (ตามจอตกรต ดัก C)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.24	≤ 35
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.27	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	0.4	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	17,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว.-176

3. ^{/3} : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

04/02/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กูเกิ้ล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6901-0828
SAMPLING DATE³ : 20/01/2026 SAMPLING TIME³ : 01.42 PM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-จ-0006)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.04	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	72.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	22	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	260	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	14.42	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	5.33	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีขาว เหนียว
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]
STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 7-176
3. ³ : Information received from customer

Examined by 
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-จ-0002

06/02/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 7-176

Approved by 
(MRS. PENNAPA CHANPEN)

7-176-ค-0003

04/02/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมน้ำเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6901-0828
SAMPLING DATE³ : 20/01/2026 SAMPLING TIME³ : 01.42 PM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โสมน้ำเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	2,400	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีขาว เหนียว

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว.-176

3.³ : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

04/02/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6901-0224

Report No.W 6901-0258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6901-0826
SAMPLING DATE³ : 20/01/2026 SAMPLING TIME³ : 01.50 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-จ-0006)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ค่าผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ดิถ A)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.12	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	92.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	45	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	344	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	83.30	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	5.60	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล เข้ม

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567


เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 7-176

3. ³ : Information received from customer

Examined by 


(MS. SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-จ-0002

04, 02, 2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 7-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

7-176-ค-0003

04, 02, 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6901-0826
SAMPLING DATE³ : 20/01/2026 SAMPLING TIME³ : 01.50 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	8.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	1,100,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล เข้ม

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176

3. ³ : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



รองผู้จัดการวิเคราะห์เอกชน
เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

04, 02, 2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6902-0217

Report No.W 6902-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6902-0850
SAMPLING DATE^{/3} : 16/02/2026 SAMPLING TIME³ : 11.27 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE : 16-28/02/2026 RECEIVED DATE : 16/02/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 07/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ลานจอดรถ ตึก C)	STANDARD
pH at 25 ⁰ C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.83	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	5.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	13	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	175	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมัวตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176

3.^{/3} : Information received from customer

Examined by
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

07/03/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ก-0003

07/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6902-0850
SAMPLING DATE³ : 16/02/2026 SAMPLING TIME³ : 11.27 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 16-28/02/2026 RECEIVED DATE : 16/02/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 07/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ตามจอตรด ตึก C)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	0.70	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.20	≤ 1
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	0.5	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	54,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2.-176

3. ³ : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

07/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6902-0851
SAMPLING DATE³ : 16/02/2026 SAMPLING TIME³ : 11.35 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-จ-0006)
TESTED DATE : 16-28/02/2026 RECEIVED DATE : 16/02/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 07/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ค่าผ่านการบำบัด (ผังถ่านจอตลอด)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.28	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	62.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	65	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	194	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	11.20	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.40	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3-176

3. ³ : Information received from customer

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-จ-0002

07/03/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 3-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

3-176-ค-0003

07/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6902-0851
SAMPLING DATE³ : 16/02/2026 SAMPLING TIME³ : 11.35 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 16-28/02/2026 RECEIVED DATE : 16/02/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 07/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	2.0	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	920,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
3.³ : Information received from customer



กองปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเคมี
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

07, 03, 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6902-0217

Report No. W 6902-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6902-0849
SAMPLING DATE³ : 16/02/2026 SAMPLING TIME³ : 11.34 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 2-176-จ-0006)
TESTED DATE : 16-28/02/2026 RECEIVED DATE : 16/02/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 07/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.48	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	60.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	34	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	308	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	68.32	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.87	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีเขียว เหม็น

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2-176

3. ³ : Information received from customer

Examined by 

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

2-176-จ-0002

07/03/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 2-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

2-176-ค-0003

07/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเคท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6902-0849
SAMPLING DATE^{/3} : 16/02/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 11.34 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 16-28/02/2026 RECEIVED DATE : 16/02/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 07/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	1,100,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมัวตะกอนแขวนลอยสีเขียว เหม็น

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3. ^{/3} : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

07, 03, 2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6903-0205

Report No. W 6903-0265

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE ^{/3}	: โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay)	SAMPLE NO.	: 6903-0761
SAMPLING DATE ^{/3}	: 16/03/2026	SAMPLING TIME ^{/3}	: 11.04 AM
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING BY ^{/3}	: STC
SAMPLING METHOD ^{/3}	: GRAB		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE	: 16-28/03/2026	RECEIVED DATE	: 16/03/2026
FILE NAME	: โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay)	REPORTED DATE	: 30/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผลการบำบัด (ลานจอดรถ ตึก C)	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	6.95	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	62.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	87	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	324	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176

3. ^{/3} : Information received from customer

Examined by Panvisa Jinrat

(MS.PANVISA JINRAT)

ว-176-ก-0004

30/03/2026



กองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
ลงทะเบียน ว-176

Approved by [Signature]

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ก-0003

30/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6903-0205

Report No. W 6903-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6903-0761
SAMPLING DATE^{/3} : 16/03/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 11.04 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 16-28/03/2026 RECEIVED DATE : 16/03/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 30/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ตามจอร์จ ดีก C)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	6.86	≤ 35
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	1.20	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	3.0	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	17,000,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
3. ^{/3} : Information received from customer



รองอธิบดีการวิเคราะห์และ
ศูนย์ เซ็นเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30 03 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6903-0205

Report No.W 6903-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Chongtalay) SAMPLE NO. : 6903-0762
SAMPLING DATE³ : 16/03/2026 SAMPLING TIME³ : 10.56 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-จ-0006)
TESTED DATE : 16-28/03/2026 RECEIVED DATE : 16/03/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Chongtalay) REPORTED DATE : 30/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ส่งงานจอตรด)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.25	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	14.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	92	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	93	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3-176

3.³ : Information received from customer

Examined by Panvira Jinrat

(MS.PANVIRA JINRAT)

3-176-จ-0004

16/03/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 3-176

Approved by Pennapa Chanpen

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

3-176-จ-0003

30 03 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6903-0205

Report No. W 6903-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6903-0762
SAMPLING DATE³ : 16/03/2026 SAMPLING TIME³ : 10.56 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 16-28/03/2026 RECEIVED DATE : 16/03/2026
FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 30/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.68	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	35,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3. ³ : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6903-0205

Report No.W 6903-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมาเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6903-0760
 SAMPLING DATE³ : 16/03/2026 SAMPLING TIME³ : 11.07 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
 TESTED DATE : 16-28/03/2026 RECEIVED DATE : 16/03/2026
 FILE NAME : โรงแรม โฮมาเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 30/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.46	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	54.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	148	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	318	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	77.84	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	4.53	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีเขียว เหม็น

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176

3. ³ : Information received from customer

Examined by Pannisa Jinrat

(MS.PANVISA JINRAT)

๖-176-๖-0004

๓๐/๐๓/๒๐๒๖



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
 บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
 เลขทะเบียน ๖-176

Approved by Pennapa Chanpen

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

30/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6903-0205

Report No. W 6903-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6903-0760
SAMPLING DATE³ : 16/03/2026 SAMPLING TIME³ : 11.07 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 16-28/03/2026 RECEIVED DATE : 16/03/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 30/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	1.5	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	9,200,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีเขียว เหม็น

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3.³ : Information received from customer


รองผู้จัดการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30/03/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6904-0291

Report No.W 6904-0324

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6904-1069
 SAMPLING DATE^{/3} : 23/04/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 10.04 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
 SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-จ-0006)
 TESTED DATE : 23/04/2026-04/05/2026 RECEIVED DATE : 23/04/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ตามจอตกรต ตัก C)	STANDARD
pH at 25 ⁰ C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.62	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	44.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	778	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	284	≤ 1,000
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.93	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles),G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3-176

3.^{/3} : Information received from customer

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-จ-0002

06/05/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 3-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

3-176-ค-0003

06/05/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6904-1069
SAMPLING DATE^{/3} : 23/04/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 10.04 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 23/04/2026-04/05/2026 RECEIVED DATE : 23/04/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ลานจอดรถ ตึก C)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	4.06	≤ 35
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	3.0	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	16,000,000	-

PHYSICAL APPEARANCE

- ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ
- Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

- ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
- ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
- ^{/3} : Information received from customer



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

06.05.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6904-0291

Report No.W 6904-0324

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6904-1070
SAMPLING DATE³ : 23/04/2026 SAMPLING TIME³ : 10.15 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE : 23/04/2026-04/05/2026 RECEIVED DATE : 23/04/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.16	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	48.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	157	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	280	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	10.50	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	2.00	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176

3. ³ : Information received from customer

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

06/05/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003

06/05/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6904-1070
 SAMPLING DATE³ : 23/04/2026 SAMPLING TIME³ : 10.15 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
 TESTED DATE : 23/04/2026-04/05/2026 RECEIVED DATE : 23/04/2026
 FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	5.0	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	1,700,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3.³ : Information received from customer



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by
 (MRS. PENNAPA CHANPEN)

06/05/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE ³	: โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay)	SAMPLE NO.	: 6904-1068
SAMPLING DATE ³	: 23/04/2026	SAMPLING TIME ³	: 10.19 AM
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING BY ³	: STC
SAMPLING METHOD ³	: GRAB		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE	: 23/04/2026-04/05/2026	RECEIVED DATE	: 23/04/2026
FILE NAME	: โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay)	REPORTED DATE	: 06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.36	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	84.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	59	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	316	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	83.30	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	7.13	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำเหม็น

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176

3. ³ : Information received from customer

Examined by

(MS. SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

06/05/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003

06/05/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6904-1068
SAMPLING DATE³ : 23/04/2026 SAMPLING TIME³ : 10.19 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 23/04/2026-04/05/2026 RECEIVED DATE : 23/04/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	9,200,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำเหม็น

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2.-176

3. ³ : Information received from customer



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

06/05/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6905-0204

Report No.W 6905-02002

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6905-0849
 SAMPLING DATE³ : 18/05/2026 SAMPLING TIME³ : 10.48 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
 TESTED DATE : 18-27/05/2026 RECEIVED DATE : 18/05/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 29/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ตามจอตกรต ดัก C)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.52	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	35.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	61	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	342	≤ 1,000
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.67	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567


เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176

3. ³ : Information received from customer

Examined by 

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

29.05.2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003

29.05.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6905-0204

Report No. W 6905-02002

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กูเกิ้ล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6905-0849
SAMPLING DATE³ : 18/05/2026 SAMPLING TIME³ : 10.48 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 18-27/05/2026 RECEIVED DATE : 18/05/2026
FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 29/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ตามจอตรด ตึก C)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	23.72	≤ 35
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	1.2	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	3,500,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

- ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
- ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
- ^{/3} : Information received from customer
- ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

29.05.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6905-0204

Report No. W 6905-02002

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียล เอสเตท กูเก้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6905-0848
 SAMPLING DATE³ : 18/05/2026 SAMPLING TIME³ : 10.54 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
 TESTED DATE : 18-27/05/2026 RECEIVED DATE : 18/05/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 29/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.49	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	62.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	37	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	340	≤ 1,000
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	4.00	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling


2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
 1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
 2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176
 3.³ : Information received from customer

Examined by 

(MS. SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

๑๙.๐๕.๒๖



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
 เลขทะเบียน ว-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003

๒๙.๐๕.๒๐๒๖

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6905-0204

Report No.W 6905-02002

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมาเจ็ททะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6905-0848
 SAMPLING DATE³ : 18/05/2026 SAMPLING TIME³ : 10.54 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
 TESTED DATE : 18-27/05/2026 RECEIVED DATE : 18/05/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมาเจ็ททะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 29/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	43.68	≤ 35
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	0.1	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	5,400,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3. ^{/3} : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๑๑ ๐๕ ๒๐๒๖

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6905-0355

Report No.W 6906-0092

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay)
 SAMPLING DATE³ : 30/05/2026
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
 SAMPLING METHOD³ : GRAB
 TESTED DATE : 30/05/2026-13/06/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay)

SAMPLE NO. : 6905-1382
 SAMPLING TIME³ : 02.00 PM
 SAMPLING BY³ : CUSTOMER
 RECEIVED DATE : 30/05/2026
 REPORTED DATE : 15/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ฟ่งถานจอตระ)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.58	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	7	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	10	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.52	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : yellowish
 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
 1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
 2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
 3.³ : Information received from customer



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 
 (MRS. PENNAPA CHANPEN)

15/06/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6905-0355

Report No.W 6906-0092

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียด เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay)
 SAMPLING DATE³ : 30/05/2026 SAMPLE NO. : 6905-1382
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME³ : 02.00 PM
 SAMPLING METHOD³ : GRAB SAMPLING BY³ : CUSTOMER
 TESTED DATE : 30/05/2026-13/06/2026 RECEIVED DATE : 30/05/2026
 FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 15/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	14,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : yellowish

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

- ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
- ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2-176
- ³ : Information received from customer
- ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



กองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

END OF REPORT

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

15/06/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6906-0177

Report No.W 6906-0239

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียล เอสเตท ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมาเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6906-0651
 SAMPLING DATE³ : 15/06/2026 SAMPLING TIME³ : 10.51 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-0-0006)
 TESTED DATE : 15-25/06/2026 RECEIVED DATE : 15/06/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมมาเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 25/06/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ลานจอดรถ ติด C)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.58	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	26.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	33	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	248	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ
 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
 2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 7.-176
 3. ³ : Information received from customer

Examined by 


(MS. SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-0-0002

25/06/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
 เลขทะเบียน 7-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

7-176-0-0003

25/06/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PAGE 1 / 6

FM-LAB-034 / Rev.1 / 12-11-68

Environmental Management Consultation, Water Quality.
 Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
 Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6906-0177

Report No.W 6906-0239

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสม่าเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6906-0651
 SAMPLING DATE³ : 15/06/2026 SAMPLING TIME³ : 10.51 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
 TESTED DATE : 15-25/06/2026 RECEIVED DATE : 15/06/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสม่าเชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ตามจอตรต ดิก C)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	13.16	≤ 35
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.27	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3.0	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	0.9	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	1,600,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
 1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
 2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 7.-176
 3.^{/3} : Information received from customer



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

25/06/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6906-0177

Report No.W 6906-0239

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6906-0652
 SAMPLING DATE³ : 15/06/2026 SAMPLING TIME³ : 10.47 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 2-176-0-0006)
 TESTED DATE : 15-25/06/2026 RECEIVED DATE : 15/06/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ฝั่งลานจอดรถ)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.51	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	10.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	73	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	110	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ
 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
 1. ¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
 2. ² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2-176
 3. ³ : Information received from customer

Examined by
 (MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-ก-0002

25/06/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
 ภูเก็ต 83110

Approved by
 (MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ก-0003

25/06/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PAGE 3 / 6

FM-LAB-034 / Rev.1 / 12-11-68

Environmental Management Consultation, Water Quality.
 Air Quality Analysis and Environmental Monitoring, EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
 Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6906-0177

Report No.W 6906-0239

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE¹ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6906-0652
SAMPLING DATE¹ : 15/06/2026 SAMPLING TIME³ : 10.47 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 15-25/06/2026 RECEIVED DATE : 15/06/2026
FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด (ฝั่งถนนจอครร)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.82	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.13	≤ 1
Settleable Solids ^{1/2}	mL/L	Volumetric Method	0.2	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	140,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2.-176
3.³ : Information received from customer



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

25 06 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6906-0177

Report No.W 6906-0239

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กูเกิ้ล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6906-0650
 SAMPLING DATE³ : 15/06/2026 SAMPLING TIME³ : 10.56 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-0-0006)
 TESTED DATE : 15-25/06/2026 RECEIVED DATE : 15/06/2026
 FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ค่าผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
pH at 25 °C ¹	-	Electrometric Method	7.42	5.5 - 9.0
BOD ₅ ¹	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	62.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	29	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	256	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ¹	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	71.82	≤ 35
Sulfide ¹	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	5.33	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ เหม็น 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA. AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
 1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
 2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3-176
 3.³ : Information received from customer

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-0-0002

25/06/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
 เลขทะเบียน 3-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

3-176-0-0003

25/06/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PAGE 5 / 6

FM-LAB-034 / Rev.1 / 12-11-68

Environmental Management Consultation, Water Quality.

Air Quality Analysis and Environmental Monitoring, EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.

Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670



Request No. 6906-0177

Report No.W 6906-0239

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเคที กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
 SAMPLING SOURCE³ : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6906-0650
 SAMPLING DATE³ : 15/06/2026 SAMPLING TIME³ : 10.56 AM
 SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY³ : STC
 SAMPLING METHOD³ : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
 TESTED DATE : 15-25/06/2026 RECEIVED DATE : 15/06/2026
 FILE NAME : โรงแรม โสมมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด (ทางเข้า-ออก ตึก A)	STANDARD
Grease & Oil ¹	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	11.0	≤ 20
Settleable Solids ^{1/2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Fecal Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	2,200,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ เหนียว
 2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
 1.¹ : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
 2.² : Out of accredited scope of private analysis laboratories 1-176
 3.³ : Information received from customer
 4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

25/06/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PAGE 6 / 6

FM-LAB-034 / Rev.1 / 12-11-68

Environmental Management Consultation, Water Quality.
 Air Quality Analysis and Environmental Monitoring, EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
 Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ (WATER SUPPLY)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Chergntalay) SAMPLE NO. : 6901-0832
SAMPLING DATE : 20/01/2026 SAMPLING TIME : 02.06 PM
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Chergntalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโครงการ (Lobby)	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	6.51	6.5 - 8.5
Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method	56.0	≤ 300
Chloride	mg/L	Argentometric Method	92.91	≤ 250
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.13	≥ 0.2
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	≤ 0.3
Manganese	mg/L	Persulfate Method	ND	≤ 0.08

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ใส 2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]


STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

64, 02, 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLE NO. : 6901-0832
SAMPLING DATE : 20/01/2026 SAMPLING TIME : 02.06 PM
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/01/2026-02/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : โรงแรม โฮมา เชียงทะเล (HOMA Cherngtalay) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโครงการ (Lobby)	STANDARD
Total Coliform Bacteria	in 100 mL	MPN Test Method	< 1.8	ND
Escherichia Coli	in 100 mL	MPN Test Method	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ใส 2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]
STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023
REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

04/02/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (SMIMMING POOL)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กูเกิ้ล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLING DATE : 20/01/2026
SAMPLE NO. : 6901-0829, 6901-0830 SAMPLING TIME : 01.59 PM, 02.02 PM
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/01/2026-03/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : บริษัท วัน เรียว เอสเตท กูเกิ้ล จำกัด (สำนักงานใหญ่) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Phenol Red Photometer	7.12	7.19	7.2-8.4
Chloride	mg/L	Argentometric Method	2,942.07	2,864.64	≤ 600
Ammonia Nitrogen	mg/L	Distillation and Titrimetric Method	ND	ND	≤ 20
Nitrate	mg/L	Cadmium Reduction Method	5.98	5.67	≤ 50
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.74	1.97	0.6-1.0
Total Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	1.12	2.87	-
Combined Chlorine	mg/L as Cl ₂	Calculation Method	0.38	0.90	0.5-1.0
T-Alkalinity	ppm	T-Alkalinty Test Strip	80.0	80.0	80 - 100
Calcium Hardness	ppm	Calcium Hardness Test Strip	250	100	250 - 600
Cyanuric acid	ppm	Cyanuric Acid Test Strip	100	100	30 - 60

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L, G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)


ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

04 02 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท วัน เรียว เอสเตท ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 91 ซอยเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อำเภอเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โรงแรม โฮมา เชิงทะเล (HOMA Cherngtalay) SAMPLING DATE : 20/01/2026
SAMPLE NO. : 6901-0829, 6901-0830 SAMPLING TIME : 01.59 PM, 02.02 PM
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/01/2026-03/02/2026 RECEIVED DATE : 20/01/2026
FILE NAME : บริษัท วัน เรียว เอสเตท ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) REPORTED DATE : 04/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Main Pool "จุดลึก"	Main Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 mL	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 mL	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L, G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการส้วมขี้เถ้า

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

- ^{1/} ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)
- Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- P.aeruginosa < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)


ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

04 02 2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 3

เอกสารชี้แจงระเบียบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗๕๖๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

อ้างถึง คำขอต่ออายุของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๗๖ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙/๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายพิมุข สอนมี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๑

๒) นายศิริพงศ์ พะสริ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๒

๓) นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวพรวิษา จินรัตน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวกรรณิกา แก้วสามเขียว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวจุฑาทิพย์ ชูถึง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๔

๕) นางสาวบุษยา ประกอบแสง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๖

๗) นางสาวกรรณนิการ์ ประทุมเพชร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๗

๘) นางสาวสุธาสินี ละเมาะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ห.

(นายเนเรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๗๖
ที่ อก ๐๓๒๒/ ลงวันที่

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ
น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Method
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
9	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, Washington, DC: APHA, 2023.

(นาง
นักวิท



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
(Southern Thai Consulting Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทด
(Accreditation No. Testing 1)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดง
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown)

ออกให้ ณ
(Issue date)



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2025-12-15T15:01:47.283+07:00
bf8ba089

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เลขาธิการสำนัก

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015

(Certification No. 26-LB0015)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 01

(Issue No. 01)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

(Southern Thai Consulting Company Limited)

ทดสอบ 1834

(Testing 1834)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(Valid from 24 November B.E. 2568 (2025))

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573

(Until 23 November B.E. 2573 (2030))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสีสิ่งแวดล้อม (environmental field) Water and wastewater	- Total dissolved solids (TDS) 25 mg/L to 5 000 mg/L - Total suspended solids (TSS) 5 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1279

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : COD Reactor

Manufacturer : Lovibond

Model : RD125

Serial No. : 0423/00542

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T26-1279

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : COD Reactor
Manufacturer : Lovibond
Model : RD125
Serial No. : 0423/00542
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

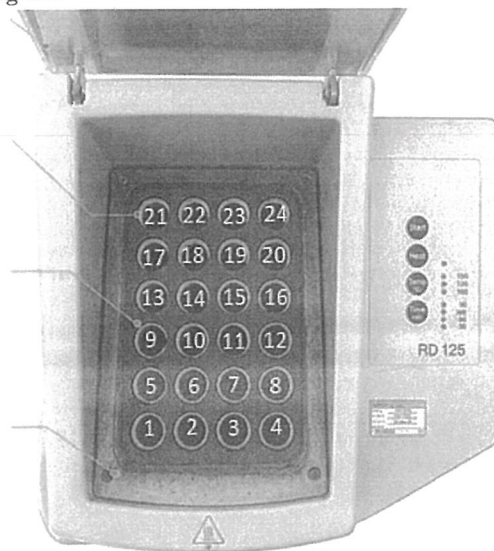

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1279

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : COD Reactor
Manufacture : Lovibond
Model : RD125
Serial No. : 0423/00542
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the COD Reactor and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
150	150.753	150.439	149.034	151.036	151.064	151.362	151.430	151.046	148.679	0.21
	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	
	150.421	150.212	151.745	151.545	151.445	150.057	150.774	150.723	151.535	
	#19	#20	#21	#22	#23	#24				
	151.542	150.907	151.560	151.077	150.774	150.723				

COD Reactor Performance Result

The performance of the COD Reactor are reported as shown below

Cal Point	UUC Setting	UUC Reading	Block Stability
(°C)	(°C)	(°C)	(± °C)
150	150	-	0.13

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration of

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Incubator

Manufacturer : ACCUPLUS

Model : I250

Serial No. : 0408-0415-0034

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 2 of 4

Equipment : Incubator
Manufacturer : ACCUPLUS
Model : I250
Serial No. : 0408-0415-0034
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

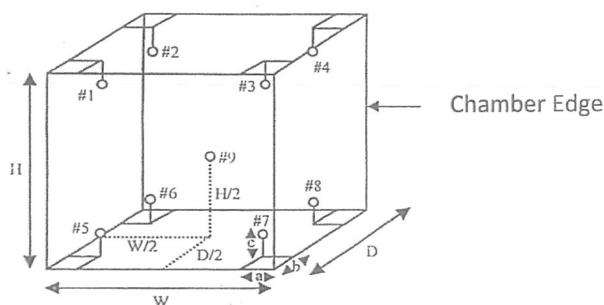

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 39.5 \times 110 \times 50.5 \text{ cm}$
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5 \text{ cm}$

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE NO. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Incubator
Manufacture : ACCUPLUS
Model : I250
Serial No. : 0408-0415-0034
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the incubator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
20	20.483	20.515	20.478	20.423	20.561	20.450	20.444	20.423	20.475	0.42

Incubator Performance Result

The performance of the incubator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
20	20.0	20.0	0.13		

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.




CERTIFICATE NO. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

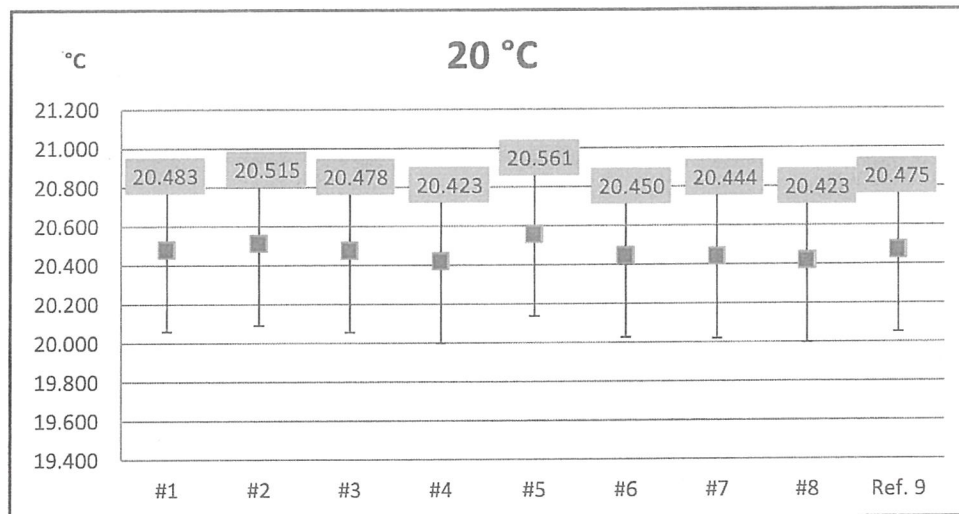

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1282

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Water Bath

Manufacturer : Memmert

Model : WNB22

Serial No. : L522.1030

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibrator : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T26-1282

CSR No. : 260511

Page : 2 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacturer : Memmert
Model : WNB22
Serial No. : L522.1030
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003W/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.161 based on ASTM E715 : 80 (re-approved 2022) as calibration guidelines.

TRACEABILITY :


This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

Sensor Installation Diagram

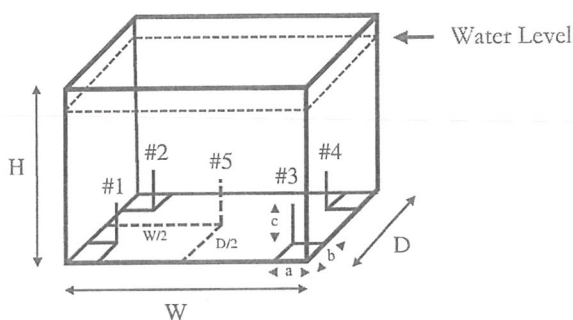

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 35 \times 22 \times 29$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1282

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacture : Memmert
Model : WNB22
Serial No. : L522.1030
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Received : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the water bath and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations					Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	
85	84.525	84.466	84.587	84.498	84.500	0.18
95	94.607	94.569	94.750	94.625	94.576	0.19

Water Bath Performance Result

The performance of the water bath are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Water Bath Stability (± °C)	Water Bath Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
85	85.0	85.0	0.053	0.11	0.20
95	95.0	95.0	0.067	0.21	0.21

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the r

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.





CERTIFICATE NO. : T26-1282

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

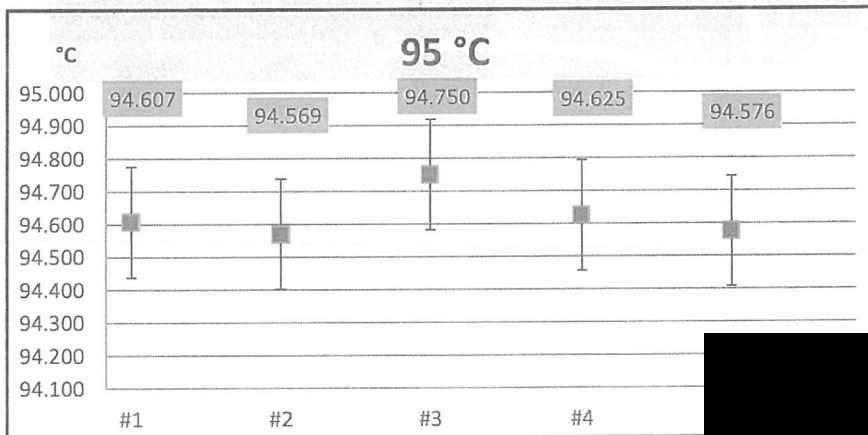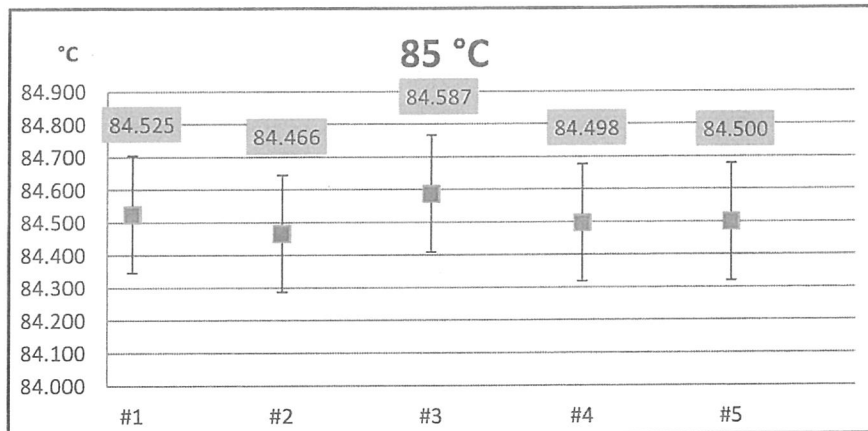

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Refrigerator

Manufacturer : SANDEN INTERCOOL

Model : SEA-0405

Serial No. : SEA0405-191200194

ID. No. : -

Resolution : -

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 15) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(60 \pm 20) \%$

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVE

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 2 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacturer : SANDEN INTERCOOL
Model : SEA-0405
Serial No. : SEA0405-191200194
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

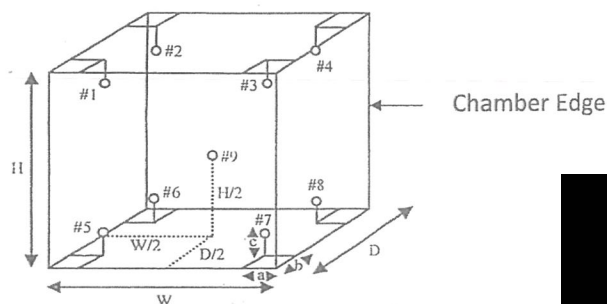

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 110 \times 120 \times 48$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacture : SANDEN INTERCOOL
Model : SEA-0405
Serial No. : SEA0405-191200194
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the refrigerator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
4	4.176	3.905	3.866	3.869	3.801	3.804	4.106	3.937	3.852	1.8

Refrigerator Performance Result

The performance of the refrigerator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
4	4	-	1.4	2.1	3.0

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 %

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04




CERTIFICATE NO. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

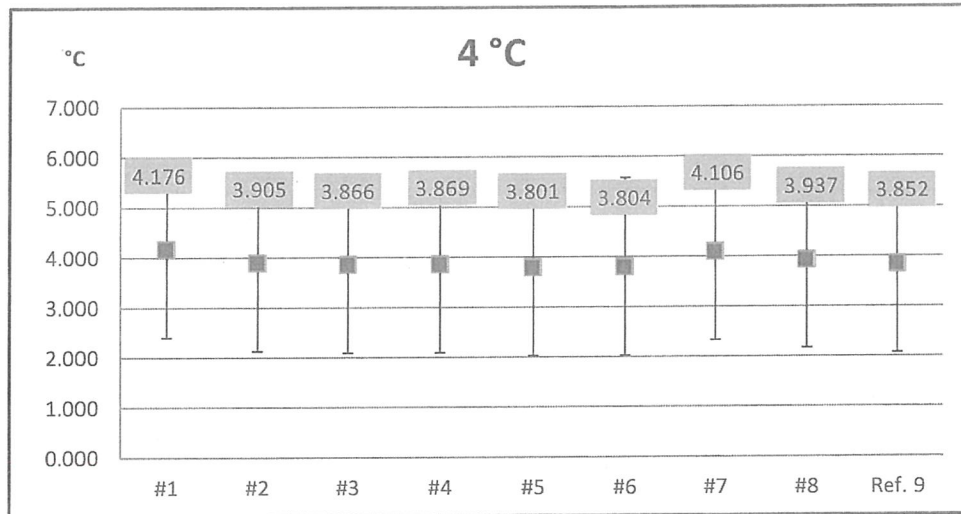

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com , Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Hot Air Oven

Manufacturer : Binder

Model : FD 56

Serial No. : 20220000017352

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED SIGNATURE

Calibrated By : Mr. Athiwat Supachewa
(Temperature Supervisor)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 2 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacturer : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20220000017352
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

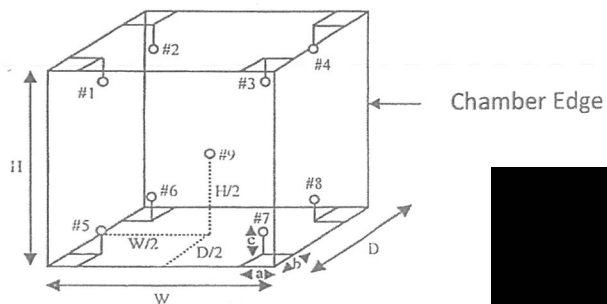

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 40 \times 40 \times 30$
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacture : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20220000017352
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the hot air oven and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
104	103.975	103.813	103.817	103.958	103.985	103.925	103.884	103.713	103.860	0.70
180	180.245	179.920	178.698	179.002	179.631	178.922	177.836	178.646	179.878	1.2

Hot Air Oven Performance Result

The performance of the hot air oven are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
104	104	104	0.082	0.19	0.37
180	180	180	0.65	2.4	3.17

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately

The above results are valid exclusively for calibration sample as m

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.





CERTIFICATE NO. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

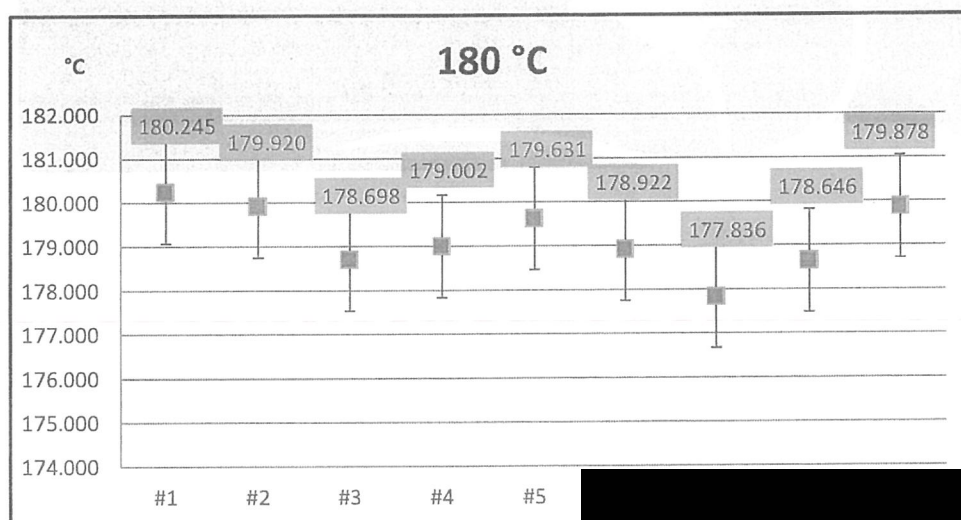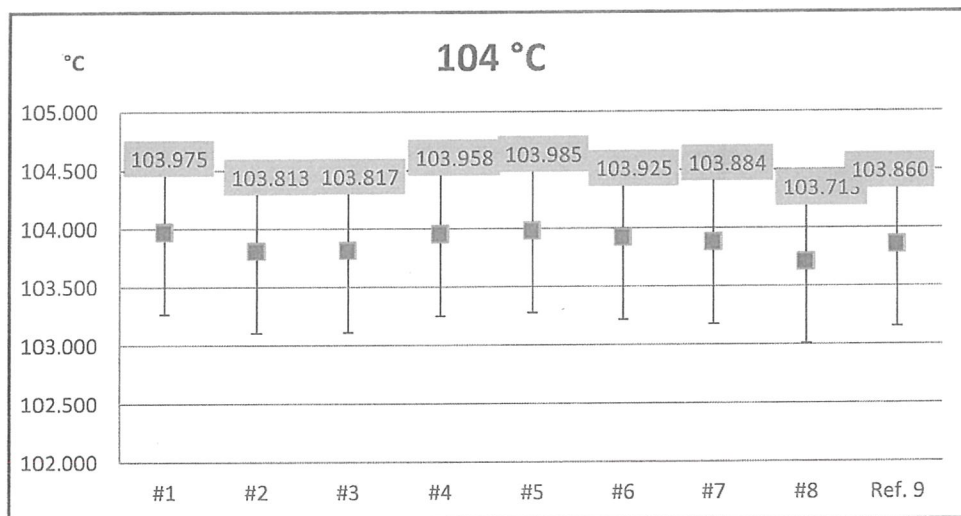

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M26-0664

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Analytical Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM2101-1S

Serial No. : 0033508410

ID. No. : -

Capacity : 2100 g

Resolution : 0.1 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : (1010 ± 10) hPa

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

APPROVED SIGNATORY

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Calibration Engineer)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : M26-0664

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM2101-1S
Serial No. : 0033508410
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Normal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2511127S	20-11-2026	TCS

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022 as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :
TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :


(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE (N=5)

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
400	0.10

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 200 g

Position					Maximum Difference (g)
1	2	3	4	5	
199.8	196.3	195.1	199.5	200.7	4.7



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M26-0664

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM2101-1S
Serial No. : 0033508410
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 200 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
40	40.4	-0.40
80	80.5	-0.50
120	120.3	-0.30
160	160.3	-0.30
200	200.1	-0.10

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0	0.00	0.29	2.65
0.5	0.5	0.00	0.29	2.65
1	1.0	0.00	0.29	2.65
2	2.0	0.00	0.29	2.65
5	5.0	0.00	0.29	2.65
10	10.0	0.00	0.29	2.65
20	20.0	0.00	0.29	2.65
40	40.0	0.00	0.29	2.65
80	79.9	0.10	0.29	2.65
120	119.9	0.10	0.29	2.65
160	159.8	0.20	0.29	2.65
200	199.8	0.20	0.29	2.65
240	239.7	0.30	0.29	2.65
280	279.7	0.30	0.25	2.65
320	319.7	0.30	0.25	2.65
360	359.6	0.40	0.25	2.65
400	399.6	0.40	0.25	2.65

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M26-0665

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Analytical Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM224-1S

Serial No. : 0035106544

ID. No. : -

Capacity : 220 g

Resolution : 0.0001 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : (1010 ± 10)

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROV

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Calibration Engineer)

() MR. PIYAPONG KATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.021-161124 R.05



CERTIFICATE No. : M26-0665

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM224-1S
Serial No. : 0035106544
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Normal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2511127S	20-11-2026	TCS

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022 as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :
TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :


(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
200	0.00005

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 100 g

Position					Maximum Difference (g)
1	2	3	4	5	
100.0000	100.0001	100.0002	100.0002	100.0000	0.0002



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M26-0665

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM224-1S
Serial No. : 0035106544
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 100 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
20	20.0000	0.00000
40	40.0000	-0.00002
60	60.0000	0.00003
80	80.0000	0.00003
100	100.0000	0.00009

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0000	0.00000	0.00014	2.25
0.01	0.0100	0.00000	0.00014	2.25
0.05	0.0500	0.00000	0.00014	2.25
0.1	0.1000	0.00001	0.00014	2.25
0.5	0.5001	-0.00010	0.00014	2.25
1	0.9999	0.00009	0.00014	2.25
2	2.0000	0.00000	0.00014	2.25
5	4.9999	0.00011	0.00015	2.25
10	10.0000	0.00001	0.00014	2.23
20	20.0001	-0.00010	0.00015	2.21
40	40.0000	-0.00002	0.00016	2.14
60	60.0000	0.00003	0.00017	2.08
80	80.0000	0.00003	0.00018	2.06
100	100.0000	0.00009	0.00018	2.02
120	120.0000	0.00008	0.00026	1.92
140	139.9999	0.00017	0.00026	1.82
160	159.9999	0.00022	0.00026	1.74
180	180.0000	0.00011	0.00028	1.67
200	200.0001	0.00001	0.00029	1.61

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sritranguroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : V26-0993

CSR No. : 260511

Page : 1 of 2

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Conductivity

Manufacturer : APERA

Model : EC 8500

Serial No. : EC85001323271005

ID. No. : -

Resolution : 0.1 μ S/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (25 $\pm$ 5) $^{\circ}$ C

Relative Humidity : (55 $\pm$ 15) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Settawut Paotong
(Calibration Technician)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



PSE.CA.AP.11.038-161124 R.03



CERTIFICATE NO. : V26-0993

CSR No. : 260511

Page : 2 of 2

Equipment : Conductivity
Manufacturer : APERA
Model : EC 8500
Serial No. : EC85001323271005
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Nominal Value/Model	Lot No.	Batch. No.	Due Date	Traceability
Conductivity Standard	84 uS/cm	CS8425A1	CS8425A1	28-01-2027	METTLER TOLEDO
Conductivity Standard	12.88 mS/cm	1209497	1209497	02-04-2027	CPA Chem
Conductivity Standard	111.8 mS/cm	6877	6877	03-09-2026	HANNA

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.181 based on direct measurement by using certified reference material as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

METTLER TOLEDO : Mettler-Toledo GmbH, Analytical, Im Longacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland

CPA Chem : CPA chem Ltd. (ANAB Cert No. AR-1835)

HANNA : Hanna Instruments Inc.

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Function : Chemical Measurement

Standard Buffer Solutions ($\mu\text{S/cm}$)	UUC Reading ($\mu\text{S/cm}$)	Correction ($\mu\text{S/cm}$)	Uncertainty ($\pm\mu\text{S/cm}$)	Coverage Factor (k)
* 84.05	84.4	-0.35	1.2	2.00

Standard Buffer Solutions (mS/cm)	UUC Reading (mS/cm)	Correction (mS/cm)	Uncertainty ($\pm\text{mS/cm}$)	Coverage Factor (k)
12.8895	12.87	0.0195	0.18	
* 111.8	112.1	-0.3	0.42	

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration on

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : psc-cal@sriranggroup.com , Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : V26-0994

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : pH Meter

Manufacturer : SI Analytics

Model : lab 845

Serial No. : 21021943

ID. No. : -

Resolution : 0.01 pH

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(25 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

Relative Humidity : $(55 \pm 15) \%$

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Settawut Paotong
(Calibration Technician)

APPROVED SIGNATORY

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 %.





CERTIFICATE NO. : V26-0994

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : SI Analytics
Model : lab 845
Serial No. : 21021943
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Nominal Value/Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
pH Calibration Standard	4.00	1127311	1127311	28-08-2026	CPA Chem
pH Calibration Standard	7.00	1127312	1127312	28-08-2026	CPA Chem
pH Calibration Standard	10.00	1127313	1127313	28-08-2026	CPA Chem
Temperature/Electrical Calibrator	MC2-TE	10548	CAL0252-26P0032	26-01-2027	RKT

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.117 based on direct measurement by using standard voltage calibrator as calibration guidelines.

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.117 based on direct measurement by using certified reference material (CRM) as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

CPA Chem : CPA chem Ltd. (ANAB Cert No. AR-1835)

RKT : Rockertek (Thailand) Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0069)

CALIBRATION RESULTS :**Function : Electrical Measurement**

Applied Voltage (mV)	pH meter Reading (mV)	Correction (mV)	Uncertainty ($\pm$ mV)	Coverage Factor (k)
177.48	178	-0.52	0.60	2.00
0.00	0	0.00	0.59	2.00
-177.48	-177	-0.48	0.60	2.00

Function : Chemical Measurement

Standard Buffer Solutions (pH)	pH meter Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty ($\pm$ pH)	Coverage Factor (k)
3.986	3.99	-0.004	0.010	2.07
6.988	6.99	-0.002	0.010	2.07
10.010	10.06	-0.050	0.010	2.07

Calibration curve - % off set - mV

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration



CERTIFICATE No. : V26-0994

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : SI Analytics
Model : lab 845
Serial No. : 21021943
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	376	220608721	SDTH-002/1025	27-10-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.180 comparison with standard thermometer

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Cal Point	Standard Temperature	UUC Reading	Correction	Uncertainty
(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(±°C)
25	25.16	25.3	-0.14	0.25

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration

--End--

PSE.CA.AP.11.017-161124 R.04



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Hot Air Oven

Manufacturer : Binder

Model : FD 56

Serial No. : 20210000003365

ID. No. : ST64030140

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Athiwat Supachewa
(Temperature Supervisor)

APPROVED SIGNATORY

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 2 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacturer : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20210000003365
ID. No. : ST64030140
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

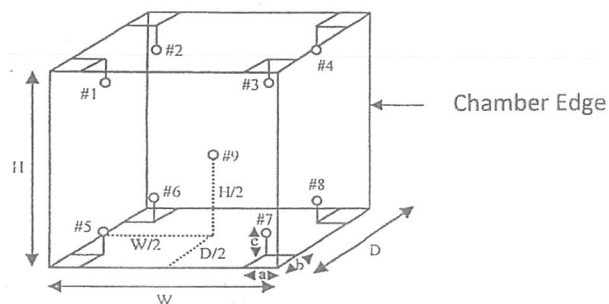

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 40 \times 40 \times 34.5$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration



CERTIFICATE NO. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 3 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacture : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20210000003365
ID. No. : ST64030140
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the hot air oven and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
104	104.267	104.021	103.729	103.750	104.162	104.128	103.868	103.771	103.984	0.71
180	183.121	182.442	180.182	179.381	179.713	181.030	178.415	178.299	179.933	1.1

Hot Air Oven Performance Result

The performance of the hot air oven are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
104	104	104	0.083	0.35	0.67
180	180	180	0.25	3.5	5.2

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the re

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.





CERTIFICATE NO. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 4 of 4

Report Graph

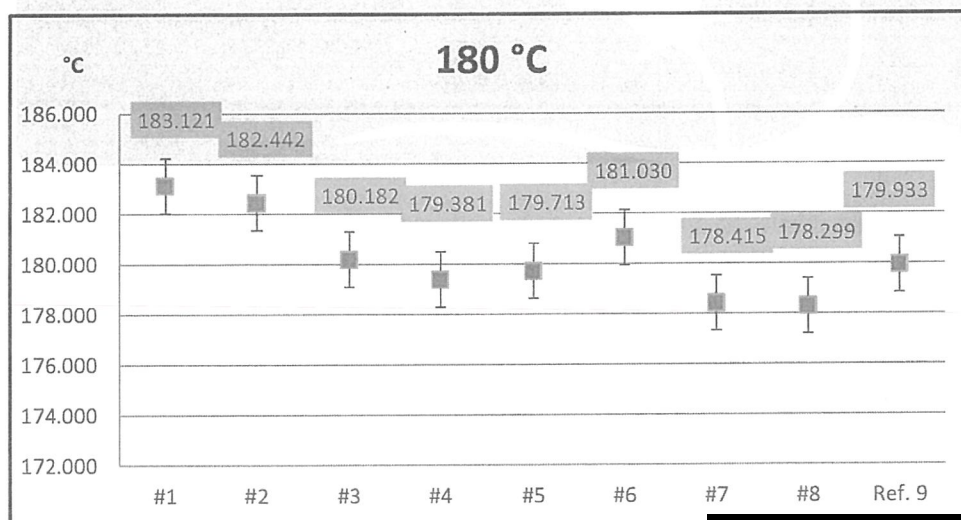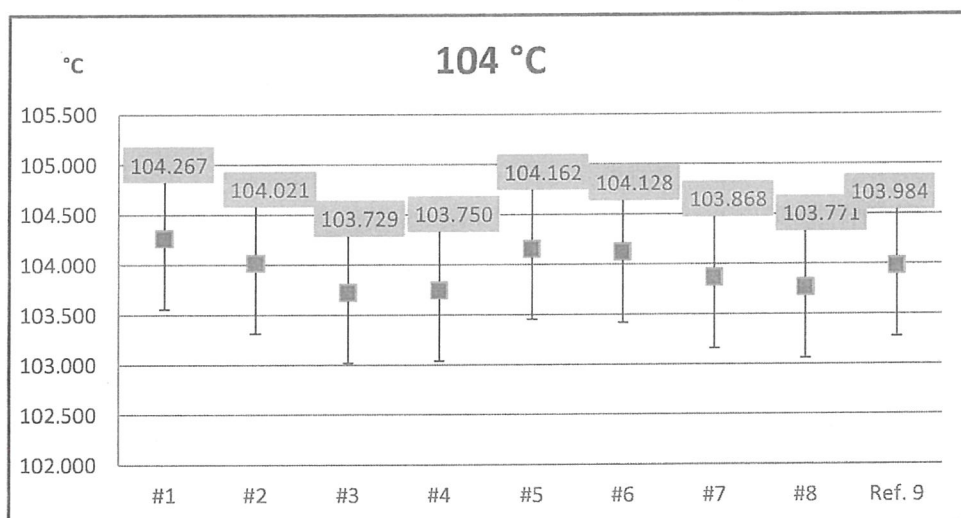

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the re

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibrati

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sritranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Water Bath

Manufacturer : Memmert

Model : WNB 22

Serial No. : L519.1143

ID. No. : ST65030144

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

APPROVED SIGNATORY

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 2 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacturer : Memmert
Model : WNB 22
Serial No. : L519.1143
ID. No. : ST65030144
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003W/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.161 based on ASTM E715 : 80 (re-approved 2022) as calibration guidelines.

TRACEABILITY :


This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

Sensor Installation Diagram

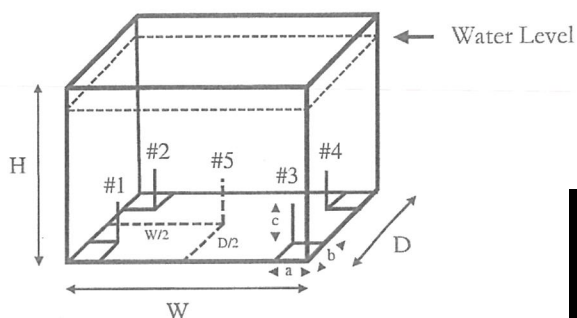

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 35 \times 22 \times 29$
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 3 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacture : Memmert
Model : WNB 22
Serial No. : L519.1143
ID. No. : ST65030144
Date of Received : 7-May-2026
Date of Received : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the water bath and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations					Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	
85	84.546	84.598	84.604	84.484	84.533	0.19
95	94.494	94.523	94.450	94.426	94.429	0.20

Water Bath Performance Result

The performance of the water bath are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Water Bath Stability (± °C)	Water Bath Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
85	85.0	85.0	0.068	0.14	0.22
95	95.0	95.0	0.095	0.19	0.28

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 %

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of





CERTIFICATE NO. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 4 of 4

Report Graph

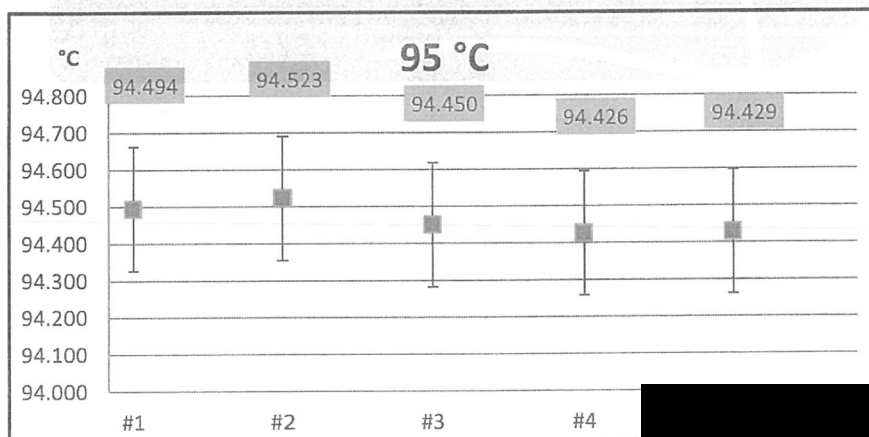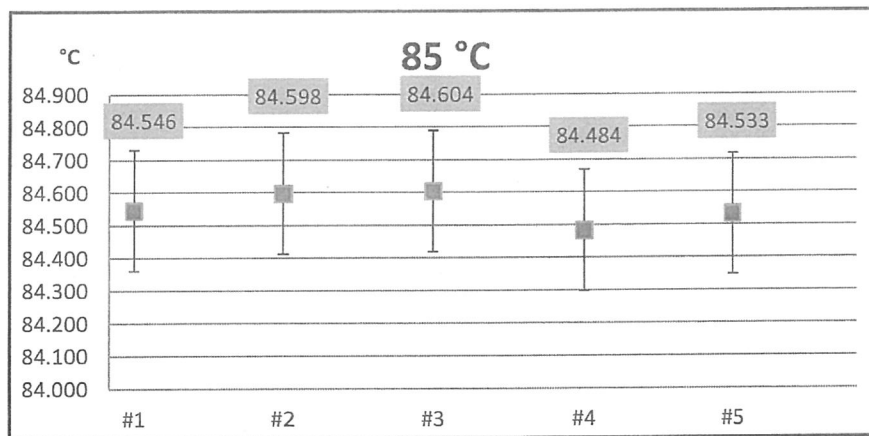

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Refrigerator

Manufacturer : Senden Intercool

Model : SEA-0405

Serial No. : SRR3375A-220900366R

ID. No. : ST660500419

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPR

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

on Manager
Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 2 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacturer : Senden Intercool
Model : SEA-0405
Serial No. : SRR3375A-220900366R
ID. No. : ST660500419
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

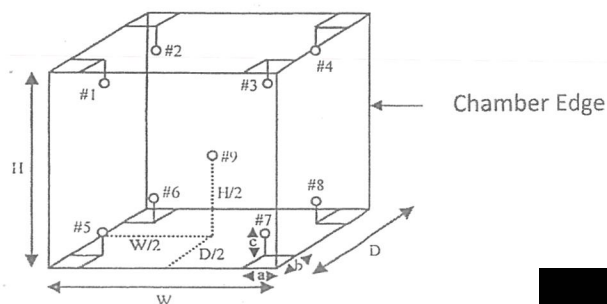

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 100 \times 120 \times 48$
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the certificate.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration.



CERTIFICATE NO. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 3 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacture : Senden Intercool
Model : SEA-0405
Serial No. : SRR3375A-220900366R
ID. No. : ST660500419
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the refrigerator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
4	4.016	3.902	4.058	3.805	3.656	3.562	3.605	3.598	3.453	0.83

Refrigerator Performance Result

The performance of the refrigerator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
4	4	4	0.36	0.82	1.1

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.




CERTIFICATE NO. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 4 of 4

Report Graph

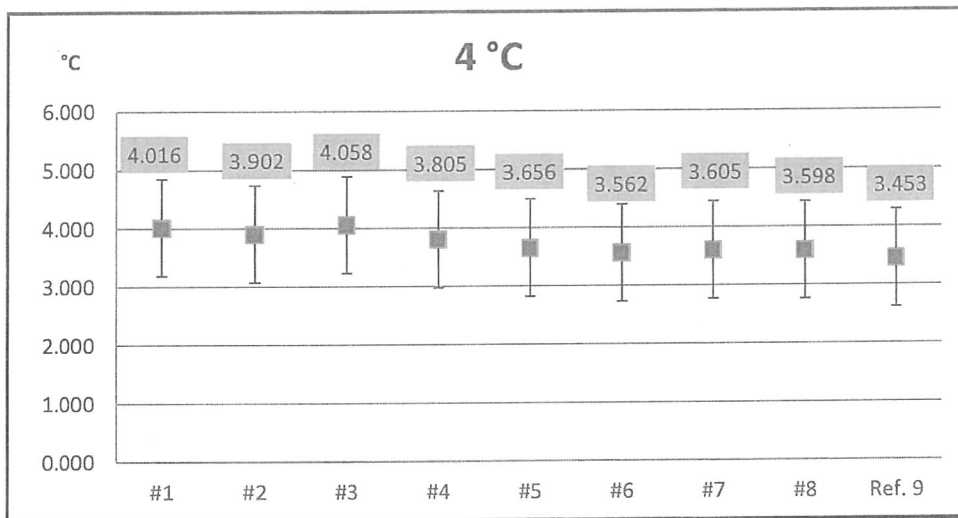

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M26-0666

CSR No. : 260512

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Analytical Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : BCA2241I-1S

Serial No. : 39506504

ID. No. : ST640202139

Capacity : 220 g

Resolution : 0.0001 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : (1010 ± 10) hPa

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Calibration Engineer)

() MR. ATTAPOL JUNTASURAT / Calibration Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : M26-0666

CSR No. : 260512

Page : 2 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BCA2241I-1S
Serial No. : 39506504
ID. No. : ST640202139
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Norminal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2511127S	20-11-2026	TCS

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022 as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurment according to the International System of Unit (SI) through :
TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :


(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE (N=5)

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
200	0.00006

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 100 g

Position					Max Differ
1	2	3	4	5	
100.0000	100.0000	100.0000	100.0001	100.0001	0.0001



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M26-0666

CSR No. : 260512

Page : 3 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BCA2241I-1S
Serial No. : 39506504
ID. No. : ST640202139
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment () After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 100 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
20	20.0000	0.00000
40	40.0000	-0.00002
60	60.0000	0.00003
80	80.0000	0.00003
100	100.0000	0.00009

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0000	0.00000	0.00018	2.37
0.1	0.1000	0.00001	0.00018	2.37
0.2	0.2000	0.00001	0.00018	2.37
0.5	0.5000	0.00000	0.00018	2.37
1	1.0000	-0.00001	0.00018	2.37
2	2.0000	0.00000	0.00018	2.37
5	5.0000	0.00001	0.00018	2.37
10	10.0000	0.00001	0.00018	2.37
20	20.0000	0.00000	0.00018	2.37
40	40.0000	-0.00002	0.00019	2.23
60	60.0000	0.00003	0.00020	2.16
80	80.0000	0.00003	0.00021	2.12
100	100.0000	0.00009	0.00021	2.11
120	120.0000	0.00008	0.00026	2.03
140	139.9999	0.00017	0.00026	2.02
160	159.9999	0.00022	0.00026	2.02
180	179.9998	0.00031	0.00029	2.01
200	199.9998	0.00031	0.00030	2.01

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration of

-- End --



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
(Southern Thai Consulting Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๘๓๔
(Accreditation No. Testing 1834)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
(Issue date : 15 December 2025)



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2025-12-15T15:01:47.283+07:00
bf8ba089

(นายวิ
ผู้อำนวยการสำนักงานค
ปฏิบัติ
เลขานุการสำนักงานค

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015

(Certification No. 26-LB0015)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 01

(Issue No. 01)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

(Southern Thai Consulting Company Limited)

ทดสอบ 1834

(Testing 1834)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(Valid from 24 November B.E. 2568 (2025))

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573

(Until 23 November B.E. 2573 (2030))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสีสิ่งแวดล้อม (environmental field) Water and wastewater	- Total dissolved solids (TDS) 25 mg/L to 5 000 mg/L - Total suspended solids (TSS) 5 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ภาคผนวกที่ 5

Checklist อุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

On process

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

On process

HOMA		Fire Protection Equipment Checklist																Month: April 2026			
		Fire Hose Cabinet						Extinguisher				Pull	Blanket	Exit	Light						
No	Location	Cabinet	Hose Reel	Valve 1 1/2'	Valve 2 1/2'	Extinguisher	Cover Valve	Axe	Chalk	Instruction	ABC	BF2000	Co2	Foam/Tpoye K	Instruction	Pull Station	Alarm Bell	Fire blanket	Fire Exit sign	Emergency light	Remark
Bld. A Fl. 1																					
Fire extinguisher																					
1	FHC-A2-01										✓										
2	FHC-A2-02										✓										
Pull Station/Alarm Bell																					
1	Beside Room A101															✓	✓				
2	Beside Administrative Office															✓	✓				
3	Access door to Room A109															✓	✓				
Fire cabinet																					
1	FHC-A1-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
2	FHC-A1-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
Emergency light																					
1	HK Pantry A1																				✓
2	Server Room A1																				✓
3	DB Room A1																				✓
4	Executive Office																				✓
5	Administrative Office																				✓
6	Finance Office																				✓
7	Right Stair Fire Exit A1.5																				✓
8	Left Stair Fire Exit A1.5																				✓
9	Main Stair A1.5																				✗
Fire Exit Signage																					
1	In Front Room A101																			✗	
2	In Front Room A109																		✓		
Bld. A Fl. 2																					
Fire extinguisher																					
1	FHC-A2-01										✓										
2	FHC-A2-02										✓										
Pull Station/Alarm Bell																					
1	Beside Room A201															✓	✓				
2	In Front Main Stair A2															✓	✓				
3	Opposite Room A215															✓	✓				
Fire cabinet																					
1	FHC-A2-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
2	FHC-A2-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
Emergency light																					
1	HK Pantry A2																				✗
2	Server Room A2																				✓
3	DB Room A2																				✓
4	Right Stair Fire Exit A2.5																				✓
5	Left Stair Fire Exit A2.5																				✓
Fire Exit Signage																					
1	In Front Room A201																			✗	
2	Opposite Room A214																		✓		
3	In Front Room A215																			✗	
Bld. A Fl.3																					
Fire extinguisher																					
1	FHC-A3-01										✓										
2	FHC-A3-02										✓										
Pull Station/Alarm Bell																					
1	Fire exit door A304															✓	✓				
2	Beside Room A316															✓	✓				
3	Fire exit door A334															✓	✓				
Fire cabinet																					
1	FHC-A3-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
2	FHC-A3-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
Emergency light																					
1	HK Pantry A3																				✗
2	Server Room A3																				✓
3	DB Room A3																				✓
4	Right Stair Fire Exit A3.5																				✓

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

On process

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pull Station/Alarm Bell																			
1	In Front Main Stair C5																	✓	✓
2	In Front Fire Exit C5 (1)																	✓	✓
3	In Front Fire Exit C5 (2)																	✓	✓
Emergency light																			
1	Fire Exit Stair C5.5 (1)																		✓
2	Fire Exit Stair C5.5 (2)																		✓
3	DB Room C5																		✓
4	Pantry HK C5																		✓
Fire Exit Signage																			
1	In Front Room C507																		✗
2	In Front Room C518																		✓
3	In Front Room C522																		✓
Bld. C Fl.6																			
Fire extinguisher																			
1	FHC-C6-01																		✓
2	FHC-C6-02																		✓
Fire cabinet																			
1	FHC-C6-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
2	FHC-C6-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Pull Station/Alarm Bell																			
1	In Front Main Stair C6																		✓
2	In Front Fire Exit C6 (1)																		✓
3	In Front Fire Exit C6 (2)																		✓
Emergency light																			
1	Fire Exit Stair C6.5 (1)																		✓
2	Fire Exit Stair C6.5 (2)																		✓
3	DB Room C6																		✓
4	Pantry HK C6																		✓
Fire Exit Signage																			
1	In Front Room C607																		✓
2	In Front Room C618																		✓
3	In Front Room C622																		✓
Bld. C Fl.7																			
Fire extinguisher																			
1	FHC-C7-01																		✓
2	FHC-C7-02																		✓
Fire cabinet																			
1	FHC-C7-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
2	FHC-C7-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗									
Pull Station/Alarm Bell																			
1	In Front Main Stair C7																		✓
2	In Front Fire Exit C7 (1)																		✓
3	In Front Fire Exit C7 (2)																		✓
Emergency light																			
1	DB Room C7																		✓
2	Pantry HK C7																		✓
Fire Exit Signage																			
1	In Front Room C707																		✓
2	In Front Room C718																		✓
3	In Front Room C722																		✓
Bld. C Fl.8																			
Fire extinguisher																			
1	barbecue Zone																		✓
2	barbecue Zone																		✓

Building A Checked by Name: Tanawut Chaochalermpong / Positon: Security Supervisor / Date: 30 June2026
 Building B Checked by Name: Tanawut Chaochalermpong / Positon: Security Supervisor / Date: 30 June 2026
 Building C Checked by Name: Jetsarit Kitjanuvat / Position: Assistant Security Manager / Date: 22 June 2026

Verified By: _____ Position _____ Date _____

■ On process

Fire Protection Equipment Check List Carpark

Month:January..... 2026

No	Location	Fire Hose Cabinet							Extinguisher			Pull	Blanket	Exit	Light	Remark				
		Cabinet	Hose Reel	Valve 1 1/2'	Valve 2 1/2'	Extinguisher	Cover Valve	Axe	Chalk	Instruction	ABC	BF2000	Co2	Foam/Type K	Instruction		Pull Station	Alarm Bell	Fire blanket	Fire Exit sign
Bld. Car Park Fl. 1																				
Pull Station/Alarm Bell																				
1	Beside Stair Fl. 01 (Right)															✓	✓			
2	Beside Stair Fl. 01 (Left)															✓	✓			
Fire cabinet																				
1	ABC 01									✓										
2	ABC 02									✓										
3	ABC 03									✓										
Emergency light																				
1	Car Park Fl.01 / 01																		✓	
2	Car Park Fl.01 / 02																		✓	
3	Car Park Fl.01 / 03																		✓	
4	Car Park Fl.01 / 04																		✓	
5	Car Park Fl.01 / 05																		✓	
6	Car Park Fl.01 / 06																		✓	
7	Car Park Fl.01 / 07																		✓	
8	Car Park Fl.01 / 08																		✓	
9	Car Park Fl.01 / 09																		✓	
Fire Exit Signage																				
1	In Front of Stair Fl. 01 (Right)																	✓		
2	In Front of Stair Fl. 01 (Left)																	✓		
Bld. Car Park Fl. 2																				
Pull Station/Alarm Bell																				
1	Beside Stair Fl. 02 (Right)															✓	✓			
2	Beside Stair Fl. 02 (Left)															✓	✓			
Fire cabinet																				
1	ABC 04									✓										
2	ABC 05									✓										
3	ABC 06									✓										
Emergency light																				
1	Car Park Fl.2 / 01																		✓	
2	Car Park Fl.2 / 02																		✓	
3	Car Park Fl.2 / 03																		✓	
4	Car Park Fl.2 / 04																		✓	
5	Car Park Fl.2 / 05																		✓	
6	Car Park Fl.2 / 06																		✓	
7	Car Park Fl.2 / 07																		✓	
8	Car Park Fl.2 / 08																		✓	
9	Car Park Fl.2 / 09																		✓	
10	Stair (Left)																		✓	
11	Stair (Right)																		✓	
Fire Exit Signage																				
1	In Front of Stair Fl. 02 (Right)																	✓		
2	In Front of Stair Fl. 02 (Left)																	✓		

Building Carpark Checked by Na Riswan Kla / Positon: Security Supervisor / Date: 25/January/2026

Verified By: Paniti Thubthieng Position Cluster Helth & Safety Manager

Fire Protection Equipment Check List Carpark

Month: February 2026

No	Location	Fire Hose Cabinet							Extinguisher				Pull	Blanket	Exit	Light	Remark		
		Cabinet	Hose Reel	Valve 1 1/2'	Valve 2 1/2'	Extinguisher	Cover Valve	Axe	Chalk	Instruction	ABC	BF2000	Co2	Foam/Type K	Instruction	Pull Station		Alarm Bell	Fire blanket
Bld. Car Park Fl. 1																			
Pull Station/Alarm Bell																			
1	Beside Stair Fl. 01 (Right)																		
2	Beside Stair Fl. 01 (Left)																		
Fire cabinet																			
1	ABC 01																		
2	ABC 02																		
3	ABC 03																		
Emergency light																			
1	Car Park Fl.01 / 01																		
2	Car Park Fl.01 / 02																		
3	Car Park Fl.01 / 03																		
4	Car Park Fl.01 / 04																		
5	Car Park Fl.01 / 05																		
6	Car Park Fl.01 / 06																		
7	Car Park Fl.01 / 07																		
8	Car Park Fl.01 / 08																		
9	Car Park Fl.01 / 09																		
Fire Exit Signage																			
1	In Front of Stair Fl. 01 (Right)																		
2	In Front of Stair Fl. 01 (Left)																		
Bld. Car Park Fl. 2																			
Pull Station/Alarm Bell																			
1	Beside Stair Fl. 02 (Right)																		
2	Beside Stair Fl. 02 (Left)																		
Fire cabinet																			
1	ABC 04																		
2	ABC 05																		
3	ABC 06																		
Emergency light																			
1	Car Park Fl.2 / 01																		
2	Car Park Fl.2 / 02																		
3	Car Park Fl.2 / 03																		
4	Car Park Fl.2 / 04																		
5	Car Park Fl.2 / 05																		
6	Car Park Fl.2 / 06																		
7	Car Park Fl.2 / 07																		
8	Car Park Fl.2 / 08																		
9	Car Park Fl.2 / 09																		
10	Stair (Left)																		
11	Stair (Right)																		
Fire Exit Signage																			
1	In Front of Stair Fl. 02 (Right)																		
2	In Front of Stair Fl. 02 (Left)																		

Building Carpark Checked by Na Riswan Kla / Positon: Security Supervisor / Date: 28/February/2026

Verified By: Paniti Thubthieng Position Cluster Helth & Safety Manager

Fire Protection Equipment Check List Carpark

Month:April..... 2026

No	Location	Fire Hose Cabinet								Extinguisher				Pull	Blanket	Exit	Light	Remark	
		Cabinet	Hose Reel	Valve 1 1/2'	Valve 2 1/2'	Extinguisher	Cover Valve	Axe	Chalk	Instruction	ABC	BF2000	Co2	Foam/Type K	Instruction	Pull Station	Alarm Bell		Fire blanket
Bld. Car Park Fl. 1																			
Pull Station/Alarm Bell																			
1	Beside Stair Fl. 01 (Right)																		
2	Beside Stair Fl. 01 (Left)																		
Fire cabinet																			
1	ABC 01																		
2	ABC 02																		
3	ABC 03																		
Emergency light																			
1	Car Park Fl.01 / 01																		
2	Car Park Fl.01 / 02																		
3	Car Park Fl.01 / 03																		
4	Car Park Fl.01 / 04																		
5	Car Park Fl.01 / 05																		
6	Car Park Fl.01 / 06																		
7	Car Park Fl.01 / 07																		
8	Car Park Fl.01 / 08																		
9	Car Park Fl.01 / 09																		
Fire Exit Signage																			
1	In Front of Stair Fl. 01 (Right)																		
2	In Front of Stair Fl. 01 (Left)																		
Bld. Car Park Fl. 2																			
Pull Station/Alarm Bell																			
1	Beside Stair Fl. 02 (Right)																		
2	Beside Stair Fl. 02 (Left)																		
Fire cabinet																			
1	ABC 04																		
2	ABC 05																		
3	ABC 06																		
Emergency light																			
1	Car Park Fl.2 / 01																		
2	Car Park Fl.2 / 02																		
3	Car Park Fl.2 / 03																		
4	Car Park Fl.2 / 04																		
5	Car Park Fl.2 / 05																		
6	Car Park Fl.2 / 06																		
7	Car Park Fl.2 / 07																		
8	Car Park Fl.2 / 08																		
9	Car Park Fl.2 / 09																		
10	Stair (Left)																		
11	Stair (Right)																		
Fire Exit Signage																			
1	In Front of Stair Fl. 02 (Right)																		
2	In Front of Stair Fl. 02 (Left)																		

Building Carpark Checked by Na Riswan Kla / Positon: Security Supervisor / Date: 28/April/2026

Verified By: Paniti Thubthieng Position Cluster Helth & Safety Manager

Building Carpark Checked by Na Riswan Kla / Positon: Security Supervisor / Date: 27/March/2026

Verified By: Paniti Thubthieng Position Cluster Helth & Safety Manager

Fire Protection Equipment Check List Carpark

Month: May 2026

No	Location	Fire Hose Cabinet								Extinguisher				Pull	Blanket	Exit	Light	Remark		
		Cabinet	Hose Reel	Valve 1 1/2'	Valve 2 1/2'	Extinguisher	Cover Valve	Axe	Chalk	Instruction	ABC	BF2000	Co2	Foam/Type K	Instruction	Pull Station	Alarm Bell		Fire blanket	Fire Exit sign
Bld. Car Park Fl. 1																				
Pull Station/Alarm Bell																				
1	Beside Stair Fl. 01 (Right)																✓	✓		
2	Beside Stair Fl. 01 (Left)																✓	✓		
Fire cabinet																				
1	ABC 01										✓									
2	ABC 02										✓									
3	ABC 03										✓									
Emergency light																				
1	Car Park Fl.01 / 01																			✓
2	Car Park Fl.01 / 02																			✓
3	Car Park Fl.01 / 03																			✓
4	Car Park Fl.01 / 04																			✓
5	Car Park Fl.01 / 05																			✓
6	Car Park Fl.01 / 06																			✓
7	Car Park Fl.01 / 07																			✓
8	Car Park Fl.01 / 08																			✓
9	Car Park Fl.01 / 09																			✓
Fire Exit Signage																				
1	In Front of Stair Fl. 01 (Right)																		✓	
2	In Front of Stair Fl. 01 (Left)																		✓	
Bld. Car Park Fl. 2																				
Pull Station/Alarm Bell																				
1	Beside Stair Fl. 02 (Right)																✓	✓		
2	Beside Stair Fl. 02 (Left)																✓	✓		
Fire cabinet																				
1	ABC 04										✓									
2	ABC 05										✓									
3	ABC 06										✓									
Emergency light																				
1	Car Park Fl.2 / 01																			✓
2	Car Park Fl.2 / 02																			✓
3	Car Park Fl.2 / 03																			✓
4	Car Park Fl.2 / 04																			✓
5	Car Park Fl.2 / 05																			✓
6	Car Park Fl.2 / 06																			✓
7	Car Park Fl.2 / 07																			✓
8	Car Park Fl.2 / 08																			✓
9	Car Park Fl.2 / 09																			✓
10	Stair (Left)																			✓
11	Stair (Right)																			✓
Fire Exit Signage																				
1	In Front of Stair Fl. 02 (Right)																		✓	
2	In Front of Stair Fl. 02 (Left)																		✓	

Building Carpark Checked by Na Riswan Kla / Positon: Security Supervisor / Date: 31/May/2026

Verified By: Paniti Thubthieng Position Cluster Helth & Safety Manager

Fire Protection Equipment Check List Carpark

Month: June 2026

No	Location	Fire Hose Cabinet							Extinguisher				Pull	Blanket	Exit	Light	Remark					
		Cabinet	Hose Reel	Valve 1 1/2'	Valve 2 1/2'	Extinguisher	Cover Valve	Axe	Chalk	Instruction	ABC	BF2000	Co2	Foam/Type K	Instruction	Pull Station	Alarm Bell	Fire blanket	Fire Exit sign	Emergency light		
Bld. Car Park Fl. 1																						
Pull Station/Alarm Bell																						
1	Beside Stair Fl. 01 (Right)															✓	✓					
2	Beside Stair Fl. 01 (Left)															✓	✓					
Fire cabinet																						
1	ABC 01										✓											
2	ABC 02										✓											
3	ABC 03										✓											
Emergency light																						
1	Car Park Fl.01 / 01																			✓		
2	Car Park Fl.01 / 02																			✓		
3	Car Park Fl.01 / 03																			✓		
4	Car Park Fl.01 / 04																			✓		
5	Car Park Fl.01 / 05																			✓		
6	Car Park Fl.01 / 06																			✓		
7	Car Park Fl.01 / 07																			✓		
8	Car Park Fl.01 / 08																			✓		
9	Car Park Fl.01 / 09																			✓		
Fire Exit Signage																						
1	In Front of Stair Fl. 01 (Right)																		✓			
2	In Front of Stair Fl. 01 (Left)																		✓			
Bld. Car Park Fl. 2																						
Pull Station/Alarm Bell																						
1	Beside Stair Fl. 02 (Right)															✓	✓					
2	Beside Stair Fl. 02 (Left)															✓	✓					
Fire cabinet																						
1	ABC 04										✓											
2	ABC 05										✓											
3	ABC 06										✓											
Emergency light																						
1	Car Park Fl.2 / 01																			✓		
2	Car Park Fl.2 / 02																			✓		
3	Car Park Fl.2 / 03																			✓		
4	Car Park Fl.2 / 04																			✓		
5	Car Park Fl.2 / 05																			✓		
6	Car Park Fl.2 / 06																			✓		
7	Car Park Fl.2 / 07																			✓		
8	Car Park Fl.2 / 08																			✓		
9	Car Park Fl.2 / 09																			✓		
10	Stair (Left)																			✓		
11	Stair (Right)																			✓		
Fire Exit Signage																						
1	In Front of Stair Fl. 02 (Right)																		✓			
2	In Front of Stair Fl. 02 (Left)																		✓			

Building Carpark Checked by Na Riswan Kla / Positon: Security Supervisor / Date: 30/June/2026

Verified By: Paniti Thubthieng Position Cluster Helth & Safety Manager

ภาคผนวกที่ 6

ใบเสร็จค่าขยะ
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

เล่มที่ 0082 เลขที่ 0004

ใบเสร็จรับเงินค่าชยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 026 - 002901

วันที่ 21 มกราคม 2569

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา โรงแรม 20,000

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 จาก บริษัท วันเรียล เอสเตท จำกัด

บ้านเลขที่ 91ซอยเชิงทะเล 4 ถนนศรีสุนทร

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 20,000.00 บาท (= สองหมื่นบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 27 ม.ค. 2569 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

128357

90

0237

เล่มที่ 0100 เลขที่ 0036

ใบเสร็จรับเงินค่าขยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 026 - 002901

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา โรงแรม 20,000

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จาก บริษัท วันเรียล เอสเตท จำกัด

บ้านเลขที่ 91ซอยเชิงทะเล 4 ถนนศรีสุนทร

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 20,000.00 บาท (= สองหมื่นบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่

เดือน

13 ก.พ. 2569

พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

130189

91 0068

เล่มที่ 0119 เลขที่ 0095

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 026 - 002901

วันที่ 9 มีนาคม 2569

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา โรงแรม 20,000

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 จาก บริษัท วันเรียล เอสเตท จำกัด

บ้านเลขที่ 91 ซอยเชิงทะเล 4 ถนนศรีสุนทร

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 20,000.00 บาท (= สองหมื่นบาทถ้วน =)

ได้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 17 มี.ค. 2569 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

132148

92 0056

เล่มที่ 0124 เลขที่ 0082

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 026 - 002901

วันที่ 1 เมษายน 2569

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา โรงแรม 20,000

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 จาก บริษัท วันเรียล เอสเตท จำกัด

บ้านเลขที่ 91 ซอยเชิงทะเล 4 ถนนศรีสุนทร

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 20,000.00 บาท (= สองหมื่นบาทถ้วน =)

ใช้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ เดือน 24 เม.ย. 2569 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

132635

92 0544

เล่มที่ 0145 เลขที่ 0004

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 026 - 002901

วันที่ 28 เมษายน 2569

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา โรงแรม 20,000

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จาก บริษัท กันเวียต เอสเตท จำกัด

บ้านเลขที่ 91 ซอยเชิงทะเล 4 ถนนศรีสุนทร

ต.เชิงทะเล อ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี

เป็นเงิน 20,000.00 บาท (= สองหมื่นบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 4 มิ.ย. 2569 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

134657

93 0566

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารตรวจเช็คระบบปั๊มเติมอากาศของบ่อน้ำเสีย

HOMA Chergtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบปั๊มเติมอากาศบ่อเลี้ยงปลา)

Location : Building A Pump No. : 1

Month: Jan 2026 (ม.ค.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
31	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non

Remark:

/ คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto ออโต้, M=Manual แมนนวล, O= Off ออฟ

HOMA Chergntalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศหอน้ำเสีย)

Location : Building B Pump No. : 2

Month: Jan 2026 (ม.ค.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ทำงาน 1 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 1 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 2 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 2 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 3 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 3 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 4 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 4 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 5 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 5 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 1 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 1 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 2 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 2 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 3 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 3 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 4 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 4 ชั่วโมง (Manual Test)	Air Pump ทำงาน 5 ชั่วโมง (A/O/M)	Air Pump ทำงาน 5 ชั่วโมง (Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	X 25.5 ชั่วโมง	Sak
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak
31	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Sak

Remark: / คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนวล, O= Off ออฟ

HOMA Cherngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบปั๊มเติมอากาศหอน้ำเสีย)

Location : Building C Pump No. : 3

Month: Jan 2026 (ม.ค.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา
31	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อริษา

Remark: / คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แบบกด , O= Off ปิด

HOMA Chergntalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบบันทึกเดินอากาศอัตโนมัติ)

Location : Building A Pump No. : 1

Month: Feb 2026 (ก.พ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพร
29																						
30																						
31																						

Remark: / คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนนวล, O= Off ออฟ

HOMA Chertgalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศบ่อน้ำเสีย)

Location : Building B Pump No. : 2

Month: Feb 2026 (ก.พ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		วิมลพร
29																						
30																						
31																						

Remark: / คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนนวล, O= Off ปิด

HOMA Chertngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศอัตโนมัติ)

Location : Building ____ C ____ Pump No. : ____ 3 ____

Month: Feb 2026 (ก.พ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump (A/O/M)	ปั๊มอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปั๊มขั้ว
29																						
30																						
31																						

Remark:

/ คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนนวล, O= Off ปิด

HOMA Cherrngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบบันทึกผลอากาศหอน้ำเสีย)

Location : Building A Pump No. : 1

Month: Mar 2026 (ปี.ศ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร
31	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		อ.ระพีพร

Remark:

/ คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual ควบคุมด้วยมือ, O= Off ปิด

HOMA Chongtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบปั๊มเติมอากาศหอพักนักเรียน)

Location : Building B Pump No. : 2

Month: Mar 2026 (ปี.ค.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	ไม่ 2 ไปให้ช่างซ่อม	จิ๋วจ
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	ไม่ 2 ไปให้ช่างซ่อม	จิ๋วจ
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ
31	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		จิ๋วจ

Remark:

/ คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนนวล, O= Off ออฟ

HOMA Chergntalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศหอน้ำเสีย)

Location : Building C Pump No. : 3

Month: Mar 2026 (ค.ศ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ชั้นที่ 1 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 2 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 3 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 4 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 5 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 1 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 2 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 3 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 4 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ชั้นที่ 5 (A/O/M)	Air Pump ชั้นที่ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non
31	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		Non

Remark:

/ คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนนวล, O= Off ออฟ

HOMA Cherngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบปั๊มเติมอากาศบ่อหน้าเลี้ยง)

Location : Building A Pump No. : 1

Month: Apr 2026 (น.บ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (ทดสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (ทดสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กิตติพงษ์
31																						

Remark: / คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนนวล, O= Off ปิด

HOMA Cherngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบบันทึกเพิ่มอากาศบ่อน้ำเสีย)

Location : Building B Pump No. : 2

Month: Apr 2026 (ม.ย.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (A/O/M)	Air Pump อัตโนมัติ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		ปกติ
31																						

Remark: / คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual ควบคุมด้วยมือ, O= Off ปิด

HOMA Cherngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบปั๊มเติมอากาศบ่อเลี้ยง)

Location : Building C Pump No. : 3

Month: Apr 2026 (ม.ย.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจ
	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ปั๊มอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
2	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
3	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
4	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
5	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
6	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
7	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
8	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
9	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
10	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
11	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
12	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
13	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
14	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
15	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
16	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
17	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
18	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
19	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
20	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
21	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
22	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
23	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
24	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
25	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
26	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
27	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
28	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
29	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
30	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/		กมลวิทย์
31																						

Remark:

/ คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนนวล, O= Off ออฟ

HOMA Cherngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบบันทึกผลการทำงานประจำวัน)

Location : Building A Pump No. : 1

Month: May 2026 (พ.ศ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump จำนวนที่ 1 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 2 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 3 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 4 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 5 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 1 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 2 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 3 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 4 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump จำนวนที่ 5 (A/O/M)	Air Pump จำนวนที่ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
2	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
3	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
4	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
5	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
6	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
7	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
8	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
9	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
10	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
11	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
12	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
13	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
14	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
15	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
16	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
17	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
18	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
19	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
20	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
21	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
22	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
23	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
24	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
25	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
26	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
27	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
28	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
29	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
30	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖
31	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		พ.ศ. ๖๖

Remark:

/ คือปกติ, X คือผิดปกติ

A=Auto ออโต้, M=Manual แมนวล, O= Off ออฟ

HOMA Chertngtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบบำบัดเสียอากาศคอป้อนน้ำเสีย)

Location : Building B Pump No. : 2

Month: May 2026 (พ.ศ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ข้อมูล 1 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 1 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 2 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 2 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 3 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 3 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 4 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 4 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 5 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 5 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 1 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 1 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 2 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 2 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 3 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 3 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 4 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 4 (เหนือ Manual Test)	Air Pump ข้อมูล 5 (A/O/M)	Air Pump ข้อมูล 5 (เหนือ Manual Test)		
1	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
2	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
3	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
4	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
5	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
6	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
7	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
8	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
9	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
10	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
11	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
12	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
13	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
14	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
15	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
16	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
17	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
18	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
19	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
20	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
21	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
22	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
23	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
24	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
25	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
26	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
27	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
28	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
29	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
30	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		Non
31	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	มี 2 ไม่ทำงาน	Non

Remark:

/ คือปกติ, X คือไม่ปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual แมนวล, O= Off ออฟ

HOMA Chongtalay

ENGINEERING DEPARTMENT

Log Sheet: Air Pump (ตรวจเช็คระบบน้ำเติมอากาศหอน้ำเลี้ยง)

Location : Building C Pump No. : 3

Month: May 2026 (พ.ศ.)

Date	8.00-18.00										15.00-24.00										Remark หมายเหตุ	ENG Check By ผู้ตรวจสอบ
	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 1 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 1 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 2 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 2 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 3 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 3 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 4 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 4 (ตรวจสอบ Manual Test)	Air Pump ถังอากาศ 5 (A/O/M)	Air Pump ถังอากาศ 5 (ตรวจสอบ Manual Test)		
1	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
2	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
3	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
4	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
5	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
6	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
7	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
8	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
9	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
10	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
11	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
12	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
13	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
14	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
15	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
16	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
17	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
18	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
19	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
20	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
21	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
22	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
23	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
24	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
25	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
26	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
27	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
28	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
29	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
30	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว
31	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓		อ.ทว

Remark: / คือปกติ, X คือผิดปกติ

A=Auto อัตโนมัติ, M=Manual ควบคุมด้วยมือ, O= Off ปิด

ภาคผนวกที่ 8


ประมวลภาพทำความสะอาดห้องพักรวม



ประมวลภาพทำความสะอาดห้องพักรวม

ภาคผนวกที่ 9

ประมวลภาพชุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ

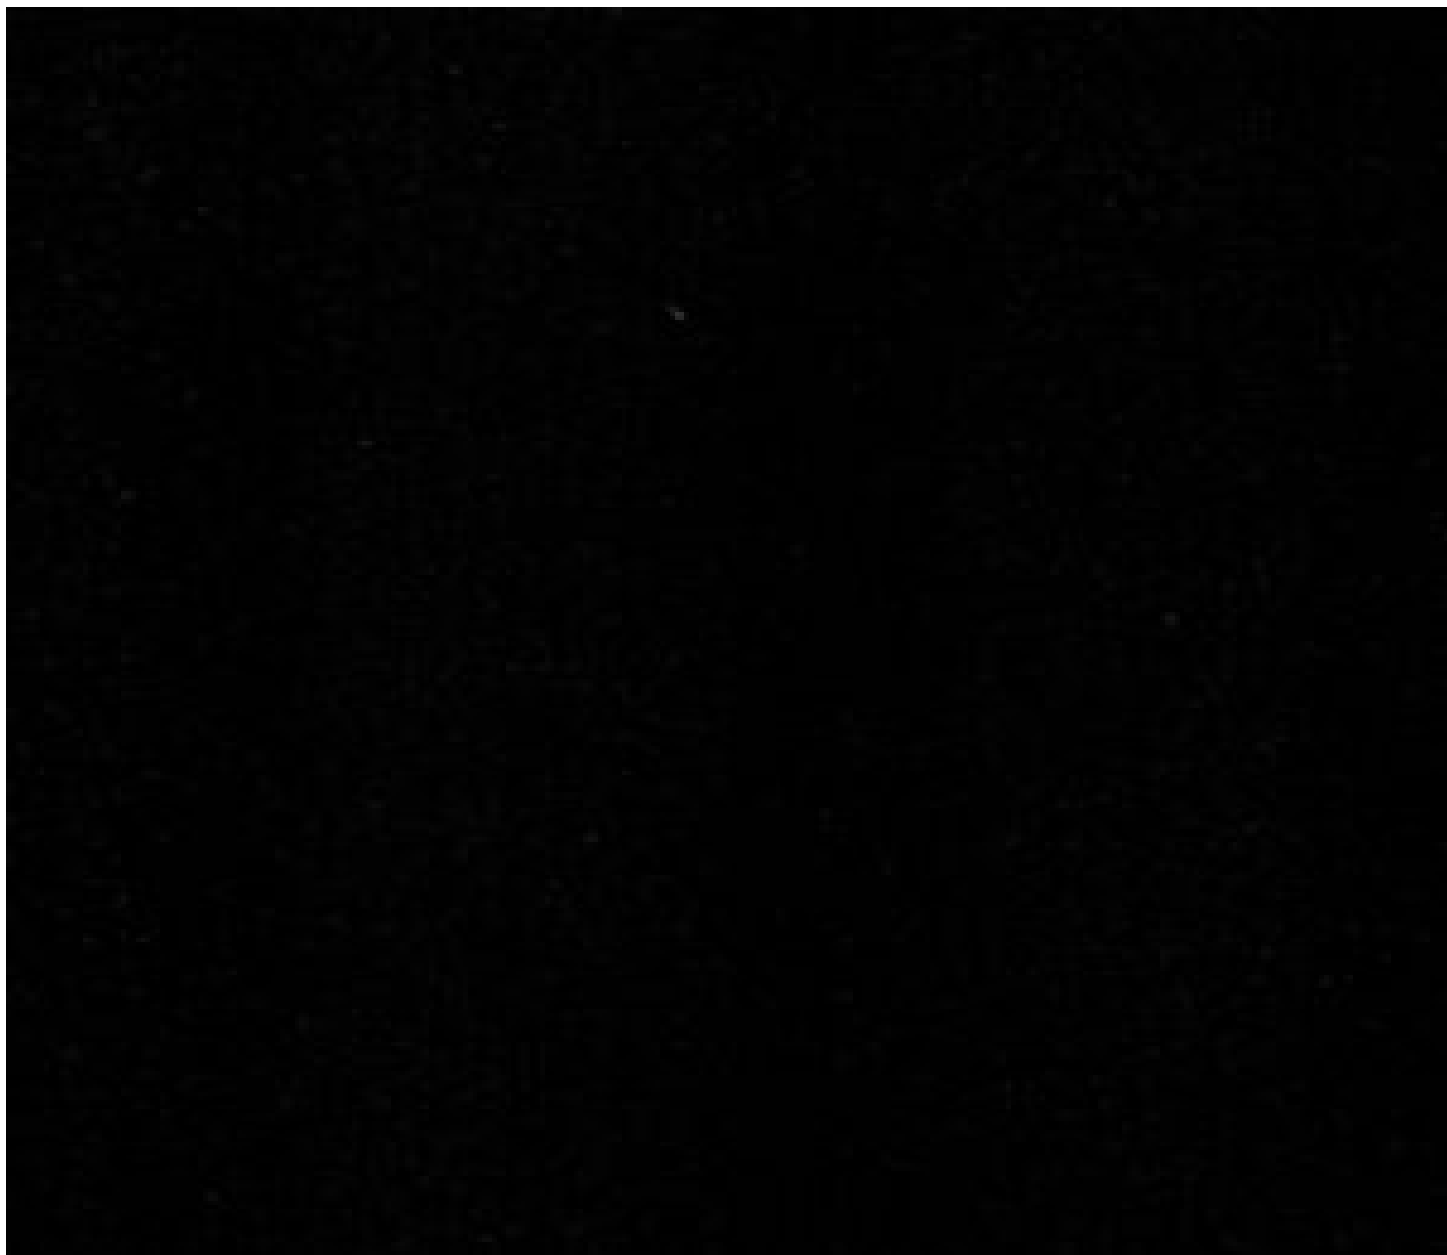

ภาคผนวกที่ 10

ใบเสร็จค่าสุบสิ่งปฏิกุล ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

เลขที่/ Bill No./單號.

CASH SALE/現兌單

นายยาน จอกทอง
รถสูบลมร่วมเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่ 35/131 ตำบลรัชฎา
☎ 083-6321931, 089-7278573, 063-0805026

Wat Wattana
Customer ๑. ช. ๒๕๖๓ ๖๐ ส.๖๐๙ ก.ก.๒๐/๒/๖๙ Date
ที่อยู่ Address ๑. ช. ๒๕๖๓ ๖๐ ส.๖๐๙ ก.ก.๒๐/๒/๖๙ Commercial License

ที่อยู่ Address ๑๑ ซ. เจริญฯ ๒ 4 ต. คลองเตย กรุงเทพฯ

U7M Bau B	การก่อสร้างอาคาร	รวม รวม รวม	12500
-----------------	------------------	-------------------	-------

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

0.2N

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

បែសេរីជក់ស្អាតសំបុត្រប្រតិបត្តិ

เลขที่ / Bill No. / 單號.

CASH SALE/現兌單

นายชาน จอกทอง
รศ.บวชร่วมเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่ 35/131 ตำบลศรีษะ
☎ 063-6321931, 089-7278573, 063-0805026

นางสาว...
Customer...
ที่อยู่...
Address...
วันที่... 5/6/64
Commercial License

จำนวน Quantity 數量	ชื่อสินค้า / Description / 貨名 Tax Id: 0835562008443	หน่วย Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額
-------------------------	--	---------------------------	---------------------------

ผู้รับเงิน/Collector/ 收票人

02/

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention


បែងចែកសេវាស្របតាមប្រភេទ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1) และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ - ซอย เชียงทะเล 4
ถนนศรีสุนทร..... แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต.....
โทรศัพท์076-643789..... โทรสาร-..... มีบริษัท.วัน เรียล เอสเตท จำกัด.....เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทโรงแรม..... ประเภท.....2....
ใบอนุญาตเลขที่ 133/2566 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 27 ธันวาคม 2571..

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

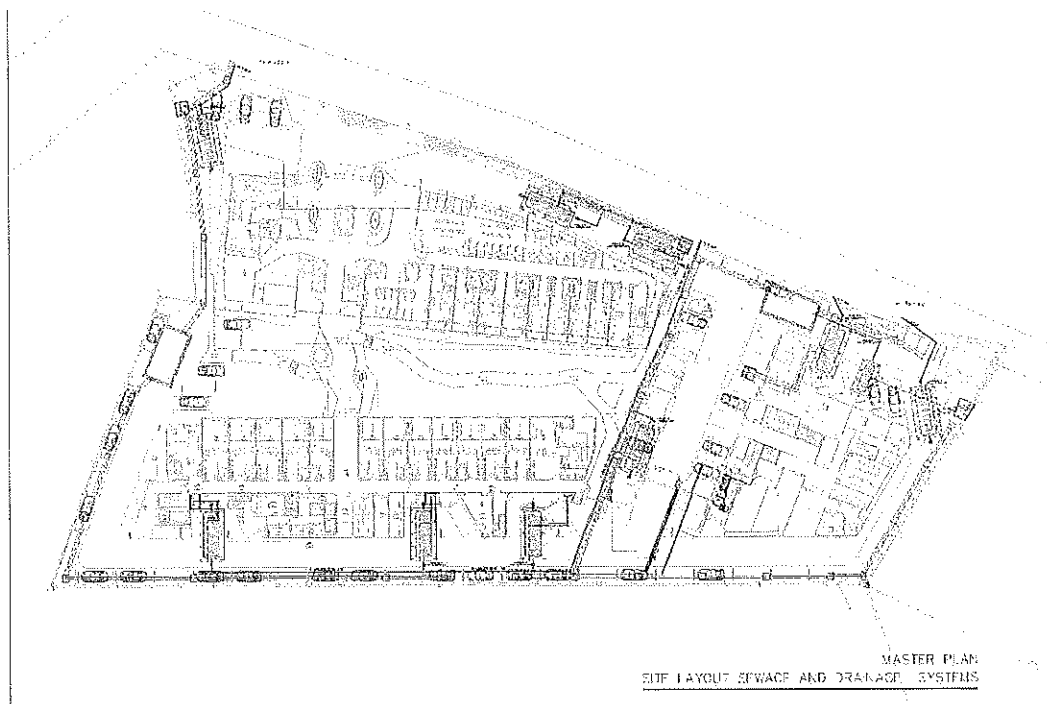

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


10
21/12
21/12
21/12

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/69	186	164.00	131.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
2/1/69	186	134.00	107.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
3/1/69	186	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
4/1/69	186	132.00	105.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
5/1/69	186	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
6/1/69	186	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
7/1/69	186	136.00	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
8/1/69	186	141.00	112.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
9/1/69	186	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
10/1/69	186	122.00	97.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
11/1/69	186	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
12/1/69	186	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
13/1/69	186	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
14/1/69	186	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	
15/1/69	186	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

HCT

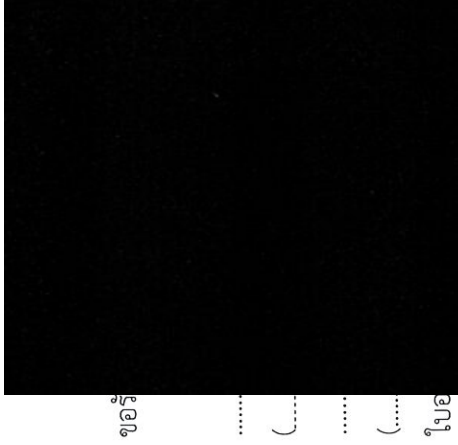

ขอรับ

ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอ..... หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โฮม่า เชียงทะเล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 91

หมู่ที่ :

ซอย : เชียงทะเล 4

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชียงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076643789

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 423

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 113/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 27/12/71

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ลูก้า ดอตติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|---|-----------------|
| 1. อื่นๆ ระบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ
(Contact.Aeration Bio-filter Tank) | 75.00 ลบ.ม./วัน |
| 2. อื่นๆ ระบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ
(Contact.Aeration Bio-filter Tank) | 75.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. อื่นๆ ระบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ
(Contact.Aeration Bio-filter Tank) | 75.00 ลบ.ม./วัน |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

5,766.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

3,980.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

3,184.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ ซอย เชียงทะเล 4
ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ กลาง จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-643789 โทรสาร-..... มี บริษัท วัน เรียล เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ประเภท 2
ใบอนุญาตเลขที่ 133/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 27 ธันวาคม 2571

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

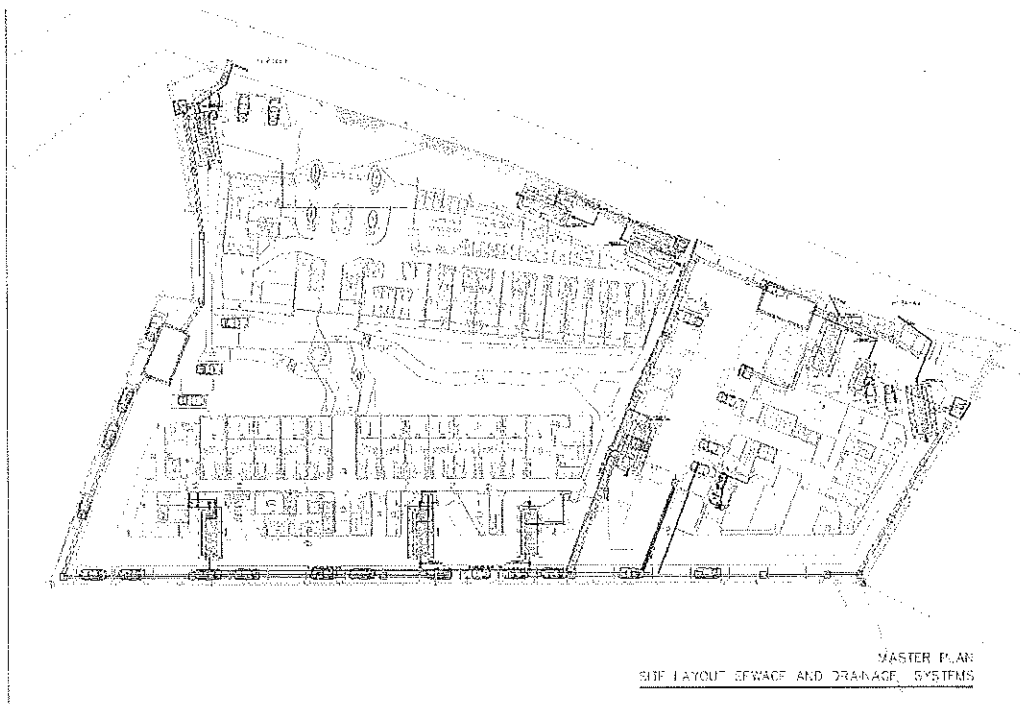

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/2/69	186	111.00	88.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
2/2/69	186	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
3/2/69	186	110.00	88.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
4/2/69	186	114.00	91.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
5/2/69	186	116.00	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
6/2/69	186	108.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
7/2/69	186	120.00	96.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
8/2/69	186	104.00	83.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
9/2/69	186	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
10/2/69	186	110.00	88.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
11/2/69	186	110.00	88.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
12/2/69	186	111.00	88.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
13/2/69	186	131.00	104.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
14/2/69	186	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	
15/2/69	186	115.00	92.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	กฤษฎา	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

	ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
	)
	 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
	)
	 หมดยุ
	
	 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
	)
	ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
	ออกให้โดย

1-CT

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โสมมา เชียงทะเล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 91

หมู่ที่ :

ซอย : เชียงทะเล 4

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชียงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076643789

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 423

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 113/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 27/12/71

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ลู้า ดอดติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|---|---|
| 1. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank) | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 75.00 ลบ.ม./วัน |
| 2. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank) | 75.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank) | 75.00 ลบ.ม./วัน |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,766.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,202.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,561.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ - ซอย ...เชิงทะเล 4.....
ถนนศรีสุนทร..... แขวง/ตำบลเชิงทะเล..... เขต/อำเภอถลาง..... จังหวัดภูเก็ต.....
โทรศัพท์076-643789..... โทรสาร-..... มีบริษัท วัน เรียว เอสเตท จำกัด.....เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทโรงแรม..... ประเภท.....2.....
ใบอนุญาตเลขที่ 133/2566 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 27 ธันวาคม 2571.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

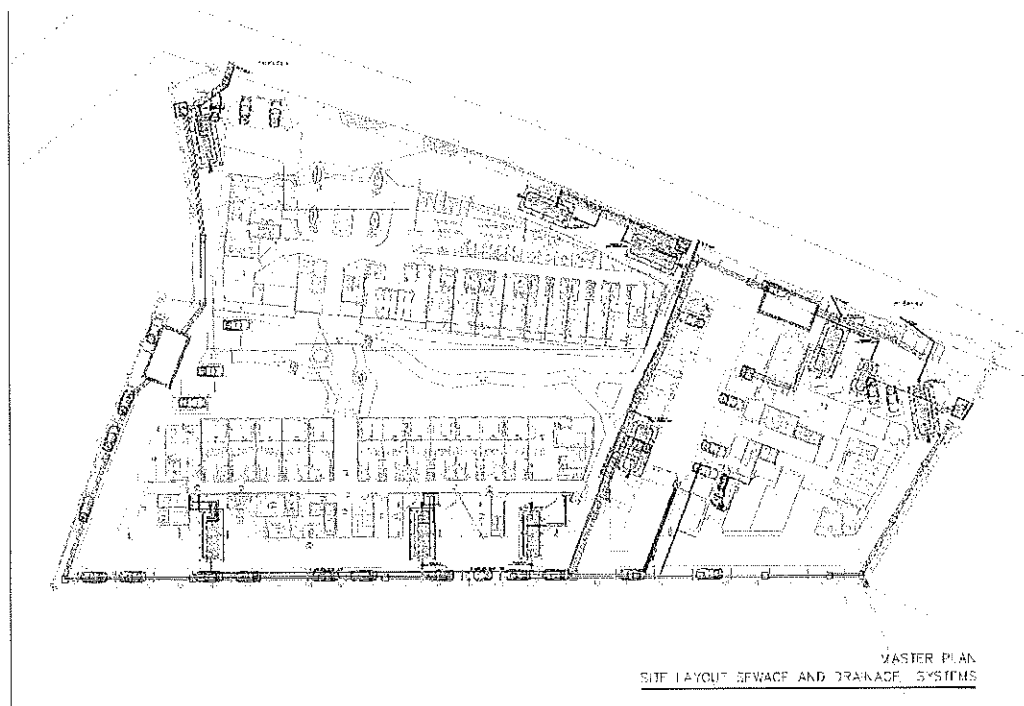


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/69	186	108.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
2/3/69	186	117.00	93.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
3/3/69	186	119.00	95.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
4/3/69	186	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
5/3/69	186	118.00	94.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
6/3/69	186	112.00	89.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
7/3/69	186	108.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
8/3/69	186	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
9/3/69	186	115.00	92.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
10/3/69	186	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
11/3/69	186	112.00	89.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
12/3/69	186	113.00	90.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
13/3/69	186	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
14/3/69	186	111.00	88.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
15/3/69	186	101.00	80.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



HCT

ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

..... หมดอายุ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โฮมมา เชียงทะเล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 91

หมู่ที่ :

ซอย : เชียงทะเล 4

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชียงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076643789

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 423

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 113/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 27/12/71

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ลูก้า ดอตติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank)	75.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank)	75.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank)	75.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องวาง/ผสานน้ำเสีย

[] เครื่องวาง/ผสานสารเคมี

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,766.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,856.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,084.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้ทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ซอย เชียงทะเล 4 ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ กลาง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-643789 โทรสาร มี บริษัท วัน เรียล เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ประเภท 2 ใบอนุญาตเลขที่ 133/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 27 ธันวาคม 2571

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

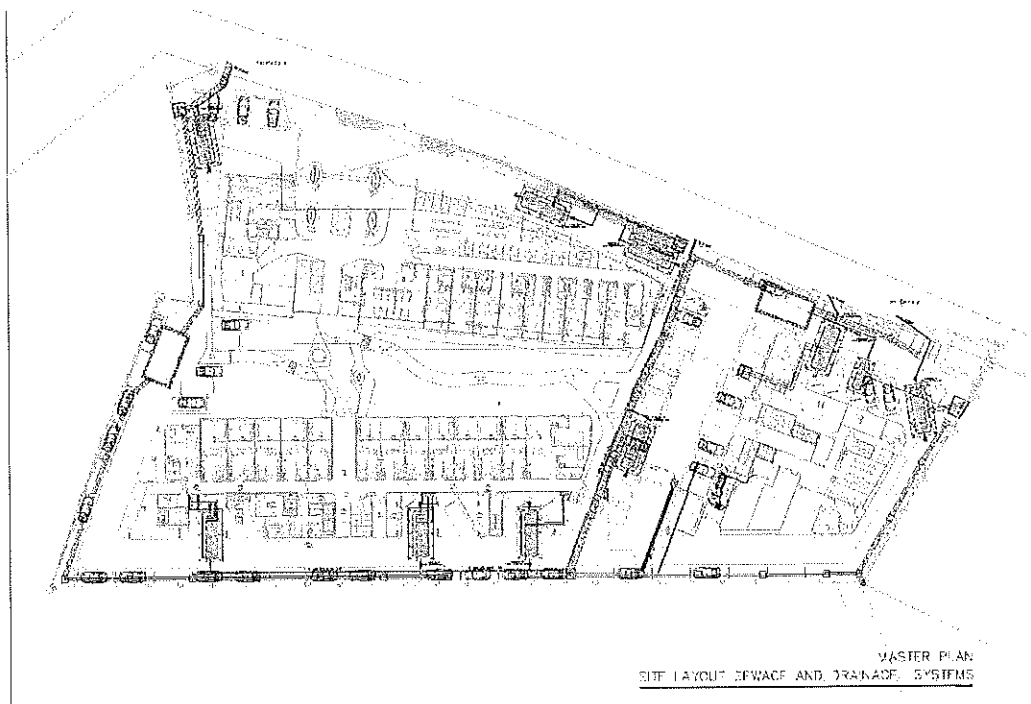

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุรกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
1/4/69	186	110.00	88.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
2/4/69	186	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
3/4/69	186	117.00	93.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
4/4/69	186	129.00	103.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
5/4/69	186	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
6/4/69	186	119.00	95.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
7/4/69	186	128.00	102.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
8/4/69	186	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
9/4/69	186	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
10/4/69	186	108.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
11/4/69	186	172.00	137.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
12/4/69	186	117.00	93.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
13/4/69	186	123.00	98.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
14/4/69	186	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา
15/4/69	186	141.00	112.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ภาษา

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระบบ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/4/69	186	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
17/4/69	186	122.00	97.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
18/4/69	186	131.00	104.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
19/4/69	186	109.00	87.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
20/4/69	186	114.00	91.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
21/4/69	186	122.00	97.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
22/4/69	186	113.00	90.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
23/4/69	186	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
24/4/69	186	99.00	79.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
25/4/69	186	108.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
26/4/69	186	118.00	94.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
27/4/69	186	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
28/4/69	186	139.00	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
29/4/69	186	132.00	105.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา
30/4/69	186	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ภาษา

6. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

มุลตามตารางข้างต้นถูกตองทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....)

.....หมดอายุ.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โหม่ง เชียงทะเล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 91

หมู่ที่ :

ซอย : เชียงทะเล 4

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชียงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076643789

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 423

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 113/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 27/12/71

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ลูก้า ดอตติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank)	75.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank)	75.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Contact.Aeration Bio-filter Tank)	75.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,766.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,805.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,044.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ - ซอย เชียงทะเล 4 ถนนศรีสุนทร..... แขวง/ตำบลเชียงทะเล..... เขต/อำเภอ.....ฉะเชิงเทรา..... จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์076-643789..... โทรสาร-..... มี บริษัท วัน เรียวล เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทโรงแรม..... ประเภท.....2..... ใบอนุญาตเลขที่ 133/2566 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 27 ธันวาคม 2571.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

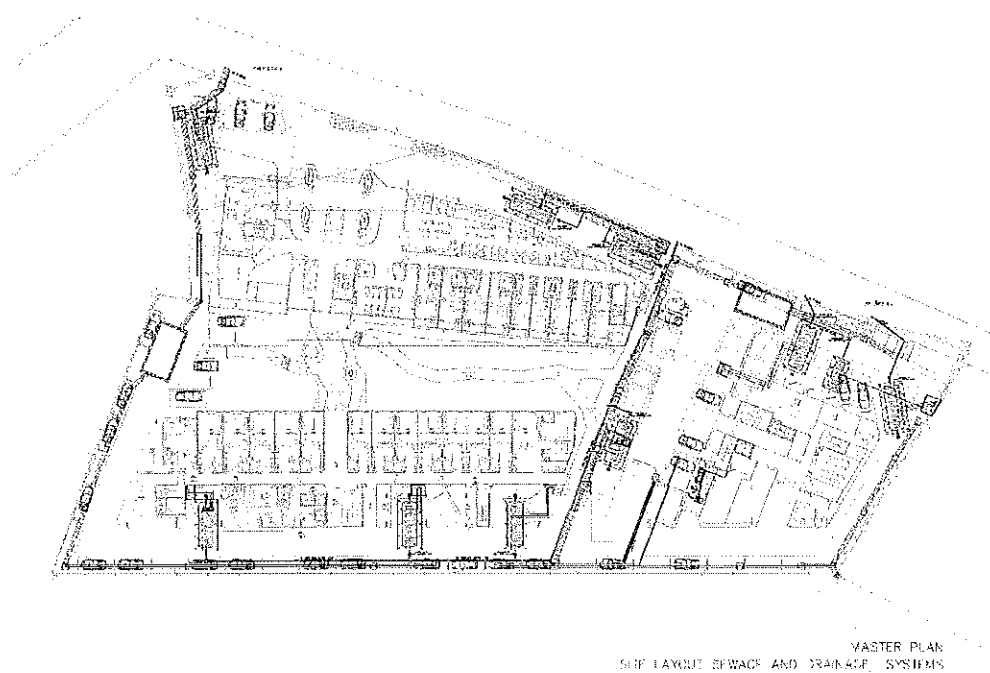

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)	
1/5/69	186	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
2/5/69	186	110.00	88.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
3/5/69	186	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
4/5/69	186	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
5/5/69	186	125.00	100.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
6/5/69	186	108.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
7/5/69	186	100.00	80.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
8/5/69	186	100.00	80.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
9/5/69	186	99.00	79.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
10/5/69	186	97.00	77.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
11/5/69	186	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
12/5/69	186	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
13/5/69	186	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
14/5/69	186	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
15/5/69	186	116.00	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/69	186	90.00	72.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
17/5/69	186	109.00	87.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
18/5/69	186	99.00	79.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
19/5/69	186	92.00	73.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
20/5/69	186	91.00	72.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
21/5/69	186	92.00	73.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
22/5/69	186	108.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
23/5/69	186	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
24/5/69	186	136.00	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
25/5/69	186	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
26/5/69	186	116.00	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
27/5/69	186	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
28/5/69	186	107.00	85.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
29/5/69	186	106.00	84.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
30/5/69	186	103.00	82.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา
31/5/69	186	82.00	65.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

..... หมดอายุ

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ - ซอย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 133/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ
..... 27 .. ธันวาคม 2571

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย ลู๊ ก้า คอตติ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.๑. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบป้อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 75 ลบ.ม./

วัน

๑.๒ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... 75ลบ.ม./
วัน

๑.๓ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... 75ลบ.ม./
วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง20... ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลาก ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 5766

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 3464

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 2771.20

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลาก ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ - ซอย เชียงทะเล 4
ถนนศรีสุนทร..... แขวง/ตำบลเชียงทะเล..... เขต/อำเภอ.....กลาง.....จังหวัดภูเก็ต.....
โทรศัพท์076-643789..... โทรสาร-..... มี บริษัท วัน เรียว เอสเตท จำกัด.....เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทโรงแรม..... ประเภท.....2....
ใบอนุญาตเลขที่ 133/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 27 ธันวาคม 2571..

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

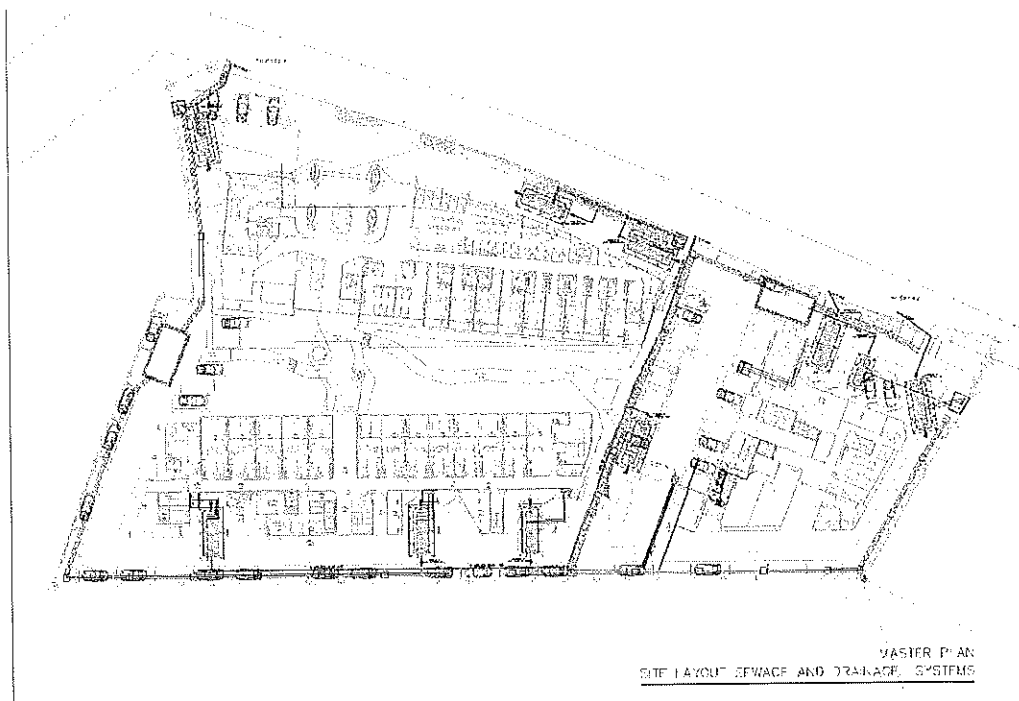

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	
1/6/69	186	103.00	82.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
2/6/69	186	104.00	83.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
3/6/69	186	98.00	68.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
4/6/69	186	86.00	68.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
5/6/69	186	96.00	76.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
6/6/69	186	104.00	83.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
7/6/69	186	78.00	62.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
8/6/69	186	79.00	63.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
9/6/69	186	75.00	60.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
10/6/69	186	78.00	62.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
11/6/69	186	84.00	67.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
12/6/69	186	100.00	80.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
13/6/69	186	116.00	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
14/6/69	186	90.00	72.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	
15/6/69	186	87.00	69.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กฤษฎา	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
16/6/69	186	95.00	76.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
17/6/69	186	84.00	67.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
18/6/69	186	74.00	59.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
19/6/69	186	80.00	73.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
20/6/69	186	75.00	72.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
21/6/69	186	88.00	73.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
22/6/69	186	87.00	86.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
23/6/69	186	76.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
24/6/69	186	75.00	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
25/6/69	186	84.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
26/6/69	186	96.00	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
27/6/69	186	104.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
28/6/69	186	93.00	85.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
29/6/69	186	96.00	84.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา
30/6/69	186	93.00	82.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กฤษฎา

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

.....	ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....)	เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)	ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....	หมดอายุ
.....	ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....)	
ใบอนุญาตเลขที่	หมดอายุ
ออกให้โดย	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ - ซอย เขต/อำเภอ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-643789 โทรสาร มี บริษัท วัน เรือ เอส.เอส.เตท. จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-643789 โทรสาร มี บริษัท วัน เรือ เอส.เอส.เตท. จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 133/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 27 .. ธันวาคม 2571 ..

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย ลูก้า ดอดติ) (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.๑ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบป้อนเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 75 ลบ.ม./

วัน

๑.๒ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบป้อนเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....75.....ลบ.ม./
วัน

๑.๓...ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....75.....ลบ.ม./
วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง20... ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลาก่อน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....5766.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....2678.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....2142.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบายนทุกวัน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....-

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลาก่อน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 12

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

HOMA

เขียนที่ : บริษัท วัน เรียล เอสเตท ภูเก็ต จำกัด

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เรียน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

บริษัท วัน เรียล เอสเตท ภูเก็ต จำกัด ขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงแรม HOMA Chermgtalay เพื่อให้เป็นไปตามที่ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการกิจกรรมตามองค์ประกอบที่กำหนดนั้น

พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร ดังนี้

☒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงาน จำนวน 6 ฉบับ

☒ สำเนาเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

☒ สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ จำนวน 6 ฉบับ

จึงเรียนเพื่อทราบ

ลงชื่อ



HOMA

3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
6. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 – 29 กรกฎาคม 2569

คำสั่ง

วัน เรียล เอสเตท ภูเก็ต จำกัด

ที่ 004 /2568

เรื่อง จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการตามองค์ประกอบที่กำหนดนั้น

บริษัท วัน เรียล เอสเตท ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) ประกอบกิจการในนามโรงแรม HOMA Phuket Cherngtalay มีลูกจ้างจำนวน 50-99 คน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โรงแรม HOMA Phuket Cherngtalay เลขที่ 91 ซอยเชิงทะเล 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ดังนี้

1.นายอำนาจ หวันตาหลา	ประธานกรรมการ
2.นายอริวัฒน์ ชูช่วย	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3.นางสาวประภาพร รัตนกุล	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4.นายเอกชัย นวลละออง	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
5.นางสาว ศุภาวิณี ฟองคำ	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
6.นายอันวา ดอปอ	ผู้แทนลูกจ้าง
7.นางสาวจันจิรา นนทเกท	ผู้แทนลูกจ้าง
8.นายธณวุฒิ เชาว์เฉลิมพงศ์	ผู้แทนลูกจ้าง
9.นายวุฒิสักดิ์ ทองกัญญา	ผู้แทนลูกจ้าง
10.นางสาวกนกกาญจน์ คำรงกุล	ผู้แทนลูกจ้าง
11.นางสาวสรณ์ศิริ รักษากิจ	เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอตนายจ้าง
- จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอตนายจ้าง

HOMA

คำชี้แจง

1. นายจ้างคนหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่ง อาจมีสถานประกอบการกิจการหลายแห่ง ให้ระบุที่ตั้งสถานประกอบการกิจการตามสถานที่ที่จัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. กฎกระทรวงมิได้กำหนดรูปแบบในการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีหน้าที่หลายประการรวมถึงต้องรายงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาคือ นายจ้าง จึงควรจัดทำเป็นคำสั่งของนายจ้างมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

ภาคผนวกที่ 13

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569




ภาพถ่าย การฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2569




ภาพถ่าย การฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2569



ภาพถ่าย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

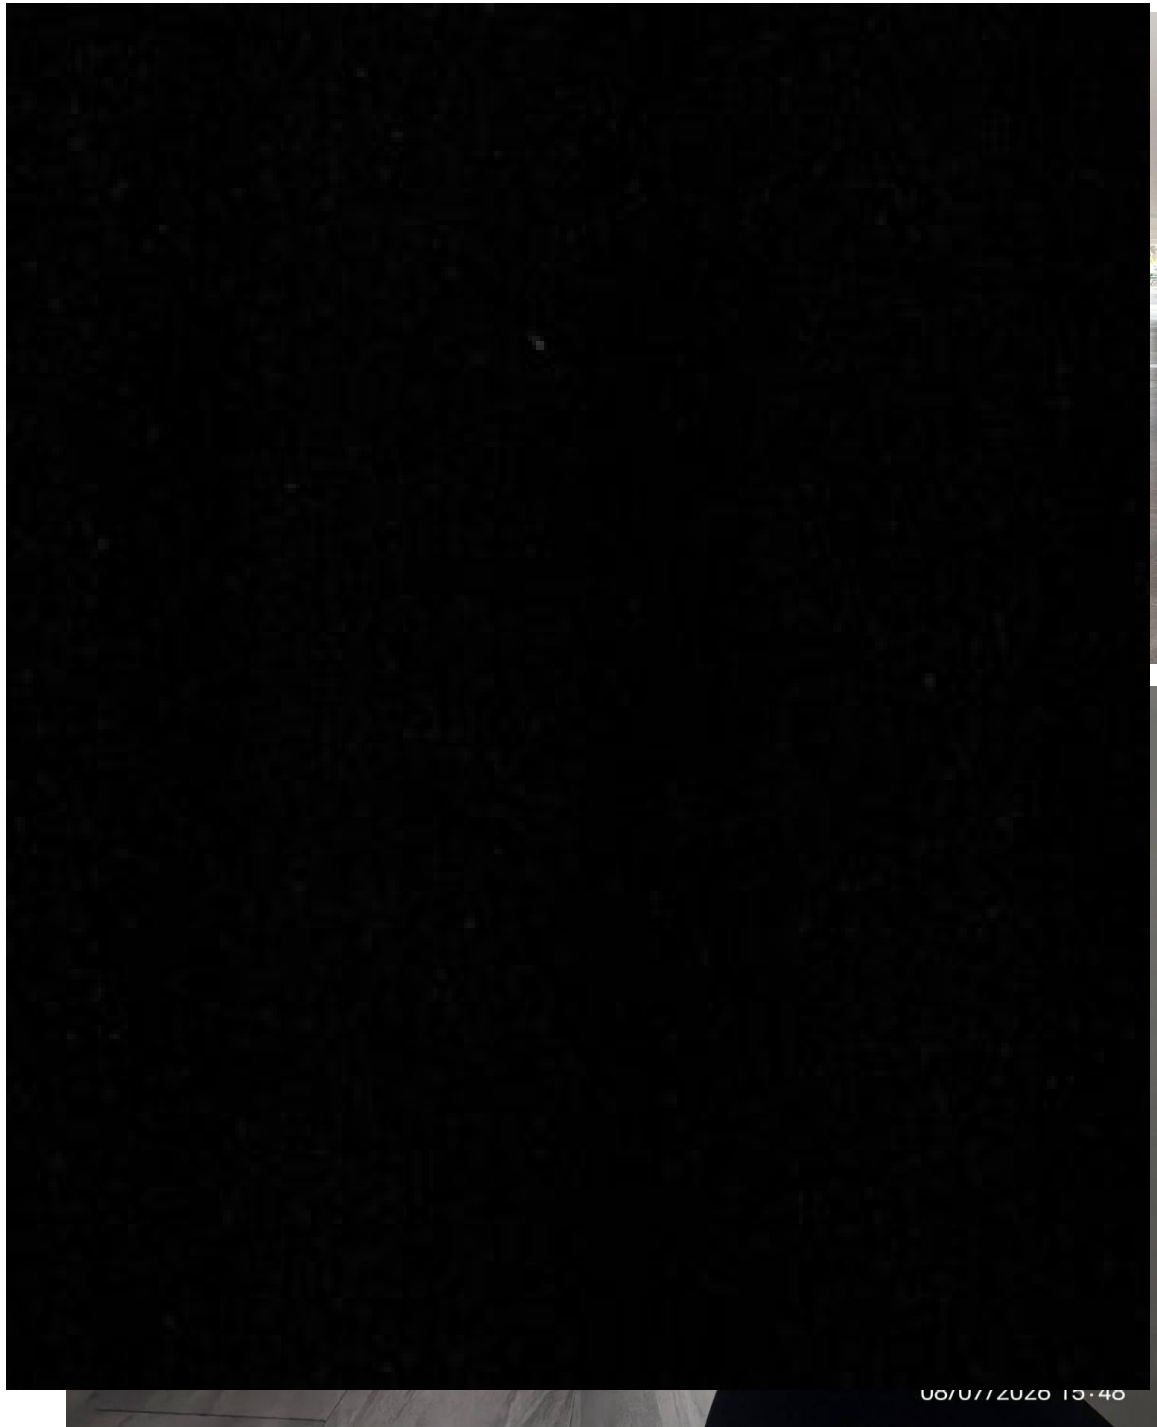

ภาพถ่าย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

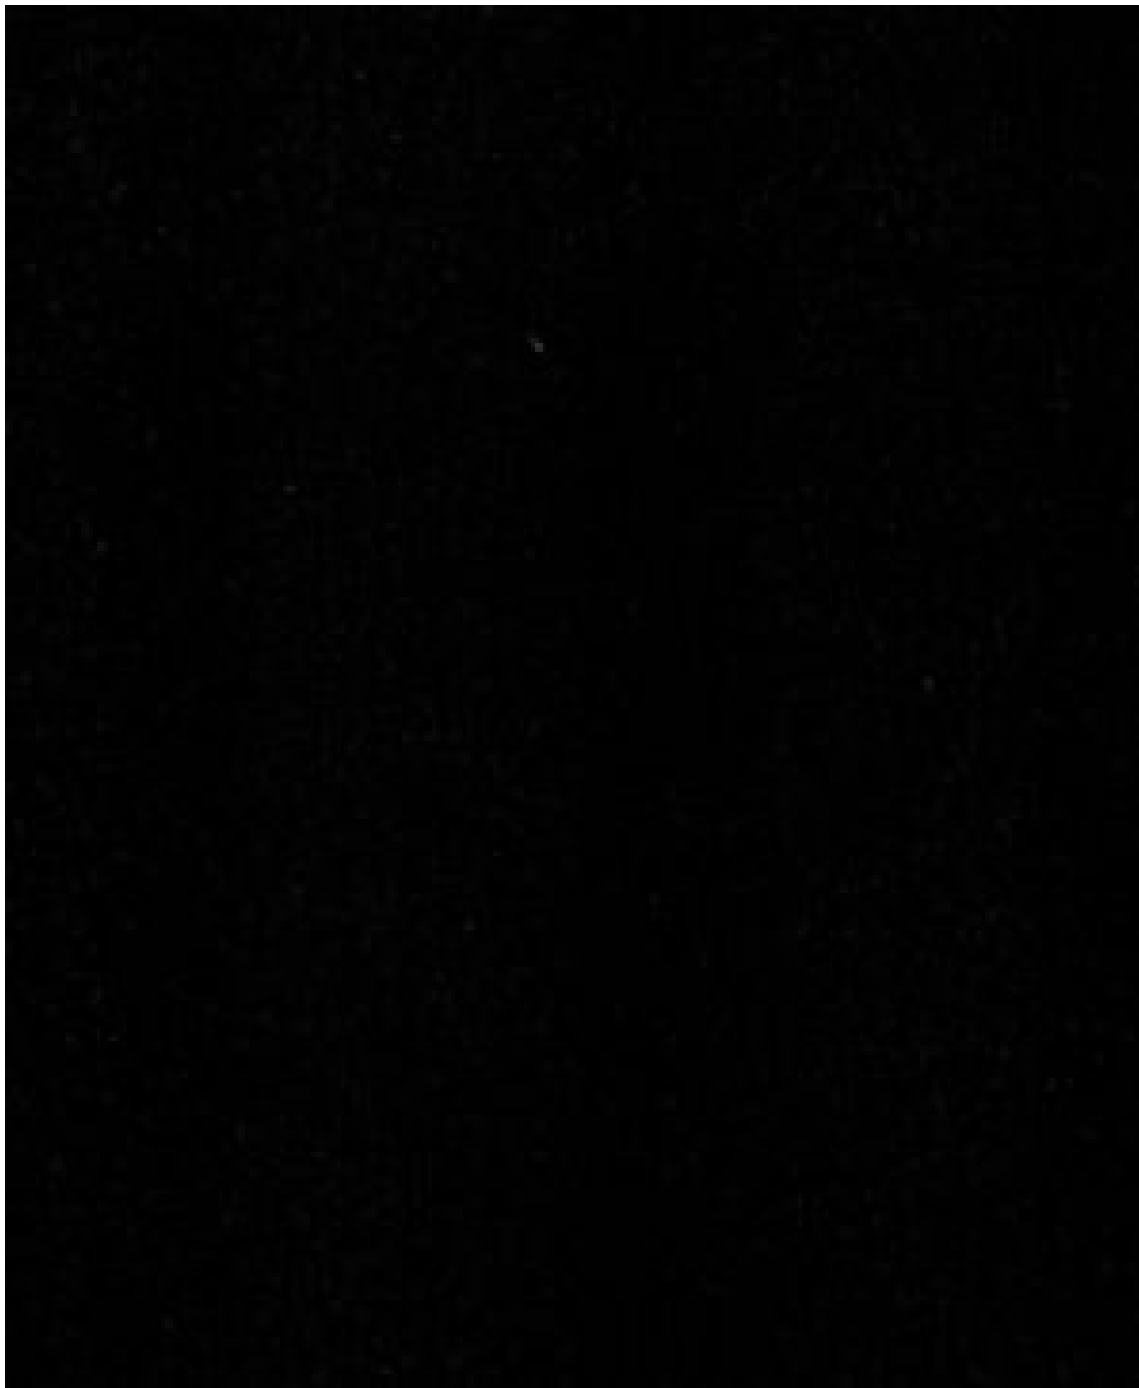

ภาพถ่าย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569
