

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอร์ไลต์ ประทานบัตรที่ 29189/15734 ของ บริษัท ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ.2569 และได้เข้าดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ อีกครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2569 ประกอบด้วยมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ดังตารางที่ 2-1)
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ (ดังตารางที่ 2-2)
- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ดังตารางที่ 2-3)

2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ (ดังตารางที่ 2-4)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ (ดังตารางที่ 2-4)

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอร์ไลต์ ประทานบัตรที่ 29189/15734 ของบริษัท ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นป่า ไม้พื้นที่ 244 ไร่ไปเป็นพื้นที่ทำเหมืองเป็นบ่อ เหมืองขนาด 39-0-95 ไร่ ลึก 10 เมตร ทำให้ ความลาดชันเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่บางส่วนถูก ปรับให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการทำเหมือง เช่น เส้นทางลำเลียง ลานกองแร่ อาคารเก็บวัตถุ ระเบิด ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน และ บ่อตัดตะกอน เป็นต้น ซึ่งผลของการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อ ทัศนียภาพโดยรอบของพื้นที่โครงการ เปลี่ยนแปลงไปขัดแย้งกับพื้นที่โดยรอบพื้นที่ กับพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ	1. การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำ เหมือง เช่น บริเวณลานกองแร่ บริเวณที่เก็บกอง เปลือกดินเศษแร่ และอาคารเก็บวัตถุระเบิด ต้อง จัดเตรียมให้เพียงพอและเรียบร้อยก่อนเปิดทำ เหมือง	- โครงการมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่เปิดทำ เหมือง อย่างชัดเจน - จัดทำแนวเวนไม่ทำเหมือง พร้อมทั้งปัก หมุดหลักแสดงแนวเขต	ไม่พบปัญหา	 21/06/2569 บริเวณหน้าเหมืองของโครงการ  08/06/2569 หลักเขตแสดงแนวเวนไม่ทำเหมือง
	2. รักษาสภาพพืชพรรณต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ โครงการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองเพื่อ คงสภาพพื้นที่เดิมไว้	- คงสภาพป่าธรรมชาติไว้ตามเดิมในพื้นที่ โครงการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ เหมือง	ไม่พบปัญหา	
	3. ปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เดิมในโครงการแบบสลับ ฟันปลาในระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ระหว่าง แถว 1 เมตร จำนวน 3 แถว เป็นอย่างน้อย	- ทำการปลูกต้นยูคาลิปตัส บริเวณภายใน พื้นที่โครงการ	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.2 ทรัพยากรดิน การขุดเปิดเปลือกดินในบริเวณพื้นที่ทำเหมือง, บ่อดักตะกอน “บ” คุ้ระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และคุณสมบัติของดินต่างๆจากเดิม ทำให้ยากต่อการถูกชะล้างพังทลายรวมทั้งการเหยียบย่ำของเครื่องจักรกลหนัก ทำให้เกิดการอัดตัวแน่นของดิน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทำเหมืองเส้นทางลำเลียง ลานกองเก็บแร่ ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน	1. ปลุกพืชคลุมดินประเภทพืชตระกูลถั่วปกคลุมพื้นที่กองเก็บเปลือกดินคั่นทำนบดิน ขอบคุ้ระบายน้ำ บ่อดักตะกอน พื้นที่ที่นำเศษดินและเศษหินไปถมกลับขุมเหมืองผ่านการทำเหมือง และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยฟื้นฟูดินและลดการชะล้างพังทลายตลอดจนที่ถูกพัดพามากับน้ำ	- ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเนื่องจากเศษดินและ เศษหินมีปริมาณน้อยมาก และนำไปสร้างคั่นทำนบบริเวณ แนวขอบ ประทานบัตร พร้อมทั้งปลูกต้นยูคาลิปตัสบริเวณคั่นทำนบ	ไม่พบปัญหา	
	2. ขุดคุ้ระบายน้ำขนาดกว้าง 2.0 ม.ท่อดูกว้าง 1.0 ม.ลึก 1.0 ม. เพื่อรองรับน้ำไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่ทำเหมือง กองเก็บเปลือกดินและเศษหินและลานกองแร่ให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอนเพื่อป้องกันการไหลบ่าชะล้างตะกอนดินทรายออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ใช้บ่อขุมเหมืองรองรับน้ำจากบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการแล้วปล่อยไหลลงสู่บ่อดักตะกอนอีกครั้งหนึ่ง	ไม่พบปัญหา	 บ่อขุมเหมือง
	3. ขุดบ่อดักตะกอน “บ” ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ ลึก 2.0 เมตร เพื่อรองรับน้ำไหลบ่าหน้าดินและให้ตกตะกอนอย่างน้อย 2 ชม.	- มีบ่อดักตะกอนจำนวน 1 บ่อ	ไม่พบปัญหา	 บ่อดักตะกอนของโครงการ

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. ตัดพินต้นไม้และเปิดเปลือกดินเฉพาะบริเวณ ที่จะทำเหมืองและพื้นที่สนับสนุนการทำ เหมืองเท่านั้น	- มีการตัดพินต้นไม้และเปิดเปลือกดินเฉพาะ บริเวณที่จะทำเหมืองและพื้นที่สนับสนุนการ ทำเหมืองเท่านั้น	ไม่พบปัญหา	
1.3 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดิน - ด้านปริมาณน้ำ อาจจะทำให้ น้ำในแหล่งน้ำ ใกล้เคียงลดลง เนื่องจากพื้นที่ให้น้ำลดลงในระดับต่ำ - ด้านคุณภาพน้ำ อาจจะทำให้ น้ำขุ่น และมี สารปนเปื้อน 2) น้ำใต้ดิน - ด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ผลกระทบใน ด้านนี้ไม่เด่นชัด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ ทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ ทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ ทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ผลกระทบต่อทรัพยากร น้ำอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด	ไม่พบปัญหา	
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ ผลกระทบในด้านนี้จะอยู่ในรูปของการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง ซึ่งได้แก่ 1) ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองภายใน พื้นที่โครงการ เช่น การขุดเปิดเปลือกดิน การเจาะรู ระเบิด การเจาะรูเพื่อผลิตแร่ การกองเก็บเปลือกดิน และเศษหิน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยตรง คือ คนงานเหมือง และอาจมีผลกระทบต่อประชาชนและ พระสงฆ์ในวัดเนินสวรรค์ทางทิศใต้ของโครงการ	- เตรียมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์เพื่อใช้ฉีด พรมน้ำในบริเวณพื้นที่กำเนิดฝุ่น	- โครงการจะทำการเปิดหน้าเหมืองตามที่ แผนผังโครงการกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการเปิดหน้าเหมือง	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการลำเลียง/ขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของถนนสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ (ทางทิศใต้ของโครงการ) ประมาณ 2 หลังคาเรือน (บ้านพู่แก้ว) พระสงฆ์ที่อยู่วัดเนินสวรรค์ และพืชพรรณทางการเกษตร				
1.5 ทรัพยากรแร่ เกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ - ด้านบวก เป็นการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรแร่ เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รัฐมีรายได้จากภาษีและค่าภาคหลวง - ด้านลบ ปริมาณสำรองแร่ลดลง เกิดการสูญเสียหินแร่ในขั้นตอนการผลิต ธรณีสัณฐานของแหล่งแร่เปลี่ยนไป และไม่ได้กำหนดความสูงของลานกองแร่ไว้ในการเก็บกองแร่ควรสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตแร่	1. ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ใช้เครื่องกระแทกทุบย่อยหินแทนการระเบิดย่อยหินที่มีขนาดใหญ่	ไม่พบปัญหา	 เครื่องกระแทกทุบย่อยหิน
	2. วางแผนการทำเหมืองให้สอดคล้องกับลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่	- มีการวางแผนการทำเหมืองที่สอดคล้องกับลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่	ไม่พบปัญหา	
	3. ควบคุมดูแลในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญงาน/วิศวกร	- มีการควบคุมดูแลในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญงาน/วิศวกร	ไม่พบปัญหา	
	4. พื้นที่เก็บกองแร่ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไร่ สูง 3 เมตรรองรับได้ประมาณ 4,191 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสัมพันธ์กับการผลิตแร่ใน 1 เดือน ซึ่งผลิตได้ 4,000 ลูกบาศก์เมตร	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	5. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำเหมือง	- มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำเหมืองให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ	ไม่พบปัญหา	


(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1) <u>พืชพรรณ</u> ทำให้สูญเสียพืชพรรณไม่ในบริเวณพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่สนับสนุนการทำเหมืองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด	- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด	ไม่พบปัญหา	
2) สัตว์ป่า ทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เกิดเสียงดังรบกวน	2. ห้ามตัดฟันต้นไม้และล่าสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงโดยเด็ดขาด ยกเว้นตัดฟันต้นไม้ในโครงการเพื่อการทำเหมือง	- ไม่มีการตัดฟันต้นไม้และล่าสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่โครงการ	ไม่พบปัญหา	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - <u>พืชพรรณในน้ำและสัตว์น้ำ</u> ทำให้การดำรงชีวิตและปริมาณของพืชน้ำและสัตว์น้ำลดลง แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และหากินน้อยชนิดและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล	3. ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้ใช้ไม้หรือวัสดุก่อสร้างจากภายนอกพื้นที่โครงการ ยกเว้น ไม้ที่ได้จากบริเวณพื้นที่เปิดทำเหมืองเท่านั้น	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	4. ไม่ตัดฟัน/ถากถางพื้นที่ไว้ล่วงหน้าเกินกว่า 3 เดือน กรณีพื้นที่ทำเหมือง ส่วนพื้นที่อื่นไม่เกิน 1 เดือน ส่วนพื้นที่แนวกันเขตไม่ทำเหมืองให้คงสภาพเดิมไว้ โดยเฉพาะทางตอนใต้ที่ติดกับวัดเนินสวรรค์เพื่อเป็น Buffer Zone ในการดักฝุ่นละออง เสียง และบดบังทัศนียภาพจากการทำเหมือง	- มีการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัสไว้ตลอดแนวพื้นที่ที่ยังไม่มีการทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	 ต้นยูคาลิปตัสตลอดแนวพื้นที่ที่ยังไม่มีการทำเหมือง

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3. ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นพื้นที่ 244-0-13 ไร่ - ทำให้ที่ดินเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า	1. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดทำตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ และจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุน (ดังภาคผนวกที่ 5)	ไม่พบปัญหา	 สำเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่
	2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ ด้านกายภาพและชีวภาพอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง (ดังภาคผนวกที่ 4)	ไม่พบปัญหา	 รายงานแผน และผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การคมนาคมขนส่ง ทำให้สภาพพื้นผิวการจราจรชำรุดทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น การพังกระจายของ ฝุ่น คิวัน เสียงดัง ความสั่นสะเทือนผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน และทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น - ช่วงถนนดินเป็นเส้นทางเข้าป่าที่มีอยู่เดิม และใช้ขนส่งแร่จากพื้นที่โครงการไปยังแหล่งรับซื้อ - ช่วงถนนลาดยาง ห้วยสาราม-เนินสวรรค์ และทางหลวงหมายเลข 2340 ใช้ขนส่งแร่จากพื้นที่โครงการไปยังโรงแต่งแร่ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไป-มา บนถนนสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ อันเนื่องจากการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมือง	1. ตัดถนนจากบริเวณชุมหมิงมายังถนนสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์และจัดทำให้เป็นถนนลูกรังอัดแน่นให้เสร็จก่อนเปิดทำเหมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และขนส่งแร่จากพื้นที่โครงการไปยังโรงแต่งแร่พร้อมกับดูแลรักษาให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	- มีการตัดถนนจากบริเวณชุมหมิงมายังถนนสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ และจัดทำให้เป็นถนนลูกรังอัดแน่นให้เสร็จก่อนเปิดทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	 ถนนทางเข้าพื้นที่ประทานบัตร
	2. ติดป้ายเตือนผู้ใช้เส้นทางสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ บริเวณก่อนถึงทางแยกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ในการขนส่งแร่บรรทุกทุกคันจะบรรทุกแร่มีน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด - มีการซ่อมแซมผิวถนนกรณีมีการชำรุด	ไม่พบปัญหา	 สภาพเส้นทางขนส่งแร่สายห้วยสาราม-เนินสวรรค์
	3. ติดป้ายประกาศช่วงเวลาทำการระเบิดให้เห็นชัดเจนในระยะ 500 เมตร จากแนวโครงการ	- ติดป้ายเตือนระวังรถบรรทุกให้ผู้ใช้เส้นทางสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ บริเวณก่อนถึงทางแยกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด หากมีการใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมืองจะทำการติดป้ายประกาศในทันที	ไม่พบปัญหา	 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. ประสานงานกับองค์กรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเส้นทาง เพื่อให้การสนับสนุน การบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ต่างๆ	- มี การ สนับสนุน การบริการ สาธารณูปโภค/สาธารณูปการต่างๆ	ไม่พบปัญหา	
	5. เลือกใช้รถบรรทุกพ่วงในการขนส่งแร่ เพื่อ ลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งแร่และไม่ จำเป็นต้องขนทุกวัน	- กิจกรรมหน้าเหมืองทางโครงการจะมี การใช้รถบรรทุกพ่วงในการขนส่งแร่ เพื่อ ลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งแร่		 ใช้รถบรรทุกพ่วงในการขนส่งแร่
3.3 การเกษตร ผลกระทบจากการทำเหมืองอาจทำให้พืช พรรณทางการเกษตรเจริญเติบโตช้า ทำให้ผลผลิต และคุณภาพลดลงเนื่องจากฝุ่นละออง รวมถึงหิน ปลิวจากการระเบิดอาจสร้างความเสียหายแก่พืช พรรณที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านกายภาพและชีวภาพอย่าง เคร่งครัด	- จากผลการสำรวจ พบว่า การทำ เหมืองของโครงการไม่มีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตของพืชพรรณทาง เกษตร	ไม่พบปัญหา	
3.4 การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ การทำเหมืองอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค/บริโภคของชุมชนได้	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านกายภาพและชีวภาพอย่าง เคร่งครัด	- จากผลการสำรวจ พบว่า การทำเหมือง ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค/บริโภคของชุมชน	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการใกล้เคียงประกอบด้วย 1) <u>สถาบันการศึกษา</u> ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสระเพลง ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่ระยะดังกล่าวมีป่าไม้กันไว้ ผลกระทบในรูปของเสียงดัง ฝุ่นละอองและการคมนาคมจึงอยู่ในระดับต่ำ	1. ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีการและขั้นตอนการทำเหมืองที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีการและขั้นตอนการทำเหมืองที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด - จากผลการสำรวจ พบว่า โรงเรียนบ้านสระเพลงไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมโครงการ	ไม่พบปัญหา	
2) <u>สถาบันศาสนา</u> คือ วัดเนินสวรรค์ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 130 เมตร พื้นที่โครงการทางทิศใต้ (หลักหมุดที่ 1) อาจจะได้รับผลกระทบในรูปของเสียงดังฝุ่นละอองรบกวน	2. สำรวจแหล่งบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ว่าได้รับความเสียหายจากการดำเนินการหรือไม่	- โครงการมีการสำรวจแหล่งบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ พบว่า ไม่มีแหล่งใดได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ	ไม่พบปัญหา	
3) <u>การบริการด้านอื่น ๆ</u> เช่น ไฟฟ้า ประปา การดำเนิน โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและประปาของชุมชนใกล้เคียง	3. กำหนดให้ใช้วัตตละเบิดในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 8 ปอนด์/จังหวะถ่วง	- จากผลการสำรวจ พบว่า วัดเนินสวรรค์ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมโครงการ - การผลิตแร่ของโครงการจะใช้เพียงรถตักแร่ในบริเวณที่สามารถทำการตักได้เท่านั้น และปัจจุบันไม่มีใช้วัตตละเบิดเปิดหน้าเหมือง ดังนั้นจึงไม่มีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และหากมีการใช้วัตตละเบิดในการผลิตแร่ทางโครงการจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ใกล้เคียง ประกอบด้วย 1) <u>สถาบันการศึกษา</u> ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน สระเพลิง ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่ระยะดังกล่าวมีป่าไม้กันไว้ ผลกระทบ ในรูปของเสียงดัง ฝุ่นละอองและการคมนาคมจึงอยู่ ในระดับต่ำ	1. ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีการและ ขั้นตอนการทำเหมืองที่กำหนดไว้ในแผนผัง โครงการอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีการและขั้นตอน การทำเหมืองที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด - จากผลการสำรวจ พบว่า โรงเรียนบ้านสระเพลิง ไม่ได้รับ ผลกระทบจากกิจกรรมโครงการ	ไม่พบปัญหา	
2) <u>สถาบันศาสนา</u> คือ วัดเนินสวรรค์ซึ่งอยู่ห่าง จากพื้นที่โครงการประมาณ 130 เมตร พื้นที่ โครงการทางทิศใต้ (หลักหมุดที่ 1) อาจจะได้รับ ผลกระทบในรูปของเสียงดังฝุ่นละอองรบกวน	2. สำรวจแหล่งบริการสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ ว่าได้รับความเสียหายจาก การดำเนินการหรือไม่	- โครงการมีการสำรวจแหล่งบริการสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ พบว่า ไม่มีแหล่งใดได้รับความเสียหายจากการ ดำเนินการของโครงการ และพบว่า วัดเนินสวรรค์ไม่ได้รับ ผลกระทบจากกิจกรรมโครงการ	ไม่พบปัญหา	
3) <u>การบริการด้านอื่น ๆ</u> เช่น ไฟฟ้า ประปา การ ดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ ไฟฟ้าและประปาของชุมชนใกล้เคียง	3. กำหนดให้ใช้วัตถุระเบิดในปริมาณสูงสุด ไม่เกิน 8 ปอนด์/จังหวะถ่วง	- การผลิตแร่ของโครงการจะใช้เพียงรถตักแร่ในบริเวณที่ สามารถทำการตักได้เท่านั้น และปัจจุบันไม่มีใช้วัตถุระเบิด เปิดหน้าเหมือง โครงการได้ใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่อง กระแทกทุบย่อยหินแทนการระเบิดย่อยหินที่มีขนาดใหญ่	ไม่พบปัญหา	 21/06/2569 เครื่องกระแทกทุบย่อยหิน  21/06/2569 รถตักแร่

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ใกล้เคียง (ต่อ)	4. สำรวจทัศนคติของราษฎรในชุมชน ใกล้เคียงหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำอยู่ตามสถานบริการสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการต่าง ๆ ว่าได้รับผลกระทบ จากการดำเนินกิจกรรมโครงการหรือไม่	- จากการสำรวจทัศนคติ ดำเนินการโดย สอบถามราษฎรบริเวณบ้านสระเพลง บ้าน คลองบง และบ้านพั่ว จำนวน 24 ราย ถึง ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทำเหมือง เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า การดำเนินกิจกรรมทำเหมืองของโครงการไม่ ส่งผลกระทบต่อราษฎรบริเวณใกล้เคียงในด้าน ต่าง ๆ แต่อย่างใด (ดังภาคผนวกที่ 9)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะ ดำเนินการในเดือนธันวาคม และจะนำเสนอในรายงาน ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	  การสำรวจทัศนคติของราษฎร
3.6 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ/โบราณสถาน และโบราณวัตถุ - ไม่เกิดผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ	-	- การทำเหมืองของโครงการยังไม่พบว่าเกิดผล กระทบกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4. ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน ทำให้ชุมชน รวมกันเข้มแข็งขึ้นลดการโยกย้ายถิ่นฐานไป ทำงานต่างถิ่น 4.2 โครงสร้างประชากร มีการเปลี่ยนแปลง ต่อวัยแรงงานบางส่วนที่มาจากต่างถิ่น 4.3 สภาพเศรษฐกิจ คือ ทำให้ราษฎรใน ท้องถิ่นมีงานทำพอมีรายได้เพิ่มขึ้น การซื้อ ขายสินค้าในชุมชนสูงขึ้นให้รัฐมีรายได้จาก ค่าภาคหลวงแร่ภาษีเงินค่าภาคหลวงแร่หนึ่ง ย่อนกลับคืนสู่ตำบลที่ตั้งโครงการ ทำให้ตำบล มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ระบบเศรษฐกิจในระดับภาค หรือประเทศ	1. ในการจัดรับสมัครงานเข้าทำงานเหมืองให้พิจารณา รับราษฎรในท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียงเข้าทำงาน ก่อน	- ชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทราบถึง ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมือง รวมถึงชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทราบถึง ผลดีที่เกิดจากการทำเหมือง - โครงการจะพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเข้า ทำงานก่อน	ไม่พบปัญหา	
	2. การรับคนงานเพิ่มเติมหากเป็นคนต่างถิ่นต้องทำ การตรวจสอบประวัติก่อนรับเข้าทำงาน พร้อมกับ จัดที่พักให้อยู่ในภายในพื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	3. จัดอบรมคนงานและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความ เข้าใจถึงอันตรายและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความ ปลอดภัยและควบคุมความประพฤติของคนงานให้ อยู่ในกฎระเบียบ	- มีการจัดอบรมคนงานและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิด ความเข้าใจถึงอันตรายและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ความปลอดภัยและควบคุมความประพฤติของ คนงานให้อยู่ในกฎระเบียบ	ไม่พบปัญหา	
	4. มีการวางแผนการทำงานที่ดี และดำเนินกิจกรรม เหมืองตามแผนงานที่วางไว้	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	5. จัดให้มีอาสาสมัครประจำบ้านและอุปกรณ์ปฐม พยาบาลเบื้องต้นและรถรับ-ส่งไว้ภายในบริเวณ สำนักงานโครงการ	- จัดให้มีอาสาสมัครประจำบ้านและอุปกรณ์ปฐม พยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่โครงการ	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.4 สภาพสังคม หากชุมชนมีการพัฒนาเป็น สังคมอุตสาหกรรมสังคมเมืองเพิ่มขึ้นอาจมีการ แก่งแย่ง เห็นแก่ตัว ความสามัคคีของราษฎรใน ชุมชนลดลงหรือเกิดอาชญากรรมได้ เป็นต้น 4.5 สาธารณสุขและอาชีวอนามัย ประกอบ 1) เสี่ยง มีสาเหตุมาจากการทำงานของ เครื่องจักรกลต่าง ๆ อุปกรณ์เพื่อการทำเหมือง และเสียงดังจากการใช้วัตถุระเบิดปรับสภาพ หน้าเหมือง ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่องาน เหมืองที่ทำงานอยู่บริเวณหน้างาน ราษฎรที่อยู่ ทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (2 หลังคาเรือน) พระสงฆ์จำพรรษาในวัดเนินสวรรค์ 2) ความสั่นสะเทือน มีสาเหตุมาจากการทำงาน ของเครื่องจักรกลหนัก เช่น เครื่องเจาะ Bulldozer รถขุดตักและรถบรรทุกใหญ่ และการใช้วัตถุ ระเบิดเพื่อปรับสภาพหน้าเหมือง ซึ่งจะเป็น สาเหตุที่ทำให้โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง และบันไดหน้าเหมืองพังทลายได้	6. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับ คนงานเหมืองทุกคนอย่างเหมาะสมกับ งาน	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้กับคนงาน และกำชับให้คนงานสวมใส่ ตลอดระยะเวลาทำงาน	ไม่พบปัญหา	
	7. จัดให้มีการทำงานเป็น ทีม และ กำหนดเวลาพักเป็นระยะๆ สำหรับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับงานที่อันตราย	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	8. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานเหมือง พร้อมทั้งการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานพร้อมทั้ง เก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	ไม่พบปัญหา	
	9. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานและคนงาน ให้รู้จักใช้เครื่องจักรกลถูกวิธี และเทคนิค การปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	10. ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือและ ประสานงานกับผู้ประสานงานกับผู้นำ ชุมชน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในรูปแบบของ การพัฒนาสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	11. จัดหาวัสดุรองรับขยะและพื้นที่กำจัด ขยะ ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้ เพียงพอกับความต้องการของคนงาน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	12. จัดสร้างแหล่งน้ำหรือหาแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค/บริโภคให้เพียงพอสำหรับคนงาน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) <u>ฝุ่นละออง</u> มีสาเหตุมาจากการขุดเปิดหน้าเหมืองการเจาะรูเพื่อผลิตแร่ การกองเก็บเปลือกดินและเศษหินลำเลียงแร่ภายในพื้นที่การขนส่ง แร่ออกนอกพื้นที่โครงการส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนงานที่ทำงานภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เคียงนัยนตา เป็นโรคปอดหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญ 4) <u>อุบัติเหตุ</u> มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ขาดความระมัดระวัง เช่น ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้องกับงาน ขาดความตั้งใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากสภาวะร่างกายและจิตใจของคนงานไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งกระบวนการผลิตของทางโครงการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งกระบวนการผลิตของโครงการ 5) <u>หินปลิวจากการระเบิด</u> การใช้วัตถุระเบิดเพื่อปรับสภาพหน้าเหมืองทำให้เกิดการแตกหักของหินออกจากหน้าเหมือง ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อราษฎรที่หาของป่าใกล้เคียงและคนงานเหมือง	13. ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใกล้เคียงทราบถึงลักษณะของขั้นตอนในการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อการดำเนินงานโครงการ โดยให้ทำการประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	- ติดป้ายแสดงพื้นที่ประทานบัตรไว้บริเวณทางเข้าโครงการ	ไม่พบปัญหา	 ป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการบริเวณทางเข้าโครงการ
		- ในการทำเหมืองจะก่อให้เกิดเสียงดังแต่มีระดับเสียงค่อนข้างต่ำเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้มีขนาดเล็ก ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่า	ไม่พบปัญหา	
		- ในการทำเหมืองจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนแต่จะมีระดับความสั่นสะเทือนต่ำมากเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้มีขนาดเล็ก ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่า	ไม่พบปัญหา	
		- ในการทำเหมืองจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยมากเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้มีขนาดเล็ก ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่า	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	1. แผนประชาสัมพันธ์ - แจ้งให้ชุมชนทราบถึงรายละเอียดโครงการ วิธีการและมาตรการในการทำเหมืองและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง ตลอดจนความก้าวหน้าของการเดินหน้าเหมืองแต่ละช่วงและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนำเรื่องเสนอผ่าน อบต.ยางราก เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบและตัวแทนในที่ประชุม ซึ่งมาจากชุมชนต่าง ๆ แจ้งให้ลูกบ้านในชุมชนทราบเป็นลำดับ	- โครงการได้แจ้งให้ชุมชนทราบถึงรายละเอียดโครงการ วิธีการและมาตรการในการทำเหมืองและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	
	- เมื่อทำการสำรวจทัศนคติของพระในวัดและราษฎรในชุมชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบจากโครงการ (วัดเนินสวรรค์ชุมชนบ้านพู่แก้ว ชุมชนบ้านสระเพลง และชุมชนบ้านห้วยบง) ควรประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการลดผลกระทบประกอบ เพื่อนำมาปรับมาตรการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป	- จากการสำรวจทัศนคติ ดำเนินการโดยสอบถามราษฎรบริเวณบ้านสระเพลง บ้านคลองบง และบ้านพู่แก้ว จำนวน 24 ราย ถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทำเหมือง เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า การดำเนินกิจกรรมทำเหมืองของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎรบริเวณใกล้เคียงในด้านต่าง ๆ แต่อย่างใด (ดังภาคผนวกที่ 9)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะดำเนินการในเดือนธันวาคม และจะนำเสนอในรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	 การสำรวจทัศนคติของราษฎร


(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. แผนมวลชนสัมพันธ์ - สร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนในรูปแบบของการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนนโรงเรียน วัด สถานีอนามัย เป็นต้น ทั้งในรูปแบบกำลังคน เครื่องจักร และกำลังทรัพย์ อาทิ : ถนน ทำการซ่อมแซมดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาทั้งปี : โรงเรียน ให้งานการศึกษาหรือร่วมกิจกรรมในโรงเรียน : วัด ทำนุบำรุงวัดหรือร่วมกิจกรรมงานบุญ/งานกุศล ตามวันสำคัญทางศาสนา และงานกุศล ผ้าป่า : สถานีอนามัย ร่วมในกิจกรรมที่ทางสถานีอนามัยจัดให้มี : ชุมชน ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ได้แก่ งานบวช งานศพงานแต่งงาน และขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น : เมื่อต้องการแรงงานเพิ่ม ควรให้สิทธิ์แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับแรก	- มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ อาทิเช่น การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือด้านการพัฒนา สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนนโรงเรียน วัด สถานีอนามัย เป็นต้น ทั้งในรูปแบบกำลังคน เครื่องจักร และกำลังทรัพย์ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพให้กับชาวบ้านโดยรอบพื้นที่โครงการ จากเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่เพอร์ไลต์ (ดังภาคผนวกที่ 6) และมีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่โครงการเหมืองแร่เพอร์ไลต์ (ดังภาคผนวกที่ 7)	ไม่พบปัญหา	   การตรวจสอบสุขภาพให้กับชาวบ้าน โดยรอบพื้นที่โครงการ จากเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.268

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
		- จัดให้มีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน และจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุน (ดังภาคผนวกที่ 6) และมีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุน (ดังภาคผนวกที่ 7)	ไม่พบปัญหา	 บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน โครงการเหมืองแร่เพอร์ไลต์  บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่เพอร์ไลต์
	3.แผนการชดเชยค่าเสียหายต่อชุมชน - เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ ต้องยินดีฟังข้อร้องเรียน พร้อมปรับปรุงแก้ไข หรือจ่ายค่าชดเชย/ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม โดยมีตัวแทน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนกลางร่วมตัดสินใจและเป็นพยานทุกครั้ง	- ตั้งแต่เริ่มเปิดการทำเหมืองยังไม่เคยมีกรณีร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากกิจกรรมของโครงการแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
6) <u>ทัศนคติ</u> <u>6.1 ด้านลบ</u> ทัศนคติของราษฎรในชุมชนจะเป็นไปในด้านลบหากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง <u>6.2 ด้านบวก</u> ทัศนคติของราษฎรในชุมชนจะเป็นไปในด้านบวกหากการดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับทางโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเอื้อประโยชน์กับท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้น สร้างงานและรายได้ให้กับราษฎรในชุมชน		- ชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทราบถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	
		- มีการชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทราบถึงผลดีที่เกิดจากการทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	
		- จากการสำรวจทัศนคติ ดำเนินการโดยสอบถามราษฎรบริเวณบ้านสระเพลง บ้านคลองบง และบ้านพู่แก้ว จำนวน 24 ราย ถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทำเหมือง เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า การดำเนินกิจกรรมทำเหมืองของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎรบริเวณใกล้เคียงในด้านต่าง ๆ แต่อย่างใด (ดังภาคผนวกที่ 9)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะดำเนินการในเดือนธันวาคม และจะนำเสนอในรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	  การสำรวจทัศนคติของราษฎร

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ช่วงดำเนินการทำเหมือง 1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 1) ลักษณะภูมิประเทศ เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นป่าไม้ พื้นที่ 244 ไร่ไปเป็นพื้นที่ทำเหมืองเป็นบ่อ เหมืองขนาด 39-0-95 ไร่ ลึก 10 เมตร ทำให้ ความลาดชันเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่บางส่วนถูกปรับ ให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการทำเหมือง เช่น เส้นทางลำเลียง ลานกองแร่ อาคารเก็บวัตถุดิบ ระเบิด ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน และ บ่อตัดตะกอน เป็นต้น ซึ่งผลของการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อ ทัศนียภาพโดยรอบของพื้นที่โครงการ เปลี่ยนแปลงไปขัดแย้งกับพื้นที่โดยรอบพื้นที่กับ พื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ	1. การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อทำ เหมือง (บริเวณหน้าเหมือง “ห”) จะต้อง กระทำภายในขอบเขตกำหนดไว้ตาม แผนผังโครงการเท่านั้น 2. รักษาสภาพพืชพรรณต่าง ๆ บริเวณ พื้นที่ที่ยังเปิดทำเหมืองไม่ถึง	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว - คงสภาพป่าธรรมชาติไว้ตามเดิมในพื้นที่ โครงการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ เหมือง	ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา	 21/06/2569 สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ และการคงสภาพป่าธรรมชาติ
	3. การเปิดหน้าเหมือง ให้กระทำตาม แผนผังโครงการอย่างเคร่งครัดโดยจะทำ เหมืองเป็นแบบขั้นบันได (Bench) มีความ สูงประมาณ 3 เมตรและมีความกว้างไม่ น้อยกว่า 5 เมตร ให้มีความลาดเอียง ทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	 21/06/2569 การเปิดหน้าเหมือง

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. การเปิดหน้าเหมืองระยะแรก (ปีที่ 1-5) จากระดับผิวดินลึกลงไปเป็นขุมเหมืองให้นำเปลือกดินและเศษแร่ไปเก็บกองยังบริเวณที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินที่จัดไว้ ส่วนการเปิดหน้าเหมืองในระยะต่อมาจะนำเปลือกดินและเศษแร่ไปถมกลับขุมเหมืองที่เกิดจากการทำเหมืองในระยะที่ผ่านมาเพื่อลดขนาดและความสูงของพื้นที่เก็บกองลงเหลือเพียง 13 ไร่ และสูงเพียง 3 เมตร และเปลี่ยนตำแหน่งที่กองเก็บเปลือกดินเศษหินเพื่อลดโอกาสการพังทลายของดินสู่ถนนที่อยู่ใกล้เคียงและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว - ปัจจุบันเปลือกดินมีปริมาณน้อยมากทางโครงการจึงนำมาสร้างคันทำนบบริเวณแนวเขตที่ดินพร้อมทั้งเตรียมการปลูกต้นยูคาลิปตัสบริเวณคันทำนบเพื่อเป็นแนวป้องกัน	ไม่พบปัญหา	  การปลูกต้นยูคาลิปตัสบริเวณคันทำนบดิน
	5. ดูแลและปลูกพืชทดแทนหากพบว่า พืชพันธุ์ไว้ที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหาย	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	6. ขุมเหมืองที่ไม่สามารถปรับถมได้ทั้งหมดขนาดพื้นที่ประมาณ 22-0-9 ไร่ ลึก 10 เมตร ให้ปรับสภาพความลาดชันให้ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นบ่อเก็บน้ำใช้ในการเกษตรต่อไป	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ทรัพยากรดิน การขุดเปิดเปลือกดินในบริเวณพื้นที่ทำเหมือง, บ่อดักตะกอน “บ” ระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติของดินจากเดิม ทำให้ง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายรวมทั้งการเหยียบย่ำของเครื่องจักรกลหนัก ทำให้เกิดการอัดตัวแน่นของดิน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทำเหมืองเส้นทางลำเลียง ลานกองเก็บแร่ ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน เป็นต้น	1. นำเปลือกดินและเศษหินไปบดอัดทำถนนและพื้นที่สนับสนุนการทำเหมืองภายในพื้นที่โครงการตามความเหมาะสม และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ ส่วนที่เหลือนำไปกองเก็บฯ ยังบริเวณพื้นที่ที่เตรียมไว้พร้อมทั้งบดอัดแน่นเมื่อถึงปีที่ 6 ให้ทยอยนำไปถมกลับขุมเหมืองที่ผ่านการทำเหมืองไปแล้ว เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินไหลออกนอกพื้นที่	- ปัจจุบันเปลือกดินมีปริมาณน้อยมากทางโครงการจึงนำมาสร้างคันทำนบบริเวณแนวเขตที่ดินพร้อมทั้งเตรียมการปลูกต้นยูคาลิปตัส บริเวณคันทำนบเพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทัศนียภาพ	ไม่พบปัญหา	
	2. ปลูกพืชคลุมดินประเภทพืชตระกูลถั่วปกคลุมพื้นที่กองเก็บเปลือกดินคันทำนบดินขอบระบายน้ำ บ่อดักตะกอน พื้นที่ที่นำเศษดินและเศษหินไปถมกลับขุมเหมืองผ่านการทำเหมือง และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยฟื้นฟูดินและลดการชะล้างพังทลายตลอดจนที่ถูกพัดพามากับน้ำ	- หากทางโครงการมีพื้นที่เก็บกองเปลือกดินจักได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	3. ขุดระบายน้ำขนาดกว้าง 2.0 ม. ท้องคูกว้าง 1.0 ม. ลึก 1.0 ม. เพื่อรองรับน้ำไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่ทำเหมือง กองเก็บเปลือกดินและเศษหินให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอนเพื่อป้องกันการไหลบ่าชะล้างตะกอนดินทรายออกนอกพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันทางโครงการกำลังปรับพื้นที่บริเวณบ่อขุมเหมือง เพื่อรองรับน้ำจากบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการแล้วปล่อยไหลลงสู่บ่อดักตะกอนอีกครั้งหนึ่ง	ไม่พบปัญหา	 บ่อขุมเหมือง

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. ขุดบ่อดักตะกอน “บ” ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ ลึก 2.0 เมตร เพื่อรองรับน้ำไหลบ่าหน้า ดินและให้ตกตะกอนอย่างน้อย 2 ชม.	- มีบ่อดักตะกอนจำนวน 1 บ่อ	ไม่พบปัญหา	 บ่อดักตะกอนของโครงการ
	5. ตัดพินต้นไม้และเปิดเปลือกดินเฉพาะ บริเวณที่จะทำเหมืองและพื้นที่สนับสนุน การทำเหมืองเท่านั้น	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
3) ทรัพยากรน้ำ (1) น้ำผิวดิน - <u>ด้านปริมาณน้ำ</u> อาจจะทำให้ น้ำในแหล่ง น้ำใกล้เคียงลดลง เนื่องจากพื้นที่ให้น้ำลดลงใน ระดับต่ำ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดิน อย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
- <u>ด้านคุณภาพน้ำ</u> อาจจะทำให้ น้ำขุ่น และ มีสารปนเปื้อน	- หากต้องระบายน้ำจากขุมเหมืองและบ่อ ดักตะกอนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้ ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินก่อนทุกครั้ง	- ปัจจุบันระดับน้ำในบ่อขุมเหมืองและบ่อ ดักตะกอนมีปริมาณน้อย และมีขนาด เพียงพอที่รองรับน้ำจากบริเวณพื้นที่ โครงการโดยไม่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
(2) น้ำใต้ดิน - ด้านปริมาณน้ำ ผลกระทบในด้านนี้ไม่เด่นชัด - ด้านคุณภาพน้ำ ผลกระทบในด้านนี้ไม่เด่นชัด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดิน อย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
4) ลักษณะภูมิอากาศ ผลกระทบในด้านนี้จะอยู่ในรูปของการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง ซึ่งได้แก่ 1) ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง ภายในพื้นที่โครงการ เช่น การขุดเปิดเปลือกดิน การเจาะรูระเบิด การเจาะรูเพื่อผลิตแร่ การกอง เก็บเปลือกดินและเศษหิน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าวโดยตรง คือ คนงานเหมือง และอาจมี ผลกระทบต่อประชาชนและพระสงฆ์ในวัดเนิน สวรรค์ทางทิศใต้ของโครงการ 2) ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการลำเลียง/ ขนส่งแร่รอบนอกพื้นที่โครงการผู้ที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรง คือ ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ บริเวณฝั่งตะวันตกของถนนสายห้วยสาราม-เนิน สวรรค์ (ทางทิศใต้ของโครงการ) ประมาณ 2 หลังคาเรือน (บ้านพู่แก้ว) พระสงฆ์ที่อยู่วัดเนิน สวรรค์ และพืชพรรณทางการเกษตร	1. ฉีดพรมน้ำวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วง บ่ายโดยใช้น้ำจากบ่อดักตะกอนให้ทั่ว บริเวณพื้นที่ที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองภายในพื้นที่โครงการ 2. ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากราษฎร หาก ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อ ราษฎรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 3. ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น ละออง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือที่ ครอบจมูก 4. ใช้วัสดุปิดคลุมกระบะท้ายรถบรรทุกแร่ หรือผูกยึดหินบล็อก เพื่อป้องกันการร่ว่ง หล่นในขณะขนส่ง	- ปัจจุบันการทำเหมืองจะก่อให้เกิดฝุ่น ละอองน้อยมาก เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ มีขนาดเล็ก ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการเป็น พื้นที่ป่า - ยังไม่เคยมีกรณีร้องเรียนจากประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจาก กิจกรรมของโครงการแต่อย่างใด - จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน	ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา	 การใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุก

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	6. ควบคุมอัตราความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ติดตั้งป้ายควบคุมอัตราความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.	ไม่พบปัญหา	 ป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
	7. ในการเจาะระเบิดและการเจาะรูเพื่อผลิตแร่ให้ใช้เทคนิคการเจาะแบบเปียก	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิด	ไม่พบปัญหา	
	8. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	9. ดูแลรักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการขนส่งแร่ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
5) ทรัพยากรแร่ เกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ - ด้านบวก เป็นการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรแร่ เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รัฐมีรายได้จากภาษีและค่าภาคหลวง - ด้านลบ ปริมาณสำรองแร่ลดลง เกิดการสูญเสียหินแร่ในขั้นตอนการผลิต ธรณีสัณฐานของแหล่งแร่เปลี่ยนไป และไม่ได้กำหนดความสูงของลานกองแร่ไว้ในการเก็บกองแร่ควรสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตแร่	1. ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด	ไม่พบปัญหา	 21/06/2569 รถบรรทุกขนส่งแร่
	2. ดำเนินการทำเหมืองให้สอดคล้องกับลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่	- โครงการได้ดำเนินการทำเหมืองให้สอดคล้องกับลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่	ไม่พบปัญหา	
	3. ควบคุมดูแลในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญงาน/วิศวกร	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	4. พื้นที่เก็บกองแร่ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไร่ สูง 3 เมตร รองรับได้ประมาณ 4,191 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสัมพันธ์กับการผลิตแร่ใน 1 เดือน ซึ่งผลิตได้ 4,000 ลูกบาศก์เมตร	- ปริมาณแร่ที่ผลิตได้มีปริมาณน้อย ดังนั้นจะขนส่งไปโดยทันที จึงไม่มีพื้นที่เก็บกองแร่	ไม่พบปัญหา	
	5. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำเหมือง	- มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	
	6. นำทรัพยากรแร่ไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสม	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก (1) พืชพรรณ ทำให้สูญเสียพืชพรรณไม้ในบริเวณพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่สนับสนุนการทำเหมือง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	2. ห้ามตัดฟันไม้และล่าสัตว์ในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงโดยเด็ดขาด ยกเว้นตัดฟันไม้ในโครงการเพื่อการทำเหมือง	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

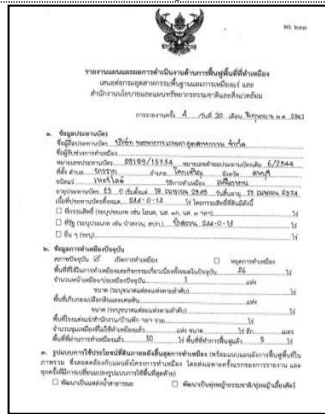
ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
(2) สัตว์ป่า ทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า เกิดเสียงดังรบกวน 2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - <u>พืชพรรณในน้ำและสัตว์น้ำ</u> ทำให้การดำรงชีวิตและปริมาณของพืชน้ำและสัตว์น้ำลดลง แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และหากินน้อยชนิดและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล	3. ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้ใช้ไม้หรือวัสดุก่อสร้างจากภายนอกพื้นที่โครงการ ยกเว้นไม้ที่ได้จากบริเวณพื้นที่เปิดทำเหมืองเท่านั้น	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	4. ไม่ตัดฟัน/ถากถางพื้นที่ไ่ว่ล้งหน้าเกินกว่า 3 เดือน กรณีพื้นที่ทำเหมือง ส่วนพื้นที่อื่นไม่เกิน 1 เดือน ส่วนพื้นที่แนวกันเขตไม่ทำเหมืองให้คงสภาพเดิมไว้ โดยเฉพาะทางตอนใต้ที่ติดกับวัดเนินสวรรค์เพื่อเป็น Buffer Zone ในการดักฝุ่นละออง เสี่ยงและบดบังทัศนียภาพจากการทำเหมือง	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว - ติดตั้งป้าย “ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้แล้ว” (ใบอนุญาตเล่มที่ 40 ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559)	ไม่พบปัญหา	
	5. ปลุกพืชคลุมดินประเภทพืชพรรณตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชอื่น ๆ ต่อไปโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตรจะหมดอายุ 1 เดือน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	6. ห้ามทำการระบายน้ำที่มีคุณภาพเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินออกจากขุมเหมืองและบ่อดักตะกอนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	- เนื่องจากน้ำในบ่อขุมเหมืองและบ่อดักตะกอนมีปริมาณน้ำน้อย และสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ จึงไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งสาธารณะ	ไม่พบปัญหา	

ป้าย “ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้แล้ว”

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.3 ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน - เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นพื้นที่ 244-0-13 ไไร่ - ทำให้ที่ดินเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า	1. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดทำตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ (ดังภาคผนวกที่ 5)	ไม่พบปัญหา	 บัญชีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่
	2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ ด้านกายภาพและชีวภาพอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง (ดังภาคผนวกที่ 4)	ไม่พบปัญหา	 รายงานแผน และผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) การคมนาคมขนส่ง ทำให้สภาพพื้นผิวการจราจรชำรุดทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น การพังกระจายของ ฝุ่น คิวัน เสียงดัง ความสั่นสะเทือนผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน และทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น - ช่วงถนนดินเป็นเส้นทางเข้าป่าที่มีอยู่เดิม และใช้ขนส่งแร่จากพื้นที่โครงการไปยังแหล่งรับซื้อ - ช่วงถนนลาดยาง ห้วยสาราม-เนินสวรรค์ และทางหลวงหมายเลข 2340 หมายเลข 21 และหมายเลข 205 ใช้ขนส่งแร่จากพื้นที่โครงการไปยังโรงแต่งแร่ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรไป-มา บนถนนสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ อันเนื่องจากการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมือง	1. ดูแลรักษาดินจากบริเวณขุมเหมืองมายังถนนสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	 ถนนสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์
	2. กำหนดความเร็วของรถบรรทุกวิ่งไม่เกิน 30 กม./ชม. ช่วงถนนลูกรังและช่วงที่ผ่านชุมชน สำหรับความเร็วบนทางหลวงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง	- โครงการได้มีการกำหนดความเร็วของรถบรรทุกวิ่งไม่เกิน 30 กม./ชม. ช่วงถนนลูกรังและช่วงที่ผ่านชุมชน	ไม่พบปัญหา	 ป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
	3. กำหนดให้ใช้ผ้าใบปกคลุมแร่ให้เรียบร้อยในระหว่างขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นลงพื้นถนน	- กำชับให้มีการใช้ผ้าใบปกคลุมแร่ให้เรียบร้อยในระหว่างขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นลงพื้นถนน	ไม่พบปัญหา	 การใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะท้ายรถบรรทุก

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. ฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ ช่วงที่เป็นถนนลูกรังวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและ ช่วงบ่าย	- จัดรถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำบริเวณ เส้นทางขนส่งในช่วงที่มีการขนส่งแร่	ไม่พบปัญหา	
	5.บรรทุกแร่ตามพิกัดน้ำหนักตามที่กรมทางหลวง กำหนดไว้	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	6. ฉีดพรมน้ำล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนลาดยาง บริเวณทางแยกเข้า-ออก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมติดกับทาง ลูกรัง เมื่อพบว่ามีเศษดินและเศษหินติดอยู่บน พื้นผิวถนน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	7. พนักงานขับรถต้องขับรถตามกฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัดและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	8.ไม่ควรบรรทุกแร่จนเต็มหรือล้นกระบะบรรทุก เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	9. ติดป้ายเตือนผู้ใช้เส้นทางสายห้วยสาราม-เนิน สวรรค์ บริเวณก่อนถึงทางแยกเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	- ติดป้ายเตือนระวางรถบรรทุกให้ผู้ ใช้เส้นทางสายห้วยสาราม-เนินสวรรค์ บริเวณก่อนถึงทางแยกเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ไม่พบปัญหา	 ป้ายเตือนระวางรถบรรทุก
	10. หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเช้าและเย็น หรือช่วง ไป-กลับของเด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	11. ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ติดแปลงโครงการในระยะ 171 เมตร ตลอดแนวหลังทำการระเบิดทุกครั้งหากถนนเสียหาย/ชำรุดต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ดังเดิมทุกครั้ง	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	12. ติดป้ายประกาศช่วงเวลาทำการระเบิดให้เห็นชัดเจนในระยะ 500 เมตร จากแนวโครงการ	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใดมีแต่การใช้รถตักเท่านั้น	ไม่พบปัญหา	
	13. ปิดกั้นถนนในระยะ 171 เมตร จากแนวโครงการมิให้ผู้สัญจรไป-มา ระหว่างทำการระเบิด	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	14. ประสานงานกับองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเส้นทาง เพื่อให้การสนับสนุนการบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการต่าง ๆ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	15. เลือกใช้รถบรรทุกพ่วงในการขนส่งแร่ เพื่อลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งแร่และไม่จำเป็นต้องขนทุกวัน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
3.3 การเกษตร ผลกระทบจากการทำเหมืองอาจทำให้พืชพรรณทางการเกษตรเจริญเติบโตช้า ทำให้ผลผลิตและคุณภาพลดลงเนื่องจากฝุ่นละออง รวมถึงหินปลิวจากการระเบิดอาจสร้างความเสียหายแก่พืชพรรณที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพและชีวภาพอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	2. ชดเชยค่าเสียหายให้กับราษฎรผู้เป็นเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองอย่างเป็นธรรม	- การทำเหมืองของโครงการยังไม่เคยก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อ พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ การทำเหมืองอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค/บริโภคของชุมชนได้	1. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร่วมกับชุมชนและหาก ใช้ร่วมกับชุมชน ต้องไม่ทำให้ชุมชน เดือดร้อน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	2. หาแหล่งน้ำทดแทนให้กับชุมชนหรือ สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ ราษฎรในชุมชน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
3.5 การบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ใกล้เคียง ประกอบด้วย 1) <u>สถาบันการศึกษา</u> ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน สระเพลง ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่ระยะดังกล่าวมีป่าไม้กันไว้ ผลกระทบ ในรูปของเสียงดัง ฝุ่นละอองและการคมนาคมจึงอยู่ ในระดับต่ำ 2) <u>สถาบันศาสนา</u> คือ วัดเนินสวรรค์ซึ่งอยู่ห่าง จากพื้นที่โครงการประมาณ 130 เมตร พื้นที่ โครงการทางทิศใต้ (หลักหมุดที่ 1) อาจจะได้รับ ผลกระทบในรูปของเสียงดังฝุ่นละอองรบกวน	1. ดำเนินการทำเหมืองตามวิธีการและ ขั้นตอนการทำเหมืองที่กำหนดไว้ใน แผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการทำเหมืองตาม วิธีการและขั้นตอนการทำเหมืองที่ กำหนดไว้ในแผนผังโครงการอย่าง เคร่งครัด - จากผลการสำรวจ พบว่า โรงเรียนบ้าน สระเพลง ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม โครงการ - จากผลการสำรวจ พบว่า วัดเนินสวรรค์ ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมโครงการ	ไม่พบปัญหา	
	2. สำรวจแหล่งบริการสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ ว่าได้รับความเสียหายจาก การดำเนินการหรือไม่	- โครงการมีการสำรวจแหล่งบริการ สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ พบว่า ไม่ มีแหล่งใดได้รับความเสียหายจากการ ดำเนินการของโครงการ	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) การบริการด้านอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา การดำเนิน โครงการจะไม่ส่งผล กระทบต่อระบบไฟฟ้าและประปาของ ชุมชนใกล้เคียง	3. กำหนดให้ใช้วัตุดิบในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 8 ปอนด์/จังหวัด	- การผลิตแร่ของโครงการจะใช้เพียงรถดักแร่ใน บริเวณที่สามารถทำการดักได้เท่านั้น และปัจจุบัน จะไม่มีใช้วัตุดิบเปิดหน้าเหมือง ดังนั้น จึงไม่มี การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และหากมีการใช้ วัตุดิบในการผลิตแร่ทางโครงการจะรายงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป	ไม่พบปัญหา	
	4. สำนวณทัศนคติของราษฎรในชุมชนใกล้เคียงหรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ตามสถาน บริการสาธารณสุข/โรค/สาธารณสุขการต่าง ๆ ว่า ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ หรือไม่	- จากการสำนวนทัศนคติ ดำเนินการโดยสอบถาม ราษฎรบริเวณบ้านสระเพลง บ้านคลองบง และ บ้านพั่ว จำนวน 24 ราย ถึงผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมทำเหมือง เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า การดำเนินกิจกรรมทำ เหมืองของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎร บริเวณใกล้เคียงในด้านต่าง ๆ แต่อย่างใด (ดัง ภาคผนวกที่ 9)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะ ดำเนินการในเดือนธันวาคม และจะนำเสนอในรายงาน ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	
3.6 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ/ โบราณสถานและโบราณวัตถุ - ไม่เกิดผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติโบราณสถานและโบราณวัตถุ	1. ในขณะที่ดำเนินการทำเหมืองหากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือหลักฐานทางโบราณคดี ที่ฝังจมอยู่ ใต้ดินให้หยุดดำเนินการทันที และแจ้งสนง. โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 อยุธยาทราบ เพื่อดำเนินการต่อทันที	- การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมายังไม่พบแหล่ง โบราณคดีและโบราณวัตถุในบริเวณ พื้นที่ โครงการ	ไม่พบปัญหา	
	2. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการขุดค้นหา หลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ หากขุดค้นพบใน บริเวณพื้นที่โครงการ	- หากพบกรณีดังกล่าวทางโครงการจักได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขข้างต้น	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.4 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1) ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน ทำให้ชุมชนรวมกันเข้มแข็ง ขึ้นลดการโยกย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่น 2) โครงสร้างประชากร มีการเปลี่ยนแปลงต่อวัยแรงงาน บางส่วนที่มาจากต่างถิ่น 3) สภาพเศรษฐกิจ คือ ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นมีงานทำ พอมีรายได้เพิ่มขึ้น การซื้อขายสินค้าในชุมชนสูงขึ้นให้รัฐมี รายได้จากค่าภาคหลวงแร่ภาษีเงินค่าภาคหลวงแร่หนึ่ง ย่อนกลับคืนสู่ตำบลที่ตั้งโครงการ ทำให้ตำบลมี งบประมาณในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ ระบบเศรษฐกิจในระดับภาคหรือประเทศ 4) สภาพสังคม หากชุมชนมีการพัฒนาเป็นสังคม อุตสาหกรรมสังคมเมืองเพิ่มขึ้นอาจมีการแออัด เห็นแก่ ตัว ความสามัคคีของราษฎรในชุมชนลดลงหรือเกิด อาชญากรรมได้ เป็นต้น 5) สาธารณสุขและอาชีวอนามัย ประกอบด้วย 1) เสี่ยง มีสาเหตุมาจากการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ อุปกรณ์เพื่อการทำเหมืองและเสียงดังจากการใช้วัตถุ ระเบิดปรับสภาพหน้าเหมือง ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรง ต่องานเหมืองที่ทำงานอยู่บริเวณหน้างาน ราษฎรที่อยู่ทาง ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (2 หลังคาเรือน) พระสงฆ์จำ พรรษาในวัดเนินสวรรค์	1. หมั่นสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ในชุมชนใกล้เคียงและยินดียินดียินดีรับฟังข้อร้องเรียน และทัศนคติของราษฎร 2. จัดอบรมคนงานและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความ เข้าใจถึงอันตรายและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ความปลอดภัย และควบคุมความปลอดภัยของ คนงานให้อยู่ในกฎระเบียบ 3. จัดให้มีการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและมี การเตรียมแผนฉุกเฉินรวมทั้งสอบสวน วิเคราะห์และจัดทำบันทึกอุบัติเหตุ 4. มีการวางแผนการทำงานที่ดีและให้ดำเนิน กิจกรรมเหมืองตามแผนงานที่วางไว้ 5. จัดให้มีอาสาสมัครประจำบ้านและอุปกรณ์ปฐม พยาบาลเบื้องต้นและรถรับ-ส่งไว้ภายในบริเวณ สำนักงานโครงการ 6. ในการใช้วัตถุระเบิดแต่ละครั้งให้อยู่ในความ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของวิศวกรและต้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบตามที่ได้กำหนดไว้ 7. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับ คนงานเหมืองทุกคนอย่างเหมาะสมกับงาน	- มีการสอบถามราษฎรในชุมชนใกล้เคียง เป็นประจำทุกปี - จัดให้มีการอบรมพนักงานเป็นประจำ - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนฉุกเฉิน และจัดบันทึกอุบัติเหตุ - ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว - มีอาสาสมัครประจำบ้านและอุปกรณ์ปฐม พยาบาลเบื้องต้น - ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการ เปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใดมีแต่การใช้รถ ตักเท่านั้น - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับ คนงาน	ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ความสั่นสะเทือน มีสาเหตุมาจากการทำงานของเครื่องจักรกลหนัก เช่น เครื่องเจาะ Bulldozer รถขุดตักและรถบรรทุกใหญ่ และการใช้วัตถุระเบิดเพื่อปรับสภาพหน้าเหมือง ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างและบันไดหน้าเหมืองพังทลายได้ 3) ฝุ่นละออง มีสาเหตุมาจากการขุดเปิดหน้าเหมืองการเจาะรูเพื่อผลิตแร่ การกองเก็บเปลือกดินและเศษหินลำเลียงแร่ภายในพื้นที่การขนส่งแร่รถนอกพื้นที่โครงการส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนงานที่ทำงานภายในบริเวณพื้นที่โครงการและราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เคียงชัยนาคา เป็นโรคปอดหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญ	8. จัดให้มีการทำงานเป็นทีมและกำหนดเวลาพักเป็นระยะ ๆ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อันตราย	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	 การตรวจวัดสุขภาพประจำปี พ.ศ.2568
	9. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานเหมืองพร้อมทั้งการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	- ในปี พ.ศ.2568 ทางโครงการได้จัดมีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2568 (ดังภาคผนวกที่ 8)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะดำเนินการในเดือนธันวาคมและจะนำเสนอในรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	
	10. ควบคุมดูแลงานเหมืองและคนงานเหมืองไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	11. ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้ประสานงานกับผู้ชุมชนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในรูปแบบของการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4) <u>อุบัติเหตุ</u> มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ขาดความระมัดระวัง เช่น ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้องกับงาน ขาดความตั้งใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากสภาวะร่างกายและจิตใจของคนงานไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งกระบวนการผลิตของทางโครงการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งกระบวนการผลิตของโครงการ 5) <u>หินปลิวจากการระเบิด</u> การใช้วัตถุระเบิดเพื่อปรับสภาพหน้าเหมืองทำให้เกิดการแตกหักของหินออกจากหน้าเหมือง ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อราษฎรที่หาของป่าใกล้เคียงและคนงานเหมือง 6) <u>ทัศนคติ</u> - <u>ด้านลบ</u> ทัศนคติของราษฎรในชุมชนจะเป็นไปในด้านลบหากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง - <u>ด้านบวก</u> ทัศนคติของราษฎรในชุมชนจะเป็นไปในด้านบวกหากการดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับทางโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเอื้อประโยชน์กับท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นสร้างงานและรายได้ให้กับราษฎรในชุมชน		- ในการทำเหมืองจะก่อให้เกิดเสียงดังแต่มีระดับเสียงค่อนข้างต่ำเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้มีขนาดเล็ก ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่า	ไม่พบปัญหา	
		- ในการทำเหมืองจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนแต่จะมีระดับความสั่นสะเทือนต่ำมากเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้มีขนาดเล็ก ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่า	ไม่พบปัญหา	
		- ในการทำเหมืองจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยมากเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้มีขนาดเล็ก ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่า	ไม่พบปัญหา	
		- ชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทราบถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	
		- มีการชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทราบถึงผลดีที่เกิดจากการทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2. ช่วงหลังการทำเหมือง - พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง รวมทั้งพื้นที่ สนับสนุนกิจกรรมการทำเหมือง	1. ปรับถมคุระบายน้ำและคันทำนบดินให้ เสมอกับพื้นที่โดยรอบ	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	
	2. เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้รื้อถอนให้หมด	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	
- การฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง และพื้นที่ สนับสนุนกิจกรรมการทำเหมือง	1. เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองในแต่ละชั้นบันได ให้ปลูกแฝกทันที ยกเว้นบริเวณที่จะใช้ เป็นเส้นทางขึ้น-ลงของรถบรรทุกแร่จาก การทำเหมืองในชั้นต่อไป	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	
	2. เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองทั้งโครงการ ให้ ปรับแต่งชุมชนเมืองในภาพรวมอีกครั้งให้ ปลอดภัย	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	
	3. ปลูกหญ้าแฝกเสริมบริเวณผนังบ่อเหมืองที่ พื้นน้ำขังเพื่อช่วยยึดดินและลดการกัด เซาะพังทลายของบ่อเหมือง	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	
	4. ปลูกต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้เดิมในโครงการ แบบสลับฟันปลา ระยะห่าง 2 x 2 เมตร บริเวณพื้นที่ที่นำดินมาถมกลับบ่อเหมือง และปลูกแซมให้ทั่วทั้งพื้นที่ที่มีดินปกคลุม	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	
	5. ทำป้ายบอกระดับความลึกของชุมชนเมือง แต่ละบริเวณที่มีความลึกต่างกัน พร้อม ระบุคุณ ภาพ น้ำ ที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	



(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ด้านกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ	1. ตรวจสอบการดำเนินการทำเหมืองให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการฯ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	2. ตรวจสอบความมั่นคงและความลาดชันของหน้าเหมือง และคันทำนบดินโดยวิศวกรควบคุมฯ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	3. ตรวจสอบพืชพรรณไม้ที่กำหนดให้ปลูกในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ หากพบต้นไม้ที่ปลูกตายให้ปลูกซ่อมแซม โดยวิศวกรควบคุมฯ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	4. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ไม่พบปัญหา	
1.2 ดิน	1. ตรวจสอบการกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน ให้มีความเสถียรภาพเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยวิศวกรควบคุมฯ	- ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน	ไม่พบปัญหา	
1.3 น้ำ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งทางด้านกายภาพ และเคมี ดังดัชนีการตรวจวัดดังต่อไปนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (PH), ปริมาณของแข็ง (TS), ปริมาณสารแขวนลอย(SS), ปริมาณเหล็ก (Iron), ความกระด้าง (Hardness) และความขุ่น(Turbidity) โดยวิศวกรควบคุม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม	- ทำการการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ดังนี้ 1. อ่างเก็บน้ำบ้านพู่แ้ว 2. สระเก็บกักน้ำใกล้พื้นที่โครงการ 3. ห้วยบง (บริเวณบ้านห้วยบง) โดยทำการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2569 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังรายละเอียดในบทที่ 3)	ไม่พบปัญหา	 อ่างเก็บน้ำบ้านพู่แ้ว การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				 สระเก็บกักน้ำใกล้โครงการ  ห้วยบง (บริเวณบ้านห้วยบง)
	2. ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ดัชนีที่ตรวจวัดดังต่อไปนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (PH), ปริมาณของแข็ง (TS), ปริมาณสารแขวนลอย (SS), ปริมาณเหล็ก (Iron), ความกระด้าง (Hardness) และความขุ่น (Turbidity) โดยผู้จัดการโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม	- มีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ดังนี้ 1. น้ำบาดาลบ้านพู่แก้ว 2. น้ำบาดาลบ้านสระเพลง โดยทำการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2569 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังรายละเอียดในบทที่ 3)	ไม่พบปัญหา	 น้ำบาดาลบ้านพู่แก้ว การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ต่อ)

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				 น้ำบาดาลบ้านสระเพลง
	3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากชุมเหมือง และบ่อดักตะกอนทุกครึ่งหากต้องระบายน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ดังดัชนีดังต่อไปนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (PH), ปริมาณของแข็ง (TS), ปริมาณสารแขวนลอย(SS), ปริมาณเหล็ก (Iron), ความกระด้าง (Hardness) และความขุ่น (Turbidity) โดยวิศวกรควบคุม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม	- ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากชุมเหมือง และบ่อดักตะกอน เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2569 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังรายละเอียดในบทที่ 3)	ไม่พบปัญหา	 บ่อชุมเหมือง  บ่อดักตะกอน การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ต่อ)



(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. หลังสิ้นสุดการทำเหมือง และฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในชุมชนเหมืองว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ดังดัชนีการตรวจวัด ดังดัชนีดังต่อไปนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (PH), ปริมาณของแข็ง (TS), ปริมาณสารแขวนลอย (SS), ปริมาณเหล็ก (Iron), ความกระด้าง (Hardness) และความขุ่น (Turbidity) โดยวิศวกรควบคุม	- ยังไม่ถึงระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่พบปัญหา	
1.4 อากาศ	1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศหรือปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศแบบ TSP จำนวน 3 สถานี ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั่วไป (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน	- มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปีละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัดไปแล้วในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ.2569 จำนวน 3 สถานี ดังนี้ 1. บริเวณวัดเนินสวรรค์ 2. บริเวณบ้านพู่แ้ว (ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ) 3. บริเวณบ้านสระเพลง พบว่า ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569	ไม่พบปัญหา	 วัดเนินสวรรค์  บ้านพู่แ้ว การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ


(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				 บ้านสระเพลง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ (ต่อ)
		- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด (ERD) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งนำเสนอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี ได้รับทราบ ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งได้ทำการการยื่นรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ Smart EIA Plus แล้ว ซึ่งได้นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุด คือรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568	ไม่พบปัญหา	  สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ จังหวัดพิษณุโลก การนำเสนอรายงานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

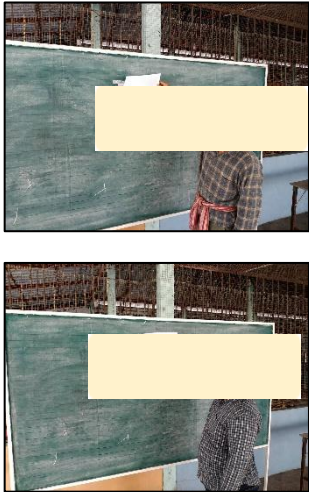
(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				  การนำเสนอรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
		- ทางโครงการได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางที่ชุมชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยติดตั้งไว้ที่บอร์ดบริเวณหน้าสำนักงานโครงการ และวัดบ้านสระเพลง (ดังภาคผนวกที่ 10)	ไม่พบปัญหา	 การเผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.5 แร่	1. ตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ ทุกช่วงการทำเหมือง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และออกแบบแผนการผลิต	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	2. ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตแร่หินอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องตามหลักการทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียสินแร่ในระหว่างการผลิตแร่โดยวิศวกรควบคุม	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
2. ด้านชีวภาพ 2.1 ชีวภาพบนบก ประกอบด้วย - พืชพรรณไม้ - สัตว์ป่า	1. ตรวจสอบการตัดฟันไม้บริเวณพื้นที่ที่จะขุดเปิดหน้าเหมืองเพื่อการทำเหมืองในแต่ละครั้ง โดยวิศวกรควบคุมฯ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	2. ตรวจสอบพันธุ์ไม้ที่กำหนดให้ปลูกในแต่ละบริเวณให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องหากพบว่าตายให้รีบปลูกซ่อมแซมโดยผู้จัดการโดยตรง	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	3. ตรวจสอบและบันทึกการพบเห็นสัตว์ป่าโดยผู้จัดการโครงการ ทั้งนี้ให้ขอความร่วมมือจากพนักงาน/คนงาน ที่ทำงานภายในเหมือง	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2.2 ชีวภาพในน้ำ ประกอบด้วย - พืชน้ำ - สัตว์น้ำ	1. จากการศึกษาและประเมินผลกระทบจากการทำเหมืองพบว่า ผลกระทบในด้านนี้ไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด ดังนั้น จึงไม่กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในด้านนี้	ไม่มีมาตรการกำหนด	ไม่พบปัญหา	
3. ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ตรวจสอบและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในบริเวณพื้นที่โครงการตามที่กำหนดไว้แผนผังโครงการ โดยผู้จัดการโครงการและวิศวกรควบคุม	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	2. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปของราษฎร หากพบว่าได้รับผลกระทบให้รีบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้หากพบความเสียหายให้ชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยวิศวกรควบคุมฯ	- จากการตรวจสอบ พบว่า การทำเหมืองของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรและปริมาณการจราจรแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
3.2 การคมนาคม	1. ตรวจสอบสภาพการจราจรและปริมาณการจราจรบนเส้นทางที่เกี่ยวข้องหากพบว่า ช่วงเวลาใดมีปัญหาให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเวลานั้น โดยผู้จัดการโครงการ	- จากการตรวจสอบ พบว่า การทำเหมืองของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปของราษฎร แต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	2. ตรวจสอบสภาพพื้นผิวการจราจรที่ใช้ขนส่งแร่ หากพบว่า ขรุขระทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อให้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยผู้จัดการโครงการ	- จากการตรวจสอบ ไม่พบว่าสภาพพื้นผิวการจราจรที่ใช้ขนส่งแร่ เกิดการขรุขระ ทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	3.ตรวจสอบสภาพพื้นที่ผิวการจราจรในช่วง ที่อาจเกิดผลกระทบจากระยะหินปลิว หากพบว่าขรุขระเสียหายให้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีพร้อมจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้จัดการโครงการ	- จากการตรวจสอบ พบว่า ผลกระทบจากระยะหินปลิวไม่มีเนื่องจากโครงการไม่มีการใช้วัตถุระเบิด	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.3 การเกษตร	1. ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของราษฎร ทั้งนี้หากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ให้ชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยผู้จัดการโครงการ	- การทำเหมืองของโครงการยังไม่เคยก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	2. ตรวจสอบพืชพรรณทางการเกษตรในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการระเบิด หากพบว่าได้รับความเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขทันทีพร้อมกับชดเชยค่าเสียหายให้อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
3.4 แหล่งน้ำ	1. ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำของราษฎร ซึ่งหากพบว่า แหล่งน้ำของราษฎรได้รับผลกระทบจากการดำเนินของโครงการให้รีบหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยผู้จัดการโครงการ	- บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำบาดาลบริเวณบ้านพู่แก้ว บ้านสระเพลง (ดังรายละเอียดในบทที่ 3)	ไม่พบปัญหา	
3.5 การบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	1. ตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินโครงการด้านความดังและแรงสั่นสะเทือน จากการใช้วัตถุระเบิด ทั้งนี้หากพบผลกระทบให้รีบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขทันที โดยวิศวกรควบคุมและผู้จัดการโครงการ	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
3.6 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ/โบราณสถานและโบราณวัตถุ	1. ตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งระดับผิวดินและใต้ดิน ในช่วงการขุดเปิดเปลือกดิน ในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้หากพบหลักฐานดังกล่าวให้หยุดดำเนินการในบริเวณนั้นทันที พร้อมกับแจ้งสำนักงานโบราณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 อุดยธาทรพพื้นที่ โดยวิศวกรควบคุม/ผู้จัดการโครงการ	- การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมายังไม่พบแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในบริเวณ พื้นที่โครงการ - หากพบกรณีดังกล่าวทางโครงการจักได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น	ไม่พบปัญหา	

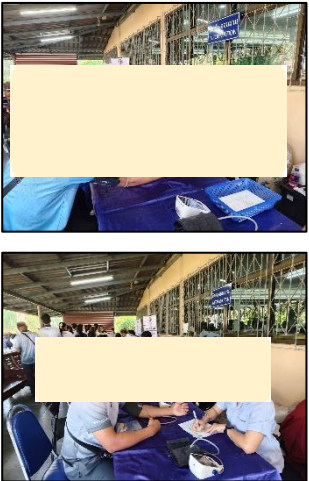
(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4. ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน	1. ตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุระเบิดของโครงการให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ไม่เกิน 8 ปอนด์/จังหวัด/จังหวัด โดยมีผู้ชำนาญการด้านวัตถุระเบิดหรือวิศวกรควบคุมโครงการ	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	2. ตรวจสอบระดับผลกระทบจากการดำเนินการทำเหมืองโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่นโดยผู้จัดการท้องถิ่น	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
4.2 โครงสร้างประชาชน	1. ตรวจสอบการรับพนักงานหรือคนงานเข้าทำงานเหมือง ทั้งนี้ให้พิจารณาคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยผู้จัดการโครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
4.3 เศรษฐกิจและสังคม	1. ตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินโครงการภายหลังจากเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่นโดยวิศวกรควบคุมและผู้จัดการโครงการ	- จากการสำรวจทัศนคติ ดำเนินการโดยสอบถามราษฎรบริเวณบ้านสระเพลง บ้านคลองบง และบ้านพู่แก้ว จำนวน 24 ราย ถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทำเหมือง เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า การดำเนินกิจกรรมทำเหมืองของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎรบริเวณใกล้เคียงในด้านต่าง ๆ แต่อย่างใด (ดังภาคผนวกที่ 9)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะดำเนินการในเดือนธันวาคม และจะนำเสนอในรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.4 สาธารณะสุข และอาชีวอนามัย	1. ตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพของพนักงาน/คนงาน เหมืองทุกคน โดยตรวจสอบในสิ่งที่จำเป็น เช่น ประสิทธิภาพของปอด สายตา หู เป็นต้น พร้อมกับจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง โดยแพทย์ประจำสถานีนามาย/คลินิกหรือโรงพยาบาล	- ในปี พ.ศ.2568 ทางโครงการได้จัดมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2568 (ดังภาคผนวกที่ 8)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะดำเนินการในเดือนธันวาคม และจะนำเสนอในรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	 การตรวจวัดสุขภาพประจำปี พ.ศ.2568
	2. ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะรับ-ส่งคนไข้ วัสดุอุปกรณ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลโดยผู้จัดการโครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	3. ตรวจสอบความเป็นอยู่จริงของพนักงาน/คนงาน ที่พักอยู่ภายในพื้นที่โครงการโดยผู้จัดการโครงการ ตรวจสอบ ความพอเพียงของน้ำดื่ม-น้ำใช้ การกำจัดขยะ สุขาและสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	4. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู แว่นตา ที่ครอบงวมก ถุงมือหนัง และรองเท้าหุ้มเหล็ก ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและพร้อมที่จะนำไปใช้ได้ตลอดเวลา โดยผู้จัดการโครงการและวิศวกรควบคุม	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5. ตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุระเบิดทุกครั้ง ตามที่กำหนดไว้ไม่เกิน 8 ปอนด์/จังหวัดละวง โดยผู้ชำนาญการ ผู้มีความรู้ และประสบการณ์หรือวิศวกรควบคุม	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	5.1 ความดังเสียง - ตรวจสอบระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นทั่วไปใน 24 ชั่วโมง จำนวน 4 สถานี 1. บริเวณวัดเนินสวรรค์ 2. บริเวณบ้านพู่แก้ว (ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ) 3. บริเวณบ้านสระเพลง 4. บ้านเรือนราษฎรทางทิศใต้ของโครงการ พร้อมทั้งจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง โดยวิศวกรควบคุม	- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง ปีละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัดไปแล้วในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ.2569 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศใต้ พบว่า ไม่มีชุมชนอาศัยอยู่	ไม่พบปัญหา	 วัดเนินสวรรค์  บ้านพู่แก้ว  บ้านสระเพลง การตรวจวัดระดับเสียง

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5.2 ความสั่นสะเทือน - ตรวจสอบความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น จากการใช้วัตถุระเบิด จำนวน 3 สถานี 1. บริเวณวัดเนินสวรรค์ 2. บริเวณบ้านพู่แก้ว (ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ) 3. บริเวณบ้านสระเพลง และจากรถบรรทุกขนส่งแร่พร้อมกับจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง โดยวิศวกรควบคุม	- การผลิตแร่ของโครงการจะใช้เพียงรถตักแร่ในบริเวณที่สามารถทำการตักได้เท่านั้น ณ ปัจจุบันจะไม่มีใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมือง ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน	ปัจจุบันไม่มีใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมือง ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และหากการมีการใช้วัตถุระเบิดในการผลิตแร่ทางโครงการจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเร่งด่วน	
	5.3 เศษหินปลิว - ตรวจสอบทิศทางและระยะทางการปลิวกระเด็นของเศษหินปลิวจากการใช้วัตถุระเบิดพร้อมกับจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง โดยวิศวกรควบคุม	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	5.4 ฝุ่นละออง - ตรวจสอบมาตรการป้องกันแก้ไขการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากการใช้วัตถุระเบิดก่อนทำการระเบิดทุกครั้ง โดยวิศวกรควบคุม	- ปัจจุบันยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด	ไม่พบปัญหา	
	6. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้งานไว้เสมอ โดยนายช่างประจำโครงการและวิศวกรควบคุม	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	7. ตรวจสอบสภาวะทางร่างกายและจิตใจของพนักงาน/คนงานก่อนปฏิบัติงาน หากสภาวะร่างกายไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานต้องให้หยุดพักตามสมควร โดยผู้จัดการโครงการและวิศวกรควบคุม	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	
	8. ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งในช่วงเวลางาน พร้อมทั้งจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	- ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.5 ทัศนคติ	1.ตรวจสอบทัศนคติของราษฎรในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ บ้านพู่แก้ว บ้านสระเพลง และ บ้านห้วยบง สํารวจปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการตรวจสอบถึงระดับผลกระทบจากการดำเนินการทำเหมืองของโครงการทั้งในด้านบวกและด้านลบ พร้อมประสานงานกับผู้นำชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบทัศนคติและประสานงานด้านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมส่วนร่วมของท้องถิ่น โดยผู้จัดการโครงการและวิศวกรควบคุม	- จากการสำรวจทัศนคติ ดำเนินการโดยสอบถามราษฎรบริเวณบ้านสระเพลง บ้านคลองบง และบ้านพู่แก้ว จำนวน 24 ราย ถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทำเหมือง เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า การดำเนินกิจกรรมทำเหมืองของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎรบริเวณใกล้เคียงในด้านต่าง ๆ แต่อย่างใด (ดังภาคผนวกที่ 9)	สำหรับในปี พ.ศ.2569 จะดำเนินการในเดือนธันวาคม และจะนำเสนอในรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569	    การสำรวจทัศนคติของราษฎรในชุมชน

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ช่วงเตรียมการทำเหมือง	- ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากได้รับประทานบัตรแล้ว และก่อนที่จะดำเนินโครงการ โดยปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2 x 2 เมตร (ประมาณ 400 ต้น/ไร่) โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีเรือนยอดที่แตกต่างกันอย่างน้อยสองชนิด ในพื้นที่เว้นการทำเหมือง รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาดินไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตเต็มที่	- ทำการปลูกต้นยูคาลิปตัสบริเวณภายในพื้นที่โครงการ - ทางโครงการได้เตรียมต้นกล้าไว้ปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ ตามรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง	ไม่พบปัญหา	
2. ช่วงดำเนินการทำเหมือง	- หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสุขได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการทำเหมือง ตามคำสั่งของทางราชการฯ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมายังไม่พบแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในบริเวณ พื้นที่โครงการ - หากพบกรณีดังกล่าวทางโครงการจักได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขข้างต้น	ไม่พบปัญหา	
	- หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงานในเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน	- หากทางโครงการมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่แตกต่างจากเงื่อนไขและจะได้แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	ไม่พบปัญหา	

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่พื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง	- โครงการได้จัดทำตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ และจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุน (ดังภาคผนวกที่ 5)	ไม่พบปัญหา	
		- โครงการได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง (ดังภาคผนวกที่ 4)	ไม่พบปัญหา	กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่  รายงานแผน และผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- ในระหว่างการทำเหมืองหากพบวัตถุโบราณหรือร่องรอยของโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสี หรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงาน และขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการทำเหมืองจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ	- การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมายังไม่พบแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในบริเวณ พื้นที่โครงการ	ไม่พบปัญหา	
	- ให้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของโลหะหนักตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และอาร์เซนิก (As) ของน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการในช่วงฤดูฝนทุกเดือนและให้รายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมแร่ทุกครั้ง	- ปัจจุบันระดับน้ำในบ่อดักตะกอนไม่มีน้ำเลย และบ่อดักตะกอนมีขนาดเพียงพอที่รองรับน้ำจากบริเวณพื้นที่โครงการโดยไม่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม	ไม่พบปัญหา	
	- ให้เพิ่มประสิทธิภาพของบ่อดักตะกอนเพื่อรองรับน้ำที่เกิดขึ้น โดยให้มีความสามารถในการรองรับได้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยบ่อดักตะกอนที่สร้างเพิ่มเติมเป็นบ่อดักตะกอนที่ต่อเนื่องกันในลักษณะบ่อน้ำล้น	- บ่อดักตะกอนมีขนาดเพียงพอที่รองรับน้ำจากบริเวณพื้นที่โครงการโดยไม่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม	ไม่พบปัญหา	บ่อดักตะกอนของโครงการ
