

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ปัจจุบันในส่วนของ อพาร์ทเมนต์ โครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาบริหารจัดการ โดยตัวโครงการเป็นที่พักอาศัยในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัยสูง 41 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 219 หน่วย โดยโครงการ ได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือ เห็นชอบเลขที่ วว 0804/1031 ลงวันที่ 22 มกราคม 2542 หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด แอทินี เรสซิเดนซ์ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินการ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ (ระยะดำเนินการ) ส่วนของอพาร์ทเมนต์ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้ง รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง การระบายน้ำ การจราจรและการขนส่ง การจัดการมูลฝอย การ บำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย คุณภาพชีวิตและสภาพเศรษฐกิจและสังคม และสาธารณสุขและความปลอดภัย

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ประกอบไปด้วยการติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง การระบายน้ำ การจราจรและการขนส่ง การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย คุณภาพชีวิตและสภาพเศรษฐกิจและสังคม และสาธารณสุขและความปลอดภัย ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4-1

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	สถานีตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ O = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	พารามิเตอร์ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย BOD, SS, Oil & Grease, Bacteria และ TKN ความถี่ - ทุก 3 เดือน/ครั้ง	- น้ำเข้า และน้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	● - โครงการได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ โดยมีพารามิเตอร์เป็นไปตามที่กำหนด ในเดือนเดือนธันวาคม 2568 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5-2	เอกสารแนบ 4	ตารางที่ 4.1-2
2. การระบายน้ำ	พารามิเตอร์ - การอุดตันของท่อระบายน้ำ ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ท่อระบายน้ำ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำรอบโครงการไม่ให้เกิดการอุดตัน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 2.2-7 เอกสารแนบ 3	-
3. การจราจรและการขนส่ง	พารามิเตอร์ - สถิติอุบัติเหตุ ความถี่ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ถนนวิฑู และถนนร่วมถุติ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกโครงการบริเวณถนนถนนวิฑู และถนนร่วมถุติ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว และในส่วนองสถิติของอุบัติเหตุจะมีการบันทึกไว้ที่สถานีตำรวจในเขตรับผิดชอบ	ภาพที่ 2.2-3	-
4. การจัดการมูลฝอย	พารามิเตอร์ - ปริมาณมูลฝอยตกค้างความสะอาด ความถี่ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ห้องพักมูลฝอยรวม	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังการเก็บขน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 2.2-6 เอกสารแนบ 3	-

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	สถานีตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ		เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
5. การบำบัดน้ำเสีย	พารามิเตอร์ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย BOD, SS, Oil & Grease, Bacteria และ TKN ความถี่ - ทุก 3 เดือน/ครั้ง	- น้ำเข้า และน้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	●	- โครงการได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำเสียออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ โดยมีพารามิเตอร์เป็นไปตามที่กำหนด ในเดือนเดือนธันวาคม 2568 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5-2	เอกสารแนบ 4	ตารางที่ 4.1-2
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	พารามิเตอร์ - ซ้อมป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน ความถี่ - 6 เดือน/ครั้ง	อุปกรณ์ในระบบป้องกัน - ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 2.2-8 เอกสารแนบ 3	-
7. คุณภาพชีวิตและสภาพเศรษฐกิจและสังคม	พารามิเตอร์ - สอบถามทัศนคติของประชาชนอาศัยใกล้เคียง ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง	- ชุมชน	✓	- โครงการจัดให้นิติบุคคลฯ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณรอบพื้นที่โครงการเพื่อนำมาปรับปรุงตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
8. สาธารณสุขและความปลอดภัย	พารามิเตอร์ - สุขภาพพนักงาน ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	พนักงานในโครงการ - ตรวจสอบสุขภาพ	✓	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการปีละ 1 ครั้ง	-	-

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ดัชนี คือ คุณภาพน้ำทิ้ง โดยสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มีการระบุให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ BOD, SS, Oil & Grease, Bacteria และ TKN ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำแขวนในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง แสดงดังตารางที่ 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1

ตารางที่ 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่วิเคราะห์วิธีการ	ตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด
- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จุดที่ 1	- pH	- Electrometric Method	1/12/2568
- น้ำเสียออกจากระบบบำบัด จุดที่ 1	- BOD	- 5 Day BOD Membrane Electrode	
- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จุดที่ 2	- Suspended Solid	- Dried at 103-105°C	
- น้ำเสียออกจากระบบบำบัด จุดที่ 2	- Settleable Solids	- Volumetric Method	
- น้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ	- TDS	- Dried at 103-105°C	
	- Sulfide	- Iodometric Method	
	- TKN	- Macro-Kjeldahl Method	
	- Fat Oil & Grease	- Partition - gravimetric method	



น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (ทิศเหนือ) น้ำเสียออกจากระบบบำบัด (ทิศเหนือ) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (ทิศใต้)



น้ำเสียออกจากระบบบำบัด (ทิศใต้)

น้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ

ภาพที่ 3.5-1 จุดตรวจน้ำในโครงการ

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ในเดือนธันวาคม 2568 จำนวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solid ; SS), ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids ; TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และน้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease ; FOG) ทำการตรวจวัด 5 สถานี ได้แก่ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จุดที่ 1, น้ำเสียออกจากระบบบำบัด จุดที่ 1, น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จุดที่ 2, น้ำเสียออกจากระบบบำบัด จุดที่ 2 และน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-2

3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) ยกเว้น BOD และ SS ในบางเดือน

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ในปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) แสดงดังตารางที่ 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2

ตารางที่ 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ							
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (ทิศเหนือ)	1/12/2568	7.7	114.0	40.0	306.0	5.0	<1.0	73.0	6.0
น้ำเสียออกจากระบบบำบัด (ทิศเหนือ)		7.6	43.4	54.0	272.0	3.0	<1.0	31.0	<5.0
น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (ทิศใต้)		7.6	109.4	88.0	294.0	5.0	<1.0	70.0	<5.0
น้ำเสียออกจากระบบบำบัด (ทิศใต้)		7.1	34.8	54.0	244.0	<0.1	<1.0	26.0	<5.0
น้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ		7.5	41.6	576.0	254.0	3.0	<1.0	27.0	<5.0
มาตรฐาน*		5.5-9.0	30	40	1,000	-	1.0	35	20

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)

SS = Suspended Solid

TDS = Total Dissolved Solids

N.D. = Not Detected

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ							
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (ทิศใต้)	31/1/2566	4.3	70.6	6856.0	340	90.0	<1.0	166.0	7.6
	18/12/2566	7.3	89.0	71.0	396.0	4.0	<1.0	49.0	<5.0
	26/6/2567	7.0	54.4	68.0	142.0	3.0	<1.0	41.0	<5.0
	3/12/2567	7.3	46.8	73.0	782.0	3.0	<1.0	34.0	5.2
	24/6/2568	6.9	34.6	50.0	274.0	0.4	<1.0	23.0	<5.0
	1/12/2568	7.6	109.4	88.0	294.0	5.0	<1.0	70.0	<5.0
น้ำเสียออกจากระบบบำบัด (ทิศใต้)	31/1/2566	6.7	16.7	173.0	124.0	4.0	<1.0	47.0	<5.0
	18/12/2566	7.3	10.3	115.0	372.0	7.0	<1.0	5.9	N.D.
	26/6/2567	7.2	57.2	56.0	150.0	2.0	<1.0	43.0	<5.0
	3/12/2567	7.4	16.0	43.0	769.0	0.3	<1.0	9.8	<5.0
	24/6/2568	6.9	22.5	54.0	336.0	0.5	<1.0	14.0	<5.0
	1/12/2568	7.1	34.8	54.0	244.0	<0.1	<1.0	26.0	<5.0
มาตรฐาน*		5.5-9.0	30	40	1,000	-	1.0	35	20

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)

SS = Suspended Solid

TDS = Total Dissolved Solids

N.D. = Not Detected

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ							
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (ทิศเหนือ)	31/1/2566	4.1	72.2	960.0	198.0	6.0	<1.0	111.0	12.0
	18/12/2566	7.3	84.2	65.0	392.0	3.0	<1.0	50.0	<5.0
	26/6/2567	7.5	52.4	82.0	108.0	4.0	<1.0	41.0	5.2
	3/12/2567	7.3	48.2	31.0	808.0	0.3	<1.0	36.0	6.4
	24/6/2568	6.9	38.0	30.0	258.0	0.2	<1.0	28.0	<5.0
	1/12/2568	7.7	114.0	40.0	306.0	5.0	<1.0	73.0	6.0
น้ำเสียออกจากระบบบำบัด (ทิศเหนือ)	31/1/2566	6.9	14.8	44.5	172.0	0.4	<1.0	45.0	N.D.
	18/12/2566	7.4	18.1	31.0	386.0	1.0	<1.0	9.8	N.D.
	26/6/2567	7.2	53.8	36.0	144.0	1.0	<1.0	39.0	<5.0
	3/12/2567	7.4	14.0	73.0	748.0	0.3	<1.0	9.4	<5.0
	24/6/2568	6.9	27.1	60.0	246.0	1.0	<1.0	19.0	<5.0
	1/12/2568	7.6	43.4	54.0	272.0	3.0	<1.0	31.0	<5.0
มาตรฐาน*		5.5-9.0	30	40	1,000	-	1.0	35	20

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)

SS = Suspended Solid

TDS = Total Dissolved Solids

N.D. = Not Detected

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)





สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ							
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)
น้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ	31/1/2566	6.9	17.7	72.0	154.0	1.6	<1.0	20.0	6.2
	18/12/2566	7.4	9.8	12.0	384.0	<0.1	<1.0	4.3	N.D.
	26/6/2567	7.3	24.2	48.0	146.0	2.0	<1.0	19.0	<5.0
	3/12/2567	7.4	8.8	46.0	773.0	4.0	<1.0	5.2	<5.0
	24/6/2568	6.9	22.0	44.0	264.0	0.2	<1.0	12.0	<5.0
	1/12/2568	7.5	41.6	576.0	254.0	3.0	<1.0	27.0	<5.0
มาตรฐาน*		5.5-9.0	30	40	1,000	-	1.0	35	20

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)





SS = Suspended Solid

TDS = Total Dissolved Solids

N.D. = Not Detected

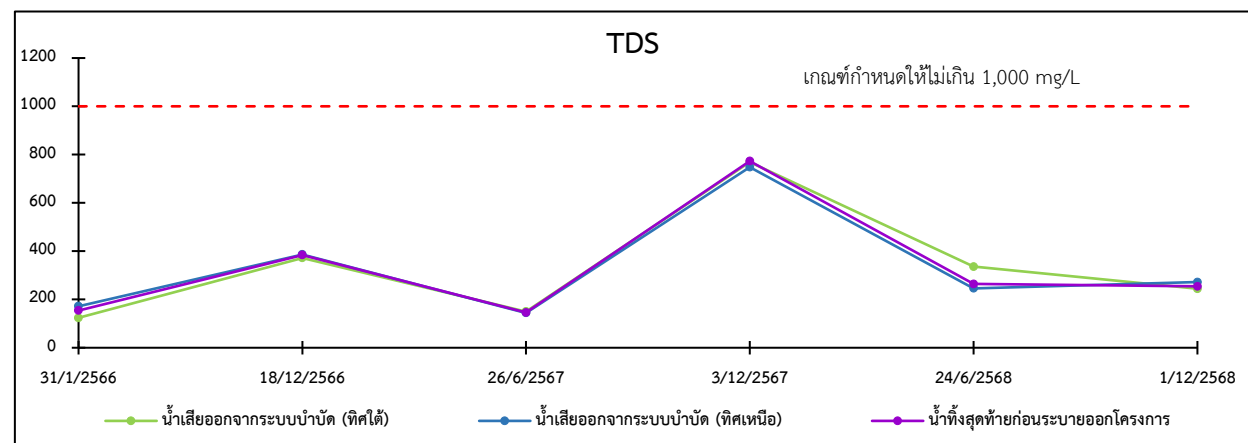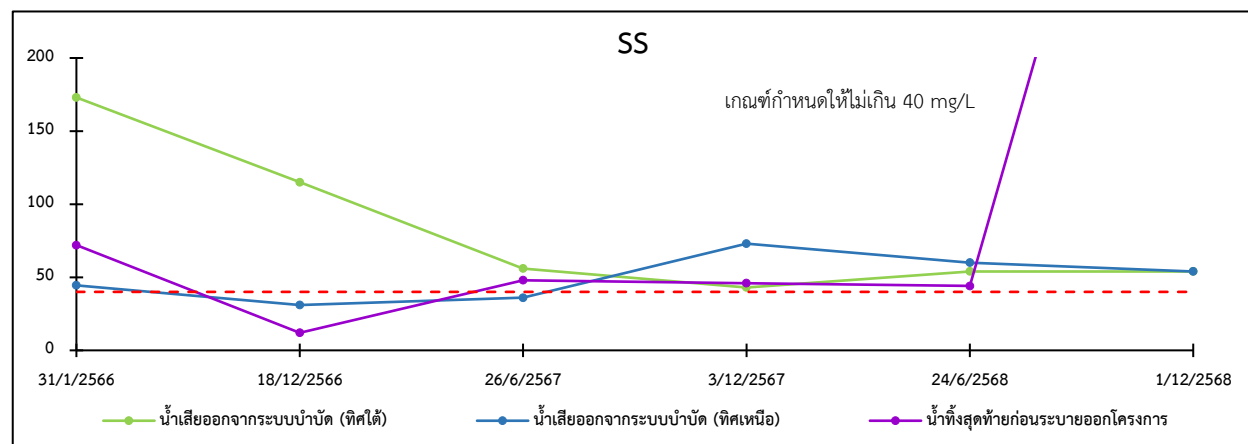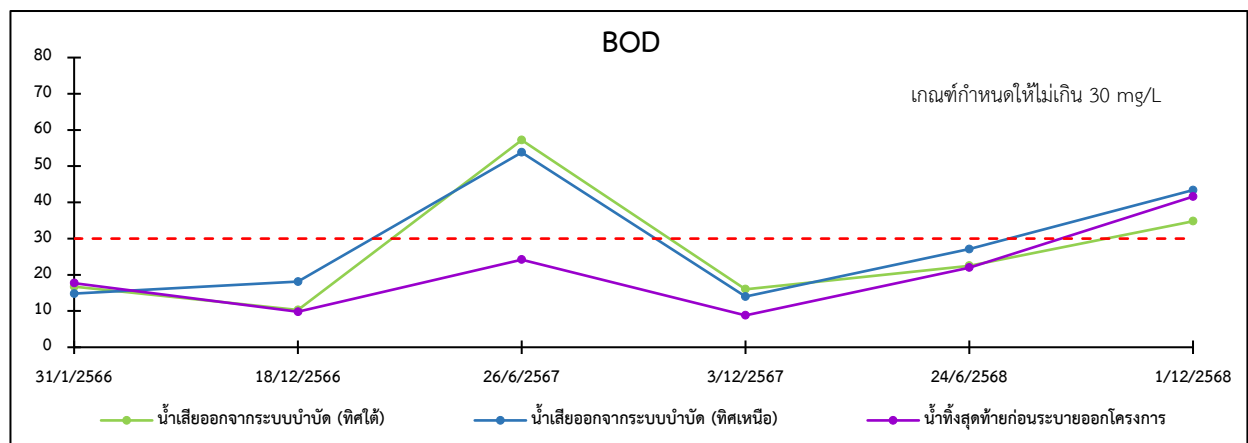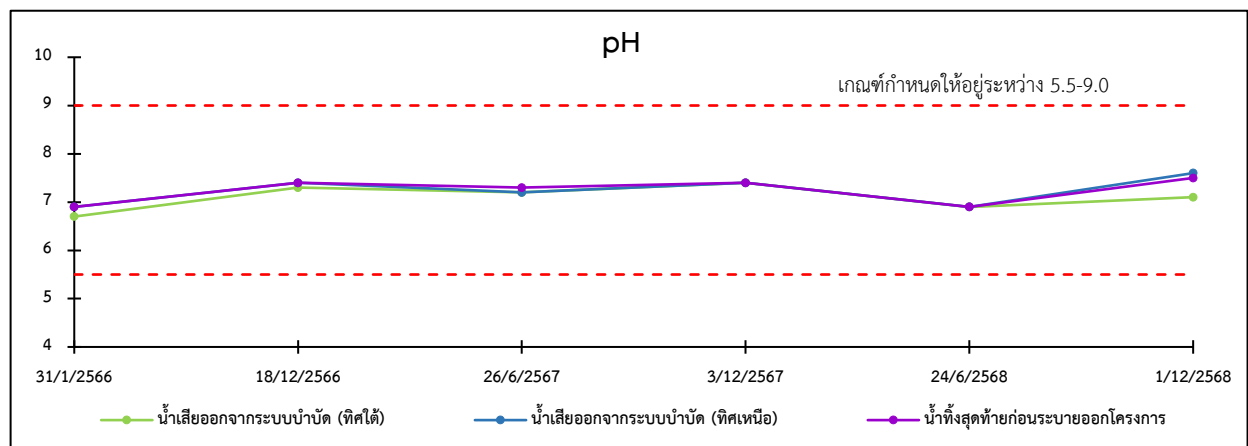

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

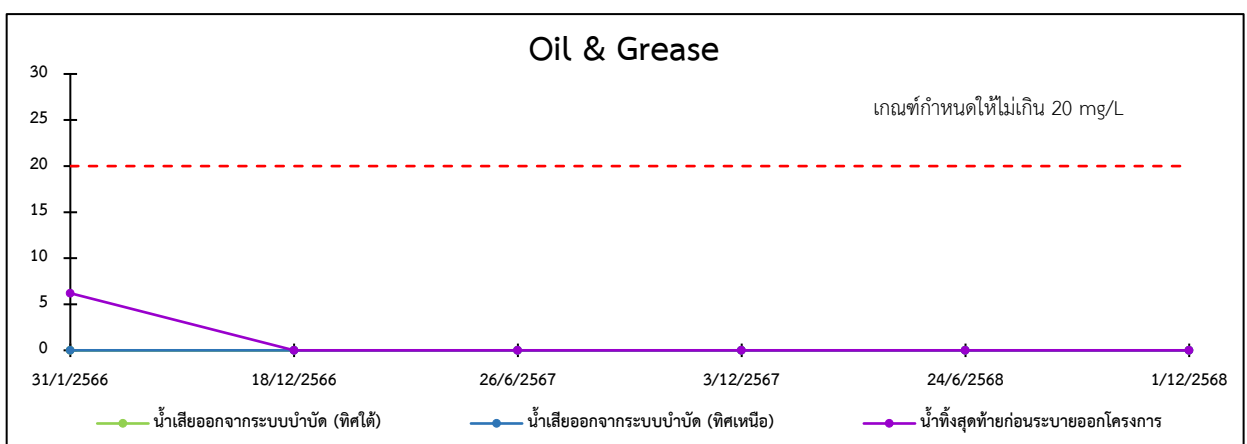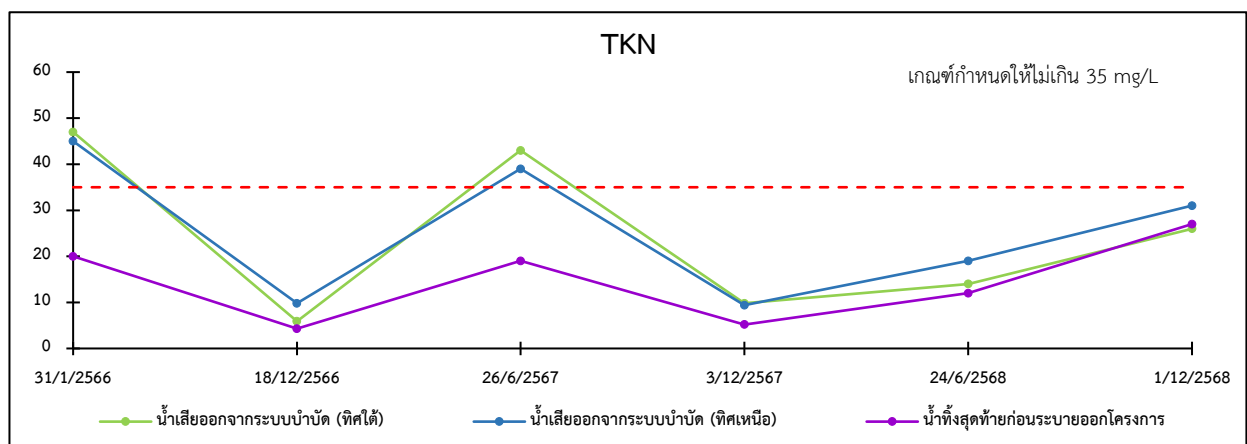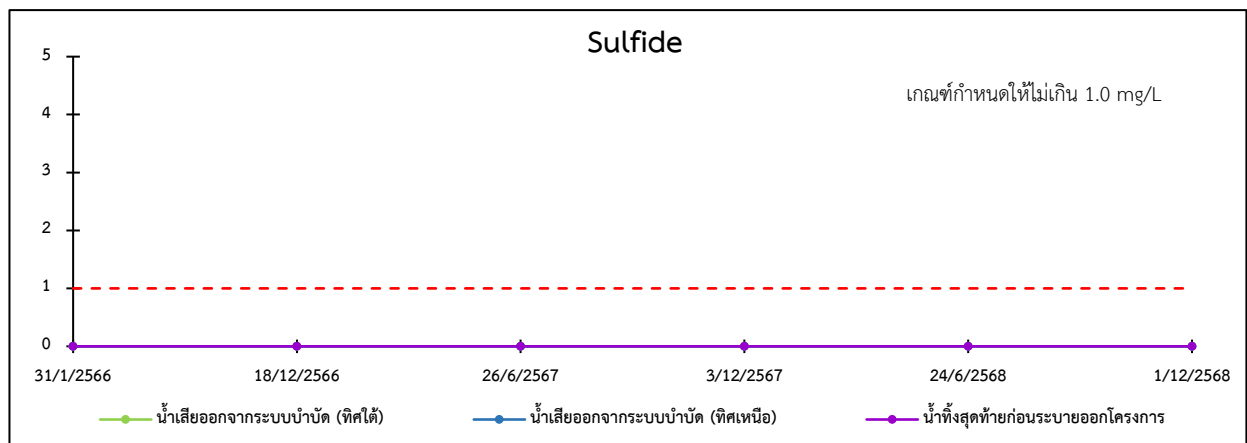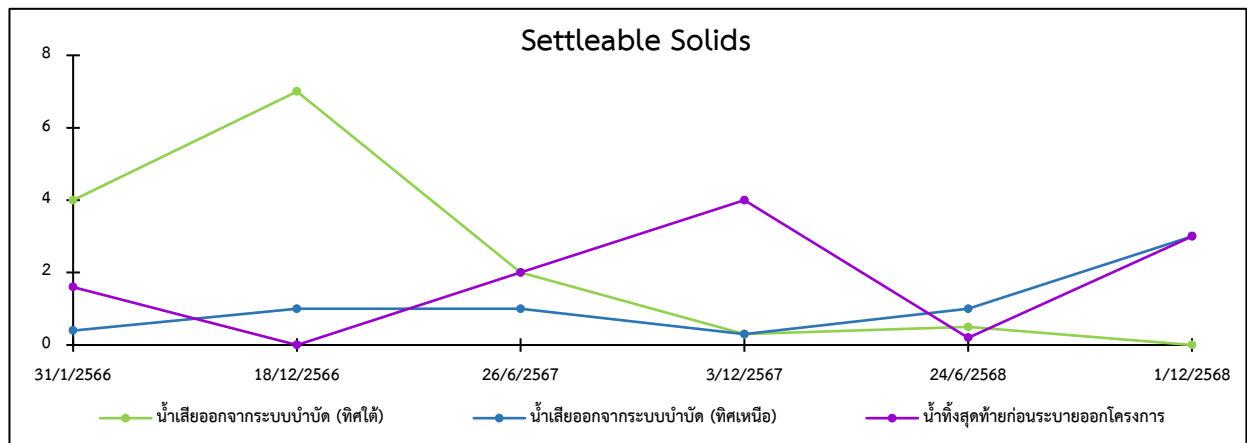

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)
