

6. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

1) บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ วินน์ธานี ระยะเปิดดำเนินการ ที่จุดเก็บตัวอย่าง บ่อตรวจคุณภาพน้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามวิธีมาตรฐาน ดังตารางที่ 5 โดย ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอลาทอรี จำกัด

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 และ 5 พฤษภาคม 2569 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 5 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
pH	-	APHA:4500-H(B)
Suspended Solids	mg/l	APHA:4500-O(C)5210B
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA:2540-D
Settleable Solids	mg/l	Dries 103-105 C
BOD	mg/l	APHA:5520-B
Oil & Grease	mg/l	APHA:4500-Norg(B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA:4500-S(F)
Sulfide	mg/l	APHA:2540F
Escherichia Coli	CFU/100ml.	APHA:9221G

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำของโครงการ


ดัชนีวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		
	24 กุมภาพันธ์ 2569	5 พฤษภาคม 2569	ค่ามาตรฐาน*
pH	7.5	7.6	5.5-9
BOD (mg/l)	72	19	≤20
SS (mg/l)	16	11	≤30
TDS (mg/l)	530	210	≤1000
Oil & Grease (mg/l)	5.6	5.6	≤20
TKN (mg/l)	34	14	≤35
Sulfide (mg/l)	2.7	3.1	≤1.0
Settleable Solids (mg/l)	<0.1	<0.1	ไม่ได้กำหนด

หมายเหตุ : *กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 (อาคารประเภท ก.)


ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแนวโน้มคุณภาพน้ำทั้งภายในพื้นที่โครงการ

เดือน/ปี	พารามิเตอร์ (mg/l)							
	pH	SS	TDS	Settleable Solids	BOD	Oil&Grease	TKN	Sulfide
ก.ย.66	7.5	11.4	71	<0.1	38	2.8	24	10
ธ.ค.66	7.5	18	187	<0.1	41	3.2	24	6.2
พ.ค.67	7.6	9.0	112	<0.1	20	4.8	61	5.9
มิ.ย.67	7.5	13	153	<0.1	28	2.0	34	6.2
ก.ย.67	7.4	7.2	385	<0.1	45	1.2	26	9.1
ธ.ค.67	7.6	8.4	300	<0.1	28	4.8	27	5.0
มี.ค.68	7.6	9.8	310	<0.1	45	1.6	29	1.0
มิ.ย.68	7.5	7.6	305	<0.1	21	9.6	18	2.1
ส.ค.68	7.5	8.8	265	<0.1	33	6.4	27	5.2
พ.ย.68	7.4	19	315	<0.1	31	4.4	0.28	4.6
ก.พ.69	7.5	16	530	<0.1	72	5.6	34	2.7
พ.ค.69	7.6	11	210	<0.1	19	5.6	14	3.1
Standard	5.5-9	30	1000	ไม่ได้กำหนด	20	20	35	1.0


ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

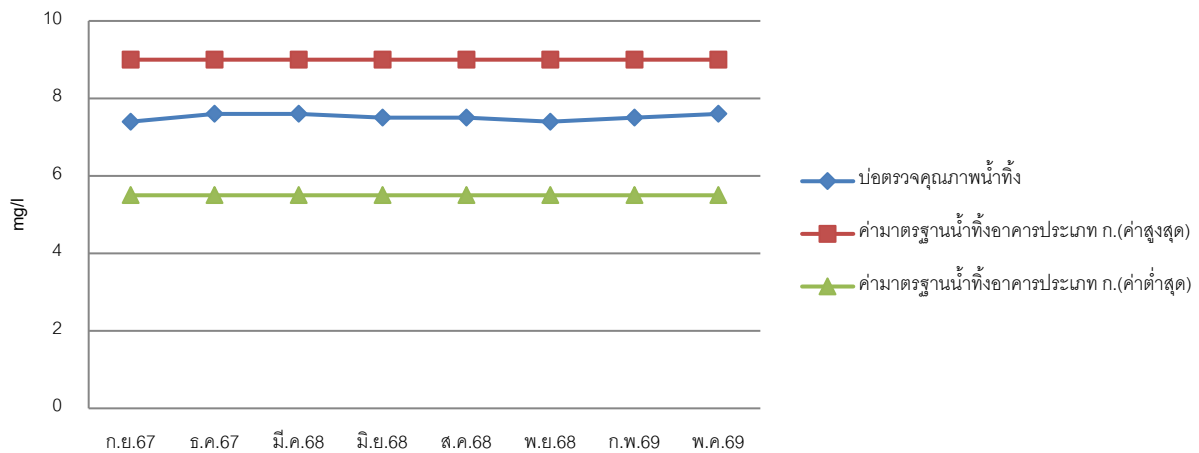

ค่าตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)

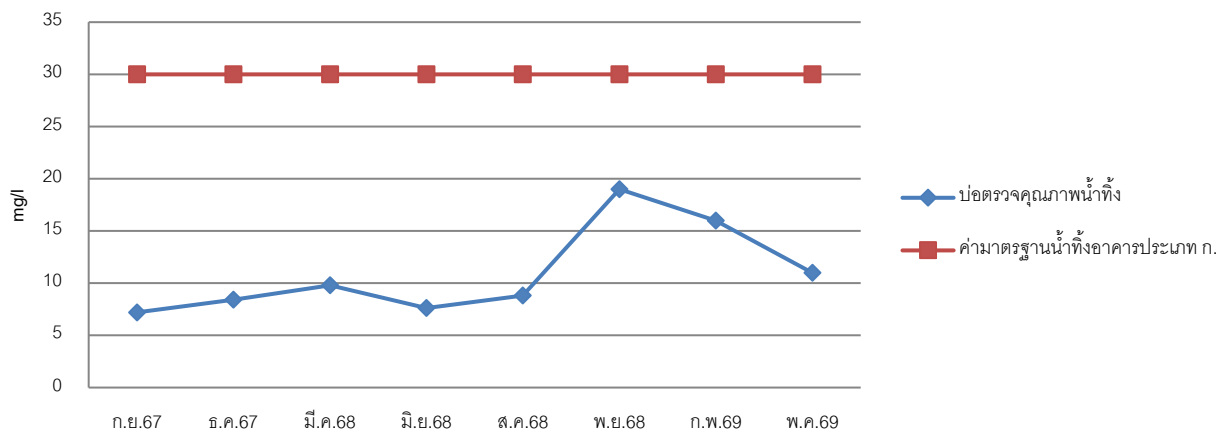


ค่าตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids)

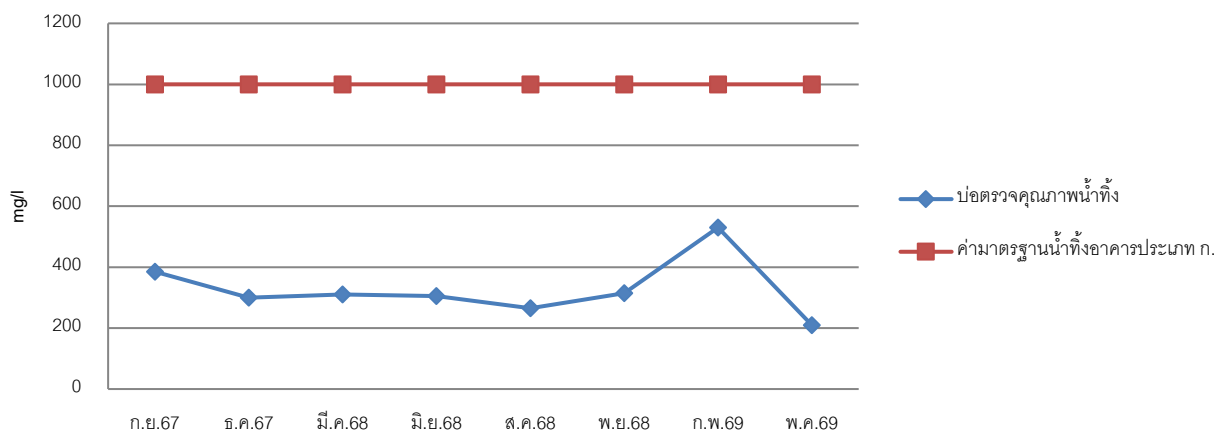


ภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ค่าตะกอนจมตัว (Settleable Solids)

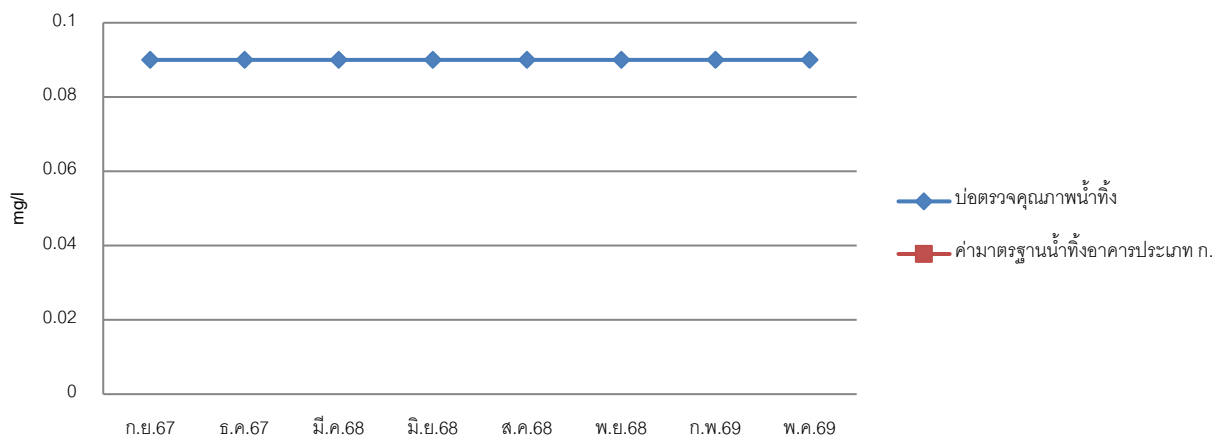

ค่าบีโอดี (BOD)

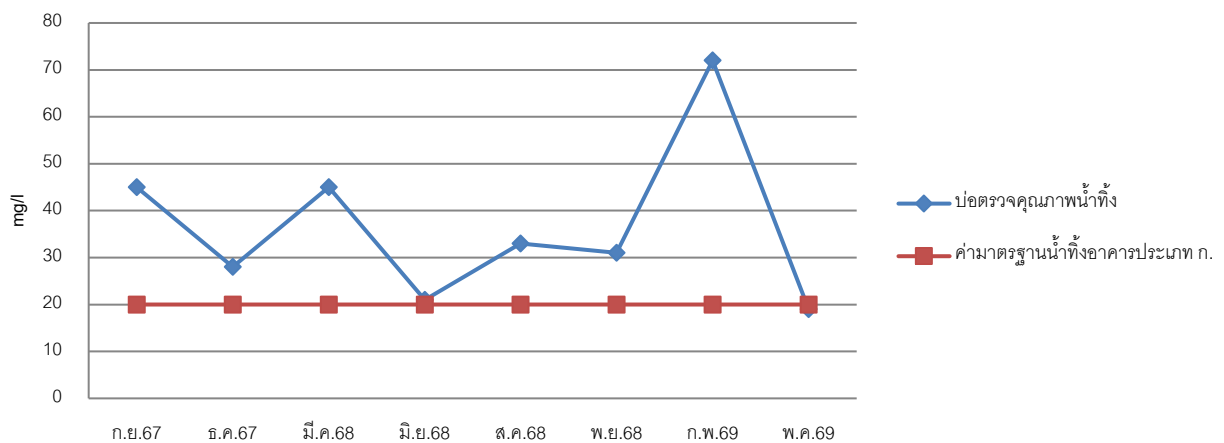


ค่าไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)

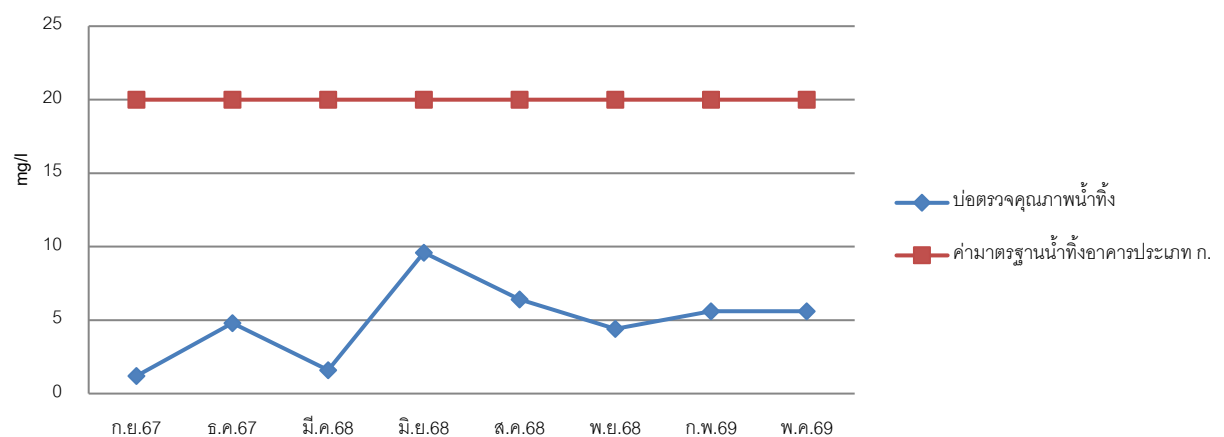


ภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

ค่าไนโตรเจนทีเคเอ็น (TKN)

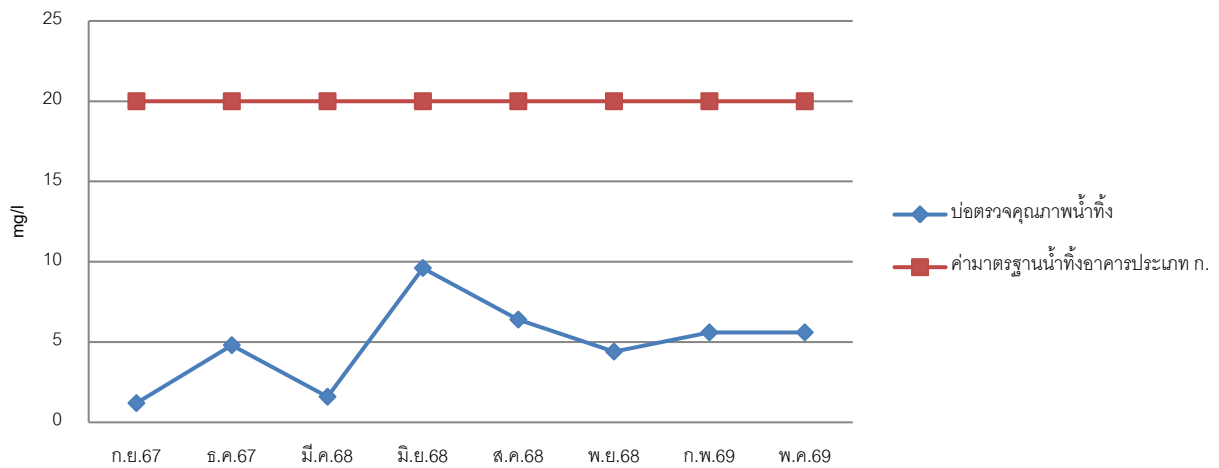

ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

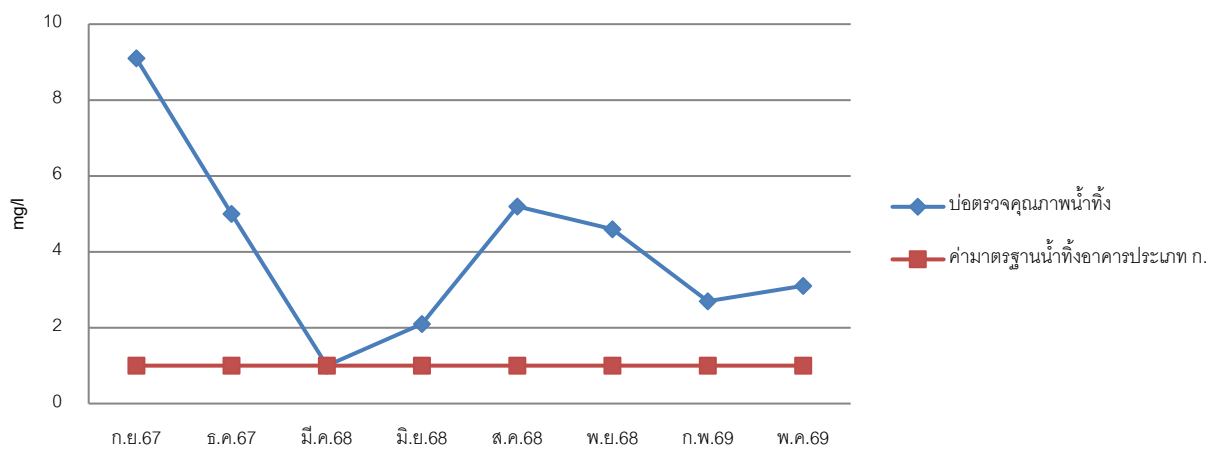

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

6.2 คุณภาพน้ำใช้บ่อสำรองน้ำ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บ่อสำรองน้ำใต้ดิน ของ โครงการ วินน์ธานี ระยะเปิดดำเนินการ ที่จุดเก็บตัวอย่าง บ่อสำรองน้ำ วิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ (กำหนดเก็บตัวอย่างทุก 3 เดือน) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ที่บ่อสำรองน้ำใต้ดิน

ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		
	24 กุมภาพันธ์ 2569	5 พฤษภาคม 2569	ค่ามาตรฐาน*
Escherichia.coli(CFU/100ml.)	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ : *(ค่ามาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011)
