บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการ ศุภาลัย สวนพลู ตั้งอยู่ที่ซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร **(ภาพที่ 1.2-1)** ดำเนินการโดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว) ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง (เดิม 79 ห้อง) ขนาดพื้นที่โครงการ 2-2-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร

ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นในชั้นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/8447 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547 **(เอกสารแนบ 1)** ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียลทัล เพลส ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย สวนพลู (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

ชื่อโครงการ : โครงการ ศุภาลัย สวนพลู

สถานที่ตั้งโครงการ : ซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 2-2-39.9 ไร่ มีอาณาเขตติดในทิศทางต่างๆ ดังนี้ **(ภาพที่ 1.2-2)**

ทิศเหนือ	ติดกับ	บริษัท ยูโรแพค จำกัด
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ลุมพินีเพลส สวนพลู-สาทร
ทิศใต้	ติดกับ	แฟลตตำรวจ
ทิศตะวันตก	ติดกับ	วิลล่าสวนพลู อพาร์ทเม้นต์

เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียลทัล เพลส **(เอกสารแนบ 2)**

สถานที่ติดต่อ : ซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [redacted]

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: ทส 1009/8447 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547

ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : มกราคม 2566

ประเภทโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย

สภาพปัจจุบัน : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ขนาดพื้นที่ : โครงการ ศุภาลัย สวนพลู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง (เดิม 79 ห้อง)

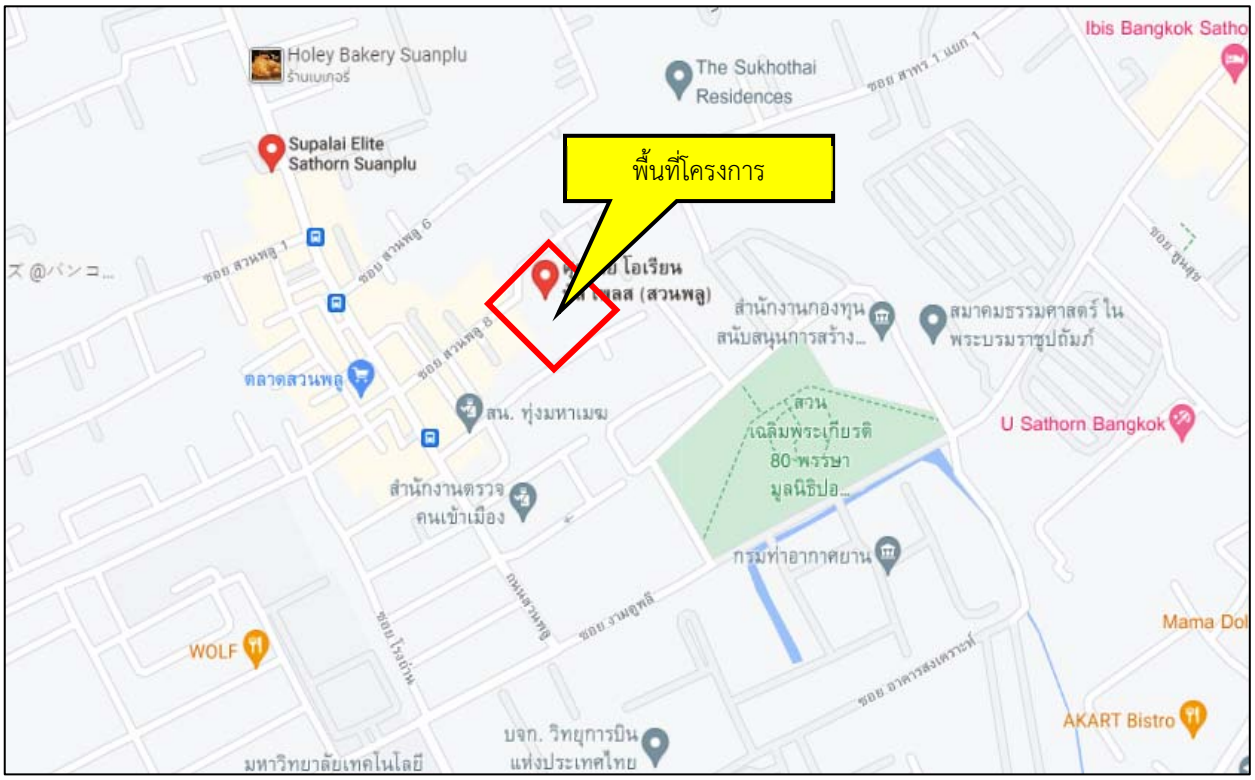

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ที่มา : ดัดแปลงจากโปรแกรม QGIS (มีนาคม 2564) และการสำรวจภาคสนาม (2564)

ภาพที่ 1.2-1	แสดงที่ตั้งพื้นที่โครงการ	N

ลุมพินีเพลส สวนพลู-สาทร

วิลล่าสวนพลู อพาร์ทเม้นต์

ที่มา : ดัดแปลงจากโปรแกรม QGIS (มีนาคม 2564) และการสำรวจภาคสนาม (2564)

ภาพที่ 1.2-2	สภาพแวดล้อมและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการ	N

1.3 รายละเอียดโครงการตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินการจริง

1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ

<u>ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

โครงการ ศุภาลัย สวนพลู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง (เดิม 79 ห้อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นล่าง	ที่จอดรถ 35 คัน และห้องประชุม
ชั้น 1	ที่จอดรถ 56 คัน
ชั้น 2	ที่จอดรถ 56 คัน
ชั้น 3	ที่จอดรถ 64 คัน
ชั้น 4	ที่จอดรถ 66 คัน
ชั้น 5	ที่จอดรถ 66 คัน
ชั้น transfer	ที่จอดรถ 23 คัน
ชั้น 6	สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักแบบ C (40 ตร.ม./ห้อง) 14 ห้อง ห้องพักแบบ A (80 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ B (60 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง และห้องพักแบบ D (105 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง
ชั้น 7-19	ห้องพักแบบ A (80 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ B (60 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ C (40 ตร.ม./ห้อง) 14 ห้อง ห้องพักแบบ D (105 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง และห้องพักแบบ E (54.5 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง
ชั้น 20	ห้องพักแบบ I (105 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ J (54.5 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง ห้องพักแบบ F (122 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ G (120 ตร.ม./ห้อง) 4 ห้อง และห้องพักแบบ H (126 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง

<u>ผลการดำเนินการจริง</u>

โครงการ ศุภาลัย สวนพลู เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคารส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **(ภาพที่ 2.2-1)**

ปัจจุบันโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งที่ตั้งของสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารชุดพักอาศัย โดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน **(เอกสารแนบ 2)**

1.3.2 ระบบน้ำใช้

<u>ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

โครงการรับน้ำจากการประปานครหลวง ผ่านท่อของโครงการ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว มาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร จากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนพักอาศัยและส่วนต่างๆ ของโครงการ

<u>ผลการดำเนินการจริง</u>

โครงการได้รับน้ำจากสำนักงานประปานครหลวงผ่านท่อของโครงการมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าก่อนจ่ายไปยังส่วนพักอาศัยและส่วนต่างๆ ของโครงการ **(ภาพที่ 2.2-5)**

1.3.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย

<u>ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียระบบ Activated Sludge Process โดยมีค่า BOD ณ ที่เกิดก่อนการบำบัดใดๆ ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ไว้สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

<u>ผลการดำเนินการจริง</u>

โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ในโครงการก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ **(ภาพที่ 2.2-4)**

1.3.4 ระบบระบายน้ำ

<u>ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

ระบบระบายน้ำของโครงการศุภาลัย สวนพลู จะใช้ระบบระบายน้ำแยกส่วนน้ำทิ้งจากการอยู่อาศัยและน้ำฝนจากอาคารออกจากกัน ดังนี้

1) ระบบระบายน้ำรอบโครงการ

ท่อระบายน้ำฝนรอบโครงการเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดของท่อระบายน้ำที่ใช้คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร มีความลาดเอียง 1:500 และมีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ โดยท่อระบายน้ำฝนจะรับเฉพาะน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายออกสู่ท่อสาธารณะด้านหน้าพื้นที่โครงการ

2) ระบบระบายน้ำจากอาคาร

ท่อระบายน้ำเสีย เป็นท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว โดยท่อระบายน้ำเสียจะรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เข้าสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ

ผลการดำเนินการจริง

โครงการแยกระบบระบายน้ำฝนและระบบบายน้ำเสียภายในโครงการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยที่น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการจะถูกรวบรวมผ่านท่อจากหลังคา แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน้ำฝนลงสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ **(ภาพที่ 2.2-4)**

1.3.5 ระบบไฟฟ้า

ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ระบบไฟฟ้าหลัก

โครงการจะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จากระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 KV 2 เฟส 4 สาย ซึ่งทางโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type Transformer) และแผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MBD) ในปริมาณ 1,600 KVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงสูงต่ำ เพื่อจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของโครงการสามารถแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ

- ระบบ Generator ซึ่งจะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาด 150 KVA ซึ่งทำหน้าที่เมื่อเกิดกรณีไฟฟ้าดับ โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนแสงสว่างส่วนกลาง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบดับเพลิง เป็นต้น
- ระบบ Battery ซึ่งจะใช้กับระบบแสงสว่างฉุกเฉินของอาคาร

ผลการดำเนินการจริง

โครงการรับจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าสู่โครงการ ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type Transformer) และแผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MBD) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงสูงต่ำ เพื่อจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป นอกจากนี้ โครงการยังมีการติดระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนส่วนกลางต่างๆ กรณีระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง **(ภาพที่ 1.3-1)**

หม้อแปลงไฟฟ้า

Electrical Room

Generator Room

ภาพที่ 1.3-1 ระบบไฟฟ้าของโครงการ

1.3.6 ระบบป้องกันระงับอัคคีภัย

ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย ระบบส่งน้ำและแหล่งน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโข่งแกนนอน เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน ท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร

2) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย หัวกระจายน้ำดับเพลิง ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยจากการไหลของน้ำ

3) ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของอาคาร

4) ป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งในห้องทุกห้อง โดยบอกตำแหน่งของห้องพักอาศัย ที่ตั้งของอุกกรณ์ดับเพลิงและบันไดหนีไฟ

5) บันไดหนีไฟ มีขนาดความกว้างของทางขึ้น-ลง 3.5 เมตร อยู่บริเวณใกล้ลิฟต์ และ 1.90 เมตร อยู่บริเวณกลางอาคาร โดยบันไดหนีไฟจะมีผนังกันไฟโดยรอบ และประตูหนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดพลักออกสู่ภายนอก

6) ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ อุปกรณ์ตรวจจับควัน

ผลการดำเนินการจริง

โครงการจทำการติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ประกอบด้วย ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ **(ภาพที่ 2.2-7)**

1.3.7 การกำจัดขยะ

ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดให้มีถังขยะพลาสติกมีฝาปิดขนาดความจุ 200 ลิตร แบ่งเป็นขยะเปียก 1 ใบ และถังขยะแห้ง 2 ใบ ในชั้น 6-19 ส่วนชั้นที่ 20 จะจัดถังขยะเปียก 1 ใบ จัดวางในตำแหน่งหน้าลิฟต์ ภายในถังรองด้วยถุงเก็บขยะ (พลาสติกสีดำ) เพื่อความสะดวกในการเก็บขน รวมถึงการป้องกันการรั่วซึม เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำขยะมาทิ้งในบริเวณที่เตรียมไว้

โดยจะมีพนักงานของโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะไปยังห้องพักขยะของโครงการ ซึ่งมีตำแหน่งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหลังพื้นที่โครงการ โดยห้องพักขยะแบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย รวมถึงโครงการจะจัดให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินการจริง

โครงการจัดให้มีถังขยะขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในแต่ละชั้น และจัดให้มีพนักงานคอยจัดเก็บมูลฝอยภายในอาคารของแต่ละชั้นไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน และมีการประสานงานให้สำนักงานเขตสาทรเข้ามาเก็บขยะทุกๆ 2 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง **(ภาพที่ 2.2-6)**

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย สวนพลู ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นำเสนอรายงานดัง**บทที่ 2**

1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง การใช้น้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัย ดัง**ตารางที่ 1.5-1**

ตารางที่ 1.5-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน

การดำเนินงาน	เดือนที่ดำเนินงาน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม												
1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง												
1.2 การใช้น้ำ												
1.3 ระบบป้องกันอัคคีภัย												
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ												
3. การเสนอรายงาน												

หมายเหตุ :
- ดำเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน
- ดำเนินการตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี
- ดำเนินการเสนอรายงานปี 2566
- ดำเนินการเสนอรายงานปี 2567
