เอกสารแนบ 1-1
หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๐ ๕ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ที่ NSC.0807/2564 ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๘๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๕๔๑ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวม

รายละเอียด...

รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิวุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
Natural Solution Co.,Ltd.
111/54 หมู่บ้านพรีเมียมเพลส ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2187-1213 แฟกซ์ : 0-2187-1203

12660 ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔
11.30

ที่ NSC.0807/2564

26 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2)
รายงานฉบับหลัก จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการนั้น

ในการนี้ บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้วจึงขอนำส่งรายงาน ฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองเดช วรศรี)
กรรมการผู้จัดการ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 574 ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14:38

ที่ กท ๑๑๐๔/๘๙

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 58 ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา 9.05

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๔๘๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสำเนา ๗ ฉบับ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๕๔๑ ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ ๔-๓-๓.๓ ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร ศาลาขั้นเดียว จำนวน ๑ อาคาร อาคารพักมูลฝอย และสระว่ายน้ำ ๑ สระ ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรุงเทพมหานครได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.
(วิรัช ตันชนะประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
เลขานุการคณะกรรมการฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ
กลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

เอกสารแนบ 1-2
หนังสือการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อโครงการ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๐๖๑๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๐๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ สส.๐๙๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมครั้ง ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๕๔๑ ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม "โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2)" เป็น "โครงการ ดี คอนโด พนา" โดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากเดิม "โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2)" เป็น "โครงการ ดี คอนโด พนา" โดยให้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เอกสารแนบ 1-3
ใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1)

แบบ อ.๑

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๗๑ / ๖๕

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อนุญาตให้ โดย นางสาวพัชริน เขี้ยวแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของอาคาร

[redacted]

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง บางขุนศรี อำเภอ/เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ

เลขที่ ๔๙๕๘๓ ๔๙๗๒๐ ๕๐๒๕๒ เป็นที่ดินของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(๔๖๗๘๓ ๔๘๕๒๖ ๔๘๖๘๗ ๔๘๖๘๘ ๔๘๖๘๙ ๔๘๖๙๐ ๔๘๘๖๙ ภาระจำยอม) นายชน ยศศักดิ์ศรี (ภาระจำยอม)

เลขที่ดิน ๔๔๐ ๓๖๙ ๓๘๓ (๓๑๗ ๔๐๗ ๔๒๓ ๔๒๔ ๒๕๗ ๒๕๘ ๔๓๒ ภาระจำยอม)

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคาร

จะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง -

อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ - เลขที่ -

เป็นที่ดินของ -

ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคารชุดอยู่อาศัย จอดรถยนต์

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๘ ชั้น จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้เป็น (๕๔๑ ห้อง)

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๑๙,๙๘๖.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน ๑๖๒ คัน พื้นที่ ๔,๕๕๑.๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร

(๒) ชนิด สระว่ายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่

ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี จะแจ้งให้ทราบเมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงาน

หรือ นายประวิตร โสภิตลาภธนา ส-สถ ๓๑๑๑ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

นายสมพงษ์ จิตรรัตนพงษ์ สย.๓๐๘๙ นายธันวา ตันเสถียร สส.๓๐๔

นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.๓๔๗๓

นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.๒๕๔๔

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าตรวจแบบ [redacted]

รวม ๘๘,๓๕๗.๐๐ บาท (แ[redacted]

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

.....

.....

.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....เดือน ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ. .....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) [redacted] ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

[redacted]

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.....
ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.....
ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.....
ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.....
ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMI

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

[redacted]

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ต้นฉบับ

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รายบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

โดย นางสาวพัชริน เขี้ยวแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ

๑) ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการหรือขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๒๖) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๐) กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับทางเท้า หรือทำทางเชื่อมเพื่อเป็นทางเข้า-ออกรถยนต์จากสำนักงานเขตท้องที่

(๓) การปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหากมีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคารผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก่อน

(๔) ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยการกั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดินโดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคารให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

(๕) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีปล่องขั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษทางเสียงและอากาศอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่น

(๖) ผู้ได้รับอนุญาตห้ามนำเศษวัสดุหรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารกองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

(๗) เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๘) ผู้ได้รับอนุญาตต้องรื้อถอนอาคารเดิมออกในทันทีที่ได้รับอนุญาต หากไม่ดำเนินการให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผิดไปจากแบบแปลนหรือแผนผัง ในกรณีอาคารเข้าข่ายดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

(๙) การใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งตกอยู่ภายใต้การจำยอมใด ๆ ผู้ขออนุญาตจะทำการได้เพียงใดเป็นปัญหาทางแพ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องพิจารณา และรับผิดชอบต่อผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

(๑๐) การดำเนินการใด ๆ กับอาคารที่ได้รับอนุญาตหรือรับแจ้งที่เป็นปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในภายหลัง ทั้งตัวอาคาร ที่ดิน หรือทรัพย์สินใด ๆ เป็นภาระที่ผู้ได้รับอนุญาตยินยอมรับผิดชอบต่อมูลกรณี หรือคู่กรณีพิพาทเองทั้งสิ้น

(๑๑) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่

[redacted]

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ต้นฉบับ

คำเตือน

(๑) ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิก การเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิ และหน้าที่งานแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อน

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

[redacted]

เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบ บทที่ 2

เอกสารแนบ 2-1
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบเครื่องจักร

VP.SAF-26

VISAVAPAT

แบบตรวจสภาพเครนประจำวัน Daily Crane Safety Check LIST

หน่วยงาน : D Condo Panaa

ประจำเดือน สิงหาคม 66

Type of Crane : [/] Mobile Crane [ ] Crawler Crane [ ] Hiab

วันที่ตรวจสอบ 1 ม.ค. 66

ชนิดของปั้นจั่น : Mobile Crane ขนาด : 25 T หมายเลขรถปั้นจั่น :

วันหมดอายุ 31 ส.ค. 66

วันที่ [Date] / รายละเอียด [Description]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. สายสลิงคด,งอ,แตก	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
2. สภาพโรลเก็บสลิงและแถบหมุน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
3. ระบบตัดรอกอัตโนมัติเมื่อเลื่อนตะขอไปชน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
4. สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
5. เครื่องแสดงน้ำหนัก	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
6. องศาการบอกมุม	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
7. ระบบล็อค,เบลค	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
8. คลิบล็อคตะขอครบ	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
9. สภาพตะขอยกและลูกรอก	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
10. การสวิง,การล็อค,กาเบรคของเครน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
11. ระบบไฟ สัญญาณเตือนสวิง,ยกน้ำหนักเกิน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
12. สภาพของขาเครน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
13. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮโดรลิค	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
14. การตังเครน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
15. เพทรองขาเครน	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
16. สภาพยาง,ดีนตะขาบ	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
17. การตรวจเช็คสภาพของระบบไอเสียและควันดำ	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/
18. ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชื่อพนักงานขับรถ [Driver Name's]	นายธนาฟนธ์ ปัญญาแก้ว																														
ลายเซ็นต์ [Signature]	ธนาฟนธ์ ปัญญาแก้ว																														
ผู้ควบคุมงาน [Superviser]	นายสมชาติ อินเมือง																														

หมายเหตุ Remark :- / = ดี, ใช้ได้ If Good X = ไม่ดี, แก้ไข, ชำรุด If Defective

VP.SAF-26

VISAVAPAT

แบบตรวจสภาพเครนประจำวัน Daily Crane Safety Check LIST

หน่วยงาน : D Condo Panaa

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

Type of Crane : ☑ Mobile Crane ☐ Crawler Crane ☐ Hiab

วันที่ตรวจสอบ 1 กุมภาพันธ์ 66

ชนิดของปั้นจั่น : Mobile Crane ขนาด : 25 ตัน หมายเลขรถปั้นจั่น :

วันหมดอายุ 3 มีนาคม 66

รายละเอียด [Description] \ วันที่ [Date]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
1. สายสลิงคด,งอ,แตก	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
2. สภาพโรลเก็บสลิงและแถบหมุน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3. ระบบตัดรอกอัตโนมัติเมื่อเลือนตะขอไปชน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	—	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4. สัญญาณการยกนำหนักเกิน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
5. เครื่องแสดงนำหนัก	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
6. องศาการบอกมุม	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
7. ระบบล็อค,เบลค	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
8. คลิบล็อคตะขอครบ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
9. สภาพตะขอยกและลูกรอก	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
10. การสวิง,การล็อค,การเบรคของเครน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
11. ระบบไฟ สัญญาณเตือนสวิง,ยกนำหนักเกิน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
12. สภาพของขาเครน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
13. การรั่วซึมของระบบนำมันไฮโดรลิค	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
14. การตังเครน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
15. เพทรองขาเครน	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
16. สภาพยาง,ตีนตะขาบ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
17. การตรวจเช็คสภาพของระบบไอเสียและควันดำ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
18. ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ชื่อพนักงานขับรถ [Driver Name's]	นายอดิศักดิ์ มัชฌาแก้ว																														
ลายเซ็นต์ [Signature]	อดิศักดิ์ มัชฌาแก้ว																														
ผู้ควบคุมงาน [Superviser]	นายสรวิศ อมฤทธิ์																														

หมายเหตุ Remark :- ✓ = ดี, ใช้ได้ If Good ⓧ = ไม่ดี, แก้ไข, ชำรุด If Defective

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด

THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.

รายงานตรวจทดสอบปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) แบบ ปจ.1

TC1: CREDO D140 (5025)

โครงการก่อสร้าง ดีคอนโด พนา (DCondo Panaa)

ถ.เลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด



ตรวจทดสอบวันที่ 13 มีนาคม 2566

ตรวจทดสอบครั้งต่อไป 13 มิถุนายน 2566

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

๑. การทดสอบกรณี

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด .....ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด .....ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ ..... ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ..... ตัน

☑ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ .....

การทดสอบครั งล่าสุดเมื่อวันที่ .....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ .....

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☑ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528010381

ประกอบกิจการ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน .....

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย 4 ถนน สุขาภิบาล 5

แขวง/ตำบล ท่าแร้ง เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-119-5599

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน 1 เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ 1

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสร้าง ดีคอนโด พนา (DCondo Panaa)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

(๑) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

(๑) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☑ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง CREDO

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) .....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม .....

ยี่ห้อ CREDO

ประเทศ จีน ปีที่ผลิต ..... หมายเลขเครื่อง TC1

รุ่น D140(5025) ขนาดเครื่องต้นกำลัง 89.9 กิโลวัตต์ กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) ISO9001,CE ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี).....

ที่อยู่ .....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร .....

๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135556008271

ที่อยู่เลขที่ 80/382 ซอย คลองหลวง 26 ถนน .....

แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์/โทรสาร 02-162-0190

E-mail Aswan.prc@Gmail.com

ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน ..... ระดับ ..... หมดอายุวันที่ .....

และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ .....

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☑ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน 1716/63 หมดอายุวันที่ 14 ก.ค. 2567

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ 06010325650011

หมดอายุวันที่ 23 ก.พ. 2568 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ ไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ วศ.อัสวัน กูวิง

เลขทะเบียน ภก.47022 ระดับ ภาคีวิศวกร หมดอายุวันที่ 14 มิ.ย. 2569

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน [redacted]

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

๑) แบบปั้นจั่น ☑ ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)

☐ ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

๒) ขนาดพิกัดการยก

๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑

☐ ปั้นจั่นขาสูง ..... ตัน ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ..... ตัน

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..... ตัน

๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ☑ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด[๑]

สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

☑ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด .....2.5..... ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด .....4.0..... ตัน

☐ ที่มุมองศามากสุด ..... ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด ..... ตัน

☐ อื่นๆ ..... ตัน

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☑ มีโดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มีโดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล.....

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น[๒]

☐ มี(ระบุ) ..... ☑ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น[๓]

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๖) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง[๔]

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๑.๒) ระบบเชื่อเพลิง

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า

๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๒.๒) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตซ์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๓) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๓.๒) ระบบคลัตช์

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๓.๓) ระบบเบรก

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☑ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น[๕]

๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๑.๑) สภาพของท่อน ามันและข้อต่อ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๒) สวิตซ์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)[๖]

๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๓) การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 มม. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) เท่ากับ N/A อายุการใช้งาน N/A เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) .....

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

๑๗.๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ..... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) เท่ากับ ..... อายุการใช้งาน ..... เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) .....

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑)ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ เมตรต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๑) การจัดทำพื้นชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☐ เรียบร้อย ☑ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ....ใช้วิทยุสื่อสาร.....

๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ[๗]

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ .....ก้อนน้ำหนัก..... น้ำหนัก .....3.3..... ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, ตลับเมตร วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ..ตรวจพินิจด้วยสายตา.....

อื่นๆ ระบุ .....

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)

ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .....

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน าหนักยกอย่างปลอดภัย

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .....

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑ เท่า

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .....

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .....

๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด[๙]โดยไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☐ ตามวาระทุก ..... เดือน/ปี	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด[๘] แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☑ ตามวาระทุก .....3..... เดือน/ปี	☑ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..... ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย)

๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน าหนักยก (Load chart))

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน .....2.5..... ตัน ที่ระยะ .....50 เมตร.....
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน .....4.0..... ตัน ที่ระยะ .....4.1-40.3 เมตร.....
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..... ตัน ที่ระยะ .....
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..... ตัน ที่ระยะ .....

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....

.....

.....

.....

.....

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

1.สลิง Hoist แห้ง
2.สปายเวลล์ไม่หมุน
3.มีรอยสายไฟแตก

หมายเหตุ

๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

[๑]วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด

[๒]วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก

[๓]โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น

[๔]ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

[๕]ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

[๖]Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเลื่อนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด

[๗]น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์ - คาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตาการใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ

ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

[๘] กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน าหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน าหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร กำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิต กำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ ..... วันที่ .....

(.....)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ ๔ (๒)) ลงชื่อ .....[redacted]..... วันที่ 13 มีนาคม 2566

(.....[redacted]..)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ .....[redacted]..... วันที่ 13 มีนาคม 2566

(.....[redacted]...)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร


และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ


ลงชื่อ ..... วันที่ .....


(.....)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

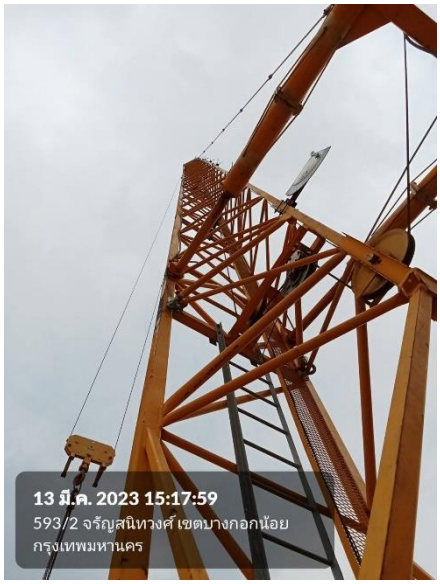

13 มี.ค. 2023 15:17:59
593/2 จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

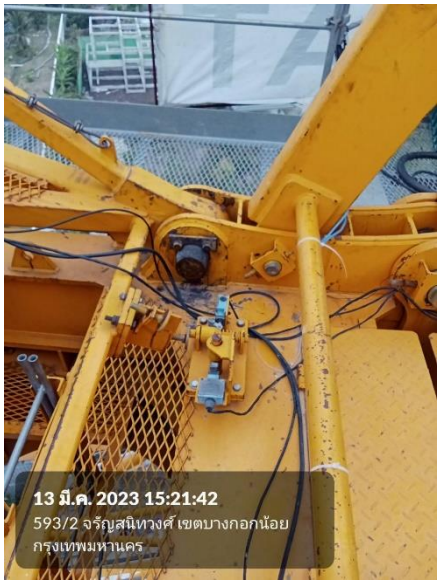
13 มี.ค. 2023 15:21:42
593/2 จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

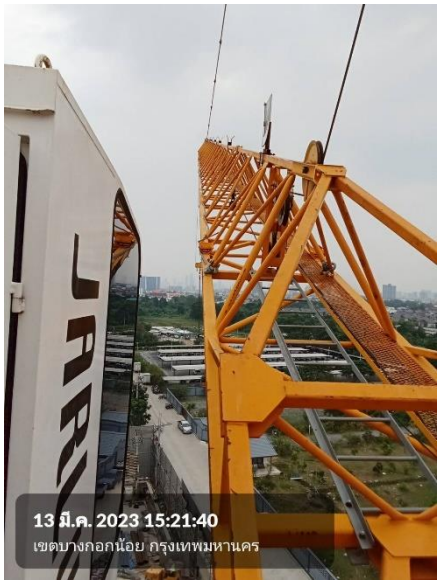
13 มี.ค. 2023 15:21:40
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


13 มี.ค. 2023 15:22:10
593/2 จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร


13 มี.ค. 2023 15:22:26
593/2 จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

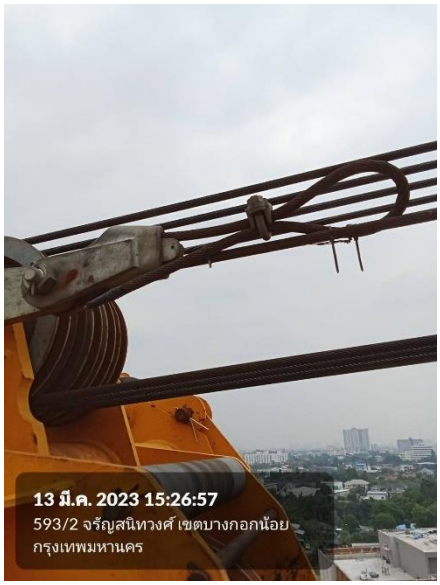
13 มี.ค. 2023 15:26:57
593/2 จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร


13 มี.ค. 2023 15:28:22
593/2 จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร


13 มี.ค. 2023 15:37:56
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


13 มี.ค. 2023 16:04:26
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด

THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.



[redacted]

ตรวจทดสอบวันที่ 13 มีนาคม 2566


สำเนาถูกต้อง

ใช้ประกอบเอกสารรายงานตรวจทดสอบปั้นจั่น (Tower Crane) แบบ ปจ.1

TC1: CREDO D140 (5025)

โครงการก่อสร้าง ดีคอนโด พนา (DCondo Panaa)

ถ.เลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

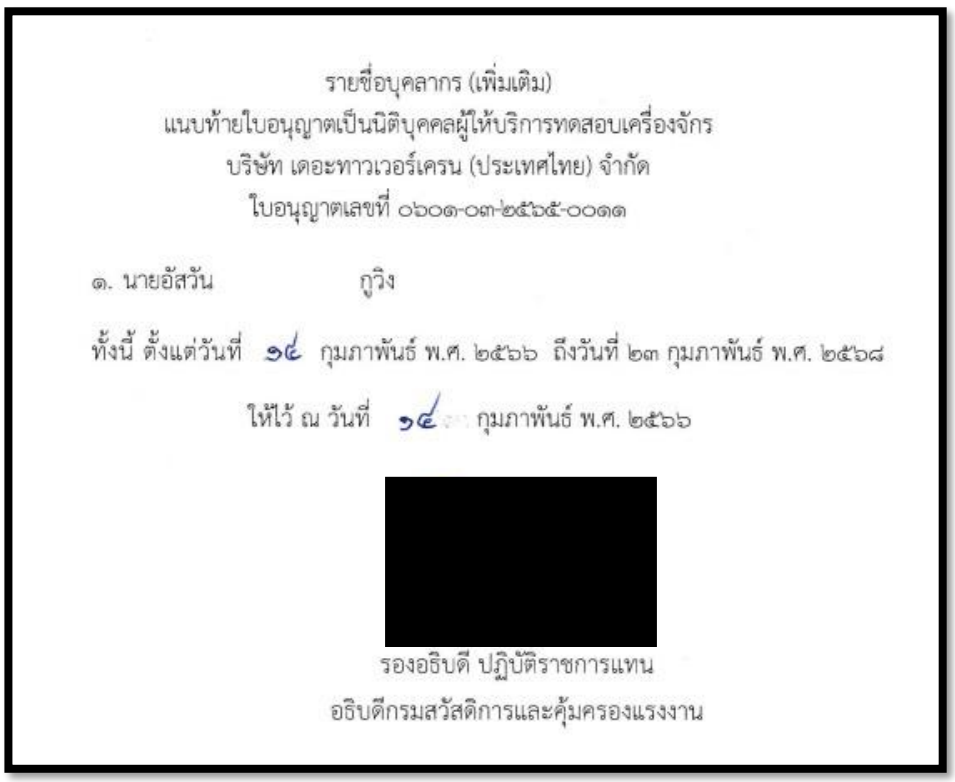

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)
แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร
บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๑


๑. นายอัสวัน กูวิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

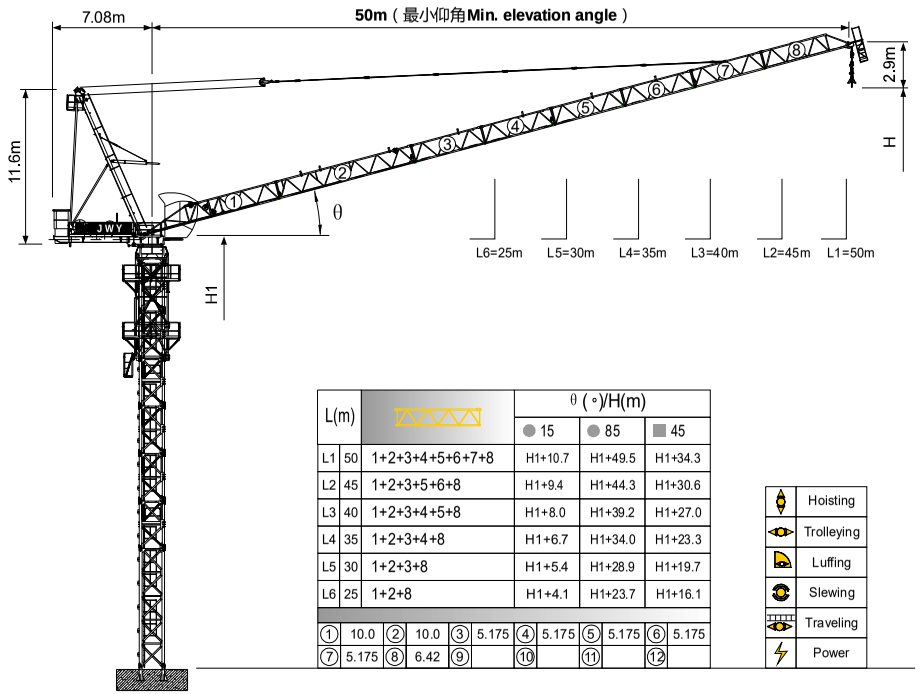


L(m)		θ(°)/H(m) 15	85	45
L1	50	1+2+3+4+5+6+7+8	H1+10.7	H1+49.5	H1+34.3
L2	45	1+2+3+5+6+8	H1+9.4	H1+44.3	H1+30.6
L3	40	1+2+3+4+5+8	H1+8.0	H1+39.2	H1+27.0
L4	35	1+2+3+4+8	H1+6.7	H1+34.0	H1+23.3
L5	30	1+2+3+8	H1+5.4	H1+28.9	H1+19.7
L6	25	1+2+8	H1+4.1	H1+23.7	H1+16.1

①	10.0	②	10.0	③	5.175	④	5.175	⑤	5.175	⑥	5.175
⑦	5.175	⑧	6.42	⑨		⑩		⑪		⑫	

Hoisting
Trolleying
Luffing
Slewing
Traveling
Power

臂根铰点高度 Jib root hinge height

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

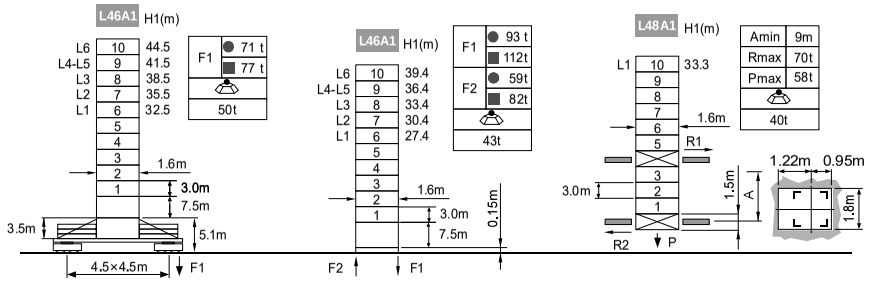

● 工作状态 In service F 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service


△ 自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(C_MAX)	C_MAX		m	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50
50m		4.1~40.3	4	t		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	**3.2**	2.9	**2.5**
		4.1~32.1	6	t		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.1	4.7	4.1	3.7	**3.2**	2.9	**2.5**
45m		3.7~41.9	4	t		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.4		
		3.7~33.0	6	t		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.4	4.9	4.3	3.9	3.4		
		3.7~27.3	8	t		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.9	6.3	5.4	4.9	4.3	3.9	3.4		
40m		3.2~40.0	4	t		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0				
		3.2~33.9	6	t		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	5.2	4.5				
		3.2~27.8	8	t		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.2	6.6	5.7	5.2	4.5				
35m		2.8~35.0	4	t		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0						
		2.8~35.0	6	t		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7						
		2.8~28.6	8	t		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.2	6.6	5.7						
30m		2.3~30.0	4	t		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0								
		2.3~30.0	6	t		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0								
		2.3~29.4	8	t		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.2								
25m		1.9~25.0	4	t		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0										
		1.9~25.0	6	t		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0										
		1.9~25.0	8	t		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0										

附着 Anchorages

L46A1 塔身高度 Tower body height

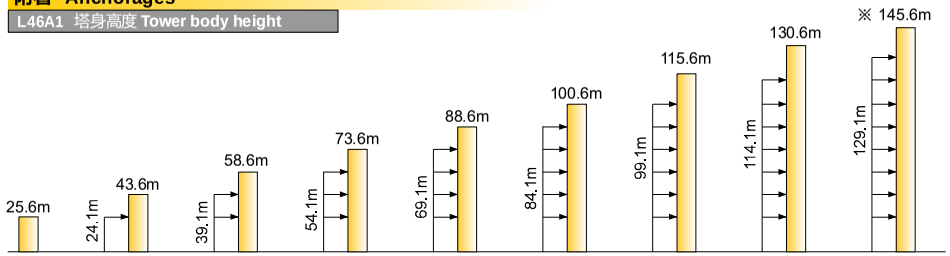

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	50LVF20		m/min	0~44	0~66	37kW
			t	4	2	
			m/min	0~29	0~44	
			t	6	3	
			m/min	0~22	0~33	
			t	8	4	
	60LVF20 △		m/min	0~59	0~88	45kW
			t	4	2	
			m/min	0~39	0~58	
			t	6	3	
			m/min	0~30	0~44	
			t	8	4	
	50VVF30	m/min	3min10s			30kW
	RCV95	rpm	0~0.6			2×5.5kW
	RT324	m/min	0~25			2×5.2kW
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)		50LVF20:110kVA 60LVF20:120kVA			kVA

	440m
	>440m※
	720m
	>720m※

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option

เอกสารแนบ 2-2
รายงานสำรวจบ้านติด

VISAVAPAT

วันที่...09.../.....ส.ค...../.. 2565....

เรื่อง ขออนุญาต เข้าสำรวจพื้นที่บ้าน ขณะดำเนินการก่อสร้าง โครงการ D condo Panaa
เรียน ดี คอนโด ธาร
จาก บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด

ตามที่ทาง บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างชุดพักอาศัย โครงการ D Condo Panaa ทางโครงการฯ ใคร่ขออนุญาตให้เข้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ตัวอาคารที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับตัวแทน บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อยืนยันสภาพตัวอาคารขณะก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

[redacted]

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด

ข้าพเจ้า .....

☑ อนุญาตให้เข้าสำรวจ
☐ ไม่อนุญาตให้เข้าสำรวจ เนื่องจาก.....

[redacted]

ลงนาม..... เจ้าของบ้าน/ผู้ดูแล
วันที่ ...9../..8.../..65...

VISAVAPAT

บันทึกก่อน-หลังงานก่อสร้าง

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง

☑ ก่อนเริ่มงาน ☐ กำลังก่อสร้าง ☐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ D Condo Panaa

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ดีคอนโด ธาร 699 ซอยเอราวัณ, ถนน เลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวง บางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

ตามที่ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนั้น บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

เบอร์โทรติดต่อ

คุณสมปอง ผู้ช่วยผู้จัดการ โครงการ [redacted]
คุณสุณีย์ จป.วิชาชีพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

รับทราบ

[redacted]

ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

[redacted] โทร.....

[redacted]

ตัวแทน บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

VISAVAPAT

เข้าสำรวจพื้นที่ โครงการ ดี คอนโด ธาร

ก่อนการก่อสร้างโครงการ D Condo Panaa


1. รั้ว ภายในโครงการ





หมายเหตุ : มีรอยราวบริเวณขอบบนกำแพง

VISAVAPAT

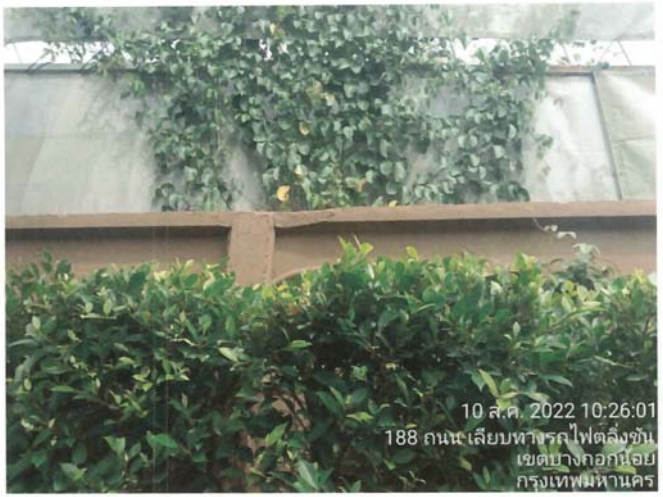

หมายเหตุ : มีรอยราวบริเวณขอบบนกำแพง



หมายเหตุ : มีรอยราวบริเวณขอบบนกำแพง

VISAVAPAT

2. รั้วด้านนอก โครงการ



หมายเหตุ : มีรอยราวบริเวณแผ่นกำแพง



หมายเหตุ : มีรอยราวบริเวณแผ่นกำแพง

VISAVAPAT



หมายเหตุ : มีรอยราวบริเวณแผ่นกำแพง



หมายเหตุ : กำแพงเอียงเข้าด้านในโครงการ ดี คอนโด ธาร

VISAVAPAT



หมายเหตุ : กำแพงเอียงเข้าด้านในโครงการ ดี คอนโด ธาร



หมายเหตุ : ฐานกำแพงมีรอยร้าว

VISAVAPAT

3. ตัวอาคาร ฝั่งที่ติดกับ D Condo Panaa



หมายเหตุ : ตัวอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ตัวอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ



หมายเหตุ : มุมอาคารชำรุดแตกร้าว

VISAVAPAT



หมายเหตุ : มุมอาคารชำรุดแตกร้าว



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ

VISAVAPAT



หมายเหตุ : ผนังอาคารปกติ พื้นแผ่นทางเดินไม่เรียบเสมอกัน

VISAVAPAT

4. ถนนฝั่งที่ติดกับ โครงการ D Condo Panaa





หมายเหตุ : พื้นลานจอดมีรอยแตกร้าว อาคารที่ติดกับโครงการ D Condo Panaa

VISAVAPAT



หมายเหตุ : พื้นมีรอยแตกร้าว อาคารฝั่งที่ติดกับโครงการ D Condo Panaa



หมายเหตุ : พื้นลานจอดแยกตัวไม่เสมอกัน

VISAVAPAT



หมายเหตุ : พื้นลานจอดมีรอยแตกร้าว มีการซ่อมแซม

VISAVAPAT



หมายเหตุ : พื้นลานจอดมีรอยแตกร้าว มีการซ่อมแซม



หมายเหตุ : พื้นลานจอดมีรอยแตกร้าว มีการซ่อมแซม

VISAVAPAT



หมายเหตุ : พื้นถนนเรียบปกติ



หมายเหตุ : พื้นถนนเรียบปกติ

VISAVAPAT

5. ผู้ร่วมกิจกรรมเดินสำรวจพื้นที่โครงการ

- ตัวแทน บริษัท วิสวภัทร จำกัด ,ตัวแทน บริษัท วิระยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นิติ คีคอน โด ธาร





VISAVAPAT





VISAVAPAT







6. ด้านในอาคาร



หมายเหตุ : มีร้อยร้าย ที่ชั้น 3 บริเวณตู้ไฟ

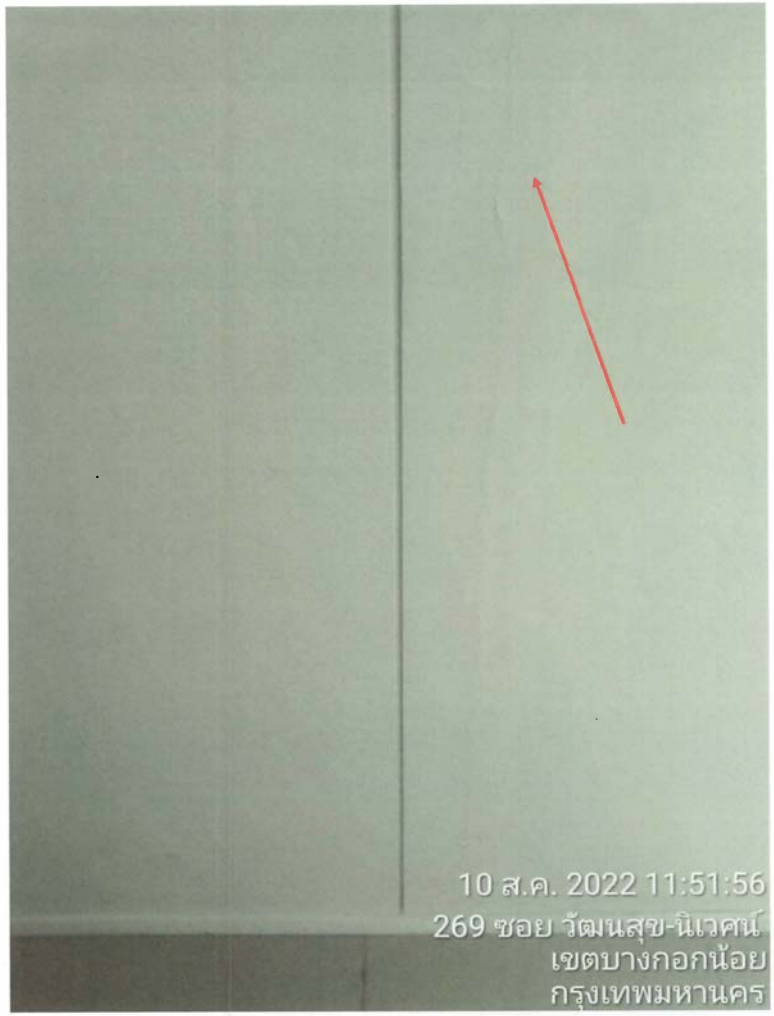

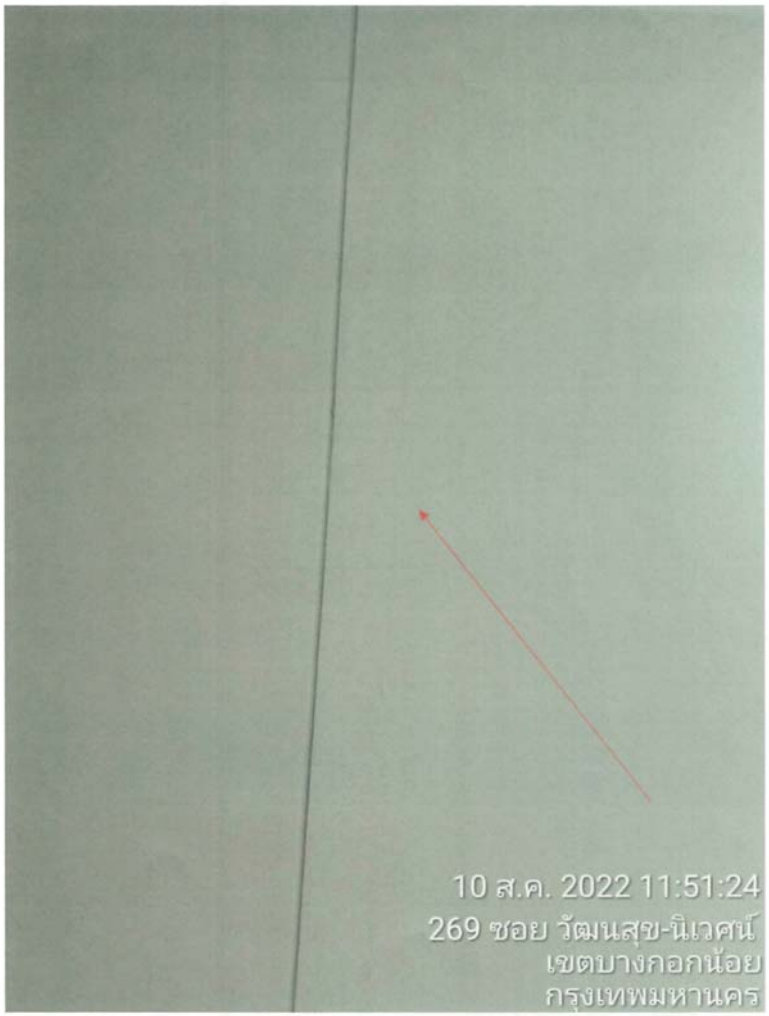

หมายเหตุ : มีรอยร้าวเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างแผ่น Precast ตลอดทั้งแนวตั้งแต่ชั้น 1-8

VISAVAPAT

บันทึกก่อน-หลังการก่อสร้าง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง

☑ ก่อนเริ่มงาน ☐ กำลังก่อสร้าง ☐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ D Condo Panaa

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร [redacted] ถนน เลียบทางรถไฟคลิ่งชัน แขวง บางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ตามที่ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้(ตามเอกสารแนบ)

[redacted]


ทั้งนี้ บริษัท วิศวภัทร จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน-หลังการสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

สำรวจ ดี คอนโด ธาร เลขที่ [redacted]

รายละเอียดการเข้าสำรวจดังนี้



หมายเหตุ : มีรอยร้าวบริเวณขอบประตูระหว่างห้องครัว-ห้องน้ำ

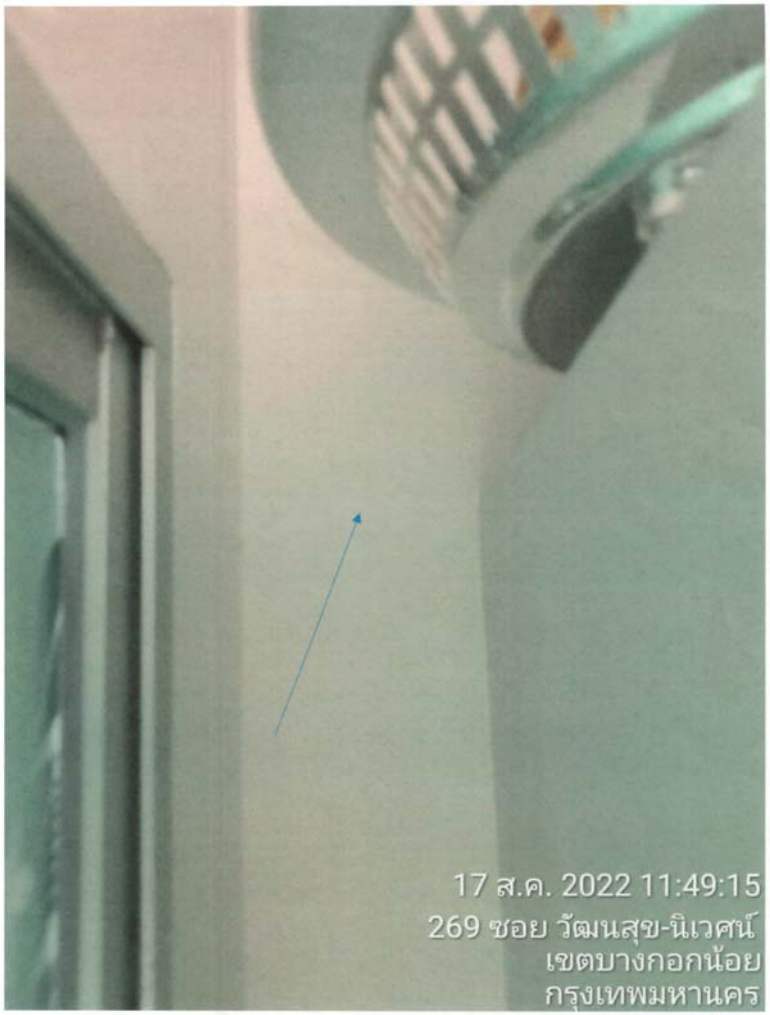

หมายเหตุ : มีรอยร้าวผนังห้องครัวตรงช่องระหว่างผนัง-ตู้เก็บของห้องครัว

VISAVAPAT

บันทึกก่อน-หลังก่อสร้าง

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง

☑ ก่อนเริ่มงาน ☐ กำลังก่อสร้าง ☐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ ....D Condo Panga

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร [redacted] ดี คอนโด ธาร

ตามที่ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

[redacted]

VISAVAPAT


บันทึกการเข้าสำรวจก่อนก่อสร้าง

ห้องชุด โครงการ ดีคอนโด ธาร [redacted]



หมายเหตุ : รอยร้าวบริเวณมุมห้องฝั่งประตูทางเข้าห้อง

VISAVAPAT

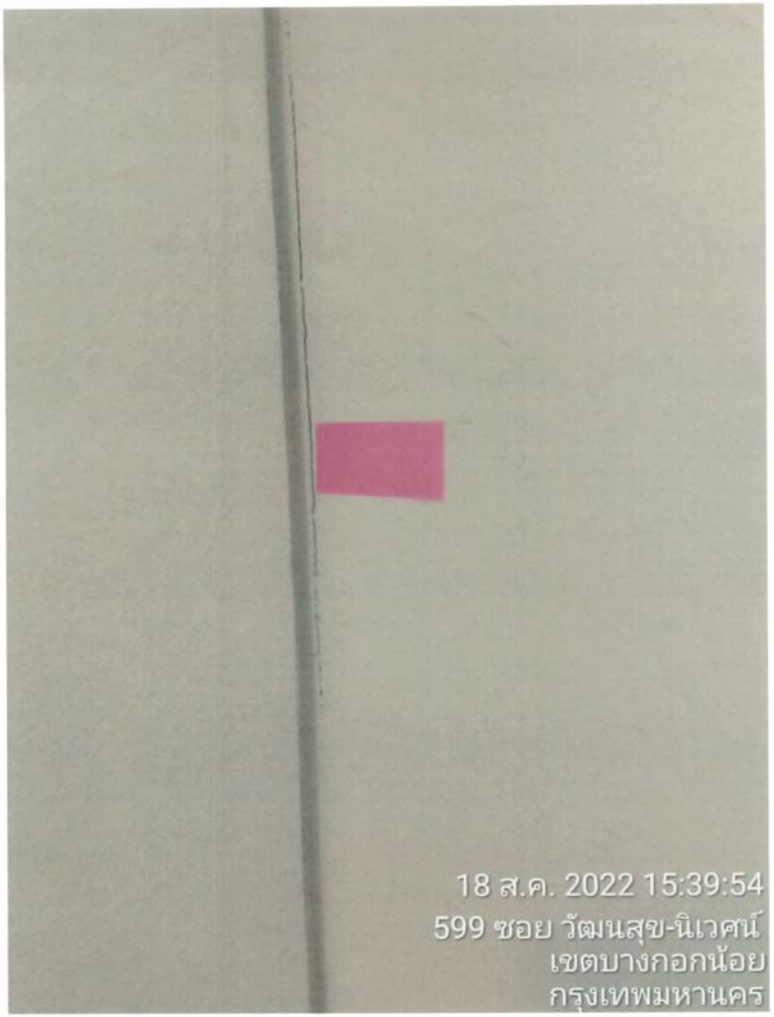

หมายเหตุ : รอยร้าวผนังมุมห้องฝั่งประตูทางเข้าห้อง

VISAVAPAT




หมายเหตุ : รอยร้าวขอบหน้าต่าง



หมายเหตุ : รอยร้าวขอบหน้าต่าง

VISAVAPAT

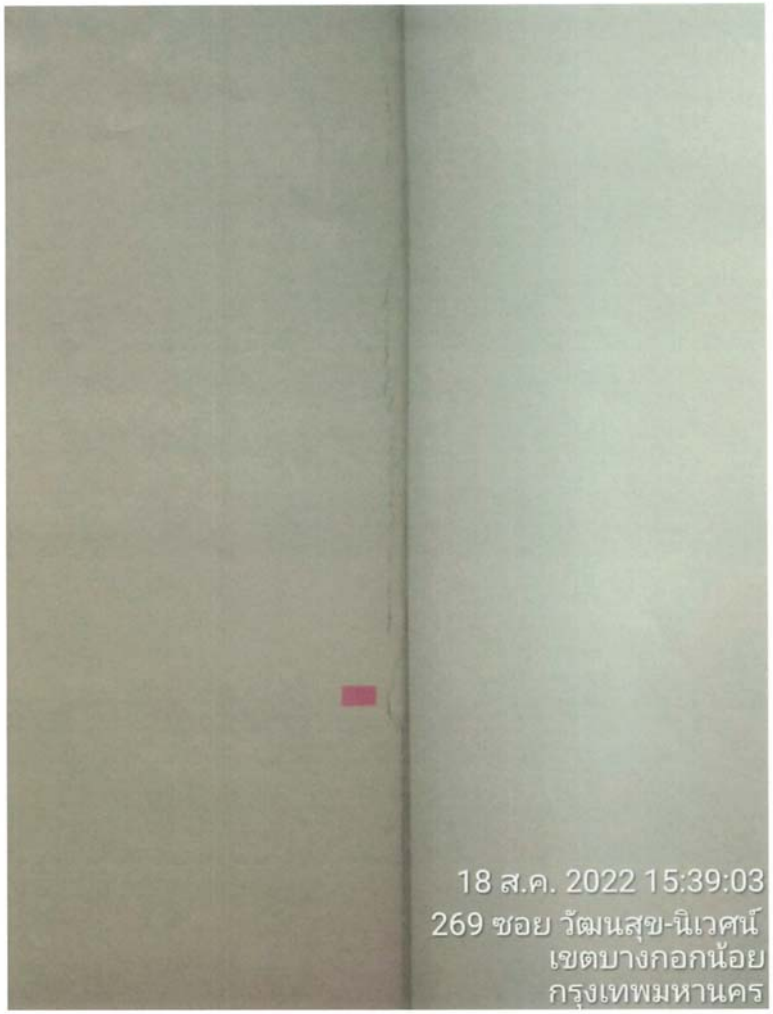

หมายเหตุ : รอยร้าวผนังมุมห้อง

VISAVAPAT

บันทึกก่อน-หลังก่อสร้าง

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง

☑ ก่อนเริ่มงาน ☐ กำลังก่อสร้าง ☐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ D Condo Panaa

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร [redacted] ดี คอนโด ธาร

ตามที่ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ขอ ส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น


จึงเรียนมาเพื่อทราบ รับทราบ

[redacted]

VISAVAPAT


เข้าสำรวจก่อนก่อสร้างโครงการ **D Condo Panaa**

ห้องเลขที่ [redacted]

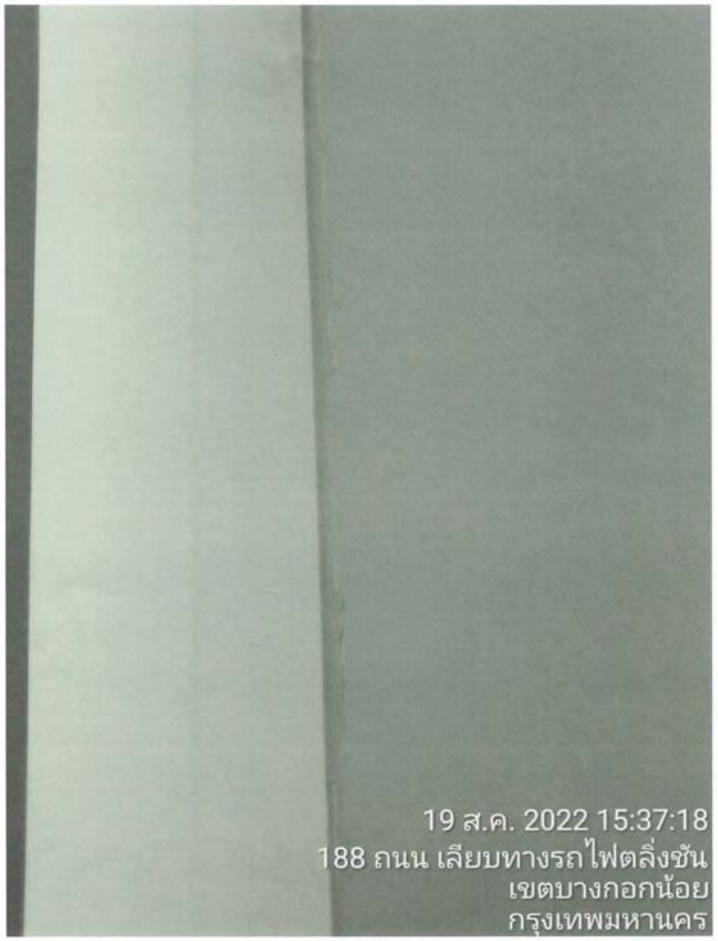

หมายเหตุ : มีรอยร้าวบริเวณมุมห้อง

VISAVAPAT

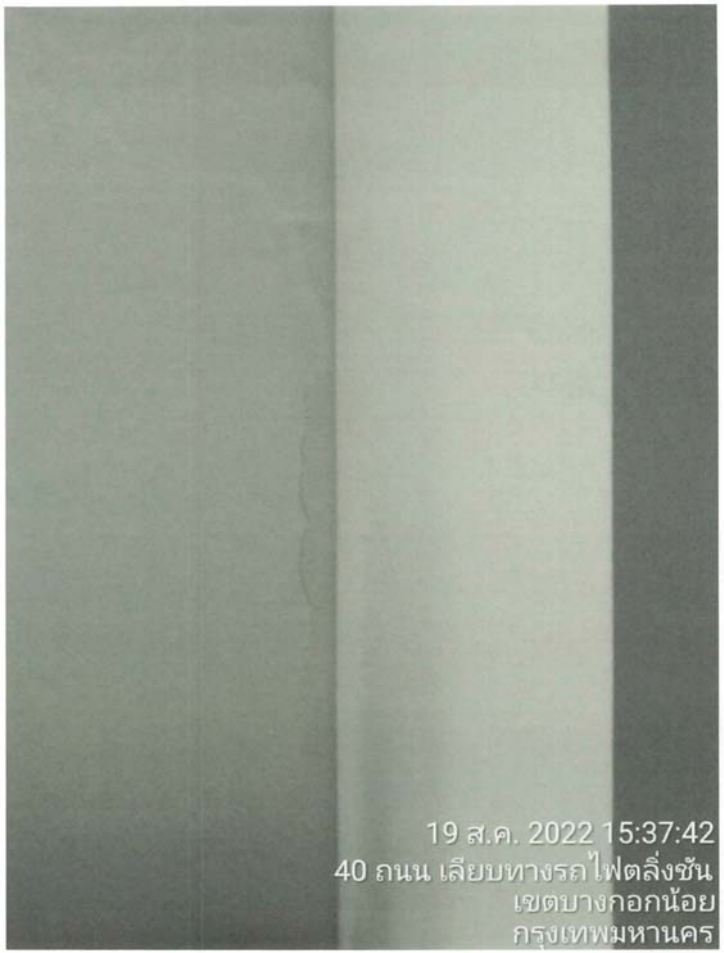

หมายเหตุ : มีรอยร้าวบริเวณมุมห้อง

VISAVAPAT

บันทึกก่อน-หลังก่อสร้าง

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง

☑ ก่อนเริ่มงาน ☐ กำลังก่อสร้าง ☐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ D Condo Panaa

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร [redacted] ดี คอนโด ธาร

ตามที่ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ขอ ส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ รับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการโครงการ ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ ..... โทร.....

VISAVAPAT

เข้าสำรวจก่อนก่อสร้างโครงการ **D Condo Panaa**

[redacted]



หมายเหตุ : มีรอยร้าวและมีการซ่อมแซมบริเวรขอบฝ้าและผนังมุมห้อง



หมายเหตุ : มีรอยน้ำฝนสาดเข้ามาด้านในผนังห้องบริเวณขอบหน้าต่างและรอยร้าวมุมขอบหน้าต่าง

VISAVAPAT



หมายเหตุ : มีรอยน้ำฝนสาดเข้ามาด้านในผนังห้องบริเวณขอบหน้าต่าง



หมายเหตุ : มีรอยราวบริเวณมุมห้อง

VISAVAPAT

บันทึกก่อน-หลังก่อสร้าง

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง

☑ ก่อนเริ่มงาน ☐ กำลังก่อสร้าง ☐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ D Condo Panaa

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร [redacted].....

ตามที่ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ขอส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้(ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้น บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ รับทราบ


[redacted]

วันที่ ..... โทร.....


เข้าสำรวจ ข้างเคียง [redacted]




หมายเหตุ : มีรอยร้าวที่คาน

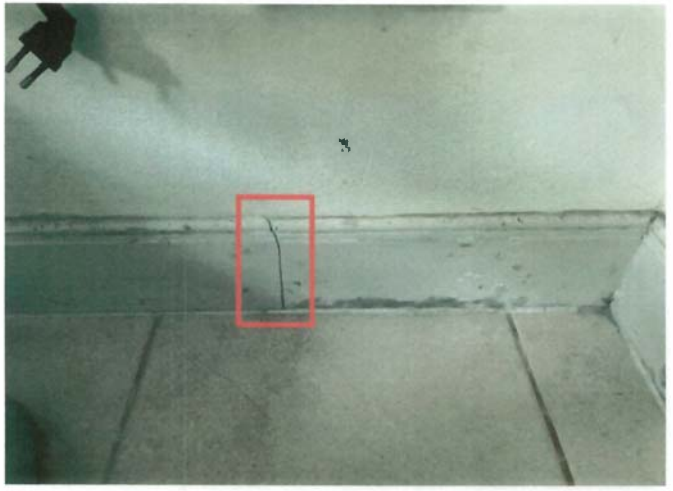

หมายเหตุ : มีรอยร้าว

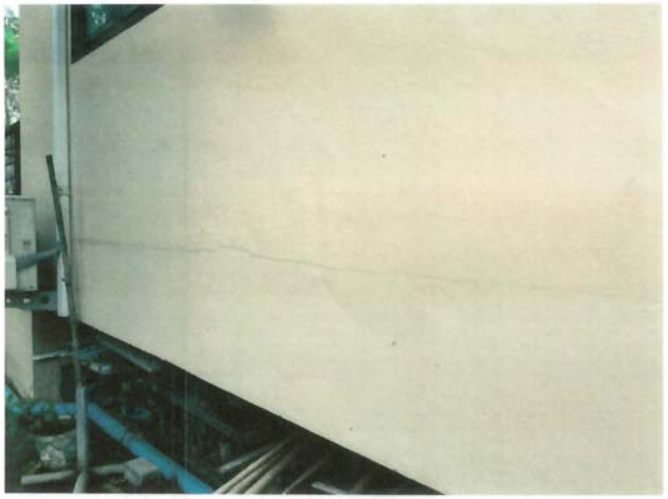

หมายเหตุ : มีรอยร้าวที่ผนังด้านนอก

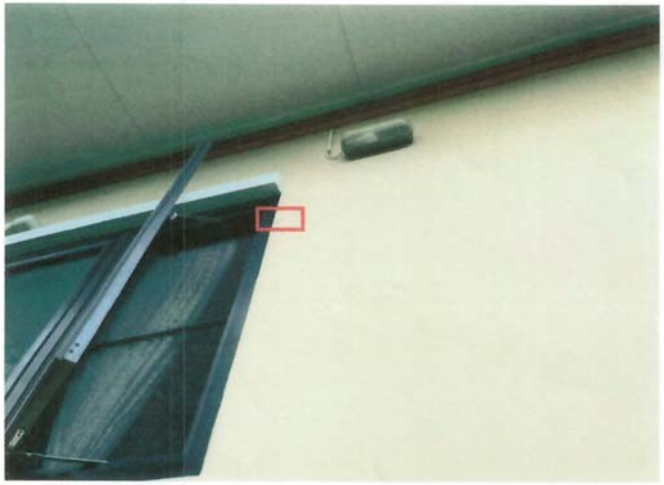

หมายเหตุ : มีรอยร้าวที่ขอบหน้าต่าง

ภาพรวมการเข้าสำรวจ





เอกสารแนบ 2-3
บันทึกเรื่องร้องเรียน

VISAVAPAT

มวลชนสัมพันธ์ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

เรื่องร้องเรียน เดือน มีนาคม 2566

บ้านเลขที่	ชื่อ-สกุล	ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ	แนวทางแก้ไข
		ร้องเรียนเรื่องการทำงานเกินเวลา มีเสียงดังเสียบงทุบ เสียงเจียเหล็ก ในวันที่ 15/03/2566	เนื่องจากมีแรงงานกระเบื้องย้ายงานมาจากหน่วยงานอื่นและเข้าใจเรื่องเวลาการทำงานผิด ทั้งนี้ทางหน่วยงาน ดี คอนโด พนา ได้ทำการส่งย้ายแรงงานชุดนี้ไปหน่วยงานอื่นเป็นที่เรียบร้อย
[redacted]			

บ้านเลขที่	ชื่อ-สกุล	ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ	แนวทางแก้ไข
[redacted]			เนื่องจากมีแรงงานกระเบื้องย้ายงานมาจากหน่วยงานอื่นและเข้าใจเรื่องเวลาการทำงานผิด ทั้งนี้ทางหน่วยงาน ดี คอนโด พนา ได้ทำการส่งย้ายแรงงานชุดนี้ไปหน่วยงานอื่นเป็นที่เรียบร้อย

เอกสารแนบ 2-4
บันทึกประวัติคนงาน

VISAVAPAT

ชุด ผรม. บริษัท พุทธรักษา โปรดักชั่น จำกัด / รหัส 02-P333 ช่าง


ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ/นามสกุล	รหัส สแกนนิ้ว	ตำแหน่ง	สัญชาติ	เลขพาสปอร์ต
1	[redacted]					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

หมายเหตุ : ผู้ติดตาม 3

VISAVAPAT

ชุด ผรม.บจก.ธนแสน พรีคาสท์ รหัส 02-T186 ห

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ/นามสกุล	รหัส สแกนนิ้ว	ตำแหน่ง	สัญชาติ	เลขพาส
1	[redacted]					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

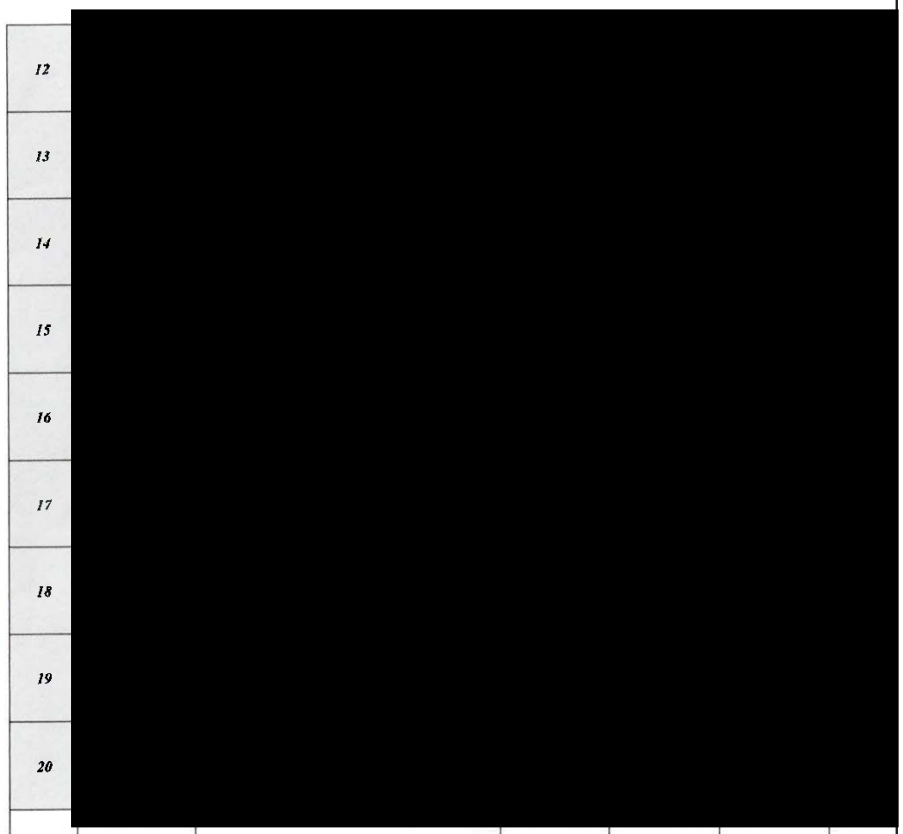
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เอกสารแนบ 2-5
ใบเสร็จค่าการขึ้นทะเบียนแรงงาน

เลขที่ 26589/66

ใบเสร็จรับเงิน

กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน

ที่ทำการ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
วันที่ 05-10-2565
เลขที่ใบชำระเงิน 1000219112

เลขที่อ้างอิงคนต่างด้าว [redacted]
ได้รับเงินจาก MR. MENG CHRONG (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565)
สัญชาติ CAMBODIA เลขประจำตัวนายจ้าง [redacted]
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท	100.00
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน อายุไม่เกิน 1 ปี	900.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00

กรมการจัดหางาน

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ส่วนที่ 1 - สำหรับแสดงเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

[redacted]

คำเตือน 1. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพ

ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หรือทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ เมื่อคนต่างด้าวหรือนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวตามแต่ละกรณีแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือหลักฐานการทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย (กรณีที่ยังไม่เกิดสิทธิประกันสังคม)

2. การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

1) ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2) เมื่อจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อ 1) แล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของคนต่างด้าว ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูล : ชาญกิจ บุญเงิน วันที่บันทึก/แก้ไขข้อมูล : 5 ตุลาคม 2565

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันที่พิมพ์ : 2022-11-15 12:21:42

ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (บต.50)

[redacted]

หมายเหตุ

1) ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวคู่กับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน
2) การดำเนินการหลังจากได้รับใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว
(1) ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม หรือทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แล้วแต่กรณี ดังนี้
กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในระหว่างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อคนต่างด้าวหรือนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวตามแต่ละกรณีแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนประกันสังคมพร้อมด้วยประกันสุขภาพฯ ของคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานและออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวมีสิทธิทำงานได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
(2) ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
1. การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2. การตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้ นายจ้างต้องยื่นหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อ 1 และใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
3) เมื่อดำเนินการตามข้อ 2) แล้ว ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปยื่นคำร้องขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และขอรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูล : ชาญกิจ บุญเงิน วันที่บันทึก/แก้ไขข้อมูล : 5 ตุลาคม 2565

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันที่พิมพ์ : 2022-11-15 12:21:34

PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PCL

ศูนย์สินไหมทดแทน TPA
โทร: 02-4947004

A member of the Pacific Cross Group of Companies

ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE OF INSURANCE

รหัสบริษัท PCHI Company Code	กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม เฮลท์ พลัส Group Health & Accident Insurance Health Plus Policy	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. 00012-G-HPM-22-02 ใบรับรองเลขที่ Certificate No 000358-000-074196900-20221012

1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Policy Holder : Name and Address
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน .
40/22 ซอยคู้บอน 13 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2. ผู้เอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ MR. MENG CHRONG . เลขประจำตัวประชาชน : ID No. 2022100604537
The Insured : Name and Address อาชีพ : Occupation - อายุ : Age 22

3. ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ชื่อและที่อยู่ MR. MENG CHRONG . ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย : The Insured
The Covered Person : Name and Address Relationship to the Insured

4. ผู้รับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ ทายาทตามกฎหมาย ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย : ทายาทตามกฎหมาย
The Beneficiary : Name and Address Relationship to the Insured

5. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 12/10/2022 เวลา น. สิ้นสุดวันที่ 12/02/2023 เวลา 16:30 น.
Period of Insurance : From at hrs. To at 16:30 hrs.

6. จำนวนจำกัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะผลของการเกิดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทางร่างกายในอันที่มีจำนวนเงินผลประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น
Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury or sickness for which a sum insured is stated.

ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย Insuring Agreement / Endorsement	จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) Benefit Amount (Baht)	ความรับผิดส่วนแรก (บาท) Deductible (Baht)
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน)	150,000	
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (ต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง)	1,000	ไม่มี
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และการชันสูตร หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)	50,000	
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	150,000	

เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	986.00 บาท Baht	อากรแสตมป์ Stamp Duty	4.00 บาท Baht	ภาษี Tax	- บาท Baht	เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium	990.00 บาท Baht

☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย : Agent
■ นายหน้าประกันวินาศภัย : Broker TSN INSURANCE BROKER CO., LTD. ใบอนุญาตเลขที่ : License No. ว00029/2564
☐ ประกันภัยตรง : Direct

วันทำสัญญาประกันภัย : Agreement made on 12/10/2022 วันออกกรมธรรม์ประกันภัย : Policy issued on 14/10/2022

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัท โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

[redacted]

กรรมการ Director กรรมการ Director ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

Verify Certificate

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 21
ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Pacific Cross Health Insurance PCL
152 Chartered Square Building 21st Floor,
Room 21-01, North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel: +662 401 9189
Fax: +662 401 9187
www.PacificCrossHealth.com

เลขที่ 119169/66

ใบเสร็จรับเงิน

กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน

ที่ทำการ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
วันที่ 15-10-2565
เลขที่ใบชำระเงิน 1000240086

เลขที่อ้างอิงคนต่างด้าว [redacted]
ได้รับเงินจาก MISS. PHUPAE INTHAWONGSA (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565)
สัญชาติ LAOS เลขประจำตัวนายจ้าง [redacted]
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท	100.00
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน อายุไม่เกิน 1 ปี	900.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00

กรมการจัดหางาน

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ส่วนที่ 1 - สำหรับแสดงเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

[redacted]

คำแนะนำ 1. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพ

ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หรือทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ เมื่อคนต่างด้าวหรือนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวตามแต่ละกรณีแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือหลักฐานการทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย (กรณีที่ยังไม่เกิดสิทธิประกันสังคม)

2. การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

1) ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2) เมื่อจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อ 1) แล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของคนต่างด้าว ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูล : ชาญกิจ บุญเงิน วันที่บันทึก/แก้ไขข้อมูล : 15 ตุลาคม 2565

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันที่พิมพ์ : 2022-11-15 12:19:41

ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (บต.50)

[redacted]

หมายเหตุ

1) ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวคู่กับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน
2) การดำเนินการหลังจากได้รับใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว
   (1) ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม หรือทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แล้วแต่กรณี ดังนี้
   กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
   กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในระหว่างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
   เมื่อคนต่างด้าวหรือนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวตามแต่ละกรณีแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนประกันสังคมพร้อมด้วยประกันสุขภาพฯ ของคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานและออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวมีสิทธิทำงานได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
   (2) ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
      1. การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
      2. การตรวจสุขภาพ
   ทั้งนี้ นายจ้างต้องยื่นหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อ 1 และใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
3) เมื่อดำเนินการตามข้อ 2) แล้ว ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปยื่นคำร้องขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และขอรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูล : ชาญกิจ บุญเงิน วันที่บันทึก/แก้ไขข้อมูล : 15 ตุลาคม 2565

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันที่พิมพ์ : 2022-11-15 12:19:32

PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PCL

ศูนย์สินไหมทดแทน TPA
โทร: 02-4947004

A member of the Pacific Cross Group of Companies

ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE OF INSURANCE

รหัสบริษัท PCHI Company Code	กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม เฮลท์ พลัส Group Health & Accident Insurance Health Plus Policy	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. 00012-G-HPM-22-02 ใบรับรองเลขที่ Certificate No 000376-000-084031900-20221015

1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Policy Holder : Name and Address
   กลุ่มผู้ใช้แรงงาน .
   40/22 ซอยคู้บอน 13 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2. ผู้เอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ MISS PHUPAE INTHAWONGSA . | เลขประจำตัวประชาชน : ID No. 2022200240032
   The Insured : Name and Address | อาชีพ : Occupation - อายุ : Age 19

3. ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ชื่อและที่อยู่ MISS PHUPAE INTHAWONGSA . | ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย : The Insured
   The Covered Person : Name and Address | Relationship to the Insured

4. ผู้รับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ ทายาทตามกฎหมาย | ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย : ทายาทตามกฎหมาย
   The Beneficiary : Name and Address | Relationship to the Insured

5. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 15/10/2022 เวลา น. สิ้นสุดวันที่ 15/02/2023 เวลา 16:30 น.
   Period of Insurance : From at hrs. To at 16:30 hrs.

6. จำนวนจำกัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะผลของการเกดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทางร่างกายในธอที่มีจำนวนเงินผลประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น
   Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury or sickness for which a sum insured is stated.

ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย Insuring Agreement / Endorsement	จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) Benefit Amount (Baht)	ความรับผิดส่วนแรก (บาท) Deductible (Baht)
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน)	150,000	
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (ต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง)	1,000	ไม่มี
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และการชันที่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)	50,000	
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	150,000	

เบี้ยประกันภัยสุทธิ		อากรแสตมป์		ภาษี		เบี้ยประกันภัยรวม	
Net Premium	986.00 Baht	Stamp Duty	4.00 Baht	Tax	- Baht	Total Premium	990.00 Baht

☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย : Agent
■ นายหน้าประกันวินาศภัย : Broker TSN INSURANCE BROKER CO., LTD. ใบอนุญาตเลขที่ : License No. ว00029/2564
☐ ประกันภัยตรง : Direct

วันทำสัญญาประกันภัย : Agreement made on 15/10/2022 วันออกกรมธรรม์ประกันภัย : Policy issued on 17/10/2022

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัท โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

[redacted]

กรรมการ Director กรรมการ Director ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

Verify Certificate

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 21
ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Pacific Cross Health Insurance PCL
152 Chartered Square Building 21st Floor,
Room 21-01, North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel: +662 401 9189
Fax: +662 401 9187
www.PacificCrossHealth.com

เลขที่ 48774/66

ใบเสร็จรับเงิน

กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน

ที่ทำการ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
วันที่ 08-10-2565
เลขที่ใบชำระเงิน 1000222488

เลขที่อ้างอิงคนต่างด้าว [redacted]
ได้รับเงินจาก MR. NAY LIN TUN (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565)
สัญชาติ MYANMAR เลขประจำตัวนายจ้าง [redacted]
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท	100.00
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน อายุไม่เกิน 1 ปี	900.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00

กรมการจัดหางาน

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ส่วนที่ 1 - สำหรับแสดงเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

[redacted]

คำเตือน 1. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพ

ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หรือทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ เมื่อคนต่างด้าวหรือนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวตามแต่ละกรณีแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือหลักฐานการทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย (กรณีที่ยังไม่เกิดสิทธิประกันสังคม)

2. การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

1) ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2) เมื่อจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อ 1) แล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของคนต่างด้าว ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูล : ชาญกิจ บุญเงิน วันที่บันทึก/แก้ไขข้อมูล : 8 ตุลาคม 2565

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันที่พิมพ์ : 2022-11-15 13:20:53

ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (บต.50)

[redacted]

หมายเหตุ

1) ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวคู่กับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน
2) การดำเนินการหลังจากได้รับใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว
   (1) ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม หรือทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แล้วแต่กรณี ดังนี้
   กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
   กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในระหว่างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
   เมื่อคนต่างด้าวหรือนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวตามแต่ละกรณีแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนประกันสังคมพร้อมด้วยประกันสุขภาพฯ ของคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานและออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวมีสิทธิทำงานได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
   (2) ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
      1. การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
      2. การตรวจสุขภาพ
   ทั้งนี้ นายจ้างต้องยื่นหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อ 1 และใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
3) เมื่อดำเนินการตามข้อ 2) แล้ว ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปยื่นคำร้องขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และขอรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูล : ชาญกิจ บุญเงิน วันที่บันทึก/แก้ไขข้อมูล : 8 ตุลาคม 2565

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันที่พิมพ์ : 2022-11-15 13:20:47

PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PCL

ศูนย์สินไหมทดแทน TPA
โทร: 02-4947004

A member of the Pacific Cross Group of Companies

ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE OF INSURANCE

รหัสบริษัท PCHI Company Code	กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม เฮลท์ พลัส Group Health & Accident Insurance Health Plus Policy	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. 00012-G-HPM-22-02 ใบรับรองเลขที่ Certificate No 000376-000-084151500-20221015

1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Policy Holder : Name and Address
   กลุ่มผู้ใช้แรงงาน .
   40/22 ซอยคู้บอน 13 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2. ผู้เอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ MR. NAY LIN TUN . | เลขประจำตัวประชาชน : ID No. 2022304868006
   The Insured : Name and Address | อาชีพ : Occupation - อายุ : Age 21

3. ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ชื่อและที่อยู่ MR. NAY LIN TUN . | ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย : The Insured
   The Covered Person : Name and Address | Relationship to the Insured

4. ผู้รับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ ทายาทตามกฎหมาย | ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย : ทายาทตามกฎหมาย
   The Beneficiary : Name and Address | Relationship to the Insured

5. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 15/10/2022 เวลา น. สิ้นสุดวันที่ 15/02/2023 เวลา 16:30 น.
   Period of Insurance : From at hrs. To at 16:30 hrs.

6. จำนวนจำกัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะผลของการเกดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทางร่างกายในธอที่มีจำนวนเงินผลประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น
   Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury or sickness for which a sum insured is stated.

ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย Insuring Agreement / Endorsement	จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) Benefit Amount (Baht)	ความรับผิดส่วนแรก (บาท) Deductible (Baht)
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน)	150,000	
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (ต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง)	1,000	ไม่มี
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และการชันสูตร หรือโดยสารธจักรยานยนต์)	50,000	
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	150,000	

เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	986.00 บาท Baht	อากรแสตมป์ Stamp Duty	4.00 บาท Baht	ภาษี Tax	- บาท Baht	เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium	990.00 บาท Baht

☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย : Agent
■ นายหน้าประกันวินาศภัย : Broker TSN INSURANCE BROKER CO., LTD. ใบอนุญาตเลขที่ : License No. ว00029/2564
☐ ประกันภัยตรง : Direct

วันทำสัญญาประกันภัย : Agreement made on 15/10/2022 วันออกกรมธรรม์ประกันภัย : Policy issued on 17/10/2022

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัท โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

[redacted]

Verify Certificate

กรรมการ Director กรรมการ Director ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 21
ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Pacific Cross Health Insurance PCL
152 Chartered Square Building 21st Floor,
Room 21-01, North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500

Tel: +662 401 9189
Fax: +662 401 9187
www.PacificCrossHealth.com

เอกสารแนบ 2-7
ใบเสร็จค่าเก็บขนขยะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

5 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160

ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่

บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม

Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 061 **บิลเครื่องจักร / ส่งของ** เลขที่ 3032

ลูกค้า น. ศิริวุฒิภัทร์ สกัด วันที่ 16-2-66

ที่อยู่ ขรัว เลี่ยงทางรถไฟ

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1.	ค่าบริการ 6 ล้อ	1 เที่ยว	900	900
	ขนเศษวัสดุออกทิ้ง			
	ฮิ-3449 พะเยา			
	เวลาทำงาน 11 น. 00 น.			
	ออก 11 น. 40 น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver สุริยะ ผู้ควบคุมงาน/Controller

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

5 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 061 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 3033

ลูกค้า น. กิตติวรินทร์ สุริกัญ วันที่ 16-2-66

ที่อยู่ ศรีบุญเรือง เลี่ยบทางรถไฟ

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1.	ค่าบริการ 6 ล้อ	1 เที่ยว	900	900
	ขนดินชีวิตออกทิ้ง			
	81-2134 น่าน			
	เวลาทำงาน 13 น. 00 น.			
	ออก 14 น. 10 น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver ชวลิต

ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

5 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 061 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 3034

ลูกค้า น. วิศวกิจ ศึกิล วันที่ 16-2-66

ที่อยู่ สวิง เสียบทางรถไฟ

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการ 6 ล้อ	1 เที่ยว	900	900
	ขนเสาชิสุ 004 หิ้ง			
	ฐ0-3447 พะเยา			
	เวลาทำงาน 16 น. 10 น.			
	ออก 15 น. 00 น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver สุวิช ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

5 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160

ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่

บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม

Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 061 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 3036

ลูกค้า บ. กิ่งไพรจักร์ สาขา วันที่ 17-2-66

ที่อยู่ ศรีสะเกษ

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1.	ค่าบริการ 1 ชั่วโมง	1 ชม.	900	900
	หน้าสัมปทานอ่างทิ้ง			
	81-2099 น่าน			
	เวลาทำงาน 09 น. 50 น.			
	ออก 10 น. 20 น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver สมาร์ ผู้ควบคุมงาน/Controller

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

95 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 046 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 2287

ลูกค้า บ. VP วันที่ 21-2-66

ที่อยู่ วิรัญรินทวงศ์

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	บริการ รถ 6 ล้อ/ใบ่	6ชั่ว		
	ขนย้าย บุยะ เหิง			
	เที่ยวไปกลับ	1เที่ยว	900	900
	ท. 81-2134 น่าน			
	เวลาทำงาน 04.50 น. 10.00 น.			
	..... น. ..... น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver เม่ ดอน

ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

95 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 046 **บิลเครื่องจักร / ส่งของ** เลขที่ 2288

ลูกค้า ม. VP. วันที่ 21-2-66

ที่อยู่ จริญสินทวงศ์

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	บริการ 56 6 ล้อใหญ่ 8 ล้อ			
	เหมาจ่ายเหมาทั้ง			
	เป็นเงิน 900	1 เที่ยว	900	900
	ท. 81-214 น่าน			
	เวลาทำงาน 8.40 น. 9.50 น.			
	..... น. ..... น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver ..... ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

95 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 046 **บิลเครื่องจักร / ส่งของ** เลขที่ 2289

ลูกค้า น. VP วันที่ 21-2-66

ที่อยู่ จริยะนิทวงษ์

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ขนดร รถ 6ล้อใหญ่	6คัน		
	ขนย้ายบุยะเทิง			
	เป็นเที่ยว	1 เที่ยว	900	900
	ท. 81-2147 น่าน			
	เวลาทำงาน 10.50 น. 11.40 น.			
	..... น. ..... น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver เอง ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

95 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 046 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 2290

ลูกค้า ป. NP วันที่ 21-2-66

ที่อยู่ วริญรินทวงศ์

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	บริการ รถ 6 ล้อ/ดิน	8ถึง		
	ขนย้าย ปยะหิน			
	เป็นเศียง	1 เที่ยว	900	900
	ก. 81-2147 น่าน			
	เวลาทำงาน 13.45 น. 16.00 น.			
	..... น. ..... น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver ..... ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

5 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 058 **บิลเครื่องจักร / ส่งของ** เลขที่ 2887

ลูกค้า น. วิสารัทร์ วันที่ 23-2-66

ที่อยู่ ลวัมสมาย

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	แม็คขนาดเล็ก	1	900	900
	90-3449 พิษณุ			
	เวลาทำงาน 10.48 น. 11.30 น.			
	..... น. ..... น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL				900

พนักงานขับรถ/ Driver แม็ค ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

5 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 058 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 2888

ลูกค้า น.ย. วิศวกิจ วันที่ 23 ธ.ค. 66

ที่อยู่ ศรีสัชนาลัย

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการแม็คโคร	1	900	900
	70-3447 น.ก			
	70-3447 น.ก			
	เวลาทำงาน 13:18 น. 19:30 น.			
	..... น. ..... น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL				900

พนักงานขับรถ/ Driver เบนซ์ ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

5 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 058 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 2889

ลูกค้า น. วิสุทธิ์ วันที่ 23-2-66

ที่อยู่ อโณทัย

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ปรับพื้นที่	1	900	900
	90.3449 พ.ค.			
	เวลาทำงาน 15.31 น. 15.50 น.			
	..... น. ..... น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL				900

พนักงานขับรถ/ Driver ..... ผู้ควบคุมงาน/Controller .....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

หางหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

95 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160

ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่

บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม

Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 049 **บิลเครื่องจักร / ส่งของ** เลขที่ 2420

ลูกค้า ป V D จำกัด วันที่ 25/12/66

ที่อยู่ ปริ๊น

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	บริการรถ 6 ล้อใหญ่ 1คัน			
	ขนย้ายขยะ ออกครั้ง	1 เที่ยว	400	400
	57-0750 น่าน.			
	เวลาทำงาน เข้า น. 9.30 น.			
	ออก น. 9.30 น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ น. น.			
รวมเงิน TOTAL	สี่ร้อยบาทถ้วน			400

พนักงานขับรถ/ Driver ชัย ผู้ควบคุมงาน/Controller

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99 (สำนักงานใหญ่)

95 หมู่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม็คโครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อดั้ม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

เล่มที่ 049 **บิลเครื่องจักร/ส่งของ** เลขที่ 2421

ลูกค้า..... ว V D จำกัด วันที่ 25/2/66

ที่อยู่..... สรัญ

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	บริการรถ 6 ล้อ 6 คิว			
	ขนเศษขยะ ออกหิว	1 เที่ยว	600	600
	ฐา-0750 น่าน			
	เวลาทำงาน เช้า น. 10.30 น.			
	บ่าย น. 11.00 น.			
	ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ ..... น. ..... น.			
รวมเงิน TOTAL	เก้าร้อยบาทถ้วน			900

พนักงานขับรถ/ Driver.....

ผู้ควบคุมงาน/Controller.....

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

เอกสารแนบ 2-8
ใบเสร็จค่าเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้าง



The Forestias Signature Series

(Condominium)

Construction and Demolition Waste

Management Report

May 2023

Report by

VISAVAPAT

Visavapat Co., Ltd

TABLE OF C ONTENTS

CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT 3

INTRODUCTION 3

IMPLIMENTATION 3

CONSTRUCTION WASTE ACTIVITY 6

CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT

INTRODUCTION

Recycle and/or salvage nonhazardous construction and demolition debris. Develop and implement a construction waste management plan that , at a minimum , identifies the materials to be diverted from disposal and whether the materials will be sorted on-site or commingled. Excavated soil and land-clearing debris do not contribute to this credit. Calculations can be done by weight or volume, but must beconsistent throughout. The minimum percentage debris to be recycled or salvaged for each pointthreshold is as follows :

Recycled or Salvaged	Points
50%	1
75%	2

IMPLEMENTATION

The following chart identifies waste materials expected from this project, their disposal method and handling procedures:

Waste Material	Disposal Method	Handling Procedure	Unit
Concrete	Donation, Recycle	Keep separated in designated areas	Weight (ton)
Gypsum Board	Landfill or Recycle		
Insulation	Landfil		
Metal (e.g. steel bar, aluminum)	Reuse, Recycle		
Paper	Recycle		
Plastic	Recycle		
Tile	Reuse, Recycle		
Wood (e.g. formwork, MDF, plywood)	Reuse, Recycle		
General Mixed Waste (from construction)	Landfill	Keep separated in smaller container or designated areas	

Construction Waste Management Tracking Sheet : Master Tally (April 2023)

The total percentage of waste diverted from landfill disposal will be calculated using a summary of all construction wastes generated by type and quantity that were diverted and landfilled. The example of a summary table that will be used during the construction period is shown in the table below.

Total Construction Waste 1285.014 tons

Total Diverted Waste = 1280.002 tons (Percent of Waste Diverted tons70.932%)

Total Landfilled Waste = 5.012 tons

Key : = Key Result

= Input

Material Category	Disposal Method / Hauler	Disposed in Landfill (tons)	Recycled (tons)	Salvaged (tons)	Reused (tons)	Total Diverted (tons)
Aspha+A80:I93lt						
Concrete			1280			
Steel						
Wood						
Glass						
Brick						
Cardboard	Recycle /by labour		0.001			
Plastic	Recycle /by labour		0.001			
Gypsum						
PVC						
Duct Insulation+Foam						
Cement						
Construction Mixed Waste						
General Waste	Landfill	5.012				
Total Landfilled Waste (A) =		5.012	Total Diverted Waste (B) =			1280.002
Total Construction W aste (A) + (B) =		1285.014				

Construction Waste Management Tracking Sheet : April 2023

LEED MRc2 Construction Waste Management

Construction Waste Management Tracking Sheet

(รายงานการจดบันทึกขยะ)

Key : = Key Result (ช่องแสดงผล)

= Input (ช่องเติมข้อมูล)

(ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด) Total Construction Waste = 1285.5 tons

ปริมาณขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด Total Diverted Waste = 1285 tons

(ปริมาณขยะที่นำไปทิ้ง) Total Landfilled Waste = 5.5 tons

(Percent of Waste Diverted = 99.5 %)

(เปอร์เซนต์ขยะที่นำใช้ประโยชน์)

Material Category (ประเภทวัสดุ)	Disposal Method / Hauler (วิธีการกำจัด / ผู้รับเศษขยะรีไซเคิล)	Landfill (ทิ้งหรือฝังกลบ) (tons)	Recycled (รีไซเคิล) (tons)	Reused (นำกลับมาใช้ใหม่) (tons)	Other อื่นๆ (tons)	Total Diverted บริมาณที่นำไปใช้ประโยชน์ (tons)
Concrete	Donation		1280			
Steel						
Wood						
Glass						
Brick						
Cardboard						
Plastic						
Gypsum						
PVC						
Duct Insulation+Foam						
Cement						
Construction Mixed Waste						
General Waste	Landfill	5.5				
Total Landfilled Waste (A) = (ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำไปทิ้ง)		5.5	Total Diverted Waste (B) = (ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำๆไปใช้ประโยชน์)			1280
Total Construction Waste (A) + (B) = (ปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น)		1285.5				

CONSTRUCTION WASTE ACTIVITY

Construction waste data which was collected in APRIL 2023 as below.


Date	Waste Material	Disposal Method	Amount (ton)	Total (ton)
Total construction waste				

** Soil does not include in construction waste

Concrete waste





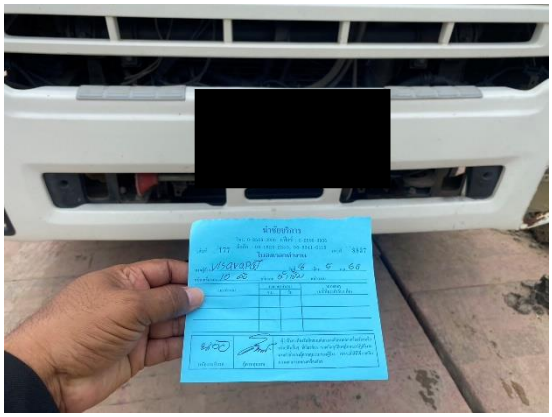








General waste



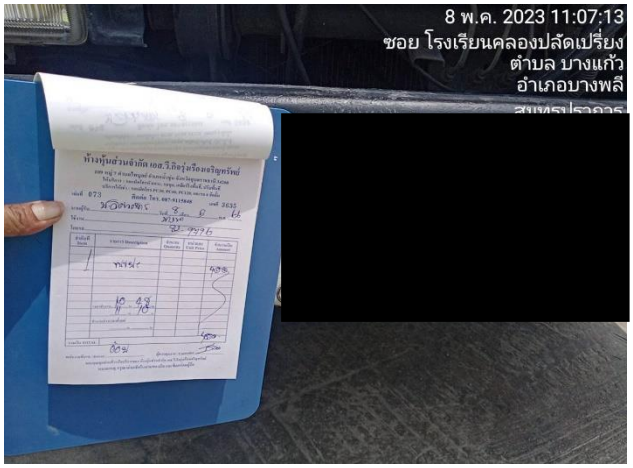










เอกสารแนบ 2-9
การจัดการน้ำเสียของโครงการ

เอกสารแนบ 2-9.1
แบบระบบบ่อเกรอะ

DOS LIFE

Life in Harmony

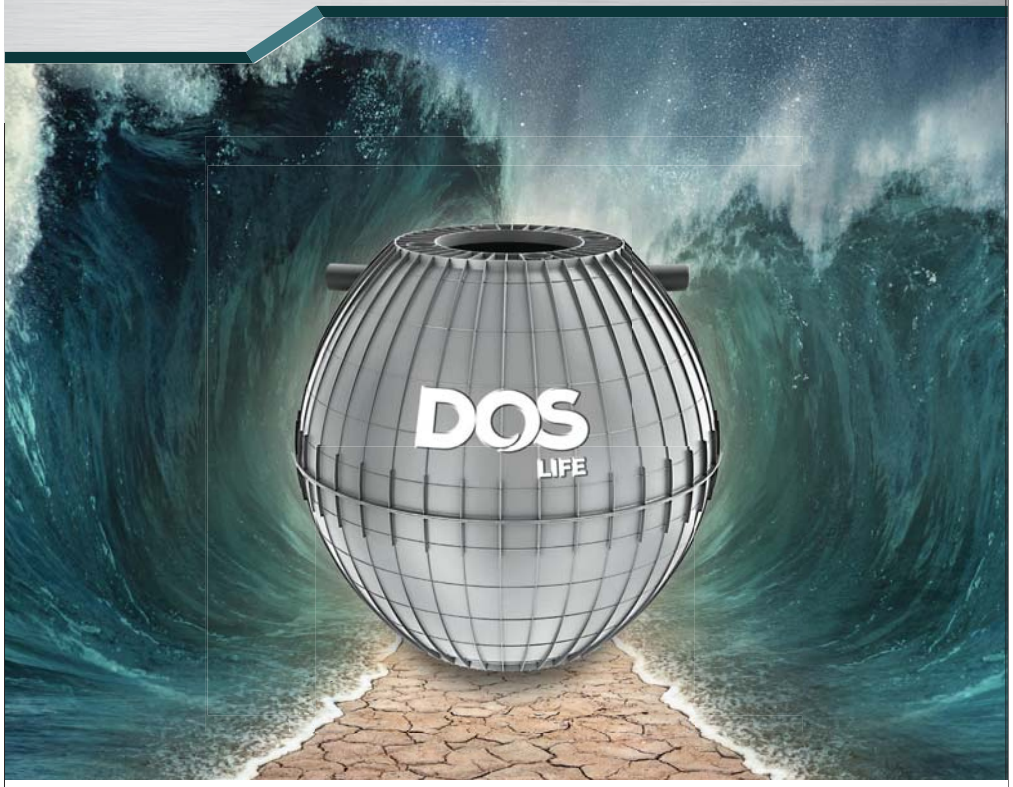

Power Full Highly Effective treatment

นวัตกรรมที่แข็งแกร่ง**เกินพิกัด**

DOS ULTRA

DOS ULTRA นวัตกรรมที่แข็งแกร่งเกินพิกัด

จากการพัฒนา และคิดค้นอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ DOS LIFE ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด จนนำมาซึ่งการประดิษฐ์คิดค้น **นวัตกรรมใหม่ล่าสุด** เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับถังบำบัดน้ำเสีย ผนวกกับประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณ

ULTRA แข็งแรงกว่าด้วย **นวัตกรรมวัสดุ/นวัตกรรมการผลิต/ผสานการออกแบบ**

- นวัตกรรมวัสดุ **HDPE (High Density Polyethylene)** คุณภาพสูง มีความทนทาน แข็งแรงกว่า **MDPE**
- **Injection Process** การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อให้ถังมีความแข็งแรงในระดับเบอร์ 5
- วิศวกรรมการออกแบบที่ผ่านการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบลอนรอบตัวถัง/ไม่มีบ่าถัง และก้นถังรับแรง

ลอนรอบตัวถัง
Ripple Around Tank
โครงสร้างถ่ายแรงรอบตัวถัง สามารถรับแรงได้ดีกว่าเดิม
Distribute force structure can supported more strength.





ไม่มีบ่าถัง
Flat Top
สะดวกกว่าไม่ต้องขุดลึก
More Comfortable, didn't deep inlay.

ก้นถังรับแรง
More Pressure Resist at the Bottom of Tank
ด้วยแนวเส้นรองรับช่วงล่าง
มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งทนทาน
With supported structure at lower of tank.




HIGH EFFICIENCY SYSTEM

เต็มระบบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

SPIRAL CROSS FLOW MEDIA DOS ULTRA

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของ **ระบบการกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)** ที่ผสานการออกแบบระหว่าง **Spiral Cross Flow Media** ที่มีพื้นที่ในการยึดเกาะของ **Bacteria** สูง และการวางตัวแบบ **Spiral** ที่ให้ประสิทธิภาพในการบำบัดสูงกว่าระบบการกรองแบบเดิม

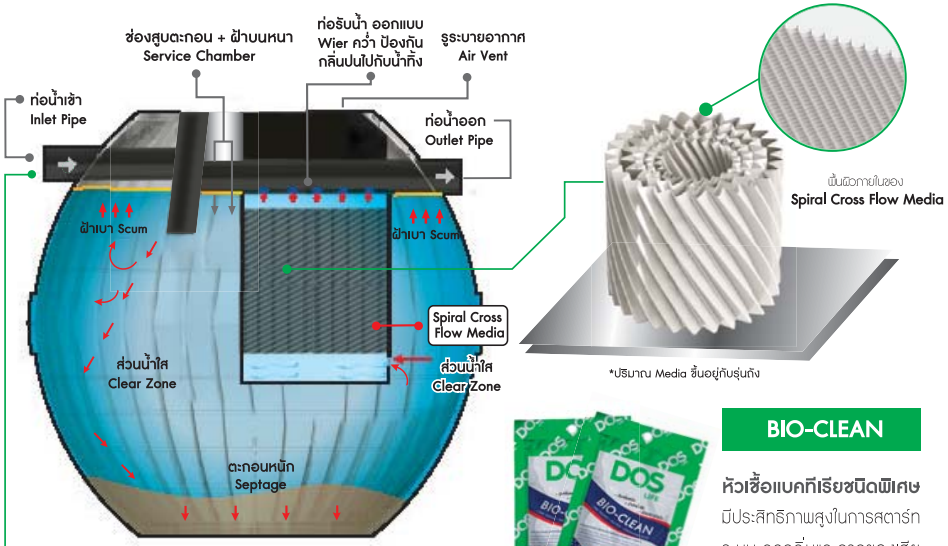

BIO-CLEAN

หัวเชื้อแบคทีเรียชนิดพิเศษ
มีประสิทธิภาพสูงในการสตาร์ทระบบ ลดกลิ่นและกากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์

ACCESSORIES อุปกรณ์ประกอบถัง

FLEXIBLE JOINT

ข้อต่อใช้ต่อกับท่อเข้า-ออกของถัง ผลิตจากวัสดุ SYNTHETIC PVC ชนิดเดียวกับที่ใช้ทำท่ออากาศ ในระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีความสามารถยืดหยุ่นและคงทน ป้องกันการแตกหักระหว่างท่อของอาคารกับถังบำบัด



พิเศษ!! มีความยาวถึง 30 cm. ขนาดยาวกว่าเดิมทำให้เพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้ไม่เกิดการเสียหายและง่ายในการติดตั้ง

ARCHITECTURAL ENGINEERING COVER (AEC COVER)

ฝาถังออกแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด **"วิศวกรรมที่กลมกลืน"** ที่ผสานวัสดุและโครงสร้างด้านวิศวกรรม


- **สีและลายหินธรรมชาติ** สวยงาม กลมกลืนเข้ากับการจัดแต่งสวนสวย
- **มือจับแบบ Flip Lock** ช่องมือเปิดมีฝาปิดกลมกลืนกับพื้นผิว ออกแบบเพื่อความสวยงาม และป้องกันการเปิดฝาโดยไม่ตั้งใจ



SPECIFICATION DOS ULTRA

ขนาด (Dimension)							จำนวนคน (Persons)					ความจุรวม (Total Capacity) ปริมาตรการใช้งาน (ลบ.ม.)
จำนวน (ลิตร)	กว้าง (w : cm.)	สูง (H : cm.)	ระดับท่อน้ำเข้า (a : cm.)	ระดับท่อน้ำออก (b : cm.)	ขนาดท่อ (Ø : Inch.)	ขนาดท่อระบายอากาศ (Ø : Inch.)	บ้าน (รวม)	บ้าน (ส้วม)	สำนักงาน (ส้วม)	โรงงาน (ส้วม)	ภัตตาคาร (ส้วม)	
800	130	109	91	86	4	1.5	2-3	8	10	17	35	0.9
1000	136	118	102	97	4	1.5	3	11	13	22	44	1.0
1600	156	141	122	117	4	1.5	5	17	21	35	71	1.7
2000	166	154	136	131	4	2	6	22	26	44	88	2.0

หมายเหตุ : สินค้าจริงอาจมีขนาดความกว้าง/สูง/ระดับท่อคลาดเคลื่อนไปกว่านี้เล็กน้อย เนื่องจากการหดหรือขยายตัวตามธรรมชาติของวัสดุ
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน




**BOD$_5$ (in) = 250 mg/l BOD$_5$ (out) = 50 mg/l

**ตามเงื่อนไขการออกแบบ

ประเภทถังบำบัดน้ำเสีย (TYPE OF ONSITE WASTE)

ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ


**BOD$_5$ (in) = 250 mg/l BOD$_5$ (out) = 50 mg/l



(ST-21/GY)

ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดไม่เติมอากาศ
DOS COMPACT SEPTIC ANAEROBIC SYSTEM


ถังบำบัดน้ำเสียที่รวมถังเกรอะ และถังกรองไร้อากาศไว้ในใบเดียวกัน เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียทุกชนิดในบ้านทั้งจากการชำระล้างในครัวเรือนและสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่าย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ก่อนระบายลงสู่ท่อน้ำสาธารณะต่อไป เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด หรือบ้านที่มีปัญหาระดับน้ำใต้ดินสูง **



(STS-21/GY)

ถังเกรอะ
DOS SEPTIC

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะชั้นแรก Primary Package Treatment Tank ช่วยลดค่าความสกปรก (BOD) ของน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้กักน้ำปัสสาวะ และกากอุจจาระก่อนเข้าสู่ (DOS FILTER) ต่อไป



(STL-21/GY)


ถังกรอง
DOS ANAEROBIC FILTER

ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไม่เติมอากาศ Up Flow Anaerobic Filter อาศัยแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยมีผลสุดท้ายเป็นน้ำ ก๊าซ และพลังงานทำให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีพอ ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

**ตามเงื่อนไขการออกแบบ

ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ


**BOD$_5$ (in) = 250 mg/l BOD$_5$ (out) = 20 mg/l



(SSF-21/GY)

ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ
DOS SEPTIC AEROBIC FIXED FILM

ถังบำบัดที่รวมถังเกรอะ และถังกรองแบบ Fixed Film ไว้ในถังเดียวกัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพที่ดี โดยน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีค่า BOD eff>20 mg./l ได้มาตรฐานอีกทั้งยังประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง **



(SFF-21/GY)

ถังกรอง
DOS AEROBIC FIXED FILM


เป็นการผสานของ 2 ระบบคุณภาพ ระหว่างระบบ Fixed Film Aeration ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ กับระบบ Filter ที่อาศัยตัวกลางพลาสติก (Media) เมื่อทั้ง 2 ระบบรวมกันจึงเพิ่มประสิทธิภาพสามารถลดค่าความสกปรก (BOD) ให้เป็นน้ำทิ้งที่ดีได้มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์

**ตามเงื่อนไขการออกแบบ

ถังดักไขมัน GREASE TRAP

ถังดักไขมัน
DOS GREASE TRAP

ถังดักไขมันขนาดใหญ่ ชนิดฝังใต้ดิน เหมาะสำหรับการแยกไขมัน หรือของแข็งลอยน้ำ ออกจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก อาคาร, ร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงอาหาร และบ้านพักอาศัย ใช้สำหรับแยกเศษอาหาร และไขมัน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Primary Treatment) และแยกไขมันออกจากน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต่อไป (Secondary Treatment)




(SGT-21/GY)

DOS ULTRA

QUALITY STANDARD
ความแข็งแรงระดับสูงสุด

FULL CAPACITY
ปริมาตรความจุเต็มลิตร

ระดับความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าใคร
มาตรฐานเบอร์ 5 พลัส ผ่านการทดสอบ
ความแกร่งที่มากกว่าระดับเกณฑ์กำหนด
ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน CANADIAN STANDARD
CAN/CSA-B66-M90 **



ทนทุกสภาพดิน
เบอร์ 5+
แข็งแกร่งเกินพิกัด


FULL CAPACITY
เต็ม ปริมาตร ไม่โกงลิตร

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย คือ คุณภาพความแข็งแกร่งที่ผ่านการทดสอบถึง 2 ขั้นตอน
*VACUMM TEST คือ การทดสอบโดยการสูบอากาศออกจากถังให้เป็นสูญญากาศ
*LOADED TEST คือ การทดสอบโดยการใช้น้ำหนักวางไว้ด้านบนถัง ผลการทดสอบปรากฏว่า รูปทรงถังใหม่
สามารถรับแรงกดและแรงดันที่กระทำต่อถังในทุกทิศทางได้อย่างดีเยี่ยม
** ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน CANADIAN STANDARD CAN/CSA-B66-M90

QUALITY MATERIAL
วัสดุคุณภาพ

วัสดุตัวถังคุณภาพสูง High-Density Polyethylene
แข็งแรง ทนทาน สูงสุด

PLUS
HDPE+



INTERNATIONAL STANDARD



กระบวนการออกแบบ
ทดสอบความแข็งแรง



ถังที่วิศวกรแนะนำ



ทดสอบแรงกดและแรงดัน



มาตรฐานเทคโนโลยีคุณภาพ



สินค้าจดสิทธิบัตร
การออกแบบ
และการผลิต

DOS
LIFE

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO.,LTD.
156/20 อาคารธรรมา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RAJTHEVEE, BANGKOK 10400, THAILAND
TEL: (02)611-0290 (13 LINES), (02)215-2535 (6 LINES)
FAX: (02)611-0460, (02)215-9074

www.dos.co.th
DOS Life

ผู้แทนจำหน่าย :

เอกสารแนบ 2-9.2
ใบเสร็จค่าสูบสิ่งปฏิกูล

ใบรับเงิน

วันที่ 6 ม.ค. 66

ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ แป้นทอง อยู่บ้านเลขที่ [redacted]

บัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ [redacted] ได้รับเงินจาก บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

เป็นการชำระค่า

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.	ค่าสูบสิ่งปฏิกูล			1,500	
	2 05 66				
			รวมเงินทั้งสิ้น	1500	

จำนวนเงิน หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

( ) เงินสด ( ) เช็ค ธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....

ข้าพเจ้าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้รับเงิน

( )

ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้อนุมัติ

( )






ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล สนข.บางกอกน้อย
6 ม.ค. 2023 12:37:33
599 ซอย วัฒนสุข-นิเวศน์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร


ELF
NPR
ISUZU
6 ม.ค. 2023 12:37:45
599 ซอย วัฒนสุข-นิเวศน์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

ใบรับเงิน

วันที่ 31 ม.ค. 66

ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ แป้นทอง อยู่บ้านเลขที่ [redacted] ถนน [redacted]

เป็นการชำระค่า

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	คลื่นไฟ ระบบสุขาภิบาลในแคมป์			3,500	
	- ดูดส้วม				
	- เคลียร์ท่อระบบสุขาภิบาล				
	(เนื่องจากส้วมเต็มบ่อย และท่อส้วมตัน)				
			รวมเงินทั้งสิ้น	3500	

จำนวนเงิน สามพันห้าร้อยบาทถ้วน

( ) เงินสด ( ) เช็ค ธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....

ข้าพเจ้าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน ลงชื่อ [redacted] ผู้อนุมัติ

( ) ( )





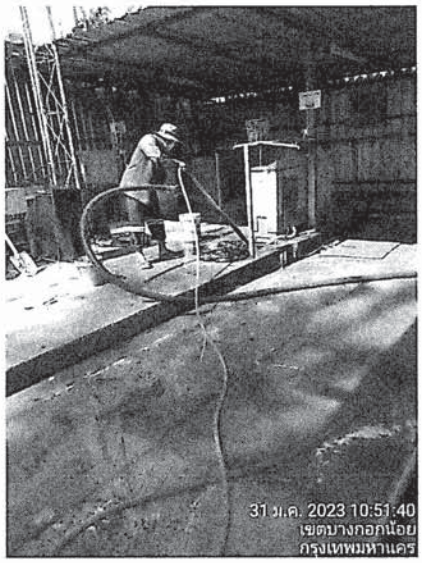


31 ม.ค. 2023 10:51:40
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร


31 ม.ค. 2023 11:06:52
599 ซอย วัฒนสุข-นิเวศน์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร


31 ม.ค. 2023 11:06:42
599 ซอย วัฒนสุข-นิเวศน์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

ใบรับเงิน

วันที่ 8 - 3 - 66

ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ แป้นทอง อยู่บ้านเลขที่ [redacted] ถนน .....

[redacted]

เป็นการชำระค่า

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.	ค่าดูดสิ่งปฏิกูล			1500	
	แคมป์คนงาน				
	2.05.06				
			รวมเงินทั้งสิ้น	1,500	

จำนวนเงิน หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

( ) เงินสด ( ) เช็ค ธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....


ข้าพเจ้าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน ลงชื่อ [redacted] ผู้อนุมัติ

( ) ( )



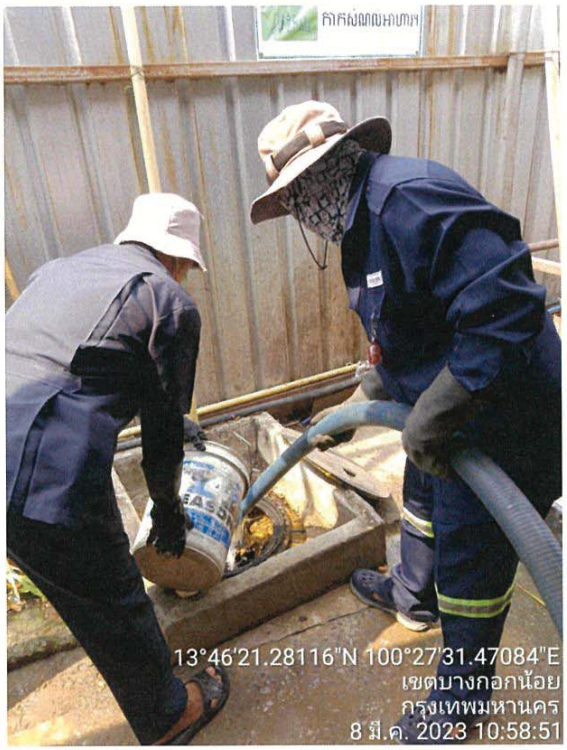


13°46'21.28116"N 100°27'31.47084"E
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
8 มี.ค. 2023 10:58:51


ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล สนข.บางกอกน้อย
13°46'23.70096"N 100°27'30.84066"E
599 ซอย วัฒนสุข-นิเวศน์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
8 มี.ค. 2023 11:03:45

ใบรับเงิน

วันที่ 10 พ.ค. 66

ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ แป้นทอง อยู่บ้านเลขที่ [redacted] ถนน [redacted]

เป็นการชำระค่า

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.	ค่าดูดสิ่งปฏิกูล	3		1500	
	(ดูดส้วมบ้านพักคนงาน)				
	205.06				
			รวมเงินทั้งสิ้น	1,500	

จำนวนเงิน หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน.

( ) เงินสด ( ) เช็ค ธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....

ข้าพเจ้าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

( )

ถงชื่อ [redacted] ผู้อนุมัติ

( )





ค่าดูดสิ่งปฏิกูล (บ้านพักคนงาน)

วันที่ 10 พ.ค.66 จำนวนเงิน 1,500 บาท






เอกสารแนบ 2-10
การจัดการระบบไฟฟ้า

เอกสารแนบ 2-10.1
แบบแปลนวงจรไฟฟ้า

VISAVAPAT

แบบแปลนวงจร

D CONDO PANAA

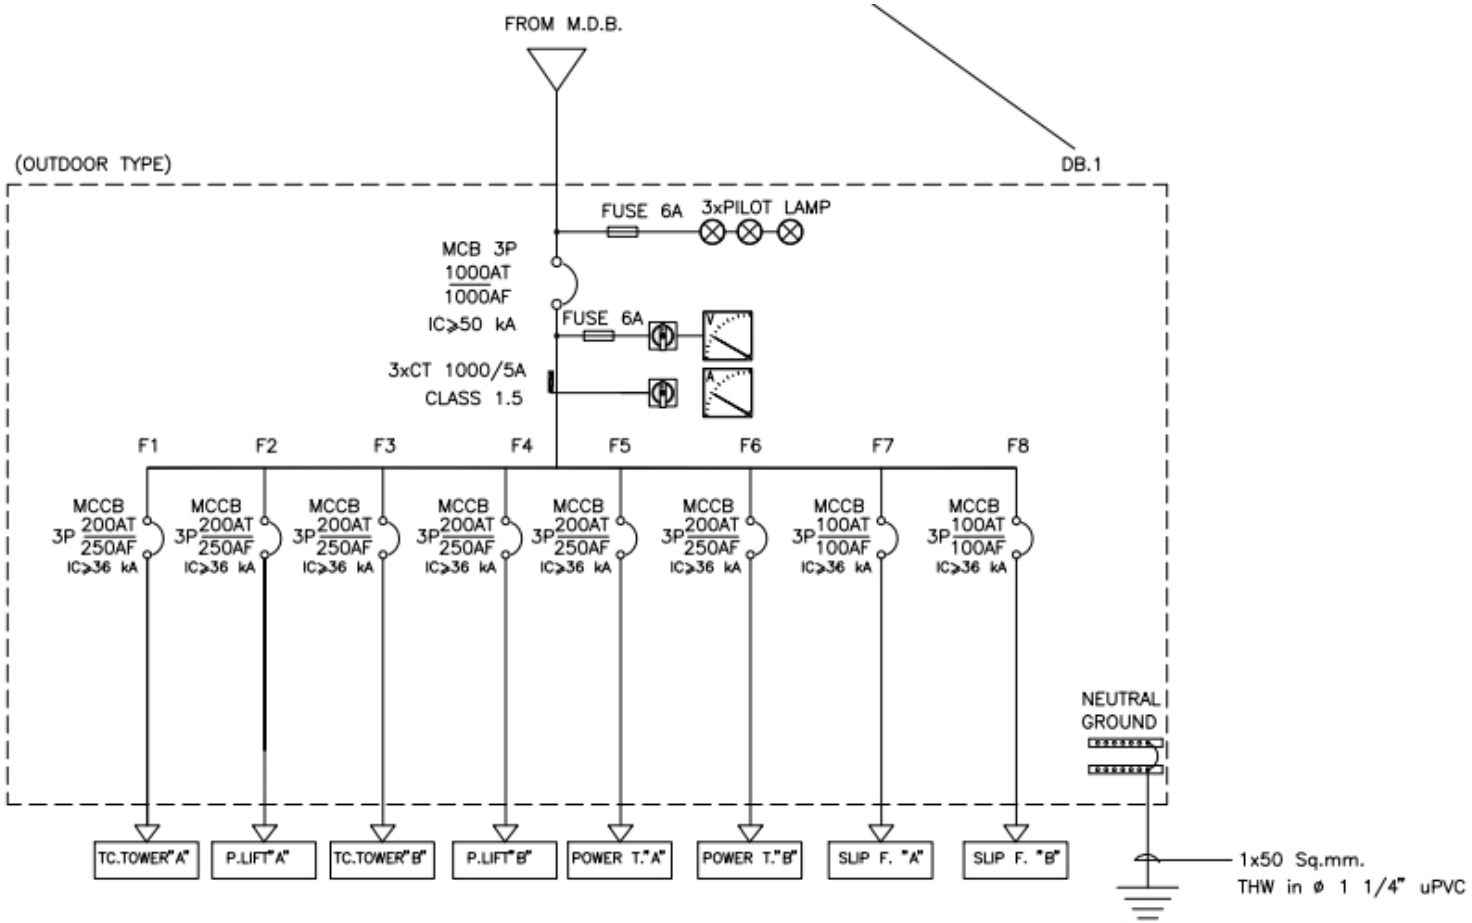

เอกสารแนบ 2-11
เอกสารการขึ้นทะเบียน จป.

ที่ รง ๐๕๑๖/ศ๔๐

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖
อาคารร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาลาดหญ้า
เลขที่ ๓๐๘ ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น
เรื่อง แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน
๒. หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ แผ่น
๓. ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๔ แผ่น
๔. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๓ แผ่น
๕. สำเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๑ แผ่น
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แต่งตั้งและแจ้งชื่อลูกจ้าง จำนวน ๒ คน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและระดับบริหาร ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ดี คอนโด พนา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖ นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖ ได้รับขึ้นทะเบียนแล้วและขอแจ้งเลขรหัสทะเบียน ดังนี้

๑. นางสาวสุณีย์ สีชมพู เลขรหัสทะเบียน กสร.จปว. ๑๐๕-๐๐๐๖๑๗
๒. นายสมปอง กลิ่นอ่อน เลขรหัสทะเบียน กสร.จปบ. ๑๐๕-๐๐๒๓๓๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖

กลุ่มงานความปลอดภัย เขตบางกอกน้อย
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๔๓๙ ๐๗๖๗
อีเมล์ : area6@labour.mail.go.th

ที่ รง ๐๕๑๖/๖๓๐๕

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖
๓๐๘ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑ ฉบับ
๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามเอกสารที่อ้างถึง ท่านได้แต่งตั้งและแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อขึ้นทะเบียนและเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ณ สถานที่ก่อสร้างชื่อ ดี คอนโด พนา เลขที่ ๑๘๘ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖ นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖ ได้รับขึ้นทะเบียนแล้วและขอแจ้งเลขทะเบียน นายศรัณย์ภพ อธิโชติอัครโภคิน เลขทะเบียน ๐๓ - ๑๐๕ - ๒๕๖๕ - ๐๐๐๐๐๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖

งานความปลอดภัยฯ เขตบางกอกน้อย
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๙ ๐๗๖๗
โทรสาร : ๐ ๒๔๓๙ ๐๗๗๑
อีเมล์ : area6@labour.mail.go.th

กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

เอกสารแนบ 2-12
คู่มือความปลอดภัย

เอกสารแนบ 2-12.1
คู่มือความปลอดภัย ฉบับภาษาไทย

ความปลอดภัย
เป็นหน้าที่ของทุกคน

VISAVAPAT

VISAVAPAT

คู่มือความปลอดภัย สำหรับงานก่อสร้าง
SAFETY HANDBOOK FOR CONSTRUCTION

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
VISAVAPAT CO.,LTD.



ใบรับทราบ

ข้าพเจ้า ได้ลงมือชื่อในการรับเอกสาร คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง สำหรับพนักงาน จำนวน 1 เล่ม เรียบร้อยแล้ว และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและจุดประสงค์ของคู่มือเล่มนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล(ตัวบรรจง) : _____
ลายเซ็นต์ : _____
หน่วยงาน/โครงการ : _____
แผนก/ฝ่าย : _____
ตำแหน่ง : _____
วันที่ : _____

หมายเหตุ : เมื่อท่านรับทราบ และกรอกรายละเอียดลงในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารส่วนนี้ ไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในแต่ละโครงการก่อสร้างด้วย เพื่อนำมาบันทึกลงเป็นข้อมูลต่อไป



นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกท่านและบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน
4. บริษัทฯ จะป้องกันอุบัติเหตุใดๆอันเกิดจากการทำงาน ที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ
5. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับต้องมีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
6. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรรมการผู้จัดการ

ข้อแนะนำเพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างปลอดภัย

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักถึงข้อควรระวังและวิธีการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ภายในบริเวณหน่วยงานหรือในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ โดยคู่มือความปลอดภัยเล่มนี้ยังได้ชี้แจงและอธิบายมาตรฐานความปลอดภัยในปฏิบัติงานในแต่ละลักษณะงาน

ดังนั้นเนื้อหาของคู่มือความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโครงการฯ ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติโดยหน้าที่และความรับผิดชอบผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานทุกคนควรทำความเข้าใจ หมั่นศึกษา ปฏิบัติตามและสามารถนำกลับมาอ่านได้หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ เมื่อกำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวัน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตั้งมั่นและมีสติที่จะทำงานโดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ อาจนำความเสียหายและความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและบริษัทได้

สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย
ทำงานปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ



27. ข้อคิด เตือนใจ

" สิ่งปลูกสร้างสำคัญที่รากฐาน การทำงานสำคัญที่ความปลอดภัย"
"ร่วมมือกันต้านอุบัติภัย ร่วมใจกันป้องกันอุบัติเหตุ"



- การไม่ฝึกปฏิบัติตามกฎและระเบียบในเรื่องความปลอดภัยอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านและผู้อื่นรวมถึงทรัพย์สินของบริษัท

- จิตใจที่กังวล ความเจ็บป่วย การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับท่านได้

การกระทำที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทั้งปวง
การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุดีกว่าการแก้ไข
คิดก่อนทำจำใส่ใจปลอดภัยไว้ก่อน



26. แบบสอบถามเพื่อประเมินตัวเองด้านความปลอดภัย

ทุกวันนี้ท่านทำงานด้วยความเสี่ยงต่ออันตรายมากน้อยเพียงใด
ลองประเมินตัวท่านเอง ด้วยการตอบรับหรือตอบปฏิเสธคำถามดังต่อไปนี้

	ใช่	ไม่
- ท่านรู้ขั้นตอนของงานที่ทำใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านรู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านได้ระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้เครื่องจักรที่ทำงานใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านรู้วิธีใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและได้ใช้อุปกรณ์ทุกครั้งที่ต้องการใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านรู้จักวิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องหรือไม่	☐	☐
- ท่านได้ดูแลรักษาความสะอาดและจัดที่ทำงานให้เป็นระเบียบหรือไม่	☐	☐
- ท่านหลีกเลี่ยงการทำงานลัดขั้นตอนใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านคิดก่อนทำทุกครั้งใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอหลังจากทำงานใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยอยู่เสมอใช่หรือไม่	☐	☐
- ท่านยืนยันที่จะให้เพื่อนร่วมงานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับท่านใช่หรือไม่	☐	☐

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. การผ่านเข้า - ออกในเขตพื้นที่การทำงานก่อสร้าง	6
2. การป้องกันตนเองจากความเสี่ยงอันตรายในที่ทำงาน	7
3. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	8
4. การปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายเตือนอันตราย	9
5. ข้อปฏิบัติของผู้รับเหมาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	10
6. ข้อปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	11
7. การป้องกันอันตรายที่เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ	12
8. การใช้เครื่องมือไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย	13
9. ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อม ตัดโลหะ	14
10. งานเสี่ยงอันตราย (Hazardous Work)	15
11. การใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย	16
12. การจราจรและที่จอดรถ	17
13. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก : โดยปั้นจั่น	18
14. การเลือกใช้อุปกรณ์งานยก สลิง สะเก็น โซ่ รอก ปากคีบ	19
15. ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ	20
16. ความปลอดภัยในงานขุด เจาะ	21
17. ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	22
18. ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน	23
19. ความปลอดภัยในการใช้บันได	24
20. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก : โดยใช้แรงคน	25

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
21. การรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ก่อสร้าง	26
22. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	27
23. การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด	28
24. การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่างๆ	29
25. ข้อห้ามสำหรับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา และการลงโทษ	30
26. แบบสอบถามเพื่อการประเมินตัวเองด้านความปลอดภัยฯ	31
27. ข้อคิด เตือนใจ	32



25. ข้อห้ามสำหรับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา และการลงโทษ






- เป็นนโยบายบริษัทฯ ที่จะไม่ให้มีการซื้อ ขาย ใช้ยาเสพติดในบริเวณเขตก่อสร้าง
- ห้ามขายสุราและห้ามดื่มสุรา ห้ามเสพยาบ้าและเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลในเขตก่อสร้างของบริษัทฯ
- ห้ามอยู่ในสภาพมึนเมาเข้ามาในเขตก่อสร้าง หรือเข้ามาปฏิบัติงาน

<u>การลงโทษ</u>

- พนักงานบริษัทฯ และพนักงานผู้รับเหมา ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ปลดออกจากงาน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ



24. การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่าง ๆ

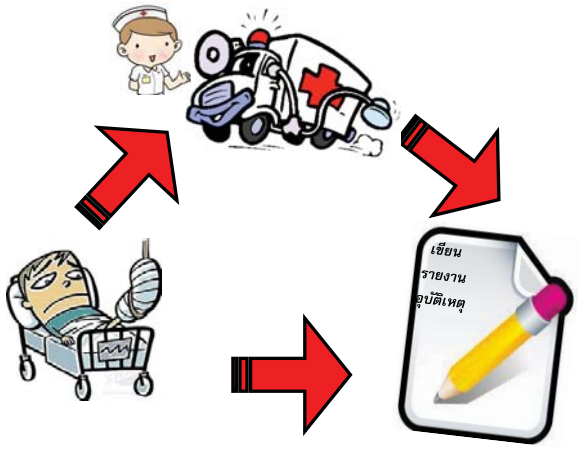

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และต้องมีการรายงานถึงแผนกความปลอดภัยทราบดังนี้

- อุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงานและอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน
- อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
- ไฟไหม้
- เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย/การกระทำ/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการทราบทันที

1. การผ่านเข้า – ออกในพื้นที่การทำงานก่อสร้าง





- กำหนดให้มีการเข้า - ออก เฉพาะประตูที่บริษัทฯ กำหนดให้เท่านั้น
- แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
- ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นเด็ดขาด
- ต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การทำงาน
- หากบัตรหายให้แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทันที





2. การป้องกันตนเองจากความเสี่ยงอันตรายในที่ทำงาน

- สังเกตและปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด



- เชื่อฟังคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ



- ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่ง



- ห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน

23. การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด

- ไม่ใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้า





- รีบหาทางตัดกระแสไฟฟ้าทันที โดยการถอดปลั๊กหรือสวิตช์ออก
- ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้า ไม้แห้ง หรือผ้าแห้งพันมือให้หนาแล้วจึงผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบเหตุให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือทำการเขี่ยสายไฟให้หลุดออกจากตัวผู้ประสบเหตุ
- ถ้าเกิดไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจร ทำให้เกิดไฟไหม้รีบสับสวิตช์ แล้วทำการดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง



- กรณีผู้ป่วยหมดสติ ให้นวดหัวใจและผายปอดช่วยชีวิตทันที

22. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นท่านอาจจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ มีชีวิตรอดโดยวิธีการ ดังนี้

- ประเมินสถานการณ์ (เช่น ยังมีลมหายใจอยู่ หรือใครเจ็บหนักที่สุด)
- ตัดสินใจช่วยผู้ที่บาดเจ็บมากที่สุด
- ติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
- แจ้ง จป. (โทร._____)
หรือเรียกทางวิทยุมือถือ ที่ ว._____
- ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรง ต้องเตรียมรถเพื่อนำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุ : ***เบอร์โทรฉุกเฉิน***
1. ผู้จัดการโครงการ โทร._____
2. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ โทร._____
3. โรงพยาบาล โทร._____
4. สถานพยาบาล/คลีนิคแพทย์ โทร._____



3. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



- พนักงานทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า ต้องถูกนำมาใช้กับงานที่อาจทำให้ดวงตาและใบหน้า มีโอกาสได้รับอันตราย
- สวมเข็มขัดนิรภัยในการทำงานขณะปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
- สำหรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอื่นๆควรใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงอันตราย

4. การปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายเตือนอันตราย

- ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายบังคับ, เครื่องหมายห้าม, เครื่องหมายเตือนอันตราย ต่างๆอย่างเคร่งครัด







- บริเวณเขตก่อสร้างต้องจัดทำรั้วกั้นบริเวณเขตก่อสร้างพร้อมปิดประกาศ **"เขตก่อสร้าง บุคคลภายนอกห้ามเข้า"**





- พื้นที่สูง พื้นที่ที่มีช่องเปิดต่างๆต้องทำราวกั้นกันตกที่มั่นคงแข็งแรง

21. การรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่

- วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ต้องเก็บให้เรียบร้อย ไม่ให้เกะกะทางเดิน

-สถานที่ปฏิบัติงานต้องปราศจากสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตราย



- ห้ามจัดวางเศษวัสดุที่ง่ายต่อการลุกไหม้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อนมีประกายไฟ

- ขยะและของเหลือใช้ต้องนำออกไปนอกเขตปฏิบัติงานทุกวัน



20. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก : โดยใช้แรงคน

- วางแผนการยก โดยพิจารณาของที่จะยกว่ามีลักษณะอย่างไร โดยให้รู้ถึงปริมาณ น้ำหนัก

- ถ้ายกหนักเกินกว่าที่จะยกคนเดียวได้ ให้เรียกเพื่อนร่วมงานมาช่วยยก

- ต้องสวมถุงมือและรองเท้านิรภัยให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะทำการยก







- งอเข่าและคู้ลงต่ำใกล้ของ ให้ลำตัวชิดลง ให้หลังตรงเกือบเป็นแนวดิ่ง แล้วยืนขาทั้งสองขึ้นให้ใช้ขายกอย่าให้หลังยก

- เมื่อวางของให้ทำวิธีย้อนกลับตามวิธีเดิม

5. ข้อปฏิบัติของผู้รับเหมาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- การทำงานของผู้รับเหมาจะต้องมีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติงานทุกครั้ง





- หัวหน้างานและคนงานของผู้รับเหมาต้องแต่งกายอย่างรัดกุม สวมเสื้อ กางเกงขายาว รองเท้าหนังหัวเหล็ก สำหรับการทำงานอย่างปลอดภัย

- ผู้รับเหมาต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุและรายงานสภาพการณ์การทำงาน หรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้กับทางบริษัทฯทราบ

- ผู้รับเหมาควรเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯกับทางบริษัทฯ



6. ข้อปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย





- ต้องเรียนรู้และเข้าใจการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและรู้ถึงตำแหน่งที่มีการติดตั้ง
- ควรมีการจัดแยกจัดเก็บสิ่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิง เชื้อไฟจากจุดที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน
- พบเพลิงไหม้ต้องแจ้งหัวหน้าทันที หากสามารถดับเพลิงได้ ให้รีบดับเพลิงทันที




19. ความปลอดภัยในการใช้บันได



- บันไดที่ชำรุด แตก หัก ห้ามใช้และควรติดป้าย "ห้ามใช้งาน"




- ห้ามนำบันได 2 อันมามัดต่อกัน เพื่อให้ยาวขึ้น



- ปลายของบันไดต้องเกินจากจุดที่พาดผ่าน 3 ฟุตหรือ 90 เซนติเมตร
- การขึ้นลงบันไดให้หันหน้าเข้าหาบันไดเสมอ
- การปีนป่ายบนบันได ต้องใช้มือทั้ง 2 ข้าง ยึดเกาะกับบันได
- การใช้บันไดพาดต้องมีผู้ช่วยเหลือในการจับบันไดเพื่อให้เกิดความมั่นคง

18. ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน

- การทำงานที่สูงเกินกว่า 2 เมตร ต้องทำนั่งร้าน
- พื้นนั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร
- มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และสูงไม่เกิน 1.10 เมตร





- ต้องจัดทำบันได เพื่อใช้ขึ้น-ลงนั่งร้าน
- ต้องจัดผ้าใบหรือตาข่ายนิรภัยปิดคลุมโดยรอบนอกนั่งร้าน
- โครงสร้างนั่งร้านต้องมีการยึด โดยค้ำยันเพื่อป้องกันมิให้นั่งร้าน เกิดการทรุดเอียงจนล้มลงในที่สุด

7. การป้องกันอันตรายที่เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือต่าง ๆ



- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือทำครอบกั้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ



- หากต้องใช้เครื่องมือประเภทมอเตอร์เจียร์/ตัด ตรวจฝาครอบหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย โดยให้มีอยู่ครบก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง





- ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ต้องมีการตัดแยกระบบที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและติดป้ายเตือน "ห้ามจ่ายกระแสไฟฟ้า"

8. การใช้เครื่องมือไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

- อย่าใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะเปียกน้ำ หรือร่างกายมีความชื้น





- ส่วนที่เป็นโลหะของแผงสวิตช์ต้องต่อสายดิน (Ground)
- เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องมีฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าและต้องมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

- เมื่อพบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที
- ห้ามซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด หากชำรุดต้องให้ช่างไฟฟ้าแก้ไขโดยทันที






- ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง

17. ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง



- การทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่มั่นคงแข็งแรง




- พื้นที่การทำงานบนที่สูง พื้นที่ต่างระดับที่มีช่องเปิด ร่อง ปล่อง ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำราวกั้นกันตกหรือฝาปิดอย่างมิดชิดและแข็งแรง
- การทำงานบนที่สูงต้องจัดให้มีราวกันตกต้องมั่นคงแข็งแรง มีความสูงไม่น้อยกว่า 90-110 เซนติเมตร จากพื้น



- ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหรือเชือกนิรภัย โดยการคล้องเกี่ยวอย่างปลอดภัยตลอดเวลาที่ทำงาน
- เมื่อมีความเสี่ยงที่จะพลัดตกมาจากที่สูง 2 เมตรขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งให้ใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต

16. ความปลอดภัยในงานขุด เจาะ

- ต้องจัดทำเครื่องกีดขวาง และเครื่องหมายติดตั้งรอบบริเวณที่ทำการขุด
- คนงานขุดดินต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มส้น
- ไม่ควรให้บุคคลใดเข้าใกล้บริเวณขอบหลุมที่ทำการขุด หรือวัสดุอื่นใดเมื่อมีการทำงานของเครื่องจักร





- ต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ของการขุดหลังจากฝนตก และต้องมีการป้องกันการเกิดน้ำท่วม
- สิ่งสกปรกหรือของที่ได้จากการขุดหรือวัสดุอื่นใดต้องจัดเก็บห่างจากขอบของการขุดอย่างน้อย 1 เมตร

- บ่อหรือหลุมขุดต้องมีการจัดทำบันไดสำหรับการขึ้น-ลง

9. ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัดโลหะ


- ***ต้อง*** สวมถุงมือและแว่นตา หรือหน้ากากทุกครั้งที่ทำงานเชื่อมโลหะ






- ***ไม่ควร*** วางนอนถังแก๊สไว้ และ***ควร*** ให้ห่างจากบริเวณเชื่อมตัด เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม กระเด็นไปถึง
- ***ตรวจสอบ*** บริเวณโดยรอบจะต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้อยู่ในรัศมีที่สะเก็ดไฟจากการปฏิบัติงานกระเด็นไปถึง

- ***ต้อง*** จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ใกล้บริเวณพื้นที่ทำงานเพียงพอ และสามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



10. งานเสี่ยงอันตราย (Hazardous Work)

– งานเสี่ยงอันตราย หมายถึง งานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเพื่อนร่วมงานสูง หรืองานที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่งานที่มีลักษณะ ดังนี้



- การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน (Hot Work) หมายถึง งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ ขณะปฏิบัติงาน เช่น งานตัดและเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือเชื่อมแก๊สและงานที่ต้องใช้เครื่องเจียรนัย เป็นต้น



- การทำงานบริเวณที่อับอากาศ (Confined Space Work) หมายถึง การทำงานบริเวณที่มีออกซิเจนต่ำ มีการสะสมของสารไวไฟหรือสารพิษ เช่น บ่อ ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ไซโล และเตา เป็นต้น

- ลักษณะงานอื่นๆ กำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนเข้าทำงาน

15. ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ




- ต้องขออนุญาตปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ



- ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนและแก๊สพิษในพื้นที่อับอากาศ หากเครื่องตรวจวัดแก๊สเริ่มส่งเสียงเตือนให้รีบออกจากพื้นที่ทันที

- พนักงานใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศเข้าปฏิบัติงาน โดยต้องมีพนักงานอีก 1 คน อยู่ภายนอกเพื่อคอยติดต่อสื่อสารเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน

- ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน





14. การเลือกใช้อุปกรณ์งานยก สลิง สะเก็น โซ่ รอก ปากคีบ


- ไม่ปล่อยวัสดุที่จะยกอยู่ในสภาพไม่รัดกุมและไม่ได้รับการเฝ้าระวัง ถูกห้อยแขวนอยู่กับโซ่ยก




Bridle hitch



Three leg bridle



- ใช้ตะขอยกน้ำหนัก โดยน้ำหนักวัสดุตกตรงร่องตะขอ
- ต้องใช้สลิงหรือสายพานยึดชิ้นงานที่ทำการยกมากกว่า 2 ที่ขึ้นไป
- โซ่ยกของต้องเป็นโซ่ที่ได้มาตรฐานหรือนำไปยกของเท่านั้น ห้ามนำโซ่รัดของมาทำเป็นยกของ
- อุปกรณ์กันตกทุกชนิดก่อนนำไปใช้งานต้องตรวจเช็คสภาพให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย




11.การใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย


- ห้ามโดยสารยานพาหนะที่ไม่ได้ทำไว้ให้สำห
การโดยสาร



รถยกไม่ใช่รถเมล์นะ



- การปีนขึ้น-ลง ควรกระทำอย่างปลอดภัย



- การจอดรถที่ต้องจอดในพื้นที่ลาดเอียงต้องล็อคเบรคมือทุกครั้ง



- การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องทุ่นแรงต่างๆต้องใช้ให้ถูกประเภท

12. การจราจรและที่จอดรถ



- การตรวจสอบยานพาหนะก่อนใช้งานทุกครั้ง

- อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่สามารถขับขี่ยานพาหนะในเขตก่อสร้างได้เท่านั้น



- ให้พนักงานเดินทางขวามือบนถนนในเขตก่อสร้าง ในขณะที่รถยนต์วิ่งสวนทางกับพนักงาน




- จำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. และให้เคารพกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร

- รถของพนักงาน/ผู้มาติดต่อให้จอดได้เฉพาะบริเวณหน้าอาคารสำนักงานหรือจอดได้ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

13. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก : โดยปั้นจั่น

- ต้องมีการตรวจสภาพเครนก่อนใช้งาน






- ***ห้าม*** อยู่ใต้สิ่งของขณะที่มีการยกของ



- บริเวณยกย้ายสิ่งของต้องปิดล้อมบริเวณที่ทำการยก



เอกสารแนบ 2-12.2


คู่มือความปลอดภัย ฉบับภาษาพม่า




၆။ ခြေဆန့်ခြင်း။ ခြေဖြစ်စေပါ။ ညာဘက်ဒူးကိုကွေးရမှာ လက်ကိုညာဘက်သို့။ ညာဘက်ကိုကွေးရမှာ တင်ထားပါ။ ညာဘက်ကွေးစဉ် ဘယ်ဖက်ကိုဆန့်ပါ။ ဤသို့တလှည့်ပြန်ပြုလုပ်ပါ။



၇။ ဒူးခေါင်းလျှော့တင်ပေးခြင်း။ ခြေထောက်ကိုမြှင့်ပြီးခွေပါ။ လက်ကိုဒူးခေါင်းပေါ်တင်၍ တောက်ထိုင်ပါ။ ဒူးခေါင်းကိုတင်၍ကွေးစေပါ။



၁၀။ ခြေခြင်းခြင်း။ ပြာဇေထားသည်ဟန်ဖြင့် သဘဝခြေ ညာခြေကို တင်လည်ပိုင်ခြင်း။



၅။ ခြေကားခြင်းမှာကိုယ်အထက်ပိုင်းလှည့်ခြင်း။ ဦးခေါင်းပေါ်လက်တင်ထားပါ။ ခါးမှ၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဝင်ပိုင်းသဏ္ဌာန်လှည့်ပါ။ ဘယ်၊ ညာခြောင်းလဲပေးပါ။



၄။ ခြေကားခြင်း။ ခြေဖြစ်စေပါ။ ခန္ဓာထောက်ခြင်း နေသည်။ ဤသို့ ခြေလုပ်နိုင်သည်။

จัดทำโดย : น.ส. สมฤดี ศิลาน้อย (ตั๊กแตน)

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်

คู่มือความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้าง





၁။ ခြေဆန့်ခြင်း။ ခြေဖြစ်စေပါ။ ညာဘက်ဒူးကိုကွေးရမှာ လက်ကိုညာဘက်သို့။ ညာဘက်ကိုကွေးရမှာ တင်ထားပါ။ ညာဘက်ကွေးစဉ် ဘယ်ဖက်ကိုဆန့်ပါ။ ဤသို့တလှည့်ပြန်ပြုလုပ်ပါ။



၂။ ခြေခြင်းခြင်း။ ပြာဇေထားသည်ဟန်ဖြင့် သဘဝခြေ ညာခြေကို တင်လည်ပိုင်ခြင်း။



၃။ ခြေကားခြင်းမှာကိုယ်အထက်ပိုင်းလှည့်ခြင်း။ ဦးခေါင်းပေါ်လက်တင်ထားပါ။ ခါးမှ၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဝင်ပိုင်းသဏ္ဌာန်လှည့်ပါ။ ဘယ်၊ ညာခြောင်းလဲပေးပါ။

၄။ ဒူးခေါင်းလျှော့တင်ပေးခြင်း။ ခြေထောက်ကိုမြှင့်ပြီးခွေပါ။ လက်ကိုဒူးခေါင်းပေါ်တင်၍ တောက်ထိုင်ပါ။ ဒူးခေါင်းကိုတင်၍ကွေးစေပါ။



၅။ ခြေခြင်းခြင်း။ ခြေဖြစ်စေပါ။ ခန္ဓာထောက်ခြင်း နေသည်။ ဤသို့ ခြေလုပ်နိုင်သည်။



၆။ ခြေဆန့်ခြင်း။ ခြေဖြစ်စေပါ။ ညာဘက်ဒူးကိုကွေးရမှာ လက်ကိုညာဘက်သို့။ ညာဘက်ကိုကွေးရမှာ တင်ထားပါ။ ညာဘက်ကွေးစဉ် ဘယ်ဖက်ကိုဆန့်ပါ။ ဤသို့တလှည့်ပြန်ပြုလုပ်ပါ။



၇။ ခြေခြင်းခြင်း။ ခြေဖြစ်စေပါ။ ခန္ဓာထောက်ခြင်း နေသည်။ ဤသို့ ခြေလုပ်နိုင်သည်။

နာမကို

ဘ။ အမည်(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) .....
ဖိုး (မြေးနာ/အင်္ဂလိပ်) .....

ဂျ။ အခြားအမည်(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) .....
ဖိုးမြေး.....

လျှောက်ထားသူလက်မှတ်
(လာရောက်ဆိုင်ရာ)

အမည် ဖိုး.....
ရက်စွဲ ရက်ပို.....
ဖုန်းနံပါတ်/ဘေးလ်ကြေး.....





	ဘာသာရပ်	အမှတ်
1.	ထွက်လမ်းလျှောက	5
2.	တားမြစ် သင်္ကေတများ	6
3.	သတိပေး သင်္ကေတများ	7
4.	မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမည့်သင်္ကေတများ	8
5.	ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသင်္ကေတ	9
6.	မီးသတ်ဘူးသုံးနည်း	10
7.	အရေးပေါ်မီးလောင်လျှင်	11
8.	ဝန်ချိုစက်ယာဉ်များသုံးခြင်း	13
9.	အဝတ်အစားမီးစွဲလောင်ခြင်း	14
10.	လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း	18
11.	ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်သံဂဟေဆော်ရခြင်း	20
12.	လျှပ်စစ်ဖြင့်သံဂဟေဆော်ခြင်း	21
13.	အခိုးအငွေ့ပျံတတ်သောရေနံဆီ၊ဓာတ်ဆီ၊သင်းနှာပေါက်ကွဲစေတတ်သောအရာဝတ္ထုများဖြင့်ပတ်သက်ရသောလုပ်ငန်း	2
14.	ကျောက်ဖြတ်စက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း	24
15.	တူ	25
16.	လွှ	27
17.	လျှပ်စစ်အားသုံးလွှ	29
18.	ကရိန်းစက်သုံးခြင်း	30
19.	ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာတွင်အလုပ်လုပ်ရခြင်း	32
20.	ဖောက်စက်၊တုံခါသောစက်များ	33
21.	ဘူဒိုဇာ	35
22.	ညှပ်ဆင်၍အလုပ်လုပ်ရခြင်း	36

	ဘာသာရပ်	အမှတ်
23.	အမြင့်ပိုင်းလေ့ခါးများတွင် အလုပ်လုပ်ရခြင်း	38
24.	ပစ္စည်းများ မ ခြင်း၊ရွှေ့ခြင်း	42
25.	ပစ္စည်းများ မ တင်သည့်နည်း	46
26.	လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို စနစ်တကျ ထားရှိခြင်း။	47
27.	ဓာတုဆေးပစ္စည်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း	49
28.	အအေးခန်းတွင်အလုပ်လုပ်ရခြင်း	51
29.	ခါတုဗေဒပစ္စည်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များပေါ်မှ အမှတ်သင်္ကေတများ	52
30.	အလုပ် လုပ်သောဝတ်စုံ	55
31.	ကိုယ်ခန္ဓာကိုလုံခြုံစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ	56
32.	မျက်နှာနှင့်မျက်လုံးကိုကာကွယ်ပေးသောကိရိယာ	57
33.	လက်ကိုကာကွယ်ရန် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ	58
34.	အကြားအာရုံကိုကာကွယ်ပေးသောကိရိယာ	59
35.	ခြေထောက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ	60
36.	ရေးဦးသူနာပြုစုနည်း	61
37.	အရိုးအဆစ်လွှဲခြင်း ကြွက်တက်ခြင်း	63
38.	ဓာတ်လိုက်ခြင်း	64
39.	လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ ဝတ်ဆင်ရန်များ	65
40.	လက်ဆေးကြောနည်းအဆင့်ဆင့်	66
41.	လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း (၁၀) မျိုး	67

လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ ဝတ်ဆင်ရန်များ



ဦးခေါင်းထိခိုက်အန္တရာယ်ရခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်ဦးထုပ်ဆောင်းပါ။
နားအူ၊နားပင်းခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်နားပိတ်ကိရိယာများတပ်ဆင်ပါ။



အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများရခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ပါ။



လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့်လက်များထိခိုက်ရှနာမှုနှင့် အရေပြားရောဂါရခြင်းတို့မှကာကွယ်နိုင်သည်။



လည်ရှည်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် မတော်တဆချော်ကျခြင်းနှင့်ခြေထောက်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့မှကာကွယ်နိုင်သည်။

38. ဓာတ်လိုက်ခြင်း

မီးခလုတ်များနှင့် မိန်းခလုတ်များအား ချက်ချင်းပိတ်ပါ။ ဓာတ်လိုက်သူအား အဝတ်ဖြင့် ဆွဲယူကယ်တင်ပါ။ ကယ်တင်သူမှာ ရာဘာဖိနပ်စီးပြီး အောက်ခံမြေမှာ ရေစိုခြင်းကင်းမဲ့ရမည်။

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
ထိုသူ၏ နဖူးကို ဖိထားပြီး မေးစေ့ကို မော့ထားပေးပါ။

ထိုသူ၏ အသက်ရှူပုံကို စစ်ဆေးပါ။ အနာဒဏ်ရာများကို စစ်ဆေးပါ။
မီးလောင်ထားသော ဒဏ်ရာများရှိလျှင် ရေအေးဖြင့် လောင်းပေးပါ။
ဒဏ်ရာကိုအဝတ်စဖြင့်ဖုံးအုပ်စည်းနှောင်ပြီး ဆရာဝန်ထံသို့အမြန်သွားပါ။



1. ထွက်လမ်းလျှောက်

အထောက်အထား









2. တားမြစ် သင်္ကေတများ



37. အရိုးအဆစ်လွဲခြင်း ကြွက်တက်ခြင်း

အရိုးအဆစ်လွဲခြင်း



လူပ်ရှားခြင်း အလွန်ပြုလုပ်ရသောကြောင့် အရိုး၊ အဆစ်၊ အကြောများ ယောင်ရမ်း နာကျင်လာမည်။

တစ်ကြိမ်လျှင် ၅ မိနစ် မှ ၁၀ မိနစ် ကြာအောင် ရေခဲအုပ်ပေးပါ။ ယောင်ရမ်းခြင်းသက်သာလာမည်။



အနာအနီးလူပ်ရှားခြင်းမပြုဘဲ အဝတ်စဖြင့် စည်းနှောင်ထားသင့်သည်။

ကြွက်တက်ခြင်း




ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းခြင်း၊ အဝတ်အထည် ကြပ်တည်းစွာဝတ်ခြင်း၊ အလွန်အေးသော နေရာတွင် နေထိုင်ခြင်း၊ ချွေးထွက်လွန်ပြီး အိုင်အိုဒင်းဆား ချို့တဲ့ခြင်း၊ အလွန်အမင်း အားစိုက်ထုတ်ရပြီး အကြောအခြင်များ တင်းလွန်းခြင်း။



ပရုပ်ဆီလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်။ ထိုသူအား နွေးနွေးထွေးထွေး နေစေပါ။

စူးဝင်သောအရာကြောင့်ရသောအနာ

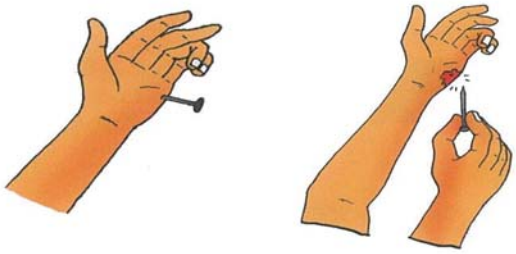

အနာကြောင့် ယောင်ရမ်းပြီး ကိုက်ခဲတတ်သည်။



ဤအနာမျိုးသည် ရောဂါပိုးဝင်တတ်သဖြင့်
ပဋိဇီဝဆေးများ သုံးရတတ်သည်(သို့) ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး
အနာယင်းခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။

သတိပေး သင်္ကေတများ



မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမည့်သင်္ကေတများ



ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း

ချွန်ထက်သောအရာကြောင့်ရရှိသောအနာ

အနာ၏အတိမ်အနက်ကို အကဲခတ်ပါ။
အနာအတွင်းဝင်ရောက်နေတတ်သော
ထူးခြားသည့်အရာများကို
ရှာပါ။ ရှိပါက အပြင်သို့ထုတ်ပစ်ပါ။





သွေးတိတ်အောင် အနာကို
ဖိထားပါ။ ပြီးလျှင်
ရေသန့်ဖြင့်သေချာဆေးပါ။

ရေခြောက်သွားလျှင် အရက်ပျံနှင့်
သုတ်၍အနာကို သွေးတိတ်အောင်
ပလာစတာ (သို့) ပတ်တီးဖြင့် ဖုံးအုပ်
ထားပါ။ ထို့နောက် ဆရာဝန်နှင့်
အပြန်သွားပြပါ။



ခြေထောက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ

ခြေသလုံး၊ ညိုသကြီး၊ ခြေထောက်နှင့် ခြေချောင်းကလေးများကို
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။



သံကွပ်ဖိနပ်
ခြေထောက်များကို
ဆောင့်ချခံရမှုမှ
ကာကွယ်နိုင်သည်။



ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများမှ
ကာကွယ်နိုင်သောဖိနပ်
ကြာရှည်ခံနိုင်သောအသားဖြင့်
ပြုလုပ်ထားသည်။ဖိနပ်ဦးပိုင်း
တွင် သံမဏိကာပါသောအမျိုး
အစားနှင့် မပါသောအမျိုးအစား
ဟူ၍၂မျိုးထားသည်။



လည်ရှည်ဘွတ်ဖိနပ်
အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
ညိုသကြီး တဝက် (သို့)
ဒူးဆစ်အထိ အမြင့်လောက် ထိ
ရှိတတ်သည်။



အပူကာဖိနပ်
မီးပြိမ်းသတ်ရာတွင်၊သတ္တု
ကျိုခြင်းအလုပ်၊ပန်းပဲဖိုတို့.
တွင်ဝတ်ရန်သင့်တော်သည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသင်္ကေတ



မီးသတ်ဘူးသုံးနည်း



မီးသတ်ဘူးကို
ကြမ်းပြင်ပေါ်ထားပါ။

၁။
ခလုတ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ။





၂။
မီးပြိမ်းပိုက်ကို ဖြုတ်ပါ။

၃။
ခလုတ်ကို ဖိလိုက်ပါ။
မီးသတ်ဆေးရည်များ
ပိုက်ဝမှ ပန်းထွက်လာမည်။





၄။
ပိုက်ဝကိုကိုင်၍လွှဲပြီးမီးလောင်နေသောအောက်ခြေ
အကုန်လုံးကိုဖြန်းပါ။

အကြားအာရုံကိုကာကွယ်ပေးသောကိရိယာ



နားအဆို -မိမိနားနှင့်
သင့်လျော်သောအရွယ်ကိုသာ
ရွေးချယ်ရန် လိုသည်။



နားရွက်ဖုံး

အမြင့်ပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်လျှင်မပြုတ်ကျအောင် ထိန်းပေးသောကိရိယာ



အမြင့်မှမပြုတ်ကျစေရန်ထိန်းပေးသောခါးပတ်

လက်ကိုကာကွယ်ရန် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ

လက်ချောင်းများနှင့် လက်များသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်ခြင်း၊
ဓါတုရည်များလောင်ကျွမ်းခြင်း စသဖြင့် ထိခိုက်ခြင်းခံရရန် အလွန်လွယ်ကူသော
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်မှုများမှ
ကာကွယ်ရန် လက်အိတ်များ စွပ်ထားသင့်သည်။



လျှပ်ကာ လက်အိတ်
လျှပ်ကာလက်အိတ်ကို အတွင်းဘက်၌စွပ်၍
အပြင်တွင်သားရေလက်အိတ်ကို ထပ်မံစွပ်ခြင်းဖြင့်
လျှပ်ကာလက်အိတ်၏ စုတ်ပြဲမှုကို
ကာကွယ်ပေးရုံသာမက လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူးခြင်းမှ
ရာနှုန်းပြည့် ကာကွယ်နိုင်သည်။



သားရေလက်အိတ်
မျက်နှာပြင်မညီညာသော အရာဝတ္ထုနှင့်
ပူလောင်သော အရာဝတ္ထုများကို
အချိန်တိုတိုအတွင်း ကိုင်တွယ်ရာတွင် သုံးနိုင်သည်။
လေးလံသောပစ္စည်းများ မ,တင်ရန်နှင့် ဂဟေဆက်ခြင်း
လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။



အပူကာလက်အိတ်
ပူလောင်သောအရာများကို
အချိန်တိုတိုအတွင်း
ကိုင်တွယ်ရာတွင်
သုံးနိုင်သည်။



ဓာတုပစ္စည်းကာလက်အိတ်
အစိုင်အခဲ (သို့မဟုတ်)
အရည်ဖြစ်သော ဓာတုပစ္စည်းများမှ
ကာကွယ်နိုင်သော လက်အိတ်မှာ
လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သင့်လျော်သော
လက်အိတ်ဖြစ်ရမည်။




သံဇကာလက်အိတ်
အသွားထက်သော
အရာဝတ္ထုများကို
ကိုင်တွယ်ရာတွင်
အသုံးပြုသည်။

အရေးပေါ်မီးလောင်လျှင်



သတိကောင်းစွာထားပါ။ မီးခိုးများအောက်တွင် တွားသွား၍
ထွက်ပေါက်ကို ကြိုးစားရာဖွေပါ။



အခန်းအားမီးမကူးစေရန်
တံခါးပိတ်ထားပါ။

လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို
အဆင်သင့် ရှိနေပါစေ။

လျှောခါးသုံးပြီးထွက်ပြေးပါ။ ဓာတ်လှေကား မသုံးပါနှင့်။







မျက်အိမ်ဖုံးမျက်မှန်
အန္တရာယ်ကာမျက်မှန်များနှင့် ခိုင်မာမှုတူညီသော်လည်း
မျက်အိမ်တခုလုံးကို ဖုံးကာနိုင်သည်။ လေရူးပေါက်များ
ပါဝင်ကာ အကြေးခံနှင့် ဓါတုဗေဒပစ္စည်းခံဟူ၍
ခွဲခြားထားသည်။



ဂဟေဆော်မျက်မှန်
သံဖြတ်ဆက်ခြင်းများမှ ဖြစ်တတ်သော
စူးရှသည့်အလင်းရောင်နှင့် သံစများ၊ မီးပွင့်မီးပွားများ၊
ရောင်ခြည်နှင့် ဓါတုပစ္စည်းအစအနများ၊
အခိုးအငွေ့များမှ ကာကွယ်နိုင် သည်။



ဂဟေဆော်မျက်ကာ
လက်ကိုင်ဒိုင်း



ဂဟေဆော်မျက်ကာ
ဦးခေါင်းစွပ် သက်သက် ဟူ၍ ခွဲခြားထုတ်
လုပ်ထားသည်။



ဦးခေါင်းစွပ်များ
သည် အန္တရာယ်ကာဦးထုပ်နှင့် တဆက်တည်း
ဆက်စပ်ထားသည်။



ဦးခေါင်းစွပ်များ
ဓါတ်ငွေ့ကာ အစီခံမပါ



ဦးခေါင်းစွပ်များ
ဓါတ်ငွေ့ကာအစီခံနှင့် ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။

ကိုယ်ခန္ဓာကိုလုံခြုံစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ

ဦးခေါင်းပိုင်းကာကွယ်ရန်ကိရိယာဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်သည် ဦးခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ် ဖြတ်စီးမှု၊ အပူလောင်ကျွမ်းမှုများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ဦးထုပ်၏ ခိုင်မာမှုမှာ ထုတ်လုပ်ရန်အမာခံကုန်ကြမ်း ပေါ်တွင် မူတည်၍



အထက်ဖိအားကာသင့်သော်



ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးအုပ်ဆောင်းသောပုံသင့်သော်ဟူ၍ခွဲခြားထား သည်။

မျက်နှာနှင့်မျက်လုံးကိုကာကွယ်ပေးသောကိရိယာ

ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ဂဟေဆော်သည့်လုပ်ငန်း၊ တွင်ခုံနှင့် ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းများမှ အခိုးအငွေ့နှင့် အမှုန်အစများ မျက်လုံးအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ကိရိယာများကို အသုံးပြုရန်လိုသည်။ မျက်နှာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ကိရိယာများမှာ လုပ်ငန်းခွင်အလိုက် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်သည်။



- **အန္တရာယ်ကာမျက်မှန်**

သာမန်မျက်များနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် တူသော်လည်း မှန်သားပိုမိုခိုင်မာသည်။ထိခိုက်ဆောင့်မိခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းနိုင်ခြင်း၊ အပူရှိန်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ တိုက်ဖြတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းများကို ခုခံနိုင်သည်။

အဝတ်အစားမီးစွဲလောင်ခြင်း




အခြားနေရာသို့ မီးမကူးစေရန် လှုပ်ရှားခြင်းမပြုပါနှင့်။



သတိကောင်းစွာထားပါ။

မီးငြိမ်းအောင် မြေပြင်ပေါ်တွင် လိမ့်ပါ။



ဝန်ချိုစက်ယာဉ်များသုံးခြင်း

ဝန်ချိုစက်မ,တင်သည့်လက်တံများ ပေါ်တွင် ရပ်မနေနှင့်။



ပစ္စည်းများကို ဝန်ချိုစက်ယာဉ်မောင်း သူအမြင်ကွယ်အောင် အမြင့်ကြီးမတင်ပါနှင့်။အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။



အလုပ် လုပ်သောဝတ်စုံ



- အကျီအနားစများကို ဘောင်းဘီအတွင်းသို့ ထည့်ပါ။
- ကြယ်သီးများအားလုံးတပ်ပါ။
- ဖိုင်ဘာဦးထုပ်ကို မေးကြိုးတပ်ပါ။
- မျက်မှန်၊ မျက်ကာတပ်ပါ။
- နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်ကာများစည်းပါ။
- နားကြပ်တပ်ပါ။
- လုပ်ငန်းခွင် ဖိနပ်စီးပါ။
- ချွန်ထက်သော၊ ရှစေတတ်သော အရာများ၊မီးလောင်စေတတ်သော အရာများအိတ်ကပ်ထဲတွင်မထည့် ထားပါနှင့်။
- ဖော်ပြပါအလုပ်ဝတ်စုံနှင့် ကိရိယာများ မရှိလျှင် ဆင်တူသောပစ္စည်းကိရိယာများကို ရှာဖွေခြင်း၊ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးအသုံးပြုပါ။



အလိုအလျောက်မီးစွဲနိုင်သောအရာများ
ဖေါ့စ်ဖေါရပ်အဖြူ ၊ ဖေါ့စ်ဖေါရပ်အဝါ၊ ဆိုဒီယမ်ဆာဖိုက် စသောဓါတ်များသည် ပြင်ပလေထုနှင့်တွေ့ ထိပါက ငါးမိနစ်အတွင်း မီးထတောက်လောင်နိုင်သည်။



ရေနဲ့ထိတွေ့၍မီးစွဲခြင်း
ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗိုက်၊ ဆိုဒီယမ်မီဘိန်း၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် စသောဓါတ်များသည် ရေနှင့်ထိစပ်ပါက မီးထတောက်လောင်နိုင်သည်။



အဆိပ်ရှိဝတ္ထု
ပြဒါးရည်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးရည်နှင့် ခဲစသည်များကို ရှူရှိုက်ခြင်း၊ စားသုံးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပွတ်တိုက် ထိခိုက်မိပါက အနည်းငယ်သောပမာဏပင် ဖြစ်စေသော်လည်း လူကို သေစေနိုင်သည်။



ရောဂါပိုးစွဲကပ်နေသောအရာဝတ္ထုများ
သုံးစွဲပြီးသောဆေးထိုးအပ်များ၊ဆေးရုံမှအမှိုက်သရိုက်များကို အသုံးပြုပါက ရောဂါများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။



ဓာတ်ရောင်ခြည်
ယူရေနီယမ်၊ ကိုဘော့်၊ ရေဒီယမ် စသည်များသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ရောင်ခြည် များဖြစ်သည်။



လောင်ကျွမ်းနိုင်သောအရာဝတ္ထု
ဆိုဒီယမ်အက်ဆစ်၊ ဆာဖြူရစ်အက်ဆစ်၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ခြောဆိုဒ်များသည် အရေပြားကို ထိခိုက်လောင်ကျွမ်းနိုင်၍ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်။



အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အရာဝတ္ထုများ
- ကတ္တရာစေး - သတ္တုကျိုဖိုများမှ အပြားများ

ပစ္စည်းများကိုစင်မေါ်တွင် အမြင့်ကြီးစီ, တင်ထားခြင်းဖြင့်ပြုတ်ကျကာ ထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။




ဝန်ချီစက်သွားရာမဟုတ်သောလမ်းကြောင်း သို့သာ သွားလာလှုပ်ရှားပါ။



ဝန်ချီစက်ယာဉ်များသုံးခြင်း

ဝန်ချီစက်မောင်းနှင်သူသည်လမ်းသွားလမ်းလာများ ရှောင်တိမ်းရန် ဟွန်းတီး(သို့) အချက်ပြပေးပါ။

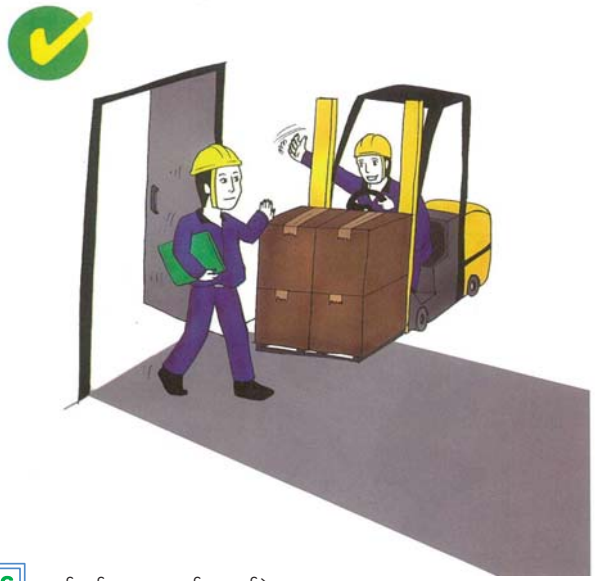

ဓါတုဗေဒပစ္စည်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များပေါ်မှ အမှတ်သင်္ကေတများ



ပေါက်ကွဲနိုင်သောပစ္စည်းများ
ပေါက်ကွဲရန်လွယ်ကူသော T.N.T ယမ်းဘီလူးနှင့် မီးရှူး၊ မီးပန်းများသည် ဆောင့်ကျမှု၊ ပွတ်တိုက်မှု အပူရှိန်များနှင့် ကြုံပါက အလွယ်တကူ ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။



မီးလောင်လွယ်သောဓါတ်ငွေ့
ချက်ပြုတ်ရာတွင် သုံးသည့်ဓါတ်ငွေ့၊ ဟိုက်ထရိုကျင်ဓါတ်ငွေ့၊ မီသိန်းဓါတ်ငွေ့၊ အဆီတိုင်လင်း ဓါတ်ငွေ့များမှာ မီးပွားနှင့်ထိတွေ့လျှင် မီးလောင်တတ်သည်။



မီးစွဲရန်ခက်ခဲ၍ အဆိပ်အတောက်ကင်းသည့်ဓါတ်ငွေ့
မီးစွဲရန်ခက်ခဲသော်လည်း ဓာတ်ငွေ့ထည့်ထားသောဗူးများ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင့်ကျခြင်း၊ ထုရိုက်ခြင်း၊ အပူရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပြုိက်ခြင်းများ ခံရပါက ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။



အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့
ကလိုရင်းဓါတ်ငွေ့၊ အမိုးနီးယား၊ ဟိုက်ထရိုကျင်ကလိုရိုဒ် စသောဓါတ်ငွေ့များကို ရှူရှိုက်မိပါက အသက်ကို သေစေနိုင်သည်။



မီးစွဲလွယ်သောဓာတ်ရည်များ
ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ စသောလောင်စာဆီများ၊ ဆေးရောင်ရောစပ်သော တင်နာဆီ စသည့်ဓာတ်ရည်များမှာ မီးပွင့်၊ မီးပွားများနှင့် ထိစပ်ပါက မီးစွဲလွယ်သည်။



မီးစွဲလွယ်သောဝတ္ထုများများ
ကန့်၊ မီးခြစ် စသည်တို့မှာ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ အပူရှိန်ပေးခြင်း များခံရပါက မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းလွယ်သည်။

29. အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့


အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့

ပင်လယ်စာသို့လောင်သိမ်းဆည်းထားသောစည်(သို့)အခန်းများမှ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ရှူရှိုက်မိခြင်းမှကာကွယ်ရန် အဖုံးမဖွင့်ခင် နာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်သင့်သည်။





9. ဝန်ချီစက်ယာဉ်များသုံးခြင်း

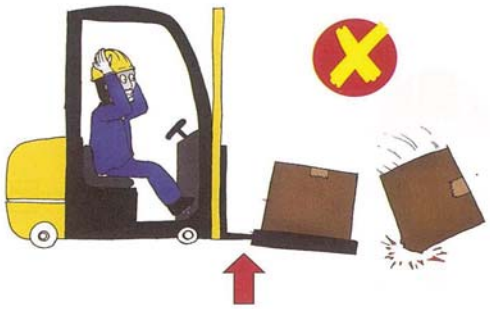

ပစ္စည်းများကို မတင်ခင်
စက်၏လက်တံများ ယာဉ်နှင့်သေချာ
ချိတ်ဆက်မှုရှိ ၊မရှိ စစ်ဆေးပါ။



10. လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း

လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း



လက်များ၊ ကိုယ်ခန္ဓာများ
ရေစိုနေလျှင် (သို့)
အနီးအနားတွင်
ရေထွန်း အိုင်နေလျှင်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို
မသုံးပါနှင့်။ လျှပ်စစ်မီးခလုတ်များ၊
အသုံးပြုရမည့် ကိရိယာများ၊
ပျက်စီးချွတ်ယွင်းနေလျှင်
ချက်ချင်းပြုပြင်ပါ။



ပျက်စီးချွတ်ယွင်းနေသော
လျှပ်စစ်သုံး ပစ္စည်းများကို
အသုံးမပြုပါနှင့်။ လျှပ်စစ်သုံး
ပစ္စည်းများအားလည်း
သန့်ရှင်းစွာထားပါ။



ဓာတ်လိုက်ပါက စိတ်ကို
ငြိမ်သက်စွာထားပြီး ခလုတ်ကို
ဝိတ်ပါ။



28. အအေးခန်းတွင်အလုပ်လုပ်ရခြင်း

အအေးခန်းတွင်အလုပ်လုပ်ရခြင်း



အအေးခန်းထဲသို့မဝင်မီနွေးထွေးသောအဝတ်အစားနှာရွက်
ဖုံးသောဦးထုပ်နှင့်ရေခဲများဖြင့်ချော်လဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန်
သံမဏိထိပ်ဦး ပါသောလည်ရှည်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ပါ။


27. ဓာတုဆေးပစ္စည်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း





ဓာတုဆေးပစ္စည်းများကြောင့် အရေပြား ယားယံခြင်း (သို့) သတိမေ့မြောခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ ဓာတုဆေး ပစ္စည်းများ ကိုယ်တွင်းသို့ အမြောက်များ ဝင်ရောက်ပါက ကင်ဆာရောဂါများပင် ဖြစ်ပွားတတ်သည်။

ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်သော ဓာတုဆေး ပစ္စည်းများကို သီးခြားခွဲထားပြီး ဘူးများ၊ ပုလင်းများ ထဲတွင် ထည့်၍ အမှုံးကို ကောင်းစွာ ပိတ်ထား ရမည်။ မည်သည့် ဓာတုဆေး ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြောင်း ဘူးများ၊ ပုလင်းများ ပေါ်တွင် ထင်ရှားစွာ ရေးမှတ် ထားရမည်။

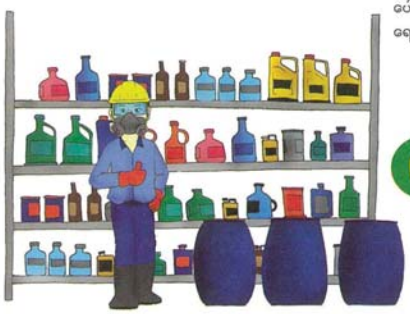

တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတော်ချင်းမတူသောဓာတုဆေးများကိုအတူတကွမထားပါနှင့်။ ဥပမာ-အချို့ဓာတုဆေးပစ္စည်းများအားထားရှိသောနေရာသည်ခြောက်သွေ့ပြီး စိုစွတ်ခြင်းကင်းခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ရမည်။နေရောင်ထိုးခြင်း၊အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာများတွင် လည်းမထားသင့်ပါ။

10. လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း



ဓာတ်လိုက်သူအား အဝတ်ဖြင့် ဆွဲယူကယ်တင်ပါ။



အလုပ်လုပ်နေစဉ် လက်အိတ်များ၊ ရာဘာအိတ်များ၊ မျက်မှန်များ၊ ဒေါက်မြင့်သောဖိနပ်များ၊ အခွံမာသော ဦးထုပ် စသည့် အကာအကွယ် ပစ္စည်းများ ဆောင်းခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။

11. ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်သံဂဟေဆော်ရခြင်း

ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်သံဂဟေဆော်ရခြင်း




မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများနှင့် ပေါက်ကွဲ ဖေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများအနီး အလုပ် လုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများလည်း လုပ်ငန်း အနားတွင် မထားရ။





ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊

မီးငြိမ်းသတ်နိုင်သော ကိရိယာ အနီးတွင် အဆင်သင့် ထားရှိရမည်။

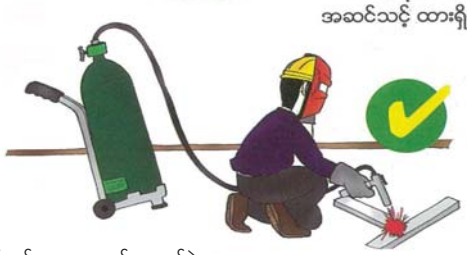

27. ဓာတုဆေးပစ္စည်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း

ဓာတုဆေးပစ္စည်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း



ဓာတုဆေးပစ္စည်းများသည် နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့် လူ့ကိုယ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ လူကိုယ်တိုင်က ဓာတုဆေးပစ္စည်းများကို သွားရောက်ထိတွေ့ရခြင်း (သို့) ဓာတုဆေးပစ္စည်းများက လူ့ကိုယ်တွင်းသို့ စီးဝင်ရောက်ရှိသွားခြင်း။




ဓာတုဆေးပစ္စည်းအရည်၊ အမှုန့်နှင့် ဓာတ်ငွေ့များကို လူ့နှာခေါင်းမှတဆင့် ရှူရှိုက်မိခြင်း။




အစာစားစဉ် လက်များသည် ဓာတုဆေး ပစ္စည်းများ ပေကျံနေတတ်ခြင်းကြောင့် ထိုမှတဆင့် လူ့ကိုယ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း

အလုပ်လုပ်ပြီးတိုင်း လက်များကိုကောင်းစွာ စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောရမည်။

ပစ္စည်းများကို ထွက်ပေါက် တွင်ပိတ်မထားရ။

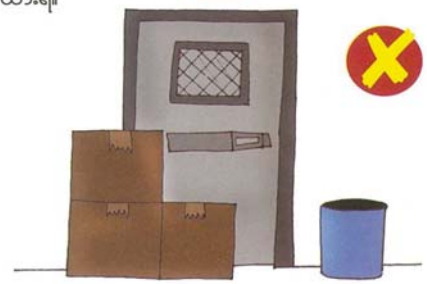

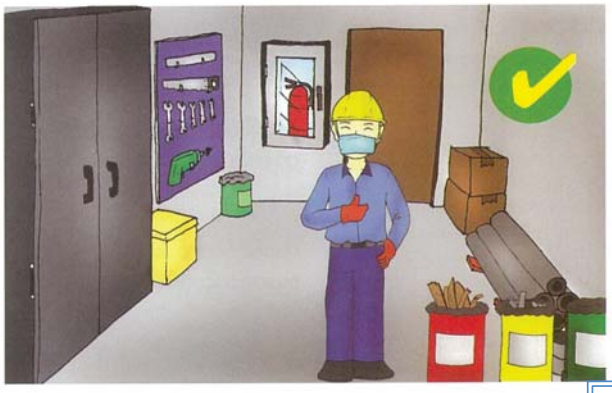

လျှပ်စစ်ဖြင့်သံဂဟေဆော်ခြင်း

မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ အနီးတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။





မီးငြိမ်းသတ်နိုင်သော ကိရိယာ အနီးတွင်အဆင်သင့်ထားရှိရမည်။

စူးရှသော အလင်းကို ကာကွယ်ရန် မျက်စိကာနှင့် အလင်းကို ကာကွယ်ရန် အထူးပြုလုပ်ထားသော မျက်မှန်တို့ကို အသုံးပြုသင့်သည်။



အခိုးအငွေ့ပျံတတ်သောရေနံဆီ၊ဓာတ်ဆီ၊သင်းနှာ၊ပေါက်ကွဲစေတတ်သောအရာဝတ္ထုများဖြင့်ပတ်သက်ရသောလုပ်ငန်း

မီးလောင်စေတတ်သော သတ္တုများ၊ ဖိတ်ကျနေလျှင်လည်း လုံခြုံအောင် သိမ်းဆည်းပါ။ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အရာများအား လေဝင်၊ လေထွက်ရှိသောနေရာတွင်ထားပါ။




မီးလောင်လွယ်သောအရည်များအနီး၊မီးလောင်လွယ်သောအရာများဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။




မီးအန္တရာယ်ကာကွယ်သောကိရိယာအမြဲ အဆင်သင့်ဖြစ်ရမည်။

လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို စနစ်တကျ ထားရှိခြင်း။

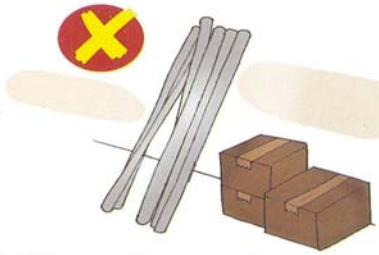

ပစ္စည်းကိရိယာများကို သူ့နေရာနှင့်သူ သေချာကျနစွာ သိမ်းဆည်းပါ။

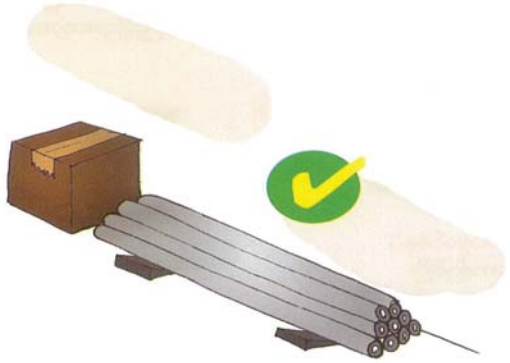

ပစ္စည်းများ မ တင်သည့်နည်း



ပစ္စည်းများမ,တင်ရာတွင် ကိုယ်ခန္ဓာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး
ရှေ့သို့ခြေလှမ်းနိုင်မည့် ပုံမှန်အနေအထားဖြစ်ရမည်။

ခါးကိုဖြောင့်တန်းစွာထားပြီးကိုယ်ကို
လျှောချရမည်။(ဒူးညွတ်ပေးပါ)





လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို
ကိုယ်နှင့်ကပ်ထားပါ။
လက်မောင်းကို ကိုယ်နှင့်ခွာ
ထားခြင်းမပြုရ။



မ,ရမည့် ပစ္စည်းအားမြဲမြံစွာ
ကိုင်တွယ်ပါ။ (လက်ဖဝါးဖြင့်
သေချာဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း
ဖြင့် လက်မှလွတ်သွားခြင်း၊
လျှောကျသွားခြင်းမှ
ကာကွယ်နိုင်မည်။)



မ,ရမည့်ပစ္စည်းကို ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်
အနီးဆုံးကပ်ထားခြင်းသည်
ပစ္စည်းအလေးချိန်ကို
ခြေနှစ်ဖက်ကြားတွင်
ညီမျှစွာထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမပြုရ။ မီးလောင်စေတတ် သောပစ္စည်းများကိုဓာတုဆေးပစ္စည်းအနားတွင် မထားရပါ။

အဖုံး





အငွေ့ပျံပြီး မီးလောင်စေတတ်သော
အရည်များ ပေကျံနေသည့် အဝတ်
အစားများအား ပုံး၊ သေတ္တာများတွင် ထည့်ပြီး
အလုံပိတ်ထားရမည်။ မီးအပူရှိန်များနှင့်
ဝေးကွာအောင်ထားပါ။



ဤသို့သော မီးလောင်ပြီး ပေါက်ကွဲ
စေတတ်သော အရာဝတ္ထုများ ထိတွေ့.
ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့် အရေပြားရောဂါ
ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

မီးလောင်စေတတ်သောအရည်များ
ဖိတ်လျှင် လျင်မြန်စွာ
ဆေးကြော သိမ်းဆည်းပါ။

ကျောက်ဖြတ်စက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း


ကျောက်ဖြတ်စက်မှလွှင့်စင်လာတတ်သော
စက်သွားကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။
အသုံးမပြုခင်စက်သွားကို သေချာတပ်ဆင်ပါ။
ထိုစက်အသုံးပြုရာနားတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။





ကျောက်ဖြတ်စက်မှထွက်လာသောအမှုန်များသည်မျက်လုံးများအတွင်း၊
နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီး
အသက်ရှူရန်ခက်ခဲခြင်း၊ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊
ပန်းနာရင်ကြပ်ဖြစ်ခြင်း၊မောပန်းခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်
နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်စည်းများသုံးရမည်။

ပစ္စည်းအလွန်လေးလံပါက ဝိုင်းကူပြီး မ, ပြောင်းပါ (သို့) ကူသယ်နိုင်မည့် ကိရိယာပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များကို ရှာပါ။ ပစ္စည်းများမ, ရာတွင် အချင်းချင်းသဘောပေါက် နားလည်စေပြီးမှ အချက်ပေး၍ တူညီစွာ မ, တင်ပါ။

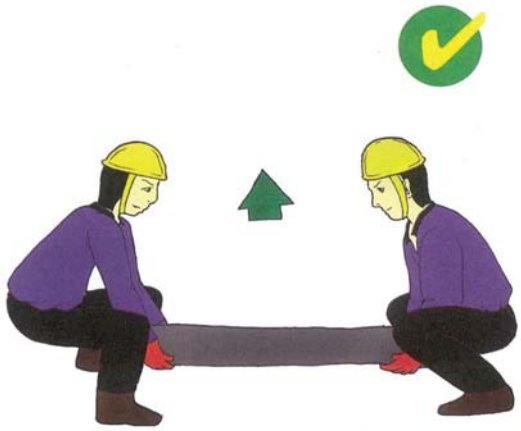

ပစ္စည်းများ မ ခြင်း၊ရွှေ့ခြင်း

သယ်စရာပစ္စည်းများ၊ များလျှင် စုစည်းချည်နှောင်ပြီးမှသယ်ဆောင်ပါ။









လက်သုံးကိရိယာများကို
ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးပါ။
အသုံးပြုရန် အမြဲအဆင်သင့်
ဖြစ်နေရမည်။



ကိရိယာ လက်သုံးပစ္စည်းများကို
နေရာတကျ သိမ်းဆည်းထားရန်
လိုသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်
အန္တရာယ်များကို
ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။



ပစ္စည်းများ အမြင့်ပိုင်းတွင်ရှိပါက
လှေခါးကို သုံးပါ။





ခြေလက်ကြွက်သားများ
ညှစ်သုံးရသော
လွန်စွာလေးလံသည့်
ပစ္စည်းများ မ, ခြင်း၊
ရွှေ့ခြင်းကို ရှောင်ပါ။



လေးလံသောပစ္စည်းများ သယ်မ,
နေစဉ် ဘယ်ဖက်၊ ညာဖက်သို့
လျင်မြန်စွာ လှည့်ပြောင်းခြင်း
မပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက
ခါးကြောများ မျက်တတ်သည်။



ပစ္စည်းများ မ ခြင်း၊ရွှေ့ခြင်း





မ, တင်ရမည့် ပစ္စည်းများသည် အနိမ့်ပိုင်း ဒူးခေါင်းအောက်တွင်ရှိပါက
မိမိကိုယ်ခန္ဓာအား အောက်သို့ လျော့ကျစေပြီးမှ မ, တင်ပါ။
ဒူးခေါင်းကွေးပြီး အားသုံးပါ။

လွှ





လက်ဖြင့်ဖိနှိပ်ခြင်းကြောင့်
အကြော၊ အဆစ်၊
အရိုးများ နာကျင်ကိုက်ခဲပြီး
အနာတရဖြစ်ပွားနိုင်သည်။





မောပန်းလာလျှင် ခေတ္တအနားယူခြင်း၊
ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထား ပြောင်းလဲခြင်းများ
ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ပါက
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်
ဖြစ်ပွားခြင်း၊ အနာရောဂါ ရရှိခြင်းမှ
ကာကွယ်နိုင်သည်။



ကိုယ်နှင့် အနေတော်ဖြစ်သော
အဝတ်အစား များကိုသာ
ဝတ်ဆင်သင့်သည်။
ပွယောင်းသော၊ တင်းကျပ်သော
အဝတ်အစားများ မဖြစ်စေရ။
လျှောတတ်သော ဖိနပ်မျိုးမစီးဘဲ
ဖိုင်ဘာဦးထုပ်ဆောင်းခြင်းတို့သည်
ရှောင်တခင် ဘေးရန် ဖြစ်ခြင်းမှ
ကာကွယ်နိုင်သည်။








အမြင့်ပိုင်းလေ့ခါးများတွင် အလုပ်လုပ်ရခြင်း



လေကားတက်ခါနီးတွင်
လေကားဂျက်ကျမကျကို စစ်ဆေးပါ။

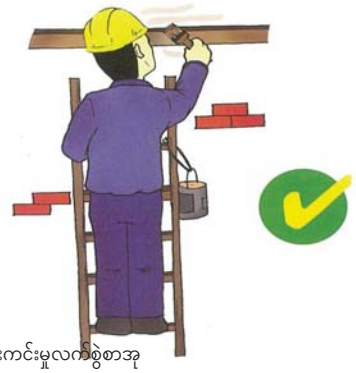

လျှပ်စစ်အားသုံးလွှဲ



အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို
ထိခိုက်စေသော ရောဂါများနှင့်
အဆုတ်ရောဂါများသည်
လေထုအတွင်း
ပျံ့နှံ့နေသော အမှုန်နှင့်
အညစ်အကြေးများကို
ရှူရှိုက်မိုး နှာခေါင်းအတွင်း
မှတဆင့် ကိုယ်တွင်းသို့
ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။

အလုပ်လုပ်နေစဉ် စကားပြောဆိုခြင်း၊
ကျီစယ်နောက်ပြောင် ကစားခြင်းတို့မှ
ရှောင်ကြဉ်ပါ။





အမှားအယွင်း တစုံတရာဖြစ်ပွားလျှင် ကိရိယာခလုတ်
(သို့) ပလပ်ကို ချက်ချင်း ပိတ်ပါ။ ဖြုတ်ပါ။



အနာတရဖြစ်ပွားသူရှိပါက မည်မျှထိခိုက် နာကျင်ကြောင်း အကဲခတ်ပါ။ ရှေးဦး သူနာပြုနည်းဖြင့်
ကူညီစောင့်ရောက်ပြီး ဆေးရုံသို့ အမြန်ပို့ပါ။

အလုပ်မလုပ်မီ အဝတ်အစားကို
သေသပ် ကျနစွာဝတ်ဆင်ပါ။
အင်္ကျီစကို ဘောင်းဘီ အတွင်းသို့
ထည့်ပြီး ကြယ်သီးများအား လုံးကို
တပ်ဆင်ပါ။ အန္တရာယ်ကာကွယ်သည့်
ကိရိယာများ၊ မျက်မှန်
စသည်တို့ကို တပ်ဆင်ပါ။

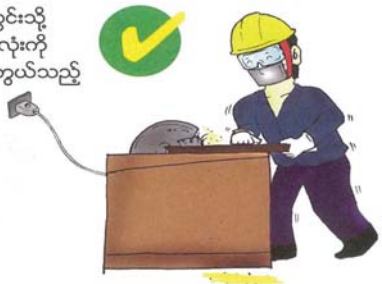






လေကားကို ရွှေ့မသွားစေရန်
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း
ကိရိယာအမျိုးမျိုးဖြင့်
ထိန်းထားနိုင်သည်။





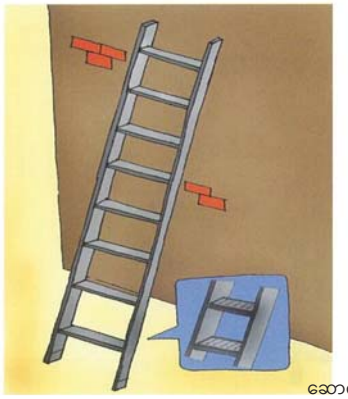

လျှောမကျစေရန်
လေကားထစ်များတွင်
လိုင်းများရှိသင့်သည်။

23. အမြင့်ပိုင်းလေ့ခါးများတွင် အလုပ်လုပ်ရခြင်း


အမြင့်ပိုင်းလေ့ခါးများတွင် အလုပ်လုပ်ရခြင်း

လေ့ကားကို ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် အသုံးပြုနေစဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်က မြဲမြံစွာ ကိုင်ထားပေးရမည်။



18. ကရိန်းစက်သုံးခြင်း

ကရိန်းစက်သုံးခြင်း




ဓမြဲပေါ်မှ ပစ္စည်းကို မ,မခင်သေချာချည်နှောင်၍ ချိန်းကြိုးများကိုစစ်ဆေးပါ။




မ,တင်နေစဉ် ပစ္စည်းအောက်တွင် မည်သူမျှ မနေစေနှင့်။

19. ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာတွင်အလုပ်လုပ်ရခြင်း

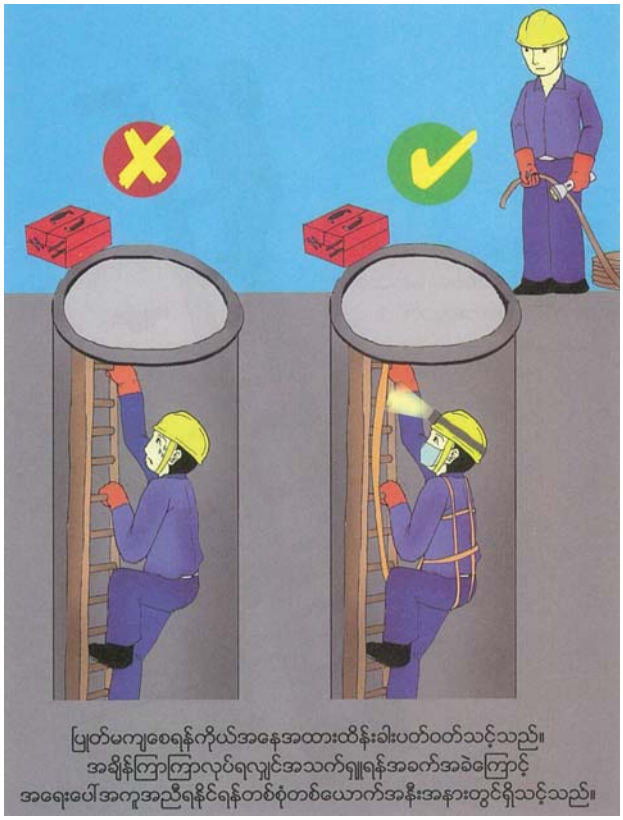

ပြုတ်မကျစေရန်ကိုယ်အနေအထားထိန်းခါးပတ်ဝတ်သင့်သည်။
အချိန်ကြာကြာလုပ်ရလျှင်အသက်ရှူရန်အခက်အခဲကြောင့်
အရေးပေါ်အကူအညီရနိုင်ရန်တစ်စုံတစ်ယောက်အနီးအနားတွင်ရှိသင့်သည်။

22. ညှိမ်းဆင်၍အလုပ်လုပ်ရခြင်း

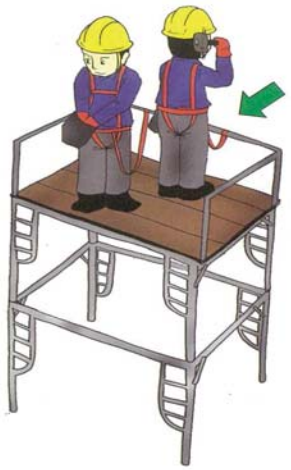

အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ခါးချည်နှောင်ရသော ကြိုးတပ်ကိရိယာကို သုံးပါ။



အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဘီးတပ်ထားသော ညှိမ်းစင်အား တွန်းခြင်းမပြုရ။

ဘီးတပ်ညှိမ်းစင်ကိုအသုံးမပြုခင် ဘီးလုံးများကိုဘရိတ်အုပ်ထားရမည်။

ညှိမ်းဆင်ရှိအလုပ်လုပ်ရခြင်း



ပစ္စည်းအမျိုးချင်းမတူသော
အရာများဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော
ညှိမ်းမှာ မခိုင်မြဲပါ။



ဖောက်စက်၊တုံခါသောစက်များ



မြေမှုန့်၊ အမှိုက်မှုန့်များ နှာခေါင်းတွင်း၊
ပါးစပ်တွင်းမှတဆင့် အဆုတ်အတွင်းသို့
ဝင်ရောက်ပြီး အဆုတ်ရောဂါ၊
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ထိခိုက်စေသော
ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။



တုံခါမှုရှိသော စက်များကို
ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုခြင်း (သို့)
မကြာခဏ အသုံးပြုခြင်းကြောင့်
သွေးလည်ပတ်မှု ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ
လက်များ၊ လက်ချောင်းများ
ထုံကျင်လာပြီး ထိတွေ့ခံစားမှု
အာရုံပျောက်ဆုံးနိုင်သည်။


အလုပ်လုပ်စဉ် လက်အိတ်များအသုံးပြုခြင်း၊ မျက်မှန်များတပ်ဆင်ခြင်း၊
ပါးစပ် နှာခေါင်းများကိုအဝတ်ဖြင့်ပိတ်စည်းပြီးကာကွယ်ခြင်း
ပြုလုပ်သင့်သည်။



တုံခါသောစက်များ ဆက်တိုက်သုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ ထိုစက်များသုံးလျှင်
ခေတ္တနားခြင်း၊ ရက်ခြားချိန်လုပ်ခြင်းနှင့် လက်များတွင် ထိတွေ့ခံစားမှုကို
မသိရှိနိုင်တော့ပါက ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံပြသရန်လိုသည်။

ဘူဒိုဇာ

ဘူဒိုဇာ ယာဉ်နားတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
အလုပ်လုပ်ရလျှင်လည်းအကာအကွယ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော
ဖိုင်ဘာဦးထုပ်၊လက်အိတ်၊ဖိနပ် နှင့် နားပိတ်ကိရိယာတို့ကိုတပ်ဆင်ပါ။

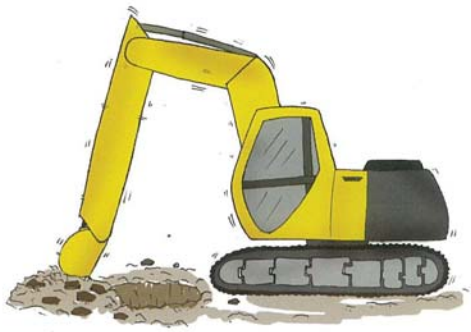



เอกสารแนบ 2-13
บันทึกการอบรมคนงาน

VISAVAPAT

เอกสารใบเซ็นรับทราบกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

Training Course
เรื่องที่อบรม ความปลอดภัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย

Instructor
ผู้ฝึกสอน [redacted]

Location
สถานที่อบรม [redacted]

Data
วันที่อบรม 1/11/65

Time
เวลา 08.00

No. ลำดับ	Name ชื่อ - นามสกุล	Position ตำแหน่ง	Contractor บริษัท	Signature ลายเซ็น	No. เลขบัตร
1	[redacted]	นักศึกษาฝึกงาน		[redacted]	
2	[redacted]	นักศึกษาฝึกงาน			
		ไฟฟ้า			

หมายเหตุ : เมื่อผ่านการอบรม ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามความกฎระเบียบของหน่วยงาน

[redacted]

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

VISAVAPAT

อบรมก่อนเริ่มงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2565





VISAVAPAT

เอกสารใบเซ็นรับทราบกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

Training Course
เรื่องที่อบรม ความปลอดภัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย

Instructor
ผู้ฝึกสอน ชล. ศุภัช สีดา

Location
สถานที่อบรม ออฟฟิต D Condo panaa

Data
วันที่อบรม 9 พ.ค 65

Time
เวลา 19:30

No. ลำดับ	Name ชื่อ - นามสกุล	Position ตำแหน่ง	Contractor บริษัท	Signature ลายเซ็น	No. เลขบัตร
1	Zaw	ช่างเชื่อม	ดีเรก	[redacted]	
2	Mint	"	"		
3	Ano	"	"		
4	Myo	"	"		
5	Win	"	"		
6	Maung	"	"		
7	Aung	"	"		
8	Tun	"	"		
9	Ko	"	"		

หมายเหตุ : เมื่อผ่านการอบรม ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามความกฎระเบียบของหน่วยงาน

[redacted]

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

VISAVAPAT

อบรมก่อนเริ่มงาน

วันที่ 8/11/2565





VISAVAPAT

เอกสารใบเซ็นรับทราบกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

Training Course
เรื่องที่อบรม ความปลอดภัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย

Instructor
ผู้ฝึกสอน น.ส. [redacted]

Location
สถานที่อบรม ออฟฟิต D Condo panaa

Data
วันที่อบรม 8 พ.ย. 65

Time
เวลา 14 : 20

No. ลำดับ	Name ชื่อ - นามสกุล	Position ตำแหน่ง	Contractor บริษัท	Signature ลายเซ็น	No. เลขบัตร
1	[redacted]	ช่างเทคนิค	ชุดนี้	[redacted]	
2	[redacted]	〃	〃		
3	[redacted]	〃	〃		
4	[redacted]	〃	ชุดนี้		
5	[redacted]	〃	〃		

หมายเหตุ : เมื่อผ่านการอบรม ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามความกฎระเบียบของหน่วยงาน

[redacted]

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

VISAVAPAT

อบรมก่อนเริ่มงาน

วันที่ 8/11/2565





เอกสารแนบ 2-14
บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน Covid-19

เอกสารแนบ 2-15
แผนความปลอดภัยประจำปี

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

VISAVAPAT COMPANY LIMITED

โครงการ : D Condo Panaa

แผนงานความปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2565

ที่	รายละเอียด	มิ.ย. 2565		ก.ค. 2565		ส.ค. 2565		ก.ย. 2565		ต.ค. 2565		พ.ย. 2565		ธ.ค. 2565		ม.ค. 2565		ก.พ. 2566		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-28		
	งานตรวจสอบและปรับปรุง																				
1	ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยอุปกรณ์ / เครื่องมือ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวัน / 1. เดือน
2	ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของเครื่องจักร	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวัน / ทุกเดือน
3	ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทาวเวอร์เครน (ปจ.1)	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุก 1 เดือน
4	ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโมบายเครน (ปจ.2)		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุก 1 เดือน
5	ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป.	ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน
6	ตรวจสอบสภาพรุปกรณ์ไฟฟ้า	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ช่างไฟฟ้า	ทุกวัน / ทุกเดือน
7	จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย																	↔		จป.	
	กิจกรรมความปลอดภัย																				
8	จัดทำบอร์ดความปลอดภัย / ข่าวสารความปลอดภัย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวันที่ 22 ของเดือน
9	จัดสนทนาความปลอดภัย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวันพุธ
10	จัดกิจกรรมออกกำลังกายก่อน Morning Talk	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวันอังคาร
	กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม																				
11	จัดเตรียมน้ำดื่ม / น้ำใช้ ในหน่วยงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวัน
12	จัดให้มีการจัดทำความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวัน
	การดำเนินงานด้านความปลอดภัย																				
13	แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประจำหน่วยงาน									↔	↔									จป.	
14	จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำหน่วยงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป.	สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
15	จัดทำป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายสัญลักษณ์	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป.	ทุกเดือน
	งานประจำ																				
16	การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยประจำวัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป.	ทุกวัน
17	สรุปการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยประจำสัปดาห์	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป.	ทุกสัปดาห์
18	สรุปการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยประจำเดือน QC SAFETY		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔	จป.	ทุกสิ้นเดือน
19	การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวัน / เดือน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป. / ควบคุมเครื่องจักร	ทุกวัน / ทุกเดือน
20	การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำวัน / เดือน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ช่างไฟฟ้า	ทุกวัน / ทุกเดือน
21	การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ถังดับเพลิงประจำสัปดาห์ / เดือน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป.	ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน
22	สรุปรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ	↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		จป.	ทุกเดือน / ทุกครั้งที่มี
23	สรุปรายงานอุบัติเหตุประจำเดือน	↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		จป.	ทุกต้นเดือน
24	สรุปรายงานการสนทนาความปลอดภัยประจำเดือน	↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		จป.	ทุกต้นเดือน
25	สำรวจตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ PPE	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป./ ผู้ควบคุมงาน	ทุกวัน
26	กำหนดกฎระเบียบมาตรฐานการทำงานเพื่อความปลอดภัย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	จป.	
27	สรุปรายงานผลการดำเนินงานความปลอดภัย (จป.ว)													↔	↔					จป.	ทุก 6 เดือน

อนุมัติโ[redacted]

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

เ[redacted]

จป.วิชาชีพ

เอกสารแนบ 2-16
บันทึกตรวจสอบถังดับเพลิง

VISAVAPAT

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ชนิด (Type) CO_2

Serial No. 3 ขนาด (Size) 10 P

MONTHS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	INSPECTOR
JANUARY	/	/	/	/	
FEBRUARY	/	/	/	/	
MARCH	/	/	/	/	
APRIL	/	/	/	/	
MAY	/	/	/		
JUNE					
JULY					
AUGUST					
SEPTEMBER					
OCTOBER					
NOVEMBER					
DECEMBER					

VISAVAPAT

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ชนิด (Type) CO_2

Serial No. 2 ขนาด (Size) 10 P

MONTHS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	INSPECTOR
JANUARY					
FEBRUARY					
MARCH					
APRIL					
MAY	/	/			
JUNE					
JULY					
AUGUST					
SEPTEMBER					
OCTOBER					
NOVEMBER					
DECEMBER					

VISAVAPAT

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ชนิด (Type) CO_2

Serial No. 1 ขนาด (Size) 10 P

MONTHS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	INSPECT
JANUARY	/	/	/	/	
FEBRUARY	/	/	/	/	
MARCH	/	/	/	/	
APRIL	/	/	/	/	
MAY	/	/	/	/	
JUNE					
JULY					
AUGUST					
SEPTEMBER					
OCTOBER					
NOVEMBER					
DECEMBER					

VISAVAPAT

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ชนิด (Type) CO_2

Serial No. 5 ขนาด (Size) 10 P

MONTHS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	INSPECTOR
JANUARY	/	/	/	/	
FEBRUARY	/	/	/	/	
MARCH	/	/	/	/	
APRIL	/	/	/	/	
MAY	/	/	/	/	
JUNE					
JULY					
AUGUST					

VISAVAPAT

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ชนิด (Type) CO_2

Serial No. 4 ขนาด (Size) 10 P

MONTHS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	INSPECTOR
JANUARY	/	/	/	/	
FEBRUARY	/	/	/	/	
MARCH	/	/	/	/	
APRIL	/	/	/	/	
MAY	/	/	/		
JUNE					
JULY					

VISAVAPAT

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

ชนิด (Type) CO_2

Serial No. 1 ขนาด (Size) 10 P

MONTHS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	INSPE
JANUARY	/	/	/	/	
FEBRUARY	/	/	/	/	
MARCH	/	/	/	/	
APRIL	/	/	/	/	
MAY	/	/			
JUNE					

เอกสารแนบ 2-17
ประกาศป้องกันระงับอัคคีภัย

VISAVAPAT

ประกาศ

ที่ 007/2565

เรื่อง มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการ **D Condo Panaa**

เพื่อการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในโครงการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อทั้งเจ้าของงานและของบริษัทฯ การได้รับการบาดเจ็บ ขาดรายได้จากการหยุดงาน หรืออาจทำให้สูญเสียชีวิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ฉะนั้นพนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ D Condo Panaa ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการก่อสร้าง

1. จัดให้มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานภายในอาคารทุกชั้น เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

4. จัดให้มีป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ และทางออกทุกอาคารอย่างน้อย 2 ทาง ที่สามารถอพยพคนทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย

5. จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

7. มีการตรวจสอบการชำรุดของถังลม ถังแก๊สอยู่เสมอ

8. สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับครั้งละ 500 บาท

9. ห้ามเผาขยะ จุดไฟ ก่อไฟ รวมถึงวัสดุอื่นๆ หรือภายในโครงการโดยเด็ดขาด

10. เครื่องจักร (TC) ควรมีสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ลงชื่อ [redacted]

ผู้ช่วยจัดการโครงการ

เอกสารแนบ 2-18
แผนผังผู้รับผิดชอบโครงการ

VISAVAPAT

โครงการ : DCONDO PANAA

บริษัทผู้โครงการ : Sansiri Public CO.,LTD

Site Staff Organization Chart

