ภาคผนวก ฉ.

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ฉ.1

แผน PM ประจำปี 2566 และ Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล

Generator

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE ____SRM____Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN											Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EE	Gen	1	Generator	C	1	ห้องเครื่องผลิต C	Gen-C-1-01	CUMMIN	-	J930521098	750 KVA		W	W	W/S	W	W	W/S	W	W	W/S	W	W	W/S	CUMMIN

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUATERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ _____ ผู้บริหารหน่วยงาน
Date/วันที่ 5/01/2023

ลงชื่อ _____ โครงการผู้จัดการ
Date/วันที่ 5/01/2023

รับรองโดย
ลงชื่อ _____
Date/วันที่ 5/01/2023

ATALIAN

Daily Checklist for Generator
แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำรอง ประจำวัน

Generator: C1 เดือน: สิงหาคม / 2566

Day	Selector SW. Auto	Selector SW. Manual	1	2	3	4	5	6	7	Hours	Hours	บันทึกแรงดัน / กระแสไฟฟ้า (C)	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	✓			895								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	วิชาญ	ไม่ผ่านเกณฑ์
2	✓			890								DC. Voltage 28.9 V. Ampere 1 A.	วิชาญ	29 ผ่าน
3	✓			900								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	วิชาญ	
4	✓			900								DC. Voltage 28 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
5	✓			900								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
6	✓			900								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
7	✓			900								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
8	✓			896								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
9	✓			895								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
10	✓			895								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
11	✓			895								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
12	✓			895								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
13	✓			895								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
14	✓			898								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	Test Run
15	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
16	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
17	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
18	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
19	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
20	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
21	✓			898								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
22	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	Test Run
23	✓			885								DC. Voltage 28 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
24	✓			894								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
25				[illegible]								DC. Voltage V. Ampere A.		
26	✓			887								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
27	✓			886								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
28	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
29	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
30	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	
31	✓			890								DC. Voltage 29 V. Ampere 1 A.	[illegible]	

Code	PM Program (Daily)
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]

ผู้ตรวจสอบ วิชาญ (illegible)

วันที่ 31/8/66

สรุปผลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ: ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ (-) ไม่ตรวจสอบ

Generator Weekly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Building / อาคาร: C

Specification Data : 750 KVA.

วันที่เดือน/ปี: 15/12/66

Description / รายละเอียด		Standard Rate มาตรฐาน	Before Start ก่อนการเริ่มเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automode เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record		FULL	FU			
Water Temperature Record		70-95 °C				
Oil Temperature Record						
Oil Pressure Record		500 KPa				
Oil Level Record		Full	Fu			
Fan Tension		ไม่หลวมเกินไป	ปก			
Smoke Condition		ดำ ขาว			ดำ/ขาว	
Diesel Level Record		>70%	(D)		(OO)	
Vibrator & Noise		ปกติ/ดัง/แรง			ปกติ/ดัง/แรง	
Speed Record		1,500 rpm			1,500 RPM	
Voltage Record	Phase-Phase / คู่สาย RS	380 - 420 V.			400 V.	
	Phase-Phase / คู่สาย ST	380 - 420 V.			400 V.	
	Phase-Phase / คู่สาย TR	380 - 420 V.			400 V.	
Frequency Record		50 Hz.			50 Hz	
Battery Terminals connected		แน่นไม่ขาด	ปกติ			
Specific Gravity of Distilled Water Battery		1.25 - 1.28	1.25			
Distilled Water of Battery		กันดี	ปกติ			
Battery Charger		ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ			
Battery Voltage Record		24 - 30 Volt	28 V.		28 V.	
Battery Ampere Record		0.15 - 0.5 A.	0.5 A.		0.5 A.	
Testing Period (Min.)		10 - 15 นาที			10 นาที	
Engine Operating Hour (Reading)			9744.9		9744.8	
Check ตรวจสอบ: ดวงไฟ / สภาพเครื่องยนต์			Inspection / ตรวจสอบ			
[illegible]			[illegible]			
[illegible]			[illegible]			
[illegible]			[illegible]			

สรุปผลการตรวจเช็ค: [illegible]

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature] Tech. Sup/หัวหน้าช่าง

Date/วันที่: 15/12/66

Time/เวลา: 07.00 - 08.00

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature]

Date/วันที่: 15/12/66

Time/เวลา:

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark: ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ - No Check / ไม่ตรวจสอบ

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

รหัสเอกสาร: [illegible]

Building / อาคาร: C

Specification Data : 750 KVA.

Description / รายละเอียด	Standard Rate อัตรามาตรฐาน	Before Start ตรวจสอบก่อนเริ่ม	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☑ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record	Full	Full			
Water Temperature Record	20-95 °C			65 °C	
Oil Temperature Record				60 °C	
Oil Pressure Record	300 KPA			550 KPA	
Oil Level Record	Full	Full			
Belt Tension		ปกติ			
Smoke Condition	ปกติ			ปกติ	
Diesel Level Record	>75%	750		840	
Vibration & Noise	ปกติ ไม่มีเสียงผิดปกติ			ปกติ	
Speed Record	1,500 RPM			1,500 RPM	
Voltage Record Phase-Phase / ช่วง RS	380 - 420 V			390 V	
Phase-Phase / ช่วง ST	380 - 420 V			390 V	
Phase-Phase / ช่วง TR	380 - 420 V			390 V	
Frequency Record	50 Hz			50 Hz	
Battery Terminals connected	แน่นไม่ขยับ	แน่น			
Specific Gravity of Distilled Water Battery	1.20-1.25	1.25			Exp 30/9/67
Distilled Water of Battery	Full	Full			
Battery Charger	มีไฟแสดงสถานะ	มี/ได้			
Battery Voltage Record	24 - 30 VDC	25 V.		27 V.	
Battery Amperes Record	0.10 - 0.5 A.	1 A.		1 A.	
Testing Period (Min.)	10 - 15 Min.			10 Min.	
Engine Operating Hour (Reading)		790.1		792.9	
Check Visual Inside / ตรวจสอบภายใน	Inspection / ตรวจสอบ				
Run Engine / เดินเครื่อง	เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ 2 ชุดสำรอง				
Test Load / ทดสอบโหลด	ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ 2 ชุดสำรอง				
Test Auto Start / ทดสอบเดินเครื่องอัตโนมัติ 750 Kw Transformer	ทดสอบผ่าน				

สรุปผลการตรวจสอบ: ใช้งานได้ ปกติ ไม่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature] Tech. Sup./ช่างหัวหน้างาน

Date/วันที่: 5/9/67

Time/เวลา: 09.00 - 09.10

Verified by / รวบรวมโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature]

Date/วันที่: 6/9/67

Time/เวลา: 7.30

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark / กรุณาใส่ N. Normal / ปกติ A. Abnormal / ผิดปกติ – No Check / ไม่ได้ตรวจสอบ

FM-FAC-004 Rev.0 (01/12/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

รหัสเอกสาร: [illegible]

Building / อาคาร: C

Specification Data : 750 KVA.

Description / รายละเอียด	Standard Rate อัตรามาตรฐาน	Before Start ตรวจสอบก่อนเริ่ม	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☑ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record	Full	Full			
Water Temperature Record	20-95 °C			65 °C	
Oil Temperature Record				60 °C	
Oil Pressure Record	300 KPA			550 KPA	
Oil Level Record	Full	Full			
Belt Tension		ปกติ			
Smoke Condition	ปกติ			ปกติ	
Diesel Level Record	>75%	750		840	
Vibration & Noise	ปกติ ไม่มีเสียงผิดปกติ			ปกติ	
Speed Record	1,500 RPM			1,500 RPM	
Voltage Record Phase-Phase / ช่วง RS	380 - 420 V			390 V	
Phase-Phase / ช่วง ST	380 - 420 V			390 V	
Phase-Phase / ช่วง TR	380 - 420 V			390 V	
Frequency Record	50 Hz			50 Hz	
Battery Terminals connected	แน่นไม่ขยับ	แน่น			
Specific Gravity of Distilled Water Battery	1.20-1.25	1.25			Exp 30/9/67
Distilled Water of Battery	Full	Full			
Battery Charger	มีไฟแสดงสถานะ	มี/ได้			
Battery Voltage Record	24 - 30 VDC	25 V.		27 V.	
Battery Amperes Record	0.10 - 0.5 A.	0.3 A.		0.5 A.	
Testing Period (Min.)	10 - 15 Min.			10 Min.	
Engine Operating Hour (Reading)		789.1		792.9	
Check Visual Inside / ตรวจสอบภายใน	Inspection / ตรวจสอบ				
Run Engine / เดินเครื่อง	เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ 2 ชุดสำรอง				
Test Load / ทดสอบโหลด	ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ 2 ชุดสำรอง				
Test Auto Start / ทดสอบเดินเครื่องอัตโนมัติ 750 Kw Transformer	ทดสอบผ่าน				

สรุปผลการตรวจสอบ: ใช้งานได้ ปกติ ไม่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature] Tech. Sup./ช่างหัวหน้างาน

Date/วันที่: 6/9/67

Time/เวลา: [illegible]

Verified by / รวบรวมโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature]

Date/วันที่: 6/9/67

Time/เวลา: 9.30

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark / กรุณาใส่ N. Normal / ปกติ A. Abnormal / ผิดปกติ – No Check / ไม่ได้ตรวจสอบ

FM-FAC-004 Rev.0 (01/12/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRIRAYONG HOSPITAL

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

วันที่เดือนปี 15/9/66

Building / อาคาร C

Specification Data : 750 KVA.

Description / รายละเอียด	Standard Rate มาตรฐาน	Before Start ก่อนการสั่งเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record	FULL	Full			
Water Temperature Record	30-85 °C			65°C	
Oil Temperature Record				60°C	
Oil Pressure Record	550 KPA			550 KPA	
Oil Level Record	Full	Full			
Belt Tension	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ			
Silicone Condition	ดี/ไม่ดี	ดี			
Diesel Level Record	>70%	695		840	
Vibration & Noise	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ		ปกติ	
Speed Record	1,500 RPM	1,500 RPM		1,500 RPM	
Voltage Record Phase Phase / เฟส RS	380 - 400 V	400 V		400 V	
Phase Phase / เฟส ST	380 - 400 V	400 V		400 V	
Volt / Unit (Phase Phase / เฟส TR	380 - 400 V	400 V		400 V	
Frequency Record	50 Hz	50 Hz		50 Hz	
Battery Terminals connected	ขั้วแน่นดี	ดี		ดี	
Specific Gravity of Distilled Water Battery	1.20-1.25	1.25			Exp 20/9/67
Distilled Water of Battery	Full	Full			
Battery Charger	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ			
Battery Voltage Record	24 - 30 Volt	27 Volt		27 Volt	
Battery Amperes Record	0.15 - 0.5 A	0.1 A		0.1 A	
Testing Period (Min.)	10 - 15 Min	10 min		10 min	
Engine Operating Hour (Reading)		783.3		785.6	
[illegible]		Inspection / การตรวจ			
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					

สรุปผลการตรวจเช็ค Test Run ปกติ ไม่มีปัญหา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น [signature] Tech. Sup./หัวหน้างาน

Date/วันที่ 15/9/66

Time/เวลา 09:30 - 09:40

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น [signature]

Date/วันที่ 15/9/66

Time/เวลา 9.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / ถ้าไม่มีให้ใส่ N/A ในช่องนี้ครับ

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ • No Check / ไม่ได้ตรวจสอบ

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRIRAYONG HOSPITAL

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

วันที่เดือนปี 14/8/66

Building / อาคาร C

Specification Data : 750 KVA.

Description / รายละเอียด	Standard Rate มาตรฐาน	Before Start ก่อนการสั่งเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record	FULL	Full			
Water Temperature Record	30-85 °C			75 C°	
Oil Temperature Record				60 C°	
Oil Pressure Record	550 KPA			550 kPA	
Oil Level Record	Full	Full			
Belt Tension	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ			
Silicone Condition	ดี/ไม่ดี			ดีพอใช้	
Diesel Level Record	>70%	695		840	
Vibration & Noise	ปกติ/ไม่ปกติ			ปกติ/ไม่ปกติ	
Speed Record	1,500 RPM			1500 RPM	
Voltage Record Phase Phase / เฟส RS	380 - 400 V			400	
Phase Phase / เฟส ST	380 - 400 V			400	
Volt / Unit (Phase Phase / เฟส TR	380 - 400 V			400	
Frequency Record	50 Hz			50 Hz	
Battery Terminals connected	ขั้วแน่นดี	แน่น			
Specific Gravity of Distilled Water Battery	1.20-1.25	1.25			Exp 20/9/67
Distilled Water of Battery	Full	Full			
Battery Charger	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ			
Battery Voltage Record	24 - 30 Volt	27 Volt		27 Volt	
Battery Amperes Record	0.15 - 0.5 A	0.5A		0.5 A	
Testing Period (Min.)	10 - 15 Min			10 min	
Engine Operating Hour (Reading)		782.6		787.7	
[illegible]		Inspection / การตรวจ			
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					

สรุปผลการตรวจเช็ค Test Run ปกติ ไม่มีปัญหา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น [signature] Tech. Sup./หัวหน้างาน

Date/วันที่ 14/8/66

Time/เวลา 09:20 - 09:40

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น [signature]

Date/วันที่ 14/8/66

Time/เวลา 9.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / ถ้าไม่มีให้ใส่ N/A ในช่องนี้ครับ

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ • No Check / ไม่ได้ตรวจสอบ

FM-FAC-004 Rev.0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศิริราช
SIRIRAJ HOSPITAL

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

วันที่เดือนปี: 17/7/66

Building / อาคาร: C

Specification Data : 750 KVA.

Description / รายละเอียด	Standard Rate	Before Start	☐ Manual	☑ Automatic	Remark
Coolant Water Level Record	100%	Full			
Water Temperature Record	70-90 °C			65 °C	
Oil Temperature Record				60 °C	
Oil Pressure Record	350 kPa			550 kPa	
Oil Level Record	Full	Full			
Belt Tension	ไม่หลวมไม่ตึง	ปกติ			
Smoke Condition	ดำ ขาว			ดำปนขาว	
Diesel Level Record	>70%	760		755	
Vibration & Noise	ผิดปกติ ปกติ			ปกติ/ดี	
Speed Record	1,500 RPM			1,500 RPM	
Voltage Record — Phase / คู่สาย RS	380 - 420 V			390 V	
Voltage Record — Phase / คู่สาย ST	380 - 420 V			390 V	
Voltage Record — Phase / คู่สาย TR	380 - 420 V			390 V	
Frequency Record	50 Hz			50 Hz.	
Battery Terminals connected	ต่อ ไม่ต่อ	ต่อ			
Specific Gravity of Distilled Water Battery	1.20-1.25	1.25			
Distilled Water of Battery	Full	Full			ดี 10/7/66
Battery Charger	ทำงาน ไม่ทำงาน	ปกติ			
Battery Voltage Record	24 - 30 VDC	27		27	
Battery Amperes Record	0.15 - 0.3 A	0.5		0.5	
Testing Period (Min.)	10 - 15 Min			10 Min	
Engine Operating Hour (Reading)		785.9		786.1	
Check exhaust and fuel connection leakage		Inspection / ตรวจสอบ			
☐ ☐ ☐					

สรุปผลการตรวจเช็ค: ปกติ ดี

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature]

Date/วันที่: 17/7/66

Time/เวลา: 09.00 -09.10

Tech. Sup./ช่างหัวหน้างาน

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น: [signature]

Date/วันที่: 17/7/66

Time/เวลา: 10.00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ต้องการ

Please Mark ✓ No need / ไม่ต้อง × Abnormal / ผิดปกติ - No Check / ไม่ได้ตรวจสอบ

FM FAC-004 Rev 0 (01/11/2015)

Cummins DKSH (Thailand) Limited
2106 Panthee 4 Building, Sukhumvit Road,
Phrakhanong Tai, Phrakhanong,
Bangkok 10260 Thailand
Phone +66 2 301 7300
Fax +66 2 333 0947

Power Generation

CUMMINS GENSET INSPECTION REPORT

Owner Name & Address: SIRIRAJ HOSPITAL

Equipment Manufacturer: USA

Equipment Model: VOLVO J8 S/N: J930557898

Engine Model: VOLVO S/N: 33238.8

Generator Type: — S/N: —

Type Control: DCL 700 MA / Type ATS: —

Hour: 7803 Kw: 400 Hz: 50

Amp: 1023 Volt: 230/400 Phase: 3

CHECK BEFORE START

ENGINE	GENERATOR	AUTO TRANSFER SWITCH
✓ Air Cleaner Unobstructed	✓ In/Outlet Unobstructed	— Available Normal Source
✓ Battery Fully Charged	— Grease Bearing	— Expected Emer. Source
✓ Full Coolant Level	✓ Circuit Breaker	— Control Fuse
✓ Radiator Unobstructed	✓ Anunciator Lamp Test	— Undervoltage Set ... %
✓ Proper Engine Oil Level	✓ Battery Charger on	— Overvoltage Set ... %
✓ Fan Belt Tension	✓ Dc Amp/Meter Check	— Mechanical Inter Lock
✓ Starter Motor	✓ Connector	— Electrical Inter Lock
— DCA Test		— Exercise Timer Check
✓ No Leaking Anywhere		— Motor Drive Circuit Breaker

CHECK DURING RUN SPEED

WITHOUT LOAD		WITHOUT LOAD	
✓ Water Temp. 69 °C	✓ Voltage Stability	— Idle — Rpm.	✓ Voltage Show Correct
✓ Oil Temp. 100 °F	✓ Frequency 50 Hz	✓ Run 1500 Rpm.	✓ Frequency 50 Hz
✓ Oil Press. 70 Psi	— Volt Dip when loaded	— Water Temp. Sw. Test	✓ Manual Operation
✓ Run 1500 Rpm.	— Rec. ... Sec./Dip ... %	— Oil Pres. Sw. Test	— Automatic Operation
✓ Alternator Charge	✓ Volt/Hz Active	— Over Speed Test	✓ Ventilation adequate
✓ Clear Exhaust Smoke	✓ Voltage	— Over Crank Test	— No dust or smal particles
	R 390 S 390 T 390		

Remarks or action taken: ลงน้ำมันเครื่องเพิ่ม 2 ลิตร

CDT Service Personal

Sign: [signature]

(Print name): [illegible]

Date: 11/7/23

Customer

Sign: [signature]

(Print name): [illegible]

Date: 11/7/23

ใบรายงานช่าง
Technician Report

pm

เลขที่ 3029

เลขที่ 151410

รหัสงาน Job No. 1357 4126.

วันที่ Date 11/01/23

ชื่อลูกค้า Customer Name ว.ณ ปิ่นวิทยา

หน่วยงาน Job Site

ชื่อช่าง Technician Name

รุ่น Model KTM362 หมายเลข Serial No. 3312 5368

วันเริ่มใช้งาน Date In Service

ชั่วโมงใช้งาน Operating Hrs. 9859

เวลาเริ่ม Starting Time	เวลาสิ้นสุด Stopping Time	เวลา Hrs.	รหัส Code	รายละเอียด Description
				- ทำความสะอาด ตรวจเช็ค
				- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันไฮดรอลิค
				- เช็คแบตเตอรี่ = 12.2 VDC
				- เช็คระดับ oil H, เช็คไส้กรอง oil H
				- เช็คสายพาน V-belt
				- Test ระบบ manual, touch station
				- เช็ค VSD, Hz, rpm ต่างๆ
				- เช็ค oil pressure, oil temp.
				- เช็ค lamp ต่างๆ
				- เช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น ไม่มี No on Table

เวลาทำงานปกติ NT : ..... รวม Total NT ..... ชม. Hrs. ☑ งานแล้วเสร็จ Job done

ทำงานล่วงเวลา OT : ..... รวม Total NT ..... ชม. Hrs. ☐ งานยังไม่เสร็จ Job incomplete

เวลาเดินทางไป : ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

เวลาเดินทางกลับ : ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

รวมเวลาเดินทาง Total traveling hrs ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. รวมระยะทาง Total ..... กม. Kms. เหมือนเดิม 32538

การทำงานครั้งนี้ – pm ตามรอบ

Complaint

สาเหตุการชำรุด –

Cause of failure

เงื่อนไขการซ่อม 1. อยู่ในระหว่างการรับประกัน (Warranty Coverage) ☑ Y ☐ N

Coverage 2. คิดค่าใช้จ่ายลูกค้า (Charge to customer) ☐ Y ☑ N

การแก้ไข – เช็คตามรอบ pm, ทำความสะอาด ตรวจเช็ค

Correction

ข้อเสนอแนะ – ตรวจสอบ ปรับตั้ง น้ำมันเครื่อง ระดับน้ำยาหล่อเย็น ปรับตั้งสายพาน

Recommendation

ลงชื่อหัวหน้างาน Service Supervace Sign .....

วันที่ Date ..... / ..... / .....

ลงชื่อลูกค้า Customer's Sign ..... ว.ณ [illegible]

Mobile phone .....

E-mail Address .....

Main Distribution(MDB)

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE ____SRH____.Rev.00

[illegible]	[illegible]
[illegible]	Rev.03
[illegible]	1/9/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN											Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EE	MDB	1	MDB	C	1	ห้องเครื่องไฟฟ้า C	MDB-C-1-01	Asefa	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	M	Y/S	M	M	
EE	EMDB	1	EMDB	C	1	ห้องเครื่องไฟฟ้า C	EMDB-C-1-01	Asefa	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	M	Y/S	M	M	

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUATERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ [illegible] ผู้บริหารหน่วยงาน
Date/วันที่ 5/01/2023

อนุมัติโดย
ลงชื่อ [illegible] วิศวกรปฏิบัติการ
Date/วันที่ 5/01/2023

รับทราบโดย
ลงชื่อ [illegible] General Support HOD ผู้ว่าจ้าง
Date/วันที่ 5/01/2023

ATALIAN

แบบฟอร์มตรวจเช็คอุณหภูมิห้อง MDB,UPS MDB

เดือน กรกฎาคม / 2566

วันที่	เวลา	อุณหภูมิ (°c)				ระบบการทำงาน UPS		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		MDB ROOM	UPS ROOM	ภายในอาคาร	ภายนอกอาคาร	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	07.00-08.00	26	23.8	26	34	/			
2	07.00-08.00	26	25.9	26	35	/			
3	07.00-08.00	27	24.4	26	35	/			
4	07.00-08.00	27	25.9	26	37	/			
5	07.00-08.00	27	26.8	26	34	/			
6	07.00-08.00	27	24.5	26	35	/			
7	07.00-08.00	26	26.8	26	34	/			
8	07.00-08.00	26	25.3	26	33	/			
9	07.00-08.00	26	23.8	26	34	/			
10	07.00-08.00	26	27.4	26	33	/			
11	07.00-08.00	26	26.7	26	32	/			
12	07.00-08.00	26	26.6	26	33	/			
13	07.00-08.00	26	25.4	26	34	/			
14	07.00-08.00	26	24.7	26	35	/			
15	07.00-08.00	26	24.7	26	34	/			
16	07.00-08.00	26	24.3	27	35	/			
17	07.00-08.00	27	27.7	26	35	/			
18	07.00-08.00	27	27.8	27	35	/			
19	07.00-08.00	26	26	26	35	/			
20	07.00-08.00	26	26	26	35	/			
21	07.00-08.00	25	25.1	25	33	/			
22	07.00-08.00	26	25.6	26	34	/			
23	07.00-08.00	26	23.4	26	33	/			
24	07.00-08.00	26	23.7	26	29	/			
25	07.00-08.00	26	25.6	26	30	/			
26	07.00-08.00	26	26.1	26	33	/			
27	07.00-08.00	26	27.0	26	33	/			
28	07.00-08.00	26	26.1	26	32	/			
29	07.00-08.00	26	25.9	26	32	/			
30	07.00-08.00	26	25.2	26	31	/			
31	07.00-08.00	26	25.7	26	30	/			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ (ไม่เกิน 25 องศา)

× = ผิดปกติ (เกิน 25 องศา)

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 1-8-66

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

แบบฟอร์มตรวจเช็ค Main Distribution Broad (MDB)

วันเดือนปี 8/11/66

	MAIN DISTRIBUTION BOARD	EQUIPMENT CODE :		MDB-C-01		EMDB-C-01		CAP C-01	AMCC-C-01
	TASK	Standards	Period						
1	Check Status Of All Indication / ตรวจเช็คสภาพของ Indicator ต่างๆ	N	M	N		N		N	N
	1.1 ตรวจเช็คแรงดันไฟ และแอมป์ MDB	N	M	N		N		N	N
	1.2 ตรวจเช็คแรงดันไฟ และ CAP BANK	N	M	N		N		N	N
	1.3 ตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสวิทช์ตัวเลือกและอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งปกติหรือไม่	N	M	N		N		N	N
	1.4 ตรวจสอบบุคคลากรให้ในผู้ดูแลหรือไม่	N	M	N		N		N	N
	1.5 สังเกตุดูสายไฟมีการผิดปกติจากความร้อนหรือไม่	N	M	N		N		N	N
2	Check All Meters & Record Voltage,Curent &Amp/ ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกแรงดัน , กระแสไฟฟ้า	380 - 420 V	M	400	401	401	401	401	399	398	398	399
		____ AMP		534	477	500	168	166	167	49	51	56	89	87	91
3	ตรวจเช็ค Capasitor Bank /ตรวจสอบสภาพของ Cap Bank และบันทึกกระแสไฟฟ้า	380 - 400 V	M												
		AMP													
4	Check For General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	M	N		N		N		N	
5	Check all Circuit Breaker Condition/ ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	N	M	N		N		N		N	
6	Check Fuses & Protections Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	N		N		N		N	
7	Check Casing For Condition / ตรวจสอบสภาพตู้อุปกรณ์	N	M	N		N		N		N	
8	ตรวจเช็คฟิวส์ และ อแท่า PF			0.98		0.98		0.98		0.98	

RECORD CODE

/ = Do PM , X = Dont PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ตรวจสอบ	APPROVE BY
วันที่ 8/11/66	วันที่ 8/11/66	วันที่

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

แบบฟอร์มตรวจเช็ค Main Distribution Broad (MDB)

วันเดือนปี 7/12/66

	MAIN DISTRIBUTION BOARD	EQUIPMENT CODE :		MDB-C-01		EMDB C-01		CAP C-01	AMCC-C-01
	TASK	Standards	Period						
1	Check Status Of All Indication / ตรวจเช็คสภาพของ Indicator ต่างๆ	N	M	N		N		N	N
	1.1 ตรวจเช็คแรงดันไฟ และแอมป์ MDB	N	M	N		N		N	N
	1.2 ตรวจเช็คแรงดันไฟ และ CAP BANK	N	M	N		N		N	N
	1.3 ตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสวิทช์ตัวเลือกและอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งปกติหรือไม่	N	M	N		N		N	N
	1.4 ตรวจสอบบุคคลากรให้ในผู้ดูแลหรือไม่	N	M	N		N		N	N
	1.5 สังเกตุดูสายไฟมีการผิดปกติจากความร้อนหรือไม่	N	M	N		N		N	N
2	Check All Meters & Record Voltage,Curent &Amp/ ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกแรงดัน , กระแสไฟฟ้า	380 - 420 V	M	401	401	400	401	401	401	399	330	331	399	401	400
		____ AMP		540	478	504	167	167	165	50	51	52	89	90	90
3	ตรวจเช็ค Capasitor Bank /ตรวจสอบสภาพของ Cap Bank และบันทึกกระแสไฟฟ้า	380 - 400 V	M												
		AMP													
4	Check For General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	M	N		N		N		N	
5	Check all Circuit Breaker Condition/ ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	N	M	N		N		N		N	
6	Check Fuses & Protections Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	N		N		N		N	
7	Check Casing For Condition / ตรวจสอบสภาพตู้อุปกรณ์	N	M	N		N		N		N	
8	ตรวจเช็คฟิวส์ และ อแท่า PF			0.98		0.98		0.99		0.99	

RECORD CODE

/ = Do PM , X = Dont PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ตรวจสอบ	APPROVE BY
วันที่ 7/12/66	วันที่ 7/12/66	วันที่

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

แบบฟอร์มตรวจเช็ค Main Distribution Broad (MDB)

วันที่ตรวจ 12/9/66

MAIN DISTRIBUTION BOARD	EQUIPMENT CODE :		MDB-C-01	EMDB-C-01	CAP-C-01	AMDC-C-01
TASK	Standards	Period				
1 Check Status Of All Indicator / ตรวจเช็คสถานะของไฟแสดงต่างๆ	N	M	✓	✓	✓	✓
1.1 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB	N	M	✓	✓	✓	✓
1.2 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
1.3 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
1.4 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
1.5 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
2 Check All Meters & Record Voltage, Current & ตรวจเช็คมิเตอร์ต่างๆ / ตรวจสอบการทำงานมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่าแรงดัน , กระแสไฟฟ้า	380 - 420 V	M	406	406	406	406
	____ AMP		716	131	224	130	167	163	43	8	66	261	32	163
3 ตรวจเช็ค Capacitor Bank ตรวจสอบการทำงาน Cap Bank และบันทึกการตรวจเช็ค	380 - 420 V	M												
	AMP													
4 Check For General Operations & Condition / ตรวจสอบการทำงานทั่วไป	N	M	✓	✓	✓	✓
5 Check all Circuit Breaker Condition/ ตรวจสอบการทำงานเบรคเกอร์	N	M	✓	✓	✓	✓
6 Check Relay & Protections Device / ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	✓	✓	✓	✓
7 Check Cooling Fan Condition / ตรวจสอบการทำงานพัดลม	N	M	✓	✓	✓	✓
8 ตรวจเช็คค่าไฟฟ้า และ power factor			0.98	0.99	0.99	0.99

RECORD CODE

/ = Do Pid , X = Don't Pid , N = Normal , AB = Abnormal , - = Also Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค วันที่ 12/9/66

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 11/9/66

APPROVE BY วันที่

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

แบบฟอร์มตรวจเช็ค Main Distribution Broad (MDB)

วันที่ตรวจ 15/10/66

MAIN DISTRIBUTION BOARD	EQUIPMENT CODE :		MDB-C-01	EMDB-C-01	CAP-C-01	AMCC-C-01
TASK	Standards	Period				
1 Check Status Of All Indicator / ตรวจเช็คสถานะของไฟแสดงต่างๆ	N	M	✓	✓	✓	✓
1.1 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB	N	M	✓	✓	✓	✓
1.2 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
1.3 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
1.4 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
1.5 ตรวจเช็คเบรคเกอร์ MDB CAP BANK	N	M	✓	✓	✓	✓
2 Check All Meters & Record Voltage, Current & ตรวจเช็คมิเตอร์ต่างๆ / ตรวจสอบการทำงานมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่าแรงดัน , กระแสไฟฟ้า	380 - 420 V	M	406	406	406	406
	____ AMP		716	131	224	130	167	163	43	8	66	261	32	163
3 ตรวจเช็ค Capacitor Bank ตรวจสอบการทำงาน Cap Bank และบันทึกการตรวจเช็ค	380 - 420 V	M												
	AMP													
4 Check For General Operations & Condition / ตรวจสอบการทำงานทั่วไป	N	M	✓	✓	✓	✓
5 Check all Circuit Breaker Condition/ ตรวจสอบการทำงานเบรคเกอร์	N	M	✓	✓	✓	✓
6 Check Relay & Protections Device / ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	✓	✓	✓	✓
7 Check Cooling Fan Condition / ตรวจสอบการทำงานพัดลม	N	M	✓	✓	✓	✓
8 ตรวจเช็คค่าไฟฟ้า และ power factor			0.98	0.98	0.98	0.96

RECORD CODE

/ = Do Pid , X = Don't Pid , N = Normal , AB = Abnormal , - = Also Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค วันที่ 15/10/66

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 15/10/66

APPROVE BY วันที่

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

แบบฟอร์มตรวจเช็ค Main Distribution Broad (MDB)

วันที่/Date 10/7/66

MAIN DISTRIBUTION BOARD	EQUIPMENT CODE		MDB-C-01	EMDB-C-01	CAP-C-01	AHCC-C-01
TASK	Standards	Period				
1 Check Status Of All Indicators / ตรวจเช็คสถานะของไฟแสดงสถานะต่างๆ	N	M	N	N	N	N
1.1 ตรวจเช็คขนาดไฟ และแน่นไฟ MDB	N	M	N	N	N	N
1.2 ตรวจเช็คขนาดไฟ และ CAP BANK	N	M	N	N	N	N
1.3 ตรวจเช็คสภาพการทำงานของไฟสัญญาณเตือนต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	N	N	N	N
1.4 ตรวจเช็คอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า	N	M	N	N	N	N
1.5 ตรวจเช็คการทำงานของพัดลมระบายความร้อนภายในตู้	N	M	N	N	N	N
2 Check All Motors Efficiency / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	380 - 400 V ____ AMP	M	42 40	44 42	44 42	28 26	32 30	36 34	38 36
การตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ต่างๆ และปั๊มน้ำต่างๆ, กระแสไฟฟ้า			54 51	55 52	60 57	40 38	44 42	50 47	52 49
3 ตรวจเช็ค Capacitor Bank สภาพการทำงานของ Cap Bank และปริมาณกระแสไฟฟ้า	380 - 400 V AMP	M							
4 Check For General Operations & Condition / ตรวจเช็คการทำงานทั่วไป	N	M	N	N	N	N			
5 Check all Circuit Breaker Condition / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเบรกเกอร์	N	M	N	N	N	N			
6 Check Fuses & Protective Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	N	N	N	N			
7 Check Casing For Condition / ตรวจเช็คสภาพตู้ควบคุม	N	M	N	N	N	N			
8 ตรวจเช็คอื่นๆ และ อย่างๆ			0.92	0.91	0.92	0.91			

RECORD CODE

(/) = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS รอผลเสร็จสิ้นการซ่อม

ผู้ตรวจเช็ค ____ วันที่ 10-7-66

ผู้ตรวจสอบ ____ วันที่ 10/7/66

APPROVE BY ____ วันที่ ____

FM-FAC-xxx Rev 0 (01/11/2016)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

แบบฟอร์มตรวจเช็ค Main Distribution Broad (MDB)

วันที่/Date 12-8-66

MAIN DISTRIBUTION BOARD	EQUIPMENT CODE		MDB-C-01	EMDB-C-01	CAP-C-01	AHCC-C-01
TASK	Standards	Period				
1 Check Status Of All Indicators / ตรวจเช็คสถานะของไฟแสดงสถานะต่างๆ	N	M	N	N	N	N
1.1 ตรวจเช็คขนาดไฟ และแน่นไฟ MDB	N	M	N	N	N	N
1.2 ตรวจเช็คขนาดไฟ และ CAP BANK	N	M	N	N	N	N
1.3 ตรวจเช็คสภาพการทำงานของไฟสัญญาณเตือนต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	N	N	N	N
1.4 ตรวจเช็คอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า	N	M	N	N	N	N
1.5 ตรวจเช็คการทำงานของพัดลมระบายความร้อนภายในตู้	N	M	N	N	N	N
2 Check All Motors Efficiency / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	380 - 400 V ____ AMP	M	42 40	44 42	44 42	28 26	32 30	36 34	38 36
การตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ต่างๆ และปั๊มน้ำต่างๆ, กระแสไฟฟ้า			54 51	55 52	60 57	40 38	44 42	50 47	52 49
3 ตรวจเช็ค Capacitor Bank สภาพการทำงานของ Cap Bank และปริมาณกระแสไฟฟ้า	380 - 400 V AMP	M							
4 Check For General Operations & Condition / ตรวจเช็คการทำงานทั่วไป	N	M	N	N	N	N			
5 Check all Circuit Breaker Condition / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเบรกเกอร์	N	M	N	N	N	N			
6 Check Fuses & Protective Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	M	N	N	N	N			
7 Check Casing For Condition / ตรวจเช็คสภาพตู้ควบคุม	N	M	N	N	N	N			
8 ตรวจเช็คอื่นๆ และ อย่างๆ			0.92	0.91	0.92	0.91			

RECORD CODE

(/) = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค ____ วันที่ 12/8/66

ผู้ตรวจสอบ ____ วันที่ 12/8/66

APPROVE BY ____ วันที่ ____

FM-FAC-xxx Rev 0 (01/11/2016)

UPS

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRN_____Rev.00

Form number/เลขที่	PM-03-02
Effective/วันที่	Rev.03
Modification/แก้ไข	1/4/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Tick	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EE	UPS	1	UPS No.01	A	3	พื้นที่ชั้น OR 3	UPS-A-3-01	Schneider	UJ1352300550	-	10 KVA		M	M/S	M	M	M	M/S	M	M	M	M/S	M	M	% BT Correct
EE	UPS	1	UPS No.02	A	3	พื้นที่ชั้น OR 4	UPS-A-3-02	Schneider	UJ1352300551	-	10 KVA		M	M/S	M	M	M	M/S	M	M	M	M/S	M	M	% BT Correct
EE	UPS	1	UPS No.03	A	2	ห้อง IT	UPS-A-2-01	EMERSON	NXr 120	-	120 KVA		M	M/S	M	M	M/S	M	M	M/S	M	M	M/S	M	E-01
EE	UPS	1	UPS No.04	A	2	ห้อง IT	UPS-A-2-02	LEONICS	1907C0481100001	-	10 KVA		M	M/S	M	M	M/S	M	M	M/S	M	M	M/S	M	
EE	UPS	1	UPS No.05	C	1	ห้อง MDB	UPS-C-1-01	SE	GE / S2	-	100 KVA		M	M/S	M	M	M/S	M	M	M/S	M	M	M/S	M	E-01

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUARTERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ตำแหน่ง_____ผู้บริหารงานอาคาร
Date/วันที่ 5/01/2023

ตรวจสอบโดย
ตำแหน่ง_____วิศวกรผู้ดูแลอาคาร
Date/วันที่ 5/01/2023

อนุมัติโดย
ตำแหน่ง General Support ผู้จัดการ
Date/วันที่ 5/01/2023

โรงพยาบาลกรุงเทพ ATALIAN
BANGKOK HOSPITAL

UPS MAINTENANCE CHECK LIST
แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำรอง UPS

เดือน 9/11/66

Location อาคาร A B C

Item	Location	CONTROL	Serial No.	1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
				$Volt_{1n}$	$Volt_{2n}$	$Volt_{3n}$				
1	UPS ชั้น 3 / A (ORM3)	UPS-A-3-01	NO UJI352100550	230	228	220	✓	✓	✓	
2	UPS ชั้น 3 / A (ORM4)	UPS-A-3-02	NO UJI352100546	229	227	218	✓	✓	✓	
3	UPS ห้อง IT #1	UPS-A-2-01	NXr120	230	230	590	✓	✓	✓	
4	UPS ห้อง IT #2	UPS-A-2-02	1907C648101001	233	231	232	✓	✓	✓	
5	UPS ห้อง MDB G/C	UPS-C-1-01	NO S2	232	230	231	✓	✓	✓	

CODE	PM PROGRAM MONTHLY
1	ตรวจสอบแรงดันด้านเข้า
2	ตรวจสอบแรงดันด้านออก
3	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่
4	ตรวจเช็คฟังก์ชั่นระบบป้องกัน
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ UPS และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6	ทำความสะอาดเครื่อง

สัญลักษณ์ในการตรวจเช็ค

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ

* แรงดันด้านเข้า 220 V - 230V
** แรงดันด้านออก 220 V - 230V
*** แรงดันแบตเตอรี่รวม 380-450 VDC

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ประศิษฐ์
วันที่ 9/11/66

ผู้ตรวจสอบ ธันวิชัย
วันที่ 9/11/66

โรงพยาบาลกรุงเทพ ATALIAN
BANGKOK HOSPITAL

UPS MAINTENANCE CHECK LIST
แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำรอง UPS

เดือน 7/12/66

Location อาคาร A B C

Item	Location	CONTROL	Serial No.	1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
				$Volt_{1n}$	$Volt_{2n}$	$Volt_{3n}$				
1	UPS ชั้น 3 / A (ORM3)	UPS-A-3-01	NO UJI352100550	230	229	229	✓	✓	✓	
2	UPS ชั้น 3 / A (ORM4)	UPS-A-3-02	NO UJI352100546	229	229	218	✓	✓	✓	
3	UPS ห้อง IT #1	UPS-A-2-01	NXr120	237	230	239	✓	✓	✓	
4	UPS ห้อง IT #2	UPS-A-2-02	1907C648101001	231	231	267	✓	✓	✓	
5	UPS ห้อง MDB G/C	UPS-C-1-01	NO S2	233	229	228	✓	✓	✓	

CODE	PM PROGRAM MONTHLY
1	ตรวจสอบแรงดันด้านเข้า
2	ตรวจสอบแรงดันด้านออก
3	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่
4	ตรวจเช็คฟังก์ชั่นระบบป้องกัน
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ UPS และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6	ทำความสะอาดเครื่อง

สัญลักษณ์ในการตรวจเช็ค

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ

* แรงดันด้านเข้า 220 V - 230V
** แรงดันด้านออก 220 V - 230V
*** แรงดันแบตเตอรี่รวม 380-450 VDC

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ประศิษฐ์
วันที่ 9/12/66

ผู้ตรวจสอบ ธันวิชัย
วันที่ 9/12/66

ATALIAN

UPS MAINTENANCE CHECK LIST

แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำรอง UPS

เดือน 11/9/66

Location อาคาร A B C

Item	Location	CONTROL	Serial No.	1 Volt$_{rs}$	2 Volt$_{st}$	3 Volt$_{tm}$	4	5	6	หมายเหตุ
1	UPS ชั้น 3 / A (OR#3)	UPS-A-3-01	NO UJ1352100550	230	230	218	/	/	/	
2	UPS ชั้น 3 / A (OR#4)	UPS-A-3-02	NO UJ1352100546	229	229	218	/	/	/	
3	UPS ห้อง IT #1	UPS-A-2-01	NXr120	231	231	543	/	/	/	
4	UPS ห้อง IT #2	UPS-A-2-02	1907C648101001	232	239	232	/	/	/	
5	UPS ห้อง MDB G/C	UPS-C-1-01	NO S2	238	239	232	/	/	/	

CODE	PM PROGRAM MONTHTY
1	ตรวจสอบแรงดันด้านเข้า
2	ตรวจสอบแรงดันด้านออก
3	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่
4	ตรวจเช็คฟังก์ชันระบบอลาม
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ UPS จากระยะแสดงสถานะ
6	ทำความสะอาดเครื่อง

สัญลักษณ์ในการตรวจเช็ค

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ

* แรงดันด้านเข้า 220 V - 230V

** แรงดันด้านออก 220 V - 230V

*** แรงดันแบตเตอรี่รวม 380-430 VDC

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 11/9/66

ผู้ตรวจสอบ ลันธิส

วันที่ 11/9/66

ATALIAN

UPS MAINTENANCE CHECK LIST

แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำรอง UPS

เดือน 11/10/66

Location อาคาร A B C

Item	Location	CONTROL	Serial No.	1 Volt$_{rs}$	2 Volt$_{st}$	3 Volt$_{tm}$	4	5	6	หมายเหตุ
1	UPS ชั้น 3 / A (OR#3)	UPS-A-3-01	NO UJ1352100550	230	220	218	/	/	/	
2	UPS ชั้น 3 / A (OR#4)	UPS-A-3-02	NO UJ1352100546	229	229	218	/	/	/	
3	UPS ห้อง IT #1	UPS-A-2-01	NXr120	231	231	543	/	/	/	
4	UPS ห้อง IT #2	UPS-A-2-02	1907C648101001	233	238	229	/	/	/	
5	UPS ห้อง MDB G/C	UPS-C-1-01	NO S2	232	238	232	/	/	/	

CODE	PM PROGRAM MONTHTY
1	ตรวจสอบแรงดันด้านเข้า
2	ตรวจสอบแรงดันด้านออก
3	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่
4	ตรวจเช็คฟังก์ชันระบบอลาม
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ UPS จากระยะแสดงสถานะ
6	ทำความสะอาดเครื่อง

สัญลักษณ์ในการตรวจเช็ค

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ

* แรงดันด้านเข้า 220 V - 230V

** แรงดันด้านออก 220 V - 230V

*** แรงดันแบตเตอรี่รวม 380-430 VDC

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 11/10/66

ผู้ตรวจสอบ ลันธิส

วันที่ 11/10/66

E41

บริษัท อีสิบเอ็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
E41 Engineering Co., Ltd.

E41 ENGINEERING CO., LTD.
50/28 M.2 T.Bangpleeyai, A.Bangplee,
Samutprakan, Thailand 10540
Tel:+66(0)2 009 1833
Fax:+66(0)2 011 0900
Mobile 081-9011793
Email: weerasak.ruchai@gmail.com

MDB

SERVICE REPORT

Job No.

DATE: 18 December 2023

Equipment

UPS:	✓
Rec./Chg.	
Inverter	
Battery:	
Model:	LP series S2/100KVA
S/N:	U2120 1612-042A

Customer name: Sri- Rayong Hospital
333/3 Moo 4 Cheangnoen, Muang,
Rayong 21000 Thailand

Tel: **Fax:**

Contact person:

Mobile No.

Description of duties: - PM UPS.
- check input & output voltage & current
- load waveform voltage harmonic distortion.
- check DC voltage battery
- cleaning UPS & battery

Job Analysis/Comment: UPS normal

Spair part Replacement:

E41 Engineering Co., Ltd.	
Signature	
Name	Mr.Weerasak Ruchai
Date	18-12-66

Customer authorized	
Signature	
Name	
Date	18-12-66

โรงพยาบาลศรีระยอง SRI RAYONG HOSPITAL ATALIAN

UPS MAINTENANCE CHECK LIST

แบบฟอร์มตรวจเช็กระบบไฟฟ้าสำรอง UPS

เดือน 10/12/66

Location อาคาร A B C

Item	Location	CONTROL	Serial No.	1 Volt$_{r-n}$	2 Volt$_{s-n}$	3 Volt$_{t-n}$	4	5	6	หมายเหตุ
1	UPS ชั้น 3 / A (OR#3)	UPS-A-3-01	NO UJ1352100550	230	230	214	✓	✓	-	
2	UPS ชั้น 3 / A (OR#4)	UPS-A-3-02	NO UJ1352100546	230	230	214	✓	✓	✓	
3	UPS ห้อง IT #1	UPS-A-2-01	NX1120	231	234	546	✓	✓	✓	
4	UPS ห้อง IT #2	UPS-A-2-02	1907C648101001	230	240	229	✓	✓	✓	
5	UPS ห้อง MDB G/C	UPS-C-1-01	NO S2	231	231	231	✓	✓	✓	

CODE	PM PROGRAM MONTHTY
1	ตรวจสอบแรงดันด้านเข้า
2	ตรวจสอบแรงดันด้านออก
3	ตรวจเช็กแรงดันแบตเตอรี่
4	ตรวจเช็กพัดลมระบายความร้อน
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ UPS ขณะสับสลับแหล่งจ่ายไฟ
6	ทำความสะอาดเครื่อง

สัญลักษณ์ในการตรวจเช็ก

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ

* แรงดันด้านเข้า 220 V - 240V
** แรงดันด้านออก 220 V - 230V
*** แรงดันแบตเตอรี่รวม 380-450 VDC

สรุปผลการตรวจเช็ก

ผู้ตรวจเช็ค ธนพ
วันที่ 10/12/66

ผู้ตรวจสอบ แสน
วันที่ 11/12/66

E41

บริษัท อีสิบเอ็ด (วิศวกรรม) จำกัด
E41 Engineering Co., Ltd.

E41 ENGINEERING CO., LTD.
50/28 M.2 T.Bangpleeyai, A.Bangplee,
Samutprakan, Thailand 10540
Tel:+66(0)2 009 1833
Fax:+66(0)2 011 0900
Mobile 081-9011793
Email: weerasak.ruchai@gmail.com

IT

SERVICE REPORT

Job No.

DATE: 18 December 2023

Equipment

UPS:	✓
Rec./Chg.	
Inverter	
Battery:	
Model:	[illegible]
S/N:	[illegible]

Customer name: Sri- Rayong Hospital
333/3 Moo 4 Cheangnoen, Muang,
Rayong 21000 Thailand

Tel: **Fax:**

Contact person:

Mobile No.

Description of duties: PM UPS
- check voltage & current
- check dc voltage battery
- cleaning ups & battery
- [illegible]

Job Analysis/Comment: normal

Spair part Replacement:

E41 Engineering Co., Ltd.	
Signature	
Name	Mr.Weerasak Ruchai
Date	18-12-23

Customer authorized	
Signature	
Name	
Date	18-12-23

E41

บริษัท อีสิบเอ็ด (วิศวกรรม) จำกัด
E41 Engineering Co., Ltd.

Preventive Maintenance Record

ใบบันทึกการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่อง

Customer contact/พนักงานติดต่อ: Sri- Rayong Hospital | Ups type/ชนิดเครื่อง: Victron LP series S2 | Location of UPS/ที่ตั้งเครื่อง UPS: MDB ROOM

Service Person/ช่างผู้ทำ: [illegible] | Ups Serial No./หมายเลขเครื่อง: LS330-1652-0424 | Ups Ver.: | Job No.: | Date: 18/12/2566

Tel No./หมายเลขโทรศัพท์: | UPS Power Size/ขนาด: 100KVA | Soft No.: | Battery Checking Record

| | | |

E41

บริษัท อีสิบเอ็ด เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
E41 Engineering Co., Ltd.

E41 ENGINEERING CO., LTD.
50/28 M.2 T.Bangpleeyai, A.Bangplee,
Samutprakan, Thailand 10540
Tel:+66(0)2 009 1833
Fax:+66(0)2 011 0900
Mobile 081-9011793
Email: weerasak.ruchai@gmail.com

CT-SCAN

SERVICE REPORT

Job No.

DATE: 18 December 2023

Equipment

UPS:	✓
Rec./Chg.	
Inverter	
Battery:	
Model:	Liebert Nxr 120KVA
S/N:	21012005352100010005

Customer name: **Sri- Rayong Hospital**
333/3 Moo 4 Cheangnoen, Muang,
Rayong 21000 Thailand

Tel: **Fax:**

Contact person:

Mobile No.

Description of duties: PM UPS
- check and record voltage harmonics distortion.
- check input V/A.
- check voltage battery
- cleaning UPS

Job Analysis/Comment: UPS ทำงานปกติ

Spair part Replacement:

E41 Engineering Co., Ltd.	
Signature	
Name	Mr.Weerasak Ruchai
Date	18-12-23

Customer authorized	
Signature	
Name	
Date	18-12-23

E41

บริษัท อีสิบเอ็ด เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
E41 Engineering Co., Ltd.

Preventive Maintenance Record

บันทึกการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Customer name/ชื่อลูกค้า: **Sri- Rayong Hospital** UPS Type/ชนิดเครื่อง: Liebert Nxr 120KVA Location of UPS/ที่ตั้งเครื่อง UPS: **IT Room**

Contact Person/ผู้ติดต่อ: Serial No./หมายเลขเครื่อง: 21012005352100010005 PM No: Job No. Date: 18/12/2566

Tel No./หมายเลขโทรศัพท์: 100/1,4,5,9,10,13,14,15,16,17 SW No: **Battery Checking Record**

Check electric power of Input and Output UPS (PEA/กฟภ. PWA/กปน. **P/F/N/A**) **Check quality of Battery** Actual Display **P/F/N/A** **Battery Date: 7/12/2565**

| | | |

E41

บริษัท อีโอนี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
E41 Engineering Co., Ltd.

E41 ENGINEERING CO., LTD.
50/28 M.2 T.Bangpleeyai, A.Bangplee,
Samutprakan, Thailand 10540
Tel:+66(0)2 009 1833
Fax:+66(0)2 011 0900
Mobile 081-9011793
Email: weerasak.ruchai@gmail.com

SERVICE REPORT

Job No.

DATE: 11 September 2023

Equipment

UPS:	✓
Rec./Chg.	
Inverter	
Battery:	
Model:	MGE Galaxy 10KVA
S/N:	W1357100546

Customer name: Sri- Rayong Hospital
333/3 Moo 4 Cheangnoen, Muang,
Rayong 21000 Thailand

Tel: **Fax:**

Contact person:

Mobile No.

Description of duties: - PM UPS
- Check input output voltage & current
- check voltage total battery
- Cleaning UPS.

Job Analysis/Comment: - UPS Normal

Spair part Replacement:

E41 Engineering Co., Ltd.	
Signature	
Name	Mr.Weerasak Ruchai
Date	11-9-66

Customer authorized	
Signature	
Name	
Date	11-9-66

E41

บริษัท อีโอนี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
E41 Engineering Co., Ltd.

Preventive Maintenance Record

บันทึกการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่อง

Customer name/ชื่อลูกค้า: Sri- Rayong Hospital — UPS Type/ชนิดเครื่อง: Liebert Nxr — Location of UPS/ที่ตั้งเครื่อง UPS: IT Room

Serial No./หมายเลขเครื่อง: 210120053520010005 — PO.no: — Job No.: — Date: 18/12/2566

Ref.no./หมายเลขอ้างอิง: — UPS Power rating/ขนาด: 120KVA — PCB No.: — Battery Check/Log Record

Check electric power at Input and Output UPS — Ph-N / Ph-Ph — P1/P2 — P1/P2/N/A — Check quality of Battery — Actual — Display — P1/P2/N/A — Battery Date: 1/1/15

Main Input — Voltage(V Phase and Neutral) — 231 / 231 / 231 — Battery Voltage Charge(Volt-float) — 540 — 540 — Volt — Year

Insulation Check — Current(A) — 9.7 / 9.6 / 9.6 — Battery Current charge(Amp-float check) — 9 — 8.5 — Amp — No. — Month

>0.1 V — Frequency(Hz) — 50.0 / 50.0 / 50.0 — Ripple Current(Amp) — - — - — Amp — 1 — 13/1/15 — 25 — 13/1/15 — Volt — Day

UPS Output — Voltage(V Phase and Neutral) — 231 / 231 / 231 — Battery Room temperature(20-25 C) — 25 — - — 2 — 13/2/15 — 26 — 13/2/15 — Year

Insulation Check — Current(A) — 5.5 / 5.5 / 4.7 — Select battery Duration test mode and testing status of the battery — 3 — 13/3/15 — 27 — 13/3/15

>0.1 V — Frequency(Hz) — 50.0 / 50.0 / 50.0 — Check quality of Inverter waveform(AC) — P1/P2 — P1/P2/N/A — 4 — 13/4/15 — 28 — 13/4/15

Check air input and output temperature — Inverter Output Voltage(V) — Display — Actual — 5 — 13/5/15 — 29 — 13/5/15

Equipment Check — Check all ventilation free and fan is run — (Phase to Neutral) — 234 / 234 / 234 — 6 — 13/6/15 — 30 — 13/6/15

All electric switches are in good condition — Inverter Output Current (A) — 5 / 5 / 4.9 — 7 — 13/7/15 — 31 — 13/7/15

Check tighten of inverter and cable connections — Display — Actual — 5 — 5 — 8 — 13/8/15 — 32 — 13/8/15

Check quality of rectifier section — Actual — Display — P1/P2/N/A — Inverter Output Frequency — Actual — 50 — 50 — 9 — 13/9/15 — 33 — 13/9/15

DC Rectifier Voltage (Vdc) — 540 — 540 — P1/P2 — (Hz) — Display — 50 — 50 — 10 — 13/10/15 — 34 — 13/10/15

DC Shunt Voltage (Vdc) — - — / — — —

E41

E41 Engineering Co., Ltd.

E41 ENGINEERING CO., LTD.
50/28 M.2 T.Bangpleeyai, A.Bangplee,
Samutprakan, Thailand 10540
Tel:+66(0)2 009 1833
Fax:+66(0)2 011 0900
Mobile 081-9011793
Email: weerasak.ruchai@gmail.com

OR 3

SERVICE REPORT

Job No.

DATE: 11 September 2023

Equipment

UPS:	✓
Rec./Chg.	
Inverter	
Battery:	
Model:	MGE Galaxy 10KVA
S/N:	U01J52100550

Customer name: Sri- Rayong Hospital
333/3 Moo 4 Cheangnoen, Muang,
Rayong 21000 Thailand

Tel: **Fax:**

Contact person:

Mobile No.

Description of duties: - PM UPS.
- check input, output voltage & current
- check total voltage battery
- Cleaning UPS.

Job Analysis/Comment: - UPS normal

* Battery 3. Alarm Batt Life time อีก 3 เดือน *
(Red Alarm)

Spair part Replacement:

E41 Engineering Co., Ltd.	
Signature	
Name	Mr.Weerasak Ruchai
Date	11-9-66

Customer authorized	
Signature	
Name	
Date	11/9/66

Preventive Maintenance Reroard

บันทึกการตรวจบำรุงรักษาเครื่อง

E41

Customer (ผู้ใช้บริการ): Sri- Rayong Hospital — UPS Type (เครื่องรุ่น): MGE Galaxy 300 — Location of UPS (ที่ตั้งเครื่อง UPS): OR 4

Contact Person (ผู้ติดต่อ): — Serial No. (หมายเลขเครื่อง): U01J52100550 — P/O No.: — Job No.: — Date: 11/9/2566

Tel. (หมายเลขโทรศัพท์): — UPS Power (ขนาด): 10KVA — S/O No.: — Battery Checking Record

Check electric power of Input and Output UPS (ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าขาเข้าและขาออกของเครื่อง UPS)

| | | |

E41

Preventive Maintenance Record

บันทึกการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่อง

Customer company/บริษัทลูกค้า: **Sri- Rayong Hospital**					UPS Type/รุ่นเครื่อง UPS : **MGE Galaxy 300**				Location of UPS/ที่ตั้งเครื่อง UPS: **OR 3**										
Contact Person/ผู้ติดต่อ:					Serial No./หมายเลขเครื่อง : UJ1952100530				PSB No:				Job No.				Date: 11/9/2566		
Tel No./หมายเลขโทรศัพท์:					UPS Power/ขนาดเครื่อง : 10KVA				SUB No:				Battery Checking Record						
Check electric power of Input and Output UPS		Ph1/R	Ph2/S	Ph3/T	P/F/N/A	**Check quality of Battery**		Actual	Display	P/F/N/A	Battery Date: 06/2023								
Main Input	Voltage(V. Phase and Neutral)	229	231.7	229.5		Battery Voltage Charge(Vdc-Float)		224	226		No.	Vdc(V)	Vac	Ω m	No.	Vdc(V)	Vac	Ω m
Insulation Check	Current(A.)	2	2.0	2		Battery Current charge(actual check)		0	0		1				26			
M>G= 8.4 V	Frequency(Hz.)	50	50	50		Ripple current(mA)		-	-		2				27			
UPS Output	Voltage(V. Phase and Neutral)	230				Battery Room temperature(20-35 C)		24.3	22		3				28			
Insulation Check	Current(A.) 3.5 - 4.8	4.8				Select battery function test from menu and testing status of the battery					4				29			
M>G= 8.4 V	Frequency(Hz.)	50				**Check quality of Inverter section(DC/AC)**		Ph1/R	Ph2/S	Ph3/T	P/F/N/A	5				30			
Equipment Check	Check air input and output temperature(I)	Ip	Op			Inverter Output Voltage(V.) (Phase to Neutral)	Actual	230				6				31			
	Check all ventilation free and fan is spin						Display	229				7				32			
	All control switches are in good condition					Inverter Output Current (A.)	Actual	4.8				8				33			
	Check position of thyristor and cable connections						Display	5				9				34			
Check quality of rectifier section		Actual	Display	P/F/N/A		Inverter Output Frequency F=(Hz.)	Actual	50				10				35			
DC Rectifier Voltage (Vdc.)		269	270				Display	50				11				36			
DC Boost Voltage (Vdc.)		-				Equipment Check	All thyristor fit and lock in stationary					12				37			
DC Rectifier Current (A.)		-					Buster and AC fuse are fit in socket					13				38			
AC Ripple Voltage (mv.)		53					PCB control and signaling cable are in good condition					14				39			
Wait in soft start > 10 sec.		-	sec.			**Function Test and check verify**					P/F/N/A	15				40			
Equipment Check	All thyristor fit and lock in stationary					A:Check LCD display indicator,lamp,meters are good condition						16				41			
	Buster and AC fuse are fit in socket					B:Check UPS system operation under conditions of AC failure						17				42			
	PCB control and signaling cable are in good condition					C:Test automatics transferring from Inverter to Reserve						18				43			
Check quality of static switches		R/Ro	S/So	T/To	P/F/N/A	D:Test automatics transferring from Reserve to Inverter						19				44			
Unsynchronized Voltage(V.Phase to Phase)		4.3				E:Test Manual transferring function from bypass switch						20				45			
Reserve Input Voltage(V.)	Actual	229.8				F:Simulate a main failure and ensure that battery can maintain load for 25%						21				46			
	Display	230				G:Clean up all PCB,Thyristor,dush cover,panel control and LED indicators						22				47			
Equipment Check	All thyristor fit and lock in stationary											23				48			
	Buster and AC fuse are fit in socket											24				49			
	PCB control and signaling cable are in good condition											25				50			

Technical comments:

O/P Swing 3.5-4.8 A.

Customer Comment:

Battery Type: SLA Battery

Battery Model: NPOW HP12-7.2Ah (20 h)

Battery Tel No.

Code Explanation: N/A=PASS/FAIL/NOT ACTIVE/ADJUST OR TO CORRECTED

Customer name: [illegible] Position:

Signature: Date:

Engineer: Mr.Weerasak Ruchai

Date: 11/9/66

Jockey pump

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00


System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
UP	JP	1	Jocky Pump	C	1	พื้นที่ชั้นที่ C	JP-C-01	Grundfos	-	15A15A15	30 HP 400 Kw		W/S	W	W	W/S	W	W	W/S	W	W	W/S	W	W	S.CAS

W	-	WEEKLY
M	-	MONTHLY
Q	-	QUATERLY
H	-	HALF
Y	-	YEARLY
SC	-	SUBCONTRACTOR

Date/วันที่ 5/01/2023

Date/วันที่ 5/01/2023

Date/วันที่ 5/01/2023

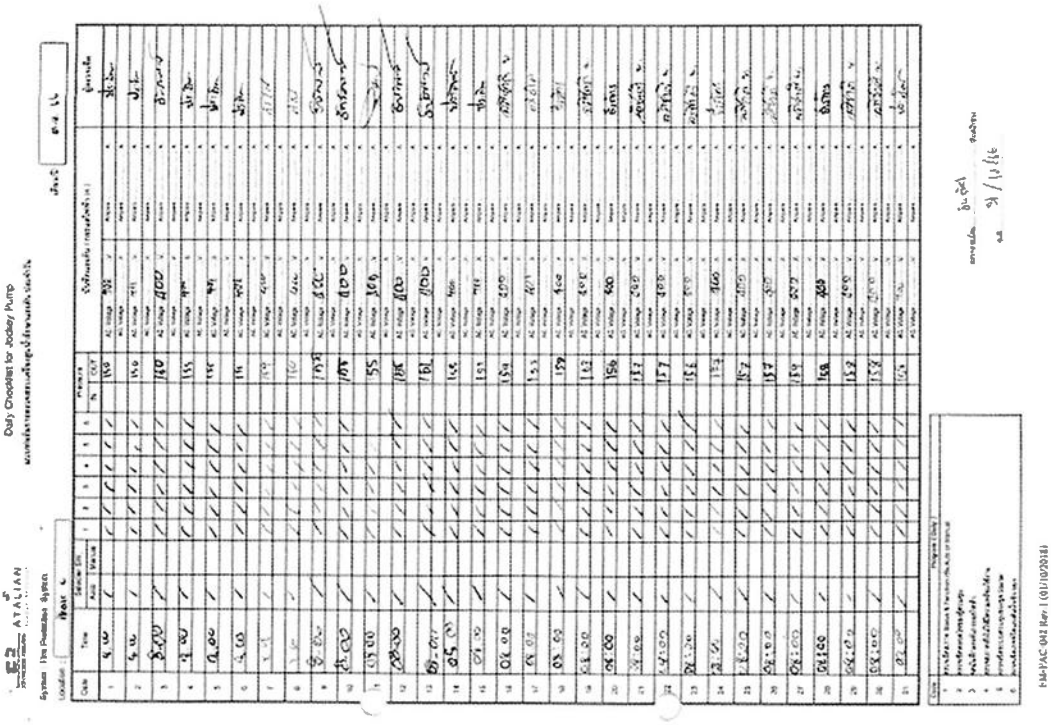

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

แบบฟอร์มการตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำ ประจำสัปดาห์

(Checklist of Jockey Pump Weekly)

อาคาร C เดือน 31/12/66

รายละเอียด		ค่ามาตรฐาน	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง		ปกติ		
	ปริมาณแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-		
	ปริมาณแรงดันทางออก (PSI)	150 PSI	150 PSI		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
ส่วนมอเตอร์	ปริมาณแรงดันไฟฟ้า (AC Volts)		401 V		
	ปริมาณกระแสไฟฟ้า (AC Amp.)		4.9 A		

สรุปผลการตรวจเช็ค Test Run ประจำสัปดาห์ รูปแบบใหม่

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 31 / 12 / 66

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 31 / 12 / 66

FM-FAC-049 Rev 0 (16/10/2016)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

แบบฟอร์มการตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำ ประจำสัปดาห์

(Checklist of Jockey Pump Weekly)

อาคาร C เดือน 12/11/66

รายละเอียด		ขั้นตอนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
เครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง		ปกติ		
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-		
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	150	150		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
มอเตอร์	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (AC Volts)		400		
	บันทึกกระแสไฟฟ้า (AC Amp.)		4.1		

สรุปผลการตรวจเช็ค Test Run ปั๊มทำงานปกติ ระบบปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ ..... วันที่ 12 / 11 / 2566

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... วันที่ 13 / 11 / 2566

FM-FAC-049 Rev.0 (1/10/2016)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

แบบฟอร์มการตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำ ประจำสัปดาห์

(Checklist of Jockey Pump Weekly)

อาคาร C เดือน 24/10/66

รายละเอียด		ขั้นตอนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
เครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง		ปกติ		
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-		
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	150 PSI	150 PSI		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
มอเตอร์	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (AC Volts)		402 V		
	บันทึกกระแสไฟฟ้า (AC Amp.)		4.0 A		

สรุปผลการตรวจเช็ค Test Run ปั๊มทำงานปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ ..... วันที่ 24 / 10 / 66

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... วันที่ 25 / 10 / 66

FM-FAC-049 Rev.0 (1/10/2016)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

แบบฟอร์มการตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำ ประจำสัปดาห์

(Checklist of Jockey Pump Weekly)

อาคาร C เดือน 03-09-2566

รายละเอียด		ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
อุปกรณ์ควบคุม	การสั่นสะเทือนและเสียง		ปกติ		
	ปั๊มที่ความดันทางเข้า (PSI)	-	-		
	ปั๊มที่แรงดันทางออก (PSI)	150	150		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
มอเตอร์	ปั๊มที่แรงดันเมื่อไฟฟ้า (AC Volts)		404		
	ปั๊มที่กระแสไฟฟ้า (AC Amp.)		4.6		
สรุปผลการตรวจเช็ค		Test Run ประจำสัปดาห์ ระบบปกติ			

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 03 / 09 / 66

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 03 / 09 / 66

FM-FAC-049 Rev.0 (16/08/2016)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

แบบฟอร์มการตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำ ประจำสัปดาห์

(Checklist of Jockey Pump Weekly)

อาคาร C เดือน 13-8-66

รายละเอียด		ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
อุปกรณ์ควบคุม	การสั่นสะเทือนและเสียง		ปกติ		
	ปั๊มที่ความดันทางเข้า (PSI)	-	-		
	ปั๊มที่แรงดันทางออก (PSI)	160 PSI	160PSI		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
มอเตอร์	ปั๊มที่แรงดันเมื่อไฟฟ้า (AC Volts)		400 V		
	ปั๊มที่กระแสไฟฟ้า (AC Amp.)		4.4 A		
สรุปผลการตรวจเช็ค		Test Run ประจำสัปดาห์ระบบปกติ			

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 13 / 8 / 66

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 15 / 8 / 66

FM-FAC-049 Rev.0 (16/08/2016)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

แบบฟอร์มการตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำ ประจำสัปดาห์

(Checklist of Jockey Pump Weekly)

อาคาร C

เดือน ๙/๗/๖๖

	รายละเอียด	ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
อุปกรณ์ควบคุม	การสั่นสะเทือนและเสียง		ปกติ		
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-		
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	150 PSI	150 PSI		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
มอเตอร์	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (AC Volts)		๔๐๙ V		
	บันทึกกระแสไฟฟ้า (AC Amp.)		๙.๖A		
สรุปผลการตรวจเช็ค		Test Run ปกติ/ปรับปรุงแก้ไขปกติ			

ผู้ตรวจเช็ค
ประเทือง
วันที่ ๙ / ๗ / ๖๖

ผู้ตรวจสอบ
แสน
วันที่ ๙ / ๗ / ๖๖

PUMP Waste

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00

[illegible]	[illegible]
แก้ไขครั้งที่	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/01/2023

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN											Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
			Waste Water Treatment Plan																						
			Submersible Pump																						
MP	WWT	1	SP -01	B	1	บ่อเก็บน้ำเสียชั้นที่ 3	SP B-1-01	-	-	-	2.2 kw		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
MP	WWT	1	SP - 02	B	1	บ่อเก็บน้ำเสียชั้นที่B	SP B 1-02	-	-	-	2.2 kw		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
MP	WWT	1	SP - 03	B	1	ใต้ลิฟต์ขยะชั้นB	SP-B-1-03	-	-	-	2.2 kw		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
MP	WWT	1	SP - 04	B	1	ใต้บันไดหนีไฟชั้นB	SP B-1-04	-	-	-	2.2 kw		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
MP	WWT	1	SP - 05 (1 ชั้น)	PK	1	บ่อบำบัด/รถน้ำ-ห้องไม้	SP PK-1-05	EURO FLOW	-	-	-		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
MP	WWT	1	SP - 06 (1 ชั้น)	PK	2	หลังบันได้	SP PK-1-06	-	-	-	-		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
MP	WWT	1	SP - 07 (1 ชั้น)	PK	1	บ่อเก็บน้ำเสียหลังอาคาร C	SP PK-1-07	tsurumi	-	-	7.5 kw		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
MP	WWT	1	SP - 08 (1 ชั้น)	PK	1	บ่อเก็บน้ำเสียหลังอาคาร C	SP PK-1-08	tsurumi	-	-	7.5 kw		M	M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
			Areator Pump																						
WWT	AP	1	AP-01	PK	1	บ่อบำบัด	AP-PK-1-01	-	-	-	1.5 kw		M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	
WWT	AP	1	AP-02	PK	1	บ่อบำบัด	AP-PK-1-02	-	-	-	1.5 kw		M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	
WWT	AP	1	AP-03	PK	1	บ่อปฏิกรณ์	AP-PK-1-03	-	-	-	1.5 kw		M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	
			Sludge Pump																						
MP	SLP	1	SLP - 1	PK	1	บ่อบำบัด	SLP -PK- 1 -01	-	-	-	0.75 kw		M	H	M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	
			Water Pump																						
			Transfer pump																						
MP	CWP	1	Cwp-01	C	1	ห้องpump	CWP-C 1 -01	ROCK CROMPTON	-	-	15 kw		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	H	
MP	CWP	1	Cwp-02	C	1	ห้องpump	CWP-C 1 02	ROCK CROMPTON	-	-	15 kw		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	H	
			Booter pump																						
MP	BP	1	BP -01	B	R	ลานหน้า	BP-B - R- 01	EBARA	-	-	3-48 kw		Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	H	M	Q	
MP	BP	1	BP - 02	B	R	ลานหน้า	BP-B- R- 02	EBARA	-	-	3-48 kw		Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	H	M	Q	

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUATERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ _____ ผู้บริหารหมายสาน
Date/วันที่ 5/01/2023

ลงชื่อ _____ ไทยกรรมผู้บริหาร
Date/วันที่ 5/01/2023

รับรองโดย
ลงชื่อ General Support [illegible] ผู้ว่าจ้าง
Date/วันที่ 5/01/2023

Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant And Water Pump

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบ PUMP ประจำเดือน

ปีงบประมาณ B,C,PK

ประจำเดือน พฤษภาคม 66

รายการ	ยี่ห้อ	ตำแหน่งที่	Code							Start	Finish	Voltage (V)			Ampere (A)			Remark
			1	2	3	4	5	6	7			R-S	S-T	T-R	R	S	T	
SP-01	B	ปั๊มน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	-	/			401	402	402	8.99	8.98	8.97	
SP-02	B	ปั๊มน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	-	/			401	402	401	8.51	8.49	8.51	
SP-03	B	ปั๊มน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	-	/			400	399	399	8.50	8.51	8.49	
SP-04	B	ปั๊มน้ำดิบ 4	/	/	/	/	/	-	/			401	401	402	8.51	8.48	8.51	
SP-05 (1+1)	PK	ปั๊มน้ำดิบหน้าโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แยก
AP-01	PK	ปั๊มน้ำดี	-	/	/	/	/	/	/			398	399	399	9.91	9.94	9.94	
AP-02	PK	ปั๊มน้ำดี	-	/	/	/	/	/	/			401	401	401	9.91	9.94	9.94	
AP-03	PK	ปั๊มน้ำดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แยก
SLP-1	PK	ปั๊มน้ำดี	-	/	/	/	/	/	/			399	399	399	1.51	1.50	1.51	
Comp-01	C	Compressor	-	/	/	/	/	/	/			401	402	401	15.76	15.31	15.71	
Comp-02	C	Compressor	-	/	/	/	/	/	/			401	401	402	15.71	15.76	15.11	
BP-01	B	ปั๊มดี	-	/	/	/	/	/	/			399	399	400	9.71	9.69	9.69	
BP-02	B	ปั๊มดี	-	/	/	/	/	/	/			400	400	401	9.95	9.91	9.94	
SP-06	PK	ปั๊มน้ำดิบ 6	/	/	/	/	/	-	/			399	399	399	1.97	1.96	1.96	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจสภาพทั่วไป
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบน้ำดิบ
3	ตรวจสอบ Control Board และ Breaker ต่างๆ
4	ปั๊มน้ำดิบทำงานหมุนเวียน
5	ปั๊มน้ำดิบทำงานเต็มอัตรา
6	ตรวจสอบการทำงานของ Level Switch
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำดิบทุกตัว

ผู้รับผิดชอบ / Action By

1 สุรศักดิ์

2 ~~ณรงค์ศักดิ์~~ ณัฐพล

วันที่ปฏิบัติ 12/12/66

ตรวจสอบโดย / Check By

ผู้จัดการ

วันที่ปฏิบัติ 12/12/66

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่ต้องทำการตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจเช็ค

FM-FAC-024 Rev.0 (01/11/2015)

แบบฟอร์มการตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ปีงบประมาณ 2566

DATE	TIME	ก่อนเข้าระบบ AP-1 A	AP-1 V	AP-2 A	AP-2 V	Auto mode	ระดับน้ำดิบ	ค่า ออกซิเจน (DO)	ค่า pH	อัตราการไหล	ปริมาณน้ำ จากการ นับ	ค่าของแข็ง (SV30)	ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)	ค่าซีโอดี (COD)	ลายเซ็นผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1		-	-	4.2	400	/	70	0.98	7.6	9.6	7.07	300		40	สมศักดิ์	
2		4.1	400	-	-	/	93	0.56	7.9	9.6	7.08	310		36	สมศักดิ์	
3		-	-	4.1	401	/	93	0.59	7.5	9.6	7.23	310		36	สมศักดิ์	
4		4.2	402	-	-	/	85	0.60	7.2	9.6	7.06	320		32	สมชัย	
5		-	-	4.1	400	/	85	0.56	7.2	9.6	7.06	330		32	สมชัย	
6		4.2	400	-	-	/	81	0.55	7.2	9.6	7.12	240		26	สมศักดิ์	
7		-	-	4.2	401	/	80	0.48	7.2	9.6	7.06	350		30	สมศักดิ์	
8		4.1	400	-	-	/	74	0.68	7.5	9.6	6.52	300		30	สมศักดิ์	
9		-	-	4.2	401	/	99	0.71	9.6	9.6	7.20	300		28	สมศักดิ์	
10		4.1	401	-	-	/	76	0.56	9.6	9.6	7.22	260		36	สมศักดิ์	
11		-	-	4.2	400	/	75	0.69	9.6	9.6	7.09	360		40	สมศักดิ์	
12		4.1	401	-	-	/	98	0.86	9.6	9.6	7.21	240		24	สมศักดิ์	
13		-	-	4.2	402	/	90	0.81	7.4	9.6	7.12	260		32	สมศักดิ์	
14		4.1	400	-	-	/	69	0.42	9.8	9.6	7.18	240		28	สมศักดิ์	
15		-	-	4.2	400	/	66	0.59	9.0	9.6	7.18	240		26	สมศักดิ์	
16		4.1	400	-	-	/	69	0.56	7.0	9.6	7.12	220		28	สมศักดิ์	
17		-	-	4.1	400	/	62	0.49	7.0	9.6	7.18	220		26	สมศักดิ์	
18		4.2	400	-	-	/	60	0.36	7.2	9.6	7.18	240		22	สมศักดิ์	
19		-	-	4.2	400	/	58	0.41	7.0	9.6	7.18	240		32	สมศักดิ์	
20		4.2	400	-	-	/	55	0.17	7.0	9.6	7.18	210		36	สมศักดิ์	
21		-	-	4.1	401	/	52	0.19	7.2	9.6	7.18	200		40	สมศักดิ์	
22		4.1	400	-	-	/	50	0.56	7.2	9.6	7.18	200		40	สมศักดิ์	
23		-	-	4.1	401	/	99	0.61	7.0	9.6	7.18	210		40	สมศักดิ์	
24		4.2	400	-	-	/	96	0.74	6.6	9.6	7.18	200		28	สมศักดิ์	
25		-	-	4.1	400	/	99	0.19	6.6	9.6	7.18	200		28	สมศักดิ์	
26		4.2	400	-	-	/	120	0.91	7.0	9.6	7.18	200		28	สมศักดิ์	
27		-	-	4.1	401	/	118	0.38	7.2	9.6	7.18	210		29	สมศักดิ์	
28		4.1	402	-	-	/	116	0.51	7.9	9.6	7.18	210		24	สมศักดิ์	
29		-	-	4.0	400	/	114	0.26	7.6	9.6	7.18	220		28	สมศักดิ์	
30		4.0	401	-	-	/	113	0.26	7.2	9.6	7.18	220		28	สมศักดิ์	
31		-	-	4.1	401	/	107	0.30	7.6	9.6	7.18	240		24	สมศักดิ์	

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ : ปิดวาล์วระบบน้ำดิบ, ปิดวาล์วระบบน้ำดี, ปิดวาล์วระบบน้ำดี, ปิดวาล์วระบบน้ำดี

โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
SIRIRAJ HOSPITAL

Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant And Water Pump

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบ PUMP ประจำเดือน

ขาดาร **B,C,PK** ประจำเดือน ตุลาคม 66

รายการ	ขาดาร	สถานที่	Code 1	2	3	4	5	6	7	Start	Finish	Voltage (V) R-S	S-T	T-R	Ampere (A) R	S	T	Remark
SP -01	B	โรงพักน้ำเสียชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	-	/			391	391	391	2.45	3.34	3.51	
SP - 02	B	บ่อพักน้ำเสียชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	-	/			393	394	394	3.56	3.56	3.56	
SP - 03	B	ใต้ถึงจอดรถ	/	/	/	/	/	-	/			393	393	393	3.52	3.56	3.56	
SP - 04	B	บ่อพักน้ำ ITD	/	/	/	/	/	-	/			394	394	394	2.05	2.05	2.05	
SP - 05 (1 ชุด)	PK	ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ชำรุด
AP-01	PK	ห้องปั๊ม	-	/	/	/	/	/	/			391	391	391	3.54	3.56	3.56	
AP-02	PK	ห้องปั๊ม	-	/	/	/	/	/	/			393	393	393	3.54	3.56	3.56	
AP-03	PK	ห้องปั๊ม Jockey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ชำรุด
SLP - 1	PK	บ่อน้ำดิบ	-	/	/	/	/	/	/			386	386	386	1.54	1.54	1.54	
Cap-01	C	ใต้ถุนอาคาร	-	/	/	/	/	/	/			390	390	390	15.96	15.96	15.96	
Cap-02	C	ใต้ถุนอาคาร	-	/	/	/	/	/	/			391	391	391	15.96	15.96	15.96	
BP - 01	B	บ่อพัก	-	/	/	/	/	/	/			393	393	393	3.54	3.56	3.56	ยังไม่ได้ใช้งาน
BP - 02	B	บ่อพัก	-	/	/	/	/	/	/			393	393	393	3.56	3.56	3.56	ยังไม่ได้ใช้งาน
SP - 06	PK	ห้องน้ำชาย ร	/	/	/	/	/	-	/			391	390	391	1.95	1.96	1.96	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสูตรระบบ
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบปั๊ม
3	ตรวจเช็ค Terminal Box และ จุด Junction Box
4	ปั๊มจ่ายการแต่งไฟฟ้า
5	ปั๊มจ่ายการแต่งไฟฟ้า
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Timer
7	ทำความสะอาดตามการทำงานปั๊มจุดควบคุม

ดำเนินการโดย / Action By
1 [signature]
2

วันที่/Date 2/10/66

ตรวจสอบโดย / Check By [signature]

วันที่/Date 3/10/66

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (×) มีปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
SIRIRAJ HOSPITAL

Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant And Water Pump

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบ PUMP ประจำเดือน

ขาดาร **B,C,PK** ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

รายการ	ขาดาร	สถานที่	Code 1	2	3	4	5	6	7	Start	Finish	Voltage (V) R-S	S-T	T-R	Ampere (A) R	S	T	Remark
SP -01	B	โรงพักน้ำเสียชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	-	/			390	390	391	2.45	2.45	2.44	
SP - 02	B	บ่อพักน้ำเสียชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	-	/			392	393	393	2.45	2.45	2.45	
SP - 03	B	ใต้ถึงจอดรถ	/	/	/	/	/	-	/			393	393	393	2.45	2.45	2.44	
SP - 04	B	บ่อพัก ITD	/	/	/	/	/	-	/			390	390	390	2.44	2.44	2.44	
SP - 05 (1 ชุด)	PK	ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ชำรุด
AP-01	PK	ห้องปั๊ม	-	/	/	/	/	/	/			391	393	393	8.35	8.35	8.51	
AP-02	PK	ห้องปั๊ม	-	/	/	/	/	/	/			394	394	394	9.59	9.59	9.54	
AP-03	PK	ห้องปั๊ม Jockey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ชำรุด
SLP - 1	PK	บ่อน้ำดิบ	-	/	/	/	/	/	/			391	392	393	1.50	1.51	1.51	
Cap-01	C	ใต้ถุนอาคาร	-	/	/	/	/	/	/			390	391	391	15.96	15.96	15.96	
Cap-02	C	ใต้ถุนอาคาร	-	/	/	/	/	/	/			390	392	392	15.96	15.96	15.96	
BP - 01	B	บ่อพัก	-	/	/	/	/	/	/			392	392	392	9.58	9.58	9.58	
BP - 02	B	บ่อพัก	-	/	/	/	/	/	/			392	392	392	9.59	9.59	9.59	
SP - 06	PK	ห้องน้ำชาย ร	/	/	/	/	/	-	/			391	392	391	1.96	1.96	1.96	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสูตรระบบ
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบปั๊ม
3	ตรวจเช็ค Terminal Box และ จุด Junction Box
4	ปั๊มจ่ายการแต่งไฟฟ้า
5	ปั๊มจ่ายการแต่งไฟฟ้า
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Timer
7	ทำความสะอาดตามการทำงานปั๊มจุดควบคุม

ดำเนินการโดย / Action By
1 [signature]
2

วันที่/Date 4/11/66

ตรวจสอบโดย / Check By [signature]

วันที่/Date 4/11/66

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (×) มีปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FM-FAC-014 : Rev 0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
SIRIRAJ HOSPITAL

Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant And Water Pump

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบ PUMP ประจำเดือน 10/8/66

อาคาร B,C,PK

ประจำเดือน 10/8/66

รายการ	อาคาร	สถานที่	Code 1	2	3	4	5	6	7	Start	Finish	Voltage (V) R-S	S-T	T-R	Ampere (A) R	S	T	Remark
SP-01	B	ปั๊มน้ำเสียใต้ตึก B	/	/	/	/	/	-	/			400	400	400	2.42	2.3	2.35	
SP-02	B	ปั๊มน้ำเสียใต้ตึก B	/	/	/	/	/	-	/			400	400	400	2.53	2.46	2.99	
SP-03	B	ปั๊มน้ำดี	/	/	/	/	/	-	/			400	400	400	2.51	2.34	2.38	
SP-04	B	ปั๊มน้ำดี	/	/	/	/	/	-	/			400	400	400	1.25	1.21	1.32	
SP-05 (1 ชุด)	PK	ปั๊มน้ำดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เสีย
AP-01	PK	ปั๊มน้ำดี	-	/	/	/	/	/	/			400	398	400	4.33	4.36	4.34	
AP-02	PK	ปั๊มน้ำดี	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	4.11	4.35	4.39	
AP-03	PK	ปั๊มน้ำดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เสีย
SLP-1	PK	ปั๊มน้ำทิ้ง	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	1.24	1.26	1.34	
Cwp-01	C	ปั๊มหอคอย	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	17.1	19.1	19.2	
Cwp-02	C	ปั๊มหอคอย	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	17.9	17.7	17.8	
BP-01	B	ปั๊มดับเพลิง	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	6.21	7.32	7.29	ยังไม่ได้ใช้งาน
BP-02	B	ปั๊มดับเพลิง	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	6.35	6.89	6.23	ยังไม่ได้ใช้งาน
SP-06	PK	ปั๊มน้ำดี AU1	/	/	/	/	/	-	/			400	400	400	1.91	1.89	1.97	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจสภาพทั่วไป
2	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ
3	ตรวจสอบ Terminal Blocks ที่ Junction Box
4	ปรับตั้งค่าระดับไฟ
5	ปรับตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
6	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน
7	บำรุงและหล่อลื่นตามคู่มือผู้ผลิต

ดำเนินการโดย / Actor By

1 [signature]

2 10/8/66

รับที่/Date

ตรวจสอบโดย / Check By

[signature]

รับที่/Date 10/8/66

หมายเหตุ (✓) ปกติ , (X) มีปัญหา , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
SIRIRAJ HOSPITAL

Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant And Water Pump

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบ PUMP ประจำเดือน 4/ส.ค./66

อาคาร B,C,PK

ประจำเดือน 4/ส.ค./66

รายการ	อาคาร	สถานที่	Code 1	2	3	4	5	6	7	Start	Finish	Voltage (V) R-S	S-T	T-R	Ampere (A) R	S	T	Remark
SP-01	B	ปั๊มน้ำเสียใต้ตึก B	/	/	/	/	/	-	/			404	400	403	2.49	2.45	2.54	
SP-02	B	ปั๊มน้ำเสียใต้ตึก B	/	/	/	/	/	-	/			401	401	405	2.46	2.39	2.42	
SP-03	B	ปั๊มน้ำดี	/	/	/	/	/	-	/			404	404	404	2.51	2.39	2.45	
SP-04	B	ปั๊มน้ำดี	/	/	/	/	/	-	/			399	399	404	2.42	2.44	2.41	
SP-05 (1 ชุด)	PK	ปั๊มน้ำดับเพลิงใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เสีย
AP-01	PK	ปั๊มน้ำดี	-	/	/	/	/	/	/			399	399	400	4.35	4.31	4.40	
AP-02	PK	ปั๊มน้ำดี	-	/	/	/	/	/	/			400	400	399	4.26	4.30	4.29	
AP-03	PK	ปั๊มน้ำดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เสีย
SLP-1	PK	ปั๊มน้ำทิ้ง	-	/	/	/	/	/	/			400	400	399	1.35	1.39	1.36	
Cwp-01	C	ปั๊มหอคอย	-	/	/	/	/	/	/			399	400	401	15.3	15.4	15.5	
Cwp-02	C	ปั๊มหอคอย	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	15.7	15.6	15.6	
BP-01	B	ปั๊มดับเพลิง	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	7.38	8.56	8.51	
BP-02	B	ปั๊มดับเพลิง	-	/	/	/	/	/	/			400	400	400	8.33	8.25	8.32	
SP-06	PK	ปั๊มน้ำดี AU1	/	/	/	/	/	-	/			401	399	400	1.71	1.68	1.73	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจสภาพทั่วไป
2	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ
3	ตรวจสอบ Terminal Blocks ที่ Junction Box
4	ปรับตั้งค่าระดับไฟ
5	ปรับตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
6	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน Fever
7	บำรุงและหล่อลื่นตามคู่มือผู้ผลิต

ดำเนินการโดย / Actor By

1 [signature]

2

รับที่/Date 4/ส.ค./66

ตรวจสอบโดย / Check By

[signature]

รับที่/Date 4/8/66

หมายเหตุ (✓) ปกติ , (X) มีปัญหา , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FM-FAC-014 Rev 0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRIRAYONG HOSPITAL

Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant And Water Pump

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบ PUMP ประจำเดือน

อาคาร B,C,PK

ประจำเดือน 10-7-66

รายการ	อาคาร	สถานที่	Code							Start	Finish	Voltage (V)			Ampere (A)			Remark
			1	2	3	4	5	6	7			R-S	S-T	T-R	R	S	T	
SP-01	B	ใต้ตึกบำบัดน้ำเสีย B	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓			400	400	400	2.41	2.39	2.32	
SP-02	B	ใต้ตึกบำบัดน้ำเสีย B	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓			401	400	400	2.52	2.42	2.43	
SP-03	B	ใต้ตึกบำบัดน้ำเสีย B	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓			400	401	400	2.48	2.36	2.41	
SP-04	B	ใต้ตึกบำบัดน้ำเสีย B	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓			400	400	400	2.25	2.24	2.23	
SP-05 (ไม่ใช้)	PK	ใต้ตึกบำบัดน้ำเสีย PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ใช้
AP-01	PK	ใต้ตึกบำบัด	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			400	401	400	4.32	4.23	4.32	
AP-02	PK	ใต้ตึกบำบัด	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			400	400	400	8.24	8.20	8.19	
AP-03	PK	ใต้ตึกบำบัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ใช้
SLP-1	PK	ใต้ตึกบำบัด	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			400	400	400	1.29	1.26	1.25	
Cmp-01	C	ใต้ตึกบำบัด	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			400	400	400	19.2	19.1	19.2	
Cmp-02	C	ใต้ตึกบำบัด	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			400	400	401	17.9	18	17.9	
SP-01	B	ตึกบำบัด	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			401	400	400	4.26	4.25	4.25	ถังใต้ตึกบำบัด
SP-02	B	ตึกบำบัด	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			400	400	401	0.34	0.28	0.27	ถังใต้ตึกบำบัด
SP-06	PK	ถังเก็บน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓			400	400	400	1.9	1.9	1.92	

Code	PM Program (Monday)
1	ตรวจเช็คสภาพ
2	ตรวจเช็ค/เปลี่ยนอะไหล่ตามระบบเดิม
3	ตรวจเช็ค Terminal Box และ ชุด Junction Box
4	ปรับตั้งค่าระดับไฟ
5	ปรับตั้งค่าระดับไฟฟ้า
6	ตรวจเช็คการตั้งค่า Timer
7	ตรวจสอบการทำงานการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม

ดำเนินการโดย / Action By

1 _____

2 _____

วันที่ Date 10-7-66

ตรวจสอบโดย / Check By

_____

วันที่ Date 10/7/66

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) ชำรุด/เสีย (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปริมาณบ่อพักน้ำ

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN											
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
			บ่อพักน้ำดี																					
MP		1	บ่อ 250 Q	C	L	อาคาร C	WT-C-1-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	Y/SC	M	M	M
MP		1	บ่อ 25 Q	B	R	สาดฟ้า	HWT-B-R-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	Y/SC	M	M	M
MP		1	บ่อ 25 Q	B	R	สาดฟ้า	HWT-B-R-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	Y/SC	M	M	M
			บ่อพักน้ำเสีย																					
WWT		1	บ่อพักน้ำเสีย	B	PK	ข้างอาคาร B	WWT-B-PK-01	-	-	-	25 Q		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	H
WWT		1	บ่อดักไขมัน	B	PK	ข้างอาคาร B	GTT-B-PK-01	-	-	-	8 Q		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	H
WWT		1	บ่อกากน้ำเสีย	B	PK	ข้างอาคาร B	ST-B-PK-01	-	-	-	13 Q		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	H
WWT		1	บ่อดาดตะกอน	PK	PK	บ่อบำบัด	SW-PK-01	-	-	-	8 Q		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	H
WWT		1	บ่อพักน้ำถังแขค	PK	PK	ห้องน้ำ ARI	SW-PK-02	-	-	-	3Q		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	H

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUATERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ.....ผู้บริหารหน่วยงาน
Date/วันที่ 5/01/2023

อนุมัติโดย
ลงชื่อ.....วิศวกรปฏิบัติการ
Date/วันที่ 5/01/2023

รับตรวจโดย
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
General Support, HOI
Date/วันที่ 5/01/2023

ATALIAN แบบฟอร์มการตรวจเช็ก ปริมาณบ่อพักน้ำ 250 m3

เดือน พฤศจิกายน 66

วันที่	เวลา	เขียว 166 - 250 m3	เหลือง 83 - 166 m3	แดง 0 - 83 m3	ผู้ตรวจเช็ก	หมายเหตุ
1	06.30	✓			ประภัสร	
2	06.30	✓			ประภัสร	
3	06.30	✓			ประภัสร	
4	06.30	✓			ประภัสร	
5	07.40		✓		ประภัสร	
6	05.45	✓			ประภัสร	
7	06.00	✓			วิทยา	
8	06.35	✓			วิทยา	
9	06.05	✓			วิทยา	
10	06.15	✓			วิทยา	
11	06.15	✓			วิทยา	
12	06.15		✓		วิทยา	
13	06.15		✓		วิทยา	
14	06.05	✓			ชัยพงษ์	
15	06.00	✓			ชัยพงษ์	
16	06.00	✓			ชัยพงษ์	
17	06.05	✓			ชัยพงษ์	
18	06.05	✓			ชัยพงษ์	
19	06.00	✓			ชัยพงษ์	
20	06.05	✓			ประภัสร	
21	05.55	✓			ประภัสร	
22	05.55	✓			ประภัสร	
23	05.55	✓			วิทยา	
24	05.55	✓			วิทยา	
25	06.00		✓		วิทยา	
26	06.05	✓			ชัยพงษ์	
27	06.05	✓			ชัยพงษ์	
28	06.05	✓			ชัยพงษ์	
29	06.10	✓			ชัยพงษ์	
30	06.15	✓			วิทยา	
31						

หมายเหตุ เขียว = ปกติ

เหลือง = เฝ้าระวัง

แดง = วิกฤติ

ผู้ตรวจสอบ สันติสุข

วัน/เดือน/ปี 30/11/66

FM-FAC-059 Rev.0 (01/05/2017)

ATALIAN แบบฟอร์มการตรวจเช็ก ปริมาณบ่อพักน้ำ 250 m3

เดือน ธันวาคม 66

วันที่	เวลา	เขียว 166 - 250 m3	เหลือง 83 - 166 m3	แดง 0 - 83 m3	ผู้ตรวจเช็ก	หมายเหตุ
1	06.15	✓			ชัยพงษ์	
2	06.15	✓			ประภัสร	
3	06.15	✓			ประภัสร	
4	06.15	✓			วิทยา	
5	06.20	✓			วิทยา	
6	06.25		✓		วิทยา	
7	06.25		✓		วิทยา	
8	05.55	✓			วิทยา	
9	05.45	✓			ชัยพงษ์	
10	05.45	✓			ชัยพงษ์	
11	05.45	✓			ชัยพงษ์	
12	06.00		✓		ชัยพงษ์	
13	06.05	✓			ประวิช	
14	06.05	✓			ประวิช	
15	06.15	✓			ประวิช	
16	05.50	✓			ประวิช	
17	05.50		✓		ประวิช	
18	05.40	✓			ชัยพงษ์	
19	05.55	✓			ชัยพงษ์	
20	06.00	✓			ชัยพงษ์	
21	06.00	✓			วิทยา	
22	06.00	✓			วิทยา	
23	06.15	✓			วิทยา	
24	06.15	✓			วิทยา	
25	06.15	✓			วิทยา	
26	06.30	✓			ประภัสร	
27	05.50	✓			ประภัสร	
28	05.30	✓			ประภัสร	
29	05.30		✓		ประภัสร	
30	06.00	✓			ประภัสร	
31	06.15	✓			ประภัสร	

หมายเหตุ เขียว = ปกติ

เหลือง = เฝ้าระวัง

แดง = วิกฤติ

ผู้ตรวจสอบ สันติสุข

วัน/เดือน/ปี 31/12/66

FM-FAC-059 Rev.0 (01/05/2017)

ATALIAN แบบฟอร์มการตรวจเช็ค ปริมาณบ่อพักน้ำ 250 m3

เดือน ตุลาคม 66

วันที่	เวลา	เขียว 166 - 250 m3	เหลือง 83 - 166 m3	แดง 0 - 83 m3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	06.50		/			
2	06.50		/			
3	06.50	/				
4	06.50	/				
5	06.50	/				
6	09.00	/				
7	09.00	/				
8	09.00	/				
9	06.50	/				
10	06.50		/			
11	06.50	/				
12	09.00	/				
13	09.10	/				
14	09.10	/				
15	09.10	/				
16	09.50	/				
17	09.50	/				
18	09.50	/				
19	09.50		/			
20	09.50	/				
21	06.55	/				
22	06.55	/				
23	06.55	/				
24	06.50	/				
25	09.10	/				
26	09.10	/				
27	09.10		/			
28	06.55		/			
29	06.55	/				
30	06.55	/				
31	09.00	/				

หมายเหตุ เขียว = ปกติ
เหลือง = เฝ้าระวัง
แดง = วิกฤติ

ผู้ตรวจสอบ.....

วัน/เดือน/ปี.....

FM-FAC-059 Rev.0 (01/05/2017)

ATALIAN แบบฟอร์มการตรวจเช็ค ปริมาณบ่อพักน้ำ 250 m3

เดือน พฤศจิกายน 66

วันที่	เวลา	เขียว 166 - 250 m3	เหลือง 83 - 166 m3	แดง 0 - 83 m3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	06.50	/				
2	06.50	/				
3	01.50	/				
4	06.50	/				
5	01.50	/				
6	06.50	/				
7	06.50	/				
8	06.50	/				
9	06.50		/			
10	01.50	/				
11	06.50	/				
12	06.50	/				
13	06.50	/				
14	09.00	/				
15	09.00	/				
16	01.50		/			
17	06.50	/				
18	06.50	/				
19	06.50	/				
20	09.00	/				
21	09.00	/				
22	09.50	/				
23	06.50	/				
24	01.50	/				
25	6.50	/				
26	6.50	/				
27	6.50	/				
28	6.50	/				
29	6.50	/				
30	6.50	/				
31						

หมายเหตุ เขียว = ปกติ
เหลือง = เฝ้าระวัง
แดง = วิกฤติ

ผู้ตรวจสอบ.....

วัน/เดือน/ปี 30/11/66

FM-FAC-059 Rev.0 (01/05/2017)

ATALIAN แบบฟอร์มการตรวจเช็ค ปริมาณบ่อพักน้ำ 250 m3

เดือน 0.9.60

วันที่	เวลา	เขียว 166 - 250 m3	เหลือง 83 - 166 m3	แดง 0 - 83 m3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	0.00	✓	–	–		
2	6.30	✓	–	–		
3	6.30	✓	–	–		
4	6.30	✓	–	–		
5	7.00	✓	–	–		
6	7.00	✓	–	–		
7	7.00	✓	–	–		
8	7.00	✓	–	–		
9	7.10	✓	–	–		
10	7.10	✓	–	–		
11	7.10	✓	–	–		
12	7.10	✓	–	–		
13	7.10	✓	–	–		
14	7.15	✓	–	–		
15	7.15	✓	–	–		
16	7.10	✓	–	–		
17	6.00	✓	–	–		
18	6.00	✓	–	–		
19	6.05	✓	–	–		
20	6.10	✓	–	–		
21	6.10	✓	–	–		
22	6.15	✓	–	–		
23	6.30	✓	–	–		
24	6.30	✓	–	–		
25	6.10	✓	–	–		
26	6.30	✓	–	–		
27	6.30	✓	–	–		
28	6.30	✓	–	–		
29	6.20	✓	–	–		
30	6.30	✓	–	–		
31	6.30	✓	–	–		

หมายเหตุ เขียว – ปกติ

เหลือง – เฝ้าระวัง

แดง – วิกฤติ

ผู้ตรวจสอบ

วันเดือนปี 31/4/66

FM-FAC-059 Rev.0 (01/05/2017)

ATALIAN แบบฟอร์มการตรวจเช็ค ปริมาณบ่อพักน้ำ 250 m3

เดือน สิงหาคม / 2566

วันที่	เวลา	เขียว 166 - 250 m3	เหลือง 83 - 166 m3	แดง 0 - 83 m3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	9.00	✓	–	–		
2	9.00	✓	–	–		
3	8.35	✓	–	–		
4	9.10	✓	–	–		
5	06:10	✓	–	–		
6	06:20	✓	–	–		
7	08:30	✓	–	–		
8	9.00	✓	–	–		
9	06:20	✓	–	–		
10	06:30	✓	–	–		
11	9:05	✓	–	–		
12	9.10	✓	–	–		
13	07:10	✓	–	–		
14	07:20	✓	–	–		
15	9:12	✓	–	–		
16	8:35	✓	–	–		
17	9:15	✓	–	–		
18	9:00	✓	–	–		
19	9:03	✓	–	–		
20	07:00	✓	–	–		
21	06:00	✓	–	–		
22	09:20	✓	–	–		
23	8.00	✓	–	–		
24	4:10	✓	–	–		
25	06:20	✓	–	–		
26	8:30	✓	–	–		
27	06:20	✓	–	–		
28	06:10	✓	–	–		
29	08:25	✓	–	–		
30	06:30	✓	–	–		
31	08:27	✓	–	–		

หมายเหตุ เขียว – ปกติ

เหลือง – เฝ้าระวัง

แดง – วิกฤติ

ผู้ตรวจสอบ

วันเดือนปี 31/4/66

FM-FAC-059 Rev.0 (01/05/2017)

Central Emergency Light

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

[illegible]	FM-F-MED-02
แก้ไขครั้งที่	Rev 03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/1/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.01	B	1	ห้องชาร์ปไฟชั้น 1	CEL B-1-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 1500		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.02	B	2	ห้องชาร์ปไฟชั้น 2	CEL B-2-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 800		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.03	B	3	ห้องชาร์ปไฟชั้น 3	CEL B-3-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 1300		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.04	B	4	ห้องชาร์ปไฟชั้น 4	CEL B-4-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 1300		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.05	B	5	ห้องชาร์ปไฟชั้น 5	CEL B-5-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 400		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.06	B	6	ห้องชาร์ปไฟชั้น 6	CEL B-6-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 800		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.07	B	7	ห้องชาร์ปไฟชั้น 7	CEL B-7-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 800		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	CEL	1	Central Emergency Light No.08	B	8	ห้องชาร์ปไฟชั้น 8	CEL B-8-01	Max Bright by C.E.E	-	-	HP 801		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUARTERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ.....ผู้บริหารหน่วยงาน
Date/วันที่ 5/01/2023

อนุมัติโดย
ลงชื่อ.....วิศวกรปฏิบัติการ
Date/วันที่ 5/01/2023

รับทราบโดย
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
Date/วันที่ 5/01/2023

ATALIAN

Central Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ประจำเดือน

อาคาร ..... วันเดือนปี ตุลาคม 66

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code) 1	2	3	4	หมายเหตุ
1	CEL-B-1-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	
2	CEL-B-2-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	
3	CEL-B-3-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	
4	CEL-B-4-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	
5	CEL-B-5-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	
6	CEL -B-6-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	
7	CEL -B-7-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	
8	CEL -B-8-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟแสดงผล (Normal)
2	ทดสอบการส่องสว่างของหลอดไฟ
3	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแห้ง)
	-อายุการใช้งาน -ลักษณะแบต บวม/ไม่บวม - ไม่เป็นสนิม
4	ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 ชม.)

ผู้ตรวจเช็ก ปรเมศร์ อุดรวงศ์
วันที่ 10/11/66

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ
วันที่ 10/11/66

หมายเหตุ : (√) ปกติ, (X) ผิดปกติ

ATALIAN

Central Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ประจำเดือน

อาคาร ..... วันเดือนปี พฤศจิกายน 66

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code) 1	2	3	4	หมายเหตุ
1	CEL-B-1-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	
2	CEL-B-2-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	
3	CEL-B-3-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	
4	CEL-B-4-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	
5	CEL-B-5-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	
6	CEL -B-6-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	
7	CEL -B-7-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	
8	CEL -B-8-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟแสดงผล (Normal)
2	ทดสอบการส่องสว่างของหลอดไฟ
3	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแห้ง)
	-อายุการใช้งาน -ลักษณะแบต บวม/ไม่บวม - ไม่เป็นสนิม
4	ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 ชม.)

ผู้ตรวจเช็ก ว.ว.ว
วันที่ 10/12/66

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ
วันที่ 10/12/66

หมายเหตุ : (√) ปกติ, (X) ผิดปกติ

FM-FAC-040 Rev.1 (04/02/2019)

ATALIAN

Central Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ประจำเดือน

อาคาร B วันเดือน/ปี 12/8/66

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code)				หมายเหตุ
				1	2	3	4	
1	CEL-B-1-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 1	1	/	/	/	/	
2	CEL-B-2-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 2	2	/	/	/	/	
3	CEL-B-3-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 3	3	/	/	/	/	
4	CEL-B-4-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 4	4	/	/	/	/	
5	CEL-B-5-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 5	5	/	/	/	/	
6	CEL -B-6-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 6	6	/	/	/	/	
7	CEL -B-7-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 7	7	/	/	/	/	
8	CEL -B-8-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 8	8	/	/	/	/	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟแสดงผล (Normal)
2	ทดสอบการส่องสว่างของหลอดไฟ
3	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแห้ง)
	-อายุการใช้งาน -ลักษณะแบต บวมไม่บวม - ไฟเป็นขึ้นเสีย
4	ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 รม.)

ผู้ตรวจเช็ค [illegible] วันที่ 12-8-66

ผู้ตรวจสอบ [illegible] วันที่ 12/8/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (X) ผิดปกติ

ATALIAN

Central Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ประจำเดือน

อาคาร ..... วันเดือน/ปี [illegible] 66

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code)				หมายเหตุ
				1	2	3	4	
1	CEL-B-1-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 1	1	/	/	/	/	
2	CEL-B-2-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 2	2	/	/	/	/	
3	CEL-B-3-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 3	3	/	/	/	/	
4	CEL-B-4-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 4	4	/	/	/	/	
5	CEL-B-5-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 5	5	/	/	/	/	
6	CEL -B-6-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 6	6	/	/	/	/	
7	CEL -B-7-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 7	7	/	/	/	/	
8	CEL -B-8-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 8	8	/	/	/	/	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟแสดงผล (Normal)
2	ทดสอบการส่องสว่างของหลอดไฟ
3	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแห้ง)
	-อายุการใช้งาน -ลักษณะแบต บวมไม่บวม - ไฟเป็นขึ้นเสีย
4	ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 รม.)

ผู้ตรวจเช็ค [illegible] วันที่ 11/10/66

ผู้ตรวจสอบ [illegible] วันที่ 11/10/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (X) ผิดปกติ

FM-FAC-040 Rev.1 (04/02/2019)

ATALIAN

Central Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ประจำเดือน

อาคาร ..... b ..... วัน/เดือน/ปี 15/7/66

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code) 1	2	3	4	หมายเหตุ
1	CEL-B-1-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	
2	CEL-B-2-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	
3	CEL-B-3-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	
4	CEL-B-4-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	
5	CEL-B-5-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	
6	CEL -B-6-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	
7	CEL -B-7-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	
8	CEL -B-8-01	ห้องชาร์ปไฟชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟแสดงผล (Normal)
2	ทดสอบการส่องสว่างของหลอดไฟ
3	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแห้ง)
	-อายุการใช้งาน -ลักษณะแบต บวม/ไม่บวม - ไม่เป็นสนิมกัด
4	ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบปลดจำเดือน 2 ชม)

ผู้ตรวจเช็ก ..... วันที่ 15/7/66

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ 15/7/66

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ

Emergency Light

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	EMERGENCY EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DESCRIPTION				Unit	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EM	EML	1	Emergency Light No.01	1	A		EML-A-1-01																		
EM	EML	1	Emergency Light No.02	1	A		EML-A-1-02																		
EM	EML	1	Emergency Light No.03	1	A		EML-A-1-03																		
EM	EML	1	Emergency Light No.04	1	A		EML-A-1-04																		
EM	EML	1	Emergency Light No.05	1	A		EML-A-1-05																		
EM	EML	1	Emergency Light No.06	1	A		EML-A-1-06																		
EM	EML	1	Emergency Light No.07	1	A		EML-A-1-07																		
EM	EML	1	Emergency Light No.08	1	A		EML-A-1-08																		
EM	EML	1	Emergency Light No.09	1	A		EML-A-1-09																		
EM	EML	1	Emergency Light No.10	1	A		EML-A-1-10																		
EM	EML	1	Emergency Light No.11	1	A	LOBBY 2-WAY	EML-A-1-11																		
EM	EML	1	Emergency Light No.12	1	A	ทิศ ตะวันตก, LOBBY	EML-A-1-12																		
EM	EML	1	Emergency Light No.13	1	A	ทิศ CT SCAN 1	EML-A-1-13																		
EM	EML	1	Emergency Light No.14	1	A	Control Room CT SCAN	EML-A-1-14																		
EM	EML	1	Emergency Light No.15	1	A	ทิศ CT SCAN 2	EML-A-1-15																		
EM	EML	1	Emergency Light No.16	1	A		EML-A-1-16																		
EM	EML	1	Emergency Light No.17	1	A	ห้องเครื่องลิฟต์ 5 ตัน 1	EML-A-1-17																		
EM	EML	1	Emergency Light No.18	1	A		EML-A-1-18																		
EM	EML	1	Emergency Light No.19	1	A		EML-A-1-19																		
EM	EML	1	Emergency Light No.20	1	A		EML-A-1-20																		
EM	EML	1	Emergency Light No.21	1	A		EML-A-1-21																		
EM	EML	1	Emergency Light No.22	1	A		EML-A-1-22																		
EM	EML	1	Emergency Light No.23	1	A		EML-A-1-23																		
EM	EML	1	Emergency Light No.24	1	A		EML-A-1-24																		
EM	EML	1	Emergency Light No.25	1	A		EML-A-1-25																		
EM	EML	1	Emergency Light No.26	2	A		EML-A-2-26																		
EM	EML	1	Emergency Light No.27	2	A		EML-A-2-27																		
EM	EML	1	Emergency Light No.28	2	A		EML-A-2-28																		
EM	EML	1	Emergency Light No.29	2	A		EML-A-2-29																		
EM	EML	1	Emergency Light No.30	2	A		EML-A-2-30																		
EM	EML	1	Emergency Light No.31	2	A		EML-A-2-31																		
EM	EML	1	Emergency Light No.32	2	A		EML-A-2-32																		

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH._____Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Rqs	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EB	EML	1	Emergency Light No.33	2	A	โถงทางเข้าใหญ่	EML-A-2-08	(Sun)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.34	2	A	ทางเชื่อมบันไดหนีไฟ	EML-A-2-09	(Sun)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.35	3	A	LOBBY หน้า Lift	EML-A-3-01	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.36	3	A	LOBBY หน้าลิฟท์ SURVERY	EML-A-3-02	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.37	3	A	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ผู้โดยสาร เบอร์ 1	EML-A-3-03	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.38	3	A	ทางเดินหลัง Lift	EML-A-3-04	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.39	3	A	ห้องเครื่อง Lift	EML-A-3-05	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.40	3	A	หน้าห้องเครื่อง Lift	EML-A-3-06	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.41	3	A	ทางเดินด้านหลังลิฟท์ Lift 3,4	EML-A-3-07	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.42	3	A	ห้องพักแม่บ้านหน้าลิฟท์ Lift	EML-A-3-08	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.43	3	A	หน้าห้องน้ำชาย และห้องน้ำ Lift	EML-A-3-09	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.44	3	A	ห้องน้ำชายหน้าลิฟท์ ทางเข้า	EML-A-3-10	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.45	3	A	ห้องน้ำชายหน้าลิฟท์ หญิง เข้า	EML-A-3-11	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.46	3	A	หน้าห้องน้ำแม่บ้านหน้าลิฟท์ หญิง เข้า	EML-A-3-12	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.47	3	A	หน้าห้องน้ำแม่บ้านหน้าลิฟท์ หญิง ออก	EML-A-3-13	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.48	3	A	หน้าห้องน้ำชาย ออก	EML-A-3-14	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.49	3	A	ห้อง STERILE 1/1	EML-A-3-15	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.50	3	A	ห้อง STERILE 1/2	EML-A-3-16	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.51	3	A	หน้าห้องน้ำ CSSD 1/1	EML-A-3-17	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.52	3	A	หน้าห้องน้ำ CSSD 1/2	EML-A-3-18	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.53	3	A	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า CSSD	EML-A-3-19	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.54	3	A	ห้องรับรองเจ้าหน้าที่ CSSD	EML-A-3-20	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.55	3	A	ห้องเก็บน้ำยา CSSD	EML-A-3-21	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.56	3	A	หน้าห้องเก็บของแม่บ้าน ชั้น 3	EML-A-3-22	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.57	3	A	ห้องเก็บของแม่บ้าน CSSD	EML-A-3-23	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.58	3	A	ทางเข้าหลังห้องน้ำ CSSD	EML-A-3-24	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.59	3	A	ทางเดินด้านหลัง CSSD	EML-A-3-25	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.60	3	A	ทางเดินหลัง CSR 1/1	EML-A-3-26	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.61	3	A	ทางเดินหลัง CSR 1/2	EML-A-3-27	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.62	3	A	ทางเดินหลัง CSR 1/3	EML-A-3-28	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.63	3	A	ทางเดินหลัง CSR1/4	EML-A-3-29	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.64	3	A	ทางเดินหลัง CSR 1/5	EML-A-3-30	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH._____Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Rqs	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EB	EML	1	Emergency Light No.65	3	A	หน้าห้องน้ำแม่บ้านชั้น 3	EML-A-3-31	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.66	3	A	หน้าห้องเก็บของแม่บ้าน LR	EML-A-3-32	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.67	3	A	หน้าห้องเก็บของแม่บ้าน NS	CML-A-3-33	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.68	3	A	เคาน์เตอร์ NS 1/1	EML-A-3-34	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.69	3	A	เคาน์เตอร์ NS 1/2	EML-A-3-35	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.70	3	A	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์ 1/1	EML-A-3-36	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.71	3	A	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์ 1/2	EML-A-3-37	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.72	3	A	ทางเดินโถงกลาง 1/1	EML-A-3-38	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.73	3	A	ทางเดินโถงกลาง 1/2	EML-A-3-39	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.74	3	A	ทางเดิน เคาน์เตอร์ NS	EML-A-3-40	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.75	3	A	ทางเดินหลัง ICU	EML-A-3-41	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.76	3	A	หน้าห้องน้ำชาย ISOLATE 1,2	EML-A-3-42	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.77	3	A	หน้าห้อง ISOLATE 1,2	EML-A-3-43	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.78	3	A	เคาน์เตอร์ ICU	EML-A-3-44	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.79	3	A	หน้าห้องน้ำแขวนหน้าห้อง ICU	EML-A-3-45	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.80	3	A	ห้องพักแม่บ้านหน้าห้อง ICU	EML-A-3-46	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.81	3	A	ห้องน้ำแขวนหน้าห้องพยาบาล	EML-A-3-47	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.82	3	A	ทางเดินหน้าห้องเคาน์เตอร์ ICU 1/1	EML-A-3-48	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.83	3	A	ทางเดินหน้าห้องเคาน์เตอร์ ICU 1/2	EML-A-3-49	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.84	3	A	ทางเดินหน้าห้องเคาน์เตอร์ ICU 1/3	EML-A-3-50	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.85	3	A	ทางเดินหน้าห้อง VIP ICU	EML-A-3-51	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.86	3	A	หน้าห้อง ICU 1/4	EML-A-3-52	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.87	3	A	หน้าห้อง ICU 1/3	EML-A-3-53	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.88	3	A	หน้าห้อง ICU 1/2	EML-A-3-54	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.89	3	A	โถง ICU	EML-A-3-55	Emergency Light (M/S)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.90	3	A	ทางเดิน ICU	EML-A-3-56	Emergency Light (M/S)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.91	3	A	โถงทางเข้า ICU	EML-A-3-57	Emergency Light (M/S)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.92	3	A	ICU	EML-A-3-58	Emergency Light (M/S)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.93	3	A	ทางเดิน ICU 1/2	EML-A-3-59	Emergency Light (M/S)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.94	3	A	ทางเดิน ICU 1/3	EML-A-3-60	Emergency Light (M/S)	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.95	3	A	โถงทางเข้าหลัก	EML-A-3-61	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EB	EML	1	Emergency Light No.96	3	A	ทางเดินหลัง	EML-A-3-62	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE ....SRH.....Rev.00

หมายเลขเอกสาร	FM-QR-02
ฉบับที่แก้ไข	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/5/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
ER	EML	1	Emergency Light No.97	1	S	ห้องเครื่องใหญ่	EML-S-1-03	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.98	1	S	LOBBY หน้าลิฟต์-ใหญ่	EML-S-1-04	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.99	1	S	ปั๊มดับเพลิง ST 1 ชั้น 1	EML-S-1-05	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.100	1	S	หน้าบันได A,B	EML-S-1-06	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.101	1	S	ห้องเครื่องไฟ ชั้น 1	EML-S-1-07	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.102	1	S	หน้าห้องน้ำ หญิง ชาย	EML-S-1-08	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.103	1	S	หน้าลิฟต์ C ชั้น 1	EML-S-1-09	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.104	1	S	ห้อง Control Room	EML-S-1-10	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.105	1	S	ทางเข้า Sick Baby	EML-S-1-11	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.106	1	S	เคาน์เตอร์ Sick Baby 1/3	EML-S-1-12	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.107	1	S	เคาน์เตอร์ Sick Baby 1/2	EML-S-1-13	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.108	1	S	ทางเข้าออก ศูนย์ Sick Baby	EML-S-1-14	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.109	1	S	ห้อง Treatment Sick Baby	EML-S-1-15	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.110	1	S	ห้อง ตรวจ Sick Baby	EML-S-1-16	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.111	1	S	ทางเดินหน้า ห้องตรวจ Sick Baby ทิศ 2	EML-S-1-17	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.112	1	S	หน้าห้องตรวจ ID Sick Baby	EML-S-1-18	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.113	2	S	หน้าทางลงบันได ฝั่งตรง (ด้านใน)	EML-S-2-01	Max Bright by C.E.E			CE 278-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.114	2	S	หน้าห้องน้ำชาย (ด้านนอก)	EML-S-2-02	Max Bright by C.E.E			CE 278-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.115	2	S	ทางเดินหน้าห้อง เวร ชาย	EML-S-2-03	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.116	2	S	ทางเข้าห้องเก็บความร้อนใต้หลังคาชาย	EML-S-2-04	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.117	2	S	หน้าห้องเครื่องปั๊มน้ำ	EML-S-2-05	Max Bright by C.E.E			CE 278-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.118	2	S	หน้าทางลงบันได ST 1 ชั้น 2	EML-S-2-06	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.119	2	S	หน้าลิฟต์ห้องพักผู้ป่วยพิเศษชั้น 2	EML-S-2-07	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.120	2	S	หน้าบันได C ชั้น 2	EML-S-2-08	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.121	3	S	ห้องพักเจ้าหน้าที่ WARD 1	EML-S-3-01	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.122	3	S	ห้องตรวจ WARD 1	EML-S-3-02	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.123	3	S	ทางเดินหน้าตรวจ WARD 3/1	EML-S-3-03	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.124	3	S	ทางเดินหน้าตรวจ WARD 3/2	EML-S-3-04	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.125	3	S	หน้าห้อง 307 ชั้น 3	EML-S-3-05	Max Bright by C.E.E			CE 278-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.126	3	S	หน้าห้อง 308 ชั้น 3	EML-S-3-06	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.127	3	S	หน้าห้อง CLEAN ROOM WARD 3	EML-S-3-07	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light no.128	3	S	ห้องเครื่องไฟ ชั้น 3	EML-S-3-08	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE ....SRH.....Rev.00

หมายเลขเอกสาร	FM-QR-02
ฉบับที่แก้ไข	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/5/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
ER	EML	1	Emergency Light No.129	3	S	หน้าลิฟต์ดับเพลิง ST 2 ชั้น 3	EML-S-3-09	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.130	3	S	หน้าบันได B ชั้น 3	EML-S-3-10	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.131	3	S	ปั๊มดับเพลิง ST ชั้น 3	EML-S-3-11	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.132	3	S	ห้องเก็บความร้อน ชั้น 3	EML-S-3-12	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.133	3	S	ห้องเก็บความร้อน ชั้น 3	EML-S-3-13	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.134	3	S	ปั๊มดับเพลิง ST3 ชั้น 3	EML-S-3-14	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.135	4	S	ปั๊มดับเพลิงน้ำหน้าที่ WARD 4	EML-S-4-01	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.136	4	S	ปั๊มดับเพลิง ST 1 ชั้น 4	EML-S-4-02	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.137	4	S	ห้องเครื่องไฟ ชั้น 4	EML-S-4-03	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.138	4	S	หน้าห้อง 411	EML-S-4-04	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.139	4	S	หน้าห้อง 407	EML-S-4-05	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.140	4	S	หน้าห้อง 414	EML-S-4-06	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light no.141	4	S	หน้าห้อง 403	EML-S-4-07	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.142	4	S	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 4 1/1	EML-S-4-08	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.143	4	S	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 4 1/2	EML-S-4-09	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.144	4	S	หน้าบันได A ชั้น 4	EML-S-4-10	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.145	4	S	ปั๊มดับเพลิง ST 2 ชั้น 4	EML-S-4-11	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.146	4	S	ห้องพักแพทย์ ชั้น 4	EML-S-4-12	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 278-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.147	4	S	ปั๊มดับเพลิง ST 3 ชั้น 4	EML-S-4-13	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.148	4	S	หน้าห้องประชุม Talk conference ชั้น 4	EML-S-4-14	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.149	5	S	ห้องเครื่องไฟ ชั้น 5	EML-S-5-01	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.150	5	S	หน้าห้อง 508	EML-S-5-02	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.151	5	S	หน้าห้อง 514	EML-S-5-03	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.152	5	S	หน้าห้อง 507	EML-S-5-04	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.153	5	S	หน้าห้อง 502	EML-S-5-05	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.154	5	S	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 5 1/3	EML-S-5-06	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.155	5	S	ห้องตรวจแยก WARD 5	EML-S-5-07	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.156	5	S	หน้าห้องน้ำ 5 ชั้น 5	EML-S-5-08	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.157	5	S	ปั๊มดับเพลิง ST 2 ชั้น 5	EML-S-5-09	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.158	5	S	ปั๊มดับเพลิง ST 1 ชั้น 5	EML-S-5-10	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.159	5	S	ไฟฟ้าฉุกเฉินห้องพักเจ้าหน้าที่ WARD 5	EML-S-5-11	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ER	EML	1	Emergency Light No.160	5	S	ห้องเครื่องไฟ ชั้น 5	EML-S-5-12	Max Bright by C.E.E	-	-	CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev 00

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EM	EML	1	Emergency Light No.143	6	B	หน้าห้อง 614	EML-B-6-07	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.144	6	B	หน้าห้องน้ำชั้น 6	EML-B-6-08	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.145	6	B	หน้าห้องเครื่องล่าง HVAC 6 1/2	EML-B-6-09	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.146	6	B	หน้าห้องเครื่องล่าง HVAC 6 1/2	EML-B-6-10	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.147	6	B	ห้องเก็บของ 608	EML-B-6-11	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.148	6	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ 6	EML-B-6-12	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.149	6	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	EML-B-6-13	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.170	6	B	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	EML-B-6-13	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.171	6	B	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	EML-B-6-13	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.172	7	B	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	EML-B-7-03	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.173	7	B	ทางเข้าบันได ST 1 ชั้น 7	EML-B-7-02	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.174	7	B	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 7	EML-B-7-03	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.175	7	B	ทางเดินหน้า ห.7 1/3	EML-B-7-06	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.176	7	B	ทางเดินหน้า ห.7 1/3	EML-B-7-05	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.177	7	B	หน้าห้อง 702	EML-B-7-05	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.178	7	B	หน้าห้อง 708	EML-B-7-07	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.179	7	B	หน้าห้อง 716	EML-B-7-08	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.180	7	B	หน้าห้องพักน้ำ	EML-B-7-09	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.181	7	B	ห้องทำงานโซน ชั้น 7	EML-B-7-10	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.182	7	B	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	EML-B-7-11	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.183	7	B	ห้องเครื่องทำน้ำเย็น ชั้น 7	EML-B-7-12	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.184	8	B	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	EML-B-8-01	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.185	8	B	หน้าบันได ST 1 ชั้น 8	EML-B-8-02	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.186	8	B	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 8	EML-B-8-03	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.187	8	B	ทางเดินหน้า ห.8 1/3	EML-B-8-04	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.188	8	B	ทางเดินหน้า ห.8 1/3	EML-B-8-05	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.189	8	B	หน้าห้อง 802	EML-B-8-06	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.190	8	B	หน้าห้อง 808	EML-B-8-07	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.191	8	B	หน้าห้อง 816	EML-B-8-08	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.192	8	B	หน้าห้องน้ำชาย	EML-B-8-09	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00

[illegible]	[illegible]
[illegible]	Rev 03
[illegible]	1/6/2023

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
EM	EML	1	Emergency Light No.193	8	B	ห้องทางเดิน ชั้น 8	EML-B-8-10	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.194	8	B	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	EML-B-8-11	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.195	8	B	ห้องเครื่องทำน้ำเย็น ชั้น 8	EML-B-8-12	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.196	1	C	ห้องครัว CANTEEN	EML-C-1-01	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.197	1	C	ห้องรับประทานอาหาร CANTEEN	EML-C-1-02	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.198	1	C	แผนกซ่อม	EML-C-1-03	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.199	1	C	แผนกเครื่องมือแพทย์	EML-C-1-04	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.200	1	C	แผนกซักรีด กรุ๊ดแพร์	EML-C-1-05	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.201	1	C	ห้องเก็บ Locker	EML-C-1-06	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.202	1	C	ห้องน้ำ	EML-C-1-07	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.203	1	C	ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด CLEAN	EML-C-1-08	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.204	1	C	ห้อง FIRE PUMP	EML-C-1-09	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.205	1	C	ห้อง PUMP VACUUM	EML-C-1-10	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.206	1	C	ห้อง CCTV	EML-C-1-11	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
EM	EML	1	Emergency Light No.207	1	C	ห้อง MDB	EML-C-1-12	Max Bright by C.E.E			CE 230-9 ED		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUARTERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	SUBCONTRACTOR

ตรวจโดย [illegible]
ตำแหน่ง [illegible]
Date/วันที่ 5/01/2023

ตรวจโดย [illegible]
ตำแหน่ง [illegible]
Date/วันที่ 5/01/2023

รับรองโดย [illegible]
ตำแหน่ง [illegible]
Date/วันที่ 5/01/2023

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

อาคาร B/C วันที่ตรวจ 15/8/66

ลำดับ	รหัสครื่องจ่าย	ตำแหน่ง	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
154	EML-B-5-11	ในห้องพักเจ้าหน้าที่ WARD 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
155	EML-B-6-01	ห้องเชคบิ๊ปไฟ ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
156	EML-B-6-02	หน้าห้อง 616	6	✓	✓	✓	✓	✓	
157	EML-B-6-03	หน้าห้องผ่าชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
158	EML-B-6-04	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/1	6	✓	✓	✓	✓	✓	
159	EML-B-6-05	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/2	6	✓	✓	✓	✓	✓	
160	EML-B-6-06	หน้าห้อง 608	6	✓	✓	✓	✓	✓	
161	EML-B-6-07	หน้าห้อง 602	6	✓	✓	✓	✓	✓	
162	EML-B-6-08	ห้อง01 WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
163	EML-B-6-09	ห้อง Treatment WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
164	EML-B-6-10	หน้าบันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
165	EML-B-6-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
166	EML-B-6-12	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
167	EML-B-7-01	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
168	EML-B-7-02	หน้าบันได ST 1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
169	EML-B-7-03	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
170	EML-B-7-04	เคาน์เตอร์ w.7 1/1	7	✓	✓	✓	✓	✓	
171	EML-B-7-05	เคาน์เตอร์ w.7 1/2	7	✓	✓	✓	✓	✓	
172	EML-B-7-06	หน้าห้อง 702	7	✓	✓	✓	✓	✓	
173	EML-B-7-07	หน้าห้อง 708	7	✓	✓	✓	✓	✓	
174	EML-B-7-08	หน้าห้อง 716	7	✓	✓	✓	✓	✓	
175	EML-B-7-09	หน้าห้องเก็บศพ	7	✓	✓	✓	✓	✓	
176	EML-B-7-10	ห้องเชคบิ๊ปไฟ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
177	EML-B-7-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
178	EML-B-7-12	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
179	EML-C-1-01	ห้องอาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
180	EML-C-1-02	ห้องจัดเตรียม อาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
181	EML-C-1-03	แผนกแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
182	EML-C-1-04	แผนกเครื่องมือแพทย์	1	✓	✓	✓	✓	✓	
183	EML-C-1-05	แผนกซักรีด (ห้องน้ำ)	1	✓	✓	✓	✓	✓	
184	EML-C-1-06	ห้องเก็บ body	1	✓	✓	✓	✓	✓	
185	EML-C-1-07	ห้องพิซ่า	1	✓	✓	✓	✓	✓	
186	EML-C-1-08	ห้องหน้าทางเข้าห้อง CDDE	1	✓	✓	✓	✓	✓	
187	EML-C-1-09	ห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
188	EML-C-1-10	ห้อง PUMP VACUUM	1	✓	✓	✓	✓	✓	
189	EML-C-1-11	ห้อง GEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
190	EML-C-1-12	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	✓	✓	

Code

1 การเช็คแสงสว่างไฟฉุกเฉิน (Normal)

2 ทดสอบการตัดแหล่งจ่ายไฟ

3 ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ (ระยะสั้น)
- ดูจุดไม่ชาร์จ -ดีงขอบยาง บวม/ไหม้ -ไม่มีน้ำเดือด

4 ตรวจสอบแบตเตอรี่

5 ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบต่อเนื่อง 3 ชม.)

ผู้ตรวจเช็ค [illegible]
วันที่ 15/8/66
ผู้ตรวจสอบ 15-8-66

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

อาคาร B/C วันที่ตรวจ 15/7/66

ลำดับ	รหัสครื่องจ่าย	ตำแหน่ง	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
159	EML-B-5-11	ในห้องพักเจ้าหน้าที่ WARD 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
160	EML-B-6-01	ห้องเชคบิ๊ปไฟ ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
161	EML-B-6-02	หน้าห้อง 616	6	✓	✓	✓	✓	✓	
162	EML-B-6-03	หน้าห้องผ่าชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
163	EML-B-6-04	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/1	6	✓	✓	✓	✓	✓	
164	EML-B-6-05	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/2	6	✓	✓	✓	✓	✓	
165	EML-B-6-06	หน้าห้อง 608	6	✓	✓	✓	✓	✓	
166	EML-B-6-07	หน้าห้อง 602	6	✓	✓	✓	✓	✓	
167	EML-B-6-08	ห้อง01 WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
168	EML-B-6-09	ห้อง Treatment WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
169	EML-B-6-10	หน้าบันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
170	EML-B-6-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
171	EML-B-6-12	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
172	EML-B-7-01	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
173	EML-B-7-02	หน้าบันได ST 1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
174	EML-B-7-03	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
175	EML-B-7-04	เคาน์เตอร์ w.7 1/1	7	✓	✓	✓	✓	✓	
176	EML-B-7-05	เคาน์เตอร์ w.7 1/2	7	✓	✓	✓	✓	✓	
177	EML-B-7-06	หน้าห้อง 702	7	✓	✓	✓	✓	✓	
178	EML-B-7-07	หน้าห้อง 708	7	✓	✓	✓	✓	✓	
179	EML-B-7-08	หน้าห้อง 716	7	✓	✓	✓	✓	✓	
180	EML-B-7-09	หน้าห้องเก็บศพ	7	✓	✓	✓	✓	✓	
181	EML-B-7-10	ห้องเชคบิ๊ปไฟ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
182	EML-B-7-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
183	EML-B-7-12	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
184	EML-C-1-01	ห้องอาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
185	EML-C-1-02	ห้องจัดเตรียม อาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
186	EML-C-1-03	แผนกแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
187	EML-C-1-04	แผนกเครื่องมือแพทย์	1	✓	✓	✓	✓	✓	
188	EML-C-1-05	แผนกซักรีด (ห้องน้ำ)	1	✓	✓	✓	✓	✓	
189	EML-C-1-06	ห้องเก็บ body	1	✓	✓	✓	✓	✓	
190	EML-C-1-07	ห้องพิซ่า	1	✓	✓	✓	✓	✓	
191	EML-C-1-08	ห้องหน้าทางเข้าห้อง CDDE	1	✓	✓	✓	✓	✓	
192	EML-C-1-09	ห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
193	EML-C-1-10	ห้อง PUMP VACUUM	1	✓	✓	✓	✓	✓	
194	EML-C-1-11	ห้อง GEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
195	EML-C-1-12	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	✓	✓	

Code

1 การเช็คแสงสว่างไฟฉุกเฉิน (Normal)

2 ทดสอบการตัดแหล่งจ่ายไฟ

3 ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ (ระยะสั้น)
- ดูจุดไม่ชาร์จ -ดีงขอบยาง บวม/ไหม้ -ไม่มีน้ำเดือด

4 ตรวจสอบแบตเตอรี่

5 ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบต่อเนื่อง 3 ชม.)

ผู้ตรวจเช็ค [illegible]
วันที่ 15-7-66
ผู้ตรวจสอบ [illegible]
วันที่ 16/8/66

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRIRAYONG HOSPITAL

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

อาคาร B C

วันเดือนปี 1 ตุลาคม 66

ลำดับ	รหัสเครื่องใช้	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
154	EML-B-5-11	ในห้องพักเจ้าหน้าที่ WARD 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
155	EML-B-6-01	ห้องเชาร์ปไฟ ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
156	EML-B-6-02	หน้าห้อง 616	6	✓	✓	✓	✓	✓	
157	EML-B-6-03	หน้าห้องน้ำชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
158	EML-B-6-04	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/1	6	✓	✓	✓	✓	✓	
159	EML-B-6-05	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/2	6	✓	✓	✓	✓	✓	
160	EML-B-6-06	หน้าห้อง 608	6	✓	✓	✓	✓	✓	
161	EML-B-6-07	หน้าห้อง 602	6	✓	✓	✓	✓	✓	
162	EML-B-6-08	ห้อง601 WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
163	EML-B-6-09	ห้อง Treatment WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
164	EML-B-6-10	หน้าบันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
165	EML-B-6-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
166	EML-B-6-12	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
167	EML-B-7-01	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
168	EML-B-7-02	หน้าบันได ST 1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
169	EML-B-7-03	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
170	EML-B-7-04	เคาน์เตอร์ w.7 1/1	7	✓	✓	✓	✓	✓	
171	EML-B-7-05	เคาน์เตอร์ w.7 1/2	7	✓	✓	✓	✓	✓	
172	EML-B-7-06	หน้าห้อง 702	7	✓	✓	✓	✓	✓	
173	EML-B-7-07	หน้าห้อง 706	7	✓	✓	✓	✓	✓	
174	EML-B-7-08	หน้าห้อง 716	7	✓	✓	✓	✓	✓	
175	EML-B-7-09	หน้าห้องเก็บผ้า	7	✓	✓	✓	✓	✓	
176	EML-B-7-10	ห้องเชาร์ปไฟ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
177	EML-B-7-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
178	EML-B-7-12	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
179	EML-C-1-01	ห้องอาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
180	EML-C-1-02	ห้องจัดเตรียม อาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
181	EML-C-1-03	แผงกลแม่บ้าน	1						
182	EML-C-1-04	แผงกลเครื่องมือแพทย์	1						
183	EML-C-1-05	แผงกลซักรีด (ห้องเล็ก)	1						
184	EML-C-1-06	ห้องเก็บ body	1	✓	✓	✓	✓	✓	
185	EML-C-1-07	ห้องพิธี	1	✓	✓	✓	✓	✓	
186	EML-C-1-08	ด้านหน้าทางเข้าห้อง CDDE	1	✓	✓	✓	✓	✓	
187	EML-C-1-09	ห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
188	EML-C-1-10	ห้อง PUMP VACUUM	1	✓	✓	✓	✓	✓	
189	EML-C-1-11	ห้อง GEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
190	EML-C-1-12	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	
1	สภาพพร้อมใช้งานตามปกติ (Normal)
2	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่
3	ตรวจสภาพของแบตเตอรี่ (ทุกเดือน)
	- อยู่ในสภาพ ดีและสามารถใช้งานได้ - ไม่มีรอยรั่วซึม
4	ทำการสลับวงจรไฟฟ้า
5	ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 ชม.)

ผู้ตรวจสอบ ...

วันที่ 1/10/66

ผู้ตรวจสอบ ...

วันที่ 1/10/66

FM-FAC-[illegible]

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRIRAYONG HOSPITAL

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

อาคาร ...

วันเดือนปี 20/9/66

ลำดับ	รหัสเครื่องใช้	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
154	EML-B-5-11	ในห้องพักเจ้าหน้าที่ WARD 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
155	EML-B-6-01	ห้องเชาร์ปไฟ ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
156	EML-B-6-02	หน้าห้อง 616	6	✓	✓	✓	✓	✓	
157	EML-B-6-03	หน้าห้องน้ำชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
158	EML-B-6-04	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/1	6	✓	✓	✓	✓	✓	
159	EML-B-6-05	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/2	6	✓	✓	✓	✓	✓	
160	EML-B-6-06	หน้าห้อง 608	6	✓	✓	✓	✓	✓	
161	EML-B-6-07	หน้าห้อง 602	6	✓	✓	✓	✓	✓	
162	EML-B-6-08	ห้อง601 WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
163	EML-B-6-09	ห้อง Treatment WARD 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
164	EML-B-6-10	หน้าบันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
165	EML-B-6-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
166	EML-B-6-12	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
167	EML-B-7-01	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
168	EML-B-7-02	หน้าบันได ST 1 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
169	EML-B-7-03	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
170	EML-B-7-04	เคาน์เตอร์ w.7 1/1	7	✓	✓	✓	✓	✓	
171	EML-B-7-05	เคาน์เตอร์ w.7 1/2	7	✓	✓	✓	✓	✓	
172	EML-B-7-06	หน้าห้อง 702	7	✓	✓	✓	✓	✓	
173	EML-B-7-07	หน้าห้อง 708	7	✓	✓	✓	✓	✓	
174	EML-B-7-08	หน้าห้อง 716	7	✓	✓	✓	✓	✓	
175	EML-B-7-09	หน้าห้องเก็บผ้า	7	✓	✓	✓	✓	✓	
176	EML-B-7-10	ห้องเชาร์ปไฟ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
177	EML-B-7-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
178	EML-B-7-12	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
179	EML-C-1-01	ห้องอาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
180	EML-C-1-02	ห้องจัดเตรียม อาหาร CANTEEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
181	EML-C-1-03	แผงกลแม่บ้าน	1	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
182	EML-C-1-04	แผงกลเครื่องมือแพทย์	1	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
183	EML-C-1-05	แผงกลซักรีด (ห้องเล็ก)	1	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
184	EML-C-1-06	ห้องเก็บ body	1	✓	✓	✓	✓	✓	
185	EML-C-1-07	ห้องพิธี	1	✓	✓	✓	✓	✓	
186	EML-C-1-08	ด้านหน้าทางเข้าห้อง CDDE	1	✓	✓	✓	✓	✓	
187	EML-C-1-09	ห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
188	EML-C-1-10	ห้อง PUMP VACUUM	1	✓	✓	✓	✓	✓	
189	EML-C-1-11	ห้อง GEN	1	✓	✓	✓	✓	✓	
190	EML-C-1-12	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	
1	สภาพพร้อมใช้งานตามปกติ (Normal)
2	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่
3	ตรวจสภาพของแบตเตอรี่ (ทุกเดือน)
	- อยู่ในสภาพ ดีและสามารถใช้งานได้ - ไม่มีรอยรั่วซึม
4	ทำการสลับวงจรไฟฟ้า
5	ทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 ชม.)

ผู้ตรวจสอบ ...

วันที่ 20/9/66

ผู้ตรวจสอบ ...

วันที่ 20/9/66

FM-FAC-[illegible]

โรงพยาบาลศิริราช SIRIRAJ HOSPITAL

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

อาคาร ..... วันเดือนปี ธันวาคม ๖๖

ลำดับ	รหัสครุภัณฑ์	ตำแหน่งที่	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
154	EML-B-5-11	ไนท์ไอซีซีเจ้าหน้าที่ WARD 5	5	/	/	/	/	/	
155	EML-B-6-01	ห้องชาร์ปไฟ ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
156	EML-B-6-02	หน้าห้อง 616	6	/	/	/	/	/	
157	EML-B-6-03	หน้าห้องผ่าชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
158	EML-B-6-04	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/1	6	/	/	/	/	/	
159	EML-B-6-05	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/2	6	/	/	/	/	/	
160	EML-B-6-06	หน้าห้อง 608	6	/	/	/	/	/	
161	EML-B-6-07	หน้าห้อง 602	6	/	/	/	/	/	
162	EML-B-6-08	ห้อง601 WARD 6	6	/	/	/	/	/	
163	EML-B-6-09	ห้อง Treatment WARD 6	6	/	/	/	/	/	
164	EML-B-6-10	หน้าบันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
165	EML-B-6-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
166	EML-B-6-12	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
167	EML-B-7-01	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
168	EML-B-7-02	หน้าบันได ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
169	EML-B-7-03	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
170	EML-B-7-04	เคาน์เตอร์ w.7 1/1	7	/	/	/	/	/	
171	EML-B-7-05	เคาน์เตอร์ w.7 1/2	7	/	/	/	/	/	
172	EML-B-7-06	หน้าห้อง 702	7	/	/	/	/	/	
173	EML-B-7-07	หน้าห้อง 708	7	/	/	/	/	/	
174	EML-B-7-08	หน้าห้อง 716	7	/	/	/	/	/	
175	EML-B-7-09	หน้าห้องเก็บผ้า	7	/	/	/	/	/	
176	EML-B-7-10	ห้องชาร์ปไฟ ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
177	EML-B-7-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
178	EML-B-7-12	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
179	EML-C-1-01	ห้องอาหาร CANTEEN	1	/	/	/	/	/	
180	EML-C-1-02	ห้องจัดเตรียม อาหาร CANTEEN	1	/	/	/	/	/	
181	EML-C-1-03	แผนกเมโย้ก	1	/	/	/	/	/	
182	EML-C-1-04	แผนกเครื่องมือแพทย์	1	/	/	/	/	/	
183	EML-C-1-05	แผนกซักนึก (ห้องผ้า)	1	/	/	/	/	/	
184	EML-C-1-06	ห้องเก็บ body	1	/	/	/	/	/	
185	EML-C-1-07	ห้องศิริ	1	/	/	/	/	/	
186	EML-C-1-08	ด้านหน้าทางเข้าห้อง CDDE	1	/	/	/	/	/	
187	EML-C-1-09	ห้อง FIRE PUMP	1	/	/	/	/	/	
188	EML-C-1-10	ห้อง PUMP VACUUM	1	/	/	/	/	/	
189	EML-C-1-11	ห้อง GEN	1	/	/	/	/	/	
190	EML-C-1-12	ห้อง MDB	1	/	/	/	/	/	

Code	
1	ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น (Normal)
2	ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่
3	ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (กรณีดับ)
	-อยู่การใช้งาน -มีแสงสว่างเพียงพอ -ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4	ทำความสะอาดเบื้องต้น
5	ตรวจสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 ชม.)

ผู้ตรวจรับ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วันที่ 11/12/66

ผู้ตรวจสอบ ลัมศิริ ศ.

FM FAC-[illegible]

โรงพยาบาลศิริราช SIRIRAJ HOSPITAL

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

อาคาร ..... วันเดือนปี พฤศจิกายน ๖๖

ลำดับ	รหัสครุภัณฑ์	ตำแหน่งที่	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
154	EML-B-5-11	ไนท์ไอซีซีเจ้าหน้าที่ WARD 5	5	/	/	/	/	/	
155	EML-B-6-01	ห้องชาร์ปไฟ ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
156	EML-B-6-02	หน้าห้อง 616	6	/	/	/	/	/	
157	EML-B-6-03	หน้าห้องผ่าชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
158	EML-B-6-04	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/1	6	/	/	/	/	/	
159	EML-B-6-05	เคาน์เตอร์พยาบาล WARD 6 1/2	6	/	/	/	/	/	
160	EML-B-6-06	หน้าห้อง 608	6	/	/	/	/	/	
161	EML-B-6-07	หน้าห้อง 602	6	/	/	/	/	/	
162	EML-B-6-08	ห้อง601 WARD 6	6	/	/	/	/	/	
163	EML-B-6-09	ห้อง Treatment WARD 6	6	/	/	/	/	/	
164	EML-B-6-10	หน้าบันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
165	EML-B-6-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
166	EML-B-6-12	บันไดหนีไฟ ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
167	EML-B-7-01	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
168	EML-B-7-02	หน้าบันได ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
169	EML-B-7-03	หน้าห้อง TREATMENT ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
170	EML-B-7-04	เคาน์เตอร์ w.7 1/1	7	/	/	/	/	/	
171	EML-B-7-05	เคาน์เตอร์ w.7 1/2	7	/	/	/	/	/	
172	EML-B-7-06	หน้าห้อง 702	7	/	/	/	/	/	
173	EML-B-7-07	หน้าห้อง 708	7	/	/	/	/	/	
174	EML-B-7-08	หน้าห้อง 716	7	/	/	/	/	/	
175	EML-B-7-09	หน้าห้องเก็บผ้า	7	/	/	/	/	/	
176	EML-B-7-10	ห้องชาร์ปไฟ ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
177	EML-B-7-11	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
178	EML-B-7-12	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
179	EML-C-1-01	ห้องอาหาร CANTEEN	1	/	/	/	/	/	
180	EML-C-1-02	ห้องจัดเตรียม อาหาร CANTEEN	1	/	/	/	/	/	
181	EML-C-1-03	แผนกเมโย้ก	1	/	/	/	/	/	
182	EML-C-1-04	แผนกเครื่องมือแพทย์	1	/	/	/	/	/	
183	EML-C-1-05	แผนกซักนึก (ห้องผ้า)	1	/	/	/	/	/	
184	EML-C-1-06	ห้องเก็บ body	1	/	/	/	/	/	
185	EML-C-1-07	ห้องศิริ	1	/	/	/	/	/	
186	EML-C-1-08	ด้านหน้าทางเข้าห้อง CDDE	1	/	/	/	/	/	
187	EML-C-1-09	ห้อง FIRE PUMP	1	/	/	/	/	/	
188	EML-C-1-10	ห้อง PUMP VACUUM	1	/	/	/	/	/	
189	EML-C-1-11	ห้อง GEN	1	/	/	/	/	/	
190	EML-C-1-12	ห้อง MDB	1	/	/	/	/	/	

Code	
1	ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น (Normal)
2	ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่
3	ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (กรณีดับ)
	-อยู่การใช้งาน -มีแสงสว่างเพียงพอ -ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4	ทำความสะอาดเบื้องต้น
5	ตรวจสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ (ทดสอบประจำเดือน 2 ชม.)

ผู้ตรวจรับ ประสิทธิ์ [illegible]

วันที่ 12/11/66

ผู้ตรวจสอบ ลัมศิริ

วันที่ 12/11/66

FM FAC-[illegible]

Fire alarm Control

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN											Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA		1	Fire and Security Control Platform	1	B	ห้อง CONTROL	FC-B-1-01	GE Security	-	EST3	-		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUATERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ..... ผู้บริหารหน่วยงาน
Date/วันที่ 5/01/2023

อนุมัติโดย
ลงชื่อ..... วิศวกรปฏิบัติการ
Date/วันที่ 5/01/2023

รับทราบโดย
ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
Date/วันที่ 5/01/2023

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

BUILDING NAME	: Fire and Security	DATE	: 19/11/64
ADDRESS	:	LOCATION	: Control Room

FIRE ALARM CONTROL PANEL

PERIOD | M

EQUIPMENT CODE	: FC-B-1-01
BRAND / MODEL	: FST-3
SYSTEM	: GE - Security

TASKS	STANDARD	RECORD
☐ *MONTHLY MAINTENANCE No.1-8*		
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	N	N
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย	N	N
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย	N	N
4 Check Chager Control Panel / ตรวจสอบชุดชาร์จของตู้ควบคุม	N	N
5 Check Battary Backup 24 V/DC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองขนาด 24 โวล์ท	24 V/D.C	24
6 Check PowerSuppdy 220 V/AC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ท	220 V/A.C.	230
7 Check Power Supply 24 V/DC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 24 โวล์ท	24 V/D.C	24
8 General Cleanning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/

RECORD CODE

/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ไม่มีข้อเสนอแนะ

SERVICED BY

1. : ชัย
2. :

วันที่ 19/11/64

APPROVE BY

ลงชื่อ

วันที่ 19/11/64

FM FAC-010 : Rev 0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

BUILDING NAME	: Fire and Security	DATE	: 19/12/64
ADDRESS	:	LOCATION	: Control Room

FIRE ALARM CONTROL PANEL

PERIOD | M

EQUIPMENT CODE	: FC-B-1-01
BRAND / MODEL	: FST-3
SYSTEM	: GE - Security

TASKS	STANDARD	RECORD
☐ *MONTHLY MAINTENANCE No.1-8*		
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	N	N
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย	N	N
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย	N	N
4 Check Chager Control Panel / ตรวจสอบชุดชาร์จของตู้ควบคุม	N	N
5 Check Battary Backup 24 V/DC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองขนาด 24 โวล์ท	24 V/D.C	24
6 Check PowerSuppdy 220 V/AC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ท	220 V/A.C	229
7 Check Power Supply 24 V/DC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 24 โวล์ท	24 V/D.C	24
8 General Cleanning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/

RECORD CODE

/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ไม่มีข้อเสนอแนะ

SERVICED BY

1. : ชัย
2. :

วันที่ 19/12/64

APPROVE BY

ลงชื่อ

วันที่ 19/12/64

FM-FAC-010 : Rev.0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

BUILDING NAME : Fire and Security
ADDRESS :

DATE 14/9/66
LOCATION Control Room

FIRE ALARM CONTROL PANEL

PERIOD 1 M

EQUIPMENT CODE : FC-B-1-01
BRAND / MODEL : EST-3
SYSTEM : GE-Security

TASKS	STANDARD	RECORD
MONTHLY MAINTENANCE No.1-8		
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	N	N
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย	N	N
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย	N	N
4 Check Chager Control Panel / ตรวจสอบชุดชาร์จของตู้ควบคุม	N	N
5 Check Battery Backup 24 V/DC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองขนาด 24 โวล์ท	24 V/D.C	24
6 Check PowerSuppply 220 V/AC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ท	220 V/A.C.	229
7 Check Power Supply 24 V/DC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 24 โวล์ท	24 V/D.C	26
8 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/

RECORD CODE
/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS
ระบบปกติ

SERVICED BY
1. ชัยโรจน์
2.
วันที่ 14/9/66

APPROVE BY
ธนชิต์
วันที่ 14/9/66

FM-FAC-010 : Rev 0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

BUILDING NAME : Fire and Security
ADDRESS :

DATE 14/10/66
LOCATION Control Room

FIRE ALARM CONTROL PANEL

PERIOD 1 M

EQUIPMENT CODE : FC-B-1-01
BRAND / MODEL : EST-3
SYSTEM : GE-Security

TASKS	STANDARD	RECORD
MONTHLY MAINTENANCE No.1-8		
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	N	N
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย	N	N
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย	N	N
4 Check Chager Control Panel / ตรวจสอบชุดชาร์จของตู้ควบคุม	N	N
5 Check Battery Backup 24 V/DC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองขนาด 24 โวล์ท	24 V/D.C	24
6 Check PowerSuppply 220 V/AC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ท	220 V/A.C.	229
7 Check Power Supply 24 V/DC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 24 โวล์ท	24 V/D.C	24
8 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/

RECORD CODE
/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS
ระบบปกติ

SERVICED BY
1. ชัยโรจน์
2.
วันที่ 14/10/66

APPROVE BY
ธนชิต์
วันที่ 14/10/66

FM-FAC-010 : Rev.0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

BUILDING NAME : Fire and Security
ADDRESS :

DATE : 14-7-66
LOCATION : Control Room

FIRE ALARM CONTROL PANEL

PERIOD : M

EQUIPMENT CODE : FC-B-1-01
BRAND / MODEL : EST - 3
SYSTEM : GE - Security

TASKS	STANDARD	RECORD
MONTHLY MAINTENANCE No.1-8		
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	N	N
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย	N	N
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย	N	N
4 Check Charger Control Panel / ตรวจสอบชุดชาร์จของตู้ควบคุม	N	N
5 Check Battery Backup 24 V/DC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองขนาด 24 โวล์ท	24 V/D.C	25 Vac
6 Check PowerSupply 220 V/AC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ท	220 V/A.C	228 Vac
7 Check Power Supply 24 V/DC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 24 โวล์ท	24 V/D.C	26 Vac
8 General Cleanning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓

RECORD CODE
/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS
ระบบปกติ

SERVICED BY
1. ....
2. ....
วันที่ 14/7/66

APPROVE BY
....
วันที่ 15/7/66

FM-FAC-010 : Rev.0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง SRI RAYONG HOSPITAL

MAINTENANCE TASKS REPORT

BUILDING NAME : Fire and Security
ADDRESS :

DATE : 13/8/66
LOCATION : Control Room

FIRE ALARM CONTROL PANEL

PERIOD : M

EQUIPMENT CODE : FC-B-1-01
BRAND / MODEL : EST-3
SYSTEM : GE - Security

TASKS	STANDARD	RECORD
MONTHLY MAINTENANCE No.1-8		
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	N	N
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย	N	N
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย	N	N
4 Check Charger Control Panel / ตรวจสอบชุดชาร์จของตู้ควบคุม	N	N
5 Check Battery Backup 24 V/DC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองขนาด 24 โวล์ท	24 V/D.C	25
6 Check PowerSupply 220 V/AC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ท	220 V/A.C	228
7 Check Power Supply 24 V/DC / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 24 โวล์ท	24 V/D.C	26
8 General Cleanning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/

RECORD CODE
/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

RECOMMENDATIONS / REMARKS
ระบบปกติ

SERVICED BY
1. ....
2. ....
วันที่ 13/8/66

APPROVE BY
....
วันที่ 13/8/66

FM-FAC-010 : Rev.0 (01/11/2015)

Fire Alarm Sytem

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

[illegible]	[illegible]
แก้ไขครั้งที่	Rev.05
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2023

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.1	A	1	ห้อง ADMISSION	SD-A-1-01	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.2	A	1	ห้องตรวจ 10	SD-A-1-02	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.3	A	1	ห้องตรวจ 9	SD-A-1-03	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.4	A	1	ห้องตรวจ 8	SD-A-1-04	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.5	A	1	ห้องตรวจ 7	SD-A-1-05	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.6	A	1	ห้องตรวจ 6	SD-A-1-06	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.7	A	1	ห้องตรวจ 5	SD-A-1-07	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.8	A	1	ห้องตรวจ 4	SD-A-1-08	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.9	A	1	ห้องตรวจ 3	SD-A-1-09	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.10	A	1	ห้องตรวจ 2	SD-A-1-10	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.11	A	1	หน้าห้อง Treatment	SD-A-1-11	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.12	A	1	ห้อง W/S วัสดุทางเดินหน้าลิฟ	SD-A-1-12	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.13	A	1	ห้อง Treatment	SD-A-1-13	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.14	A	1	ห้องอุปกรณ์	SD-A-1-14	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.15	A	1	ห้องพยาบาล	SD-A-1-15	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.16	A	1	ห้องจ่ายยา	SD-A-1-16	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.17	A	1	ห้องรับน้ำหนัก,วัดความดัน OPD	SD-A-1-17	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.18	A	1	ห้องจ่ายยา	SD-A-1-18	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.19	A	1	ทางเดิน	SD-A-1-19	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.20	A	1	ห้องตัดแยก	SD-A-1-20	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.21	A	1	ห้องรอพบ	SD-A-1-21	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.22	A	1	ไซคุมือสาร	SD-A-1-22	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.23	A	1	ทางเดินหน้าห้องตัดแยก	SD-A-1-23	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.24	A	1	ห้องตัดแยก2	SD-A-1-24	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.25	A	1	ห้องทำหัตถการหน้าเคาน์เตอร์ ER 1/1	SD-A-1-25	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.26	A	1	ห้องทำหัตถการหน้าเคาน์เตอร์ ER 1/2	SD-A-1-26	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.27	A	1	ห้อง Charting	SD-A-1-27	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.28	A	1	ห้อง Wash	SD-A-1-28	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.29	A	1	ห้องเก็บ[illegible]	SD-A-1-29	GE Security	SAGA2-PS		Y/T												

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

[illegible]	[illegible]
แก้ไขครั้งที่	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/8/2023

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.30	A	1	[illegible]	SDA-1-30	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.31	A	1	[illegible]	SDA-1-31	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.32	A	1	[illegible]	SDA-1-32	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.33	A	1	[illegible]	SDA-1-33	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.34	A	1	[illegible]	SDA-1-34	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.35	A	1	[illegible]	SDA-1-35	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.36	A	1	[illegible]	SDA-1-36	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.37	A	1	[illegible]	SDA-1-37	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.38	A	1	[illegible]	SDA-1-38	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.39	A	1	[illegible]	SDA-1-39	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.40	A	1	[illegible]	SDA-1-40	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.41	A	1	[illegible]	SDA-1-41	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.42	A	1	[illegible]	SDA-1-42	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.43	A	1	[illegible]	SDA-1-43	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.44	A	1	[illegible]	SDA-1-44	GE Security	SACA2-PS		Y/T												
FA	SD	1	Smoke Detector No.45	A	1	[illegible]	SDA-1-45	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.46	A	1	[illegible]	SDA-1-46	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.47	A	1	[illegible]	SDA-1-47	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.48	A	1	[illegible]	SDA-1-48	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.49	A	1	[illegible]	SDA-1-49	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.50	A	1	[illegible]	SDA-1-50	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.51	A	1	[illegible]	SDA-1-51	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.52	A	1	[illegible]	SDA-1-52	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.53	A	1	[illegible]	SDA-1-53	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.54	A	1	[illegible]	SDA-1-54	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.55	A	1	[illegible]	SDA-1-55	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.56	A	1	[illegible]	SDA-1-56	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.57	A	1	[illegible]	SDA-1-57	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.58	A	1	[illegible]	SDA-1-58	GE Security	SACA2-PS			Y/T											

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

[illegible]	[illegible]
แก้ไขครั้งที่	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/8/2023

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.60	A	1	[illegible]	SDA-1-60	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.61	A	1	[illegible]	SDA-1-61	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.62	A	1	[illegible]	SDA-1-62	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.63	A	1	[illegible]	SDA-1-63	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.64	A	1	[illegible]	SDA-1-64	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.65	A	1	[illegible]	SDA-1-65	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.66	A	1	[illegible]	SDA-1-66	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.67	A	1	[illegible]	SDA-1-67	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.68	A	1	[illegible]	SDA-1-68	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.69	A	1	[illegible]	SDA-1-69	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.70	A	1	[illegible]	SDA-1-70	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.71	A	1	[illegible]	SDA-1-71	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.72	A	1	[illegible]	SDA-1-72	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.73	A	1	[illegible]	SDA-1-73	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.74	A	1	[illegible]	SDA-1-74	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.75	A	1	[illegible]	SDA-1-75	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.76	A	1	[illegible]	SDA-1-76	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.77	A	1	[illegible]	SDA-1-77	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.78	A	1	[illegible]	SDA-1-78	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.79	A	1	[illegible]	SDA-1-79	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.80	A	1	[illegible]	SDA-1-80	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.81	A	1	[illegible]	SDA-1-81	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.82	A	2	[illegible]	SDA-2-01	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.83	A	2	[illegible]	SDA-2-02	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.84	A	2	[illegible]	SDA-2-03	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.85	A	2	[illegible]	SDA-2-04	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.86	A	2	[illegible]	SDA-2-05	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.87	A	2	[illegible]	SDA-2-06	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.88	A	1	[illegible]	SDA-2-07	GE Security	SACA2-PS			Y/T											
FA	SD	1	Smoke Detector No.89	A	2	[illegible]	SDA-2-08	GE Security	SACA2-PS			Y/T											

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.90	A	2	[illegible]	SDA-2-[illegible]	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.91	A	2	[illegible]	SDA-2-10	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.92	A	2	[illegible]	SDA-2-11	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.93	A	2	[illegible]	SDA-2-12	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.94	A	2	[illegible]	SDA-2-13	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.95	A	2	[illegible]	SDA-2-14	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.96	A	2	[illegible]	SDA-2-15	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.97	A	2	[illegible]	SDA-2-01	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.98	A	2	[illegible]	SDA-2-02	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.99	A	2	[illegible]	SDA-2-03	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.100	A	2	[illegible]	SDA-2-04	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.101	A	2	[illegible]	SDA-2-05	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.102	A	2	[illegible]	SDA-2-06	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.103	A	2	[illegible]	SDA-2-07	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.104	A	2	[illegible]	SDA-2-08	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.105	A	2	[illegible]	SDA-2-09	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.106	A	2	[illegible]	SDA-2-10	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.107	A	2	[illegible]	SDA-2-11	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.108	A	2	[illegible]	SDA-2-12	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.109	A	2	[illegible]	SDA-2-13	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.110	A	2	[illegible]	SDA-2-14	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.111	A	2	[illegible]	SDA-2-15	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.112	A	2	[illegible]	SDA-2-16	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.113	A	2	[illegible] (STAFF ROOM)	SDA-2-17	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.114	A	3	[illegible] LAB	SDA-3-01	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.115	A	3	[illegible]	SDA-3-02	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.116	A	3	[illegible]	SDA-3-03	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.117	A	3	[illegible]	SDA-3-04	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.118	A	3	[illegible]	SDA-3-05	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.120	A	3	[illegible] OR 3	SDA-3-07	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.121	A	3	[illegible] OR 3-4	SDA-3-08	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.122	A	3	[illegible] ST 4	SDA-3-09	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.123	A	3	[illegible] OR3	SDA-3-10	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.124	A	3	[illegible] Dirty OR	SDA-3-11	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.125	A	3	[illegible]	SDA-3-12	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.126	A	3	[illegible]	SDA-3-13	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.127	A	3	[illegible] LR	SDA-3-14	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.128	A	3	[illegible] EQUIPMENT OR	SDA-3-15	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.129	A	3	[illegible] OR	SDA-3-16	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.130	A	3	[illegible] Clean OR	SDA-3-17	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.131	A	3	[illegible] OR	SDA-3-18	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.132	A	3	[illegible] STERILE OR 1/2	SDA-3-19	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.133	A	3	[illegible] STERILE OR 1/1	SDA-3-20	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.134	A	3	[illegible] OR 4	SDA-3-21	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.135	A	3	[illegible] OR 3	SDA-3-22	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.136	A	3	[illegible]	SDA-3-23	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.137	A	3	[illegible] 1/2	SDA-3-24	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.138	A	3	[illegible]	SDA-3-25	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.139	A	3	[illegible]	SDA-3-26	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.140	A	3	[illegible]	SDA-3-27	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.141	A	3	[illegible]	SDA-3-28	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.142	A	3	[illegible]	SDA-3-29	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.143	A	3	[illegible]	SDA-3-30	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.144	A	3	[illegible]	SDA-3-31	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.145	A	3	[illegible]	SDA-3-32	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.146	A	3	[illegible]	SDA-3-33	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.147	A	3	[illegible]	SDA-3-34	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.148	A	3	[illegible]	SDA-3-35	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.149	A	3	[illegible] PACK	SDA-3-36	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										
FA	SD	1	Smoke Detector No.150	A	3	[illegible] PACK	SDA-3-37	GE Security	SAGA2-PS				Y/T										

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.181	A	3	Nursery	SD-A-3-69	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.182	A	3	Dirty Room	SD-A-3-70	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.183	A	3	เคาน์เตอร์พยาบาล 1,2,3	SD-A-3-71	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.184	A	3	ทางเข้า OR ฝั่งที่ 2	SD-A-3-72	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.185	A	3	ทางเข้าหน้าห้องผ่าตัด OR	SD-A-3-73	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.186	A	3	หน้าห้องทางเข้า 2	SD-A-3-74	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.187	A	3	ห้องเตรียม OR CU 1	SD-A-3-75	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.188	A	3	ทางหน้าห้องเตรียม 1	SD-A-3-76	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.189	A	3	Role Clean CU 1	SD-A-3-77	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.190	A	3	ห้องเครื่องมือ CU 1	SD-A-3-78	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.191	A	3	หน้าห้องน้ำ CU 1	SD-A-3-79	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.192	A	3	ห้องน้ำ CU 1 ชาย	SD-A-3-80	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.193	A	3	ห้องน้ำ CU 2 ชาย	SD-A-3-81	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.194	A	3	โถงพักผู้ป่วย CU 1/2	SD-A-3-82	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.195	A	3	โถงพักผู้ป่วย CU 1/1	SD-A-3-83	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.196	A	3	ห้องน้ำ VIP (CU)	SD-A-3-84	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.197	A	3	หน้าห้องส่องแสง 1	SD-A-3-85	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.198	A	3	ห้องส่องแสง 1	SD-A-3-86	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.199	A	3	หน้าห้องส่องแสง2	SD-A-3-87	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.200	A	3	ห้องส่องแสง 2	SD-A-3-88	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.201	A	3	ปั๊มสูญญากาศ CU	SD-A-3-89	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.202	A	3	ทางเดินเข้า CU	SD-A-3-90	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.203	A	3	Dryer CU	SD-A-3-91	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.204	A	3	ห้องซักรีด CU	SD-A-3-92	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.205	A	3	ห้องเครื่อง CU	SD-A-3-93	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.206	A	4	ห้อง LAB เด็ก ชั้น 4	SD-A-4-01	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.207	A	4	หน้าห้อง LAB เด็ก ชั้น 4	SD-A-4-02	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.208	A	4	ทางเดินห้องบิ๊กซีเล็ก 1/1	SD-A-4-03	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.209	A	4	ทางเดินห้องบิ๊กซีเล็ก 1/2	SD-A-4-04	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.210	A	4	ทางเดินห้องบิ๊กซีเล็ก 1/3	SD-A-4-05	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.211	A	4	โถง LAB 1/1	SD-A-4-06	GE Security	SACA2-PS						Y/T								

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.151	A	3	Dirty room	SD-A-3-38	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.152	A	3	ปั๊มสูญญากาศ OR	SD-A-3-39	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.153	A	3	เคาน์เตอร์ OR	SD-A-3-40	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.154	A	3	ทางเดินข้างเครื่องฉายแสงที่ OR	SD-A-3-41	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.155	A	3	ทางเดินหน้าห้อง EQUIPMENTOR	SD-A-3-42	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.156	A	3	ห้องเครื่องแสงที่ ทาง	SD-A-3-43	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.157	A	3	ทางเดินห้องเครื่องแสงที่	SD-A-3-44	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.158	A	3	ทางเข้าเปลี่ยนชุดเสื้อคลุมด้านหน้าที่ OR	SD-A-3-45	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.159	A	3	ห้องเครื่องแสงที่ หญิง	SD-A-3-46	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.160	A	3	ห้องน้ำผู้หญิงของเจ้าหน้าที่ OR	SD-A-3-47	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.161	A	3	ห้องน้ำผู้ชายของเจ้าหน้าที่ OR	SD-A-3-48	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.162	A	3	ทางเดินหน้าห้องเย็บ หน้าที่	SD-A-3-49	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.163	A	3	ห้องเย็บ หน้าที่	SD-A-3-50	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.164	A	3	ห้องเย็บ 1	SD-A-3-51	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.165	A	3	ห้องเย็บ 2	SD-A-3-52	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.166	A	3	ห้องเย็บ 3	SD-A-3-53	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.167	A	3	ห้องเย็บ 4	SD-A-3-54	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.168	A	3	ห้องเย็บ 5	SD-A-3-55	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.169	A	3	ห้องเครื่องปรับอากาศ CU ชั้น 3	SD-A-3-56	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.170	A	3	ห้องเก็บของ CU 3	SD-A-3-57	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.171	A	3	ทางเดิน CU 3	SD-A-3-58	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.172	A	3	หน้าห้องน้ำห้องเครื่องปรับอากาศ	SD-A-3-59	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.173	A	3	ห้องเก็บของ CU 3	SD-A-3-60	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.174	A	3	ห้องน้ำ WAY-H	SD-A-3-61	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.175	A	3	ห้องเครื่องแสง	SD-A-3-62	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.176	A	3	ห้องเครื่องแสง	SD-A-3-63	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.177	A	3	ห้องเก็บของ	SD-A-3-64	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.178	A	3	ห้องเครื่องแสงที่	SD-A-3-65	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.179	A	3	ห้องเครื่องแสงที่	SD-A-3-66	GE Security	SACA2-PS						Y/T								

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE ....SRH.....Rev.00

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL		Rev.	PM MASTER PLAN												Remark
				BUILDING	FLOOR	AREA		BRAND	MODEL		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FA	SD	1	Smoke Detector No.212	A	4	Sim LAB 1/2	SD-A-4-07	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.213	A	4	Kitchenette	SD-A-4-08	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.214	A	4	Pantry	SD-A-4-09	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.215	A	4	Sim LAB 1/1	SD-A-4-10	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.216	A	4	STAFF OFFICE LAB	SD-A-4-11	GE Security	SACA2-PS						Y/T								
FA	SD	1	Smoke Detector No.217	A	4	สังเกตุ LAB	SD-A-4-12	GE Security	SACA2-PS						Y/T								

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUARTERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงาน
Date/วันที่ 31/1/2023

อนุมัติโดย
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง ผู้บริหารผู้บริหาร
Date/วันที่ 6/1/2023

รับทราบโดย
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง General Support HOD ผู้ช่วยงาน
Date/วันที่ 6/01/2023

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST
แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Location

วันที่ตรวจ 6/7/66

No.	CODE	Location	โซน	1	2	3	หมายเหตุ
1	SD-B-1-45	หน้าห้องเก็บเครื่องมือ 2 Sick baby	B	/	/		
2	SD-B-1-46	โถงทำงาน 1/1 Sick baby	B	/	/		
3	SD-B-1-47	โถงทำงาน 1/2 Sick baby	B	/	/		
4	SD-B-1-48	ทางเดินบันได Sick baby 1/1	B				ปรับปรุงสัปดาห์
5	SD-B-1-49	ทางเดินบันได Sick baby 1/2	B				ปรับปรุงสัปดาห์
6	SD-B-1-50	ทางเดินบันได Sick baby 1/3	B	/	/		
7	SD-B-1-51	ห้องสำรอง 7 Sick baby	B	/	/		
8	SD-B-1-52	ห้องสำรอง 8 Sick baby	B	/	/		
9	SD-B-1-53	ห้องสำรอง 9 Sick baby	B	/	/		
10	SD-B-1-54	ห้องสำรอง 10 Sick baby	B	/	/		
11	SD-B-1-55	ห้อง OBSERVE Sick baby PHASE 2	B	/	/		
12	SD-B-1-56	ห้องเก็บผ้า Sick baby PHASE 2	B	/	/		
13	SD-B-1-57	โถงทำงาน 1/3 Sick baby PHASE 2	B	/	/		
14	SD-B-1-58	โถงทำงาน 1/4 Sick baby PHASE 2	B	/	/		
15	SD-B-1-59	ทางเดินบันได Sick baby 1/4 PHASE 2	B	/	/		
16	SD-B-1-60	ทางเดินบันได Sick baby 1/5 PHASE 2	B	/	/		
17	SD-B-1-61	ทางเดินบันได Sick baby 1/6 PHASE 2	B	/	/		
18	SD-B-2-01	โถงทำงานหน้าลิฟต์ผู้ป่วย ห้อง 1/1	B	/			ปรับปรุงสัปดาห์
19	SD-B-2-02	โถงทำงานหน้าลิฟต์ผู้ป่วย ห้อง 1/2	B				ปรับปรุงสัปดาห์
20	SD-B-2-03	ห้อง Executive office	B				ปรับปรุงสัปดาห์
21	SD-B-2-04	ห้องผู้จัดการฝ่ายผู้ป่วยนอก	B				ปรับปรุงสัปดาห์
22	SD-B-2-05	ห้องเก็บของ 1 ชั้น 2 1/1	B				ปรับปรุงสัปดาห์
23	SD-B-2-06	ห้องเก็บของ 1 ชั้น 2 1/2	B				ปรับปรุงสัปดาห์
24	SD-B-2-07	ห้องเก็บของ 1 ชั้น 2 1/3	B				ปรับปรุงสัปดาห์
25	SD-B-2-08	ห้องเก็บของ 1 ชั้น 2 1/4	B				ปรับปรุงสัปดาห์
26	SD-B-2-09	ห้อง MD	B				ปรับปรุงสัปดาห์
27	SD-B-2-10	ทางเดินหน้าห้อง MD	B				ปรับปรุงสัปดาห์

CODE	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (หรือแจ้งซ่อม)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

(✓) เช็ค (X) ผิดปกติ (-) ไม่ได้ตรวจสอบในครั้งนี้

ผู้ตรวจเช็ค.....
วันที่ 6/7/66

ผู้ตรวจสอบ.....
วันที่ 10/7/66

สรุปผลการตรวจเช็ค

FM-FAC 018 Rev 0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRIRAYONG HOSPITAL

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Location :

วันเดือนปี 16 ธ.ค. 66

No.	CODE	Location	โซน	1	2	3	หมายเหตุ
1	SD-B-4-05	ห้อง405	B	/	/	/	
2	SD-B-4-06	ห้อง406	B	/	/	/	
3	SD-B-4-07	ห้อง407	B	/	/	/	
4	SD-B-4-08	ห้อง408	B	/	/	/	
5	SD-B-4-09	หน้าห้อง405	B	/	/	/	
6	SD-B-4-10	ห้อง405	B	/	/	/	
7	SD-B-4-11	ห้อง406	B	/	/	/	
8	SD-B-4-12	หน้าห้อง407	B	/	/	/	
9	SD-B-4-13	ห้อง407	B	/	/	/	
10	SD-B-4-14	ห้อง408	B	/	/	/	
11	SD-B-4-15	หน้าห้อง 409	B	/	/	/	
12	SD-B-4-16	ห้อง 409	B	/	/	/	
13	SD-B-4-17	ห้อง 410	B	/	/	/	
14	SD-B-4-18	หน้าห้อง 411	B	/	/	/	
15	SD-B-4-19	ห้อง 411	B	/	/	/	
16	SD-B-4-20	ห้อง 412	B	/	/	/	
17	SD-B-4-21	หน้าห้อง 414	B	/	/	/	
18	SD-B-4-22	ห้อง 414	B	/	/	/	
19	SD-B-4-23	ห้อง 415	B	/	/	/	
20	SD-B-4-24	ห้อง 416	B	/	/	/	
21	SD-B-4-25	Staff Lounge(ห้องเก็บเวรหน้าที่)	B	/	/	/	
22	SD-B-4-26	ON call	B	/	/	/	
23	SD-B-4-27	Head	B	/	/	/	
24	SD-B-4-28	เคาน์เตอร์พยาบาล 1/1	B	/	/	/	
25	SD-B-4-29	เคาน์เตอร์พยาบาล 1/1	B	/	/	/	
26	SD-B-4-30	ห้องเตรียมยา 1	B	/	/	/	
27	SD-B-4-31	ห้อง EQUIPMENT	B	/	/	/	

CODE	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

(/) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจเช็ค .....
วันที่ 16/9/66

ผู้ตรวจสอบ ธันยิ
วันที่ 16/9/66

สรุปผลการตรวจเช็ค

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRIRAYONG HOSPITAL

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Location : B

วันเดือนปี 12 ธ.ค. 2566

No.	CODE	Location	โซน	1	2	3	หมายเหตุ
1	SD-B-2-28	ห้องแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 2	B	/	/	/	
2	SD-B-2-29	หน้าลิฟท์ B ชั้น 2	B	/	/	/	
3	SD-B-2-30	ทางเดินไปแผนกโภชนาการ	B	/	/	/	
4	SD-B-2-31	โถงหน้าลิฟท์ C ชั้น 2	B	/	/	/	
5	SD-B-2-32	หน้าห้องเชร์ปไฟ ชั้น 2	B	/	/	/	
6	SD-B-2-33	ห้องเชร์ปไฟชั้น 2	B	/	/	/	
7	SD-B-3-01	หน้าลิฟท์ B	B	/	/	/	
8	SD-B-3-02	ห้องเชร์ปไฟ	B	/	/	/	
9	SD-B-3-03	โถงลิฟท์ C ชั้น 3	B	/	/	/	
10	SD-B-3-04	หน้าลิฟท์ C	B	/	/	/	
11	SD-B-3-05	ห้องน้ำตรวจร่าง CSSD	B	/	/	/	
12	SD-B-3-06	ห้อง 301	B	/	/	/	
13	SD-B-3-07	ห้อง 302	B	/	/	/	
14	SD-B-3-08	ห้อง 303	B	/	/	/	
15	SD-B-3-09	ห้อง 304	B	/	/	/	
16	SD-B-3-10	ห้อง 305	B	/	/	/	
17	SD-B-3-11	ห้อง 306	B	/	/	/	
18	SD-B-3-12	ห้อง 307	B	/	/	/	
19	SD-B-3-13	ห้อง 308	B	/	/	/	
20	SD-B-3-14	ห้อง 309	B	/	/	/	
21	SD-B-3-15	ห้อง 310	B	/	/	/	
22	SD-B-3-16	ห้อง 311	B	/	/	/	
23	SD-B-3-17	ห้อง 312	B	/	/	/	
24	SD-B-3-18	ห้อง 314	B	/	/	/	
25	SD-B-3-19	ห้อง 315	B	/	/	/	
26	SD-B-3-20	ทางเดินหน้าห้อง 312	B	/	/	/	
27	SD-B-3-21	ทางเดินหน้าห้อง 310	B	/	/	/	
28	SD-B-3-22	ทางเดินหน้าห้อง 307	B	/	/	/	
29	SD-B-3-23	ทางเดินหน้าห้อง 305	B	/	/	/	
30	SD-B-3-24	ทางเดินหน้าห้อง 302	B	/	/	/	
31	SD-B-3-25	ห้องพักเจ้าหน้าที่ W.3	B	/	/	/	
32	SD-B-3-26	ห้องประชุม W.3	B	/	/	/	
33	SD-B-3-27	เคาน์เตอร์พยาบาล 1/1	B	/	/	/	
34	SD-B-3-28	เคาน์เตอร์พยาบาล 1/2	B	/	/	/	
35	SD-B-3-29	ห้อง EQUIPMEN	B	/	/	/	
36	SD-B-3-30	ห้อง Clean room	B	/	/	/	

FM-FAC-016 Rev.0 (01/11/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Location :

วันเดือนปี 13 ต.ค. 66

No.	CODE	Location	โซน	1	2	3	หมายเหตุ
1	SD-B-5-14	หน้าห้อง 510	B	✓	✓	✓	
2	SD-B-5-15	ห้อง 510	B	✓	✓	✓	
3	SD-B-5-16	ห้อง 511	B	✓	✓	✓	
4	SD-B-5-17	ห้อง 512	B	✓	✓	✓	
5	SD-B-5-18	หน้าห้อง 514	B	✓	✓	✓	
6	SD-B-5-19	ห้อง 514	B	✓	✓	✓	
7	SD-B-5-20	ห้อง 515	B	✓	✓	✓	
8	SD-B-5-21	หน้าลิฟท์ C	B	✓	✓	✓	
9	SD-B-5-22	ในลิฟท์ C	B	✓	✓	✓	
10	SD-B-5-23	ห้องชาร์ฟไฟ	B	✓	✓	✓	
11	SD-B-5-24	Duty	B	✓	✓	✓	
12	SD-B-5-25	ห้องเก็บล้างสะอาด	B	✓	✓	✓	
13	SD-B-5-26	ห้อง Clean	B	✓	✓	✓	
14	SD-B-5-27	ห้อง EQIPMENT	B	✓	✓	✓	
15	SD-B-5-28	เคาน์เตอร์พยาบาล	B	✓	✓	✓	
16	SD-B-5-29	เคาน์เตอร์พยาบาล	B	✓	✓	✓	
17	SD-B-5-30	ห้องเครื่องมือ	B	✓	✓	✓	
18	SD-B-5-31	ห้องประชุม	B	✓	✓	✓	
19	SD-B-5-32	ห้องพักเจ้าหน้าที่	B	✓	✓	✓	
20	SD-B-6-01	ห้อง 601	B	✓	✓	✓	
21	SD-B-6-02	ห้อง 602	B	✓	✓	✓	
22	SD-B-6-03	ห้อง 603	B	✓	✓	✓	
23	SD-B-6-04	ห้อง 604	B	✓	✓	✓	
24	SD-B-6-05	ห้อง 605	B	✓	✓	✓	
25	SD-B-6-06	ห้อง 606	B	✓	✓	✓	
26	SD-B-6-07	ห้อง 607	B	✓	✓	✓	
27	SD-B-6-08	ห้อง 608	B	✓	✓	✓	


CODE	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจเช็ค ปรเมศ
วันที่ 13/10/66

ผู้ตรวจสอบ ลันดี ลิ้น
วันที่ 13/10/66

สรุปผลการตรวจเช็ค

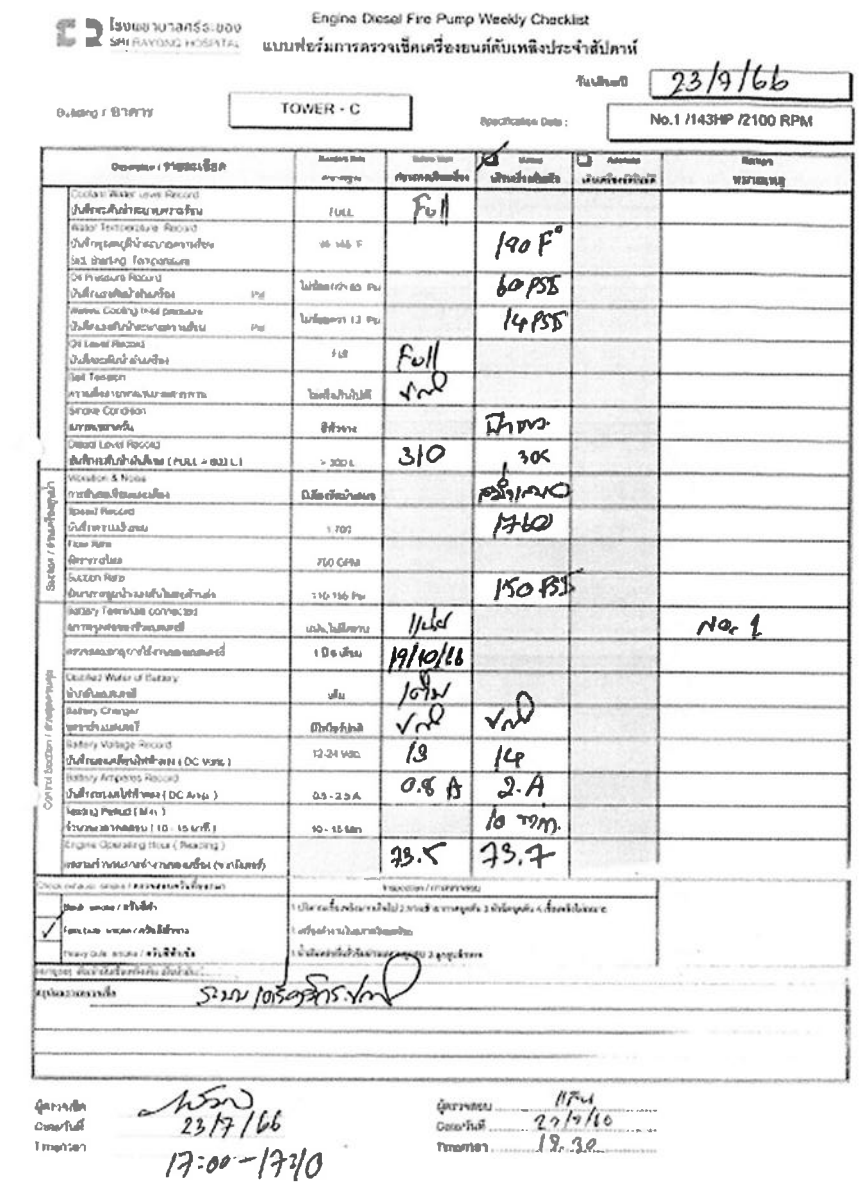

โรงพยาบาลศิริราช SIRIRAJ HOSPITAL

Engine Diesel Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

วันที่ตรวจ 23/9/66

อาคาร / Building: TOWER - C

Specification Data: No.1 /143HP /2100 RPM

Section / ส่วนที่ตรวจสอบ	Description / รายละเอียด	Standard Data ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	✓ Normal ปกติ/ค่าที่อ่านได้	Abnormal เสียหรือต้องปรับ	Remark หมายเหตุ
Control Section / ส่วนควบคุมปั๊ม	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ	FULL	Full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Set Starting Temperature	95 - 105 °F		190 F°		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง Psi	ไม่น้อยกว่า 60 Psi		60 PSI		
	Water Cooling Head pressure บันทึกแรงดันน้ำระบายความร้อน Psi	ไม่น้อยกว่า 13 Psi		14 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	Full	Full			
	Belt Tension สายพานต้องตึงพอเหมาะ ไม่หย่อนเกินไป	ไม่หย่อนเกินไป	✓			
	Smoke Condition ควันดำผิดปกติ	สีขาวจาง		ปกติ		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 600 L)	> 300 L	310	30C		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	ไม่มีการสั่นสะเทือน		✓ปกติ		
	Speed Record บันทึกรอบเครื่อง	1,700		1760		
	Flow Rate อัตราการไหล	750 GPM				
	Suction Rate ค่าแรงดูดน้ำของปั๊มในขณะทำงาน	1 Hg 1.13 Psi		150 PSI		
	Battery Terminals connection จุดขั้วแบตเตอรี่	แน่น, ไม่มีสนิม	✓			No. 1
	ตรวจสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่	1 ปี 6 เดือน	19/10/66			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม	✓			
	Battery Charger ตู้ชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟเข้าปกติ	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าขณะ (DC Volts)	12-24 Volt	13	14		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟที่ชาร์จ (DC Amps)	0.5 - 2.5 A	0.8 A	2.A		
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10 - 15 Min		10 นาที.		
	Engine Operating Hour (Reading) เวลาทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (ชั่วโมง)		73.5	73.7		

Check status: Good / ปกติ ✓ | Repair / ต้องซ่อม | Replace / เปลี่ยนใหม่

Inspection / การตรวจสอบ

1 ปิดเครื่องยนต์ทางไฟฟ้าไปที่ตำแหน่งปิด 2 ถอดสายดูดน้ำเครื่องยนต์ออก

3 เครื่องทำงานในสภาพปกติ

4 ให้เครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สรุปผลการตรวจสอบ: ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงปกติ

ผู้ตรวจเช็ค: [signature] 23/7/66 17:00 - 17:10

ผู้ตรวจสอบ: [signature] วันที่ 27/9/66 เวลา 18.30

FM-FAC 008 Rev 0 (01/11/2015)

Fire Pump

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
SIRIRAJ PIYAMAHARAJKARUNA HOSPITAL

Engine Diesel Fire Pump Weekly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

วันที่ตรวจ: 12/9/66

อาคาร / Building: TOWER - C

Specification Data: No 1 /143HP /2100 RPM

Description / รายละเอียด	Standard Rate / มาตรฐาน	Before Start / ก่อนสตาร์ทเครื่อง	Normal / เดินเครื่องตามปกติ	Abnormal / เดินเครื่องผิดปกติ	Remark / หมายเหตุ
Coolant Water Level Record ปริมาณน้ำในหม้อน้ำ	FULL	✓			
Water Temperature Record ปริมาณอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Set Starting Temperature	95 / 185 °F	-	180°F		
Oil Pressure Record ปริมาณแรงดันน้ำมันเครื่อง Psi	ไม่น้อยกว่า 55 Psi		65 Psi		
Intake Cooling Inlet (pressure) ปริมาณแรงดันน้ำระบายความร้อน Psi	ไม่น้อยกว่า 13 Psi		13 Psi		
Oil Level Record ปริมาณน้ำมันเครื่อง	Full	✓			
Belt Tension ความตึงสายพานขับเครื่องยนต์	ไม่หย่อนเกินไป	✓			
Smoke Condition สภาพควันดำ	สีขาวจาง		สีขาวจาง		
Diesel Level Record ปริมาณน้ำมันดีเซล (FULL = 600 L)	> 300 L	550	590		
Vibration & Noise การสั่นและเสียงผิดปกติ	ไม่มีเสียงผิดปกติ		ไม่มีเสียงผิดปกติ		
Speed Record ปริมาณรอบเครื่อง	1,780		1,810		
Flow Rate ปริมาณน้ำไหล	750 GPM		-		
Suction Rate ปริมาณอุณหภูมิน้ำเข้าหม้อน้ำ	110/155 Psi		155 Psi		
Battery Terminals Connected การต่อสายขั้วแบตเตอรี่	แน่นไม่หลวม	✓			
Electrolyte Level of Battery ปริมาณน้ำกลั่นแบตเตอรี่	1 นิ้ว ต่อเซล	1/2 - 3/4			No. 1
Distilled Water (if Battery) น้ำกลั่นแบตเตอรี่	มี	✓			
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโวลท์มิเตอร์	✓	ปกติ		
Battery Voltage Record ปริมาณแรงดันไฟฟ้า (DC Volts)	12-24 Volt	13.2	13.2		
Battery Amperes Record ปริมาณกระแสไฟฟ้า (DC Amps)	0.5 - 2.5 A.	0.5	0.5		
Testing Period (Min) ทำงานต่อเนื่อง (10 - 15 นาที)	10 - 15 Min		10 Min		
Engine Operating Hour (Reading) เดินเครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)		3,842	35.0		

Check without smoke / ตรวจสอบควันดำ — Inspection / ตรวจสอบ

- Black smoke / ควันดำ: เดินเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจสอบ / เครื่องยนต์ไม่ควรมีควันดำ
- Normal / ปกติ: เครื่องทำงานปกติ
- Heavy black smoke / ควันดำหนาทึบ: ต้องทำการซ่อมแซมทันที

หมายเหตุ: เดินเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

ข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบ: [illegible]
วันที่ตรวจ: 12/9/66
Time/เวลา:

ผู้ตรวจสอบ: [illegible]
วันที่ตรวจ: 12/9/66
Time/เวลา:

FM-FAC-008 Rev 0 (27/11/2015)

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
SIRIRAJ PIYAMAHARAJKARUNA HOSPITAL

Engine Diesel Fire Pump Weekly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

วันที่ตรวจ: 5/9/66

อาคาร / Building: TOWER - C

Specification Data: No 1 /143HP /2100 RPM

Description / รายละเอียด	Standard Rate / มาตรฐาน	Before Start / ก่อนสตาร์ทเครื่อง	Normal / เดินเครื่องตามปกติ	Abnormal / เดินเครื่องผิดปกติ	Remark / หมายเหตุ
Coolant Water Level Record ปริมาณน้ำในหม้อน้ำ	FULL	✓			
Water Temperature Record ปริมาณอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Set Starting Temperature	95 / 185 °F		190°F		
Oil Pressure Record ปริมาณแรงดันน้ำมันเครื่อง Psi	ไม่น้อยกว่า 55 Psi		65 Psi		
Intake Cooling Inlet (pressure) ปริมาณแรงดันน้ำระบายความร้อน Psi	ไม่น้อยกว่า 13 Psi		13 Psi		
Oil Level Record ปริมาณน้ำมันเครื่อง	Full	✓			
Belt Tension ความตึงสายพานขับเครื่องยนต์	ไม่หย่อนเกินไป	✓			
Smoke Condition สภาพควันดำ	สีขาวจาง		สีขาวจาง		
Diesel Level Record ปริมาณน้ำมันดีเซล (FULL = 600 L)	> 300 L	550	590		
Vibration & Noise การสั่นและเสียงผิดปกติ	ไม่มีเสียงผิดปกติ		ไม่มีเสียงผิดปกติ		
Speed Record ปริมาณรอบเครื่อง	1,780		1,810		
Flow Rate ปริมาณน้ำไหล	750 GPM		-		
Suction Rate ปริมาณอุณหภูมิน้ำเข้าหม้อน้ำ	110/155 Psi		155 Psi		
Battery Terminals Connected การต่อสายขั้วแบตเตอรี่	แน่นไม่หลวม	✓			
Electrolyte Level of Battery ปริมาณน้ำกลั่นแบตเตอรี่	1 นิ้ว ต่อเซล	1/2 - 3/4			No. 2
Distilled Water (if Battery) น้ำกลั่นแบตเตอรี่	มี	✓			
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโวลท์มิเตอร์	✓	ปกติ	[illegible]	
Battery Voltage Record ปริมาณแรงดันไฟฟ้า (DC Volts)	12-24 Volt	13.2	13.2		
Battery Amperes Record ปริมาณกระแสไฟฟ้า (DC Amps)	0.5 - 2.5 A.	0.5	0.5		
Testing Period (Min) ทำงานต่อเนื่อง (10 - 15 นาที)	10 - 15 Min		10 Min		
Engine Operating Hour (Reading) เดินเครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)		3,842.1	35.3	[illegible]	

Check without smoke / ตรวจสอบควันดำ — Inspection / ตรวจสอบ

- Black smoke / ควันดำ: เดินเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจสอบ / เครื่องยนต์ไม่ควรมีควันดำ
- Normal / ปกติ: เครื่องทำงานปกติ
- Heavy black smoke / ควันดำหนาทึบ: ต้องทำการซ่อมแซมทันที

หมายเหตุ: เดินเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี ปั๊มน้ำ ต้องมีการ ซ่อมบำรุง

ผู้ตรวจสอบ: [illegible]
วันที่ตรวจ: 5-9-66
ไม่ตรงปก

ผู้ตรวจสอบ: [illegible]
วันที่ตรวจ: 5/9/66
Time/เวลา:

FM-FAC-008 Rev 0 (27/11/2015)

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ SIRIRAJ PIYAMAHARAJKARUNA HOSPITAL

Engine Diesel Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

วันที่ตรวจ: 26/9/66

Building / อาคาร: TOWER - C

Specification Data: No.1 /143HP /2100 RPM

Description / รายละเอียด	Standard Data ค่ามาตรฐาน	Before Test ก่อนการทดสอบเครื่อง	After Test ☑ หลังทดสอบเครื่อง	Abnormal ☐ ผิดปกติหลังทดสอบ	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	FULL	F/L			
Temperature Record บันทึกอุณหภูมิก่อนและหลังทดสอบ Gas Starting Temperature	95-100 °F		160 °F		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง PSI	ไม่น้อยกว่า 65 PSI		70 PSI		
Water Cooling Temperature บันทึกแรงดันน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ PSI	ไม่น้อยกว่า 13 PSI		14 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	F/L			
Belt Tension ความตึงของสายพานขับเครื่องยนต์	ไม่หย่อนเกินไป	ปกติ			
Smoke Condition สภาพของควัน	สีดำจาง		ดำจาง		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 600 L)	>300 L	595	590		
Voltmeter & Relay การทำงานของโวลท์มิเตอร์และรีเลย์	บันทึกค่าที่อ่านได้		ปกติ		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	2,700		2,710		
Flow Rate ความสามารถในการจ่ายน้ำ	750 GPM				
System Head ความสามารถในการส่งน้ำที่ความดันต่างๆ	110-130 PSI		130 PSI		
Battery Terminals Connection การต่อขั้วแบตเตอรี่	แน่นไม่หลวม	ปกติ			No. 2
Battery Charge Indicator Light การแสดงสถานะไฟเลี้ยงแบตเตอรี่	ปกติ	19-10-66			
Distilled Water in Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	มี	มี			
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟแสดงสถานะ	ปกติ	ปกติ		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	12-24 Volts	15 Volt	14 Volt		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amps.)	0.5 - 2.5 A	0.5 A	2.0 A		
Testing Period (Min.) ระยะเวลาในการทดสอบ (10 - 15 นาที)	10 - 15 Min		10 Min		
Engine Operating Hour (Reading) เลขชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (ขณะทดสอบ)		5.1	15		

Check Items / รายการตรวจสอบ	Inspection / ผลการตรวจสอบ
☐ Check Valve / ตรวจสอบวาล์วกันกลับ	
☑ Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	ปรับความดันเปิดวาล์วไว้ที่ 150 PSI ตามมาตรฐาน
☐ Emergency Valve / วาล์วฉุกเฉิน	

หมายเหตุ: เมื่อน้ำในถังเก็บน้ำดับเพลิงลดลงถึง 300 มิลลิเมตร/ลูกบาศก์

สรุปผลการตรวจเช็ค: Test Run ปกติ (ผ่านเกณฑ์)

ผู้ตรวจเช็ค: [signature]
วันที่: 26/9/66
Time/เวลา: 09.00-09.30

ผู้ตรวจสอบ: [signature]
วันที่: 26/9/66
Time/เวลา: 9.30 น.

FM-FAC-008 Rev.2 (01/12/2015)

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ SIRIRAJ PIYAMAHARAJKARUNA HOSPITAL

Engine Diesel Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

วันที่ตรวจ: 1/10/66

Building / อาคาร: TOWER - C

Specification Data: No.1 /143HP /2100 RPM

Description / รายละเอียด	Standard Data ค่ามาตรฐาน	Before Test ก่อนการทดสอบเครื่อง	After Test ☑ หลังทดสอบเครื่อง	Abnormal ☐ ผิดปกติหลังทดสอบ	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	FULL	F/L			
Temperature Record บันทึกอุณหภูมิก่อนและหลังทดสอบ Gas Starting Temperature	95-100 °F		160 °F		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง PSI	ไม่น้อยกว่า 65 PSI		70 PSI		
Water Cooling Temperature บันทึกแรงดันน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ PSI	ไม่น้อยกว่า 13 PSI		14 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	F/L			
Belt Tension ความตึงของสายพานขับเครื่องยนต์	ไม่หย่อนเกินไป	ปกติ			
Smoke Condition สภาพของควัน	สีดำจาง		ดำจาง		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 600 L)	>300 L	595	590		
Voltmeter & Relay การทำงานของโวลท์มิเตอร์และรีเลย์	บันทึกค่าที่อ่านได้		ปกติ		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	2,700		2,710		
Flow Rate ความสามารถในการจ่ายน้ำ	750 GPM				
System Head ความสามารถในการส่งน้ำที่ความดันต่างๆ	110-130 PSI		130 PSI		
Battery Terminals Connection การต่อขั้วแบตเตอรี่	แน่นไม่หลวม	ปกติ			No. 2
Battery Charge Indicator Light การแสดงสถานะไฟเลี้ยงแบตเตอรี่	ปกติ	19-10-66			
Distilled Water in Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	มี	มี			
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟแสดงสถานะ	ปกติ	ปกติ		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	12-24 Volts	15 Volt	14 Volt		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amps.)	0.5 - 2.5 A	0.5 A	2.0 A		
Testing Period (Min.) ระยะเวลาในการทดสอบ (10 - 15 นาที)	10 - 15 Min		10 Min		
Engine Operating Hour (Reading) เลขชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (ขณะทดสอบ)		5.1	15		

Check Items / รายการตรวจสอบ	Inspection / ผลการตรวจสอบ
☐ Check Valve / ตรวจสอบวาล์วกันกลับ	
☑ Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	ปรับความดันเปิดวาล์วไว้ที่ 150 PSI ตามมาตรฐาน
☐ Emergency Valve / วาล์วฉุกเฉิน	

หมายเหตุ: เมื่อน้ำในถังเก็บน้ำดับเพลิงลดลงถึง 300 มิลลิเมตร/ลูกบาศก์

สรุปผลการตรวจเช็ค: Test Run ปกติ (ผ่านเกณฑ์)

ผู้ตรวจเช็ค: [signature]
วันที่: 1/10/66
Time/เวลา: 09.00-09.30

ผู้ตรวจสอบ: [signature]
วันที่: 1/10/66
Time/เวลา:

FM-FAC-008 Rev.2 (01/12/2015)

INSPECTION AND TEST REPORT

SERVICE CONTACT FIRE PUMP

โรงพยาบาลศิริราช
SIRIRAJ HOSPITAL

Engine Diesel Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดีเซลเพลิงประจำสัปดาห์

วันที่ตรวจ 31/12/64

Building / อาคาร TOWER - C

Specification Data : No.1 /143HP /2100 RPM

รายละเอียด	Standard Data ค่ามาตรฐาน	Before Test ผลการตรวจเช็ค	✓ Normal ปกติ	✓ Abnormal ไม่ปกติ/ต้องแก้ไข	Remark หมายเหตุ
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบายความร้อน	FULL	Full			
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำขณะตรวจเช็ค Std. Starting Temperature	95-185 °F		150°F		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง Psi	ไม่มีกำหนด Psi		60 Psi		
Water Cooling Pressure บันทึกแรงดันน้ำระบายความร้อน Psi	ไม่มีกำหนด Psi		14 Psi		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	Full	Full			
Belt Tension ความตึงของสายพาน/ลักษณะการ	ไม่หย่อนเกินไป	ปกติ			
Grease Condition สภาพจารบี	ดีพร้อม		ดีพร้อม		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 600 L)	> 300 L	365	360		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ/ไม่ผิดปกติ		ลำไม่		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,200		1760		
Flow Rate อัตราการไหล	750 GPM				
Packet Rate อัตราการสูบน้ำของหัวฉีดในแต่ละหัว	110-165 Psi		150 Psi		
Battery Terminals connection สภาพขั้วแบตเตอรี่	แน่นไม่มีสนิม	ดี			No.1
สภาพแบตเตอรี่	1 ปี 6 เดือน	25/9/64			
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ลด	เต็ม			
Battery Charger เครื่องประจุแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	ปกติ	ปกติ		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบต (DC Volts)	12.34 Volt.	12 V.	14 V.		
Battery Amperes Record บันทึกแอมป์ไฟฟ้าแบต (DC Amp.)	0.3 - 2.5 A	1.9 A	2A		
Testing Period (Min) ทำงานเครื่องยนต์ (10 - 15 นาที)	10 - 15 Min		10Min		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงทำงานเครื่องยนต์ (ก่อนซ่อม)		9710	97.2		

Check without sound / ตรวจสอบขณะไม่มีเสียงดัง — Inspection / การตรวจสอบ

	ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	ปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันไม่ต่ำกว่าครึ่งถัง ไม่มีรอยรั่วซึม
✓	ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	ปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันไม่ต่ำกว่าครึ่งถัง
	ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	ไม่มีรอยรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ ของระบบ

หมายเหตุ: ปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันไม่ต่ำกว่าครึ่งถัง ไม่มีรอยรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ ของระบบ

ผู้ตรวจเช็ค ชัยศักดิ์ Date/วันที่ 31/12/64 Time/เวลา 07.00 - 07.10

ผู้ตรวจสอบ ธีรพงศ์ภู Date/วันที่ 31/12/64 Time/เวลา 9. [illegible]

FM-FAC-008 Rev.0 (01/11/2015)

Fire Hose Cabinet

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE _____SRH_____Rev.00

[illegible]	FM-[illegible]-02
[illegible]	Rev.00
[illegible]	1/4/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Plan	FM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.01	1	A	ที่ทำ Admission	FHC-A-1-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.02	1	A	ด้านหน้าลิฟต์ ER	FHC-A-1-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.03	1	A	หน้าห้องตรวจ 1 room ER	FHC-A-1-03	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.04	2	A	หน้าห้อง ST 6 ชั้น 2	FHC-A-2-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.05	3	A	หน้าแผนก ENT	FHC-A-3-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.06	3	A	แผนกห้องคลอด	FHC-A-3-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.07	3	A	ด้านหน้าห้องผ่าตัด	FHC-A-3-03	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.08	4	A	Lobby ชั้น 4	FHC-A-4-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.09	1	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 1	FHC-B-1-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.10	1	B	หน้าห้องแผนก SICK ward	FHC-B-1-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.11	2	B	หน้าห้องผ่าตัดเล็ก	FHC-B-2-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.12	2	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 2	FHC-B-2-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.13	3	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 3	FHC-B-3-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.14	3	B	หน้าลิฟต์ C ชั้น 3	FHC-B-3-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.15	4	B	หน้าลิฟต์ A ชั้น 4	FHC-B-4-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.16	4	B	หน้าลิฟต์ C ชั้น 4	FHC-B-4-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.17	5	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	FHC-B-5-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.18	5	B	หน้าลิฟต์ C ชั้น 5	FHC-B-5-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.19	6	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 6	FHC-B-6-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.20	6	B	หน้าลิฟต์ C ชั้น 6	FHC-B-6-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.21	7	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 7	FHC-B-7-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.22	7	B	หน้าลิฟต์ C ชั้น 7	FHC-B-7-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.23	8	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 8	FHC-B-8-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.24	8	B	หน้าลิฟต์ C ชั้น 8	FHC-B-8-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.25	1	C	หน้าห้องเอกซเรย์	FHC-C-1-01	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	
FP	FHC	1	Fire Hose Cabinet No.26	1	C	หน้าห้อง FIRE PUMP	FHC-C-1-02	-	-	-	-		M	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUATERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	Subcontractor

จัดทำโดย
ลงชื่อ _____ ผู้บริหารงานบริการ
Date/วันที่ 5/01/2023

อนุมัติโดย
ลงชื่อ _____ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
Date/วันที่ 5/01/2023

รับทราบโดย
ลงชื่อ _____ ผู้จัดการ
Date/วันที่ 5/01/2023

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร A,B,C

เดือน ๗/๖/๖๔

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
1	FHC-A-1-01	ชั้น Admission	1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	FHC-A-1-02	ด้านหลังแผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
3	FHC-A-1-03	หน้าห้องตรวจ 1 แผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FHC-A-2-01	หน้าบันได ST 4 ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FHC-A-3-01	หน้าแผนก ICU	3	✓	✓	✓	✓	✓	
6	FHC A-3-02	แผนกห้องคลอด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
7	FHC-A-3-03	ด้านหลังห้องผ่าตัด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
8	FHC A-4-01	Lobby ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FHC-B-1-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FHC-B-1-02	ทางเดินแผนก SICK BABY	1	✓	✓	✓	✓	✓	
11	FHC-A-2-01	ทางเดินไปแผนกไตเทียม	2	✓	✓	✓	✓	✓	
12	FHC-A-2-02	หน้าอีฟต์ B ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	FHC-B-3-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
14	FHC-B-3-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
15	FHC-B-4-01	หน้าอีฟต์ A ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
16	FHC-B-4-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
17	FHC-B-5-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
18	FHC-B-5-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
19	FHC-B-6-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
20	FHC-B-6-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
21	FHC-C-1-01	หน้าห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
22	FHC-C-1-02	หลังห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
23	FHC-B-7-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
24	FHC-B-7-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
25	FHC-B-8-03	หน้าอีฟต์ B ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	
26	FHC-B-8-04	หน้าอีฟต์ C ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คว่าถังดับเพลิง (ปี)
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ต่อ ฟิวส์ต่อ หัวฉีด ขดสายดับเพลิงว่าเรียบร้อย
3	ตรวจเช็คว่าสายดับเพลิง
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและจุดต่างๆ
5	ทำความสะอาด

ผู้ตรวจเช็ค [illegible]
วันที่ ๗/๖/๖๔

ผู้ตรวจสอบ [illegible]
วันที่ ๘/๗/๖๔

หมายเหตุ : (√) ปกติ, (X) ผิดปกติ

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร A,B,C

เดือน ธันวาคม ๖๔

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	สถานที่	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
1	FHC-A-1-01	ชั้น Admission	1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	FHC-A-1-02	ด้านหลังแผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
3	FHC-A-1-03	หน้าห้องตรวจ 1 แผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FHC-A-2-01	หน้าบันได ST 4 ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FHC-A-3-01	หน้าแผนก ICU	3	✓	✓	✓	✓	✓	
6	FHC-A-3-02	แผนกห้องคลอด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
7	FHC-A-3-03	ด้านหลังห้องผ่าตัด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
8	FHC-A-4-01	Lobby ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FHC-B-1-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FHC-B-1-02	ทางเดินแผนก SICK BABY	1	✓	✓	✓	✓	✓	
11	FHC-A-2-01	ทางเดินไปแผนกไตเทียม	2	✓	✓	✓	✓	✓	
12	FHC-A-2-02	หน้าอีฟต์ B ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	FHC-B-3-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
14	FHC-B-3-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
15	FHC-B-4-01	หน้าอีฟต์ A ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
16	FHC-B-4-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
17	FHC-B-5-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
18	FHC-B-5-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
19	FHC-B-6-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
20	FHC-B-6-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
21	FHC-C-1-01	หน้าห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
22	FHC-C-1-02	หลังห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
23	FHC-B-7-01	หน้าอีฟต์ B ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
24	FHC-B-7-02	หน้าอีฟต์ C ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
25	FHC-B-8-03	หน้าอีฟต์ B ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	
26	FHC-B-8-04	หน้าอีฟต์ C ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คว่าถังดับเพลิง (ปี)
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ต่อ ฟิวส์ต่อ หัวฉีด ขดสายดับเพลิงว่าเรียบร้อย
3	ตรวจเช็คว่าสายดับเพลิง
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและจุดต่างๆ
5	ทำความสะอาด

ผู้ตรวจเช็ค [illegible]
วันที่ 15/12/64

ผู้ตรวจสอบ [illegible]
วันที่ 15/12/64

หมายเหตุ : (√) ปกติ, (X) ผิดปกติ

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็กตู้ดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร A,B,C

เดือน 10/9/64

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ตำแหน่ง	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
1	FHC-A-1-01	ห้อง Admission	1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	FHC-A-1-02	ด้านหลังแผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
3	FHC-A-1-03	หน้าห้องตรวจ 1 แผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FHC-A-2-01	หน้าบันได ST 4 ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FHC-A-3-01	หน้าแผนก ICU	3	✓	✓	✓	✓	✓	
6	FHC-A-3-02	แผนกห้องคลอด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
7	FHC-A-3-03	ด้านหลังห้องผ่าตัด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
8	FHC-A-4-01	Lobby ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FHC-B-1-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FHC-B-1-02	ทางเดินแผนก SICK BABY	1	✓	✓	✓	✓	✓	
11	FHC-A-2-01	ทางเดินไปแผนกไตเทียม	2	✓	✓	✓	✓	✓	
12	FHC-A-2-02	หน้าอิฟห์ B ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	FHC-B-3-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
14	FHC-B-3-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
15	FHC-B-4-01	หน้าอิฟห์ A ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
16	FHC-B-4-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
17	FHC-B-5-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
18	FHC-B-5-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
19	FHC-B-6-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
20	FHC-B-6-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
21	FHC-C-1-01	หน้าห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
22	FHC-C-1-02	หลังห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
23	FHC-B-7-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
24	FHC-B-7-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
25	FHC-B-8-03	หน้าอิฟห์ B ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	
26	FHC-B-8-04	หน้าอิฟห์ C ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คอย่างละเอียด (ปีละ)
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง,หัวฉีด ตลอดจนอุปกรณ์การฉีดน้ำ
3	ตรวจเช็คส่วนของเครื่องยนต์
4	ตรวจเช็คการไว้วิ่งของเครื่องต่อและเชื่อต่างๆ
5	ทำความสะอาด

ผู้ตรวจเช็ค ปภัสร์ ชัยมงคล
วันที่ 10/9/64

ผู้ตรวจสอบ ศันสนีย์ ชุ้ย
วันที่ 10/9/64

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) มีสนิม

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็กตู้ดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร A,B,C

เดือน 9/10/64

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ตำแหน่ง	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
1	FHC-A-1-01	ห้อง Admission	1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	FHC-A-1-02	ด้านหลังแผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
3	FHC-A-1-03	หน้าห้องตรวจ 1 แผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FHC-A-2-01	หน้าบันได ST 4 ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FHC-A-3-01	หน้าแผนก ICU	3	✓	✓	✓	✓	✓	
6	FHC-A-3-02	แผนกห้องคลอด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
7	FHC-A-3-03	ด้านหลังห้องผ่าตัด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
8	FHC-A-4-01	Lobby ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FHC-B-1-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FHC-B-1-02	ทางเดินแผนก SICK BABY	1	✓	✓	✓	✓	✓	
11	FHC-A-2-01	ทางเดินไปแผนกไตเทียม	2	✓	✓	✓	✓	✓	
12	FHC-A-2-02	หน้าอิฟห์ B ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	FHC-B-3-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
14	FHC-B-3-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
15	FHC-B-4-01	หน้าอิฟห์ A ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
16	FHC-B-4-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
17	FHC-B-5-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
18	FHC-B-5-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
19	FHC-B-6-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
20	FHC-B-6-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
21	FHC-C-1-01	หน้าห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
22	FHC-C-1-02	หลังห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
23	FHC-B-7-01	หน้าอิฟห์ B ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
24	FHC-B-7-02	หน้าอิฟห์ C ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
25	FHC-B-8-03	หน้าอิฟห์ B ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	
26	FHC-B-8-04	หน้าอิฟห์ C ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คอย่างละเอียด (ปีละ)
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง,หัวฉีด ตลอดจนอุปกรณ์การฉีดน้ำ
3	ตรวจเช็คส่วนของเครื่องยนต์
4	ตรวจเช็คการไว้วิ่งของเครื่องต่อและเชื่อต่างๆ
5	ทำความสะอาด

ผู้ตรวจเช็ค ปภัสร์ ชัยมงคล
วันที่ 9/10/64

ผู้ตรวจสอบ ศันสนีย์ ชุ้ย
วันที่ 9/10/64

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) มีสนิม

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร A,B,C

เดือน 17-ต.ค.-66

ลำดับ	รหัสตู้ดับเพลิง	ตำแหน่ง	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
1	FHC-A-1-01	ข้าง Admission	1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	FHC-A-1-02	ด้านหลังแผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
3	FHC-A-1-03	หน้าห้องตรวจ 1 แผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FHC-A-2-01	หน้าบันได ST 4 ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FHC-A-3-01	หน้าแผนก ICU	3	-	-	-	-	-	ปิดปรับปรุงชั้นที่
6	FHC-A-3-02	แผนกห้องคลอด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
7	FHC-A-3-03	ด้านหลังห้องผ่าตัด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
8	FHC-A-4-01	Lobby ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FHC-B-1-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FHC-B-1-02	ทางเดินแผนก SICK BABY	1	-	-	-	-	-	ปิดปรับปรุงชั้นที่
11	FHC-A-2-01	ทางเดินไปแผนกไตเทียม	2	✓	✓	✓	✓	✓	
12	FHC-A-2-02	หน้าอิฟต์ B ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	FHC-B-3-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
14	FHC-B-3-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
15	FHC-B-4-01	หน้าอิฟต์ A ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
16	FHC-B-4-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
17	FHC-B-5-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
18	FHC-B-5-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
19	FHC-B-6-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
20	FHC-B-6-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
21	FHC-C-1-01	หน้าห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
22	FHC-C-1-02	หลังห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
23	FHC-B-7-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
24	FHC-B-7-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
25	FHC-B-8-03	หน้าอิฟต์ B ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	
26	FHC-B-8-04	หน้าอิฟต์ C ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายนอก (ปีละ)
2	ตรวจสภาพภายในตู้และอุปกรณ์ดับเพลิง ทดสอบระบบไฟฉุกเฉินด้วย
3	ตรวจเช็คน้ำดับเพลิงภายในเครื่อง
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและอื่นๆ
5	ทำความสะอาด

ผู้ตรวจสอบ [signature] วันที่ 17-ต.ค.-66

ผู้ตรวจสอบ [signature] วันที่ 17/10/66

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) มีปัญหา

FM-FAC-006 Rev.1 (16/01/2019)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร A,B,C

เดือน 18-ธ.ค.-66

ลำดับ	รหัสตู้ดับเพลิง	ตำแหน่ง	ชั้น	PM Program (Code)					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
1	FHC-A-1-01	ข้าง Admission	1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	FHC-A-1-02	ด้านหลังแผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
3	FHC-A-1-03	หน้าห้องตรวจ 1 แผนก ER	1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FHC-A-2-01	หน้าบันได ST 4 ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FHC-A-3-01	หน้าแผนก ICU	3	✓	✓	✓	✓	✓	
6	FHC-A-3-02	แผนกห้องคลอด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
7	FHC-A-3-03	ด้านหลังห้องผ่าตัด	3	✓	✓	✓	✓	✓	
8	FHC-A-4-01	Lobby ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FHC-B-1-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FHC-B-1-02	ทางเดินแผนก SICK BABY	1	✓	✓	✓	✓	✓	
11	FHC-A-2-01	ทางเดินไปแผนกไตเทียม	2	✓	✓	✓	✓	✓	
12	FHC-A-2-02	หน้าอิฟต์ B ชั้น 2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	FHC-B-3-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
14	FHC-B-3-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 3	3	✓	✓	✓	✓	✓	
15	FHC-B-4-01	หน้าอิฟต์ A ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
16	FHC-B-4-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 4	4	✓	✓	✓	✓	✓	
17	FHC-B-5-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
18	FHC-B-5-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 5	5	✓	✓	✓	✓	✓	
19	FHC-B-6-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
20	FHC-B-6-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 6	6	✓	✓	✓	✓	✓	
21	FHC-C-1-01	หน้าห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	✓	✓	
22	FHC-C-1-02	หลังห้อง FIRE PUMP	1	✓	✓	✓	✓	✓	
23	FHC-B-7-01	หน้าอิฟต์ B ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
24	FHC-B-7-02	หน้าอิฟต์ C ชั้น 7	7	✓	✓	✓	✓	✓	
25	FHC-B-8-03	หน้าอิฟต์ B ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	
26	FHC-B-8-04	หน้าอิฟต์ C ชั้น 8	8	✓	✓	✓	✓	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายนอก (ปีละ)
2	ตรวจสภาพภายในตู้และอุปกรณ์ดับเพลิง ทดสอบระบบไฟฉุกเฉินด้วย
3	ตรวจเช็คน้ำดับเพลิงภายในเครื่อง
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและอื่นๆ
5	ทำความสะอาด

ผู้ตรวจสอบ [signature] วันที่ 18-ธ.ค.-66

ผู้ตรวจสอบ [signature] วันที่ 13/12/66

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) มีปัญหา

FM-FAC-006 Rev.1 (16/01/2019)

Fire Extinguisher

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE ....SRH.....Rev.00

[illegible]	FM-[illegible]-02
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2023

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FP	EXT	1	Extinguisher No.01	1	A	ด้านหน้าลิฟต์ลบก ER	EXT-A-1-01	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.02	1	A	ด้านหน้าทางเข้าห้องเครื่องลิฟต์ลบก ER	EXT-A-1-02	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.03	1	A	หน้าห้องสวาท 1 ลบก ER	EXT-A-1-03	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.04	1	A	ด้านหน้าทางเข้าลิฟต์ลบก ER	EXT-A-1-04	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.05	1	A	ห้องยา OPD	EXT-A-1-05	ยาโฟมลอย	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.06	1	A	ห้องเอ็กซ์เรย์	EXT-A-1-06	ยาโฟมลอย	-	-	50 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.07	1	A	ลบก X-ray	EXT-A-1-07	ยาโฟมลอย	-	-	50 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.08	1	A	หน้าห้อง CONTROL ROOM	EXT-A-1-08	ยาโฟมลอย	-	-	50 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.09	1	A	ลบกcheck up	EXT-A-1-09	ยาโฟมลอย	-	-	50 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.10	1	A	ลบกห้องLAB	EXT-A-1-10	ยาโฟมลอย	-	-	50 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.11	2	A	หน้าลบก IT	EXT-A-2-01	เคมีแห้ง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.12	2	A	หน้าห้องใต้ ST C ชั้น 2	EXT-A-2-02	เคมีแห้ง	-	-	20 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.13	2	A	ลบกไทเทียม	EXT-A-2-03	ยาโฟมลอย	-	-	50 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.14	2	A	ห้องเวรพยาบาล เก็บปลาร์ดีผู้ป่วย	EXT-A-2-04	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.15	2	A	ลบกอาหาร	EXT-A-2-05	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.16	3	A	หน้าลบก CSSD	EXT-A-3-01	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.17	3	A	หน้าลบก ICU	EXT-A-3-02	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.18	3	A	หน้าห้องลอด	EXT-A-3-03	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.19	3	A	ด้านหลังห้องผ่าตัด 5	EXT-A-3-04	CO2	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.20	3	A	ทางเดินหน้าห้องห้องชั้น	EXT-A-3-05	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.21	3	A	ห้องเครื่องลอดหน้าลบก CSSD	EXT-A-3-06	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.22	3	A	เสาห้องหน้า ICU	EXT-A-3-07	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.23	3	A	เสาห้องหน้า MS	EXT-A-3-08	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.24	4	B	ปั๊มไฮดรอลิก ST 1 ชั้น 4	EXT-A-4-01	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.25	0	B	Lobby ชั้น 0	EXT-A-4-02	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.26	1	B	ห้อง Admission	EXT-B-1-01	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.27	1	B	หน้าลิฟต์ B	EXT-B-1-02	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.28	1	B	หน้าห้องเวรรับไต 1	EXT-B-1-03	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.29	1	B	ทางขึ้นลบก BACK RAMP	EXT-B-1-04	เคมีแห้ง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.30	2	B	ทางขึ้น[illegible]	EXT-B-2-02	เคมีแห้ง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.31	2	B	ทางเดินหน้า [illegible]	EXT-B-2-03	เคมีแห้ง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.32	2	B	[illegible]	EXT-B-2-04	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.33	2	B	หน้าห้อง[illegible]ชั้น 2	EXT-B-2-05	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.34	3	B	หน้าลิฟต์ B ชั้น 3	EXT-B-3-01	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.35	3	B	ห้อง[illegible]ชั้น 3	EXT-B-3-02	เคมีแห้ง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

[illegible]	[illegible]
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FP	EXT	1	Extinguisher No.36	3	B	หน้าห้อง C ชั้น 3	EXT-B-3-03	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.37	3	B	[illegible]	EXT-B-3-04	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.38	4	B	หน้าห้อง B ชั้น 4	EXT-B-4-01	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.39	4	B	หน้าห้อง C ชั้น 4	EXT-B-4-02	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.40	4	B	[illegible]	EXT-B-4-03	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.41	4	B	[illegible]	EXT-B-4-04	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.42	4	B	[illegible]	EXT-B-4-05	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.43	5	B	หน้าห้อง C ชั้น 5	EXT-B-5-01	เหลือง	-	-	10ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.44	5	B	[illegible]	EXT-B-5-02	เหลือง	-	-	10ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.45	5	B	หน้าห้อง B ชั้น 5	EXT-B-5-03	ผงโซเดียม	-	-	10ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.46	5	B	[illegible]	EXT-B-5-04	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.47	6	B	หน้าห้อง C	EXT-B-6-01	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.48	6	B	หน้าห้อง B	EXT-B-6-02	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.49	6	B	[illegible]	EXT-B-6-03	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.50	7	B	หน้าห้อง B ชั้น 7	EXT-B-7-01	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.51	7	B	หน้าห้อง C ชั้น 7	EXT-B-7-02	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.52	7	B	[illegible]	EXT-B-7-03	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.53	7	B	[illegible]	EXT-B-7-04	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.54	8	B	หน้าห้อง C ชั้น 8	EXT-B-8-01	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.55	8	B	หน้าห้อง B ชั้น 8	EXT-B-8-02	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.56	8	B	[illegible]	EXT-B-8-03	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.57	8	B	[illegible]	EXT-B-8-04	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.58	9	B	หน้าห้อง C ชั้น 9	EXT-B-9-01	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.59	10	B	หน้าห้อง C ชั้น 10	EXT-B-10-01	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.60	11	B	[illegible]	EXT-B-11-01	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.61	11	B	[illegible] 1/2	EXT-B-11-02	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.62	11	B	[illegible] 1/3	EXT-B-11-03	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.63	R	C	[illegible]	EXT-B-R-01	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.64	R	C	[illegible]	EXT-B-R-02	เหลือง	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.65	R	C	[illegible] Booster Pump	EXT-B-R-03	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.66	R	C	[illegible]	EXT-B-R-04	CO2	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.67	1	C	[illegible]	EXT-C-1-01	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.68	1	C	[illegible]	EXT-C-1-02	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.69	1	C	[illegible]	EXT-C-1-03	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

ATALIAN

ATALIAN FACILITY MANAGEMENT Co.,Ltd.
PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2023
AT SITE .....SRH.....Rev.00

[illegible]	[illegible]
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2021

System	Sub	AMOUNT (Set)	ENGINEERING EQUIPMENT LIST	LOCATION			CODE	DETAIL				Risk	PM MASTER PLAN												Remark
				FLOOR	BUILDING	AREA		BRAND	MODEL	SERIAL	CAPACITY		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
FP	EXT	1	Extinguisher No.70	1	C	จุด MDB 1/1	EXT-C-1-05	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.72	1	C	จุด MDB 1/2	EXT-C-1-07	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.73	1	C	จุด Generator	EXT-C-1-08	CO2	-	-	10 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.74	1	C	ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง Fire Pump	EXT-C-1-09	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.75	1	C	ในห้องปั๊ม Fire Pump	EXT-C-1-10	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.76	1	C	ในห้องปั๊ม Vacuum	EXT-C-1-11	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.77	1	PK	Store ชั้น 1	EXT-PK-1-01	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.78	1	PK	ในห้องควบคุมที่จอดรถ 1/1	EXT-PK-1-02	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.79	1	PK	ในห้องควบคุมที่จอดรถ 1/2	EXT-PK-1-03	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.80	1	PK	ในห้องควบคุมที่จอดรถ 1/3	EXT-PK-1-04	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FP	EXT	1	Extinguisher No.81	1	PK	[illegible]	EXT-PK-1-05	เหลือง	-	-	15 ปอนด์		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

W	=	WEEKLY
M	=	MONTHLY
Q	=	QUARTERLY
H	=	HALF
Y	=	YEARLY
SC	=	SUBCONTRACTOR

จัดทำโดย
ลงชื่อ [illegible] ผู้บริหารหน่วยงาน
Date/วันที่ 5/01/2023

อนุมัติโดย
ลงชื่อ [illegible] วิศวกรปฏิบัติการ
Date/วันที่ 5/01/2023

รับทราบโดย
ลงชื่อ [illegible] General Support HOL ผู้ประสาน
Date/วันที่ 5/01/2023

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Extinguisher Monthly Checklist

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

อาคาร ..... B .....

ประจำเดือน พ.ย. 66

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ตำแหน่ง	ชั้น	ขนาด (ปอนด์)	ประเภท	PM Program (Code)						หมายเหตุ
						1	2	3	4	5	6	
31	EXT-B-4-02	หน้าลิฟต์ C ชั้น 4	4	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
32	EXT-B-4-03	ห้องเจ้าหน้าที่ชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.99 Kg.
33	EXT-B-4-04	ปั๊มไฮดรอลิก ST 3	4	13	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
34	EXT-B-4-05	ตู้เก็บอุปกรณ์ชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.97 Kg.
35	EXT-B-5-01	หน้าลิฟต์ C ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
36	EXT-B-5-02	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
37	EXT-B-5-03	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
38	EXT-B-5-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
39	EXT-B-6-01	หน้าลิฟต์ C	6	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
40	EXT-B-6-02	หน้าลิฟต์ B	6	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
41	EXT-B-6-03	หน้าห้องประชุมใหญ่	6	35	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
42	EXT-B-6-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ชั้น 6	6	20	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
43	EXT-B-7-01	หน้าลิฟต์ C	7	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
44	EXT-B-7-02	หน้าลิฟต์ B	7	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
45	EXT-B-7-03	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ชั้น 7	7	20	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
46	EXT-B-7-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ ๒.๗	7	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
47	EXT-B-8-01	หน้าลิฟต์ C	8	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
48	EXT-B-8-02	หน้าลิฟต์ B	8	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
49	EXT-B-8-03	หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 8	8	35	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
50	EXT-B-8-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ ๒.๘	8	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
51	EXT-B-9-01	หน้าลิฟต์ C	9	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
52	EXT-B-10-01	หน้าลิฟต์ C	10	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
53	EXT-B-11-01	ตู้เก็บสิ่งของประเภทที่ผู้ป่วย ๑/๑	11	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
54	EXT-B-11-02	ตู้เก็บสิ่งของประเภทที่ผู้ป่วย ๑/๒	11	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
55	EXT-B-11-03	ตู้เก็บสิ่งของประเภทที่ผู้ป่วย ๑/๓	11	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
56	EXT-B-12-01	ตู้เก็บสิ่งของ ๒/๑	12	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
57	EXT-B-12-02	ตู้เก็บสิ่งของ ๒/๒	12	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
58	EXT-B-12-03	ตู้เก็บสิ่งของ ๒/๓	12	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
59	EXT-B-13-01	ตู้เก็บสิ่งของ ๑/๑	13	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
60	EXT-B-13-02	ตู้เก็บสิ่งของ ๑/๒	13	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
61	EXT-B-R-01	ห้องเครื่องมือช่างเก่า	13	15	CO2	/	-	/	/	/	/	13.91 Kg.
62	EXT-B-R-02	ห้องไฟร้านอาหารใหม่	13	13	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
63	EXT-B-R-03	ห้อง Sprinkler Pump	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.53 Kg.
64	EXT-B-R-04	ห้องเครื่องเสียงรวม	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.50 Kg.
65												

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพภายนอก ไม่มีการแตกร้าวหรือชำรุด
2	ตรวจเช็คแรงดันภายในถัง กรณีเกินให้ เติมเฉพาะผู้ชำนาญเท่านั้นเรียก หรือ Overhaul กรณีไม่ผ่าน เติมกลับสู่บริษัท Recharge
3	ทำการหว่านถัง หรือหมุนถัง 3-4 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีไม่เกิดการแข็งตัว
4	ตรวจเช็คการทำงานของหัวฉีดและสาย ต่างๆ
5	กรณีเป็นถัง CO2 ให้ชั่งน้ำหนัก กรณีไม่ผ่าน น้ำหนักน้อยกว่า 75 %
	☐ 10 ปอนด์ > 10.00 kg
6	ตรวจเช็คแขวนตั้งไว้ พร้อมใช้งาน และทำความสะอาดทั่วไป

หมายเหตุ : (√) ปกติ, (X) มีปัญหา

ผู้ตรวจเช็ค .....

ผู้ตรวจสอบ .....

10/11/66

FM-FAC-007 Rev 1 (16/01/2019)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Extinguisher Monthly Checklist

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

อาคาร ..... B .....

ประจำเดือน ธันวาคม 66

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ตำแหน่ง	ชั้น	ขนาด (ปอนด์)	ประเภท	PM Program (Code)						หมายเหตุ
						1	2	3	4	5	6	
31	EXT-B-4-02	หน้าลิฟต์ C ชั้น 4	4	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
32	EXT-B-4-03	ห้องเจ้าหน้าที่ชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.99 Kg.
33	EXT-B-4-04	ปั๊มไฮดรอลิก ST 3	4	13	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
34	EXT-B-4-05	ตู้เก็บอุปกรณ์ชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.90 Kg.
35	EXT-B-5-01	หน้าลิฟต์ C ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
36	EXT-B-5-02	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
37	EXT-B-5-03	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
38	EXT-B-5-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ชั้น 5	5	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
39	EXT-B-6-01	หน้าลิฟต์ C	6	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
40	EXT-B-6-02	หน้าลิฟต์ B	6	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
41	EXT-B-6-03	หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 6	6	35	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
42	EXT-B-6-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ชั้น 6	6	20	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
43	EXT-B-7-01	หน้าลิฟต์ C	7	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
44	EXT-B-7-02	หน้าลิฟต์ B	7	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
45	EXT-B-7-03	หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 7	7	20	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
46	EXT-B-7-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ ๒.๗	7	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
47	EXT-B-8-01	หน้าลิฟต์ C	8	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
48	EXT-B-8-02	หน้าลิฟต์ B	8	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
49	EXT-B-8-03	หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 8	8	35	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
50	EXT-B-8-04	ตู้เก็บอุปกรณ์ ๒.๘	8	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
51	EXT-B-9-01	หน้าลิฟต์ C	9	15	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
52	EXT-B-10-01	หน้าลิฟต์ C	10	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
53	EXT-B-11-01	ตู้เก็บสิ่งของประเภทที่ผู้ป่วย ๑/๑	11	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
54	EXT-B-11-02	ตู้เก็บสิ่งของประเภทที่ผู้ป่วย ๑/๒	11	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
55	EXT-B-11-03	ตู้เก็บสิ่งของประเภทที่ผู้ป่วย ๑/๓	11	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
56	EXT-B-12-01	ตู้เก็บสิ่งของ ๒/๑	12	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
57	EXT-B-12-02	ตู้เก็บสิ่งของ ๒/๒	12	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
58	EXT-B-12-03	ตู้เก็บสิ่งของ ๒/๓	12	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
59	EXT-B-13-01	ตู้เก็บสิ่งของ ๑/๑	13	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
60	EXT-B-13-02	ตู้เก็บสิ่งของ ๑/๒	13	10	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
61	EXT-B-R-01	ห้องเครื่องมือช่างเก่า	13	15	CO2	/	-	/	/	/	/	13.91 Kg.
62	EXT-B-R-02	ห้องไฟร้านอาหารใหม่	13	13	เหมือนเดิม	/	/	/	/	-	/	
63	EXT-B-R-03	ห้อง Sprinkler Pump	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.58 Kg.
64	EXT-B-R-04	ห้องเครื่องเสียงรวม	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.50 Kg.
65												

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพภายนอก ไม่มีการแตกร้าวหรือชำรุด
2	ตรวจเช็คแรงดันภายในถัง กรณีเกินให้ เติมเฉพาะผู้ชำนาญเท่านั้นเรียก หรือ Overhaul กรณีไม่ผ่าน เติมกลับสู่บริษัท Recharge
3	ทำการหว่านถัง หรือหมุนถัง 3-4 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีไม่เกิดการแข็งตัว
4	ตรวจเช็คการทำงานของหัวฉีดและสาย ต่างๆ
5	กรณีเป็นถัง CO2 ให้ชั่งน้ำหนัก กรณีไม่ผ่าน น้ำหนักน้อยกว่า 75 %
	☐ 10 ปอนด์ > 10.00 kg
6	ตรวจเช็คแขวนตั้งไว้ พร้อมใช้งาน และทำความสะอาดทั่วไป

หมายเหตุ : (√) ปกติ, (X) มีปัญหา

ผู้ตรวจเช็ค .....

ผู้ตรวจสอบ .....

10/12/66

FM-FAC-007 Rev 1 (16/01/2019)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Extinguisher Monthly Checklist
แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

ชั้นที่ 1 ถึง 6

ประจำเดือน กรกฎาคม 66

ลำดับ	รหัสเครื่องมือ	สถานที่	ชั้น	ขนาด (ปอนด์)	ประเภท	PM Program (Code)						หมายเหตุ
						1	2	3	4	5	6	
51	EXT-B-4-02	หน้าลิฟต์ C ชั้น 4	4	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
52	EXT-B-4-03	ห้องเก็บวัสดุชั้น 4	4	10	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	13.75 kg
53	EXT-B-4-04	บันไดหนีไฟ ST3	4	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
54	EXT-B-4-05	เครื่องปรับอากาศชั้น 4	4	10	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	13.14 kg
55	EXT-B-5-01	หน้าลิฟต์ C ชั้น 5	5	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
56	EXT-B-5-02	หน้าห้องเก็บวัสดุชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
57	EXT-B-5-03	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
58	EXT-B-5-04	เครื่องปรับอากาศชั้น 5	5	10	คาร์บอเรน	✓	✓	✓	✓	-	✓	
59	EXT-B-6-01	หน้าลิฟต์ C	6	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
60	EXT-B-6-02	หน้าลิฟต์ B	6	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
61	EXT-B-6-03	หน้าห้องไอทีชั้น 6	6	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
62	EXT-B-6-04	เครื่องปรับอากาศชั้น 6	6	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
63	EXT-B-7-01	หน้าลิฟต์ C	7	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
64	EXT-B-7-02	หน้าลิฟต์ B	7	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
65	EXT-B-7-03	หน้าห้องเก็บวัสดุชั้น 7	7	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
66	EXT-B-7-04	เครื่องดับ ห.7	7	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
67	EXT-B-8-01	หน้าลิฟต์ C	8	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
68	EXT-B-8-02	หน้าลิฟต์ B	8	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
69	EXT-B-8-03	หน้าห้องไอทีชั้น 8	8	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
70	EXT-B-8-04	เครื่องดับ ห.8	8	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
71	EXT-B-9-01	หน้าลิฟต์ C	9	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
72	EXT-B-10-01	หน้าลิฟต์ C	10	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
73	EXT-B-10-02	ตู้แขวนในระบบ ปีที่ผู้ผลิต 10	10	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
74	EXT-B-11-02	ตู้แขวนในระบบ ปีที่ผู้ผลิต 11	11	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
75	EXT-B-11-03	ตู้แขวนในระบบ ปีที่ผู้ผลิต 11	11	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
76	EXT-B-12-01	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
77	EXT-B-12-02	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
78	EXT-B-12-03	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
79	EXT-B-12-04	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
80	EXT-B-12-05	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
81	EXT-B-13-01	ห้องเครื่องลิฟต์ดับเพลิง	13	15	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	11.15 kg
82	EXT-B-13-02	ห้องไฟฟ้าบนดาดฟ้า	13	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
83	EXT-B-13-03	ห้อง Booster Pump	13	15	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	11.16 kg
84	EXT-B-13-04	ห้องเครื่องลิฟต์ 2 ตัว	13	20	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	15.10 kg
85												

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพภายนอก ไม่มีรอยแตกร้าวหรือชำรุดเสีย
2	ตรวจเช็คแรงดันภายในถัง กรณีเป็นชนิด เข็มชี้อยู่ในช่วงสีเขียว หรือ Counterpart กรณีเป็นชนิด เข็มชี้อยู่นอกช่วง Recharge
3	ทำการหมุนถัง หรือพลิกถัง 3-4 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีเป็นการเคลื่อนตัว
4	ตรวจเช็คการชำรุดของหัวฉีดและสายฉีด ต่างๆ
5	กรณีเป็นถัง CO2 ให้ชั่งน้ำหนัก กรณีเป็นชนิด น้ำหนักไม่ลดลงมากกว่า 75 %
	☐ 10 ปอนด์ > 10.00 kg
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมใช้งาน และทำความสะอาดทั่วไป

หมายเหตุ (✓) ปกติ, (X) มีแก้ไข

ผู้ตรวจเช็ค
1. ชัยวัฒน์
2. ศิริวุฒิ 10/7/66

ผู้ตรวจสอบ
ศิริพิชัย
วันที่ 10/7/66

FM-FAC-007 Rev 1 (16/01/2019)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Extinguisher Monthly Checklist
แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน ตุลาคม 66

ลำดับ	รหัสเครื่องมือ	สถานที่	ชั้น	ขนาด (ปอนด์)	ประเภท	PM Program (Code)						หมายเหตุ
						1	2	3	4	5	6	
51	EXT-B-4-02	หน้าลิฟต์ C ชั้น 4	4	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
52	EXT-B-4-03	ห้องเก็บวัสดุชั้น 4	4	10	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	13.65 kg
53	EXT-B-4-04	บันไดหนีไฟ ST3	4	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
54	EXT-B-4-05	เครื่องปรับอากาศชั้น 4	4	10	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	13.80 kg
55	EXT-B-5-01	หน้าลิฟต์ C ชั้น 5	5	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
56	EXT-B-5-02	หน้าห้องเก็บวัสดุชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
57	EXT-B-5-03	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
58	EXT-B-5-04	เครื่องปรับอากาศชั้น 5	5	10	คาร์บอเรน	✓	✓	✓	✓	-	✓	
59	EXT-B-6-01	หน้าลิฟต์ C	6	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
60	EXT-B-6-02	หน้าลิฟต์ B	6	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
61	EXT-B-6-03	หน้าห้องไอทีชั้น 6	6	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
62	EXT-B-6-04	เครื่องปรับอากาศชั้น 6	6	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
63	EXT-B-7-01	หน้าลิฟต์ C	7	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
64	EXT-B-7-02	หน้าลิฟต์ B	7	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
65	EXT-B-7-03	หน้าห้องเก็บวัสดุชั้น 7	7	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
66	EXT-B-7-04	เครื่องดับ ห.7	7	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
67	EXT-B-8-01	หน้าลิฟต์ C	8	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
68	EXT-B-8-02	หน้าลิฟต์ B	8	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
69	EXT-B-8-03	หน้าห้องไอทีชั้น 8	8	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
70	EXT-B-8-04	เครื่องดับ ห.8	8	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
71	EXT-B-9-01	หน้าลิฟต์ C	9	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
72	EXT-B-10-01	หน้าลิฟต์ C	10	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
73	EXT-B-10-02	ตู้แขวนในระบบ ปีที่ผู้ผลิต 10	10	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
74	EXT-B-11-02	ตู้แขวนในระบบ ปีที่ผู้ผลิต 11	11	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
75	EXT-B-11-03	ตู้แขวนในระบบ ปีที่ผู้ผลิต 11	11	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
76	EXT-B-12-01	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
77	EXT-B-12-02	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
78	EXT-B-12-03	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
79	EXT-B-12-04	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
80	EXT-B-12-05	ตู้แขวนในระบบ 12	12	10	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
81	EXT-B-13-01	ห้องเครื่องลิฟต์ดับเพลิง	13	15	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	13.56 kg
82	EXT-B-13-02	ห้องไฟฟ้าบนดาดฟ้า	13	15	เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	
83	EXT-B-13-03	ห้อง Booster Pump	13	15	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	13.5 kg
84	EXT-B-13-04	ห้องเครื่องลิฟต์ 2 ตัว	13	20	CO2	✓	-	✓	✓	✓	✓	13.7 kg

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพภายนอก ไม่มีรอยแตกร้าวหรือชำรุดเสีย
2	ตรวจเช็คแรงดันภายในถัง กรณีเป็นชนิด เข็มชี้อยู่ในช่วงสีเขียว หรือ Counterpart กรณีเป็นชนิด เข็มชี้อยู่นอกช่วง Recharge
3	ทำการหมุนถัง หรือพลิกถัง 3-4 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีเป็นการเคลื่อนตัว
4	ตรวจเช็คการชำรุดของหัวฉีดและสายฉีด ต่างๆ
5	กรณีเป็นถัง CO2 ให้ชั่งน้ำหนัก กรณีเป็นชนิด น้ำหนักไม่ลดลงมากกว่า 75 %
	☐ 10 ปอนด์ > 10.00 kg
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมใช้งาน และทำความสะอาดทั่วไป

หมายเหตุ (✓) ปกติ, (X) มีแก้ไข

ผู้ตรวจเช็ค
1. ชัยวัฒน์
2.
วันที่ 10/10/66

ผู้ตรวจสอบ
ศิริพิชัย
วันที่ 10/10/66

FM-FAC-007 Rev 1 (16/01/2019)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Extinguisher Monthly Checklist

แบบบันทึกการตรวจสอบถังเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

อาคาร ..... B .....

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รหัสเครื่องดับ	ตำแหน่ง	ชั้น	ขนาด (ปอนด์)	ประเภท	PM Program (Code) 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
31	EXT-B-4-02	หน้าลิฟต์ C ชั้น 4	4	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
32	EXT-B-4-03	ห้องเก็บน้ำแข็งชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	..... Kg
33	EXT-B-4-04	บันไดหนีไฟ ST 3	4	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
34	EXT-B-4-05	ตารังผึ้งพยาบาลชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	..... Kg
35	EXT-B-5-01	หน้าลิฟต์ C ชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
36	EXT-B-5-02	หน้าห้องเก็บน้ำแข็งชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
37	EXT-B-5-03	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
38	EXT-B-5-04	ตารังผึ้งพยาบาลชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
39	EXT-B-6-01	หน้าลิฟต์ C	6	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
40	EXT-B-6-02	หน้าลิฟต์ B	6	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
41	EXT-B-6-03	หน้าห้องน้ำชั้น 6	6	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
42	EXT-B-6-04	ตารังผึ้งพยาบาลชั้น 6	6	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
43	EXT-B-7-01	หน้าลิฟต์ C	7	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
44	EXT-B-7-02	หน้าลิฟต์ B	7	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
45	EXT-B-7-03	หน้าห้องน้ำชั้น 7	7	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
46	EXT-B-7-04	ตารังผึ้ง 7	7	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
47	EXT-B-8-01	หน้าลิฟต์ C	8	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
48	EXT-B-8-02	หน้าลิฟต์ B	8	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
49	EXT-B-8-03	หน้าห้องน้ำชั้น 8	8	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
50	EXT-B-8-04	ตารังผึ้ง 8	8	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
51	EXT-B-9-01	หน้าลิฟต์ C	9	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
52	EXT-B-9-04	หน้าลิฟต์ C	10	10	เคมีแห้ง	/	-	/	/	-	/	
53	EXT-B-11-01	ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย 1/1	11	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	13.34 kg เช็นเตอร์
54	EXT-B-11-02	ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย 1/2	11	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
55	EXT-B-11-03	ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย 1/3	11	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
56	EXT-B-12-01	ชั้นเก็บเวชระ 1/4	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
57	EXT-B-12-02	ชั้นเก็บเวชระ 1/5	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
58	EXT-B-12-03	ชั้นเก็บเวชระ 1/6	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
59	EXT-B-12-04	ชั้นเก็บเวชระ 1/7	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
60	EXT-B-13-01	ชั้นเก็บเวชระ 1/8	13	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
61	EXT-B-B-01	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้า	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.31 Kg
62	EXT-B-B-02	ห้องไฟฟ้าแรงต่ำ	13	15	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
63	EXT-B-B-03	ห้อง Diesel Pump	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.53 Kg
64	EXT-B-B-04	ห้องพักพนักงานดับเพลิง	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.53 Kg
65												

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพภายนอก ไม่มีรอยบุบหรือรั่วหรือชำรุด
2	ตรวจเช็คแรงดันภายในถัง (เข็มชี้ในช่วง เขียว) หรือ Overcharged (เข็มไม่ขึ้น เขียว หรือ Undercharged)
3	ทำการกลับถังหรือเขย่าถังอย่างน้อย 3-4 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีไม่จับตัวกันเป็นก้อน
4	ตรวจเช็คการชำรุดของหัวฉีด สายฉีด ต่างๆ
5	กรณีเป็นถัง CO2 ให้ชั่งน้ำหนัก ถ้าน้ำหนักหายไปมากกว่า 10 %
	☐ ≤ 10 ปอนด์ > 10.00 kg
6	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมใช้งาน และทำความสะอาดทั่วไป

สัญลักษณ์ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ..... 10/7/66.

ผู้ตรวจสอบ .....

10/8/61

FM-FAC-001 Rev.1 (15/07/2015)

โรงพยาบาลศรีระยอง
SRI RAYONG HOSPITAL

Fire Extinguisher Monthly Checklist

แบบบันทึกการตรวจสอบถังเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

อาคาร ..... B .....

ประจำเดือน 15-07-66

ลำดับ	รหัสเครื่องดับ	ตำแหน่ง	ชั้น	ขนาด (ปอนด์)	ประเภท	PM Program (Code) 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
31	EXT-B-4-02	หน้าลิฟต์ C ชั้น 4	4	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
32	EXT-B-4-03	ห้องเก็บน้ำแข็งชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	8.52 Kg
33	EXT-B-4-04	บันไดหนีไฟ ST 3	4	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
34	EXT-B-4-05	ตารังผึ้งพยาบาลชั้น 4	4	10	CO2	/	-	/	/	/	/	8.96 Kg
35	EXT-B-5-01	หน้าลิฟต์ C ชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
36	EXT-B-5-02	หน้าห้องเก็บน้ำแข็งชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
37	EXT-B-5-03	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	5	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
38	EXT-B-5-04	ตารังผึ้งพยาบาลชั้น 5	5	10	สายไหลออก	/	/	/	/	-	/	
39	EXT-B-6-01	หน้าลิฟต์ C	6	11	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
40	EXT-B-6-02	หน้าลิฟต์ B	6	11	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
41	EXT-B-6-03	หน้าห้องน้ำชั้น 6	6	11	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
42	EXT-B-6-04	ตารังผึ้งพยาบาลชั้น 6	6	11	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
43	EXT-B-7-01	หน้าลิฟต์ C	7	11	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
44	EXT-B-7-02	หน้าลิฟต์ B	7	15	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
45	EXT-B-7-03	หน้าห้องน้ำชั้น 7	7	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
46	EXT-B-7-04	ตารังผึ้ง 7	7	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
47	EXT-B-8-01	หน้าลิฟต์ C	8	15	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
48	EXT-B-8-02	หน้าลิฟต์ B	8	15	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
49	EXT-B-8-03	หน้าห้องน้ำชั้น 8	8	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
50	EXT-B-8-04	ตารังผึ้ง 8	8	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
51	EXT-B-9-01	หน้าลิฟต์ C	9	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
52	EXT-B-10-01	หน้าลิฟต์ C	10	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
53	EXT-B-11-01	ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย 1/1	11	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
54	EXT-B-11-02	ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย 1/2	11	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
55	EXT-B-11-03	ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย 1/3	11	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
56	EXT-B-12-01	ชั้นเก็บเวชระ 1/4	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
57	EXT-B-12-02	ชั้นเก็บเวชระ 1/5	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
58	EXT-B-12-03	ชั้นเก็บเวชระ 1/6	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
59	EXT-B-12-04	ชั้นเก็บเวชระ 1/7	12	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
60	EXT-B-13-01	ชั้นเก็บเวชระ 1/8	13	10	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
61	EXT-B-B-01	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้า	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.42 Kg
62	EXT-B-B-02	ห้องไฟฟ้าแรงต่ำ	13	15	เคมีแห้ง	/	/	/	/	-	/	
63	EXT-B-B-03	ห้อง Diesel Pump	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.52 Kg
64	EXT-B-B-04	ห้องพักพนักงานดับเพลิง	13	10	CO2	/	-	/	/	/	/	13.54 Kg
65												

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพภายนอก ไม่มีรอยบุบหรือรั่วหรือชำรุด
2	ตรวจเช็คแรงดันภายในถัง (เข็มชี้ในช่วง เขียว) หรือ Overcharged (เข็มไม่ขึ้น เขียว หรือ Undercharged)
3	ทำการกลับถังหรือเขย่าถังอย่างน้อย 3-4 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีไม่จับตัวกันเป็นก้อน
4	ตรวจเช็คการชำรุดของหัวฉีด สายฉีด ต่างๆ
5	กรณีเป็นถัง CO2 ให้ชั่งน้ำหนัก ถ้าน้ำหนักหายไปมากกว่า 10 %
	☐ ≤ 10 ปอนด์ > 10.00 kg
6	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมใช้งาน และทำความสะอาดทั่วไป

สัญลักษณ์ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค .....

ผู้ตรวจสอบ .....

10/9/66

FM-FAC-001 Rev.1 (15/07/2015)

ประทับเวลา	Liquid O2 Tank (ba	Check By
1-07-2566 9:34 น.	1120	Mark
2-07-2566 14:26 น.	1000	Mark
3-07-2566 10:36 น.	1050	Pornsuwan
4-07-2566 8:23 น.	1030	Pornsuwan
5-07-2566 10:12 น.	1010	Pornsuwan
6-07-2566 10:21 น.	970	Pornsuwan
7-07-2566 8:10 น.	950	Pornsuwan
8-07-2566 8:10 น.	900	Pornsuwan
9-07-2566 8:10 น.	850	Pornsuwan
10-07-2566 8:45 น.	1600	Pornsuwan
11-07-2566 9:05 น.	1580	Pornsuwan
12-07-2566 9:45 น.	1560	Pornsuwan
13-07-2566 9:33 น.	1540	Pornsuwan
14-07-2566 9:52 น.	1510	Pornsuwan
15-07-2566 9:52 น.	1480	Pornsuwan
16-07-2566 9:52 น.	1450	Pornsuwan
17-07-2566 8:34 น.	1430	Pornsuwan
18-07-2566 9:00 น.	1400	Pornsuwan
19-07-2566 9:50 น.	1370	Pornsuwan
20-07-2566 9:13 น.	1330	Pornsuwan
21-07-2566 9:42 น.	1290	Pornsuwan
22-07-2566 9:42 น.	1260	Pornsuwan
23-07-2566 9:42 น.	1230	Pornsuwan
24-07-2566 10:34 น.	1210	Pornsuwan
25-07-2566 9:23 น.	1170	Pornsuwan
26-07-2566 9:52 น.	1080	Pornsuwan
27-07-2566 9:31 น.	990	Pornsuwan
28-07-2566 9:31 น.	950	Pornsuwan
29-07-2566 9:31 น.	900	Pornsuwan
30-07-2566 9:31 น.	850	Pornsuwan
31-07-2566 10:13 น.	1600	Pornsuwan
1-08-2566 9:15 น.	1550	Pornsuwan
2-08-2566 9:15 น.	1530	Pornsuwan
3-08-2566 10:42 น.	1490	Pornsuwan
4-08-2566 9:19 น.	1430	Pornsuwan
5-08-2566 9:19 น.	1400	Pornsuwan
6-08-2566 9:19 น.	1380	Pornsuwan
7-08-2566 9:31 น.	1360	Pornsuwan
8-08-2566 9:52 น.	1330	Pornsuwan
9-08-2566 9:15 น.	1290	Pornsuwan
10-08-2566 9:05 น.	1240	Pornsuwan
11-08-2566 10:34 น.	1210	Pornsuwan
12-08-2566 10:34 น.	1180	Pornsuwan
13-08-2566 10:34 น.	1100	Pornsuwan
14-08-2566 10:34 น.	1000	Pornsuwan
15-08-2566 9:01 น.	900	Pornsuwan
16-08-2566 9:38 น.	850	Pornsuwan

17-08-2566 9:57 น.	1600	Pornsuwan
18-08-2566 10:15 น.	1560	Pornsuwan
19-08-2566 10:15 น.	1500	Pornsuwan
20-08-2566 10:15 น.	1450	Pornsuwan
21-08-2566 8:34 น.	1350	Pornsuwan
22-08-2566 9:12 น.	1300	Pornsuwan
23-08-2566 9:01 น.	1240	Pornsuwan
24-08-2566 9:32 น.	1210	Pornsuwan
25-08-2566 9:35 น.	1190	Pornsuwan
26-08-2566 9:35 น.	1100	Pornsuwan
27-08-2566 9:35 น.	1050	Pornsuwan
28-08-2566 9:14 น.	900	Pornsuwan
29-08-2566 9:57 น.	880	Pornsuwan
30-08-2566 16:39 น.	1600	Pornsuwan
31-08-2566 9:22 น.	1570	Pornsuwan
1-09-2566 9:05 น.	1510	Pornsuwan
2-09-2566 9:05 น.	1490	Pornsuwan
3-09-2566 9:05 น.	1450	Pornsuwan
4-09-2566 8:13 น.	1410	Pornsuwan
5-09-2566 9:56 น.	1350	Pornsuwan
6-09-2566 9:39 น.	1300	Pornsuwan
7-09-2566 8:22 น.	1250	Pornsuwan
8-09-2566 10:05 น.	1210	Pornsuwan
9-09-2566 10:05 น.	1100	Pornsuwan
10-09-2566 10:05 น.	1000	Pornsuwan
11-09-2566 13:47 น.	1600	Pornsuwan
12-09-2566 10:21 น.	1550	Pornsuwan
13-09-2566 17:00 น.	1470	Pornsuwan
14-09-2566 17:00 น.	1410	Pornsuwan
15-09-2566 15:55 น.	1350	Pornsuwan
16-09-2566 15:55 น.	1300	Pornsuwan
17-09-2566 15:55 น.	1200	Pornsuwan
18-09-2566 15:09 น.	1150	Pornsuwan
19-09-2566 16:06 น.	1000	Pornsuwan
20-09-2566 16:06 น.	950	Pornsuwan
21-09-2566 8:58 น.	900	Pornsuwan
22-09-2566 8:58 น.	1600	Pornsuwan
23-09-2566 8:58 น.	1550	Pornsuwan
24-09-2566 8:58 น.	1500	Pornsuwan
25-09-2566 11:57 น.	1400	Pornsuwan
26-09-2566 11:57 น.	1350	Pornsuwan
27-09-2566 11:12 น.	1300	Pornsuwan
28-09-2566 11:12 น.	1200	Pornsuwan
29-09-2566 11:12 น.	1100	Pornsuwan
30-09-2566 11:12 น.	1000	Pornsuwan
2-10-2566 14:49 น.	1600	Pornsuwan
3-10-2566 14:49 น.	1500	Suwapach
4-10-2566 14:49 น.	1450	Suwapach

5-10-2566 14:49 น.	1400	Suwapach
6-10-2566 13:37 น.	1350	Suwapach
9-10-2566 16:52 น.	1100	Pornsuwan
10-10-2566 12:05 น.	1050	Pornsuwan
11-10-2566 8:20 น.	1100	Pornsuwan
12-10-2566 9:10 น.	1600	Pornsuwan
16-10-2566 17:12 น.	1350	Pornsuwan
17-10-2566 17:12 น.	1300	Pornsuwan
18-10-2566 17:12 น.	1250	Pornsuwan
19-10-2566 16:20 น.	1200	Pornsuwan
20-10-2566 9:20 น.	1150	Suwapach
24-10-2566 9:01 น.	1000	Pornsuwan
25-10-2566 9:12 น.	950	Pornsuwan
26-10-2566 8:32 น.	950	Pornsuwan
27-10-2566 11:21 น.	1650	Pornsuwan
30-10-2566 15:27 น.	1500	Pornsuwan
31-10-2566 10:23 น.	1500	Pornsuwan
1-11-2566 9:13 น.	1450	Suwapach
2-11-2566 9:02 น.	1450	Pornsuwan
3-11-2566 9:32 น.	1400	Pornsuwan
6-11-2566 13:41 น.	1250	Pornsuwan
7-11-2566 14:41 น.	1200	Suwapach
8-11-2566 14:41 น.	1160	Suwapach
9-11-2566 14:41 น.	1140	Suwapach
10-11-2566 9:39 น.	1100	Pornsuwan
13-11-2566 15:26 น.	1000	Pornsuwan
14-11-2566 13:53 น.	1000	Pornsuwan
15-11-2566 14:26 น.	950	Pornsuwan
16-11-2566 9:41 น.	900	Pornsuwan
17-11-2566 15:16 น.	800	Pornsuwan
20-11-2566 9:40 น.	1600	Suwapach
21-11-2566 9:48 น.	1650	Pornsuwan
22-11-2566 13:42 น.	1600	Pornsuwan
23-11-2566 10:22 น.	1500	Pornsuwan
24-11-2566 9:32 น.	1500	Pornsuwan
27-11-2566 13:22 น.	1300	Pornsuwan
28-11-2566 8:34 น.	1250	Pornsuwan
29-11-2566 9:47 น.	1250	Pornsuwan
30-11-2566 15:41 น.	1200	Pornsuwan
1-12-2566 10:30 น.	1150	Pornsuwan
4-12-2566 14:17 น.	1100	Pornsuwan
6-12-2566 12:05 น.	1000	Pornsuwan
7-12-2566 10:41 น.	1000	Suwapach
8-12-2566 13:36 น.	950	Suwapach
12-12-2566 13:42 น.	1600	Suwapach
13-12-2566 9:57 น.	1600	Suwapach
14-12-2566 10:11 น.	1550	Pornsuwan
15-12-2566 9:25 น.	1500	Pornsuwan

18-12-2566 10:02 น.	1450	Pornsuwan
19-12-2566 9:51 น.	1400	Pornsuwan
20-12-2566 8:13 น.	1350	Suwapach
21-12-2566 8:42 น.	1300	Suwapach
22-12-2566 10:24 น.	1250	Pornsuwan
25-12-2566 10:07 น.	1200	Pornsuwan
26-12-2566 13:49 น.	1100	Pornsuwan
27-12-2566 11:27 น.	1050	Suwapach
28-12-2566 9:05 น.	1000	Suwapach
29-12-2566 9:51 น.	1000	Suwapach

ประทับเวลา	จำนวนท่อพร้อมใช้งาน	Medical Gas : Oxyger	Medical Gas : Oxyger
1-07-2566 9:34 น.	42	2000	1650
2-07-2566 14:26 น.	42	2000	1650
3-07-2566 10:36 น.	42	2000	1650
4-07-2566 8:23 น.	42	2000	1650
5-07-2566 10:12 น.	42	2000	1650
6-07-2566 10:21 น.	42	2000	1650
7-07-2566 10:17 น.	42	2000	1650
8-07-2566 10:17 น.	42	2000	1650
9-07-2566 10:17 น.	42	2000	1650
10-07-2566 8:45 น.	42	2000	1650
11-07-2566 9:05 น.	42	2000	1650
12-07-2566 9:45 น.	42	2000	1650
13-07-2566 9:33 น.	42	2000	1650
14-07-2566 9:52 น.	42	2000	1650
15-07-2566 9:52 น.	42	2000	1650
16-07-2566 9:52 น.	42	2000	1650
17-07-2566 8:34 น.	42	2000	1650
18-07-2566 9:00 น.	42	2000	1650
19-07-2566 9:50 น.	42	2000	1650
20-07-2566 9:13 น.	42	2000	1650
21-07-2566 9:42 น.	42	2000	1650
22-07-2566 9:42 น.	42	2000	1650
23-07-2566 9:42 น.	42	2000	1650
24-07-2566 10:34 น.	42	2000	1650
25-07-2566 9:23 น.	42	2000	1650
26-07-2566 9:52 น.	42	2000	1650
27-07-2566 9:31 น.	42	2000	1650
28-07-2566 9:31 น.	42	2000	1650
29-07-2566 9:31 น.	42	2000	1650
30-07-2566 9:31 น.	42	2000	1650
31-07-2566 10:13 น.	42	2000	1650
1-08-2566 9:15 น.	42	2000	1650
2-08-2566 9:15 น.	42	2000	1650
3-08-2566 10:42 น.	42	2000	1650
4-08-2566 9:19 น.	42	2000	1650
5-08-2566 9:19 น.	42	2000	1650
6-08-2566 9:19 น.	42	2000	1650
7-08-2566 9:31 น.	42	2000	1650
8-08-2566 9:52 น.	42	2000	1650
9-08-2566 9:15 น.	42	2000	1650
10-08-2566 9:05 น.	42	2000	1650
11-08-2566 10:34 น.	42	2000	1650
12-08-2566 10:34 น.	42	2000	1650
13-08-2566 10:34 น.	42	2000	1650
14-08-2566 10:34 น.	42	2000	1650
15-08-2566 9:01 น.	42	2000	1650
16-08-2566 9:38 น.	42	2000	1650

17-08-2566 9:57 น.	42	2000	1650
18-08-2566 10:15 น.	42	2000	1650
19-08-2566 10:15 น.	42	2000	1650
20-08-2566 10:15 น.	42	2000	1650
21-08-2566 8:34 น.	42	2000	1650
22-08-2566 9:12 น.	42	2000	1650
23-08-2566 9:01 น.	42	2000	1650
24-08-2566 9:32 น.	42	2000	1650
25-08-2566 9:35 น.	42	2000	1650
26-08-2566 9:35 น.	42	2000	1650
27-08-2566 9:35 น.	42	2000	1650
28-08-2566 9:14 น.	42	2000	1650
29-08-2566 9:57 น.	42	2000	1650
30-08-2566 16:39 น.	42	2000	1650
31-08-2566 9:22 น.	42	2000	1650
1-09-2566 9:05 น.	42	2000	1650
2-09-2566 9:05 น.	42	2000	1650
3-09-2566 9:05 น.	42	2000	1650
4-09-2566 8:13 น.	42	2000	1650
5-09-2566 9:56 น.	42	2000	1650
6-09-2566 9:39 น.	42	2000	1650
7-09-2566 8:22 น.	42	2000	1650
8-09-2566 10:05 น.	42	2000	1650
9-09-2566 10:05 น.	42	2000	1650
10-09-2566 10:05 น.	42	2000	1650
11-09-2566 13:50 น.	42	2000	1650
12-09-2566 10:18 น.	42	2000	1650
13-09-2566 16:58 น.	42	2000	1650
14-09-2566 16:58 น.	42	2000	1650
15-09-2566 15:53 น.	42	2000	1600
16-09-2566 15:53 น.	42	2000	1600
17-09-2566 15:53 น.	42	2000	1600
18-09-2566 15:08 น.	42	2000	1600
19-09-2566 16:05 น.	42	2000	1600
20-09-2566 16:05 น.	42	2000	1600
21-09-2566 8:56 น.	42	2000	1600
22-09-2566 8:56 น.	42	2000	1600
23-09-2566 8:56 น.	42	2000	1600
24-09-2566 8:56 น.	42	2000	1600
25-09-2566 11:55 น.	42	2000	1600
26-09-2566 11:55 น.	42	2000	1600
27-09-2566 11:10 น.	42	2000	1600
28-09-2566 11:10 น.	42	2000	1600
29-09-2566 11:10 น.	42	2000	1600
30-09-2566 11:10 น.	42	2000	1600
2-10-2566 14:36 น.	42	2000	1600
3-10-2566 14:36 น.	42	2000	1600
4-10-2566 14:36 น.	42	2000	1600

5-10-2566 14:36 น.	42	2000	1600
6-10-2566 14:36 น.	42	2000	1600
9-10-2566 16:51 น.	42	2000	1600
10-10-2566 12:03 น.	42	1950	1300
11-10-2566 8:18 น.	10	1000	0
12-10-2566 9:09 น.	14	0	450
16-10-2566 17:11 น.	42	1900	2050
17-10-2566 17:11 น.	42	1900	2050
18-10-2566 17:11 น.	42	1900	2050
19-10-2566 16:15 น.	42	1850	2050
20-10-2566 16:15 น.	42	1850	2050
24-10-2566 8:59 น.	42	1800	2050
25-10-2566 9:02 น.	42	1800	2050
26-10-2566 8:33 น.	42	1800	2050
27-10-2566 11:10 น.	40	1800	2050
30-10-2566 15:26 น.	40	1800	2050
31-10-2566 10:23 น.	40	1750	2050
1-11-2566 9:13 น.	40	1750	2050
2-11-2566 9:02 น.	40	1750	2050
3-11-2566 9:28 น.	41	1750	2050
6-11-2566 13:40 น.	41	1700	2050
7-11-2566 14:39 น.	41	1700	2000
8-11-2566 14:39 น.	41	1700	2000
9-11-2566 14:39 น.	41	1700	2000
10-11-2566 9:37 น.	41	1700	2050
13-11-2566 15:19 น.	41	1650	2050
14-11-2566 13:52 น.	41	1560	2050
15-11-2566 14:25 น.	41	1650	2050
16-11-2566 9:36 น.	41	1600	2050
17-11-2566 15:14 น.	41	1600	2050
20-11-2566 9:42 น.	41	1500	2000
21-11-2566 9:45 น.	41	1500	2000
22-11-2566 13:40 น.	41	1450	2000
23-11-2566 10:24 น.	42	1450	2000
24-11-2566 9:31 น.	42	1450	2000
27-11-2566 13:20 น.	42	1350	2050
28-11-2566 8:33 น.	42	1300	2050
29-11-2566 9:47 น.	42	1300	2050
30-11-2566 15:40 น.	42	1300	2050
1-12-2566 10:30 น.	42	1300	2050
4-12-2566 14:16 น.	42	1350	2050
6-12-2566 12:03 น.	42	1200	2050
7-12-2566 10:40 น.	42	1200	2050
8-12-2566 13:34 น.	42	1150	2050
12-12-2566 13:32 น.	42	1100	2050
13-12-2566 9:55 น.	42	1100	2050
14-12-2566 10:11 น.	42	1100	2050
15-12-2566 9:03 น.	42	1100	2050

18-12-2566 10:02 น.	42	1100	2050
19-12-2566 9:51 น.	42	1100	2050
20-12-2566 8:13 น.	42	1100	2050
21-12-2566 8:42 น.	42	1100	2050
22-12-2566 9:05 น.	42	1100	2000
25-12-2566 10:07 น.	42	1100	2000
26-12-2566 13:38 น.	42	1100	2000
27-12-2566 11:25 น.	42	1050	2000
28-12-2566 9:05 น.	42	1050	2000
29-12-2566 9:50 น.	42	1100	2000

Out Put Oxygen (PSI)	Oxygen Cylinder (Anc	Oxygen Cylinder (Val	Oxygen Cylinder (Lab
57	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
55	Normal	Normal	Normal
55	Normal	Normal	Normal
55

58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal

58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
55	Normal	Normal	Normal
55	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
57	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal

60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
58	Normal	Normal	Normal
60	Normal	Normal	Normal

Oxygen Cylinder (Ala	Check By	Room Temp
Normal	Mark	28.3
Normal	Mark	29.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	27.8
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29
Normal	Pornsuwan	26.4
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.9
Normal	Pornsuwan	27.3
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	25.8
Normal	Pornsuwan	26.9
Normal	Pornsuwan	27.3
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	27.8
Normal	Pornsuwan	26.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	27.8
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.1

Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29
Normal	Pornsuwan	26.4
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.9
Normal	Pornsuwan	27.3
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	25.8
Normal	Pornsuwan	26.9
Normal	Pornsuwan	27.3
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	27.8
Normal	Pornsuwan	26.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	27.8
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29.2
Normal	Pornsuwan	26.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Suwapach	28.6
Normal	Suwapach	28.5

Normal	Suwapach	28.3
Normal	Suwapach	28.9
Normal	Pornsuwan	27.3
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	25.8
Normal	Pornsuwan	26.9
Normal	Pornsuwan	27.3
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Suwapach	29.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.6
Normal	Pornsuwan	27.8
Normal	Pornsuwan	26.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Suwapach	28.4
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Suwapach	27.8
Normal	Suwapach	27.9
Normal	Suwapach	28.3
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Suwapach	28.4
Normal	Pornsuwan	26.7
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	27.9
Normal	Pornsuwan	29.9
Normal	Pornsuwan	28.2
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Pornsuwan	30.4
Normal	Pornsuwan	30.2
Normal	Pornsuwan	30.4
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Suwapach	29.1
Normal	Suwapach	29.2
Normal	Suwapach	29.6
Normal	Suwapach	28.8
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.9

Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Suwapach	28.6
Normal	Suwapach	27.6
Normal	Pornsuwan	26.8
Normal	Pornsuwan	26.8
Normal	Pornsuwan	26.6
Normal	Suwapach	26.9
Normal	Suwapach	27.5
Normal	Suwapach	27.4

ประทับเวลา	จำนวนท่อพร้อมใช้งาน	Medical Gas : Nitrous	Medical Gas : Nitrous
1-07-2566 9:34 น.	9	950	50
2-07-2566 14:26 น.	9	950	50
3-07-2566 10:36 น.	6	950	1000
4-07-2566 8:23 น.	6	950	1000
5-07-2566 10:12 น.	6	950	1000
6-07-2566 10:21 น.	6	950	1000
7-07-2566 10:18 น.	6	950	1000
10-07-2566 8:45 น.	6	940	1000
11-07-2566 9:05 น.	6	940	1000
12-07-2566 9:45 น.	6	940	1000
13-07-2566 9:33 น.	6	930	1000
14-07-2566 9:52 น.	6	930	1000
17-07-2566 8:34 น.	6	930	1000
18-07-2566 9:00 น.	6	920	1000
19-07-2566 9:50 น.	6	920	1000
20-07-2566 9:13 น.	6	920	1000
21-07-2566 9:42 น.	6	920	1000
24-07-2566 10:34 น.	6	920	1000
25-07-2566 9:23 น.	6	910	1000
26-07-2566 9:52 น.	6	910	1000
27-07-2566 9:31 น.	6	910	1000
31-07-2566 10:13 น.	6	900	1000
2-08-2566 9:15 น.	12	900	1000
3-08-2566 10:42 น.	12	900	1000
4-08-2566 9:19 น.	12	900	1000
7-08-2566 9:31 น.	12	900	1000
8-08-2566 9:52 น.	12	900	1000
9-08-2566 9:15 น.	12	900	1000
10-08-2566 9:05 น.	12	900	1000
11-08-2566 10:34 น.	12	900	1000
15-08-2566 9:01 น.	14	900	1000
16-08-2566 9:38 น.	12	900	1000
17-08-2566 9:57 น.	12	900	1000
18-08-2566 10:15 น.	12	900	1000
21-08-2566 8:34 น.	12	900	1000
22-08-2566 9:12 น.	12	900	1000
23-08-2566 9:01 น.	12	900	1000
24-08-2566 9:32 น.	12	900	1000
25-08-2566 9:35 น.	12	900	1000
28-08-2566 9:14 น.	12	850	1000
29-08-2566 9:57 น.	12	850	1000
30-08-2566 16:39 น.	12	850	1000
31-08-2566 9:22 น.	12	850	1000
1-09-2566 9:05 น.	12	850	1000
4-09-2566 8:13 น.	12	850	1000
5-09-2566 9:56 น.	12	850	1000
6-09-2566 9:39 น.	12	850	1000

7-09-2566 8:22 น.	12	850	1000
8-09-2566 10:05 น.	12	850	1000
11-09-2566 13:53 น.	12	800	1000
12-09-2566 10:19 น.	12	800	1000
13-09-2566 16:59 น.	12	800	1000
14-09-2566 16:59 น.	12	800	1000
15-09-2566 15:54 น.	12	800	1000
18-09-2566 15:08 น.	12	800	1000
19-09-2566 16:05 น.	12	800	1000
20-09-2566 16:05 น.	12	800	1000
21-09-2566 8:57 น.	12	800	950
22-09-2566 8:57 น.	12	800	950
25-09-2566 11:56 น.	12	750	950
26-09-2566 11:52 น.	12	750	950
27-09-2566 11:11 น.	12	750	950
28-09-2566 10:11 น.	12	750	950
29-09-2566 9:13 น.	12	750	950
2-10-2566 14:37 น.	12	750	950
3-10-2566 14:37 น.	12	750	950
4-10-2566 14:37 น.	12	750	950
5-10-2566 14:37 น.	12	700	950
6-10-2566 13:36 น.	12	700	950
9-10-2566 16:51 น.	12	700	950
10-10-2566 12:04 น.	12	300	950
11-10-2566 8:19 น.	12	0	950
12-10-2566 9:10 น.	9	0	950
16-10-2566 10:11 น.	9	0	950
17-10-2566 9:11 น.	9	0	950
18-10-2566 10:47 น.	9	0	950
19-10-2566 13:16 น.	9	0	950
20-10-2566 9:00 น.	9	0	950
24-10-2566 9:00 น.	9	0	950
25-10-2566 9:08 น.	9	0	950
26-10-2566 8:33 น.	9	0	950
27-10-2566 11:10 น.	9	0	950
30-10-2566 15:26 น.	9	0	950
31-10-2566 10:23 น.	9	0	950
1-11-2566 9:13 น.	9	0	950
2-11-2566 9:02 น.	9	0	950
3-11-2566 9:31 น.	9	0	950
6-11-2566 13:41 น.	9	0	950
7-11-2566 14:40 น.	9	0	950
8-11-2566 14:40 น.	9	0	950
9-11-2566 14:40 น.	9	0	950
10-11-2566 9:38 น.	9	0	950
13-11-2566 15:25 น.	9	0	950
14-11-2566 13:53 น.	9	0	950
15-11-2566 14:25 น.	9	0	950

16-11-2566 9:40 น.	9	0	950
17-11-2566 15:15 น.	9	0	950
20-11-2566 9:45 น.	9	0	950
21-11-2566 9:46 น.	9	0	900
22-11-2566 13:41 น.	9	0	900
23-11-2566 10:24 น.	9	0	900
24-11-2566 9:31 น.	9	0	900
27-11-2566 13:21 น.	9	0	950
28-11-2566 8:33 น.	12	0	900
29-11-2566 9:47 น.	12	0	900
30-11-2566 15:40 น.	12	0	900
1-12-2566 10:30 น.	12	0	900
4-12-2566 14:17 น.	12	0	950
6-12-2566 12:04 น.	12	0	900
7-12-2566 10:40 น.	12	0	900
8-12-2566 13:35 น.	12	0	900
12-12-2566 13:33 น.	12	650	390
13-12-2566 9:56 น.	12	650	300
14-12-2566 9:56 น.	12	650	350
15-12-2566 9:05 น.	12	650	350
18-12-2566 10:02 น.	12	650	350
19-12-2566 9:51 น.	12	650	350
20-12-2566 8:13 น.	12	650	350
21-12-2566 8:42 น.	12	650	350
22-12-2566 9:06 น.	12	600	350
25-12-2566 10:07 น.	12	600	50
26-12-2566 13:39 น.	12	600	50
27-12-2566 11:26 น.	12	600	150
28-12-2566 9:05 น.	12	600	150
29-12-2566 9:51 น.	12	600	300

Out Put Nitrous (PSI)	Nitrous Cylinder (Ancl	Nitrous Cylinder (Valv	Nitrous Cylinder (Lab
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal

50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
50	Normal	Normal	Normal
49	Normal	Normal	Normal
55	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56

56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
56	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
52	Normal	Normal	Normal
54	Normal	Normal	Normal
54	Normal	Normal	Normal
54	Normal	Normal	Normal
54	Normal	Normal	Normal

Nitrous Cylinder (Alar	Check By
Normal	Mark
Normal	Mark
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan

Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Suwapach
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan

Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Suwapach
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Pornsuwan
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach
Normal	Suwapach

]

ประทับเวลา	Air Compressed	(8.(	Air panel	(50-60 psi)	ตู้ควบคุมไฟ
1-07-2566 9:34 น.		9		50	Normal
2-07-2566 14:26 น.		9.2		50	Normal
3-07-2566 10:36 น.		9.2		50	Normal
4-07-2566 8:23 น.		9.1		50	Normal
5-07-2566 10:12 น.		9		50	Normal
6-07-2566 10:21 น.		9.2		50	Normal
7-07-2566 10:27 น.		8.7		50	Normal
10-07-2566 8:45 น.		8.8		50	Normal
11-07-2566 9:05 น.		9		50	Normal
12-07-2566 9:45 น.		9.2		50	Normal
13-07-2566 9:33 น.		9.4		50	Normal
14-07-2566 9:52 น.		9		50	Normal
17-07-2566 8:34 น.		9.4		50	Normal
18-07-2566 9:00 น.		8.8		50	Normal
19-07-2566 9:50 น.		9.6		50	Normal
20-07-2566 9:13 น.		9.4		50	Normal
21-07-2566 9:42 น.		9.2		50	Normal
24-07-2566 10:34 น.		9.6		50	Normal
25-07-2566 9:23 น.		9.4		50	Normal
26-07-2566 9:52 น.		9.6		50	Normal
27-07-2566 9:31 น.		9.2		50	Normal
31-07-2566 10:13 น.		8.7		50	Normal
2-08-2566 9:15 น.		8.9		50	Normal
3-08-2566 10:42 น.		9		50	Normal
4-08-2566 9:19 น.		9.1		50	Normal
7-08-2566 9:31 น.		8.9		50	Normal
8-08-2566 9:52 น.		9		50	Normal
9-08-2566 9:15 น.		9.1		50	Normal
10-08-2566 9:05 น.		8.7		50	Normal
11-08-2566 10:34 น.		8.8		50	Normal
15-08-2566 9:01 น.		9		50	Normal
16-08-2566 9:38 น.		9		50	Normal
17-08-2566 9:57 น.		8.8		50	Normal
18-08-2566 10:15 น.		9.2		50	Normal
21-08-2566 8:34 น.		9		50	Normal
22-08-2566 9:12 น.		9.4		50	Normal
23-08-2566 9:01 น.		9.6		50	Normal
24-08-2566 9:32 น.		9.2		50	Normal
25-08-2566 9:35 น.		9.6		50	Normal
28-08-2566 9:14 น.		9		50	Normal
29-08-2566 9:57 น.		9.4		50	Normal
30-08-2566 16:39 น.		9.2		50	Normal
31-08-2566 9:22 น.		9.6		50	Normal
1-09-2566 9:05 น.		9		50	Normal
4-09-2566 8:13 น.		9.2		50	Normal
5-09-2566 9:56 น.		9		50	Normal
6-09-2566 9:39 น.		8.8		50	Normal

7-09-2566 8:22 น.	9.6	50	Normal
8-09-2566 10:05 น.	9.2	50	Normal
11-09-2566 14:09 น.	9.5	50	Normal
12-09-2566 10:12 น.	8.8	50	Normal
13-09-2566 16:57 น.	8.7	50	Normal
14-09-2566 16:57 น.	8.5	50	Normal
15-09-2566 15:51 น.	9.6	50	Normal
18-09-2566 15:05 น.	8.8	50	Normal
19-09-2566 16:02 น.	9	50	Normal
21-09-2566 8:54 น.	9.2	50	Normal
22-09-2566 8:57 น.	9.4	50	Normal
25-09-2566 11:52 น.	9.2	50	Normal
26-09-2566 11:56 น.	9	50	Normal
27-09-2566 11:08 น.	9.6	50	Normal
28-09-2566 10:11 น.	9.2	50	Normal
29-09-2566 9:13 น.	9.4	50	Normal
2-10-2566 15:04 น.	9.2	50	Normal
3-10-2566 15:04 น.	9.2	50	Normal
4-10-2566 15:04 น.	9.2	50	Normal
5-10-2566 15:04 น.	9.2	50	Normal
6-10-2566 13:31 น.	9.2	50	Normal
9-10-2566 16:45 น.	9.6	50	Normal
10-10-2566 12:10 น.	9	50	Normal
11-10-2566 8:15 น.	9.6	50	Normal
12-10-2566 8:57 น.	9	50	Normal
16-10-2566 17:08 น.	9.2	50	Normal
17-10-2566 9:11 น.	9	50	Normal
18-10-2566 10:47 น.	8.6	50	Normal
19-10-2566 16:11 น.	8.8	50	Normal
20-10-2566 10:35 น.	9.4	50	Normal
24-10-2566 8:55 น.	9.6	50	Normal
25-10-2566 8:57 น.	9.6	50	Normal
26-10-2566 8:48 น.	9.5	50	Normal
27-10-2566 11:24 น.	9.6	50	Normal
30-10-2566 15:23 น.	8.8	50	Normal
31-10-2566 10:23 น.	8.6	50	Normal
1-11-2566 9:13 น.	8.8	50	Normal
2-11-2566 9:02 น.	9	50	Normal
3-11-2566 9:35 น.	9.4	50	Normal
6-11-2566 13:33 น.	9.2	50	Normal
7-11-2566 14:45 น.	9.2	50	Normal
8-11-2566 14:45 น.	9.2	50	Normal
9-11-2566 14:45 น.	9.4	50	Normal
10-11-2566 9:34 น.	9.4	50	Normal
13-11-2566 15:17 น.	8.8	50	Normal
14-11-2566 13:49 น.	9.2	50	Normal
15-11-2566 14:53 น.	9.2	50	Normal
16-11-2566 9:32 น.	9.2	50	Normal

17-11-2566 14:53 น.	8.8	50	Normal
20-11-2566 10:29 น.	9.4	50	Normal
21-11-2566 9:43 น.	8.8	50	Normal
22-11-2566 13:45 น.	9	50	Normal
23-11-2566 10:27 น.	9.2	50	Normal
24-11-2566 9:21 น.	9	50	Normal
27-11-2566 13:15 น.	9.4	50	Normal
28-11-2566 8:29 น.	9	50	Normal
29-11-2566 9:47 น.	9.2	50	Normal
30-11-2566 15:36 น.	9.6	50	Normal
1-12-2566 9:26 น.	9.2	50	Normal
4-12-2566 14:13 น.	9	50	Normal
6-12-2566 12:07 น.	9	50	Normal
7-12-2566 10:35 น.	9	50	Normal
8-12-2566 15:15 น.	9	50	Normal
12-12-2566 13:36 น.	9.1	50	Normal
13-12-2566 9:59 น.	9.4	50	Normal
14-12-2566 9:56 น.	9.2	50	Normal
15-12-2566 8:58 น.	9.2	50	Normal
18-12-2566 10:02 น.	9.4	50	Normal
19-12-2566 9:51 น.	9.2	50	Normal
20-12-2566 8:13 น.	9.4	50	Normal
21-12-2566 8:42 น.	9.6	50	Normal
22-12-2566 9:00 น.	9.2	50	Normal
25-12-2566 10:07 น.	9	50	Normal
26-12-2566 13:46 น.	9.4	50	Normal
27-12-2566 11:30 น.	9	50	Normal
28-12-2566 9:05 น.	9.2	50	Normal
29-12-2566 9:47 น.	9.4	50	Normal

Air Pump No.1 ชั่วโม	Air Pump No.1 สายพ	Air Pump No.2 ชั่วโม	Air Pump No.2 สายพ
791.05 N		688.34 N	
791.1 N		688.36 N	
791.25 N		688.38 N	
791.35 N		688.69 N	
791.73 N		688.92 N	
792.32 N		689.39 N	
792.76 N		689.73 N	
793.24 N		690.08 N	
793.72 N		690.43 N	
794.2 N		690.79 N	
794.69 N		691.15 N	
795.12 N		691.56 N	
795.23 N		691.98 N	
795.86 N		692.34 N	
796.03 N		692.78 N	
796.34 N		693.43 N	
796.78 N		693.89 N	
797.26 N		694.12 N	
797.68 N		694.72 N	
798.02 N		695.31 N	
798.54 N		695.87 N	
799.23 N		696.07 N	
799.54 N		696.58 N	
800.57 N		697.32 N	
801.23 N		697.99 N	
802.45 N		698.59 N	
803.64 N		699.23 N	
804.23 N		700.34 N	
805.14 N		701.69 N	
806.65 N		702.85 N	
808.31 N		703.44 N	
808.68 N		703.78 N	
809.09 N		704.15 N	
809.41 N		704.44 N	
809.98 N		705.34 N	
810.98 N		705.88 N	
811.45 N		706.23 N	
811.89 N		706.81 N	
812.21 N		707.52 N	
812.71 N		707.99 N	
813.04 N		708.43 N	
813.58 N		708.59 N	
814.23 N		709.22 N	
814.62 N		709.51 N	
815.01 N		710.01 N	
815.82 N		710.34 N	
816.21 N		710.92 N	

816.95 N	711.5 N
817.12 N	711.94 N
818.37 N	712.87 N
818.68 N	713.13 N
819.15 N	713.58 N
819.54 N	713.89 N
819.87 N	714.28 N
820.97 N	715.33 N
821.35 N	715.68 N
821.96 N	716.29 N
822.46 N	716.8 N
823.47 N	717.73 N
823.86 N	717.96 N
824.2 N	718.43 N
824.56 N	718.96 N
825.56 N	719.46 N
826.12 N	720.23 N
826.3 N	720.34 N
826.46 N	720.42 N
826.87 N	720.51 N
827.5 N	721.66 N
828.8 N	722.79 N
829.1 N	723.08 N
829.44 N	723.37 N
829.8 N	723.74 N
831.46 N	725.32 N
831.86 N	725.99 N
832.28 N	726.12 N
832.65 N	726.46 N
833.54 N	727.64 N
834.53 N	728.2 N
834.98 N	728.6 N
835.27 N	728.9 N
835.69 N	729.29 N
836.99 N	730.49 N
837.29 N	730.82 N
837.63 N	731.24 N
837.94 N	731.53 N
838.42 N	731.82 N
839.68 N	733 N
840.07 N	733.36 N
840.68 N	733.58 N
840.89 N	733.97 N
841.22 N	734.36 N
842.47 N	735.56 N
842.84 N	735.9 N
843.26 N	736.26 N
843.76 N	736.86 N

844.16 N	737.14 N
845.29 N	738.22 N
845.69 N	738.61 N
846.18 N	739.08 N
846.53 N	739.42 N
846.92 N	739.79 N
848.23 N	741.03 N
848.56 N	741.35 N
848.99 N	741.89 N
849.49 N	742.22 N
849.8 N	742.51 N
850.13 N	742.78 N
850.26 N	742.91 N
850.34 N	742.96 N
850.42 N	743.06 N
850.69 N	743.3 N
850.77 N	743.35 N
850.92 N	743.54 N
851.06 N	743.63 N
851.27 N	743.87 N
851.49 N	744.02 N
851.83 N	744.21 N
851.96 N	744.49 N
852.13 N	744.62 N
852.49 N	744.86 N
852.68 N	745.11 N
852.79 N	745.2 N
852.94 N	745.34 N
853.02 N	745.43 N

Air Pump No.3 ชั่วโม	Air Pump No.3 ตรวจส	Air Pump No.4 ชั่วโม	Air Pump No.4 ตรวจส
637.82	N	552.07	N
638.27	N	552.11	N
638.94	N	552.22	N
639.23	N	552.49	N
639.48	N	552.8	N
639.83	N	553.1	N
640.18	N	553.45	N
640.48	N	553.75	N
640.8	N	554.07	N
641.12	N	554.39	N
641.44	N	554.7	N
641.83	N	555.12	N
642.49	N	555.93	N
643.62	N	556.42	N
644.43	N	556.92	N
645.67	N	557.34	N
646.42	N	557.9	N
647.39	N	558.38	N
647.99	N	558.89	N
648.34	N	559.31	N
648.72	N	559.99	N
648.97	N	560.23	N
649.34	N	560.79	N
649.92	N	561.34	N
650.26	N	562.06	N
650.42	N	562.89	N
650.91	N	563.34	N
651.21	N	563.96	N
651.56	N	564.31	N
652.19	N	565.23	N
652.53	N	565.81	N
652.84	N	566.13	N
653.14	N	566.44	N
653.43	N	566.72	N
654.18		567.51	N
654.71	N	568.01	N
655.43		568.63	N
656.04		569.01	N
656.23		569.62	N
656.75	N	569.98	N
656.99	N	570.43	N
657.12	N	570.89	N
657.53	N	571.24	N
657.92	N	571.82	N
658.03	N	572.1	N
658.56	N	572.64	N
659.12	N	572.91	N

659.75 N	573.09 N
660.32 N	573.83 N
660.95 N	574.33 N
661.21 N	574.6 N
661.62 N	574.98 N
661.98 N	575.05 N
662.24 N	575.59 N
663.15 N	576.53 N
663.48 N	576.87 N
664.03 N	577.4 N
664.76 N	577.92 N
665.33 N	578.72 N
665.42 N	578.98 N
665.96 N	579.34 N
666.12 N	579.83 N
666.94 N	580.26 N
667.59 N	580.97 N
667.74 N	581.03 N
667.99 N	581.1 N
668.24 N	581.17 N
668.86 N	582.23 N
669.9 N	583.25 N
670.16 N	583.51 N
670.42 N	583.79 N
670.75 N	584.12 N
672.15 N	585.5 N
672.49 N	585.76 N
672.86 N	586.02 N
673.17 N	586.5 N
673.89 N	587.12 N
674.65 N	587.96 N
674.99 N	588.27 N
675.31 N	588.6 N
675.67 N	588.95 N
676.75 N	590.04 N
676.93 N	590.32 N
677.16 N	590.71 N
677.52 N	590.93 N
677.95 N	591.25 N
679 N	592.29 N
679.34 N	592.65 N
679.63 N	592.86 N
679.89 N	593.1 N
680.23 N	593.51 N
681.29 N	594.55 N
681.59 N	594.89 N
681.93 N	595.22 N
682.12 N	595.52 N

682.69 N	595.98 N
683.68 N	596.95 N
684.03 N	597.29 N
684.42 N	597.71 N
684.72 N	598.01 N
685.07 N	598.34 N
686.15 N	599.45 N
686.43 N	599.73 N
686.86 N	600.12 N
687.22 N	600.53 N
687.48 N	600.76 N
687.7 N	601.02 N
687.84 N	601.13 N
687.88 N	601.2 N
687.95 N	601.22 N
688.2 N	601.5 N
688.24 N	601.57 N
688.53 N	601.72 N
688.47 N	601.8 N
688.67 N	602.06 N
688.89 N	602.21 N
689.01 N	602.45 N
689.21 N	602.53 N
689.34 N	602.66 N
689.49 N	602.81 N
689.78 N	603.12 N
689.87 N	603.21 N
689.98 N	603.28 N
690.07 N	603.39 N

Air Dryer No.1 (Temp	Air Dryer No.2 (Temp)	Check By
38		- Mark
38		- Mark
39		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
37		- Pornsuwan
37		- Pornsuwan
37		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
40		- Pornsuwan
40		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
41		- Pornsuwan
40		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
38		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
40		- Pornsuwan
41		- Pornsuwan
40		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
43		- Pornsuwan
40		- Pornsuwan
37		- Pornsuwan
39		- Pornsuwan
40		- Pornsuwan

39	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
39	-	Pornsuwan
39	-	Pornsuwan
40	-	Pornsuwan
39	-	Pornsuwan
39	-	Pornsuwan
39	-	Pornsuwan
39	-	Pornsuwan
36	-	Pornsuwan
36	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
36	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Suwapach
38	-	Suwapach
38	-	Suwapach
38	-	Suwapach
38	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
36	-	Pornsuwan
39	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Suwapach
37	-	Pornsuwan
37	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Suwapach
38	-	Suwapach
37	-	Suwapach
37	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
38	-	Pornsuwan
-	34	Pornsuwan
-	35	Pornsuwan

-	33	Pornsuwan
-	29	Suwapach
-	30	Pornsuwan
-	31	Pornsuwan
-	31	Pornsuwan
-	31	Pornsuwan
-	33	Pornsuwan
-	30	Pornsuwan
-	31	Pornsuwan
-	32	Pornsuwan
-	33	Pornsuwan
-	31	Pornsuwan
-	32	Pornsuwan
-	31	Suwapach
-	32	Suwapach
-	31	Suwapach
-	31	Suwapach
-	29	Pornsuwan
-	30	Pornsuwan
-	30	Pornsuwan
-	29	Pornsuwan
-	28	Suwapach
-	29	Suwapach
-	27	Pornsuwan
-	28	Pornsuwan
-	29	Pornsuwan
-	29	Suwapach
-	29	Suwapach
-	29	Suwapach

ประทับเวลา	Vacuum System (-0.8	ตู้ควบคุมไฟ Left	ตู้ควบคุมไฟ Right
1-07-2566 9:34 น.	-0.76	Normal	Normal
2-07-2566 14:26 น.	-0.78	Normal	Normal
3-07-2566 10:36 น.	-0.8	Normal	Normal
4-07-2566 8:23 น.	-0.8	Normal	Normal
5-07-2566 10:12 น.	-0.76	Normal	Normal
6-07-2566 10:21 น.	-0.72	Normal	Normal
7-07-2566 10:29 น.	-0.7	Normal	Normal
10-07-2566 8:45 น.	-0.78	Normal	Normal
11-07-2566 9:05 น.	-0.76	Normal	Normal
12-07-2566 9:45 น.	-0.78	Normal	Normal
13-07-2566 9:33 น.	-0.76	Normal	Normal
14-07-2566 9:52 น.	-0.8	Normal	Normal
17-07-2566 8:34 น.	-0.72	Normal	Normal
18-07-2566 9:00 น.	-0.76	Normal	Normal
19-07-2566 9:50 น.	-0.82	Normal	Normal
20-07-2566 9:13 น.	-0.82	Normal	Normal
21-07-2566 9:42 น.	-0.78	Normal	Normal
24-07-2566 10:34 น.	-0.8	Normal	Normal
25-07-2566 9:23 น.	-0.78	Normal	Normal
26-07-2566 9:52 น.	-0.76	Normal	Normal
27-07-2566 9:31 น.	-0.78	Normal	Normal
31-07-2566 10:13 น.	-0.76	Normal	Normal
2-08-2566 9:15 น.	-0.82	Normal	Normal
3-08-2566 10:42 น.	-0.8	Normal	Normal
4-08-2566 9:19 น.	-0.82	Normal	Normal
7-08-2566 9:31 น.	-0.76	Normal	Normal
8-08-2566 9:52 น.	-0.78	Normal	Normal
9-08-2566 9:15 น.	-0.76	Normal	Normal
10-08-2566 9:05 น.	-0.78	Normal	Normal
11-08-2566 10:34 น.	-0.8	Normal	Normal
15-08-2566 9:01 น.	-0.76	Normal	Normal
16-08-2566 9:38 น.	-0.73	Normal	Normal
17-08-2566 9:57 น.	-0.72	Normal	Normal
18-08-2566 10:15 น.	-0.7	Normal	Normal
21-08-2566 8:34 น.	-0.8	Normal	Normal
22-08-2566 9:12 น.	-0.76	Normal	Normal
23-08-2566 9:01 น.	-0.72	Normal	Normal
24-08-2566 9:32 น.	-0.78	Normal	Normal
25-08-2566 9:35 น.	-0.82	Normal	Normal
28-08-2566 9:14 น.	-0.84	Normal	Normal
29-08-2566 9:57 น.	-0.72	Normal	Normal
30-08-2566 16:39 น.	-0.74	Normal	Normal
31-08-2566 9:22 น.	-0.76	Normal	Normal
1-09-2566 9:05 น.	-0.8	Normal	Normal
4-09-2566 8:13 น.	-0.86	Normal	Normal
5-09-2566 9:56 น.	-0.88	Normal	Normal
6-09-2566 9:39 น.	-0.78	Normal	Normal

7-09-2566 8:22 น.	-0.8	Normal	Normal
8-09-2566 10:05 น.	-0.82	Normal	Normal
11-09-2566 14:10 น.	-0.78	Normal	Normal
12-09-2566 10:13 น.	-0.77	Normal	Normal
13-09-2566 16:55 น.	-0.76	Normal	Normal
14-09-2566 16:55 น.	-0.78	Normal	Normal
15-09-2566 15:52 น.	-0.8	Normal	Normal
18-09-2566 15:06 น.	-0.77	Normal	Normal
19-09-2566 16:03 น.	-0.78	Normal	Normal
20-09-2566 16:03 น.	-0.76	Normal	Normal
21-09-2566 8:55 น.	-0.78	Normal	Normal
22-09-2566 8:55 น.	-0.74	Normal	Normal
25-09-2566 11:53 น.	-0.75	Normal	Normal
26-09-2566 11:56 น.	-0.76	Normal	Normal
27-09-2566 11:09 น.	-0.78	Normal	Normal
28-09-2566 10:11 น.	-0.76	Normal	Normal
29-09-2566 9:11 น.	-0.72	Normal	Normal
2-10-2566 15:05 น.	-0.7	Normal	Normal
3-10-2566 15:05 น.	-0.7	Normal	Normal
4-10-2566 15:05 น.	-0.7	Normal	Normal
5-10-2566 15:05 น.	-0.7	Normal	Normal
6-10-2566 13:33 น.	-0.7	Normal	Normal
9-10-2566 16:46 น.	-0.78	Normal	Normal
10-10-2566 12:11 น.	-0.75	Normal	Normal
11-10-2566 8:16 น.	-0.79	Normal	Normal
12-10-2566 8:58 น.	-0.8	Normal	Normal
16-10-2566 17:09 น.	-0.74	Normal	Normal
17-10-2566 9:11 น.	-0.76	Normal	Normal
18-10-2566 10:47 น.	-0.74	Normal	Normal
19-10-2566 16:13 น.	-0.79	Normal	Normal
20-10-2566 10:38 น.	-0.76	Normal	Normal
24-10-2566 8:57 น.	-0.73	Normal	Normal
25-10-2566 8:48 น.	-0.76	Normal	Normal
26-10-2566 8:49 น.	-0.7	Normal	Normal
27-10-2566 11:25 น.	-0.78	Normal	Normal
30-10-2566 15:24 น.	-0.78	Normal	Normal
31-10-2566 10:23 น.	-0.78	Normal	Normal
1-11-2566 9:13 น.	-0.76	Normal	Normal
2-11-2566 9:02 น.	-0.78	Normal	Normal
3-11-2566 9:35 น.	-0.72	Normal	Normal
6-11-2566 13:35 น.	-0.9	Normal	Normal
7-11-2566 14:47 น.	-0.85	Normal	Normal
8-11-2566 14:47 น.	-0.85	Normal	Normal
9-11-2566 14:47 น.	-0.85	Normal	Normal
10-11-2566 9:36 น.	-0.86	Normal	Normal
13-11-2566 15:18 น.	-0.75	Normal	Normal
14-11-2566 13:50 น.	-0.74	Normal	Normal
15-11-2566 14:54 น.	-0.78	Normal	Normal

16-11-2566 9:33 น.	-0.82	Normal	Normal
17-11-2566 15:13 น.	-0.72	Normal	Normal
20-11-2566 10:30 น.	-0.72	Normal	Normal
21-11-2566 9:44 น.	-0.7	Normal	Normal
22-11-2566 13:46 น.	-0.78	Normal	Normal
23-11-2566 10:28 น.	-0.74	Normal	Normal
24-11-2566 9:22 น.	-0.8	Normal	Normal
27-11-2566 13:16 น.	-0.76	Normal	Normal
28-11-2566 8:30 น.	-0.9	Normal	Normal
29-11-2566 9:47 น.	-0.86	Normal	Normal
30-11-2566 15:38 น.	-0.77	Normal	Normal
1-12-2566 9:27 น.	-0.76	Normal	Normal
4-12-2566 14:14 น.	-0.73	Normal	Normal
6-12-2566 12:08 น.	-0.79	Normal	Normal
7-12-2566 10:37 น.	-0.74	Normal	Normal
8-12-2566 15:16 น.	-0.74	Normal	Normal
12-12-2566 13:37 น.	-0.86	Normal	Normal
13-12-2566 10:00 น.	-0.77	Normal	Normal
14-12-2566 9:56 น.	-0.79	Normal	Normal
15-12-2566 8:59 น.	-0.78	Normal	Normal
18-12-2566 10:02 น.	-0.79	Normal	Normal
19-12-2566 9:51 น.	-0.8	Normal	Normal
20-12-2566 8:13 น.	-0.82	Normal	Normal
21-12-2566 8:42 น.	-0.86	Normal	Normal
22-12-2566 9:01 น.	-0.85	Normal	Normal
25-12-2566 10:07 น.	-0.78	Normal	Normal
26-12-2566 13:48 น.	-0.77	Normal	Normal
27-12-2566 11:31 น.	-0.76	Normal	Normal
28-12-2566 9:05 น.	-0.79	Normal	Normal
29-12-2566 9:48 น.	-0.76	Normal	Normal

Vacuum pump No.1 ข้	Vacuum pump No.1 ต	Vacuum pump No.2 ข้	Vacuum pump No.2 ต
358	Normal	354.42	Normal
358.15	Normal	354.57	Normal
358.33	Normal	354.65	Normal
358.42	Normal	354.73	Normal
358.53	Normal	354.84	Normal
358.61	Normal	354.9	Normal
358.68	Normal	354.99	Normal
358.75	Normal	355.07	Normal
358.86	Normal	355.16	Normal
358.94	Normal	355.24	Normal
359.03	Normal	355.33	Normal
359.28	Normal	355.62	Normal
359.67	Normal	355.95	Normal
359.89	Normal	356.1	Normal
360.02	Normal	356.37	Normal
360.27	Normal	356.52	Normal
360.46	Normal	356.82	Normal
360.69	Normal	357.2	Normal
360.86	Normal	357.57	Normal
361.29	Normal	357.8	Normal
361.56	Normal	358.15	Normal
361.99	Normal	358.3	Normal
362.28	Normal	358.52	Normal
362.67	Normal	358.75	Normal
362.76	Normal	359.08	Normal
363.12	Normal	359.39	Normal
363.31	Normal	359.64	Normal
363.86	Normal	360.05	Normal
364.25	Normal	360.2	Normal
364.84	Normal	360.69	Normal
365.42	Normal	361.28	Normal
365.55	Normal	361.69	Normal
365.69	Normal	361.96	Normal
365.8	Normal	362.07	Normal
365.9	Normal	362.1	Normal
366.38	Normal	362.22	Normal
366.56	Normal	362.42	Normal
366.74	Normal	362.67	Normal
366.92	Normal	363.28	Normal
367.5	Normal	363.75	Normal
367.62	Normal	363.94	Normal
367.98	Normal	364.08	Normal
368.25	Normal	364.24	Normal
368.43	Normal	364.4	Normal
368.61	Normal	364.62	Normal
368.82	Normal	364.88	Normal
369.02	Normal	365.12	Normal

369.24 Normal	365.49 Normal
369.48 Normal	365.68 Normal
370.14 Normal	366.39 Normal
370.29 Normal	366.53 Normal
370.47 Normal	366.71 Normal
370.26 Normal	366.96 Normal
370.81 Normal	367.05 Normal
371.28 Normal	367.52 Normal
371.43 Normal	367.66 Normal
371.59 Normal	367.74 Normal
371.72 Normal	367.96 Normal
371.99 Normal	368.41 Normal
372.65 Normal	368.88 Normal
372.93 Normal	369.02 Normal
373.04 Normal	369.26 Normal
373.29 Normal	369.64 Normal
373.92 Normal	370.05 Normal
374.03 Normal	370.26 Normal
374.12 Normal	370.47 Normal
374.33 Normal	370.68 Normal
374.57 Normal	370.82 Normal
374.77 Normal	371 Normal
375.06 Normal	371.28 Normal
375.12 Normal	371.34 Normal
375.22 Normal	371.44 Normal
375.34 Normal	371.56 Normal
375.97 Normal	372.19 Normal
376.12 Normal	372.29 Normal
376.21 Normal	372.42 Normal
376.38 Normal	372.6 Normal
376.95 Normal	372.94 Normal
377.35 Normal	373.55 Normal
377.43 Normal	373.64 Normal
377.55 Normal	373.75 Normal
377.65 Normal	373.85 Normal
378.01 Normal	374.2 Normal
378.09 Normal	374.25 Normal
378.14 Normal	374.29 Normal
378.18 Normal	378.34 Normal
378.21 Normal	374.4 Normal
378.64 Normal	374.83 Normal
378.69 Normal	374.89 Normal
378.75 Normal	374.92 Normal
378.82 Normal	375.01 Normal
378.92 Normal	375.11 Normal
379.31 Normal	375.5 Normal
379.36 Normal	375.55 Normal
379.53 Normal	375.76 Normal

379.62	Normal
379.74	Normal
380.13	Normal
380.29	Normal
380.39	Normal
380.45	Normal
380.57	Normal
380.94	Normal
381.03	Normal
381.24	Normal
381.37	Normal
381.45	Normal
381.83	Normal
382.19	Normal
382.27	Normal
382.43	Normal
382.76	Normal
382.93	Normal
383.01	Normal
383.18	Normal
383.28	Normal
383.45	Normal
383.67	Normal
383.98	Normal
384.26	Normal
384.43	Normal
384.88	Normal
385	Normal
385.08	Normal
385.17	Normal
375.88	Normal
375.96	Normal
376.35	Normal
376.5	Normal
376.61	Normal
376.67	Normal
376.79	Normal
377.15	Normal
377.24	Normal
377.38	Normal
377.58	Normal
377.66	Normal
378.04	Normal
378.4	Normal
378.48	Normal
378.63	Normal
378.97	Normal
379.14	Normal
379.27	Normal
379.38	Normal
379.64	Normal
379.89	Normal
380.03	Normal
380.21	Normal
380.46	Normal
380.86	Normal
381.07	Normal
381.19	Normal
381.25	Normal
381.36	Normal

Vacuum Pump (Pipin	Vacuum Pump (Valve	Vacuum Pump (Instu	Vacuum Pump (Oil)
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal

Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal

Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal
Normal	Normal	Normal	Normal

Vacuum Pump (Filter)	Check By	Room Temp
Normal	Mark	28.3
Normal	Mark	29.8
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	29.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	29.7
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	29.2
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	29.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	29.7
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	29.2
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.4

Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	29.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	29.7
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Suwapach	28.4
Normal	Suwapach	29.2
Normal	Suwapach	29.1
Normal	Suwapach	28.3
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	28.5
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	29.5
Normal	Pornsuwan	28.9
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.4
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Suwapach	29.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Pornsuwan	29.1
Normal	Suwapach	28.4
Normal	Suwapach	28.5
Normal	Suwapach	29.7
Normal	Pornsuwan	29.6
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	29.4
Normal	Pornsuwan	28.4

Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Pornsuwan	28.7
Normal	Suwapach	28.9
Normal	Pornsuwan	28.3
Normal	Pornsuwan	30.7
Normal	Pornsuwan	29.9
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	31.3
Normal	Pornsuwan	29.3
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	32.2
Normal	Pornsuwan	31.1
Normal	Pornsuwan	31.4
Normal	Pornsuwan	31.2
Normal	Suwapach	30.7
Normal	Suwapach	31.3
Normal	Suwapach	31.3
Normal	Suwapach	30.2
Normal	Pornsuwan	30.1
Normal	Pornsuwan	30
Normal	Pornsuwan	29.8
Normal	Pornsuwan	29.9
Normal	Suwapach	30.2
Normal	Suwapach	28.4
Normal	Pornsuwan	27.5
Normal	Pornsuwan	28.2
Normal	Pornsuwan	28.1
Normal	Suwapach	28.6
Normal	Suwapach	28.6
Normal	Suwapach	28.5

NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580


SERVICE REPORT

รายงานการซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ

Customer Name : โรงพยาบาลศรีระยอง

Service Date : 15/11/2023

Attention : คุณ พรสุวรรณ

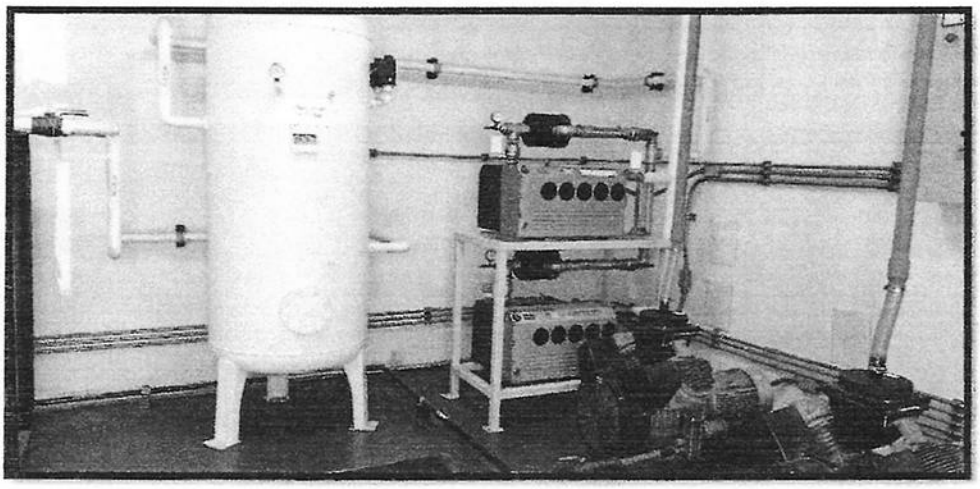


ตรวจสอบโดย ธีระเดช บริสุทธิ์


QC


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Air compressor No.1	**Brand**	Atlas Copco
Model	LF10-10UV PP 400/3/	**Series No.**	ITR0778995


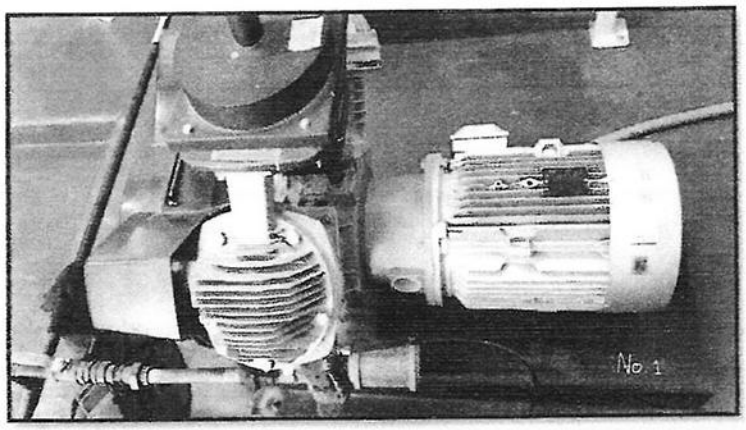


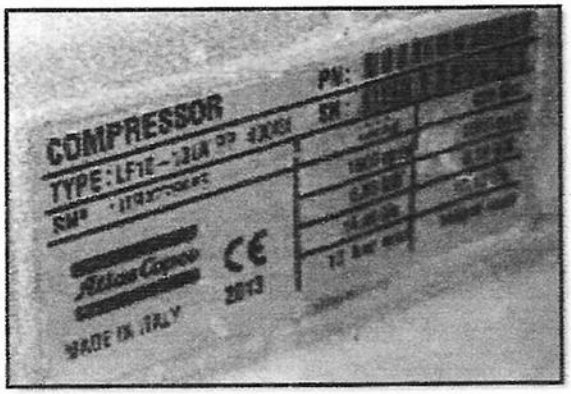



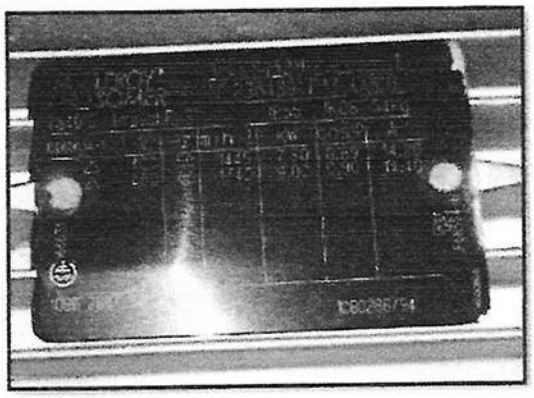


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

การวัดค่ากระแสไฟ

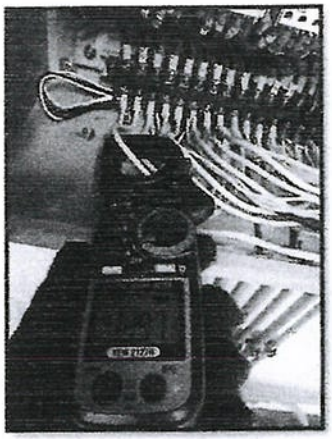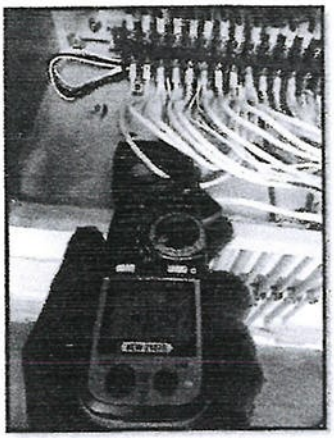Motor 7.50 KW (Current 7.50 Amp. @ 100% VAC = ...13.59 / 13.97 / 14.09...)

Celsius T(°C) 71°C /38°C /41°C

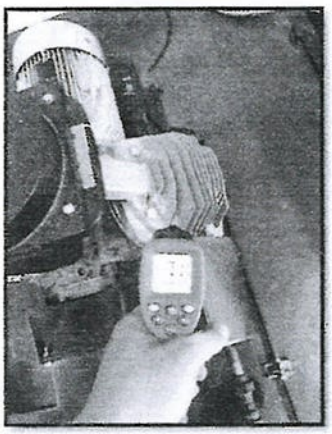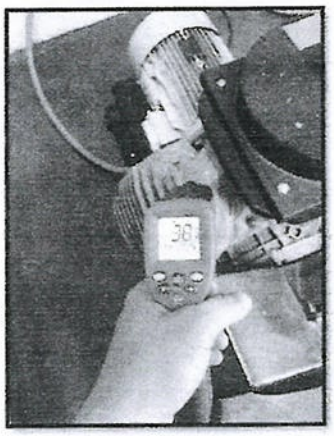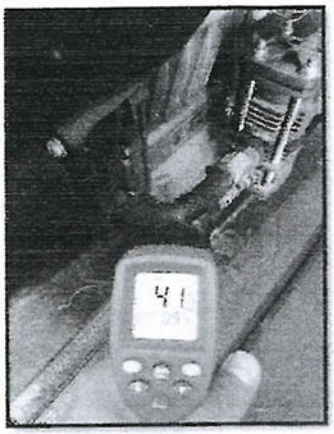No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ


สรุปผลตรวจเช็ค


สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, Motor ตรวจเช็คกระแสไฟ ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ, ไม่พบการรั่วซึม


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Air compressor No.2	**Brand**	Atlas Copco
Model	LF10-10UV PP 400/3/	**Series No.**	ITR0778996


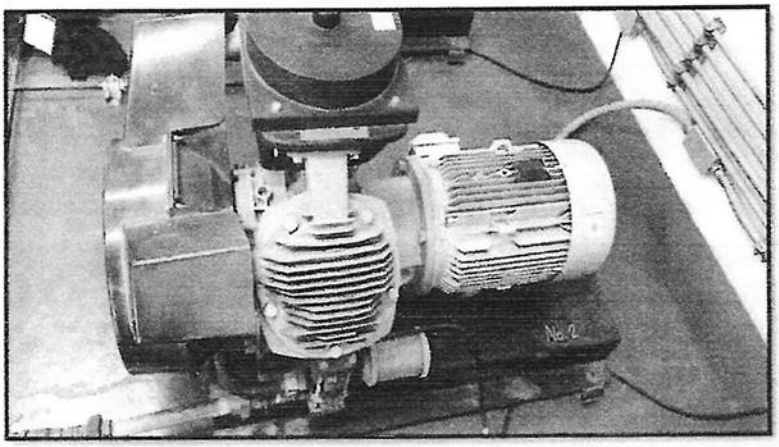


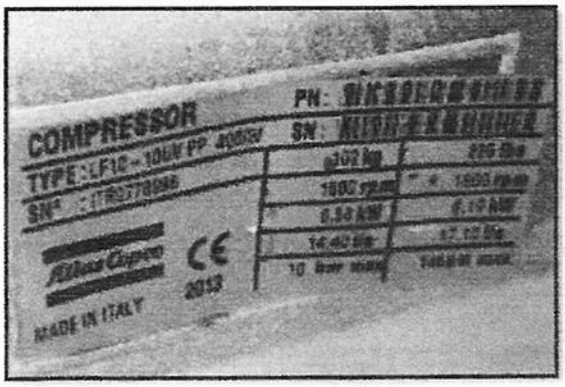

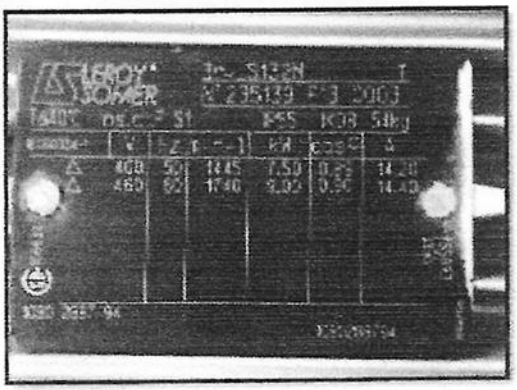


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580


การวัดค่ากระแสไฟ

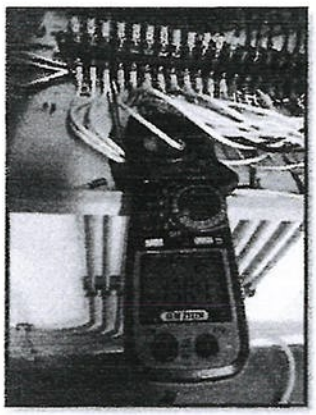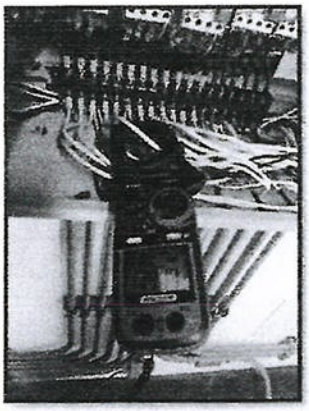
Motor 7.50 KW (Current 14.20 Amp. @ 100% VAC = ...13.84 / 14.17 / 14.24...)



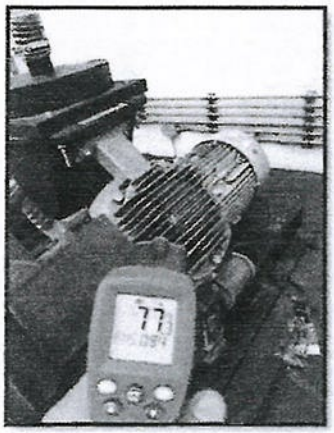

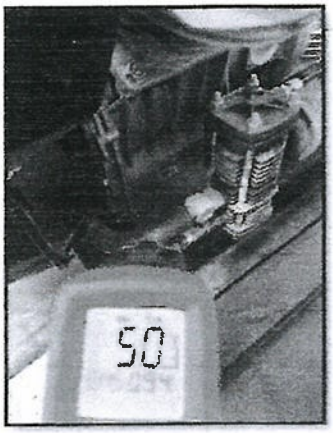

Celsius T(°C) 77°C /35°C /50°C

No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ


สรุปผลตรวจเช็ค


สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, Motor ตรวจเช็คกระแสไฟ ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ, ไม่พบการรั่วซึม


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Air compressor No.3	**Brand**	Atlas Copco
Model	LF10-10UV PP 400/3/	**Series No.**	ITR0778997

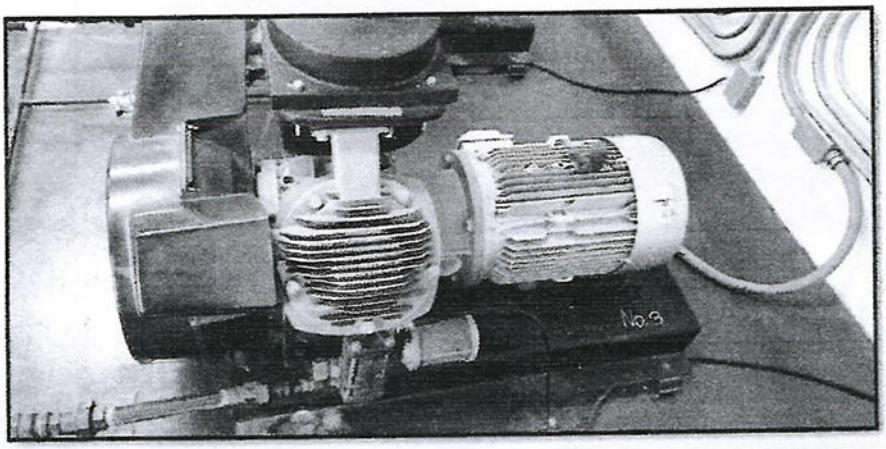

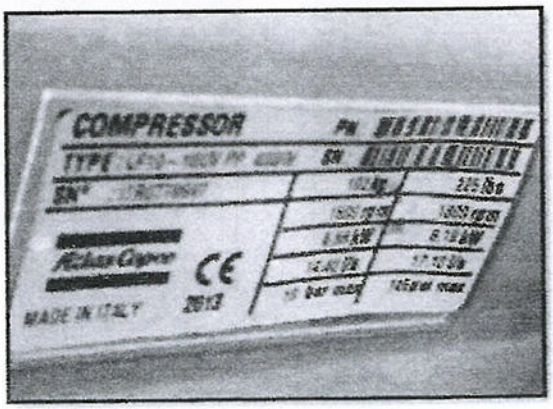

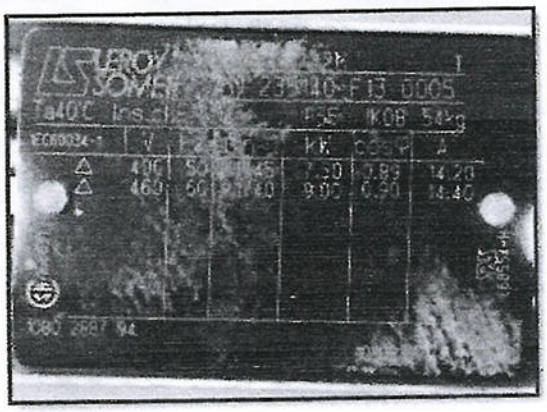


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

การวัดค่ากระแสไฟ





Motor 7.50 KW (Current 14.20 Amp. @ 100% VAC = ...13.88 / 13.55 / 14.14...)

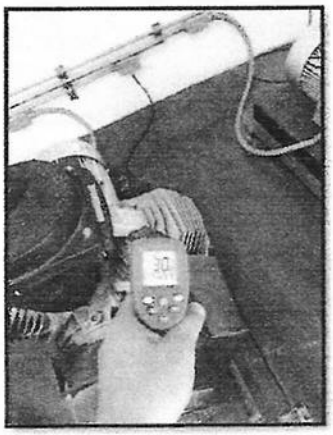
Celsius T(°C) 66°C /30°C /45°C

No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ


สรุปผลตรวจเช็ค


สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, Motor ตรวจเช็คกระแสไฟ ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ, ไม่พบการรั่วซึม


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Air compressor No.4	**Brand**	Atlas Copco
Model	LF10-10UV PP 400/3/	**Series No.**	ITR0778998

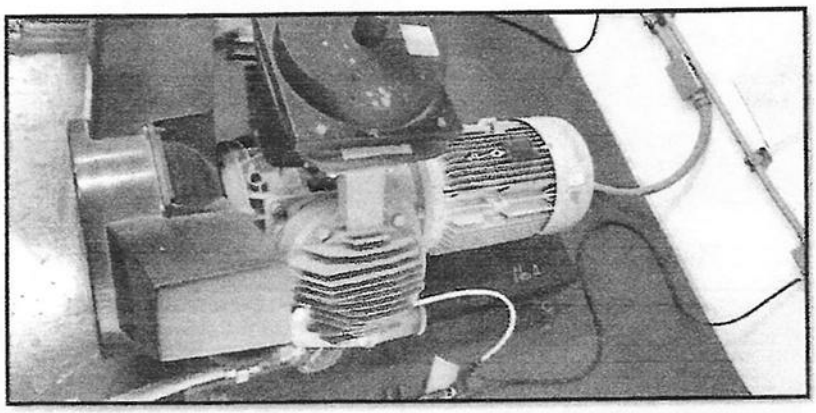

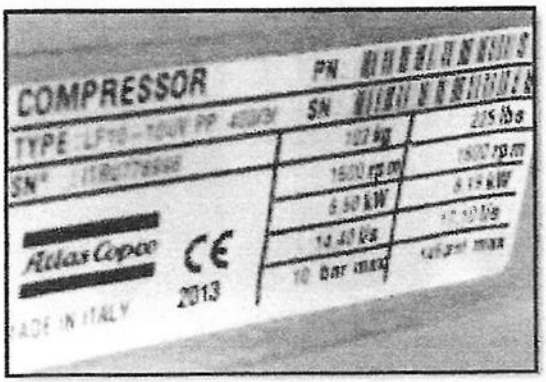

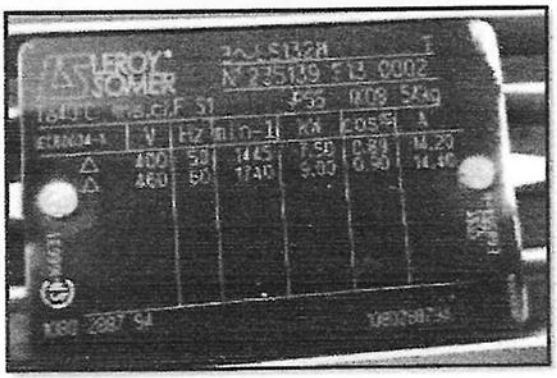



NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

การวัดค่ากระแสไฟ





Motor 7.50 KW (Current 14.20 Amp. @ 100% VAC = ...14.23/ 14.29 / 14.05...)

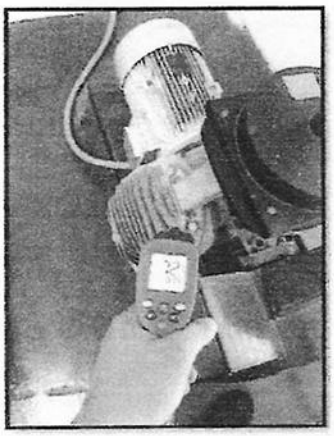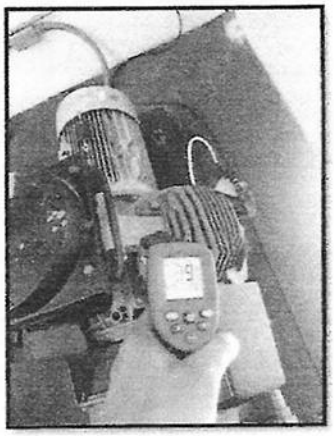
Celsius T(°C) 72°C /39°C /43°C

No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ


สรุปผลตรวจเช็ค

สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, Motor ตรวจเช็คกระแสไฟ ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ, ไม่พบการรั่วซึม


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Aftercooler No.1	**Brand**	Atlas Copco
Model	TD 50	**Series No.**	ARA 311 214



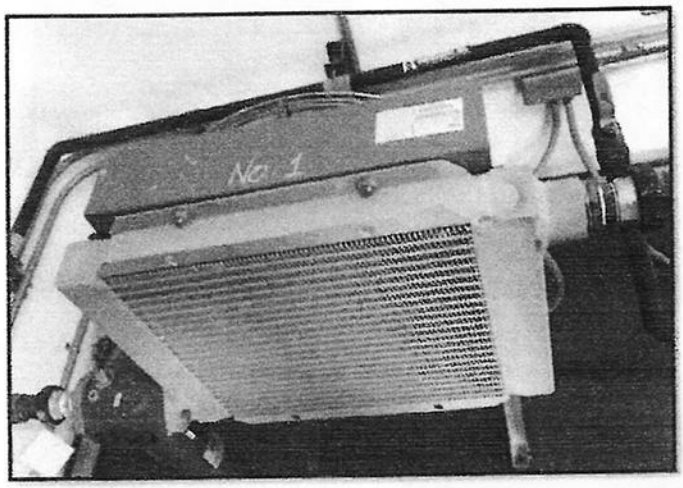






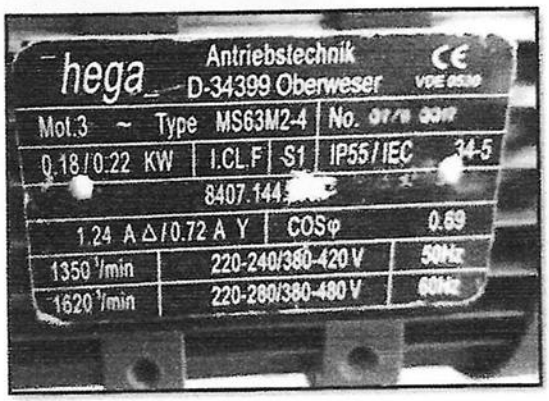


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

การวัดค่ากระแสไฟ

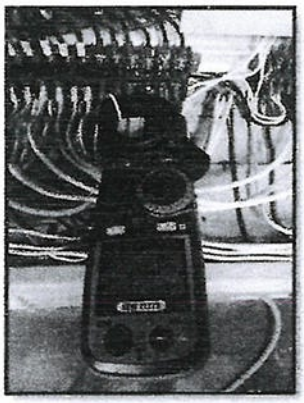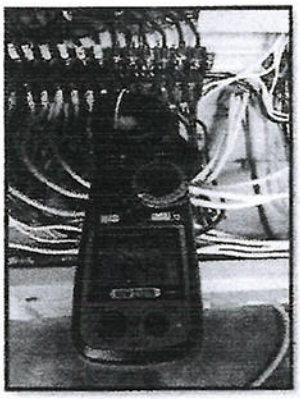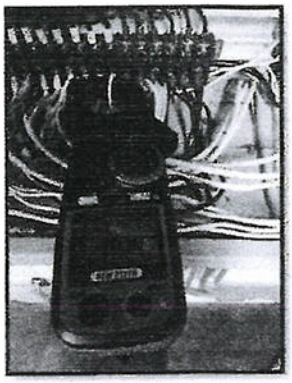Motor 7.50 KW (Current 7.50 Amp. @ 100% VAC = ...0.45 / 0.47 / 0.45...)

No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ

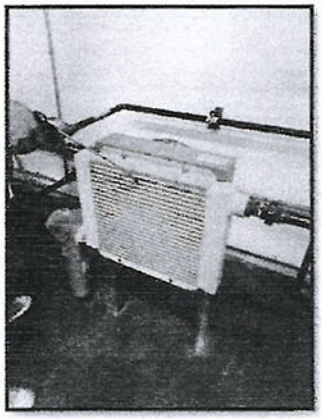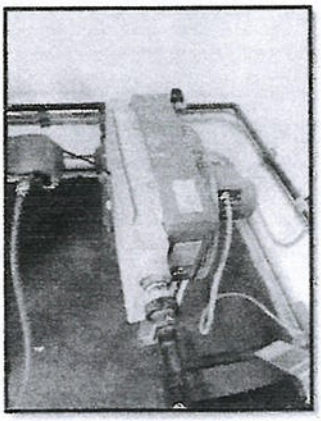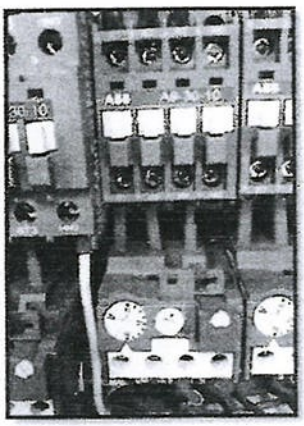
สรุปผลตรวจเช็ค


สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, Motor ตรวจเช็คกระแสไฟ ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ, ไม่พบการรั่วซึม

NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Aftercooler No.2	**Brand**	Atlas Copco
Model	TD 50	**Series No.**	ARA 311 213

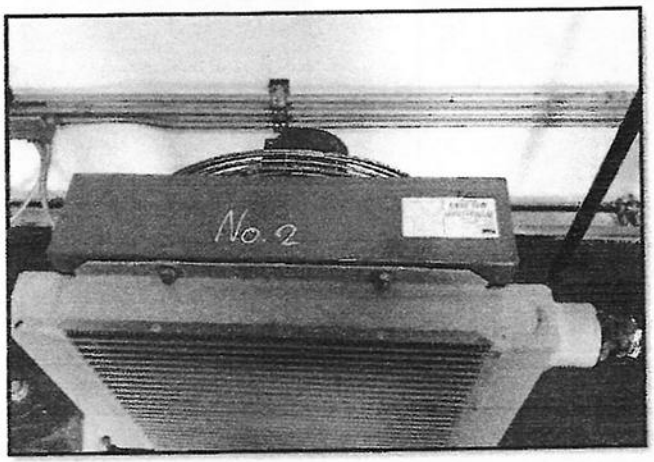


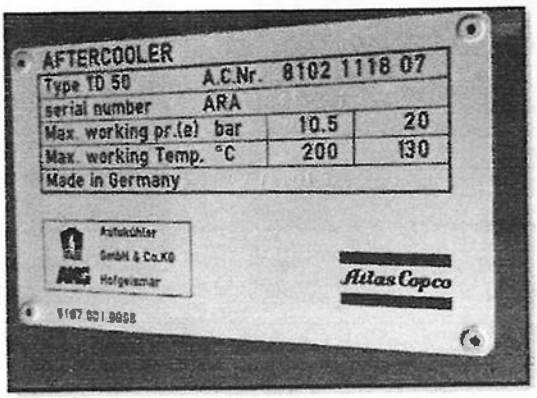






NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580


การวัดค่ากระแสไฟ

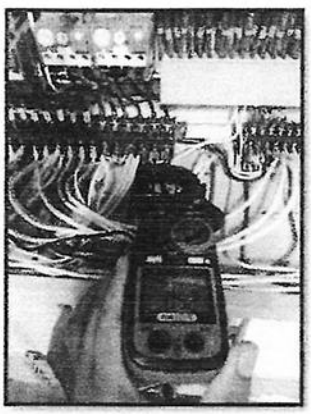

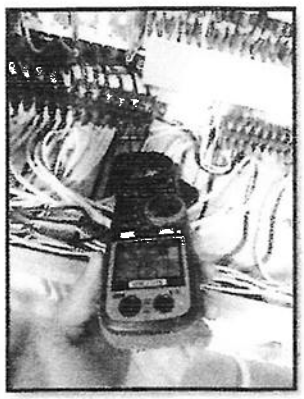

Motor 7.50 KW (Current 7.50 Amp. @ 100% VAC = ...0.52 / 0.52 / 0.53...)

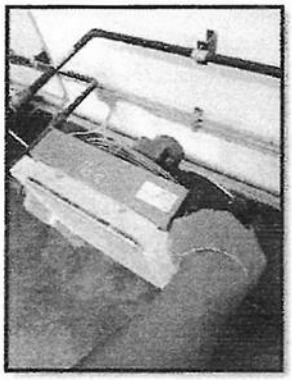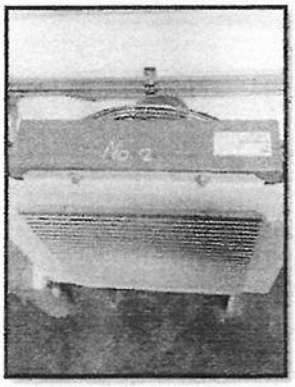

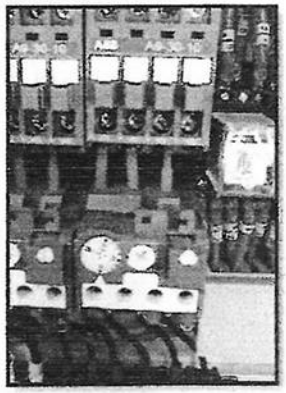No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ


สรุปผลตรวจเช็ค

สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, Motor ตรวจเช็คกระแสไฟ ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ,ไม่พบการรั่วซึม


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580


ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม


Type	Air Dryer No.1	**Brand**	Atlas Copco
Model	FD 60	**Series No.**	CAQ652281

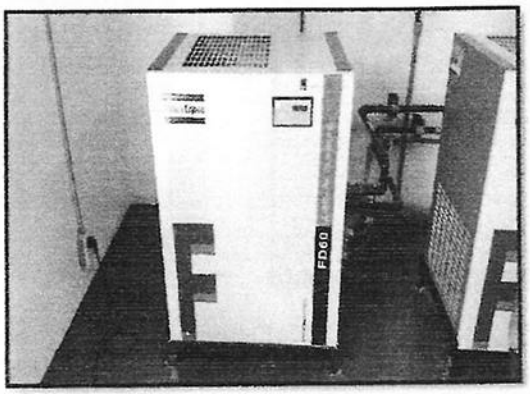



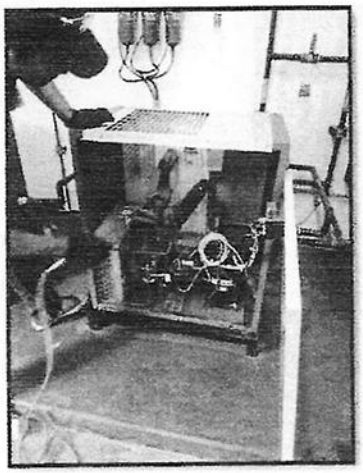

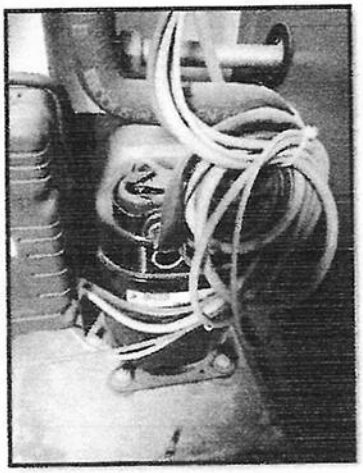

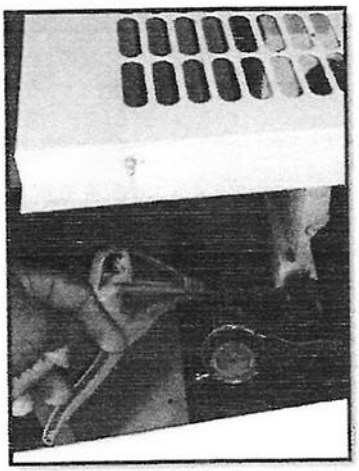

No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ


สรุปผลตรวจเช็ค

สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ,ไม่พบการรั่วซึม


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580


ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม


Type	Air Dryer No.2	**Brand**	Atlas Copco
Model	FD 60	**Series No.**	CAQ652280

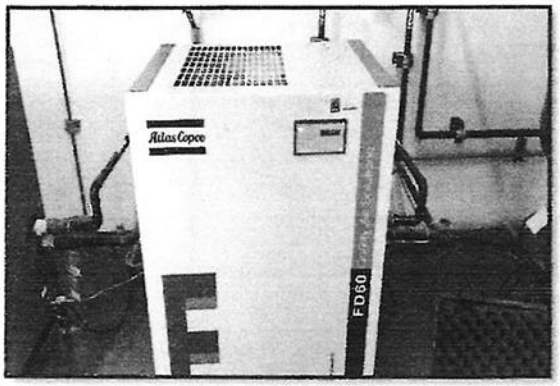



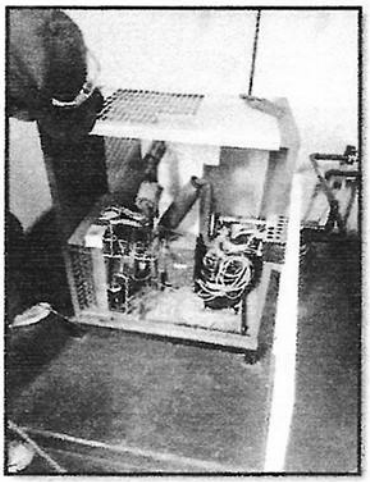

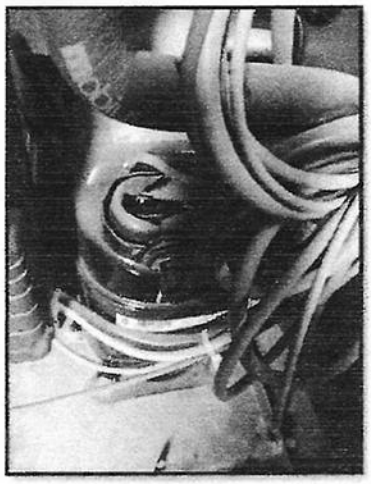

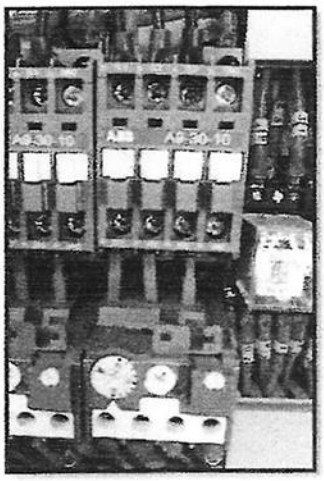

No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	ปกติ


สรุปผลตรวจเช็ค


สภาพปั๊มโดยรวม ปกติ, เสียงปั๊ม ปกติ, ไม่พบการรั่วซึม


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Rotary Vane Vacuum Pump No.1	**Brand**	Gardner
Model	V-VC 303	**Series No.**	SC10131250004


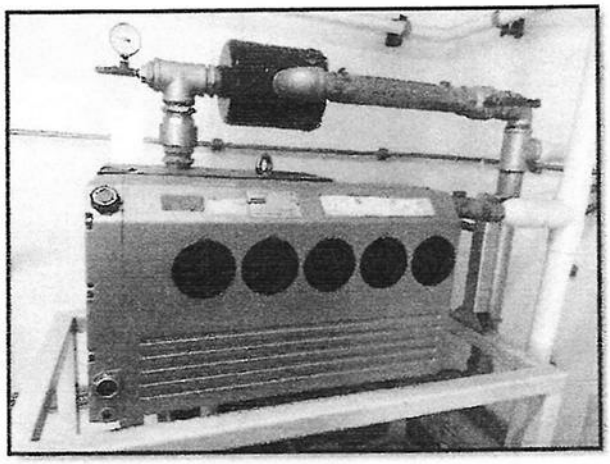


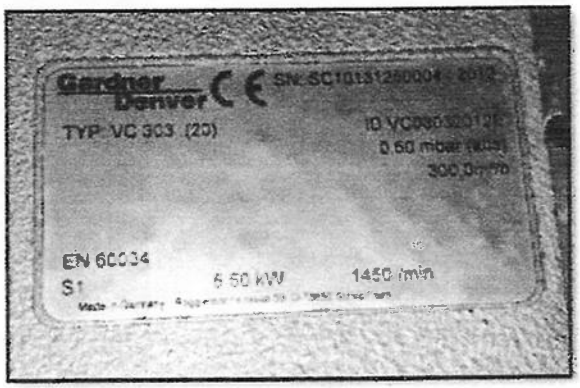

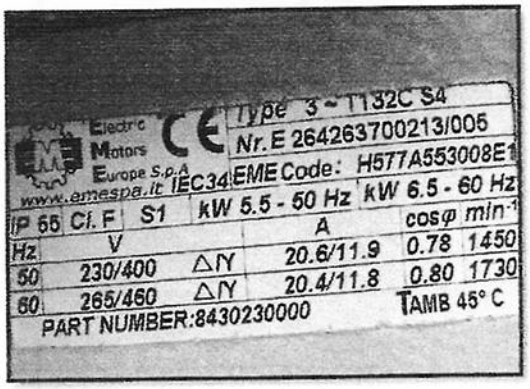


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

การวัดค่ากระแสไฟ

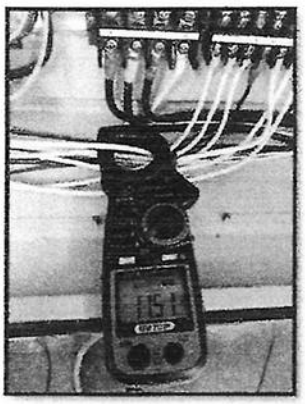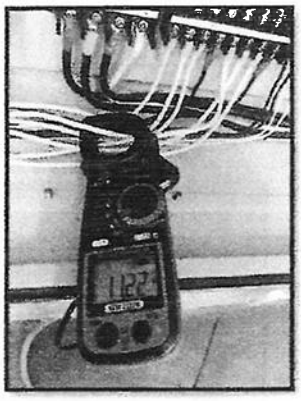
Motor 5.5 KW (Current 11.9 Amp. @ 100% VAC = ...11.51 / 11.22 / 11.33...)

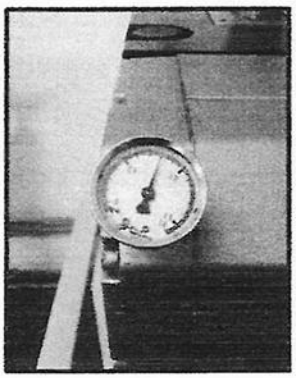

⊙ การวัดค่า Pressure=14.7 mbar ⊙ ⊙ การวัดค่า Exhaust Filter= 0.80 bar ⊙ ⊙ การวัดค่า Vibration 7.6/5.8 mm./s ⊙

No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	เสียงดัง


สรุปผลตรวจเช็ค


Motor ตรวจเช็คกระแสไฟยังอยู่ในค่ามาตรฐาน ,ค่า Exhaust Filter เกินมาตรฐาน, ปั๊มเสียงดัง, ไม่พบการรั่วซึม แนะนำควรส่ง Overhaul.


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

ข้อมูลทั่วไปของปั๊ม

Type	Rotary Vane Vacuum Pump No.2	**Brand**	Gardner
Model	V-VC 303	**Series No.**	SC10167624001



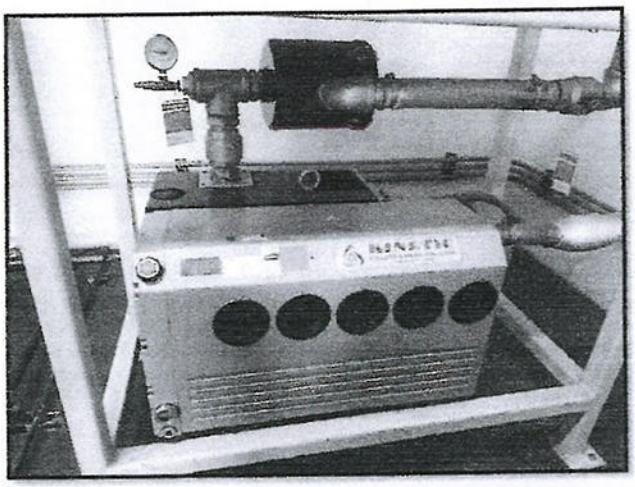


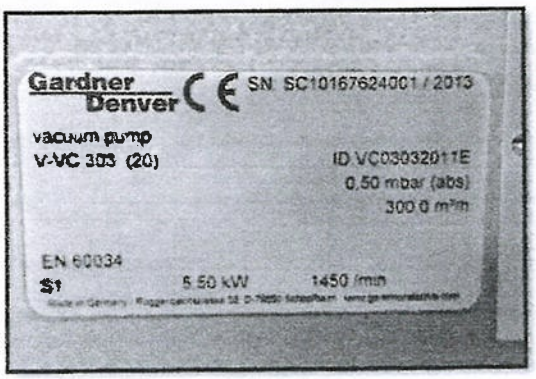


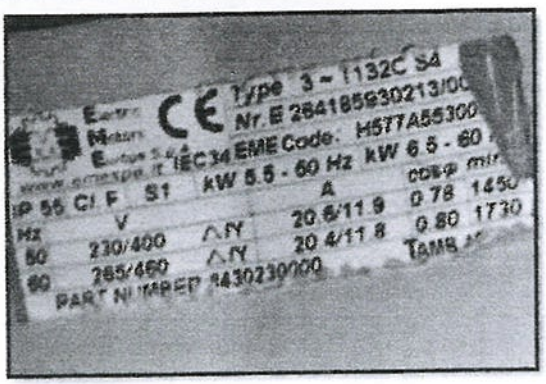


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

การวัดค่ากระแสไฟ

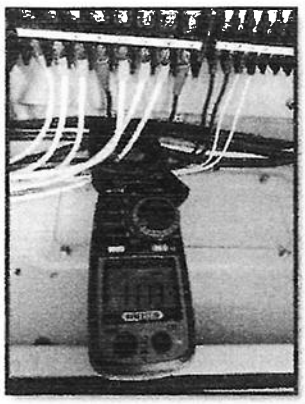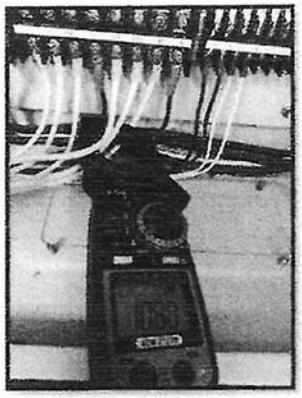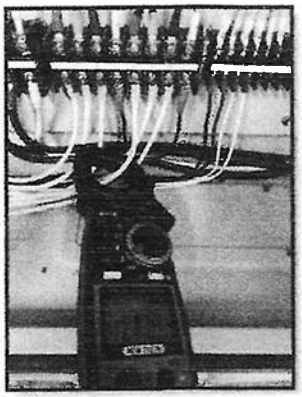Motor 5.5 KW (Current 11.9 Amp. @ 100% VAC = ...11.13 / 10.80 / 11.19...)

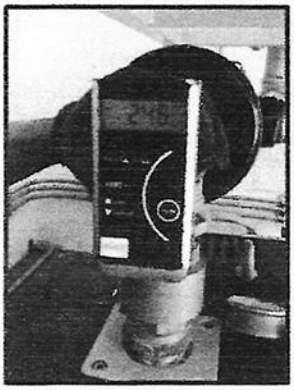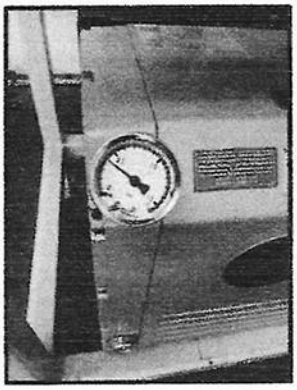

⊙ การวัดค่า Pressure =24.6 mbar ⊙ ⊙ การวัดค่า Exhaust Filter=0.40 bar ⊙ ⊙ การวัดค่า Vibration 0.8/1.5 mm./s ⊙


No.	รายการตรวจสอบ	หน่วยวัด/วิธีการวัด	ค่าอ้างอิง	ค่าที่ได้
1.	ความสะอาด	สายตา	สะอาด	สะอาด
2.	ตรวจสอบการรั่วซึม	สายตา	ไม่มี	ไม่มี
3.	ตรวจสอบ Motor	การทำงาน	ปกติ	ปกติ
4.	ความผิดปกติของเสียงปั๊ม	ฟังเสียง	ปกติ	เสียงดัง


สรุปผลตรวจเช็ค


Motor ตรวจเช็คกระแสไฟยังอยู่ในค่ามาตรฐาน, ค่า Exhaust Filter ยังอยู่ในค่ามาตรฐาน, ไม่พบการรั่วซึม.


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

Checking Main Line Filter






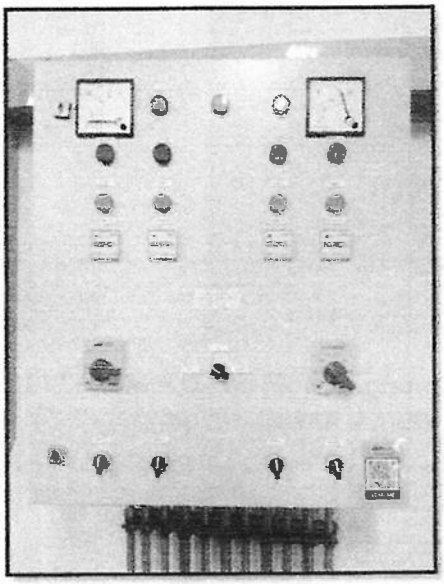


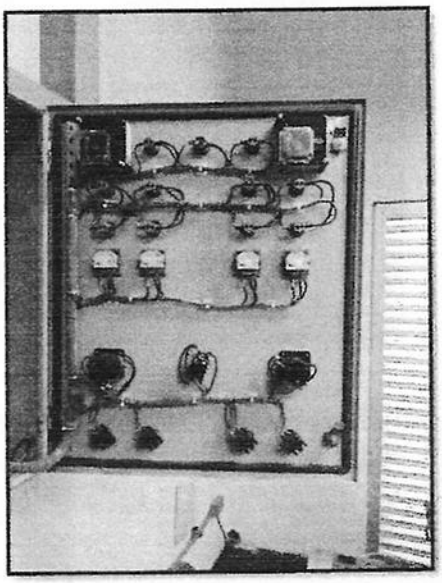

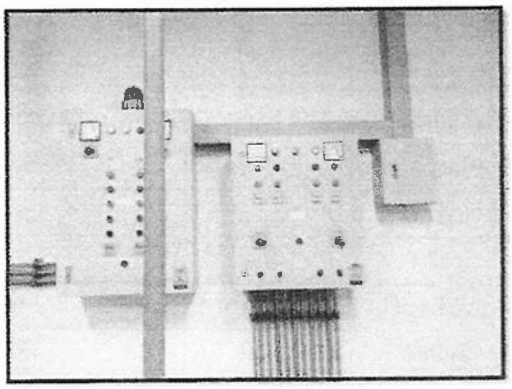


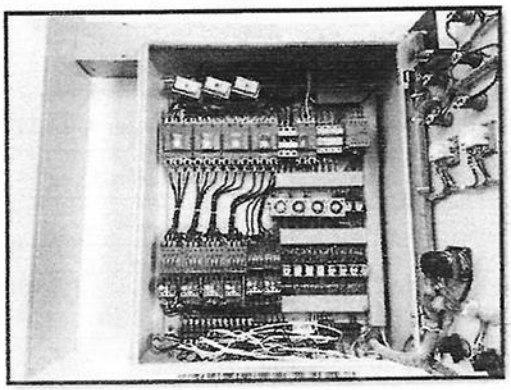


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

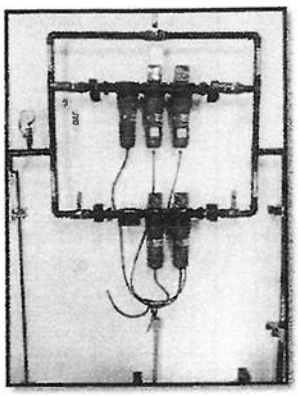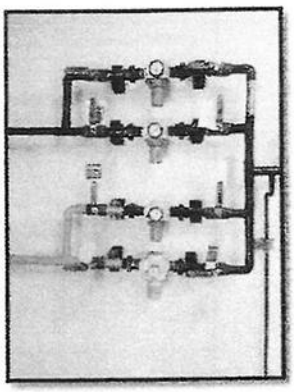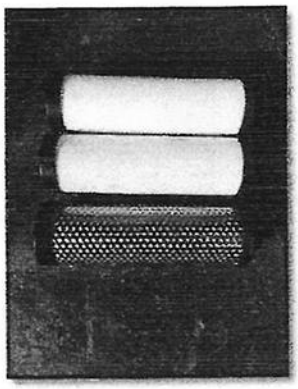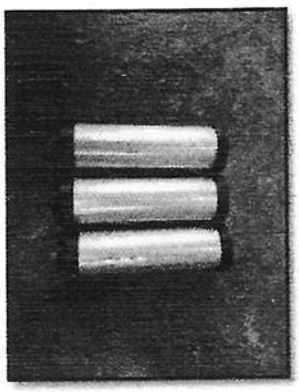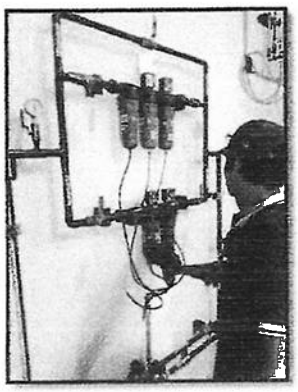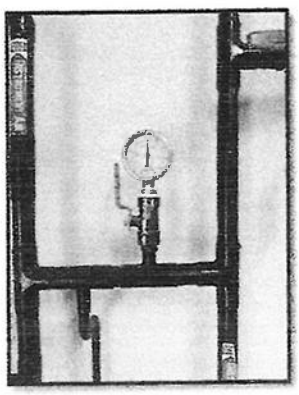




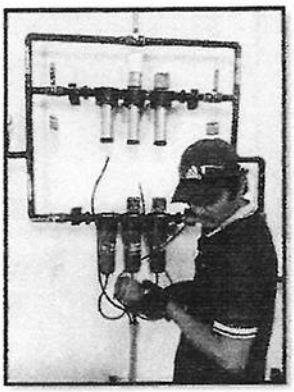


NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

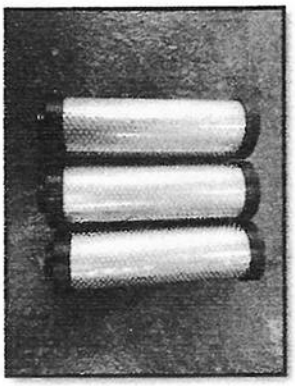


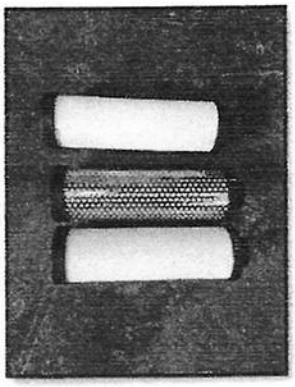









NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

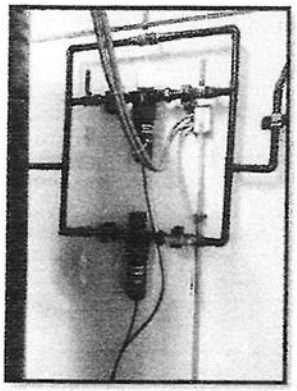

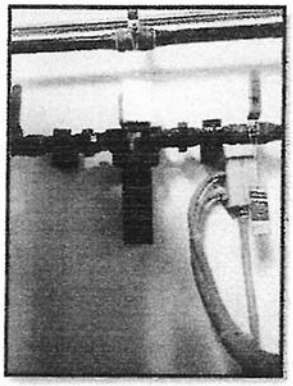

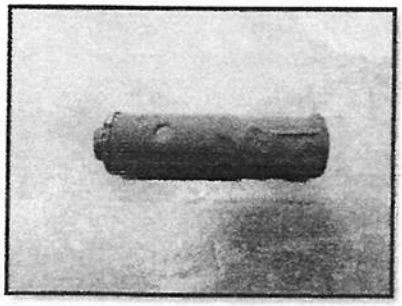

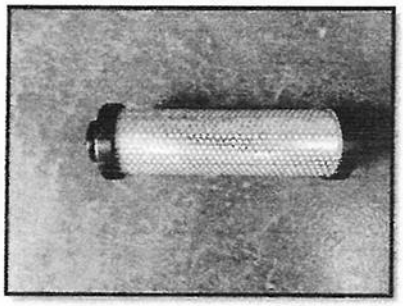

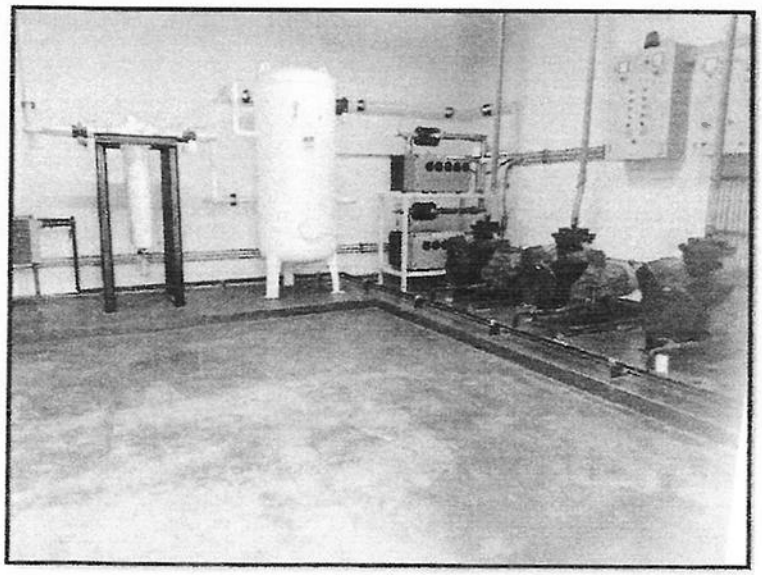

NEWMOTION PUMP AND SERVICE CO.,LTD
217/28 Moo.1, Bowin Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 082-4424149, 038-058321 Fax: 038-058322 Tax. ID : 0205556023580

