เอกสารแนบ 4

รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ปี 2566

บ้านเลขที่ 200/15 หมู่ที่ 2
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น

ข้าพเจ้านายปุลิน จีนตระกูล ในฐานะเจ้าของโครงการทำเหมืองชนิดแร่ดีบุกและหินอ่อน ของนายปุลิน จีนตระกูล ประทานบัตรที่ 25957/16166 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25958/16167 ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ชนิดแร่ดีบุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]



บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
C.I.G. INTER GROUP CO., LTD.

200/15 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
200/15 Potaram Road Chang Puak, Muang, Chiang Mai 50300 Thailand
โทรศัพท์ (Tel.) 0-5322-6868, 0-5322-6886 โทรสาร (Fax.) 0-5322-2251, 0-5322-3993
E-mail : goldensand 123 @hotmail.com

วันที่ 25 มีนาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น

ข้าพเจ้าบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการทำเหมืองชนิดแร่ดีบุก ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ประทานบัตรที่ 25958/16167 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25957/16166 ของนายปุลิน จีนตระกูล ชนิดแร่ดีบุกและหินอ่อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

C.I.G. INTER GROUP CO.,LTD. บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
[redacted]
25 มี.ค. 66

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่..4..../...2566..... วันที่....6.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ..2566.....

1. ประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....นายปุลิน จีนตระกูล ร่วมแผนผังเดียวกันกับ บริษัท ซี.ไอ.จี.กรุ๊ป จำกัด.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง..... .....

หมายเลขประทานบัตร....25957/16166 และ 25958/16167...หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....-.....

ที่ตั้ง ตำบล.....แม่ตืน.....อำเภอ.....สี้.....จังหวัด.....ลำพูน.....

ชนิดแร่.....ดีบุกและแร่หินอ่อน.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองหาบ.....

อายุประทานบัตร.....24.....ปี เริ่มตั้งแต่....22 กันยาน 2565.....วันสิ้นอายุ ...21 กันยายน 2589.....

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....299-3-91 และ 299-2- 82.....ไร่ โดย

กรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

( ) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด นส.3ก นส.3 ฯลฯ).....ไร่

( ) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ป่าโซน E 299-3-91 และ 299-2-82.....ไร่

( ) อื่น ๆ (ระบุ)...อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท.....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (✓) เปิดการทำเหมือง ( ) หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....48-0-00.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....48-0-00.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.(กองกินใหญ่เพื่อรอเข้าปากโม่).....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....40-0-00.....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/ สำนักงาน /บ้านพัก ฯ ล ฯ อยู่นอกเขตประทานบัตร.....0-3-90.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว..... .....แห่ง ขนาด..... .....ไร่ ลึก.....-.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....-.....ไร่ พื้นที่เว้นการทำเหมืองที่ฟื้นฟูแล้ว....50-1-50.....ไร่

รวมพื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....94-1-50.....ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

(✓) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ (✓) พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

( ) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ( ) ปลูกสร้างสวนป่า

( ) อื่นๆ (ระบุ).....

4. ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (รูปที่ 1)

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

.....

.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....30-0-00.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....ปรับสภาพพื้นที่ด้านล่างกองเก็บเปลือกดินให้เรียบนำหน้าดินที่เปิดจากหน้าเหมืองมาปิดทับเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และขุดหลุมลึก 50 ซม.ระยะห่าง 2 x 2 เมตร นำต้นไม้โตเร็ว เช่น สะเดา , ตะแบก , ขี้เหล็ก มาปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ ส่วนพื้นที่คันดินปลูกต้นไม้คลุมดินตระกูลถั่ว หรือ กระดุมทอง รวมถึงหาหญ้าแฝกมาปลูก เพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายลงมา

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

.....

.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด .....10-0-00.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ปลูกต้นไม้คลุมดินตระกูลถั่ว หรือ กระดุมทอง รวมถึงหาหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายลงมา และหาต้นไม้โตเร็วมาปลูกตามคันทำนบดินโดยมีระยะห่างของต้นไม้ 2x 2 เมตร.....

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ...65-0-00..ไร่

วิธีดำเนินการ.....ปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบนำหน้าดินที่เปิดจากหน้าเหมืองมาปิดทับเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และขุดหลุมลึก 50 ซม.ระยะห่าง 2 x 2 เมตร นำต้นไม้โตเร็ว เช่น สะเดา , ตะแบก , ขี้เหล็ก มาปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ โดยพื้นที่ในปีนี้จะฟื้นฟูรอบพื้นที่ห้วยส้านและห้วยแม่ระงอง รวมถึงพื้นที่ว่างรอบเขตประทานบัตรทางทิศเหนือที่อยู่ใกล้กับกองเปลือกดิน.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน (นอกเขตประทานบัตร) เนื้อที่..-..ไร่

วิธีดำเนินการ

.....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

.....

.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....2,200,000.....บาท

5. แผนการดำเนินงานในปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในปีข้างหน้า **(รูปที่** 2)

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....

.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....40-0-0.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....ปรับสภาพพื้นที่ด้านล่างกองเก็บเปลือกดินให้เรียบนำหน้าดินที่เปิดจากหน้าเหมืองมาปิดทับเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และขุดหลุมลึก 50 ซม.ระยะห่าง 2 x 2 เมตร นำต้นไม้โตเร็ว เช่น สะเดา , ตะแบก , ขี้เหล็ก มาปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ ส่วนพื้นที่คันดินปลูกต้นไม้คลุมดินตระกูลถั่ว หรือ กระดุมทอง รวมถึงหาหญ้าแฝกมาปลูก เพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายลงมา.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล) .....-..... เมตร

วิธีดำเนินการ

.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....2x500x2.....เมตร

วิธีดำเนินการ .....ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณทิศเหนือของของพื้นที่หน้าเก็บกองเปลือกดินและจัดทำคันทำนบดินด้านข้างของคูระบายน้ำ นำหญ้าแฝกมาปลูกริมคูระบายน้ำรวมถึงขอบคันทำนบดิน เพื่อป้องกันการพังทลาย ด้านบนของคันทำนบดิน หาต้นไม้โตเร็วมาปลูกตามคันทำนบดินโดยมีระยะห่างของต้นไม้ 2x 2 เมตร.....

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่....10-0-0.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....ปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบนำหน้าดินที่เปิดจากหน้าเหมืองมาปิดทับเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และขุดหลุมลึก 50 ซม.ระยะห่าง 2 x 2 เมตร นำต้นไม้โตเร็ว เช่น สะเดา , ตะแบก , ขี้เหล็ก มาปลูกในหลุมที่เตรียมไว้.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

.....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

.....

.....

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....3,000,000.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....300,000.....บาท

6. ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และส่วนราชการอื่น ๆ.....

วิธีการดำเนินงาน

.....

.....

(ลงชื่อ).....[redacted].....

(.....[redacted].....)

ตำแหน่ง.....วิศวกรควบคุม.....ผู้จัดทำรายงาน

วันที่.....

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....[redacted].....

(.....[redacted].....)

ตำแหน่ง.....กรรมการผู้จัดการ.....

C.I.G. INTER GROUP CO.,LTD. บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด CIG

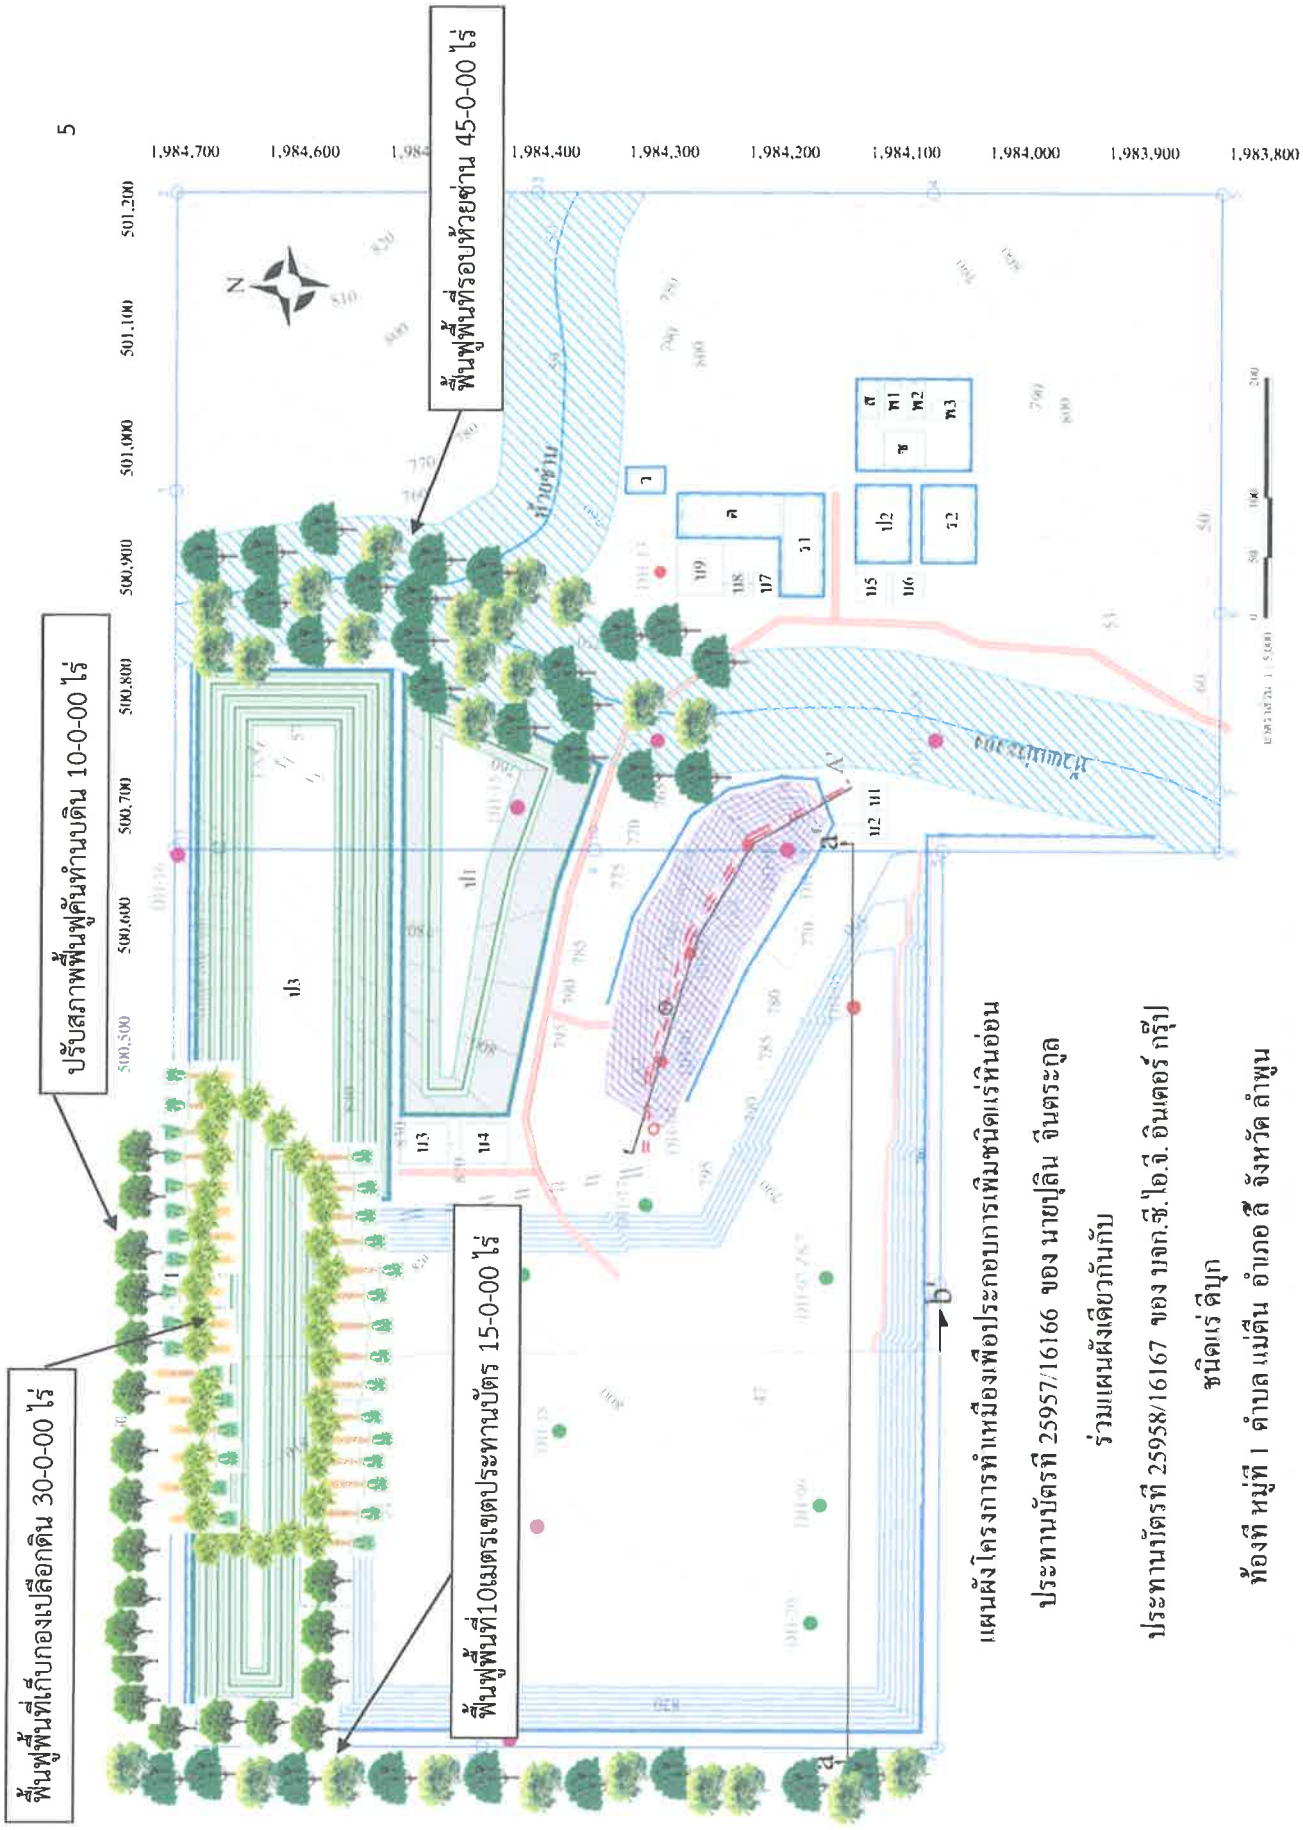

รูปที่ 1 แผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง ปี 2565-2566

รูปที่ 2 ปรับพื้นที่และฟื้นฟูที่เก็บกองดินพื้นที่ 30-0-00 ไร่

รูปที่ 3 ปรับสภาพฟื้นฟูคันทำนบดิน 10-0-00 ไร่

รูปที่ 4 ฟื้นฟูพื้นที่10เมตรเขตประทานบัตร 15-0-00 ไร่

รูปที่ 5 ฟื้นฟูพื้นที่รอบห้วยซ่าน 45-0-00 ไร่

10

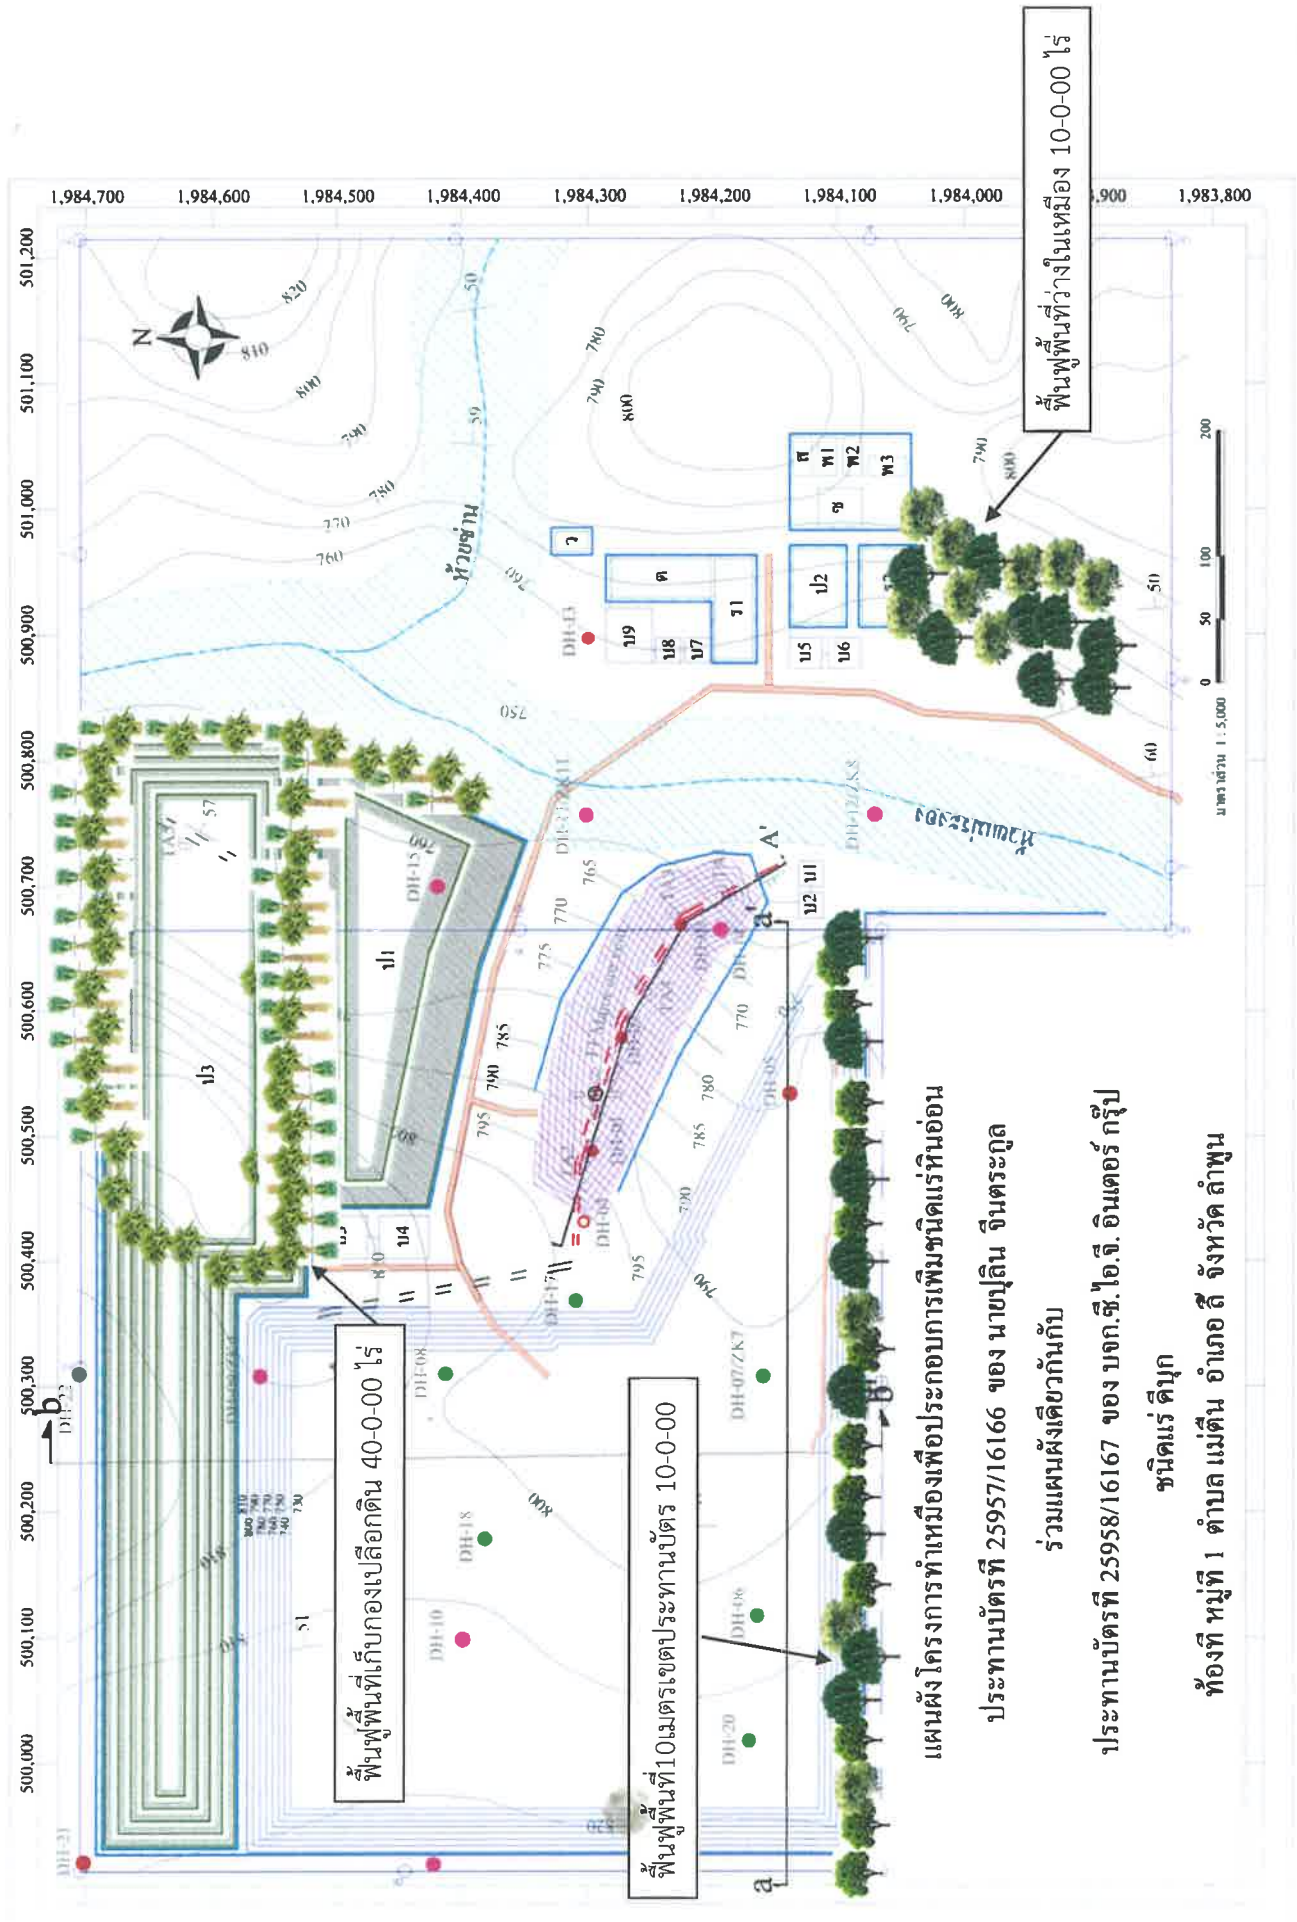

รูปที่ 6 แผนปรับปรุงฟื้นฟูแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง ปี 2567
