ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

1.สำเนาหนังสือเห็นชอบและสรุปมาตรการฯระยะก่อสร้าง

2.สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗ ๒ ๔ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พอร์ช (Porch) ของบริษัท วันยันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วันยันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ GCC-148/2561 ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ GCC-040/2562 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
๓. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๑๓๗๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พอร์ช (Porch) ของบริษัท วันยันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท วันยันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ PEARL ของบริษัท วันยันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๒ แยก ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑๐๑ ห้อง และต่อมาได้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นชื่อใหม่คือ โครงการ พอร์ช (Porch) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กรุงเทพมหานคร มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พอร์ช (Porch) ของบริษัท วันยันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๒ แยก ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด...

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF file) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุไข อุบลทิพย์

(นายสุไข อุบลทิพย์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมลิวรรณ สอนดา)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖๓๔๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ พอร์ช (Porch)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วันฮันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๗๒๔๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือบริษัท วันฮันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ที่ ORP-001/2565 ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พอร์ช (Porch) ของบริษัท วันฮันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๒ แยก ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พอร์ช (Porch) ของบริษัท วันฮันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท วันฮันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม “โครงการ พอร์ช (Porch)” เป็น “โครงการ พรีมิโอ คอนโดมิเนียม (Premio Condominium)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม “โครงการ พอร์ช (Porch)” เป็น “โครงการ พรีมิโอ คอนโดมิเนียม (Premio Condominium)” โดยให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมที่ดิน ในฐานะหน่วยงานอนุญาตเพื่อทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก ข.

ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ดังต่อไปนี้

อาคาร ประเภทที่	จุดตรวจวัด	ความถี่ (Hz)	ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน (มิลลิเมตรต่อวินาที)	
			ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 1**	ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 2**
2*	2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร	$f \leq 10$	5	-
		$10 < f \leq 50$	0.25 f + 2.5	
		$50 < f \leq 100$	0.1 f + 10	
		$f > 100$	20	
	2.2 ชั้นบนสุดของอาคาร	ทุกความถี่	15′	5′
	2.3 พื้นอาคารในแต่ละชั้น	ทุกความถี่	20″	10″

* อาคารประเภทที่ 2 หมายความว่า

1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ

5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

** ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ไม่ทำให้เกิดการล้าและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร

ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดการล้าและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร

f ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็น เฮิรตซ์

′ กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน

″ กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง

- การวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดสำหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตามข้อ 2.2 ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นซึ่งมีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด

- การวัดค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแต่ละชั้นตามข้อ 2.3 ให้ยกเว้นการวัดที่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร

ภาคผนวก ค.

สำเนา รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายใน พื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 24-25 กรกฎาคม 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ห่างประมาณ 3 เมตร ห่างประมาณ 3 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
24-25	PM10	mg/m^3	0.049	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.081	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 24-25 กรกฎาคม 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
24-25	PM10	mg/m^3	0.060	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.108	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายใน พื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 20-21 สิงหาคม 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ห่างประมาณ 3 เมตร ห่างประมาณ 3 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
20-21	PM10	mg/m^3	0.054	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.084	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 20-21 สิงหาคม 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
20-21	PM10	mg/m^3	0.060	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.093	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายใน พื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 23-24 กันยายน 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ห่างประมาณ 3 เมตร ห่างประมาณ 3 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
23-24	PM10	mg/m^3	0.055	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.081	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMNCONS CO., LTD.

รายงานผลการทดสอบ
เลขที่ SP- PORCH-21-32

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ
สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 23-24 กันยายน 2566
เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน
ทิศทางจุดตรวจวัด : ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 เมตร
เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS
วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N
ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
23-24	PM10	mg/m^3	0.049	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.075	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด 125/178 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
☎ : 086-5654788 e- mail: wymncons @ gmail .com

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายใน พื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 30-31 ตุลาคม 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ห่างประมาณ 3 เมตร ห่างประมาณ 3 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
30-31	PM10	mg/m^3	0.058	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.097	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 30-31 ตุลาคม 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
30-31	PM10	mg/m^3	0.056	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.099	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายใน พื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 26-27 พฤศจิกายน 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ห่างประมาณ 3 เมตร ห่างประมาณ 3 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
26-27	PM10	mg/m^3	0.052	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.090	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 26-27 พฤศจิกายน 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง / วัน

ทิศทางจุดตรวจวัด : ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 เมตร

เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols TAS

วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

วันที่	รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
26-27	PM10	mg/m^3	0.051	<0.120	อยู่ในมาตรฐาน
	TSP	mg/m^3	0.084	<0.330	อยู่ในมาตรฐาน

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด _____
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ใบรายงานการตรวจวัดอากาศ

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 24-25 กรกฎาคม 2566
เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชม.

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E - 1536567.66 N
วิธีการเก็บตัวอย่าง WEATHER STATION
ชื่อเครื่องมือ PROFESSIONAL WEATHER STATION WH-1081
Instrument number SN : WA 5915 MTX

Time	Outdoor Temperature(°C)	Outdoor Humidity(%)	Absolute Pressure(mmHg)	Wind()	Direction	Relative Pressure(mmHg)	Hour Rainfall(mm)
12:28:40	34.6	48	761.3	0.7	NW	755.9	0
13:28:40	35.9	44	760.6	0.3	NW	755.1	0
14:28:40	37.2	39	759.6	0.7	S	754.1	0
15:28:40	35.7	45	759	0	SW	753.5	0
16:28:40	32.3	57	758.9	1.4	SE	753.5	3.6
17:28:40	33.4	56	759.6	0	NW	754.1	0
18:28:40	32.6	60	759.6	1	SW	754.1	0
19:28:40	27.8	83	761	0	NE	755.5	5.4
20:28:40	25.8	99	762	0.3	WSW	756.5	0.6
21:28:40	26.5	94	762.3	0.3	W	756.8	0
22:28:40	26.7	93	762.7	0	W	757.2	0
23:28:40	27.1	90	762.9	0	E	757.4	0
0:28:40	28	86	762.8	0	SE	757.4	0
1:28:40	28	84	762.5	0	SW	757	0
2:28:40	27.9	82	761.9	0	SW	756.4	0
3:28:40	27.9	82	761.7	0	SW	756.2	0
4:28:40	27.8	80	761.6	1.4	SW	756.1	0
5:28:40	27.6	81	761.5	0.3	S	756	0
6:28:40	27.4	81	761.8	0	NE	756.3	0
7:28:40	27.6	80	761.9	1	W	756.5	0
8:28:40	28.5	74	762.3	0.7	W	756.8	0
9:28:40	29.8	70	762.2	1.7	WNW	756.8	0
10:28:40	32.6	58	762	1.4	W	756.5	0
11:28:40	32.4	55	761.9	2	SW	756.5	0

ผู้ตรวจวัด
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ใบรายงานการตรวจวัดอากาศ

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 20-21 สิงหาคม 2566
เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชม.

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E - 1536567.66 N
วิธีการเก็บตัวอย่าง WEATHER STATION
ชื่อเครื่องมือ PROFESSIONAL WEATHER STATION WH-1081
Instrument number SN : WA 5915 MTX

Time	Outdoor Temperature(°C)	Outdoor Humidity(%)	Absolute Pressure(mmHg)	Wind()	Direction	Relative Pressure(mmHg)	Hour Rainfall(mm)
12:57:04	35.2	46	760.8	2	NW	755.3	0
13:57:04	35.2	45	760.1	1.4	SW	754.6	0
14:57:04	36.7	42	759.3	0.3	NE	753.8	0
15:57:04	34.6	48	758.9	1.7	W	753.4	0
16:57:04	33.9	56	759.8	1	SW	754.4	0.9
17:57:04	33.5	55	759.6	0.3	NW	754.1	0
18:57:04	32	63	759.9	0.7	NE	754.4	0
19:57:04	25.5	99	761.6	0.3	NE	756.1	32.1
20:57:04	25.9	98	762.4	0	SE	756.9	0.9
21:57:04	26.3	95	762.7	0	SW	757.2	0
22:57:04	27.1	90	762.7	0.3	N	757.2	0
23:57:04	27.8	84	763	0	W	757.5	0
0:57:04	27.8	84	762.8	0	SW	757.4	0
1:57:04	28.1	82	762.2	0	SE	756.7	0
2:57:04	28	82	761.7	0	E	756.2	0
3:57:04	27.9	81	761.6	0.7	SW	756.1	0
4:57:04	27.6	81	761.5	0.7	SW	756	0
5:57:04	27.5	81	761.9	1.4	W	756.4	0
6:57:04	27.4	81	761.9	1	SW	756.5	0
7:57:04	28	78	762	0.3	SW	756.5	0
8:57:04	29.3	71	762.2	1.7	SW	756.8	0
9:57:04	31.5	61	762.3	2	SW	756.8	0
10:57:04	32.3	56	762.2	1.7	W	756.8	0
11:57:04	34.3	49	761.6	0.3	W	756.2	0

ผู้ตรวจวัด
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ใบรายงานการตรวจวัดอากาศ

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 23-24 กันยายน 2566
เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชม.

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E - 1536567.66 N
วิธีการเก็บตัวอย่าง WEATHER STATION
ชื่อเครื่องมือ PROFESSIONAL WEATHER STATION WH-1081
Instrument number SN : WA 5915 MTX

Time	Outdoor Temperature(°C)	Outdoor Humidity(%)	Absolute Pressure(mmHg)	Wind()	Direction	Relative Pressure(mmHg)	Hour Rainfall(mm)
14:50:58	34.4	57	761.9	0	S	754	1.8
15:50:58	32.8	62	759.2	0	N	757.1	1.2
16:50:58	30.9	69	758.7	0.3	NW	756.5	0
17:50:58	29.9	73	759.2	0	W	757.1	0
18:50:58	29.4	75	759.9	0	NW	757.7	0
19:50:58	29.1	73	760.8	0	NW	758.6	0
20:50:58	28.9	72	761.6	0	SE	759.5	0
21:50:58	28.7	73	762	0	SW	759.8	0
22:50:58	28.1	73	761.8	0	NW	759.6	0
23:50:58	27.9	73	761.4	0	NE	759.2	0
0:50:58	27.7	74	761.3	0	W	759.1	0
1:50:58	27.5	76	761.1	0	N	758.9	0
2:50:58	27.8	77	760.8	0	NW	758.6	0
3:50:58	27.7	78	760.9	0	NW	758.7	0
4:50:58	28.3	73	761.3	0	N	759.1	0
5:50:58	27.4	79	761.7	0	N	759.5	0
6:50:58	27.6	79	762.2	0	SW	760	0
7:50:58	28.7	75	762.8	0	NW	760.6	0
8:50:58	30.3	64	762.7	0	NW	760.5	0
9:50:58	34.2	47	762.4	1	E	760.2	0
10:50:58	35.7	42	762.2	0.3	W	760.1	0
11:50:58	35.7	43	761.4	0	NW	759.2	0
12:50:58	36.4	41	760.8	0	W	758.6	0
13:50:58	37.6	39	759.8	0.3	NE	757.6	0

ผู้ตรวจวัด
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ใบรายงานการตรวจวัดอากาศ

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 30-31 ตุลาคม 2566

เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชม.

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E - 1536567.66 N

วิธีการเก็บตัวอย่าง WEATHER STATION

ชื่อเครื่องมือ PROFESSIONAL WEATHER STATION WH-1081

Instrument number SN : WA 5915 MTX

Time	Outdoor Temperature(°C)	Outdoor Humidity(%)	Absolute Pressure(mmHg)	Wind()	Direction	Relative Pressure(mmHg)	Hour Rainfall(mm)
12:05:07	35.9	42	761.8	0.3	SW	759.6	0
13:05:07	36.4	41	761	0.3	N	758.9	0
14:05:07	36.5	41	760.2	0.7	SE	758	0
15:05:07	36.8	39	759.5	0	N	757.4	1.5
16:05:07	32.6	51	759.5	0	N	757.3	1.8
17:05:07	31.2	74	759.6	0	NE	757.4	1.2
18:05:07	31.3	65	759	0.3	N	756.8	0
19:05:07	30.3	71	759	0	NW	756.8	0
20:05:07	29.7	75	759.4	0.3	W	757.2	0
21:05:07	29.3	73	760.4	0	NE	758.2	0
22:05:07	29	71	761.2	0	WNW	759	0
23:05:07	28.8	73	761.8	0	E	759.6	0
0:05:07	28.2	73	761.9	0	N	759.8	0
1:05:07	28.1	72	761.6	0	W	759.5	0
2:05:07	27.9	73	761.3	0	NW	759.2	0
3:05:07	27.9	74	761.1	0	NW	758.9	0
4:05:07	27.6	78	760.7	0	NW	758.5	0
5:05:07	27.7	78	760.4	0	W	758.3	0
6:05:07	27.9	78	760.8	0	E	758.6	0
7:05:07	28.2	74	761.3	0.3	NE	759.1	0
8:05:07	27.2	80	761.7	0	NE	759.5	0
9:05:07	28	77	762.5	0	NW	760.3	0
10:05:07	31	61	762.5	0	NW	760.4	0
11:05:07	31.9	58	762.5	0.3	N	760.4	0

ผู้ตรวจวัด

(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน

(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ใบรายงานการตรวจวัดอากาศ

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 26-27 พฤศจิกายน 2566
เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชม.

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E - 1536567.66 N
วิธีการเก็บตัวอย่าง WEATHER STATION
ชื่อเครื่องมือ PROFESSIONAL WEATHER STATION WH-1081
Instrument number SN : WA 5915 MTX

Time	Outdoor Temperature(°C)	Outdoor Humidity(%)	Absolute Pressure(mmHg)	Wind()	Direction	Relative Pressure(mmHg)	Hour Rainfall(mm)
15:22:57	29	45	758	0	SW	760.7	0
16:22:57	29.2	44	757.7	0	W	760.4	0
17:22:57	28.4	47	758	0	N	760.7	0
18:22:57	28.1	48	758.6	0	SW	761.3	0
19:22:57	27.6	49	759.2	0	SW	761.9	0
20:22:57	27.4	49	759.8	1	NW	762.5	0
21:22:57	26.4	49	760.4	0	N	763.1	0
22:22:57	26	48	760.8	0	W	763.5	0
23:22:57	25.1	51	760.8	0	SW	763.5	0
0:22:57	24.7	52	760.8	0	N	763.5	0
1:22:57	24.4	52	760.4	0	NE	763.1	0
2:22:57	23.8	54	760.1	0.7	W	762.8	0
3:22:57	23.1	54	759.6	1	SW	762.3	0
4:22:57	22.7	55	759.5	0.3	SW	762.2	0
5:22:57	22.3	55	759.6	1.4	SW	762.3	0
6:22:57	21.7	55	759.9	0	SE	762.6	0
7:22:57	21.5	57	760.5	0	NE	763.2	0
8:22:57	21.7	52	761.4	1	SW	764.1	0
9:22:57	22.1	50	762.1	0.7	N	764.8	0
10:22:57	23.1	45	762.3	1	SW	765	0
11:22:57	25	40	762.2	0.3	SW	764.9	0
12:22:57	26.2	37	761.1	1	SW	763.8	0
13:22:57	27.1	33	760.3	1	SW	763	0
14:22:57	26.5	36	759.2	0	N	761.9	0

ผู้ตรวจวัด
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMN.CONS. CO.,LTD.


ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

WIND ROSE PLOT:PEMIO LAKSI

Station # 0

DISPLAY:

Wind Speed
Direction (blowing from)

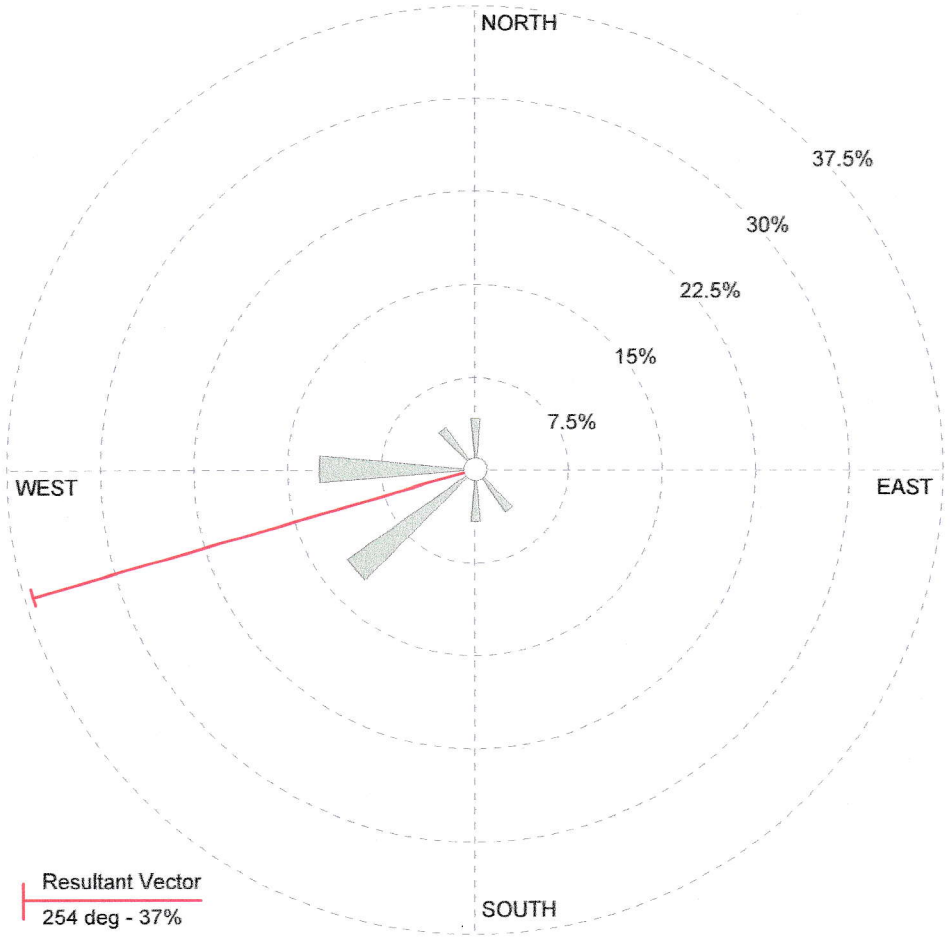

WIND SPEED
(m/s)

- >= 11.10
- 8.80 - 11.10
- 5.70 - 8.80
- 3.60 - 5.70
- 2.10 - 3.60
- 0.50 - 2.10

Calms: 58.33%


COMMENTS:	DATA PERIOD: **Start Date: 7/24/2023 - 12:28** **End Date: 7/25/2023 - 11:28**	COMPANY NAME:PEMIO CONDOMINIUM	
		MODELER:SOMKEIAT WAYAMANONT	
	CALM WINDS: **58.33%**	TOTAL COUNT: **24 hrs.**	
	AVG. WIND SPEED: **0.50 m/s**	DATE: **7/26/2023**	PROJECT NO.:

WIND ROSE PLOT:PEMIO LAKSI

Station # 0

DISPLAY:

Wind Speed
Direction (blowing from)

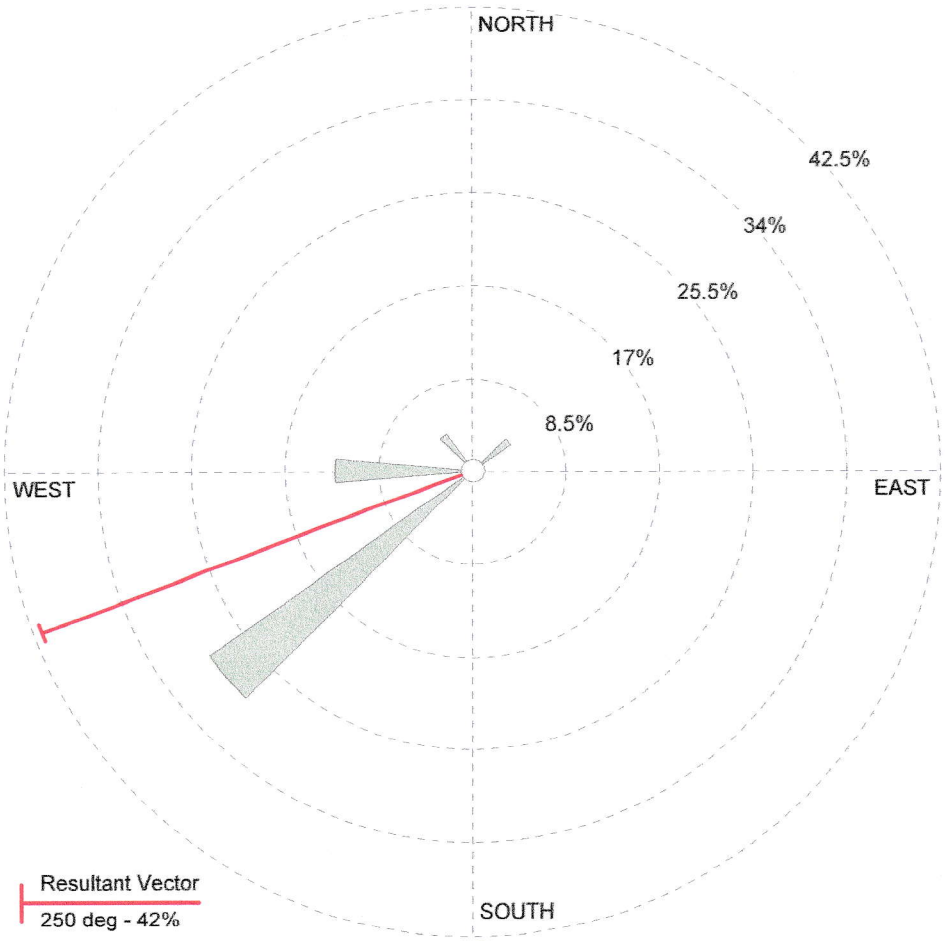

WIND SPEED
(m/s)

- >= 11.10
- 8.80 - 11.10
- 5.70 - 8.80
- 3.60 - 5.70
- 2.10 - 3.60
- 0.50 - 2.10

Calms: 50.00%


COMMENTS:	DATA PERIOD: **Start Date: 8/20/2023 - 12:57** **End Date: 8/21/2023 - 11:57**	COMPANY NAME:PEMIO CONDOMINIUM	
		MODELER:SOMKEIAT WAYAMANONT	
	CALM WINDS: **50.00%**	TOTAL COUNT: **24 hrs.**	
	AVG. WIND SPEED: **0.67 m/s**	DATE: **8/22/2023**	PROJECT NO.:

WIND ROSE PLOT:PEMIO LAKSI

Station # 0

DISPLAY:

Wind Speed
Direction (blowing from)

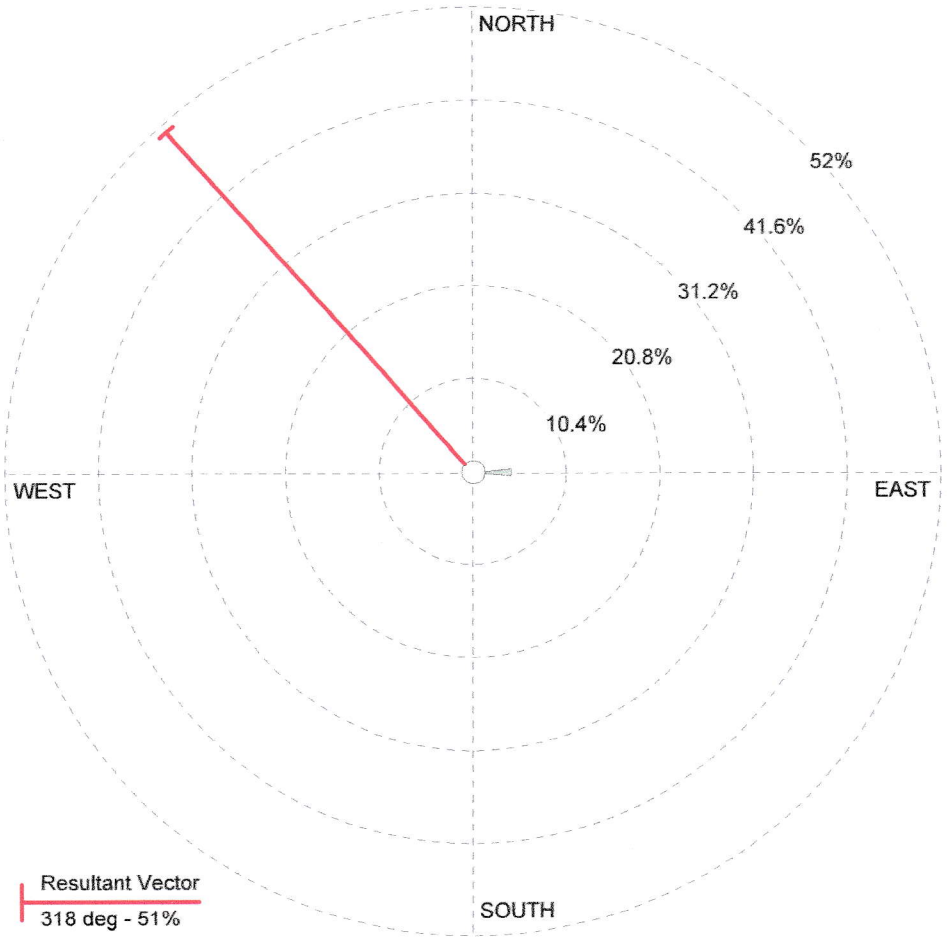

WIND SPEED
(m/s)

- >= 11.10
- 8.80 - 11.10
- 5.70 - 8.80
- 3.60 - 5.70
- 2.10 - 3.60
- 0.50 - 2.10

Calms: 95.83%


COMMENTS:	DATA PERIOD: **Start Date: 9/23/2023 - 14:50** **End Date: 9/24/2023 - 13:50**	COMPANY NAME:PEMIO CONDOMINIUM	
		MODELER:SOMKEIAT WAYAMANONT	
	CALM WINDS: **95.83%**	TOTAL COUNT: **24 hrs.**	
	AVG. WIND SPEED: **0.04 m/s**	DATE: **9/25/2023**	PROJECT NO.:

WIND ROSE PLOT:PEMIO LAKSI

Station # 0

DISPLAY:

Wind Speed
Direction (blowing from)

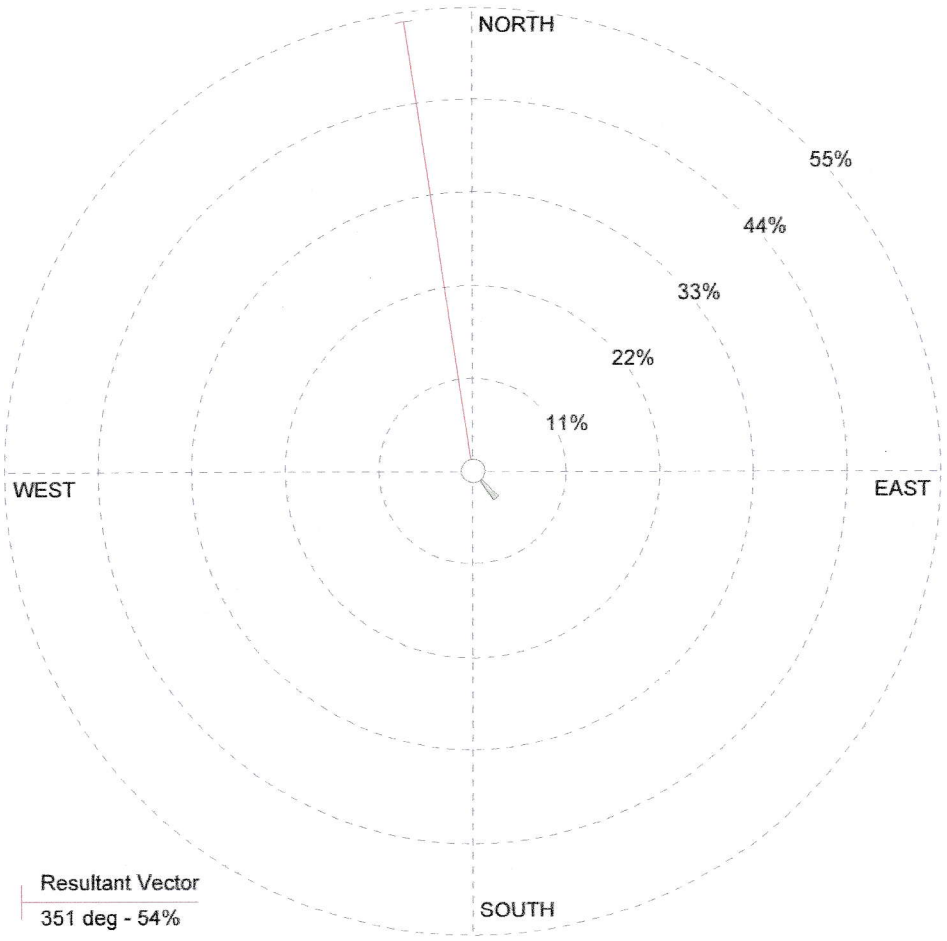


COMMENTS:	DATA PERIOD: **Start Date: 10/30/2023 - 12:05** **End Date: 10/31/2023 - 11:05**	COMPANY NAME:PEMIO CONDOMINIUM	
		MODELER:SOMKEIAT WAYAMANONT	
	CALM WINDS: **95.83%**	TOTAL COUNT: **24 hrs.**	
	AVG. WIND SPEED: **0.03 m/s**	DATE: **11/01/2023**	PROJECT NO.:

WIND ROSE PLOT:PEMIO LAKSI

Station # 0

DISPLAY:

Wind Speed
Direction (blowing from)

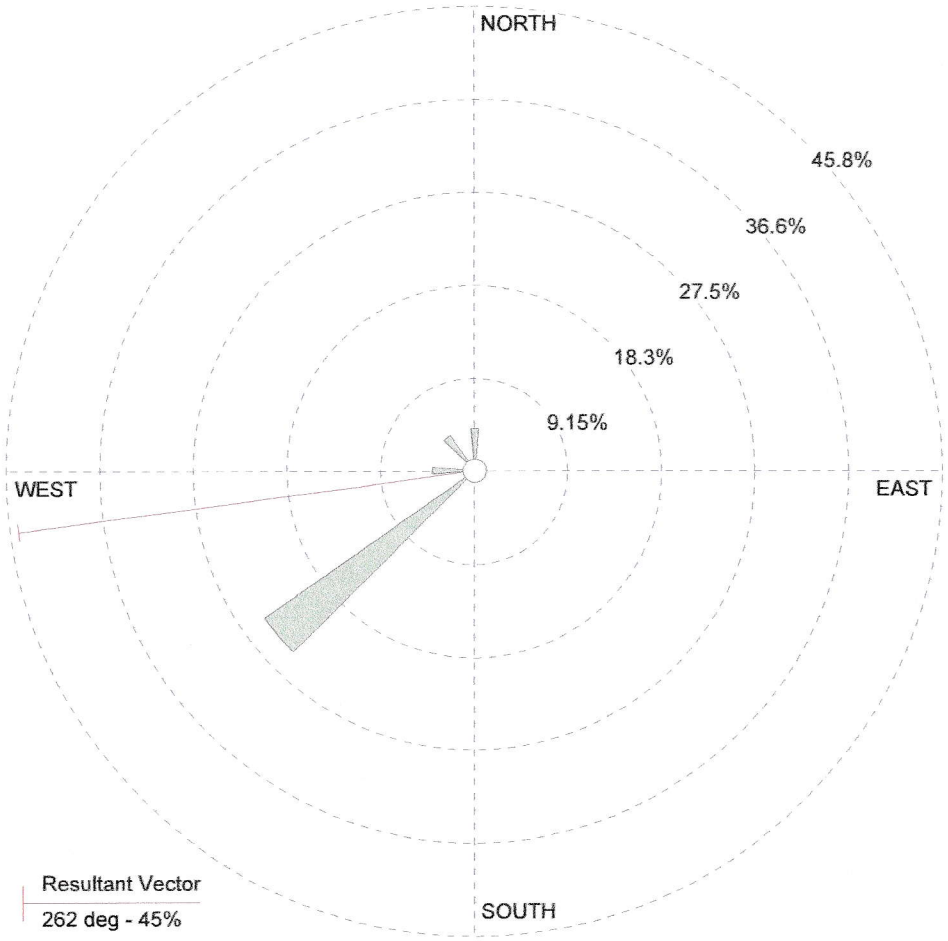

WIND SPEED
(m/s)

- >= 11.10
- 8.80 - 11.10
- 5.70 - 8.80
- 3.60 - 5.70
- 2.10 - 3.60
- 0.50 - 2.10

Calms: 62.50%

COMMENTS:	DATA PERIOD: **Start Date: 11/26/2023 - 15:22** **End Date: 11/27/2023 - 14:22**	COMPANY NAME:PEMIO CONDOMINIUM	
		MODELER:SOMKEIAT WAYAMANONT	
	CALM WINDS: **62.50%**	TOTAL COUNT: **24 hrs.**	
	AVG. WIND SPEED: **0.37 m/s**	DATE: **11/28/2023**	PROJECT NO.:

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668962.00 E - 1536567.66 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการห่างประมาณ 3 เมตร	วิธีการเก็บตัวอย่าง	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	24-25 กรกฎาคม 2566	ชื่อเครื่องมือ	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
12:23	61.7	95.6	57	3.2
13:23	62.8	83.9	57	4.3
14:23	64.4	87.0	59	4.9
15:23	63.1	74.7	59	2.6
16:23	64.0	83.1	59	3.5
17:23	64.1	94.8	55	8.6
18:23	59.2	82.1	55	2.2
19:23	58.0	77.1	53	4.0
20:23	56.4	71.5	51	3.9
21:23	55.3	80.8	51	5.8
22:23	52.9	71.8	49	4.9
23:23	53.3	73.5	49	5.3
0:23	52.6	76.3	49	4.6
1:23	51.5	69.5	49	2.5
2:23	52.3	64.0	49	3.3
3:23	53.2	72.9	49	5.2
4:23	52.2	68.5	49	3.2
5:23	59.4	76.2	53	8.9
6:23	61.1	77.1	57	2.1
7:23	62.9	80.9	57	4.4
8:23	63.4	86.9	57	5.4
9:23	63.6	80.2	57	5.6
10:23	63.3	90.7	57	4.8
11:23	62.4	80.5	57	3.9
Leq (Avg. 24Hr.)	*62.1*			
Lp Max (dBA)	*95.6*			
LDN	*63.3*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668958.12 E - 1536610.31 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทิศภายนอกบริเวณสำนักงานสนามห่างประมาณ 20 เมตร	**วิธีการเก็บตัวอย่าง**	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	24-25 กรกฎาคม 2566	**ชื่อเครื่องมือ**	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
12:47	58.3	72.7	55	0.3
13:47	59.1	75.8	57	0.0
14:47	58.8	68.9	57	0.0
15:47	58.5	75.3	57	0.0
16:47	59.9	70.2	57	0.0
17:47	57.9	70.9	49	8.4
18:47	55.6	66.5	47	8.1
19:47	53.9	64.9	47	5.9
20:47	51.6	70.8	47	3.1
21:47	49.2	67.7	47	0.7
22:47	48.1	58.6	45	3.1
23:47	48.4	61.1	47	2.4
0:47	47.7	60.8	45	2.7
1:47	46.8	55.7	45	0.3
2:47	49.3	81.7	45	5.3
3:47	55.6	77.8	45	9.1
4:47	49.4	67.5	45	5.9
5:47	59.2	66.7	47	9.7
6:47	58.5	72.3	47	9.8
7:47	54.8	72.3	47	7.3
8:47	58.6	81.9	49	9.1
9:47	54.8	68.9	49	4.3
10:47	55.8	79.2	49	5.8
11:47	54.1	79.2	47	6.1
Leq (Avg. 24Hr.)	*59.1*			
Lp Max (dBA)	*81.9*			
LDN	*60.2*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668962.00 E - 1536567.66 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการห่างประมาณ 3 เมตร	**วิธีการเก็บตัวอย่าง**	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	20-21 สิงหาคม 2566	**ชื่อเครื่องมือ**	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
13:52	61.7	82.9	57	3.2
14:52	62.8	81.4	59	2.3
15:52	62.7	83.6	57	4.2
16:52	62.3	80.0	57	3.8
17:52	62.3	79.4	57	3.8
18:52	62.3	78.4	55	6.3
19:52	58.9	77.2	55	1.9
20:52	58.3	76.8	53	4.3
21:52	57.2	83.2	51	4.7
22:52	55.9	76.7	51	6.4
23:52	53.6	73.5	49	6.1
0:52	52.7	70.4	49	4.7
1:52	51.2	67.4	49	0.7
2:52	50.5	70.3	47	4.5
3:52	50.6	72.2	47	4.6
4:52	51.1	73.0	47	5.1
5:52	52.6	68.2	49	4.6
6:52	57.2	79.3	51	7.7
7:52	60.4	80.3	57	1.9
8:52	61.5	86.0	57	3.5
9:52	63.4	88.2	57	5.9
10:52	64.3	78.1	57	6.3
11:52	63.4	81.4	57	5.4
12:52	63.4	86.9	57	5.4
Leq (Avg. 24Hr.)	*61.8*			
Lp Max (dBA)	*88.2*			
LDN	*62.6*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668958.12 E - 1536610.31 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทิศภายนอกบริเวณสำนักงานสนามห่างประมาณ 20 เมตร	วิธีการเก็บตัวอย่าง	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	20-21 สิงหาคม 2566	ชื่อเครื่องมือ	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
14:41	59.8	91.2	57	2.3
15:41	60.2	85.8	57	0.2
16:41	59.4	75.8	57	0.9
17:41	59.5	85.6	57	1.0
18:41	58.9	66.9	57	0.0
19:41	61.2	82.1	59	0.0
20:41	61.6	80.0	59	0.0
21:41	58.2	72.3	49	8.7
22:41	51.4	73.9	47	2.9
23:41	49.9	67.3	47	2.9
0:41	48.9	60.5	47	0.4
1:41	48.4	61.9	47	2.4
2:41	48.2	63.2	45	3.2
3:41	48.2	66.5	45	3.2
4:41	47.5	56.4	45	2.5
5:41	46.9	58.8	45	2.9
6:41	49.2	63.4	45	5.2
7:41	58.4	67.0	47	9.9
8:41	62.4	72.2	59	1.4
9:41	61.0	74.5	59	0.0
10:41	79.1	106.1	59	9.1
11:41	73.2	104.2	57	9.2
12:41	77.2	105.2	55	9.2
13:41	58.4	73.8	57	0.0
Leq (Avg. 24Hr.)	*68.7*			
Lp Max (dBA)	*106.1*			
LDN	*68.7*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN CONS. CO.,LTD.

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668962.00 E - 1536567.66 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการห่างประมาณ 3 เมตร	วิธีการเก็บตัวอย่าง	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	23-24 กันยายน 2566	ชื่อเครื่องมือ	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
14:11	61.5	79.7	57	3.0
15:11	64.9	93.1	59	4.4
16:11	63.6	85.3	57	6.1
17:11	63.9	80.7	59	3.4
18:11	63.0	79.4	57	5.5
19:11	63.0	81.8	53	9.5
20:11	56.4	73.4	51	3.9
21:11	57.0	78.8	51	4.5
22:11	55.9	78.9	51	3.4
23:11	53.1	71.9	49	5.1
0:11	52.7	74.5	47	7.2
1:11	51.0	74.0	47	5.0
2:11	50.2	68.1	47	3.2
3:11	51.6	74.4	47	6.1
4:11	50.4	75.6	47	4.9
5:11	49.8	70.1	47	2.8
6:11	51.2	68.2	47	5.2
7:11	54.7	71.9	49	7.2
8:11	55.5	74.4	51	3.5
9:11	56.5	76.2	51	4.0
10:11	59.6	88.6	51	8.1
11:11	56.4	79.1	51	3.9
12:11	56.0	77.1	51	3.5
13:11	56.9	77.7	51	4.4
Leq (Avg. 24Hr.)	*60.8*			
Lp Max (dBA)	*93.1*			
LDN	*61.2*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668958.12 E - 1536610.31 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทิศภายนอกบริเวณสำนักงานสนามห่างประมาณ 20 เมตร	**วิธีการเก็บตัวอย่าง**	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	23-24 กันยายน 2566	**ชื่อเครื่องมือ**	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
13:24	58.3	72.7	55	0.3
14:24	59.1	75.8	57	0.0
15:24	58.8	68.9	57	0.0
16:24	58.5	75.3	57	0.0
17:24	59.9	70.2	57	0.0
18:24	57.9	70.9	49	8.4
19:24	55.6	66.5	47	8.1
20:24	53.9	64.9	47	5.9
21:24	51.6	70.8	47	3.1
22:24	49.2	67.7	47	0.7
23:24	48.1	58.6	45	3.1
0:24	48.4	61.1	47	2.4
1:24	47.7	60.8	45	2.7
2:24	46.8	55.7	45	0.3
3:24	49.3	81.7	45	5.3
4:24	55.6	77.8	45	9.1
5:24	49.4	67.5	45	5.9
6:24	59.2	66.7	47	9.7
7:24	58.5	72.3	47	9.7
8:24	54.8	72.3	47	7.3
9:24	58.6	81.9	49	9.1
10:24	54.8	68.9	49	4.3
11:24	55.8	79.2	49	5.8
12:24	54.1	79.2	47	6.1
Leq (Avg. 24Hr.)	*59.1*			
Lp Max (dBA)	*81.9*			
LDN	*60.2*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668962.00 E - 1536567.66 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการห่างประมาณ 3 เมตร	วิธีการเก็บตัวอย่าง	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	30-31 ตุลาคม 2566	ชื่อเครื่องมือ	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
12:09	56.7	80.1	51	4.2
13:09	55.8	73.0	51	3.3
14:09	58.8	83.6	51	7.3
15:09	57.5	79.9	51	5.5
16:09	55.5	74.2	49	5.5
17:09	56.7	74.2	51	4.2
18:09	59.1	81.2	51	9.6
19:09	56.8	75.3	51	7.3
20:09	55.3	72.7	51	5.8
21:09	53.0	76.4	49	5.0
22:09	52.5	77.6	47	7.0
23:09	50.4	67.8	47	4.4
0:09	50.2	73.9	47	3.2
1:09	50.7	74.3	47	4.7
2:09	50.1	69.6	47	3.1
3:09	51.9	67.9	47	3.4
4:09	55.9	70.1	49	5.9
5:09	57.6	80.1	51	6.1
6:09	59.1	80.7	57	0.0
7:09	63.0	84.0	57	4.5
8:09	64.2	81.7	57	6.2
9:09	63.1	83.8	57	5.6
10:09	62.1	79.0	55	6.1
11:09	61.5	83.0	51	9.0
Leq (Avg. 24Hr.)	*60.5*			
Lp Max (dBA)	*84.0*			
LDN	*62.1*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668958.12 E - 1536610.31 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทิศภายนอกบริเวณสำนักงานสนามห่างประมาร 20 เมตร	วิธีการเก็บตัวอย่าง	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	30-31 ตุลาคม 2566	ชื่อเครื่องมือ	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
12:51	79.5	103.3	67	9.5
13:51	70.0	91.8	61	8.5
14:51	64.3	89.5	63	0.0
15:51	63.7	72.4	63	0.0
16:51	59.8	68.2	49	9.8
17:51	51.7	66.9	49	0.0
18:51	51.2	68.4	49	0.7
19:51	51.3	70.8	49	0.8
20:51	51.8	70.1	49	2.8
21:51	51.5	57.7	49	2.5
22:51	51.5	60.7	49	2.5
23:51	51.1	56.0	49	0.6
0:51	50.1	63.3	47	3.1
1:51	51.0	65.6	47	5.0
2:51	62.4	80.0	49	9.4
3:51	66.0	85.1	63	0.0
4:51	67.0	85.3	65	0.0
5:51	67.8	89.2	65	0.0
6:51	69.0	88.6	65	2.0
7:51	67.0	83.8	65	0.0
8:51	66.0	79.0	65	0.0
9:51	67.2	79.6	65	0.0
10:51	66.7	90.2	63	1.7
11:51	0.0	0.0	0	0.0
Leq (Avg. 24Hr.)	*68.1*			
Lp Max (dBA)	*103.3*			
LDN	*68.6*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668962.00 E - 1536567.66 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการห่างประมาณ 3 เมตร	วิธีการเก็บตัวอย่าง	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	26-27 พฤศจิกายน 2566	ชื่อเครื่องมือ	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
14:38	59.8	91.2	57	2.3
15:38	60.2	85.8	57	0.2
16:38	59.4	75.8	57	0.9
17:38	59.5	85.6	57	1.0
18:38	58.9	66.9	57	0.0
19:38	61.2	82.1	59	0.0
20:38	61.6	80.0	59	2.6
21:38	58.2	72.3	49	9.7
22:38	51.4	73.9	47	5.9
23:38	49.9	67.3	47	2.9
0:38	48.9	60.5	47	0.4
1:38	48.4	61.9	47	2.4
2:38	48.2	63.2	45	3.2
3:38	48.2	66.5	45	3.2
4:38	47.5	56.4	45	2.5
5:38	46.9	58.8	45	0.0
6:38	49.2	63.4	45	2.2
7:38	58.4	67.0	47	9.9
8:38	62.4	72.2	59	1.4
9:38	61.0	74.5	59	0.0
10:38	79.1	106.1	59	9.1
11:38	73.2	104.2	57	9.2
12:38	77.2	105.2	55	9.2
13:38	58.4	73.8	57	0.0
Leq (Avg. 24Hr.)	*68.7*			
Lp Max (dBA)	*106.1*			
LDN	*69.0*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดเสียง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ	อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ	พิกัดจุดตรวจวัด	47P 668958.12 E - 1536610.31 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	ทิศภายนอกบริเวณสำนักงานสนามห่างประมาร 20 เมตร	**วิธีการเก็บตัวอย่าง**	INTEGRATING SOUND LEVEL METER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	26-27 พฤศจิกายน 2566	**ชื่อเครื่องมือ**	SOFT DB PICCOLO SLM-P3

วัน /เวลา	Leq	Lmax	L90%	เสียงรบกวน
14:55	73.4	90.6	67	5.4
15:55	72.2	98.9	67	3.7
16:55	70.3	91.5	67	0.3
17:55	67.9	75.7	67	0.0
18:55	67.8	76.8	67	0.0
19:55	57.2	72.5	49	7.7
20:55	52.2	69.6	49	4.7
21:55	53.1	68.2	51	3.1
22:55	55.3	74.9	47	9.8
23:55	50.4	71.9	45	6.9
0:55	50.7	72.3	45	7.2
1:55	47.2	59.0	43	5.2
2:55	48.0	61.1	45	4.5
3:55	49.7	68.4	45	6.2
4:55	57.4	69.7	47	9.9
5:55	68.8	76.8	67	1.3
6:55	68.5	88.1	67	0.0
7:55	72.0	95.6	67	4.0
8:55	71.6	92.7	65	5.6
9:55	69.9	91.9	65	3.4
10:55	70.1	90.7	63	6.1
11:55	61.9	99.2	49	9.9
12:55	69.2	95.3	57	9.7
13:55	70.8	96.7	59	9.8
Leq (Avg. 24Hr.)	*68.0*			
Lp Max (dBA)	*99.2*			
LDN	*68.4*			
ค่ามาตรฐาน	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.<70 dBA	2. ระดับเสียงสูงสุด <115 dBA	3.ระดับเสียงรบกวน > 10	

หมายเหตุ :* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 12 มีค.40

ผู้ตรวจวัด _____ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(น.ส.หทัยรัตน์ เตียวนิช)

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน _____ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายในพื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 24-25 กรกฎาคม 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
24 ก.ค.66	24 ก.ค. 66 15:24:00	73.14	0.265	25 ก.ค. 66 8:39:00	3.03	0.61	24 ก.ค. 66 16:15:00	113.78	0.179
	Standard	73.14	17.314	Standard	3.03	5	Standard	113.78	20
Peak Vector SUM: 0.610 mm./sec วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:39:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD.

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 24-25 กรกฎาคม 2566

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
24 ก.ค.66	24 ก.ค. 66 15:28:00	60.24	0.25	25 ก.ค. 66 11:13:00	4.16	0.603	24 ก.ค. 66 16:40:00	113.78	0.168
	Standard	60.24	16.024	Standard	4.16	5	Standard	113.78	20
Peak Vector SUM: 0.605 mm./sec วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:13:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายในพื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 20-21 สิงหาคม 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
20 ส.ค.66	20 ส.ค. 66 16:13:00	68.27	0.123	20 ส.ค. 66 14:10:00	4.34	0.446	20 ส.ค. 66 18:36:00	113.78	0.121
	Standard	68.27	16.827	Standard	4.34	5	Standard	113.78	20
Peak Vector SUM: 0.467 mm./sec วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14:10:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 20-21 สิงหาคม 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
20 ส.ค.66	21 ส.ค. 66 12:36:00	2.65	0.123	20 ส.ค. 66 14:19:00	3.76	0.431	20 ส.ค. 66 18:53:00	113.78	0.121
	Standard	2.65	5	Standard	3.76	5	Standard	113.78	20
Peak Vector SUM: 0.456 mm./sec วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14:19:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายในพื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 23-24 กันยายน 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
23 ก.ย.66	24 ก.ย. 66 9:13:00	5.69	0.127	23 ก.ย. 66 14:32:00	3.08	0.782	23 ก.ย. 66 13:28:00	2.7	0.139
	Standard	5.69	5	Standard	3.08	5	Standard	2.7	5
Peak Vector SUM: 0.783 mm./sec วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 14:32:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 23-24 กันยายน 2566

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
23 ก.ย.66	24 ก.ย. 66 3:23:00	2.91	0.123	23 ก.ย. 66 17:37:00	9.85	0.703	24 ก.ย. 66 9:37:00	4.05	0.138
	Standard	2.91	5	Standard	9.85	5	Standard	4.05	5
Peak Vector SUM: 0.708 mm./sec วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 17:37:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายในพื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 30-31 ตุลาคม 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
30 ต.ค.66	31 ต.ค. 66 11:20:00	1.97	0.116	30 ต.ค. 66 15:41:00	3.3	0.637	31 ต.ค. 66 3:23:00	2.53	0.137
	Standard	1.97	5	Standard	3.3	5	Standard	2.53	5
Peak Vector SUM: 0.640 mm./sec วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 15:41:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 30-31 ตุลาคม 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
30 ต.ค.66	30 ต.ค. 66 13:48:00	10.89	0.111	31 ต.ค. 66 9:38:00	12.34	0.629	31 ต.ค. 66 11:45:00	1.21	0.133
	Standard	10.89	5.2225	Standard	12.34	5.585	Standard	1.21	5
Peak Vector SUM: 0.633 mm./sec วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9:38:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN.CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายในพื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 26-27 พฤศจิกายน 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668962.00 E
1536567.66 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณมุมด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
26 พ.ย.66	26 พ.ย. 66 15:37:00	2.81	0.111	27 พ.ย. 66 11:20:00	3.3	0.625	26 พ.ย. 66 13:25:00	2.84	0.124
	Standard	2.81	5	Standard	3.3	5	Standard	2.84	5
Peak Vector SUM: 0.627 mm./sec วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:20:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ อาคารชุด PREMIO แจ้งวัฒนะ

สถานที่เก็บตัวอย่าง ภายนอก พื้นที่โครงการ บริเวณสำนักงานสนาม

วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 26-27 พฤศจิกายน 2566

ทิศทางจุดตรวจวัด : ทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods , Range : sensitive,31.7 mm./sec,1024 samples per second

พิกัดจุดตรวจวัด 47P 668958.12 E
1536610.31 N

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : บริเวณสำนักงานก่อสร้างหลังสำนักงานขายทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พื้นที่เป็นดินห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร

DAY	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
26 พ.ย.66	27 พ.ย. 66 10:48:00	2.26	0.11	26 พ.ย. 66 13:55:00	3.27	0.619	26 พ.ย. 66 14:01:00	2.99	0.124
	Standard	2.26	5	Standard	3.27	5	Standard	2.99	5
Peak Vector SUM: 0.619 mm./sec วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:55:00 น.									

หมายเหตุ 1: ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด
(นางสาว หทัยรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด WYMN. CONS. CO.,LTD

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0240

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 230724005

Sampling Source : โครงการ Premio
: -
Sampling Date : 23-Jul-23
Received Date : 24-Jul-23
Testing Date : Jul 24-31,2023
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 04-Aug-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำทิ้ง	
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230724005	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
#pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	11.3	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	19.0	≤40
TSS	mg/L	APHA:2540 D	34.0	≤50
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	1,004	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤40
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	6.0	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤3.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ค

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 230724006

Sampling Source : โครงการ Premio
: -
Sampling Date : 23-Jul-23
Received Date : 24-Jul-23
Testing Date : Jul 26,2023
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 04-Aug-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230724006
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	266

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0240

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 230821011

Sampling Source : โครงการ Premio
: -
Sampling Date : 20-Aug-23
Received Date : 21-Aug-23
Testing Date : Aug 21-28,2023
Sampling Method : Garb
Sampling By : Customer
Approved Date : 31-Aug-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			คุณภาพน้ำทิ้งพื้นที่ก่อสร้าง	
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230821011	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	9.0	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	4.4	≤40
TSS	mg/L	APHA:2540 D	227	≤50
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	745	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤40
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	1.4	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤3.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ค

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 230821012

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ Premio
: -
Sampling Date : 20-Aug-23
Received Date : 21-Aug-23
Testing Date : Aug 23,2023
Sampling Method : Garb
Sampling By : Customer
Approved Date : 31-Aug-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230821012
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	240

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0240

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 230925026

#Sampling Source : โครงการ Premio
: -
#Sampling Date : 22-Sep-23
#Sampling Method : Garb
Received Date : 25-Sep-23
#Sampling By : Customer
Testing Date : Sep 27 - Oct 2,2023
Approved Date : 03-Oct-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			คุณภาพน้ำทิ้งพื้นที่ก่อสร้าง	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			230925026	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	9.0	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	2.4	≤40
TSS	mg/L	APHA:2540 D	11.0	≤50
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	383	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤40
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤3.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ค

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab
One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 230925027

Sampling Source : โครงการ Premio
: -
Sampling Date : 22-Sep-23
Received Date : 25-Sep-23
Testing Date : Sep 27,2023
Sampling Method : Garb
Sampling By : Customer
Approved Date : 03-Oct-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230925027
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	212

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0240

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 231031041

#Sampling Source : โครงการ Premio
: -
#Sampling Date : 28-Oct-23
Received Date : 31-Oct-23
Testing Date : Oct 31 - Nov 6,2023
#Sampling Method : Garb
#Sampling By : Customer
Approved Date : 09-Nov-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			231031041	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.9	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	2.6	≤40
TSS	mg/L	APHA:2540 D	10	≤50
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	385	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤40
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤3.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ค

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 231031042

Sampling Source : โครงการ Premio
: -
Sampling Date : 28-Oct-23
Received Date : 31-Oct-23
Testing Date : Nov 2,2023
Sampling Method : Garb
Sampling By : Customer
Approved Date : 09-Nov-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			231031042
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	150

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0240

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 231127018

#Sampling Source : โครงการ Premio
: -

#Sampling Date	: 26-Nov-23	#Sampling Method	: Garb
Received Date	: 27-Nov-23	#Sampling By	: Customer
Testing Date	: Nov 27 - Dec 4,2023	Approved Date	: 08-Dec-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			คุณภาพน้ำทิ้งพื้นที่ก่อสร้าง	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			231127018	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	<2.0	≤40
TSS	mg/L	APHA:2540 D	6.6	≤50
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	10	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤40
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤3.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ค

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Report No: 231127019

Sampling Source : โครงการ Premio
: -
Sampling Date : 26-Nov-23
Received Date : 27-Nov-23
Testing Date : Nov 29,2023
Sampling Method : Garb
Sampling By : Customer
Approved Date : 08-Dec-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			231127019
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	170

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
