# เอกสารแนบ 6

## เอกสารบันทึกการระเบิด-เจาะระเบิด

MM-C32

Srilamartsri Co.,Ltd.

บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Site Name : | บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด | Location : | Suphan Buri | Zone | ศิลา1 |
| The Kind of Rock | ☑ Limestone | Machine | 4 | Position | ผา3 |
| | | Work | ปกติ | Date : | 18 June 2024 |

| Drill hole detail | | | |
|---|---|---|---|
| Number of Holes | 65 | | Holes. |
| Hole Size | 3.5 | | in. |
| Bench Height | 6 | | m. |
| Burden | 3.5 | | m. |
| Spacing | 3.0 | | m. |
| Sub drill | 1.0 | | m. |
| Hole Depth | 7 | | m. |
| Stemming | 1.0 | | m. |
| High Explosive | 65 | | Pcs. |
| Density Measurement ANFO | | 0.85 | g/cc. |
| ANFO ต่อรู | | 2 | kg. |
| ANFO | | 10 | kg. |
| | | 625 | Pcs. |
| Fuel Oil | | 46 | Liter. |
| *Shot Volume* | | | |
| Shot Volume ( BCM. ) | 65.00 | | cu.m |
| Shot Volume ( Ton. ) | 73.50 | | ton. |
| | | | |
| *Powder Factor* | | | |
| Powder Factor ( BCM. ) | 4490.850 | | kg./bcm. |
| Powder Factor ( Ton. ) | 0.140 | | kg./Ton. |

Detail Cap

Explosive

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | 55 | X | 300 | mm. | 65 | Pcs. |
| HE | 55 | X | 300 | mm. | 1.0 | Pcs./Hole. |
| Booster | | X | | mm. | | Pcs. |

Electric

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IED | No. 0 | 10 | No. 6 | 10 | Pcs. |
| MSD | No. 1 | #VALUE! | No. 7 | #VALUE! | Pcs. |
| | No. 2 | 10 | No. 8 | 10 | Pcs. |
| | No. 3 | #VALUE! | No. 9 | 5 | Pcs. |
| | No. 4 | 10 | No.10 | 10 | Pcs. |
| | No. 5 | #VALUE! | No. ... | | Pcs. |

Non-electric

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ez-Det | / | ms. | Pcs. |
| Thank line | | ms. | Pcs. |
| Down line | | ms. | Pcs. |
| Safety Fuse | | | Meter. |

Total Cap 65 Pcs.

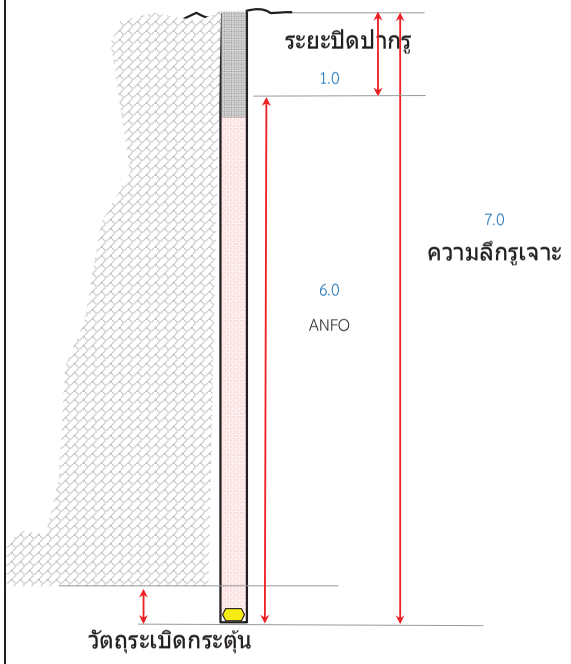


น.6/1

Srilamartsri Co.,Ltd.

บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

# บันทึกลักษณะหลุมเจาะ

Date : 18 June 2024

**รายละเอียดของการเจาะ**

| | | |
|---|---|---|
| ตำแหน่งหน้างาน | ผา3 | |
| ขนาดรูเจาะ | 3.5 | นิ้ว |
| ความลึกรูเจาะ | 7 | เมตร |
| จำนวนรูเจาะ | 65 | รู |
| ระยะ Burden | 3.5 | เมตร |
| ระยะ Spacing | 3.0 | เมตร |

| หลุมที่ | ลักษณะหลุมเจาะ |
|---|---|
| 1 | หลุมเจาะมีน้ำ |
| 2 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 3 | หลุมเจาะมีน้ำ |
| 4 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 5 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 6 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น |
| 7 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 8 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 9 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 10 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 11 | หลุมเจาะมีน้ำ |
| 12 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 13 | หลุมเจาะมีน้ำ |
| 14 | หลุมเจาะมีโพรง |

| หลุมที่ | ลักษณะหลุมเจาะ | หลุมที่ | ลักษณะหลุมเจาะ | หลุมที่ | ลักษณะหลุมเจาะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | หลุมเจาะมีน้ำ | 38 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 61 | หลุมเจาะมีโพรง |
| 16 | หลุมเจาะมีโพรง | 39 | หลุมเจาะมีน้ำ | 62 | หลุมเจาะมีน้ำ |
| 17 | หลุมเจาะมีโพรง | 40 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 63 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น |
| 18 | หลุมเจาะมีน้ำ | 41 | หลุมเจาะมีน้ำ | 64 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น |
| 19 | หลุมเจาะมีน้ำ | 42 | หลุมเจาะมีโพรง | 65 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น |
| 20 | หลุมเจาะมีโพรง | 43 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 66 | - |
| 21 | หลุมเจาะมีน้ำ | 44 | หลุมเจาะมีโพรง | 67 | - |
| 22 | หลุมเจาะมีน้ำ | 45 | หลุมเจาะมีโพรง | 68 | - |
| 23 | หลุมเจาะมีน้ำ | 46 | หลุมเจาะมีน้ำ | 69 | - |
| 24 | หลุมเจาะมีน้ำ | 47 | หลุมเจาะมีโพรง | 70 | - |
| 25 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 48 | หลุมเจาะมีโพรง | 71 | - |
| 26 | หลุมเจาะมีน้ำ | 49 | หลุมเจาะมีโพรง | 72 | - |
| 27 | หลุมเจาะมีโพรง | 50 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 73 | - |
| 28 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 51 | หลุมเจาะมีน้ำ | 74 | - |
| 29 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 52 | หลุมเจาะมีโพรง | 75 | - |
| 30 | หลุมเจาะมีน้ำ | 53 | หลุมเจาะมีโพรง | 76 | - |
| 31 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 54 | หลุมเจาะมีโพรง | 77 | - |
| 32 | หลุมเจาะมีน้ำ | 55 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 78 | - |
| 33 | หลุมเจาะมีน้ำ | 56 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 79 | - |
| 34 | หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น | 57 | หลุมเจาะมีโพรง | 80 | - |
| 35 | หลุมเจาะมีโพรง | 58 | หลุมเจาะมีน้ำ | 81 | - |
| 36 | หลุมเจาะมีน้ำ | 59 | หลุมเจาะมีโพรง | 82 | - |
| 37 | หลุมเจาะมีน้ำ | 60 | หลุมเจาะมีโพรง | 83 | - |
