เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบคู่มือพักอาศัยนิติบุคคลอาคารชุด วิธีม พหล-อารีย์

ระเบียบที่ 1 เรื่องการอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ห้องชุด และทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 1. ระเบียบว่าด้วยการอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ห้องชุด และทรัพย์ส่วนกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุด) และผู้พักอาศัยในอาคารชุด บริวาร ผู้มาติดต่อ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ ในการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวมกันและเป็นระเบียบปฏิบัติที่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคารชุด บริวาร ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัยในอาคารชุด

ข้อ 2. ในระเบียบนี้

"ผู้พักอาศัย" หมายถึง เจ้าของร่วม บริวาร ผู้แทน ผู้เช่า หรือ ผู้พักอาศัยในห้องชุดโดยใช้สิทธิของเจ้าของร่วม

"ผู้มาติดต่อ" หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในห้องชุด แต่มาติดต่อผู้พักอาศัยเป็นครั้งคราว

"นิติบุคคลอาคารชุด" หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด วิธีม พหล-อารีย์

"ผู้จัดการนิติบุคคล" หมายถึง บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอฟี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตามบทเฉพาะกาลในข้อบังคับ และจะต้องได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) ให้ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการนิติบุคคล ในเรื่องการจัดการ และบำรุงรักษาอาคาร เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ผู้จัดการนิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคล ดอยดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และเป็น ระเบียบของอาคาร ในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความคิดริเริ่มของตนเองสั่งหรือกระทำการใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร ดังเช่น วิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง นอกจากนี้ผู้จัดการนิติบุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุใน พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม

"ฝ่ายจัดการ" หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัย ความ สะอาด และการบริการให้ท่านเจ้าของร่วม ให้มีความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาว่าจ้าง อันได้แก่ ผู้จัดการอาคาร, เจ้าหน้าที่ธุรการ, หัวหน้าช่างเทคนิค, ช่างเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคารชุด ฝ่ายจัดการ จะเปิดทำการวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-19.00 น.

"ทรัพย์ส่วนกลาง" หมายถึง ทรัพย์ส่วนกลางประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของอาคารชุด ยกเว้นส่วนที่ระบุให้เป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนบุคคล หรือกรรมสิทธิ์ของเจ้าของร่วม ทรัพย์ส่วนกลางนี้ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ลานจอดรถ, สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องซาวน่า, ห้องสตีม, ห้องประชุม, สำนักงานฝ่ายจัดการ สวน และทางเดินรถ รวมถึงโถงล็อบบี้, ทางเดิน ในอาคารและห้องใช้สอยส่วนกลางต่างๆ และอื่นๆ สำหรับการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งมีเพียงเจ้าของร่วมเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนกลางร่วมกัน

"ห้องชุด" หมายถึง พื้นที่ในห้องชุด กำแพงด้านนอกที่จับไม่ถึงจนถึงชุดกึ่งกลางของกำแพงที่ ใช้ร่วมกับห้องชุดที่ติดกัน, เหนือเพดานขึ้นไปจนถึงชุดกึ่งกลางของห้องชุดด้านบนรวมถึงพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล (ถ้ามี) ซึ่งถูกกำหนดไว้ในโฉนด (อช.2) โดยมีอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ร่วมของอาคารชุด ด้วยส่วนแบ่งของทรัพย์ส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ที่ได้จดทะเบียนที่กรมที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ 3. ภายใต้ระเบียบการอยู่อาศัย เจ้าของร่วม ผู้อยู่อาศัยต้องดูแลห้องชุดของตนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย มีความปลอดภัย และไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยในห้องชุดอื่น เช่น

3.1 การส่งเสียงดัง (เปิดเพลงจัดปาร์ตี้ เสียงดังในห้อง, พูดคุยเสียงดัง) รวมถึงการประกอบอาหารที่มีกลิ่นฉุนเป็นต้น

3.2 ห้ามไม่ให้จุดธูป เทียน หรือการปรุงอาหาร ฉุ่นอาหาร ตลอดการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดควัน หรือประกายไฟ โดยประมาทอันอาจจะส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หากฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับ ปรับไม่เกิน 10,000 (หมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน เงินค่าปรับต่างๆ นำฝากเข้าบัญชีนิติบุคคลฯ และหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์ ส่วนกลาง หรือทรัพย์ของผู้อื่น จะต้องชำระค่าเสียหายตามจริง

ข้อ 4. ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบุหรี่บริเวณระเบียงห้องชุด และพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้ง ทิ้งก้นบุหรี่ บริเวณ พื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่สถานที่ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดได้จัดไว้ให้เป็นสถานที่สูบบุหรี่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามของอาคาร ชุด รวมถึงความปลอดภัยในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และควันบุหรี่ไปรบกวนผู้ชื่นหรือห้องชุดอื่น หากฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน เงินค่าปรับต่างๆ นำฝากเข้าบัญชีนิติบุคคลฯ

ข้อ 5. ห้ามผู้พักอาศัยทำการก่อสร้าง/ดัดแปลงแก้ไข/ต่อเติมห้องชุด ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

5.1 ห้ามสกัด เจาะ หรือดัดแปลงแก้ไขพื้น เพดาน ผนังกั้นห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง ผนังห้องชุดบริเวณ ระเบียงด้านหลังและผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น และการกระทำใดๆ ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของตน อันจะเป็นการ กระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคาร หรือระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด

5.2 เจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัยห้องชุด ที่มีความประสงค์จะดัดแปลงแก้ไขหรือตกแต่งห้องชุด จะต้องส่งแบบแปลน พร้อมรายละเอียดให้นิติบุคคลอาคารชุด พิจารณาตรวจสอบก่อนดำเนินการ (ตามระเบียบที่ 2)

5.3 ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงวัสดุ สี แบบ และรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมบริเวณผนังด้านนอกที่ติดกับ ทางเดินร่วม หรือผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง และรวมไปถึงราวระเบียงเพื่อความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมของ อาคารชุด และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัสดุ สี ขนาด ตำแหน่งและทิศทางการเปิด-ปิด รวมประตูที่ติดกับทางเดินร่วม และหน้าต่าง ด้านหลังห้องชุดโดยเด็ดขาด

5.4 เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยห้องชุด ประสงค์ที่จะติดแผ่นกรองแสง บริเวณหน้าต่างห้องชุด นิติบุคคลอาคารชุด อนุญาต ให้ทำการติดแผ่นกรองแสงที่ไม่กระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด ดังนี้

- ความโปร่งใส ไม่เกิน 60%
- การสะท้อนแสง ไม่เกิน 7.5%
- สีเป็นแบบใสเท่านั้น ห้ามเป็นสีดำ เขียว หรือสีอื่นๆ

5.5 ห้ามติดตั้งประตูเหล็กดัดที่ติดกับทางเดินร่วม และหรือห้ามติดตั้งเหล็กดัด กันสาดผ้าใบ หรือวัสดุอื่นใด บริเวณหน้าต่าง และระเบียงด้านนอกอาคาร

ข้อ 6. เจ้าของร่วมที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เพิ่มเติม) ต้องติดตั้งในตำแหน่ง และรูปแบบที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดกำหนดไว้เท่านั้น หากเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามนิติบุคคลอาคารชุด สามารถดำเนินการรื้อถอนออกได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัยเอง

ข้อ 7. การขนย้ายทรัพย์สิน เข้า ออก ห้องชุด เจ้าของร่วม และหรือผู้พักอาศัย จะต้องกรอกแบบฟอร์มการนำทรัพย์สินเข้า-ออก ห้องชุด ณ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ภายในเวลาทำการ และนำแบบฟอร์มดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนการขนย้าย ทรัพย์สิน เข้า- ออก โดยอนุญาตให้ขนย้ายระหว่างเวลา 8.00 น.-18.00 น. หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องได้รับการอนุญาต จากฝ่ายจัดการ เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และไม่รบกวนการอยู่อาศัยของห้องชุดอื่น

ข้อ 8. ห้ามวางของเท้า หรือวัสดุอื่นใด บริเวณทางเดินส่วนกลาง และพื้นที่ส่วนกลางอื่น รวมทั้ง ห้ามติดป้าย ขาย เช่า หรือแผ่นภาพ โฆษณาบริเวณผนัง กระจกห้องชุด หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด และห้ามตากผ้านวม, ผ้าห่ม บริเวณผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด ที่มี ผลกระทบต่อทัศนียภาพของอาคารชุด ไม่ว่าด้านนอกหรือด้านในห้องชุด

ข้อ 9. เรื่องต่อไปนี้ห้ามดำเนินการโดยเด็ดขาด

9.1 ห้ามเปลี่ยนแปลงระบบเตือนภัย และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารชุด รวมทั้งภายในห้องชุด

9.2 ห้ามเลี้ยงสัตว์ ที่จะสร้างความรำคาญ น่ากลัว น่ารังเกียจ ภายในห้องชุด หรือ นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณอาคาร ชุด และพื้นที่ส่วนกลาง

9.3 ห้ามเจ้าของห้องชุดหรือ ผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดประกอบอาหารในห้องโดยใช้เตาถ่าน หรือใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง และ หรือเชื้อเพลิงอื่นที่ก่อให้เกิดอันตราย ความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของร่วมโดยเด็ดขาด

ข้อ 10. เจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัย ต้องยินยอมให้พนักงานฝ่ายจัดการ หรือช่างเทคนิค เข้าทำการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไข ในกรณีที่ทรัพย์ส่วนกลาง หรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือนอันเนื่องมาจาก วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้น ชำรุดบกพร่อง

ข้อ 11. ผู้พักอาศัยต้องใช้คีย์การ์ด เปิดประตูเข้า – ออก อาคาร และการเปิด - ปิด ลิฟต์โดยสาร ด้วยตนเอง และต้องมารับแขก หรือ ผู้มาติดต่อ หรือ หนักงานส่งของ ที่บริเวณโถงล็อบบี้ ของอาคารชุดด้วยตนเองทุกครั้ง รวมถึง แขก หรือผู้มาติดต่อ หรือผู้มาส่งของต้องปฏิบัติ ตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดอย่างเคร่งครัด และห้ามผู้พักอาศัยใช้คีย์การ์ด เปิดประตูให้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ แขก หรือผู้มาติดต่อ ที่มา พบหรือมาส่งของ หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นเดินตามเข้ามาภายในอาคารชุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายแฝงตัวเข้ามาลักทรัพย์ หรือโจรกรรม ในอาคารชุด ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดรีบแจ้งให้ฝ่ายจัดการ รับทราบทันที

ข้อ 12. นิติบุคคลอาคารชุด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ ที่ประพฤติตัวไม่สุภาพหรือกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อระเบียบและ ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 13. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง และนิติบุคคลอาคารชุด ได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องในเวลาที่ กำหนดแล้ว ยังคงเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุด ถือว่าผู้นั้นจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ และจะดำเนินการมาตราการ ดังต่อไปนี้

13.1 กรณีฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 500 บาท (ห้าร้อย บาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน เงินค่าปรับต่างๆ นำฝากเข้าบัญชีนิติบุคคลฯ

13.2 หากนิติบุคคลอาคารชุด ได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระหนี้ค่าปรับแล้ว ผู้นั้นยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุด มีสิทธิระงับ การให้บริการส่วนกลาง หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางผู้นั้นก็ได้ เช่น การระงับสิทธิในการใช้น้ำประปา สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถ สิทธิการใช้คีย์การ์ดเข้าพื้นที่จอดรถ สิทธิการให้บริการสันทนาการ เป็นต้น จนกว่าจะชำระหนี้ค่าปรับครบถ้วน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

13.3 ในการดำเนินการมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ฝ่าฝืน ฝ่ายจัดการฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการทุกครั้ง

13.4 หากการฝ่าฝืนระเบียบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ฝ่าฝืนอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย

ระเบียบที่ 2 เรื่องการตกแต่งห้องชุด

เพื่อการป้องกันโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรง การตกแต่งห้องชุดมิดจากแบบสถาปัตยกรรมของอาคารชุด การรักษาความปลอดภัย และการรบกวนสิทธิของผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์ จึงขึ้นจงระเบียบการตกแต่งห้องชุด ดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่เจ้าของห้องชุด, ผู้พักอาศัย, ผู้เช่า, ผู้รับเหมา, คนงาน หรือบุคคลใดๆ ที่เข้าไปภายใน หรือรอบเขตของ อาคารชุด โดยการกระทำใดๆ ของ ผู้รับเหมา, คนงาน ที่เข้ามาทำการตกแต่งห้องชุดใดให้ถือว่าเป็นการกระทำของเจ้าของห้องชุด นั้นด้วย

ข้อ 2. บุคคลตามข้อ 1. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งห้องชุด อย่างเคร่งครัด และจะปฏิเสธไม่ทราบระเบียบต่างๆ ของนิติ บุคคลอาคารชุด มิได้

2.1 เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยห้องชุด ประสงค์ที่จะติดแผ่นกรองแสง บริเวณหน้าต่างห้องชุด นิติบุคคลอาคารชุด อนุญาต ให้ทำการติดแผ่นกรองแสงที่ไม่กระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด ดังนี้

- ความโปร่งใส ไม่เกิน 60%
- การสะท้อนแสง ไม่เกิน 7.5%
- สีเป็นแบบใสเท่านั้น ห้ามเป็นสีดำ เขียว หรือสีอื่นๆ

ข้อ 3. การเข้าตกแต่งห้องชุด เจ้าของห้องชุดจะต้องยื่นแบบแปลน การตกแต่งห้องชุดจำนวน 2 ชุด พร้อมตารางเวลาการทำงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน และรายงานผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยส่งให้ฝ่ายจัดการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้พิจารณาผลกระทบ ต่องานระบบไฟฟ้า ประปา และโครงสร้างของห้องชุด ก่อนพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตกแต่งห้องชุดนั้น หากนิติบุคคลอาคารชุด พิจารณา แล้วมีผลกระทบ จะแจ้งให้ทำการแก้ไขแบบแปลนการตกแต่ง ให้เจ้าของห้องชุดทำการแก้ไข และส่งแบบแปลนการตกแต่งห้องชุดฉบับใหม่ พร้อมนี้จะแจ้งผลรองการพิจารณาให้กับเจ้าของร่วม ทราบภายใน 3 วัน

ข้อ 4. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ทำการตกแต่งห้องชุดแล้วเจ้าของห้องชุดต้องวางเงินค้ำประกันความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลางและ ค่าบริการต่างๆ ในอัตรา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ยกเว้น การตกแต่งโดยการติดตั้ง หรือยึดประกอบ รวมไปถึงการดำเนินการที่ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน โดยทำการสั่งจ่ายเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์" ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้าทำการตกแต่งห้องชุด

ข้อ 5. ไม่อนุญาตให้เจ้าของห้องชุดทำการผลิตชิ้นงานต่างๆ ภายในห้องชุด เช่น เลื่อยไม้ การขัดผิว การทำสีชิ้นงาน หรือเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ โดยชิ้นงาน หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งต้องผลิตมาจากภายนอกแล้วนำมาประกอบภายในห้องชุดเท่านั้น หากจำเป็นต้องเก็บงาน ต้อง ขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดเป็นคราวๆ ไป

ข้อ 6. เจ้าของห้องชุดจะต้องทำการบันทึกรายละเอียดในการขอเข้าตกแต่ง ตามแบบฟอร์มที่นิติบุคคลอาคารชุด กำหนดไว้ นิติ บุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิในการนัดหมาย หรือการจัดการรายละเอียดของงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้รบกวนสิทธิส่วนบุคคล ในการพัก อาศัยของเจ้าของร่วมท่านอื่นๆ ภายในอาคารทุกวันก่อนทำงาน เจ้าของห้องชุดหรือผู้รับเหมาต้องแจ้งรายชื่อคนงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารชุด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ อาจจะมอบหมายให้พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานนิติ บุคคลอาคารชุด ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้ตรวจเช็คได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 7. อนุญาตให้เข้าทำการตกแต่งห้องชุด ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยไม่อนุญาตให้เข้าทำการตกแต่ง ห้องชุด ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการฯ เป็นคราว ๆ ไป โดยงานที่เข้าทำตกแต่ง จะต้องไม่มี กลิ่น เสียงรบกวน ผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด กรณี ที่ต้องทำงานล่วงเวลาต้องทำการแจ้งกับฝ่ายจัดการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการ (ยกเว้น) งานล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สามารถล้างทำความสะอาดได้ทุกวัน ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.

ข้อ 8. เจ้าของห้องชุด ควรนำถังดับเพลิงสภาพพร้อมใช้งานขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง มาประจำไว้ภายในห้องชุด เพื่อ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากการตกแต่งห้องชุด

ข้อ 9. ในกรณีการตกแต่ง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงห้องชุด เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง หรือมลภาวะใดๆ อันเกิดจากการตกแต่ง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงห้องชุด ผู้รับเหมา คนงาน จะต้องทำการปิดประตูและหน้าต่างทุกบานของห้องชุด หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถป้องกันเหตุดังกล่าว

ข้อ 10. การขนย้ายวัสดุสิ่งของ เครื่องมือช่าง ตลอดจนสัมภาระต่างๆ ต่อนิติบุคคลอาคารชุด ให้ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด สงวนสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจค้นได้ตลอดเวลา หากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย

ข้อ 11. เมื่อเลิกการทำงานตกแต่งห้องชุดในแต่ละวัน ผู้รับเหมา คนงาน จะต้องทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกห้องชุด เช่น ทางเดินร่วม โถงลิฟท์ บันได ที่ใช้ในการขนย้ายทรัพย์สิน ให้เรียบร้อย รวมทั้งเก็บขยะ หรือเศษอาหารทิ้งลงในถังขยะส่วนกลาง แต่หากเป็น วัสดุก่อสร้าง หรือขยะชิ้นใหญ่ ให้ผู้รับเหมา คนงาน นำใส่ถุง นำกลับออกไปทิ้งนอกอาคารชุด

ข้อ 12. เจ้าของร่วม จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมในการตกแต่ง ต่อเติม ห้องชุด ในอัตราเดือนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ หากตกแต่ง ต่อเติมไม่เกิน 7 วัน จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยนิติบุคคลอาคารชุด จะทำการหักจากเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่เจ้าของร่วมได้ค้ำประกันไว้กับนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 13. ห้ามตกแต่งต่อเติมสิ่งใดรุกล้ำ หรือยื่นเข้าไปในบริเวณทรัพย์ส่วนกลางหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการกระทบกระเทือน ต่อโครงสร้าง ระบบประปา ไฟฟ้า ความมั่นคง หรือระบบการป้องกันความเสียหายของอาคาร รวมทั้งความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเด็ดขาด รวมทั้ง ห้ามปรับเพิ่มความหนาของพื้นห้องชุด เว้นแต่การปรับนั้นไม่กระทบ ต่อโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชุด โดย ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ตรวจแบบ

ข้อ 14. ห้ามนำวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ตกแต่ง ทุกชนิดมาวางหรือจัดเก็บไว้ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด โดยเด็ดขาด ยกเว้นจะ ได้รับการอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด เท่านั้น

ข้อ 15. ห้ามขนถ่ายวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดยาวมากเกินขนาดชิ้น - ลงลิฟต์, บันไดหนีไฟ และพื้นที่ส่วนกลาง จะต้องตัดให้ เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายเพื่อเป็นการป้องกันการชนครีดผนังและกระทบกระแทกหลอดไฟ และทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ

ข้อ 16. ห้ามนำสิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟทุกชนิดมาเก็บรอไว้ในอาคารโดยเด็ดขาด เช่น น้ำมัน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ เมื่อเลิกจากการ ปฏิบัติงานให้นำกลับไปด้วยทุกครั้ง

ข้อ 17. ห้ามผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานตกแต่งห้องชุด ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด ใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปาจาก จุดที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางโดยเด็ดขาดให้ผู้รับเหมาคนงานใช้ภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งต่อเติมเท่านั้น

หากกรณีต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง ผู้รับเหมา คนงาน จะต้องชำระค่าบริการการใช้ไฟฟ้า ต่อวันๆ ละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง

ข้อ 18. ให้ผู้รับเหมาและคนงานใช้ห้องน้ำภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น และ ในระหว่างที่ปฏิบัติงานหรือระหว่างพักการ ทำงาน ห้ามผู้รับเหมาและคนงาน สูบบุหรี่ภายในอาคารชุดโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องชุด ทางเดินร่วมหรือบันไดหนีไฟ รวมทั้ง ห้าม ดื่มสุรา, เล่นการพนัน, ทะเลาะวิวาท, ส่งเสียงดังรบกวน หรือเล่นกีฬาทุกชนิดภายในอาคาร และให้อยู่ภายในห้องชุดที่ดำเนินการตกแต่ง เท่านั้น

ข้อ 19. ห้ามผู้รับเหมา และคนงานพักอาศัยในอาคารชุด ไม่ว่าในเวลาใด ยกเว้นการทำงานล่วงเวลา ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ข้อ 20. ผู้รับเหมา และคนงาน ควรปฏิบัติตัวขณะทำงาน และอยู่ในอาคารชุด ดังนี้

20.1 ห้ามดึงสัญญาณอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ หรือ ตัดสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือก่อให้เกิดสัญญาณแจ้งเตือน หากฝ่าฝืน สงวนสิทธิ์ในการระงับงานและปรับตามระเบียบนี้

20.2 ผู้รับเหมา และคนงาน ต้องแต่งกายรัดกุมสุภาพ หรือเป็นเครื่องแบบของบริษัทรับจ้างนั้นๆพร้อมติดบัตรผู้รับจ้างให้ เห็นชัดเจนตลอดเวลาทำงาน หรือภายในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของอาคารชุด และต้องทำการส่งมอบบัตรคืนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารหลังจากเลิกงานทุกวันถ้าไม่ติดบัตรจะถือว่าเป็นการตักเตือน และหากเพิกเฉยจะระงับการเข้าทำงานทันที

20.3 ห้ามผู้รับเหมา คนงาน เปิดประตูห้องที่กำลังตกแต่ง ทิ้งไว้ขณะทำงาน รวมถึงประตูหนีไฟค้างไว้ และหลังเลิกงานใน แต่ละวันจะต้องตรวจเช็คปิดประตูหน้าต่าง และบานเลื่อนให้เรียบร้อย ก่อนออกจากห้องชุดทุกครั้ง

20.4 ผู้รับเหมาจะต้องใช้สิฟต์ขนของเท่านั้นห้ามใช้สิฟต์โดยสารโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนปรับตามระเบียบนี้

20.5 ห้ามนำน้ำปูน เศษปูน หรือน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งทิ้งลงในท่อระบายน้ำทิ้ง หรือ โถส้วมโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะ ดำเนินการปรับตามระเบียบนี้

20.6 นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ ในการค้นตัว ผู้รับเหมาหรือคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างของเจ้าของห้องชุด ตามดุลพินิจของผู้จัดการอาคาร ได้

20.7 ผู้รับเหมาจะต้องดูแลความสะอาดรอบๆ ท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมด พร้อมทั้งดูแลชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานตลอดเวลา สำหรับท่อน้ำทิ้งที่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์กันหรือสุขภัณฑ์ จะต้องทำการปิดปลายท่อเพื่อป้องกันเศษวัสดุที่ก่อให้เกิด การอุดตันลงในท่อระบายน้ำ หากฝ่าฝืนปรับตามระเบียบนี้

20.8 ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งออกจากพื้นที่ตกแต่งให้ฝ่ายจัดการ ทราบก่อนสิ้นสุดงานตกแต่งไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้ง กำหนดนัดหมายตรวจสอบพื้นที่หลังตกแต่ง เพื่อขอคืนเงินค้ำประกัน ในกรณีที่ตรวจสอบพื้นที่ไม่มีการแก้ไข นิติบุคคลอาคารชุดจะทำเช็คสั่งจ่ายเงินค้ำประกันคืนให้กับผู้จ่ายเงินภายใน 30 วัน

ข้อ 21. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง และนิติบุคคลอาคารชุด จะแจ้งให้ระงับการตกแต่งห้องชุดทันที จนกว่าจะได้ปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากยังคงเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุด จะไม่อนุญาตให้เข้าทำการตกแต่งต่อเติมห้องชุด อีก ต่อไป และอาจจะดำเนินการมาตรการ ดังต่อไปนี้

21.1 กรณีฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

21.2 หากนิติบุคคลอาคารชุด ได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระหนี้ค่าปรับแล้ว ผู้นั้นยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุด มีสิทธิ์ระงับ การให้บริการส่วนกลาง หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางผู้นั้นก็ได้ เช่น การระงับสิทธิในการใช้น้ำประปา สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถ สิทธิการ ใช้คีย์การ์ดเข้าพื้นที่จอดรถ สิทธิการให้บริการส้นทนาการ เป็นต้น จนกว่าจะชำระหนี้ค่าปรับ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

21.3 ในการดำเนินการมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ฝ่าฝืน ฝ่ายจัดการ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการทุกครั้ง

21.4 หากการฝ่าฝืนระเบียบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ฝ่าฝืนอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย

ระเบียบที่ 3 เรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุดสำหรับบริการเช่าพักอาศัย และการขาย

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการใช้ประโยชน์ห้องชุด สำหรับบริการเช่าพักอาศัยและการขาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุด สามารถบริหารจัดการข้อมูลการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมท่านใหม่ และหรือ ผู้เช่าห้องชุดรายใหม่ และควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคารชุด นิติบุคคล จึงขอให้เจ้าของร่วมทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบการใช้ประโยชน์ห้องชุดสำหรับบริการเช่าพักอาศัย และการขายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ข้อ 1. นิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายจัดการ ไม่มีบริการรับฝากขาย - ฝากเช่า ให้กับเจ้าของร่วม แต่อย่างใด ซึ่งหากเจ้าของร่วม มีความประสงค์จะฝากขาย ฝากเช่าห้องชุด ให้เจ้าของร่วมทำการจัดหาตัวแทน และ/หรือโบรกเกอร์เอง หรือติดต่อบริษัท บางกอก ซิตี้ สมาร์ท จำกัด (BC) หรือ บริษัทอื่น เป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าว

ข้อ 2. ห้ามเจ้าของร่วมใช้ห้องชุดโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว (รายวัน) สำหรับเดินทาง หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น หากฝ่าฝืนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย

ข้อ 3. เจ้าของร่วมที่ให้ผู้อื่นเช่าพักอาศัย มีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของห้องชุดที่ให้ผู้เช่า อาศัย โดยจะอ้างเหตุการณ์เช่าพักอาศัยมาปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่ได้โดยเด็ดขาด

ข้อ 4. ในกรณีที่เจ้าของร่วมฝากกุญแจ หรือคีย์การ์ดห้องชุดไว้ที่ฝ่ายจัดการ ในการเบิกจ่ายกุญแจ หรือคีย์การ์ดเข้า – ออก ห้องชุด ฝ่ายจัดการ จะทำบันทึกผู้มาติดต่อไว้ลงในสมุดบันทึกทุกครั้ง แต่จะไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปดูแลการเปิด - ปิดห้องชุด รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายของห้องชุด หรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล ของเจ้าของร่วมโดยเด็ดขาด

ข้อ 5. เจ้าของร่วมต้องส่งเอกสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าพักอาศัย แก่นิติบุคคลอาคารชุด ดังนี้

5.1 แจ้งระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการเช่าห้องชุด

5.2 รายชื่อผู้เช่าพักอาศัยภายในห้องชุด

5.3 แจ้งชื่อ ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และสถานที่ทำงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินของผู้เช่า และผู้พักอาศัยในห้องชุด

5.4 แจ้งหรือระบุการได้สิทธิในการใช้บริการสันทนาการ คีย์การ์ด สำหรับจอดรถ คีย์การ์ดสำหรับการเข้าอาคารชุด และ สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถของอาคาร

5.5 ส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าพักอาศัยและบริวารทุกคน

5.6 แจ้งให้ผู้เช่าพักอาศัยภายในห้องชุด รวมถึงบริวารทุกคนทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคล อาคารชุดทุกประการ ทั้งนี้สามารถรับได้ที่ฝ่ายจัดการ ทุกวันเวลาทำการ

5.7 กรณีที่ผู้เช่าอาศัยเป็นชาวต่างชาติ (เพิ่มเติมจาก ข้อ 4.1 - 4.6) ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ก่อนให้เช่าพักอาศัย เจ้าของร่วม และ/หรือโบรกเกอร์ ควรทำการตรวจสอบการเข้าเมืองของผู้เช่าพักอาศัยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วส่งสำเนา ส่งถัดมาให้กับนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 6. เจ้าของร่วมต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย หรือการกระทำของผู้เช่าพักอาศัย หรือบริวารซึ่งเกิดขึ้น กับทรัพย์ส่วนกลาง หรือ ต่อเจ้าของร่วมรายอื่นโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุด ไม่สามารถตามผู้เช่าพักอาศัย หรือบริวาร มารับผิดชอบได้

ข้อ 7. กรณียกเลิกการเช่าห้องชุด หรือเปลี่ยนตัวผู้เช่าห้องชุด เจ้าของร่วมต้องแจ้งให้นิติบุคลอาคารชุดทราบทันที และต้องส่งเอกสารเพื่อจัดทำข้อมูลทะเบียนผู้พักอาศัยใหม่ด้วยทุกครั้ง เพื่อนิติบุคคลอาคารชุดจะได้ปรับปรุงข้อมูลการอยู่อาศัยของ อาคารชุด ทั้งนี้ หากเจ้าของร่วม ประสงค์ให้ทำการลบข้อมูล บัตรคีย์การ์ด จะต้องให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการ

ข้อ 8. การขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องชุด ผู้เช่าพักอาศัย จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมก่อน โดยเจ้าของร่วมจะต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มการนำทรัพย์สิน เข้า-ออก ห้องชุดที่ให้เช่า ด้วยตนเอง แล้วให้ผู้เช่านำยื่นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อน นำทรัพย์สิน เข้า-ออก ทุกครั้ง กรณีที่เจ้าของห้องชุดไม่สะดวกในการกรอกแบบฟอร์ม ด้วยตนเอง สามารถที่จะใช้วิธีการส่งเอกสาร (โทรสาร สแกนส่งอีเมล์ ที่สามารถยืนยันตัวตนของเจ้าของร่วมได้) กลับมายังนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินขนย้ายทรัพย์สิน เข้า-ออก

ข้อ 9. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 2 ครั้ง ให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลา ที่กำหนดแล้ว หากยังดงเพิกเฉย ถือว่าผู้นั้นจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ และอาจจะดำเนินการมาตรการ ดังต่อไปนี้

9.1 กรณีฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 500 บาท ตลอด ระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

9.2 หากนิติบุคคลอาคารชุด ได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระหนี้ค่าปรับแล้ว ผู้นั้นยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิ์ระงับการ ให้บริการส่วนกลาง หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางผู้นั้นก็ได้ เช่น การระงับสิทธิในการใช้น้ำประปา สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถ สิทธิการใช้ คีย์การ์ดเข้าพื้นที่จอดรถ สิทธิการให้บริการสันทนาการ เป็นต้น จนกว่าจะชำระหนี้ค่าปรับ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

9.3 ในการดำเนินการมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ฝ่าฝืน ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการทุกครั้ง

9.4 หากการฝ่าฝืนระเบียบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง ค่าเสียหายกับผู้ฝ่าฝืนอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย

ระเบียบที่ 4 เรื่อง การใช้พื้นที่จอดรถภายในอาคารชุด

เพื่อการจัดระเบียบ และอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่จอดให้กับเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด จึงขอชี้แจง ระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถภายในอาคารชุด ดังนี้

ข้อ 1. พื้นที่จอดรถมีไว้สำหรับ เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ของนิติบุคคลอาคารชุดริธึ่ม พหล-อารีย์ เท่านั้น และจะต้องติดสติ๊กเกอร์ จอดรถ ไว้บริเวณที่มองเห็นชัดเจน ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้พื้นที่จอดรถโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะมาติดต่อกับเจ้าของร่วม / ผู้พัก อาศัย เป็นครั้งคราวเท่านั้น ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ไม่เถียว่าการให้พื้นที่จอดรถ เป็นการรับฝากรถแต่อย่างใด ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายกับ รถ หรือการสูญหายของทรัพย์สินใดๆ ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ เจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งสิ้น

ข้อ 2. สิทธิการจอดรถในอาคารชุดสำหรับเจ้าของร่วม ให้เป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ซื้อ โดย กำหนดสิทธิการจอดรถห้องชุดละ 1 คัน ซึ่งพื้นที่จอดรถถือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ที่ระทุกคันสามารถจอดได้ทุกช่อง ทุกชั้น ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคาร ชุด ไม่อนุญาตให้จำหน่าย โอนสิทธิ หรือให้เช่าสิทธิการจอดรถ กับ เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยในอาคารชุดรายอื่น

ข้อ 3. นิติบุคคลอาคารชุดจะให้บัตรคีย์การ์ดและสติ๊กเกอร์ (ที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถได้ไม่เกิน 2 หมายเลขทะเบียน) สำหรับจอดรถได้ตามข้อ 2. โดยเจ้าของร่วมต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแสดงหลักฐาน ในการขอบัตรคีย์การ์ด และสติ๊กเกอร์จอดรถ ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2)

3.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3.3 สำเนาทะเบียนรถ กรณีป้ายแดง ให้ยื่นประกอบในภายหลังเมื่อได้ทะเบียนรถตัวจริงแล้ว

กรณีที่บัตรคีย์การ์ด / สติ๊กเกอร์สูญหาย ให้เจ้าของร่วมทำการแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน จากนั้นนำ เอกสารการแจ้งความมาขออนุญาตออกบัตรคีย์การ์ด และสติ๊กเกอร์จอดรถใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายใบละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ สำหรับบัตรคีย์การ์ด ที่เข้า-ออกลานจอดรถนั้น ฝ่ายจัดการจะทำการลบข้อมูลบัตรที่สูญหาย (บัตรเก่า) ออกจากฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ออก เพื่อป้องกันความปลอดภัย และการสิทธิซ้ำซ้อน

ข้อ 4. รถยนต์ที่จะผ่านเข้า-ออกในอาคารจอดรถได้ จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่าระดับความสูงที่แสดงบนป้ายจำกัดความสูง บริเวณ ทางเข้าที่จอดรถภายในอาคารจอดรถ

ข้อ 5. การใช้สิทธิ์จอดรถ ช่องพิเศษ ชั้น G

5.1 ช่องจอดรถช่องพิเศษสามารถจอดได้เฉพาะเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย (รวมผู้โดยสาร) ภายในอาคารชุด ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์ เท่านั้น

5.2 พื้นที่จอดรถพิเศษมีเพียง 3 ช่องจอด เป็นเพียงการจัดสรรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการเท่านั้น ไม่ถือเป็นสิทธิ์ผูกขาดสำหรับคนใดคนหนึ่ง

5.3 กำหนด ผู้มีสิทธิ์จอดรถช่องพิเศษ ได้ 2 ประเภท และจะต้องเป็นผู้ขับรถเองเท่านั้น ดังนี้

- ผู้หญิงตั้งครรภ์ โดยมีอายุครรภ์ 7 เดือน ขึ้นไป (จะต้องแสดงเอกสารทางการแพทย์)
- ผู้พิการ (จะต้องมีบัตรผู้พิการ)

หมายเหตุ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่เข้าเงื่อนไข ข้างต้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตามเห็นสมควร

5.4 ผู้ที่ใช้สิทธิ์จอดรถในช่องพิเศษ จะต้องยื่นความประสงค์ในการจอดพร้อมกับแสดงหลักฐานคุณสมบัติที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 5.3 พร้อมสำเนาทะเบียนรถยนต์ ที่ฝ่านักงานนิติบุคคลฯ

5.5 นิติบุคคลฯ จะทำการออกบัตรช่องพิเศษ ที่ตรงกับหมายเลขทะเบียนรถ ให้กับผู้ที่ประสงค์จอดรถในช่องจอดพิเศษ

5.6 ผู้ที่จอดรถ จะต้องวางบัตรจอดรถที่ทางนิติฯออกให้ไว้บริเวณที่มองเห็นชัดเจน ทุกครั้งขณะจอดรถในช่องจอดพิเศษ

5.7 การออกบัตรจอดรถช่องพิเศษให้กับผู้ใช้รถยนต์ ไม่ใช่การกำหนดสิทธิ์จอดให้กับผู้ใช้งาน ดังนั้นหากมีผู้ใช้งานเต็มท่านสามารถใช้ช่องจอดอื่นทดแทนที่เหมาะสม ตามดุลพินิจของฝ่ายบริหารอาคาร (ระเบียบนี้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยมติคณะกรรมการ)

ข้อ 6. เจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัยในอาคารชุด หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในบริเวณอาคารชุด ต้องจอดรถในพื้นที่ที่ นิติบุคคลอาคารชุดกำหนดเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจอดรถในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต, พื้นที่ห้ามจอด, ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือลักลอบนำรถ เข้ามาจอดในอาคารชุดโดยไม่ได้รับอนุญาต นิติบุคคลอาคารชุดจะดำเนินการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัยในอาคารชุดนำรถคันดังกล่าวออกจากพื้นที่ลานจอดรถภายในเวลา 7 วัน แต่หากยังเพิกเฉย จะทำการล็อคล้อ และทำการคิดค่าปรับตามความในระเบียบนี้ต่อไป

ข้อ 7. ผู้นำรถเข้ามาภายในอาคารจอดรถ และหรือ ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด จะต้องปฏิบัติดังนี้

7.1 ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่า 30 กม. /ชั่วโมง และไม่ขับรถสวนทางขึ้น-ลง

7.2 ให้ขับรถตามเครื่องหมายจราจร และป้ายสัญลักษณ์อย่างเคร่งครัด

7.3 ให้จอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ตรงตามช่องจอดรถ หรือเครื่องหมายที่จัดเตรียมไว้ และจอดรถยนต์ให้ติดแนวกันล้อด้านใน

7.4 ไม่อนุญาตให้จอดรถบรรทุก หรือรถโดยสารทุกชนิดที่มีขนาดใหญ่ ในลานจอดรถ เว้นแต่การจอดชั่วคราว สำหรับขนย้าย ทรัพย์สิน หรือส่งของ ซึ่งต้องแจ้งต่อฝ่ายจัดการให้ทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง

7.5 ไม่จอดรถกีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้า-ออก, การเลี้ยวรถ และการจอดรถของรถคันอื่น

7.6 ไม่อนุญาตให้ล้างรถในบริเวณลานจอดรถ เว้นแต่สถานที่ ที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนดให้เท่านั้น

7.7 ห้ามซ่อมแซมรถ ตกแต่งรถ หรือวางสิ่งของใดๆ บนพื้นที่ลานจอดรถ ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ลานจอดรถเพื่อ การเปลี่ยนอะไหล่รถ จะต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดก่อน

7.8 ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในพื้นที่จอดรถ ใช้พื้นที่จอดรถด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียงดังรบกวนการอยู่อาศัย

7.9 ห้ามเล่นฟุตบอล หรือกีฬาทุกชนิดบริเวณลานจอดรถ

7.10 ไม่นำวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ และสิ่งผิดกฎหมายเก็บไว้ในรถ

7.11 ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันทุกประเภท หรือดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด หรือกระทำการใดๆ อันผิดกฎหมายบริเวณลาน

7.12 ไม่อนุญาตให้มีการจองที่จอดรถ หรือการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน อาทิเช่น การนำวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของใดๆ มาวางบริเวณที่จอดรถ

7.13 เจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัยในอาคารชุด ต้องติดสติ๊กเกอร์ที่รถของตนตลอดระยะเวลาที่นำรถเข้ามาจอดในบริเวณอาคารชุด

7.14 เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในอาคารชุด จะต้องไม่จอดรถในตำแหน่งเดิมโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเกินกว่า 30 วัน

7.15 เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในอาคารชุด หากมีความประสงค์จะใช้กระแสไฟฟ้าส่วนกลาง เพื่อชาร์ตไฟสำหรับรถยนต์ระบบปลั๊กอินไฮบริด ให้แจ้งความประสงค์มายังนิติบุคคล เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้า โดยชำระค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อครั้ง หรือชำระเหมาจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท (ชำระภายในวันที่ 7 ของเดือน)

ซึ่งระยะเวลาชาร์ตต่อครั้งๆ ละไม่เกิน 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ ห้ามชาร์ตไฟรถยนต์เองโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

ข้อ 8. ผู้มาติดต่อ (VISITOR) ซึ่งนำรถเข้ามาภายในบริเวณอาคารชุด จะต้องรับบัตรผ่านเข้า-ออก หรือป้าย VISITOR สำหรับวางที่ กระจกด้านหน้ารถ ทั้งนี้จะต้องทำการแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนงานราชการออกให้ไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และต้องจอดรถในพื้นที่จอดรถ VISITOR ที่กำหนดไว้เท่านั้น

ข้อ 9. ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดการจัดเก็บค่าจอดรถ ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ ผู้มาติดต่อจะต้องปฏิบัติ และทำการชำระค่าใช้พื้นที่ส่วนกลาง สำหรับจอดรถ ในอัตรา ดังนี้

9.1 บัตรผ่านเข้า-ออก ที่ไม่มีการประทับตรานิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของร่วม กำหนดให้สามารถจอดได้ 15 นาทีแรก ชั่วโมงต่อไปคิดค่าใช้พื้นที่จอดรถในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

9.2 บัตรผ่านเข้า-ออก ที่ประทับตรานิติบุคคล หรือเจ้าของร่วม กำหนดให้สามารถจอดได้ 3 ชั่วโมงแรกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชั่วโมงต่อไปจะคิดค่าใช้พื้นที่จอดรถในอัตราชั่วโมงละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

9.3 ในกรณีที่ต้องการจอดค้างคืน คิดค่าใช้พื้นที่จอดรถในอัตรา 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน (สามร้อยบาทถ้วน) โดยนับจากเวลาเข้าจอดแต่ไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป หากเกินจากนี้ให้คิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อ 9.2 ทั้งนี้ อัตราการจัดเก็บค่าจอดรถ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และจะต้องประกาศให้ทราบ ต่อไป

สำหรับผู้ที่มาติดต่องานกับนิติบุคคลอาคารชุด เช่น มาร่วมประชุม จัดส่งสินค้า หรือเข้ามาดำเนินงานตามสัญญาว่าจ้าง เป็นต้น ให้ผู้จัดการอาคารชุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามอนุมัติการจอดรถโดยได้รับการยกเว้นค่าใช้พื้นที่จอดรถในบัตร ผ่านเข้า-ออกได้

ข้อ 10. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลา ที่กำหนดแล้ว หากยังคงเพิกเฉย ถือว่าผู้นั้นจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ และอาจจะดำเนินการมาตรการ ดังต่อไปนี้

10.1 กรณีฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท ถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

10.2 ในกรณีที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยในอาคารชุด ฝ่าฝืนจอดรถในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต, พื้นที่ห้ามจอด หรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนด หรือ ลักลอบนำรถยนต์เข้ามาจอดในอาคารชุดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนต้องชำระค่าปรับในอัตราครั้ง 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าปรับอีกไม่เกินวัน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเสียก่อน จึงจะสามารถนำรถออกได้

10.3 หากนิติบุคคลอาคารชุด ได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระหนี้ค่าปรับแล้ว ผู้นั้นยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิ์ระงับการ ให้บริการส่วนกลาง หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางผู้นั้นก็ได้ เช่น การระงับสิทธิในการใช้น้ำประปา สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถ สิทธิการใช้ คีย์การ์ดเข้าพื้นที่จอดรถ สิทธิการให้บริการสันทนาการ เป็นต้น จนกว่าจะชำระหนี้ค่าปรับ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

10.4 ในการดำเนินการมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ฝ่าฝืน ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการทุกครั้ง

10.5 หากการฝ่าฝืนระเบียบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้อง ค่าเสียหายกับผู้ฝ่าฝืนอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย

ระเบียบที่ 5 เรื่อง การใช้บัตรคีย์การ์ด

นิติบุคคลอาคารชุดได้นำระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร และโครงการด้วยบัตรคีย์การ์ด (Access Control) มาใช้ภายในอาคาร ชุด ประกอบด้วยระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอาคาร และลิฟต์, ระบบความคุมไม่กั้นลานจอดรถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาความ ปลอดภัยภายในอาคารชุด จึงได้กำหนดแนวทาง และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรคีย์การ์ด ดังนี้

ข้อ 1 เจ้าของร่วมมีสิทธิขอรับบัตรคีย์การ์ด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามสิทธิ ดังนี้

1.1 ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 ห้องนอน มีสิทธิได้รับจำนวน 2 ใบ

- คีย์การ์ด เข้า-ออก อาคาร จำนวน 1 ใบ (ใช้เข้า-ออกเฉพาะตัวอาคารเท่านั้น ไม่สามารถเข้า-ออกผ่านไม้กั้นลานจอดรถได้)

- คีย์การ์ด เข้า-ออก และ ไม้กั้นลานจอดรถ จำนวน 1 ใบ

1.2 ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 2 ห้องนอน มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 ใบ

- คีย์การ์ด เข้า-ออก อาคาร จำนวน 2 ใบ (ใช้เข้า-ออกเฉพาะตัวอาคารเท่านั้น ไม่สามารถเข้า-ออก ไม้กั้นลานจอดรถได้)

- คีย์การ์ด เข้า-ออก และ ไม้กั้นลานจอดรถ จำนวน 1 ใบ

ข้อ 2. นิติอาคารชุดไม่อนุญาตให้จำหน่าย จ่ายโอน ขายสิทธิ์ เช่าสิทธิ ในการใช้บัตรคีย์การ์ด และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้อยู่ อาศัยภายในอาคารชุด เท่านั้น

ข้อ 3. กรณีที่ต้องการจัดซื้อบัตรคีย์การ์ดเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ใบ ในอัตราใบละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) กรณีเปลี่ยนบัตรเก่ามาแลกบัตรใหม่ (ชำรุด) ในละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ข้อ 4. กรณีเจ้าของร่วม ทำการปล่อยห้องชุดให้เช่า จะต้องนำคีย์การ์ด ที่ครอบครองอยู่ให้กับผู้เช่าเป็นผู้ใช้ต่อไป ซึ่งหากมีการขอเพิ่ม หรือจัดซื้อใหม่ นิติบุคคลอาคารชุด จะทำการลบข้อมูลในบัตรคีย์การ์ดใบเดิมก่อน แล้วจึงจะออกบัตรคีย์การ์ดใบใหม่ให้กับผู้เช่าพักอาศัย

ข้อ 5. เมื่อเจ้าของร่วม หมดสภาพการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้ถือว่าบัตรคีย์การ์ด สิ้นสภาพไปตามสิทธินั้นเช่นกัน

ข้อ 6. บุคคลใดกระทำการปลอมแปลงบัตรคีย์การ์ด หรือใช้โดยไม่มีสิทธิในการใช้พื้นที่จอดรถของอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด จะ ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้สิทธิที่จอดรถ พร้อมระงับการให้บริการ สาธารณูปโภคส่วนกลาง และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ระเบียบที่ 6 เรื่องการใช้ลิฟต์

ข้อ 1. ระเบียบการใช้ลิฟต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และเพื่อการดูแลรักษาลิฟต์ให้มีสภาพดี และสะอาดอยู่เสมอ

ข้อ 2. ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องลิฟต์โดยสาร ลิฟต์สำหรับลานจอดรถ หรือลิฟต์สำหรับขนของดับเพลิง และระบบลิฟต์โดยรวม

ข้อ 3. กรณีต้องการใช้ลิฟต์ขนวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งห้องชุด หรือขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินต่างๆ ของเจ้าของร่วม ต้องแจ้ง ต่อฝ่ายจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก ทุกครั้ง

ข้อ 4. ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำภายในลิฟต์ และกฎระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 5. ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ไม่ขีดข่วน และใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง และความสุภาพเรียบร้อย

ข้อ 6. กรณีลิฟต์เกิดความเสียหายใดๆ และสามารถตรวจสอบหาผู้กระทำความเสียหายได้ ผู้กระทำและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ตามเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 7. กรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรืออุปกรณ์ในลิฟต์เสียหาย โปรดแจ้งกลับฝ่ายจัดการ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ข้อ 8. ห้ามติดประกาศ หรือข้อความใดๆ ในตัวลิฟต์โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด เท่านั้น

ข้อ 9. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องโดยสารลิฟต์ โดยเด็ดขาด

ข้อ 10. ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเด็ดขาด

ข้อ 11. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง และนิติบุคคลอาคารชุด จะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน เวลาที่กำหนดแล้ว หากยังคงเพิกเฉย ถือว่าผู้นั้นจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ และอาจจะดำเนินการมาตรการ ดังต่อไปนี้

11.1 กรณีฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

11.2 หากนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระหนี้ค่าปรับแล้ว ผู้นั้นยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิ์ระงับการ ให้บริการส่วนกลาง หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางของผู้นั้นก็ได้ เช่น การระงับสิทธิในการใช้น้ำประปา สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถ สิทธิการ ใช้คีย์การ์ดเข้าพื้นที่จอดรถ สิทธิการให้บริการสันทนาการ เป็นต้น จนกว่าจะชำระหนี้ค่าปรับ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

11.3 ในการดำเนินการมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ฝ่าฝืน ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการทุกครั้ง

11.4 หากการฝ่าฝืนระเบียบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด รอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง ค่าเสียหายกับผู้ฝ่าฝืนอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย

ระเบียบที่ 7 เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้อาคารสถานที่ของเจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด จึงขอชี้แจงระเบียบการใช้อาคารสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ดังนี้

ข้อ 1. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยที่มีความประสงค์ที่จะใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ จะต้องแจ้งความจำนงที่จะขอ ใช้ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่กับนิติบุคคลอาคารชุดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยระบุรายละเอียดของการใช้งาน ประกอบด้วย

1.1 แจ้งสถานที่ บริเวณ ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อการนั้นๆ

1.2 แจ้งจำนวนคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นๆ

1.3 แจ้งจำนวนรถยนต์ รถชนของที่จะเข้ามาจอดในบริเวณลานจอดรถ

1.4 แจ้งวัสดุ อุปกรณ์ เช่น อาหาร เครื่องเสียง ไฟฟ้า ฯลฯ ที่จะนำมาประกอบใช้

1.5 แจ้งเวลาเริ่มงาน และสิ้นสุดงาน

1.6 แจ้งความประสงค์ในการขอพนักงานรักษาความปลอดภัย

1.7 แจ้งความประสงค์ในการขอพนักงานรักษาความสะอาด

1.8 ก่อนจะดำเนินการกิจกรรม เจ้าของร่วม และหรือผู้พักอาศัย จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 2 การดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่มีการร้องขอ สามารถใช้งานอาคารสถานที่ได้เฉพาะในช่วงเวลา 08.00 น.-21.00 น. เท่านั้น

ข้อ 3. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอใช้อาคารสถานที่ อัตราชั่วโมงละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) อัตราการจัดเก็บอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 4. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอหนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราชั่วโมงละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) อัตราการจัดเก็บอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 5. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอหนักงานรักษาความสะอาด อัตราชั่วโมงละ 400 บาท (สี่ ร้อยบาทถ้วน) อัตราการจัดเก็บอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด นั้นๆ

ข้อ 6. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ

ข้อ 7. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย จะต้องวางเงินสดค้ำประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในอัตรา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดทันทีที่ยื่นคำขอ และนิติบุคคลอาคารชุดจะทำการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ จากเงิน ดังกล่าว หากยังไม่พอชำระจะเรียกเก็บกับเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ข้อ 8. กรณีการจัดกิจกรรม ส่งผลให้อาคารสถานที่ และอุปกรณ์พื้นที่ส่วนกลางเกิดความเสียหาย เจ้าของร่วม และ /หรือ ผู้พักอาศัย ที่แจ้งความจำนงขอใช้สถานที่อาคารไว้จะต้องรับผิดชอบ และรดใช้ความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุด ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 9. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการตามมติของคณะกรรมการ รวมทั้งสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการกิจกรรมนั้นก่อนหรือตลอดเวลาที่ดำเนินการ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความไม่ ปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในอาคาร และสถานที่ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ที่ดี ของอาคารชุด

ระเบียบที่ 8 เรื่องการใช้สวนส่วนกลาง

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้สวนส่วนกลางของเจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด จึง ขอชี้แจงระเบียบการใช้สวนส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ดังนี้

ข้อ 1. สวนส่วนกลางเปิด ใช้งานในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. และจะปิดหลัง 22.00 น. ของทุกวัน

ข้อ 2. สวนส่วนกลางมิได้สำหรับ นั่งพักผ่อน เดินเล่น หรือทำกิจกรรมที่ไม่เป็นการรบกวนห้องชุดอื่นเท่านั้น

ข้อ 3. โปรดรักษาความสะอาด และเก็บขยะทุกครั้งที่มีการใช้งานสวนส่วนกลาง

ข้อ 4. ห้ามจัดเลี้ยง จัดงานสังสรรค์ อันเป็นการสร้างความรำคาญกับห้องชุดอื่น โดยเด็ดขาด

ข้อ 5. ห้ามเด็ดดอกไม้ กิ่งไม้ หรือทำลายต้นไม้ในสวนส่วนกลาง โดยเด็ดขาด

ข้อ 6. หากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย หรือต้นไม้ตาย ให้แจ้งฝ่ายจัดการรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ข้อ7. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินส่วนตัวเอง นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบในการสูญ หาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด

ข้อ 8. หากเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ทำความเสียหายกับอุปกรณ์ของสวนส่วนกลาง เจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบรดใช้ความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุด ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 9. หากสมาชิก หรือ ผู้พักอาศัยต้องการใช้บริการสวนส่วนกลาง ในการจัดงานเลี้ยง หรือ งานสังสรรค์ใดๆ ขอให้ยึดถือตาม ระเบียบที่ 7 การขอใช้อาคารสถานที่

ข้อ 10. ระเบียบการใช้สวนส่วนกลาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคล อาคารชุด ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

ระเบียบที่ 9 เรื่องการใช้สระว่ายน้ำ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมการออกกำลังกายของเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดนิติบุคคลอาคารชุด จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางเป็นสระว่ายน้ำ ภายในบริเวณอาคารชุด และได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ ดังนี้

ข้อ 1. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

ข้อ 2. สระว่ายน้ำปิดให้บริการเพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา 22.00-06.00 น.

ข้อ 3. ห้ามบุคคลต่อไปนี้ใช้บริการสระว่ายน้ำ

3.1 ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด โรคหัวใจ ความดัน หอบหืด รวมถึงโรคอันตรายอื่นๆ

3.2 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการสระว่ายน้ำโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล

ข้อ 4. ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ

ข้อ 5. ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำตามแบบมาตรฐานสากล

ข้อ 6. โปรดรักษาความสะอาด และชำระล้างร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำ ทุกครั้ง

ข้อ 7. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ำเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ

ข้อ 8. ห้ามนำแก้ว หรือวัสดุสิ่งของที่แตกได้ และเป็นอันตราย เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

ข้อ 9. ห้ามนำอุปกรณ์ที่ใหญ่เกินควรลงมาเล่นในสระว่ายน้ำ ยกเว้นไม้บอร์ดสำหรับกระพุ่มน้ำ หรือบอลสำหรับโยนเล่นในน้ำ ทั้งนี้ การใช้สระว่ายน้ำดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการรบกวน หรือขัดต่อสิทธิ์การใช้บริการของผู้อื่น

ข้อ 10. หากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย หรือความสะอาดของสระว่ายน้ำไม่เป็นปกติ ให้แจ้งฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ข้อ 11. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินส่วนตัวเอง นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบในการสูญ หาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด

ข้อ 12. หากเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ทำความเสียหายกับอุปกรณ์สระว่ายน้ำ หรือรอบๆ สระว่ายน้ำ เจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุด ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 13. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการสระว่ายน้ำ หรือกล่าวตักเตือนได้ตามความเหมาะสม ใน กรณีที่เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือ ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดจะขอให้ยุติการลงเล่นสระว่ายน้ำทันที

ข้อ 14. ระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการ บริหารนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

ระเบียบที่ 10 เรื่อง การใช้ห้องออกกำลังกาย / ห้องโยคะ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมการออกกำลังกายของเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดนิติบุคคล อาคารชุด จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางเป็นห้องออกกำลังกาย / ห้องโยคะ ภายในบริเวณอาคารชุด และได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ห้อง ออกกำลังกาย/ห้องโยคะ ดังนี้

ข้อ 1. ห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

ข้อ 2. ผู้ใช้บริการต้องลงบันทึกการใช้ห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดเตรียมไว้

ข้อ 3. โปรดใช้อุปกรณ์ในห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ ตามวิธีที่ถูกต้อง (คู่มือการใช้งาน)

ข้อ 4. ผู้ที่ใช้ห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำแนะนำ ป้ายประกาศต่างๆ คือ

4.1 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปรับประทานภายในห้องโดยเด็ดขาด

4.2 ห้ามสูบบุหรี่

4.3 ห้ามเล่นการพนัน โดยเด็ดขาด

ข้อ 5. โปรดรักษาความสะอาด และใช้ห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ ด้วยความสุภาพ ไม่รบกวนผู้อื่น

ข้อ 6. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้ห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ โดยไม่มีผู้ปกครองดูแล

ข้อ 7. ห้ามขโมย หรือนำอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากห้องออกกำลังกาย ห้องโยคะ โดยเด็ดขาด ซึ่งหากในภายหลังพบว่ามีเจตนายันไม่ บริสุทธิ์ นิติบุคคลอาคารชุด จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ 8. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านเอง นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบในการสูญ หาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด

ข้อ 9. หากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย หรือระบบต่างๆ ของห้องออกกำลังห้องโยคะ ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โปรดแจ้งฝ่ายจัดการ รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ข้อ 10. หากเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ทำความเสียหายกับอุปกรณ์ในห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ เจ้าของร่วม หรือผู้ พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุด ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 11. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดจะขอให้ยุติการใช้ห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ ทันที

ข้อ 12.ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย/ห้องโยคะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการบริหาร นิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

ระเบียบที่ 11 เรื่อง การใช้ห้องซาวน่า / ห้องอบไอน้ำ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางเป็นห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ภายในบริเวณอาคารชุด และได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ดังนี้

ข้อ 1. ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 น. - 22.00 น.

ข้อ 2. ผู้ใช้บริการต้องลงบันทึกการใช้ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดเตรียมไว้

ข้อ 3. ห้ามบุคคลต่อไปนี้ใช้บริการห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ

3.1 ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรืออยู่ในระหว่างพักฟื้น

3.2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด โรคหัวใจ ความดัน หอบหืด

3.3 ผู้ที่มีอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3.4 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

ข้อ 4. ต้องทำการเปิด-ปิด และตั้งอุณหภูมิตามวิธีที่ถูกต้อง (จากคู่มือการใช้งาน)

ข้อ 5. โปรดรักษาความสะอาด และใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ ไม่รบกวนผู้อื่น

ข้อ 6. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ

ข้อ 7. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ

ข้อ 8. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านเอง นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด

ข้อ 9. หากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย หรือระบบต่างๆ ของห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ให้แจ้งฝ่ายจัดการ รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ข้อ 10. หากเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ทำความเสียหายกับอุปกรณ์ในห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ เจ้าของร่วม หรือผู้พัก อาศัย จะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุด ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 11. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ได้ตามความเหมาะสม ใน กรณีที่เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือ ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดจะขอให้ยุติการใช้ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำทันที

ข้อ 12. ระเบียบการใช้ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการบริหารนิติ บุคคลอาคารชุด ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

ระเบียบที่ 12 เรื่อง การใช้ห้องอเนกประสงค์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางเป็นห้องอเนกประสงค์ภายในบริเวณอาคารชุด และได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องอเนกประสงค์ ดังนี้

ข้อ 1. ห้องอเนกประสงค์เป็นสถานที่สำหรับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย และครอบครัวเท่านั้น

ข้อ 2. ห้องอเนกประสงค์เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิในการที่จะเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด-ปิด และอาจสั่งปิดในกรณีที่มีการซ่อมแซม หรือเพื่อการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 3. ผู้ที่ใช้ห้องอเนกประสงค์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำแนะนำ ป้ายประกาศต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด โดย

3.1 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปรับประทานภายในห้อง

3.2 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องอเนกประสงค์

3.3 ห้ามเล่นการพนัน โดยเด็ดขาด

ข้อ 4. การนำบุคคลภายนอกเข้ามายังห้องอเนกประสงค์จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าของร่วมเท่านั้น

ข้อ 5. ต้องรักษาความสงบเรียบร้อย มิให้รบกวนผู้อื่น

ข้อ 6. ห้ามนำห้องอเนกประสงค์มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองโดยกีดกั้นการใช้ห้องของบุคคลอื่น เช่น นำห้องไว้สำหรับการสอน หรือตัวหนังสือเรียนโดยมีอาจารย์จากภายนอกมาสอน, นำห้องไปใช้สอนดนตรี, ทำเป็นห้องประชุม เป็นต้น

ข้อ 7. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านเอง นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย

ข้อ 8. หากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย หรือระบบต่างๆ ของห้องอเนกประสงค์ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ให้แจ้งฝ่ายจัดการรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ข้อ 9. หากเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ทำความเสียหายกับอุปกรณ์ในห้องอเนกประสงค์ เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พัก อาศัย จะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุด ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 10. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในห้องอเนกประสงค์ได้ตามความเหมาะสมใน กรณีที่ เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดจะขอให้ยุติการใช้ห้องอเนกประสงค์ทันที

ข้อ 11. ระเบียบการใช้ห้องอเนกประสงค์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคล อาคารชุด ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

ระเบียบที่ 13 เรื่อง การใช้ห้องเด็กเล่น

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด นิติบุคคลอาคาร ชุด จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางเป็นห้องเด็กเล่นภายในบริเวณอาคารชุด และได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องเด็กเล่น ดังนี้

ข้อ 1. ห้องเด็กเล่นเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดเวลา 22.00 น.

ข้อ 2. ผู้ที่ใช้ห้องเด็กเล่น จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำแนะนำ ป้ายประกาศของฝ่ายจัดการฯ

ข้อ 3. การนำบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นในห้องเด็กเล่น จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยในอาคารชุด และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

ข้อ 4. ห้องเด็กเล่นเป็นสถานที่สำหรับเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยในอาคารชุด และครอบครัวเท่านั้น

ข้อ 5. ผู้ที่ใช้ห้องเด็กเล่นจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เกิน 6 ปี

ข้อ 6. ในกรณีที่เด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ผู้ปกครอง หรือคนเลี้ยงเด็ก จะต้องดูแล ควบคุมบุตรหลานของท่านเอง ให้เล่นของเล่น อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุใดๆ

ข้อ 7. ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่ม เข้าไปในห้องเด็กเล่นโดยเด็ดขาด

ข้อ 8. โปรดรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้ห้องเด็กเล่น

ข้อ 9. หลังจากเลิกใช้งานห้องเด็กเล่น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อ 10. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านเอง นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญ หายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 11. หากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย หรือระบบต่างๆ ของห้องเด็กเล่นไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ให้แจ้งฝ่ายจัดการรับทราบ และ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ข้อ 12. หากเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ทำความเสียหายกับอุปกรณ์ในห้องเด็กเล่น เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 13. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในห้องเด็กเล่นได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เจ้าของ ร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ ถูกต้องแล้วยังเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดจะขอให้ยุติการใช้ห้องเด็กเล่นทันที

ข้อ 14. ระเบียบการใช้ห้องเด็กเล่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

ระเบียบที่ 14 เรื่อง การให้บริการรถตู้โดยสาร

ข้อ 1. รถตู้เป็นทรัพย์ส่วนกลางของ นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม พหล-อารีย์ มีจำนวน 2 คัน ซึ่งเจ้าของร่วมมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เช่น ค่าแรงคนขับรถ ค่าประกันภัยรถ ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมต่างๆ ฯลฯ

ข้อ 2. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการรถตู้โดยสารเจ้าของร่วม

ข้อ 3. การกำหนดตารางเวลาการให้บริการของรถตู้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุม

ข้อ 4. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยที่จะใช้บริการรถตู้ จะต้องเรียงลำดับการเข้าใช้บริการรถตู้ โดยฝ่ายจัดการจะจัดทำบัตรลำดับ ไว้คอยให้บริการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อ 5. กำหนดให้บริเวณที่จอดรถด้านหน้าอาคาร เป็นจุดสำหรับไว้จอดรถตู้โดยสารบริการรับ – ส่ง ผู้ใช้บริการรถตู้

ข้อ 6. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ท่านละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง โดยผู้ใช้บริการจะต้องจัดซื้อคูปองที่ ออกโดยฝ่ายจัดการ (รับเฉพาะคูปองเท่านั้น) เพื่อชำระค่าโดยสาร

ข้อ 7. นิติบุคคลอาคารชุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัยที่ใช้บริการรถตู้

ข้อ 8. ระเบียบการให้บริการรถตู้โดยสาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการ บริหารนิติบุคคล อาคารชุด ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ. ในเบื้องต้น นิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้จัดทำตารางเวลาบริการของรถตู้ให้ จนกว่าจะมีมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วม ให้เปลี่ยนแปลง

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการซ้อมแผนฉุกเฉิน

Document No.	SOP-PMR-044	Revision	02	Update Date	01/06/2023
Head of Department	[redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) [redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)				
QMR/FMR/ EMR Approve	[redacted] ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม				

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
1.3 เพื่อยกระดับมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทำแผน การซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน และจัดทำรายงานสรุปการซักซ้อมในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

3.1 SOP-PMR-045 วิธีการปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ ถึง SOP-PMR-074 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่โครงการ (จำนวน 26 SOPs)
3.2 FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ จัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังการฝึกซ้อม

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การกำหนดรายละเอียดการการซ้อมแผนฉุกเฉิน	1.1 BM/VM กำหนดรอบการซ้อมแผนฉุกเฉิน พร้อมกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน เพื่อซักซ้อมแผน เช่น บุคคลที่ประสบเหตุ บุคคลที่รับเรื่อง รปภ. หรือ อื่นๆ ลงในแผนงานประจำปี โดยแบ่งเป็นการซ้อมพื้นฐานที่ทุกโครงการต้องซ้อม และการซ้อมเพิ่มเติมที่ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละโครงการ **ระดับความสำคัญ / คอนโด (C) / บ้านพักอาศัย (HT)** **การซ้อมพื้นฐาน** 1) วิธีการปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ/เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง 3) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยหมดสติในโครงการ 4) วิธีการปฏิบัติเมื่อมีผู้เสียชีวิตในโครงการ 5) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจมน้ำ **การซ้อมเพิ่มเติม** 1) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ 2) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุวาตภัย 3) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว 4) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจากรโดดอาคาร 5) วิธีการปฏิบัติเมื่อพบสัตว์อันตรายในพื้นที่โครงการ 6) วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย 7) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดโจรกรรมในพื้นที่โครงการ 8) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุพนักงาน / คนคุ้มครอง 9) วิธีการปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐกรณีอาชญากรรม 10) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉลากยาใกล้หมดอายุในโครงการ 11) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดโครงระบาดติดต่ออันตราย Covid-19 12) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำว่าว น้ำท่วมในห้องชุดของโครงการ 13) วิธีการปฏิบัติเมื่อพบผู้ที่ได้รับสารเคมีเข้าร่างกาย 14) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดจุดฟิตเนสรถยนต์เมื่อรวมกันภายในโครงการ 15) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุชุมชุดุคุคาม 16) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุบุกรุก 17) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีหกรั่วไหล 1.2 BM/VM นำเสนอแผนงานให้ OM อนุมัติดำเนินการ ยกเว้นการซ้อมเหตุเพลิงไหม้ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ	ซ้อมอย่างน้อยโดรมาสละ 1 เหตุฉุกเฉิน	1. แผนงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2. SOP-PMR-045 วิธีการปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ ถึง SOP-PMR-066 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุบุกรุก (จำนวน 22 SOPs)	BM/VM	
3	การซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ฝ่ายจัดการ ซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน ตามแผนการซ้อม บทบาทสมมติ และ รอบการซ้อมที่กำหนดไว้	ตามรอบแผนงานที่กำหนด	แผนงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ฝ่ายจัดการ	

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

4	การจัดทำรายงานสรุปผล	ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกซ้อม ส่งให้ OM พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มกลางของหน่วยงาน	ภายใน 3 วัน หลังการฝึกซ้อม	FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- ฝ่ายจัดการ - BM/VM

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-001	29/7/2020	เอกสารจัดทำใหม่ ขึ้นระบบครั้งแรก
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	[redacted]
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มจำนวน SOP 1 เล่ม คือ SOP-PMR-074 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่โครงการ

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Document No.	SOP-PMR-046	Revision	03	Update Date	01/06/2023
Head of Department	[redacted] ผ้ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) [redacted] ผ้ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)				
QMR/FMR/EMR Approve	[redacted] ตัวแทนผ้ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ้งแวดล้อม				

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบเหตุ ระงับเหตุ และการจัดการเหตุหลังเพลิงไหม้ลงบล ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน
3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน
3.3 WI-PMR-001 การจำลองแผนการดับเพลิง

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

CODE	ORANGE					
ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากผู้พักอาศัย 1.2 ฝ่ายจัดการ / รปภ.หรือผู้พบเหตุ แจ้ง BM/VM 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับสัญญาณเตือน / ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้	2.1 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ และให้นำถังอุปกรณ์ดับเพลิง และ ไฟฉายไปด้วยทุกครั้ง 2.2 ดำเนินการตามเหตุที่พบ <u>กรณีพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้จริง</u> ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 <u>กรณีไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ แต่เกิดจากระบบผิดพลาด</u> ช่างประจำหน่วยงาน ถอดอุปกรณ์ออกมาทำตรวจเช็ค และทำการ Reset ระบบใหม่อีกครั้ง *2.2.1 กรณี Reset ระบบ แล้วยังคงมีปัญหา* ช่างประจำหน่วยงานแจ้งบริษัทฯ ที่ดูแลมาตรวจสอบอย่างละเอียด และ แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หาก อุปกรณ์ชำรุด *2.2.2 กรณี Reset ระบบแล้วไม่มีปัญหา* ช่างประจำหน่วยงาน คิดตามผลจนกว่าอุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะปกติ และจัดทำรายงานตามขั้นตอนที่ 4	ภายใน 5 นาที ที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ. -SSI	
3	การเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้	3.1 BM/VM ฝ่ายจัดการแจ้งเหตุฉุกเฉินโทร.199 3.2 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, ช่างเทคนิค, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ <u>กรณีควบคุมเพลิงได้</u> เมื่อเข้าระงับเหตุสามารถควบคุมเพลิงให้สงบไม่ลุกลาม ให้ทำการประเมิน และเฝ้าติดตามสถานการณ์ <u>กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้</u> เมื่อเข้าระงับเหตุไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ดำเนินการตามแผนอพยพหนีไฟ และแจ้งสถานีดับเพลิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกับแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทันที (แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร.199, แจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 หรือ 1646) <u>เพิ่มเติม</u> ฝ่ายจัดการโทรสอบถามลูกบ้าน/แจ้งลูกบ้านเพื่อขอนุญาต กรณีไม่มีผู้รับสายให้ฝ่ายจัดการทำการแจ้ง 199 เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเข้าพื้นที่ หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้และต้องทำการเข้าห้องลูกบ้าน ฝ่ายจัดการต้องมีการถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน	ทันทีเมื่อพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ.	
4	การจัดการหลังการควบคุมเพลิงไหม้	4.1 ฝ่ายจัดการ สำรวจ และ สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ส่งให้ PMC, OM และ SSI 4.2 ฝ่ายจัดการดำเนินจัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ 4.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน ***ภายใน 24 ชม.*** (หากมี)	เมื่อควบคุมเพลิงไหม้ได้	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
5	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	5.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์เพื่อรายงานผู้ว่าจ้าง และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ส่งให้ PMC, OM และ SSI 5.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ ไดร์ฟกลางของหน่วยงาน	ภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+	วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)	Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR	Update Date	01/06/2023
		Page	Page 2 of 4

6	จัดทำแผนการฟื้นฟูความเสียหาย และ ติดตามฟื้นฟูความเสียหาย (หากมี)	BM/VM, ฝ่ายจัดการ จัดทำแผนการฟื้นฟูความเสียหาย พร้อมกับติดตามส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการแก้ไข ฟื้นฟู ให้กลับสู่สภาพเดิม	ภายใน 1 เดือน หลังเกิดเหตุ	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+	วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)	Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR	Update Date	01/06/2023
		Page	Page 3 of 4

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

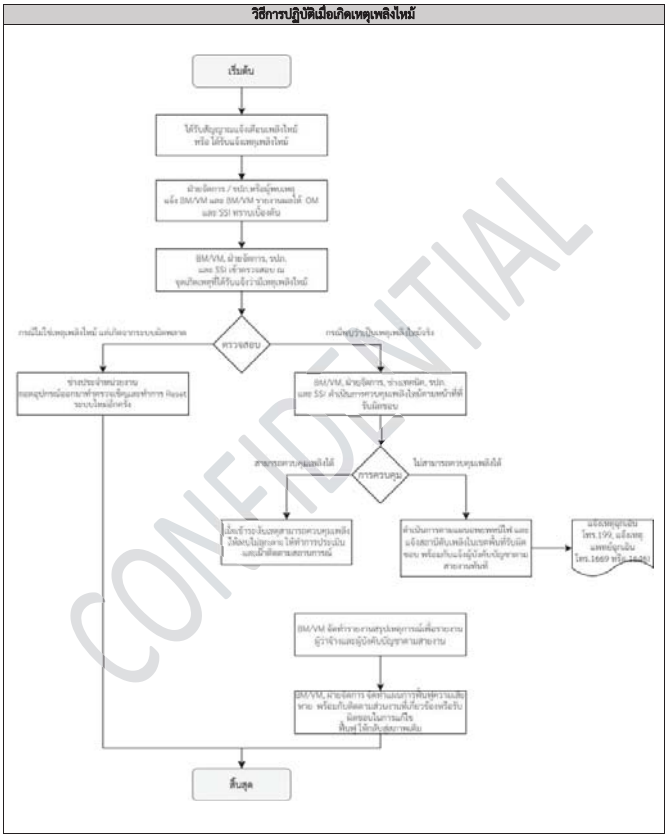

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+	วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)	Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR	Update Date	01/06/2023
		Page	Page 4 of 4

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	[redacted]
02	DAR-PMR-064	01/06/2023	เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่ม ขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบ Flow

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ

Document No.	SOP-PMR-048	Revision	03	Update Date	01/06/2023
Head of Department	[redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด/ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) [redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)				
QMR/FMR/ EMR Approve	[redacted] ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม				

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ
1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการเหตุน้ำท่วมภายในโครงการ จนเข้าสู่สภาวะปกติ ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน
3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

CODE: ORANGE

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	พบเห็น หรือ ได้รับแจ้งเหตุน้ำท่วมภายในโครงการ	1.1 ฝ่ายจัดการ/ รปภ. พบเห็น หรือ ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย และ/หรือ เจ้าของบ้านว่ามีเหตุน้ำท่วมภายในโครงการ 1.2 ฝ่ายจัดการ/ รปภ. เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุน้ำท่วมและจัดการตามแนวทางป้องกัน 1.3 BM/VM แจ้ง OM, SSI ให้ทราบ และรายงานผลให้ทราบเบื้องต้น	ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	ทุกโครงการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมไว้
2	การจัดการเหตุน้ำท่วมภายในโครงการ	<u>กรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ</u> 1) ฝ่ายจัดการ/รปภ. เข้าดำเนินการจัดแนวเขตห้ามสัญจร และวางกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณ พิจารณาเคลื่อนย้ายสารเคมี, ขยะอันตรายและใช้ปั๊มน้ำ ย้ายรถเพื่อป้องกันดูแลพื้นที่ที่สร้างความเสียหายได้ 2) ช่างประจำหน่วยงาน แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ คอยเช็คระดับความสูงและปริมาณการระบายน้ำทุก 10 นาทีจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 3) กรณีที่ปริมาณน้ำเกินการควบคุม ต้องปฏิบัติดังนี้ 3.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเคลื่อนย้ายลูกค้า และแจ้งลูกค้าให้ไปอยู่ในจุดที่พร้อมจะเคลื่อนย้าย (รอจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือรถทหาร) 3.2) กรณีลูกค้าที่มีผู้ป่วยติดเตียงฝ่ายจัดการต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการให้มารับลูกค้าถึงที่บ้าน (กรณีเกิดโรคระบาด (COVID19) ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE) 3.3) กรณีลูกค้าที่มีสัตว์เลี้ยงต้องมีกรงหรือสายลากจูงให้เรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย 3.4) ฝ่ายจัดการต้องทราบว่าสถานที่ที่ลูกค้าเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ไหน เพื่อให้ข้อมูลแก่ญาติของลูกค้า 3.5) ทีม SSI ต้องจัดกำลังพลเข้าตรวจความปลอดภัยภายในโครงการ เพื่อป้องกันการโจรกรรม และให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่มีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการ 3.6) เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายจัดการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสามารถกลับเข้าพักที่โครงการได้เมื่อไหร่ โดยแจ้งผ่านช่องทาง Home Service Application <u>กรณีเกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์</u> 1) ฝ่ายจัดการ/รปภ. เข้าดำเนินการจัดแนวเขตห้ามสัญจร และวางกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณ และใช้ปั๊มน้ำย้ายรถ ดูแลพื้นที่ที่สร้างความเสียหายได้ และให้ช่างประจำหน่วยงานเร่งระดับเหตุในเบื้องต้น เพื่อป้องกันปัญหาต่อเนื่อง เช่น ปิดวาล์วน้ำ และปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากนั้นให้รับดำเนินการแก้ปัญหา หมายเหตุ กรณีที่อุปกรณ์ป้องกันภายในโครงการไม่สามารถระดับเหตุได้ ควรร้องขอไปยัง PMC เพื่อประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการตัดสินใจด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้ง	N/A	-ช่างประจำหน่วยงาน / จนท.รปภ. -ฝ่ายจัดการประจำโครงการ -ทีม SSI	
3	การจัดการเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ	3.1 ฝ่ายจัดการ สำรวจ และ สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ส่งให้ PMC, OM, SSI 3.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ	ภายใน 24 ชม.	1. SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ - ช่างประจำหน่วยงาน	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ (ต่อ)

CODE: ORANGE

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชม. (หากมี) 3.4 ฝ่ายจัดการดำเนินการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยปฏิบัติตาม SOP-PMR-070 การบริหารจัดการของเสีย	ภายใน 24 ชม.	2. SOP-PMR-070 การบริหารจัดการของเสีย		
4	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	4.1 BM/VM รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ ไดร์ฟกลางของหน่วยงาน 4.3 ฝ่ายจัดการ ติดตาม แก้ไข จนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติ	ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ	1. ใบเคลมค่าสินไหมทดแทนที่มี BM/VM ลงนาม 2. FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ - ช่างประจำหน่วยงาน	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัติงาน

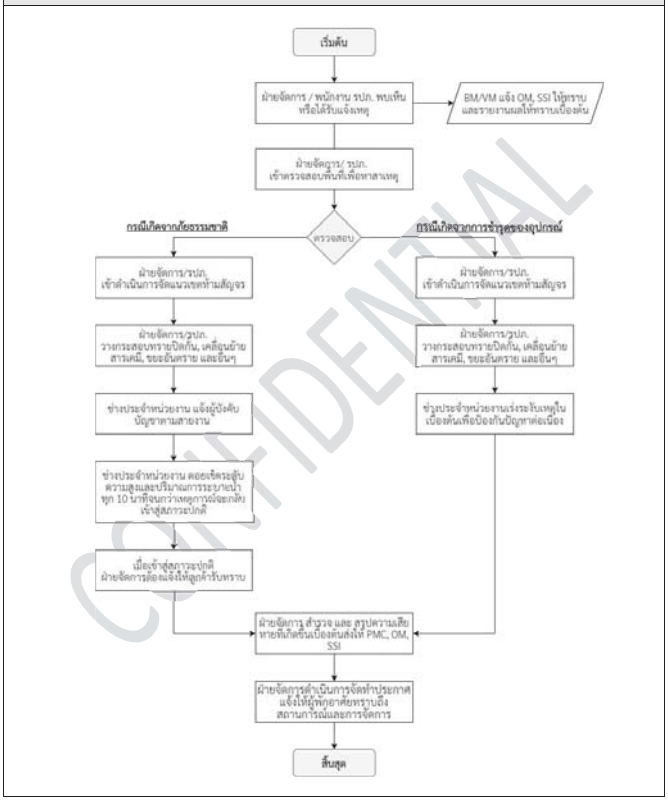

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/07/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-002	08/10/2021	[redacted]
02	DAR-PMR-042	09/02/2022	เพิ่มเติมขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อปริมาณน้ำเกินความควบคุมการในจัดการเหตุน้ำท่วมภายในโครงการและการจัดเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในการจัดการเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ และเพิ่มตำแหน่ง EMR Approve
03	DAR-PMR-064	01/06/2023	เพิ่ม วิธีการปฏิบัติงานรูปแบบ Flow

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุวาตภัย

Document No.	SOP-PMR-049	Revision	02	Update Date	01/06/2023

Head of Department	[redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) [redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)
QMR/FMR/EMR Approve	[redacted] ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุวาตภัย
1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตาม และ จัดการหลังเหตุวาตภัยสิ้นสุดลง ในทุกโครงการ (C HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

CODE ORANGE

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับข่าวสารการเตือนวาตภัย (ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง)	1.1 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ได้รับข่าวสารการเตือนวาตภัย (ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง) 1.2 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ประกาศแจ้งเตือนให้ลูกบ้านเตรียมพร้อม เก็บสิ่งของที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อคนสัญจร และ คิดตามความเคลื่อนไหว 1.3 ฝ่ายจัดการจัดทีม เฝ้าระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ เพื่อพร้อมรับมือหากมีเหตุเกิดขึ้น เช่น ป้ายหักล้ม ฯลฯ	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	แบบฟอร์มประกาศ	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	
2	การติดตาม/เฝ้าระวัง	BM/VM,ฝ่ายจัดการ ติดตามสถานการณ์ **กรณีเกิดเหตุวาตภัย** ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 **กรณีไม่เกิดเหตุวาตภัย** ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4	ตลอดเวลาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	N/A	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	
3	การดำเนินการหลังเกิดเหตุวาตภัย	**กรณีเกิดเหตุวาตภัย** 3.1 BM/VM,ฝ่ายจัดการ รอให้เหตุการณ์สงบและปลอดภัย แจ้งรายงานสถานการณ์ให้ OM และ SSI 3.2 ฝ่ายจัดการ กั้นพื้นที่เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพ้นการกีดขวางทางสัญจร 3.3 ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบความเสียหายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บว่ามีหรือไม่ หากมีคนบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แจ้งแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 หรือ 1646 และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที 3.4 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการติดต่อเคลมสินไหม	ทันทีหลังสถานการณ์สงบ	N/A	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ - SSI	
4	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	4.1 BM/VM จัดทำรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ 4.2 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชม. (หากมี) 4.4 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ ไดร์ฟกลางของหน่วยงาน	ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุวาตภัย

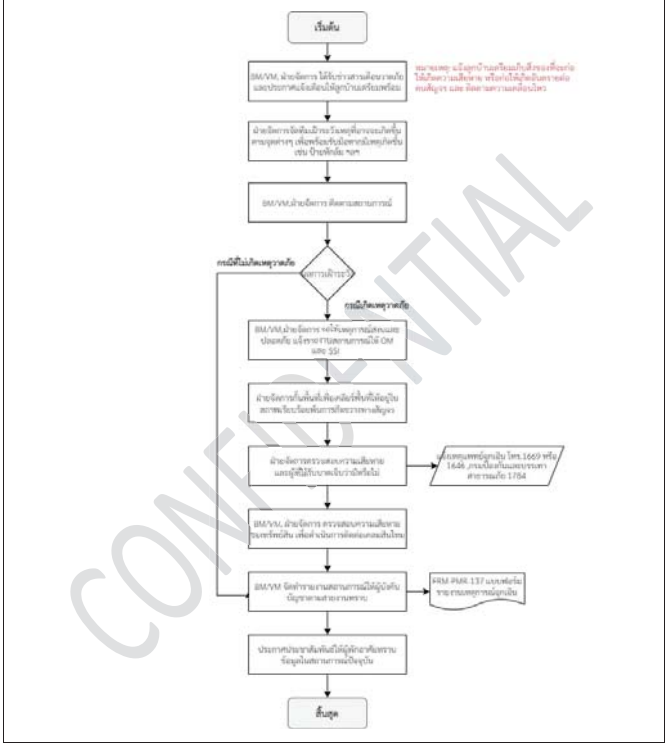

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	[redacted]
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่ม ขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบ Flow

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

Document No.	SOP-PMR-050	Revision	02	Update Date	01/06/2023
Head of Department	[redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) [redacted] ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)				
QMR/FMR/EMR Approve	[redacted] ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม				

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตามและจัดการหลังเหตุแผ่นดินไหวสงบ ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน
SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

CODE ORANGE

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว	1.1 ฝ่ายจัดการ ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว 1.2 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ประกาศเตือนให้ลูกบ้านเตรียมพร้อม และ ติดตามความเคลื่อนไหว 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
2	ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ	ฝ่ายจัดการ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.1 BM/VM จัดทำประกาศแจ้งลูกบ้านตามช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ และแนวทางการดูแลความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมไปรวมตัวที่จุดรวมพลที่เตรียมไว้หากมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 2.2 ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบรายชื่อ,จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ และขอให้ลูกบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำของทีม SSI หรือเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	หลังจากได้รับแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
3	การจัดการสำหรับเหตุการณ์	กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกินกว่ามาตรฐาน 3.1 BM/VM ประสานงานกับ SSI และกรม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อขอความช่วยเหลือ 3.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนอพยพไปยังจุดรวมพล 3.3 ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หลังเหตุการณ์สงบลง 3.4 หากมีคนบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานแจ้งแพทย์ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 1646 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที 3.5 ฝ่ายจัดการ สำรวจ และ สรุปความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเบื้องต้น 3.6 ฝ่ายจัดการ แจ้งให้กับ BM รีบทราบเพื่อติดต่อบริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชม. 3.7 BM/VM จัดทำเอกสารส่งบริษัทประกันภัย กรณีไม่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ดำเนินการต่อตามข้อ 4	ทันทีหลังเหตุการณ์สงบ	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI	
4	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	4.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและ SSI ทราบ 4.2 ฝ่ายจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.3 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ ไดร์ฟกลางของหน่วยงาน 4.4 ฝ่ายจัดการ ติดตามผลการแก้ไข จนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติ (หากมีความเสียหายเกิดขึ้น)	ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

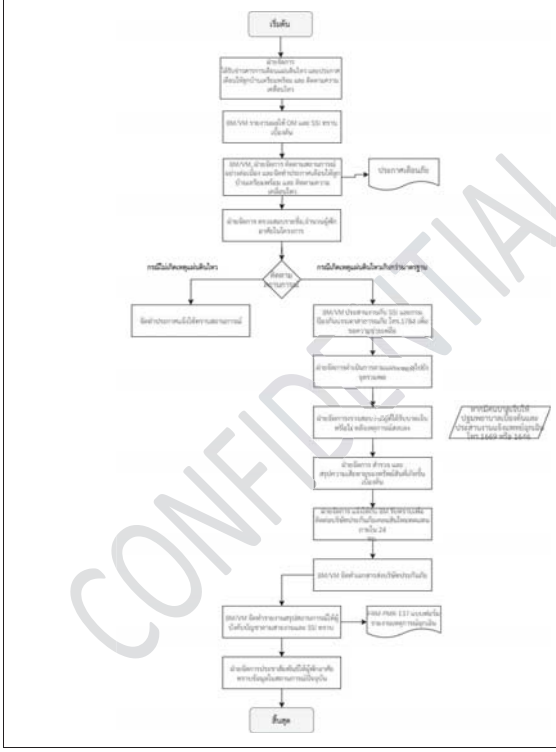

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-003	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร เพิ่มเติมรายละเอียดของขั้นตอน การจัดการสำหรับเหตุการณ์ พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	[redacted]
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบ "Flow"

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ

นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
๑๓๗๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน่วยงานฝึกอบรม
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

FIRE THAILAND FIRE DEPT. MD

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ชื่อ : นายอนุภาพ จังหาร

: นายสมชาย แจ้งจิตร์

เลขทะเบียนที่ : ดพด.-ร202 (หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น)

เลขทะเบียนที่ : ดพฝ.-ร202 (หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)

ติดต่อ : โทร. [redacted]

ที่ กท ๑๔๐๔/ ๗๗๔๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์ ตั้งอยู่ ๑๓๗๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๒๓ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดี)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ
วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร๒๐๒ วันอนุญาต ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันหมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร [redacted]

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ◯)

✓ กรณีสถานประกอบกิจการเดียวชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด วิธีม พหลฯ-อารีย์

ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๗๗ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน

แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ - โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๓ คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๒๓ คน

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับใบอนุญาต

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

กำหนดการ "ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2566
ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด วิธีม พหลฯ-อารีย์
ในวันเสาร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. – 11.00 น.

เวลา	กิจกรรม	วิทยากร
08.00 น. – 08.10 น.	ลงทะเบียน	
08.10 น. – 11.00 น.	<u>ภาคการบรรยายพร้อมการปฏิบัติ</u> : จัดให้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1.แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ 2.แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ 3.การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสพภัย 4.จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก 5.สรุปผลการฝึกซ้อม	[redacted]

รายชื่อวิทยากร

หน่วยงานฝึกอบรม : กรุงเทพมหานครใบอนุญาต ดพฝ.-ร202

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หัวข้ออบรม	สังกัดสถานีดับเพลิง	หมายเลขบัตรประชาชน
44	[redacted]	ทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	บางกะปิ	[redacted]
110		ทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	บางกะปิ	

แบบ คพค. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ คพค. – ร ๒๐๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔๖๑ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ คพค.-ร ๒๐๒

[redacted]

รายชื่อวิทยากร...

แบบ คพฝ. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ คพฝ. – ร ๒๐๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๔๗๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ คพฝ.-ร ๒๐๒

[redacted]

รายชื่อวิทยากร...

แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่.....เวลา.....ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่.....
คนพบเหตุคือ.....ได้ร้องตะโกนเรียกให้ช่วย หัวหน้างานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ.....ขณะเกิดเหตุมีเสียงดัง และมีควันลอยเต็มเป็นจำนวนมากในพื้นที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพนักงานได้ใช้ถังดับเพลิง และได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า และช่วยกันฉีดน้ำยาเคมีแห้งสกัดเพลิง แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ พนักงานช่วยกันขนของสิ่งสำคัญออกจากบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุไปยังจุดรวมพล

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้

ลำดับ	เวลา	สถานการณ์	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
1	.....00 น.	- เกิดประกายไฟบริเวณ และเกิดเสียงดัง และมีควันลอยเต็มพื้นที่	- **พนักงานผู้ประสบเหตุ** แจ้งเพื่อนร่วมงานให้ช่วยดับเพลิง - **พนักงานที่ประสบเหตุ** แจ้งหัวหน้างาน	- **ผู้ประสบเหตุ** 1. นาย/นาง..... - **เพื่อนร่วมงานที่ช่วยดับเพลิง** 1. นาย/นาง..... 2. นาย/นาง.....
2	.....01 น.	- เปลวไฟยังคงลุกไหม้ และยังไม่สามารถดับเพลิงได้	- **หัวหน้างาน** รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และลงไปสำรวจพื้นที่เกิดเหตุ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อไปยัง ผอ.แผนภาวะฉุกเฉิน - **ผอ.แผนฯ** สั่งฝ่ายช่างทำการตัดไฟฟ้า - **ผอ.แผนฯ** สั่งฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิงระดับเหตุ - **ผอ.แผนฯ** สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟและกดกริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- **ผู้ประสบเหตุ** 1. นาย/นาง..... - **ผอ.แผนภาวะฉุกเฉิน** 1. นาย/นาง..... - **คนกดกริ่ง** 1. นาย/นาง.....
3	.....02 น.	- เปลวไฟยังคงลุกไหม้	- **ฝ่ายช่าง** หลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ก็ได้เข้าทำการตัดกระแสไฟฟ้า - **ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง** หลังจากได้รับคำสั่ง จาก ผอ.แผนฯ ก็ได้เข้าไปทำการดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ - **ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง** ได้ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้ง หรือระบบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี) ดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ - **ฝ่ายอพยพ** หลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ให้ทำตามแผนอพยพหนีไฟ - **ฝ่ายอพยพ** ก็ได้ทำการอพยพพนักงานให้ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลของบริษัทฯ	- **ฝ่ายช่าง** 1. นาย/นาง..... - **ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง** **ทีมดับเพลิง ที่ 1** 1.1 นาย/นาง..... 1.2 นาย/นาง..... 1.3 นาย/นาง..... 1.4 นาย/นาง..... 1.5 นาย/นาง..... **ทีมดับเพลิงที่ 2** 2.1 นาย/นาง..... 2.2 นาย/นาง.....
			และทำการเช็คชื่อ จำนวนพนักงาน แล้วรายงาน ผอ.แผนฯ ต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ตั้งแต่เริ่มทำการอพยพ	2.3 นาย/นาง..... 2.4 นาย/นาง..... 2.5 นาย/นาง..... - **ฝ่ายอพยพ** แผนก..... 1. นาย/นาง..... แผนก..... 2. นาย/นาง..... แผนก..... 3. นาย/นาง..... แผนก..... 4. นาย/นาง..... แผนก..... 5. นาย/นาง..... แผนก..... 6. นาย/นาง..... แผนก..... 7. นาย/นาง..... แผนก..... 8. นาย/นาง..... แผนก..... 9. นาย/นาง..... แผนก..... 10. นาย/นาง..... แผนก..... 11. นาย/นาง.....
4	.....05 น.	- เพลิงสงบ	- **ผอ.แผนฯ** สั่งทีมค้นหาเข้าค้นหาผู้บาดเจ็บ/สูญหาย - **ทีมค้นหา** เข้าค้นหาคนที่สูญหาย/บาดเจ็บ ตามคำสั่ง ผอ.แผนฯ - **ผอ.แผนฯ** สั่งทีมปฐมพยาบาลเตรียมพร้อมที่จุดรวมพล - **ทีมพยาบาล** ทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ - **ผอ.แผนฯ** สั่งให้ทีมยานพาหนะนำ	- **ฝ่ายค้นหา** **ทีมค้นหา ที่ 1** 1.1 นาย/นาง..... 1.2 นาย/นาง..... 1.3 นาย/นาง..... **ทีมค้นหา ที่ 2** 2.1 นาย/นาง..... 2.2 นาย/นาง..... 2.3 นาย/นาง.....
			ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล (กรณีอาการสาหัส) - **ผอ.แผนฯ** สั่งฝ่ายสนับสนุนจัดการการจราจร ไม่ให้ติดขัด	- **ทีมพยาบาล** **ทีมพยาบาล ที่ 1** 1.1 นาย/นาง..... 1.2 นาย/นาง..... - **ฝ่ายสนับสนุน/ทีมยานพาหนะ(ถ้ามี)** 1. นาย/นาง..... 2. นาย/นาง.....
5	.....15 น.	- เพลิงสงบ	- ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมรายงานผล ให้ ผอ.แผนฯ ทราบ - ทีมต่างๆ ที่ต้องรายงานผล ดังนี้ 1. ทีมดับเพลิงขั้นต้น 2. ทีมดับเพลิง 3. ทีมค้นหา 4. ทีมปฐมพยาบาล 5. ทีมยานพาหนะ 6. ทีมตรวจสอบ ผอ.แผนฯ ประเมินความเสียหาย, สรุปสถานการณ์ และแจ้งให้พนักงานทราบ - กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ	
6	.....15 น.	- เพลิงสงบ	- ผอ.แผนฯ สั่งประกาศยกเลิกสถานการณ์สิ้นสุดสถานการณ์สมมุติ	

ผู้ป่วย
1. นาย/นาง.....
2. นาย/นาง.....

ผู้สูญหาย
1. นาย/นาง.....
2. นาย/นาง.....

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี 2567

โครงการ รีอีม พหลฯ - อารีย์
วันที่ 5 ตุลาคม 2566

| ลำดับ | ระบบรายการเครื่องจักร | สถานที่ | มกราคม | | | | | กุมภาพันธ์ | | | | | มีนาคม | | | | | เมษายน | | | | | พฤษภาคม | | | | | มิถุนายน | | | | | กรกฎาคม | | | | | สิงหาคม | | | | | กันยายน | | | | | ตุลาคม | | | | | พฤศจิกายน | | | | | ธันวาคม | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี 2567

โครงการ รีอิม พหลฯ - อารีย์
วันที่ 5 ตุลาคม 2566

| ลำดับ | ระบบ/รายการเครื่องจักร | สถานที่ | มกราคม | | | | | กุมภาพันธ์ | | | | | มีนาคม | | | | | เมษายน | | | | | พฤษภาคม | | | | | มิถุนายน | | | | | กรกฎาคม | | | | | สิงหาคม | | | | | กันยายน | | | | | ตุลาคม | | | | | พฤศจิกายน | | | | | ธันวาคม | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
14/01/2567	24	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/01/2567	24	197	157.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/01/2567	24	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/01/2567	24	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/01/2567	24	193	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/01/2567	24	141	112.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/01/2567	24	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/01/2567	24	162	129.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/01/2567	24	189	151.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/01/2567	24	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/01/2567	24	190	136	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/01/2567	24	147	117.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/01/2567	24	167	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี 2567

โครงการ รีสิม พหลฯ - ธารีย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ระบบรายการเครื่องจักร	สถานที่	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

จัดทำโดย [redacted] หัวหน้าช่างเทคนิค 1,5,67

รับทราบโดย [redacted] ผู้จัดการอาคาร 1,5,67

W งานบำรุงรักษาระยะสัปดาห์ 6M งานบำรุงรักษาระยะ 6 เดือน

M งานบำรุงรักษาระยะเดือน Y งานบำรุงรักษาประจำปี

3M งานบำรุงรักษาระยะ 3 เดือน

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
27/01/2567	~~24~~	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/01/2567	24	126	100.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/01/2567	24	195	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/01/2567	24	139	111.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/01/2567	24	185	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
Total	744	5092	4071.6												

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01/01/2567	24	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
02/01/2567	24	139	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
03/01/2567	24	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
04/01/2567	24	145	116	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
05/01/2567	24	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
06/01/2567	24	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
07/01/2567	24	149	119.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
08/01/2567	24	196	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
09/01/2567	24	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/01/2567	24	189	151.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/01/2567	24	191	152.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/01/2567	24	182	145.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/01/2567	24	138	110.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
27/02/2567	24	178.6	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
28/02/2567	24	164	134.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/02/2567	24	183	147	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
total	690.	4883.4	3868.6												

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/02/2567	24	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
02/02/2567	24	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
03/02/2567	24	151	120.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
04/02/2567	24	178	142.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
05/02/2567	24	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
06/02/2567	24	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
07/02/2567	24	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
08/02/2567	24	147	117.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
09/02/2567	24	177	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/02/2567	24	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/02/2567	24	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/02/2567	24	169	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/02/2567	24	176	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1.3.67	24	178	142.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			[redacted]
2.3.67	24	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
3.3.67	24	189	151.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
4.3.67	24	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
5.3.67	24	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
6.3.67	24	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
7.3.67	24	170	136	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
8/3/67	24	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
9.3.67	24	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
10.3.67	24	198	168.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
11.3.67	24	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
12.3.67	24	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
13.3.67	24	189	151.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
14/02/2567	24	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15/02/2567	24	152	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/02/2567	24	180	144	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/02/2567	24	185	148.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/02/2567	24	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/02/2567	24	180	144	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/02/2567	24	176	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/02/2567	24	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/02/2567	24	201	160.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/02/2567	24	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/02/2567	24	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/02/2567	24	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/02/2567	24	188	150.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1.04.67	24	212	169.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2.4.67	24	208	166.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3.4.67	24	193	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4.4.67	24	378	254.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5.4.67	24	276	220.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6.4.67	24	329	263.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7.4.67	24	294	235.2	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	ปกติ	-	-	
8.4.67	24	222	217.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9.4.67	24	367	293.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10.4.67	24	330	264	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11.4.67	24	384	307.2	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	ปกติ	-	-	
12.4.67	24	422	337.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13.4.67	24	232	185.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
14/3/67	24	195	156	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15.3.67	24	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	-	ปกติ	-	-	-	
16.3.67	24	190	152	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17.3.67	24	30	24	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18.3.67	24	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19.3.67	24	437	349.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/3/67	24	159	127.2	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21.3.67	24	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22.3.67	24	156	124.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23.3.67	24	128	102.4	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24.3.67	24	175	140	ปกติ	-	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25.3.67	24	215	172	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
	9													

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
14/04/67	24	213	170.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
15/04/67	24	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/04/67	24	215	172	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/04/67	24	239	190.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/4/67	24	188	150.4	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
19/4/67	24	276	220.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/4/67	24	198	158.4	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
21/4/67	24	245	196	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/4/67	24	266	212.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/4/67	24	232	185.6	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
24/4/67	24	284	227.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/4/67	24	209	167.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/4/67	24	243	194.4	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
26/3/67		153	122.4	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	[redacted]
27.3.67		175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	-	ปกติ	-	-	
28.3.67	24	182	145.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
29.3.67		150	120	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
30.3.67		179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
31.3.67		179	143.2	ไม่ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	
total		5425	4340											

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
14.5.67	24	185	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15.5.67	24	197	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16.5.67	24	152	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17.5.67	24	183	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18.5.67	24	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19.5.67	24	144	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20.5.67	24	211	168.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21.5.67	24	151	120.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22.5.67	24	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23.5.67	24	163	130.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24.5.67	24	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25.5.67	24	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26.5.67	24	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
27/4/67	24	356	284.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/4/67	24	170	136	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/4/67	24	269	214.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/4/67	24	239	191.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
total	720	7893	6314.4												

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
27.5.67	24	144	115.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28.5.67	24	1421	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29.5.67	24	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30.5.67	24	151	120.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31.5.67	24	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	744	5771	4614.4	(1498)											

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1.05.67	24	240	192	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2.05.67	24	240	192	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3.05.67	24	234	187.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4.05.67	24	246	196.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5.5.67	24	237	189.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6.5.67	24	267	213.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7.5.67	24	271	216.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8.5.67	24	243	194.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9.5.67	24	281	224.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10.5.67	24	212	169.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11.5.67	24	272	217.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12.5.67	24	181	144.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13.5.67	24	210	168	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัมหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
27/6/67	24	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
28/6/67	24	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/6/67	24	139	111.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/6/67	24	159	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	710	6065	4852												

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัมหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/6/67	24	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
02/6/67	24	191	164.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
03/6/67	24	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
04/6/67	24	200	160	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
05/6/67	24	169	189.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
06/6/67	24	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/6/67	24	132	105.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/6/67	24	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/6/67	24	147	117.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/6/67	24	183	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/6/67	24	186	148.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/6/67	24	188	150.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/6/67	24	163	130.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัมหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
14.6.67	24	199	159.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
15.6.67	24	187	149.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16.6.67	24	203	162.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/6/67	24	185	148	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/6/67	24	174	139.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/6/67	24	167	134.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/6/67	24	184	147.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/6/67	24	156	124.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/6/67	24	162	129.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/6/67	24	179	143.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/6/67	24	197	157.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/6/67	24	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/6/67	24	164	131.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1377 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน13
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

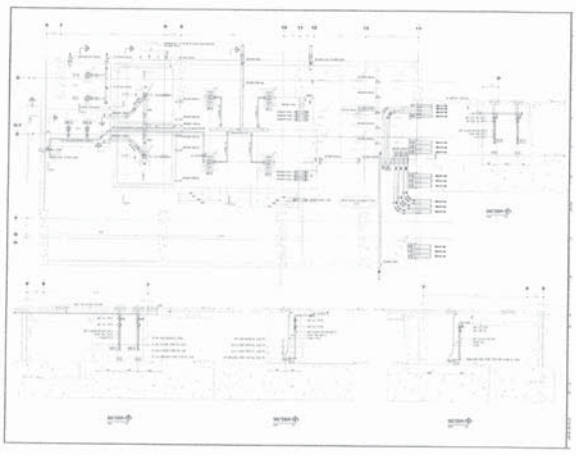

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : rhythm phahon-ari
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1377 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 13
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร [redacted]
มี : นิติบุคคลอาคารชุดริธึ่มพหล-อารีย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 809
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2556 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน ห้วยขวาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	135.70 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เก็บไว้บ่อพักตะกอน เพื่อจัดจ้างผรม.สูบออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 744.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,090.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,071.600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊มบ่อบำบัดสูบออกไม่ทัน ทำให้น้ำล้นออกมา / Manual Pump เข้า/เย็น

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... [redacted] .....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1377 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน13
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ โทรสาร มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

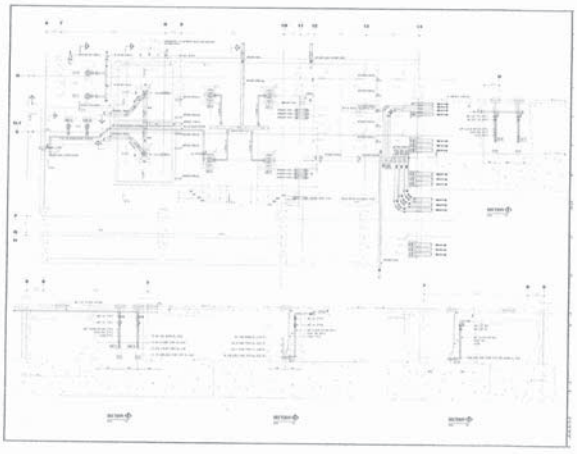

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : rhythm phahon-ari
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1377 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 13
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]
มี : นิติบุคคลอาคารชุดริธึ่มพหล-อารีย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 809
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2556 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน ห้วยขวาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 139.20 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เก็บไว้บ่อพักตะกอน เพื่อจัดจ้างผมม.สูบออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 690.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,834.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,868.600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1377 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน 13
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ โทรสาร มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

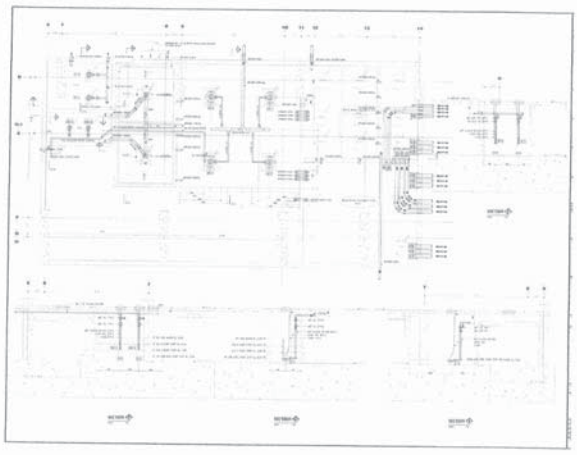

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : rhythm phahon-ari
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1377 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 13
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร [redacted]
มี : นิติบุคคลอาคารชุดริธึ่มพหล-อารีย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 809
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2556 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน ห้วยขวาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	145.60 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เก็บไว้บ่อพักตะกอน เพื่อจัดจ้างผรม.สูบออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 720.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,425.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,343.200 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... [redacted] .....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1377 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน13
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ โทรสาร มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

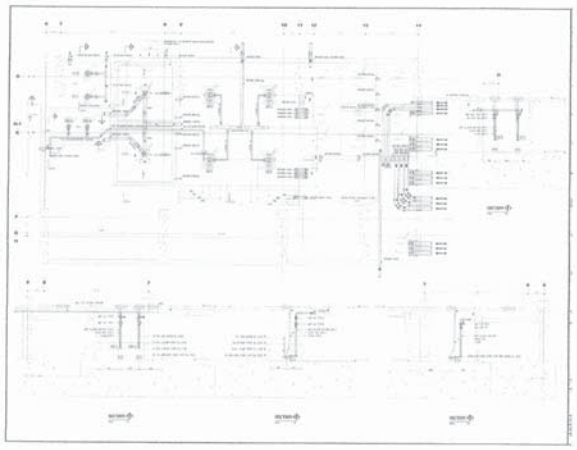

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : rhythm phahon-ari
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1377 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 13
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 809
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2556 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน ห้วยขวาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เก็บไว้บ่อพักตะกอน เพื่อจัดจ้างผมสูบออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 720.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,893.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,314.400 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1377 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน13
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ โทรสาร มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

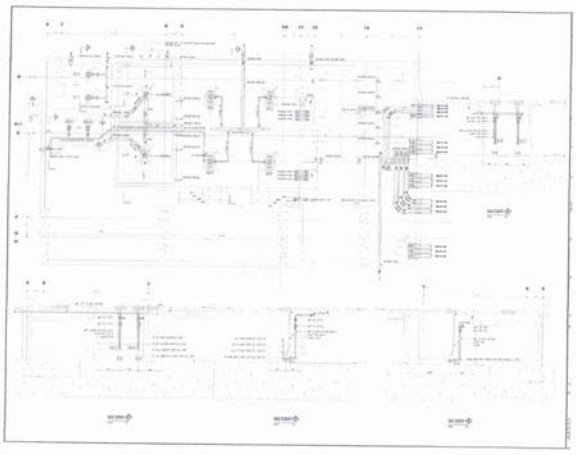

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : rhythm phahon-ari
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1377 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 13
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 809
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2556 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน ห้วยขวาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 744.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,771.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,614.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 03/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	399	407	399	112	166	112	-	0.99	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	68	-	-	-	399	409	399	108	107	104							-	0.99	-	-
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 เครื่องปรับเทอร์ร้อน

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 03/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 3.1.67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 1/1/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	53	-	56	-	-	-	-	-	-	-	394	396	393	153	119	139	-	0.99	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	55	-	-	-	394	396	392	112	120	107	-	-	-	-	-	-	-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1.1.2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1.1.67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 4/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	54		55		-	-	-	-	-	-	397	399	397	170	159	176	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	53				397	399	397	170	155	164							-	1.00		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 4/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 4/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 02.01.62

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	69	-	55		-	-	-	-	-	-	394	396	394	181	143	125	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	62	-			392	399	397	110	211	106							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 เสีย

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 02.01.62

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 2/1/67

14.3/30

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิริ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 7/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	–	56	–	–	–	–	–	–	–	397	395	397	220	255	202	–	0.98	–	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	–			395	397	399	170	155	164							–	1.00		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 7.1.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 7 1 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิริ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 5. 1. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	–	59	–	–	–	–	–	–	–	397	399	392	194	152	192				
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	–	62			395	392	395	135	146	134										
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5. 1. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5 1 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิริ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 6/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	–	59	–	61							401	402	403	153	143	151	–	0.97	–	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	–	52			401	402	401	121	159	149							–	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ 2.เวรบ่าย 2 เวร

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6.1.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 8. 1. 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิริ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 6/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	–	64	–	–	–	–	–	–	–	395	397	396	108	178	164	–	0.97	–	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	–			395	397	395	93	112	113							–	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ - MDP 1 ตัวซ้ายสุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6. 1. 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 11. 01 . 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	62		59	-	-	-	-	-	-	398	400	399	241	160	161	-	0.79	-	0.77
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60			396	398	397	109	171	150							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 11. 01. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 11 1 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 9 / 01 / 2567.

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	62	-	-	-	-	-	-	-	395	397	396	183	155	143	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-	-	-	396	398	396	84	94	109							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ -MDP 1 กดมิเตอร์ใช้งาน.

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 9/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 9 1 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 12/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	398	400	399	221	219	164	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-			398	399	398	85	83	105							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ - MDP 1. มอมิเตอร์ใช้งาน

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 12/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 12/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 10/ 1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	59	-	-	-	-	-	-	-	401	403	402	206	219	159	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-			400	402	400	209	214	166							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT
อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 10/ 1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 10. 1. 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 15/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	57	-	-	-	-	-	-	-	399	401	399	114	146	125	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-			400	401	401	114	132	142							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 15/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 15/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 13/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	53	-	55	-	-	-	-	-	-	-	400	401	400	109	134	160	-	0.99	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-			401	399	400	109	135	164										
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 13/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 13/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 16/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	58	-	-	-	-	-	-	-	397	398	397	145	181	149	-	1.0	-	098
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-			396	398	397	149	129	141							-	099		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 กดเบรคเกอร์ 3 ครั้ง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 14.01.62

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	54	-	52							392	394	392	215	223	189	-	0.97	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	61			376	378	377	112	119	134							-	0.77		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 14.01.62

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 14/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 20 . 01 . 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1												CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	~	54	~	57							396	394	396	211	199	211	~	0.97	~	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	~	62			396	391	395	54	53	52	[illegible]	[illegible]	[illegible]				~	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1 เรือ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20 / 1 / 12

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20 / 1 / 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 17 . 01 . 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00					~	~	~	~	~	~	397	397	396	109	163	120	~	0.99	~	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00					397	399	397	132	124	85								0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ [redacted]

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 17. 01. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 17 / 1 / 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 21/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	63	-	66	-	-	-	-	-	-	-	398	400	398	219	125	142	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-	-	-	397	399	396	143	139	174							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 ดวงอิเหนา(ชั้น 1,2)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21 / 1 / 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 19/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	57	-	-	~	-	-	-	-	399	100	399	140	132	141	-	0.99	-	1.00
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-			396	400	398	143	133	149							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19 / 1 / 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 24/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	399	401	400	164	98	106	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	-	-	399	401	399	87	69	85							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ -กดปิด MDP 1 (ชั้น 9)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 24/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 24/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 22/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	397	399	399	181	134	122	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	53	-			396	399	400	95	93	101							-	0.96		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 25/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	53	-	54	-	-	-	-	-	-	-	401	402	401	131	126	153	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	55	-			400	401	400	163	111	126							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 25/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 25/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 23.01.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	62								397	396	396	176	162	119	-	0.97	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-			395	396	399	194	193	202							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1 กดปิด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 23/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 23/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พพลฯ-อาริย์
วันที่ 29/1/65

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1												CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	53	-	54	-	-	-	-	-	-	-	399	399	395	221	183	209	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-			398	395	398	219	183	186							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พพลฯ-อาริย์
วันที่ 16. 01. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	BH	-	62							401	402	401	163	135	117	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	61			400	401	399	151	120	132							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 2 ตอนเช้า 2 เย็น

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16.1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พพลฯ-อาริย์
วันที่ 29/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	398	400	399	167	191	116	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-			398	400	398	100	99	132							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 คอมมอนิเคชั่น ช้ารุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/01/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม/พพลฯ-อาริย์
วันที่ 27/01/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	52	-	54	-	-	-	-	-	-	-	396	399	396	179	178	147	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-			396	397	395	112	113	147							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 คอมมอนิเคชั่น ช้ารุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 27/01/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 27/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-สาริ.
วันที่ 01/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	64	-	66	-	-	-	-	-	-	-	398	399	398	157	127	123	-	0.98	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	58	-			397	399	397	113	102	126							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 ตรวจพบปัญหาเรื่อง ช้าง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1/2/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 30/1/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-	397	399	398	148	140	146	-	0.99	-	1.00
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	1.00	-			399	398	400	105	103	141							-	1.00		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 30/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 30/1/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อา..
วันที่ 02/02/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	62	-	59	-							399	400	399	224	216	191	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	62	-			397	397	399	164	190	176							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ L ตรวจพบปัญหาเรื่อง L เสา

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 02/02/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 2/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 31/01/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	-	62	-	64							396	391	394	194	191	197	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	-	59									395	396	395	89	102	109	-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ตรวจพบปัญหาเรื่อง L เสา

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 31/1/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 31/1/67

น.3/37

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย

วันที่ 03. 02. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52	-	54																
13:00											398	400	399	234	214	152	-	0.99	-	0.99
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60			399	400	398	99	72	82							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ไ. ออฟเวอร์ 1 ที่ 2

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 03.02.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย

วันที่ 5/2/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-	395	397	395	271	228	185	-	0.99	-	1.00
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	-	-	396	397	396	171	176	169	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ คอนดิชันเนอร์ 1 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5/2/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย

วันที่ 6/2/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	59	57	57	-	-	-	-	-	-	401	405	402	133	133	159	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	-	-	399	400	401	211	235	166							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ คอนดิชันเนอร์ 1 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6/2/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย

วันที่ 4/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	396	398	395	232	217	186	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-			395	397	394	159	158	165							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 (คอนดิชันเนอร์ ชำรุด)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 4/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 4/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาจิร

วันที่ 9/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	64	–	56	–	–	–	–	–	–	–
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 2 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	397	399	397	132	130	126	–	0.97	–	098
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	58	–	–	–	395	397	395	144	146	151
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 4 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00							–	0.99		
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ – MDP 1 (ตอมอสิเทศธิกุล)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาจิร

วันที่ 7/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	62	–	64	–	–	–	–	–	–	–
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 2 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	397	399	398	171	138	150	–	0.97	–	098
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	56	–			397	399	397	170	145	153
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 4 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00							–	0.99		
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ – MDP 1 (ตอมอสิเทศธิกุล)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 7/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 7/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาจิร

วันที่ 10.02.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	–	53	–	52						
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 2 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	392	399	392	216	195	170	–	0.99	–	0.99
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	–	61			399	400	399	124	127	129
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 4 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00							–	0.96		
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. อาคารเครื่อง 1 ชั้น

2. อาคารสำนักงาน 3 ห้องประชุม

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 10.2.67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 10.02.67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาจิร

วันที่ 8.02.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	–	54	–	52						
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 2 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	401	403	402	192	207	163	–	0.97	–	0.97
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T
9:00	–	62			400	402	400	117	136	102
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

TIME	MDP 4 VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00							–	0.97		
13:00										
17:00										
21:00										
24.00										

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. อาคารเครื่อง 1 ชั้น

2. อาคารสำนักงาน 3 ห้องประชุม

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 8.2.67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 8/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาวิธ

วันที่ 13. 02. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	62	-																
13:00											399	396	397	169	114	150	-	0.99	-	0.99
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-			400	399	397	101	96	95							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ออฟเออร์ 1 เส้น

2. ฟิลเตอร์ออฟเออร์ 3 เส้น

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 13. 02. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 13. 2. 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาวิธ

วันที่ 11/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	52	-	56	-	-	-	-	-	-	-	396	398	396	197	165	193	-	0.98	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-			396	398	396	90	82	96							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1(ออมนิเทอร์ขัดข้อง)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 11/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 11/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาวิธ

วันที่ 14/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-	66	-	-	-	-	-	-	-	400	402	401	170	141	108	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	66	-			400	402	400	199	213	215							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ -ออมนิเทอร์ MDP 2 (ชำรุด)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 14/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 10/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาวิธ

วันที่ 12/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00																				
13:00											397	398	399	174	139	120	-	0.97	-	0.97
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00					400	399	401	155	149	150							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 12.02.2567

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 12. 2. 67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 17/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	400	402	401	145	143	141	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-			399	401	399	146	148	152							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 กดเบรคเกอร์ 3 ตัว

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 17/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 17/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 15/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	58	-	-	-	-	-	-	-	398	399	400	216	193	195	-	0.99	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	-	-	399	397	393	161	161	186							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 15/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 15/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 18.02.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52	-	54							400	402	399	218	201	190	-	0.97	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60			399	398	399	195	96	64							-	0.91		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ROOMDAN 1 เครื่อง

2. ปั๊ม ROOMDAN 2 เครื่อง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 18.02.62

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 18/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 16.02.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	59	-	57							399	400	399	202	141	149	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	61			399	398	399	124	124	146							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ROOMDAN 1 เครื่อง

2. ปั๊มROOMDAN 2 เครื่อง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 16.02.67

หัวหน้าช่างเทคนิค

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 16/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 21/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	54	-	62	-	-	-	-	-	-	397	399	399	110	158	135	-	1.00	-	1.00
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	53			401	400	399	259	245	260							-	0.96		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 19/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	57	-	57							397	400	399	171	117	157	2	0.44	0	0.49
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52			399	395	399	171	117	122							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 18/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 22/02/2567.

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	395	400	399	180	168	99	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	-	-	397	399	398	110	107	109							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 ตอมิเตอร์ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/02/2567.

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 20. 02 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52	-	54							410	395	410	129	120	142	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	53			397	399	399	137	122	134							-	0.91		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. [illegible]

2 [illegible]

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20/02/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 25/2/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	55	5-	54	-	-	-	-	-	-	-	398	399	399	247	199	160	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	56	-			395	396	396	242	191	166							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 25/2/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 26/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 23/02/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	50	-	59	-							399	400	394	166	118	132	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	62	-			400	398	399	190	165	140							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ตรวจเช็คเครื่อง UPS

2. ปั๊มดูดน้ำเสียเครื่องที่ 3 ใช้งาน

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 23/2/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 23/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 26/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	395	397	395	200	178	152	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	58	-			394	396	394	182	164	179							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 เครื่องมิเตอร์ขัดเรด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 26/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 26/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 24/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	398	399	397	190	210	204	-	0.97	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY (C)	WET (C)	DRY (C)	WET (C)	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	VOLT RS	VOLT ST	VOLT TR	CURRENT (A) R	CURRENT (A) S	CURRENT (A) T	QUANTITY WORK	COS q	QUANTITY WORK	COS q
9:00	58	-			397	399	396	176	157	189							-	0,99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 เครื่องมิเตอร์ขัดเรด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 24/02/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 24/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 29/02/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	54	–	56		–	–	–	–	–	–	400	402	401	218	117	167	–	0.97	–	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	58	–	–	–	167	164	168	399	409	399							–	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 ตอม่อหน้าเทอร์มินอล

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/02/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 27.02.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	–	62	–	56							377	410	377	150	150	170	–	0.99	–	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	–	60			410	411	377	111	147	122							–	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ตอม่อหน้าเทอร์มินอล 1 ต้น
2. ตู้ควบคุม 3 ต้น

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 27/02/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 27/02/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 01.03.62

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	–	56	–	[illegible]							399	420	398	164	106	169	–	0.99	–	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	–	61			402	401	404	131	101	130							–	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1 ตอม่อหน้า 1 ต้น
2 ตู้ควบ 3 ต้น

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1.3.62

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1/3/62

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 28/2/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.1 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP) WET (C)	MDP 1 VOLT RS	MDP 1 VOLT ST	MDP 1 VOLT TR	MDP 1 CURRENT (A) R	MDP 1 CURRENT (A) S	MDP 1 CURRENT (A) T	MDP 2 VOLT RS	MDP 2 VOLT ST	MDP 2 VOLT TR	MDP 2 CURRENT (A) R	MDP 2 CURRENT (A) S	MDP 2 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.1 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.1 COS q	CAPBANK NO.2 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.2 COS q
9:00	56	–	57	–	–	–	–	–	–	–	397	399	398	204	175	163	–	0.98	–	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.3 (TEMP) WET (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) DRY (C)	TRANSFORMER NO.4 (TEMP) WET (C)	MDP 3 VOLT RS	MDP 3 VOLT ST	MDP 3 VOLT TR	MDP 3 CURRENT (A) R	MDP 3 CURRENT (A) S	MDP 3 CURRENT (A) T	MDP 4 VOLT RS	MDP 4 VOLT ST	MDP 4 VOLT TR	MDP 4 CURRENT (A) R	MDP 4 CURRENT (A) S	MDP 4 CURRENT (A) T	CAPBANK NO.3 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.3 COS q	CAPBANK NO.4 QUANTITY WORK	CAPBANK NO.4 COS q
9:00	59	–	–	–	396	394	396	219	191	166	–	–	–	–	–	–	–	0.97	–	–
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 28/2/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 28/2/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 4/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	59	-	-	-	-	-	-	-	397	399	397	255	220	165	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-			396	397	399	105	120	124							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDB 1 ดอยู่ห้องMDB 3 ดอยู่ชมเชยสำนัก

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 4/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 4/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 3/3/66

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-	394	395	394	249	309	197	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	-	-	396	395	397	117	105	118							-	0.95		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDB 1 ดอยู่ห้องMDB 3 ดอยู่ชมเชย

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 2/3/66

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 2/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 05/03/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-	61	-	-	-	-	-	-	-	396	397	398	155	137	128	-	0.98	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			400	401	401	201	185	175							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 ดอยู่ห้องอาริย์ชั้น1

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 05/03/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 5/03/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-	56	-	-	-	-	-	-	-	400	402	400	268	268	206	-	0.97	-	0.95
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-			400	402	401	134	113	126							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 ดอยู่ห้องอาริย์ชั้น1

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 05/03/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 9/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-	398	400	399	216	225	213	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-			399	396	400	185	174	177							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 2 ปิดไฟ

98 MDB3 ปกติ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 06.03.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52	-	54							399	400	399	236	222	191	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60			397	404	404	222	277	251							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ตรวจเช็คทุก 1 ชม

2. ตรวจเช็คทุก start 3 ชม

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 6/7/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 6/7/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 9.3.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52	-	56							398	396	396	221	230	191	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60			396	398	399	101	120	142										
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ตรวจเช็คทุก MDB 1 ชม

2. ตรวจเช็คทุก 3 ชม

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 07/03/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	60	-	-	-	-	-	-	-	398	400	398	219	226	225	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-			399	401	400	209	211	151							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 ตรวจเช็คทุก 1 ชม

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 07/03/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 7/3/67

[redacted]

1:3/4/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 12. 03. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	\	5.8	-	60							399	399	400	210	151	204	—	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	—	54			396	398	399	26	160	191							—	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ตรวจสอบสาย L 1 จุด
2. ปั๊มทดอบสาย 3 เส้น

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 12. 3. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 12/03/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 10/03/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	63	—	58	—	-	-	-	-	-	-	395	397	395	206	243	194	—	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	66	-			396	396	393	250	238	227							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ จอมอมิเตอร์ MDP1 (ชำรุด)

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 10/03/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 10/6/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม/พหลฯ-อาริย์
วันที่ 13/03/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	-	60	-	—	—	—	—	—	—	401	403	401	231	232	232	—	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-			402	404	403	208	165	168							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 จอมอมิเตอร์ชำรุด
MDP2 ปั๊มทดสอบ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 13/03/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 13/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 11/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	59	-	-	-	-	-	-	-	400	403	401	217	187	144	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-			399	401	399	197	174	134							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 11/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 11/3/67

[redacted]

14/3/67

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 16/03/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	58	-	-	-	-	-	-	-	397	398	396	228	185	163	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ตอนเช้า เทอร์ MDP 1 ขึ้นไฟ, MDP 2 ไม่ขึ้นไฟ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16/03/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 14/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-	396	398	396	155	160	156	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-			399	400	398	229	229	229							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDB 1 ขึ้นไฟ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 14/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 14/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 17/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	393	393	392	245	256	171	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-			390	392	390										-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ตอน MDB 1 ขึ้นไฟ
ตอน MDB 2 ไม่ขึ้นไฟ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 17/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 17/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 15-03-67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	56	-	60							379	400	399	227	170	201				
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	62			400	401	399	190	220	201										
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. PENDANT 1 1.5
2. TRANSFORMER 1.5

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 15. 03. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 15/3/67

[redacted]

น.3/48

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 20/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	[illegible]	57	-	-	-	-	-	-	-	397	400	399	149	142	157	-	0.97	-	0.96
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-			397	400	399	162	152	154							-	0.95		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 10 MDB 1 ชั้น
10 MDB 2 ชั้นล่าง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 19. 03. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	56	-	62							399	396	370	241	154	162	-	0.79	-	0.92
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	59			396	392	395										-	0.77		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1 ชั้น MDB 1 N
2 ชั้น MDB 2 N

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 21. 3. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-							399	396	404	114	109	101	-	0.79	-	0.93
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-			397	394	399	156	160	157							-	0.93		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. MDB 1 ชั้น7
2. MDB 2 ชั้นล่าง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21. 3. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 19/03/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	66	-	58	-	-	-	-	-	-	-	400	402	401	199	209	187	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	69	-			-	-	-	399	401	399							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 ตอนนี้เหลือ 2 ชั้น
- MDP3 ปิดอยู่

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/03/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/3/67

[redacted]

1:3/49

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 24. 3 - 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	56	-	79							399	398	399	217	163	182	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60			394	392	397	139	133	145							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. MDB 1 ชั้น 2

2. MDB 3 ชั้น 2

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 24/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 24/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 22/03/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	62	-	-	-	-	-	-	-	397	400	398	216	155	134	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-			117	130	130	397	399	397							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1. ตอนนี้เทอร์มีปัญหา,
MDP3 ปิดการใช้งาน

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 22/03/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 22/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 25/03/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	58	-	-	-	-	-	-	-	396	398	397	241	198	178	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-			398	401	402	159	168	160							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 - ตอนนี้เทอร์มีปัญหา
MDP3 - ปิดการใช้งาน.

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 25/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 25/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 23/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	63	-	64	-	-	-	-	-	-	-	397	400	397	210	234	267	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-			398	400	399	130	157	149							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ตอน MDB 1 ชั้น 2
MDB 3 ปิดชั้น 2

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 23/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 23/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 28/03/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	62	-	-	-	-	-	-	-	401	403	401	218	180	171	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-			401	400	402	101	98	107							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 เอาออกมาเพื่อซ่อม
MDP 3 ปุ่มกดชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 28/03/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 28/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 26/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-	396	398	397	209	197	163	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-			395	397	395	163	180	171							-	0.96		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ต้อง MDB 1 เปิด
ต้อง MDB 2 ปิดเข้าใช้

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 26/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 26/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 29/3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-	399	401	399	210	213	165	-	0.99	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-			400	401	400	177	197	184							-	0.96		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ต้อง MDB 1 ไฟดับ
ต้อง MDB 2 ปุ่มกดไม่ได้

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 29/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 29/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 27. 3. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	56	-	59	-	-	-	-	-	-	399	400	399	195	193	166	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	62			397	399	398	222	220	219							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. TRANSIENT MDB 1 ON
2. TRANSIENT MDB 2 ON

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 27.3.67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 27/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 01/04/2567.

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	61	-	-	-	-	-	-	-	402	403	402	191	208	165	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	"			396	397	399	190	154	151							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ -MDP 1 ตรวจเช็คเรียบร้อยดีทุกจุด
-MDP 3 ปกติทุกจุดครับ.

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 01/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 30. 3. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	62	-	59							399	400	397	305	236	201	-	0.97	-	0.75
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52			399	400	399	102	197	124							-	0.72		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 30/3/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 30/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 2. 4. 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60	-	62							400	400	399	220	172	197	-	0.95	-	0.77
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	59			399	399	397	220	223	145							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. ตรวจเช็ค MDP 1 แล้ว
2. ตรวจเช็ค MDP 2 แล้ว

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 2.4.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 2/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 31.3/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-	396	400	397	302	228	239	-	1.0	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	55	-			396	399	395	108	159	140								0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 31.3.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 31/3/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาชีย์
วันที่ 5. 4 . 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52	-	59							377	397	373	220	140	165	-	0.95	-	0.92
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	60															-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. [redacted]
2.

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5. 4. 67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาชีย์
วันที่ 03/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	62	-	-	-	-	-	-	-	401	402	401	180	218	164	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 ดอมดีเทอร์ชำรุด
MDP 3 ปุ่มกดชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 03/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาชีย์
วันที่ 6/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-	398	400	398	199	201	204	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 ดอมดีเทอร์ชำรุด
MDP3 ปุ่มกดชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 6/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาชีย์
วันที่ 04/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-	62	-	-	-	-	-	-	-	397	399	398	232	116	163	-	0.95	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 ดอมดีเทอร์ชำรุด
- MDP 3 ปุ่มกดชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 04/04/2567

[redacted]
วันที่ 4/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 9/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	34	-	44	-	-	-	-	-	-	-	398	401	399	224	193	180	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 กดูเพลิงเทอร์มินอล
MDP3 ปุ่มกดสีชมพู

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 7/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-	395	397	395	246	245	174	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-			399	399	397	197	157	161								0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1 ปุ่มสีชมพู
MDB 3 ปุ่มสีเหลือง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 7/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 7/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 10/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	59	-							399	397	399	252	194	186	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-															-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDB1 ดูเพลิงเทอร์มินอล
- MDB 3 ปุ่มกดสีชมพู

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 10/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 10/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 8, 4, 67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	59	-	62	-	-	-	-	-	-	399	396	392	254	244	174	-	0.98	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	-	52			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 1. [redacted] MDB 1 ปุ่ม
2. MDB 3 ปุ่มสีชมพู

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 8/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 8/4/67

[redacted]

น.3/54

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 13/04/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-	61	-	-	-	-	-	-	-	401	399	399	201	230	216	-	0.98	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-			-	-	-	-	-	-							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 ลงน้ำมันไฮดรอลิค 5ลิตร

MDP3 ปุ่มกดชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 13/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 16/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 11/A/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-	63	-	-	-	-	-	-	-	396	396	396	232	215	183	-	1.00	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-			-	-	-	-	-	-							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1 ชำรุด

90 MDB 2 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 11/A/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 11/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 12/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	52	-	68	-	-	-	-	-	-	-	397	399	397	240	202	178	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-			-	-	-	-	-	-							-	0.94		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP1 ลงน้ำมันไฮดรอลิค 5ลิตร

MDP3 ปุ่มกดชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 12/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 14/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 12/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	62	-	-	-	-	-	-	-	399	401	399	242	234	240	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 ลงน้ำมันไฮดรอลิค 5ลิตร

MDP3 ปุ่มกดชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 12/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 12/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 17/04/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-	54	-	-	-	-	-	-	-	399	400	401	198	211	214	-	0.97	-	0.95
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 หม้อแปลงที่ 1150
MDP 3 ปั๊มกดอัดดี

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 17/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 17/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 19/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	62		-	-	-	-	-	-	406	403	394	211	232	209	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 หม้อแปลงที่ 1150
MDP3 ปั๊มกดอัดดี

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 19/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 19/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 18/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	56	-	-	-	-	-	-	-	400	403	400	847	194	804	-	0.99	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-			-	-	-	-	-	-							-	0.93		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 20 MDB 1 ชั้น 3 ฝั่งซ้าย

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 18/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 18/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์

วันที่ 16/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	64	-	-	-	-	-	-	-	417	400	398	203	190	169	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 หม้อแปลงที่ 1150
MDP3 ปั๊มกดอัดดี

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 16/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 16/4/67

[redacted]

น.3/56

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม,พหลฯ-อารีย์
วันที่ 21/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-	62	-	-	-	-	-	-	-	408	403	409	343	324	178	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1,3 ขัดข้อง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21/04/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 19/04/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	62	-	-	-	-	-	-	-	399	401	400	200	209	166	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1,3 ขัดข้อง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 22/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	62	-	-	-	-	-	-	-	401	400	397	240	230	197	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-															-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 ขัดข้องเรื่อง ขัดข้อง
- MDP 3 ขัดข้องขัดข้อง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 20/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-	59	-	-	-	-	-	-	-	401	403	401	297	246	274	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-			-	-	-	-	-	-							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ของ MDB 1 ขัดข้อง 3 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20/4/67

[redacted]

1:3/57

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 25/04/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	2	65	-	-	-	-	-	-	-	399	401	398	198	197	151	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	-															-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDP 1 กดมอนิเตอร์ ชำรุด
- MDP 3 ขึ้นภาพ ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 25/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 26/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 23/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	63	-	62	-	-	-	-	-	-	-	397	399	397	199	195	194	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			-	-	-	-	-	-							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1,3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 23/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 26/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 26/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	63	-	-	-	-	-	-	-	402	404	402	232	193	184	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-			-	-	-	-	-	-							0.97			
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1&3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 26/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 26/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 24/04/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	62	-	-	-	-	-	-	-	400	402	401	206	212	176	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	67	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1,3 กดมอนิเตอร์ ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 24/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 25/4/67

[redacted]

14.3/58

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 29/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	53	—	61	—	—	—	—	—	—	—	404	406	404	248	249	197	—	1.00	—	1.00
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	—			—	—	—	—	—	—							—	0.95		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ -MDP 1 กดเบรคเกอร์ ชำรุด
-MDP 3 ปุ่ม กด ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 29/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 29/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 27/04/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	—	66	—	—	—	—	—	—	—	402	400	401	248	248	206	—	0.97	—	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	—			—	—	—	—	—	—							—	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1,3 เบรคเกอร์ ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 27/04/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 27/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 30/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	60	-	—	—	—	—	—	—	409	404	402	184	255	164	—	0.99	—	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-			—	—	—	—	—	—							—	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1ชั้น 3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 30/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 30/4/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ ริยิ่ม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 94/4/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	64	-	—	—	—	—	—	—	394	397	394	245	264	255	—	0.99	—	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	—			—	—	—	—	—	—	—						—	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 94/4/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 28/4/67

[redacted]

น.3/59

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 09/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	62	-	-	-	-	-	-	-	401	404	402	299	220	222	-	1.00	-	0.96
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 คอม์เดนซิ่งเทคนิค ชำรุด
MDP3 ขุ่นกลาง ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 03/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 5/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 01/05/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	66	-	-	-	-	-	-	-	399	402	400	302	253	236	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-	61	-	-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ -MDP1, MDP3 คอมเพรสเซอร์ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 01/05/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 1/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 04/05/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	66	-	66		-	-	-	-	-	-	399	401	399	278	268	230	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	15	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1, MDP2 คอมเพรสเซอร์ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 04/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 4/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 2/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	66	-	-	-	-	-	-	-	398	401	399	298	229	198	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	63	-															-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 02/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 2/5/67

[redacted]

09/3/60

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์ วันที่ 07/05/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	62	-	-	-	-	-	-	-	399	401	400	224	200	163	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1,3 ออมอัตโนมัติ ชำรุด,ปุ่มกดชำรุด.

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 07/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 7/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์ วันที่ 5/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-	398	400	398	276	256	200	-	0.99	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-			-	-	-	-	-	-							-	0.96		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ ตอ MDB 1 ไม่ได้: 3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 5/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 5/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์ วันที่ 8/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	62	-	-	-	-	-	-	-	399	401	400	179	139	156	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-			-	-	-	-	-	-							-	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 8/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 8/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์ วันที่ 06/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	66	-	-	-	-	-	-	-	398	400	399	297	302	301	-	0.94	-	0.97
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	63	-			-	-	-	-	-	-							-	1.00		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 ออมอัตโนมัติ ชำรุด
MDP3 ปุ่มกด ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 06/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 6/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 11/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1												CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-	396	391	395	290	238	248	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1,3 ดอมอดิเทอร์ทำงาน

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 11/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 11/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 09/05/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1												CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	62	-	-	-	-	-	-	-				264	181	183	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1, 3 ดอมอดิเทอร์ทำงาน

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 09/05/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 9/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 12.5.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	60	-	-	-	-	-	-	-	397	399	397	264	240	244	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-			-	-	-	-	-	-								0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1และ3 ทำงาน

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 12/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 12/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 10.05.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	66	-	-	-	-	-	-	-	399	399	399	244	219	197	-	0.99	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-		-	-	-	-	-	-	-							-	0.95		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24:00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 ดอมอดิเทอร์ ทำงาน
MDP 3 ทำงานอยู่

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ลงชื่อ [redacted] วันที่ 10.05.67

หัวหน้าช่างเทคนิค ลงชื่อ [redacted] วันที่ 10/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 15/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-	62	-	-	-	-	-	-	-	404	406	405	201	205	176	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-			-	-	-	-	-	-							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1 แล: 3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 15/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 15/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 13.05.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-	62	-	-	-	-	-	-	-	400	402	401	218	167	149	-	1.00	-	0.95
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 ตู้ควบคุมไฟเลี้ยงชำรุด
MDP3 ชุมสาย ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 13.05.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 15/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 16/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	66	-	64	-	-	-	-	-	-	-	405	406	405	219	213	169	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			-	-	-	-	-	-							-	0.94		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1,3 ตู้ควบคุมไฟเลี้ยงชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 16/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อาริย์
วันที่ 14/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-	64	-	-	-	-	-	-	-	400	402	400	188	177	187	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68				-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1,3 ตู้ควบคุมไฟเลี้ยงชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 14/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 14/5/67

[redacted]

น.3/63

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 19/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	52	-	62	-	—	-	-	-	-	—	398	400	398	260	258	249	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	66	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1, 3 ปลอดภัยดีครับ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 19/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 17/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	—	67	—	—	-	—	-	-	—	401	401	399	220	219	163	—	1.00	-	1.00
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	69	—			-	—	—	—	—	—							—	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 17/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 17/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 20.05.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	61	-	—	-	-	-	-	-	399	402	403	129	221	209	—	1.00	—	0.997
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	62	-			-	-	—	—	—	—							—	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 ปลอดภัยดีครับ
MDP 3 ปลอดภัยดีครับ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20.05.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 20/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 18/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	69	-	-	-	-	-	-	-	400	409	400	248	244	247	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-			-	—	—	—	—	—							—	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 18/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 18/5/67

[redacted]

น.3/64

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 23/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	57	-	59	-	-	-	-	-	-	-	400	401	400	298	247	247	-	0.99	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-			-	-	-	-	-	-							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 20 MDB 111A:3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 23/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 24/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 21.5.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	60	-	62	-	-	-	-	-	-	-	397	399	398	219	191	165	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	65	-			-	-	-	-	-	-							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 20 MDB 111A: 3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21.5.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 21/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 24.05.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-	401	400	400	231	192	219	-	0.98	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.96		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1 ขอบอินเวอร์เตอร์ เสีย
MDP3 ปุ่มกดเสีย

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 24.05.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 24/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 22/05/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	64	-	62	-	-	-	-	-	-	-	400	401	399	163	204	162	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	68	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDB1, 2 ตอนอินเวอร์เตอร์เสีย, ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/05/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 22/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 27/05/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	37	~	57	~	~	~	~	~	~	~	400	401	402	217	214	192	~	0.98	~	100
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	36	~	~	~	~	~	~	~	~	~							~	0.97		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP 1 ,MDP3 ตอนเช้าเวลา ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 27.05.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 27/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 25/05/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	~	64	~	~	~	~	~	~	~	399	409	398	158	169	160	~	0.97	~	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	~			~	~	~	~	~	~							~	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ - MDB 1,3 ขอบคุณมากค่ะ ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 25/05/2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 25/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 28/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	~	59	~	~	~	~	~	~	~	401	401	402	146	146	143	~	1.00	~	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	~			~	~	~	~	~	~							~	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1 ปิด 3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 28/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 28/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 26/5/67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	~	58	~	~	~	~	~	~	~	400	402	400	248	249	247	~	1.00	~	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	~			~	~	~	~	~	~							~	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 90 MDB 1 ปิด 3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 26/5/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 26/5/67

[redacted]

1.3/69

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 31.5.67

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	59	-	60	-	-	-	-	-	-	-	402	404	402	147	147	154	-	1.00	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	61	-			-	-	-	-	-	-							-	0.98		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ 40 MDB 1,2,3 ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 31.5.67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 31/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 29/05/2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-	402	404	402	158	158	194	-	0.97	-	0.98
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-			-	-	-	-	-	-							-	0.99		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDB1, 3 คอมเพรสเซอร์ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/05/67

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 29/5/67

[redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน

โครงการ วิธีม พหลฯ-อารีย์
วันที่ 30.09.2567

TIME	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)		TRANSFORMER NO.2 (TEMP)		MDP 1						MDP 2						CAPBANK NO.1		CAPBANK NO.2	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	58	-	61	-	-	-	-	-	-	-	399	401	400	211	199	199	-	0.98	-	0.99
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

TIME	TRANSFORMER NO.3 (TEMP)		TRANSFORMER NO.4 (TEMP)		MDP 3						MDP 4						CAPBANK NO.3		CAPBANK NO.4	
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			QUANTITY	COS	QUANTITY	COS
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	WORK	q	WORK	q
9:00	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0		
13:00																				
17:00																				
21:00																				
24.00																				

หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT

อื่นๆ MDP1,7 คอมเพรสเซอร์ชำรุด

เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 30.09.2567

หัวหน้าช่างเทคนิค
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 30/9/67

[redacted]

1/3/67

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240100001
วันที่ปฏิบัติ	04/01/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
3	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1295....ลิตร				
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น....44....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....83....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น....0....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....0....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	START....14.10....ชม.				
	STOP....14.25....ชม.				
6	เวลา	✔			
	START....14.10....น.				
	STOP....14.25....น.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1499....RPM				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
2	ความถี่	✔			
	ความถี่....50....HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....25.2....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	S-T....401....โวล์ต				
	R-S....401....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
5	วัดกระแส	✔			
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
	T....0....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....14.25....ชม.				
	START....14.10....ชม.				

<u>รวยชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] .....

[redacted] .....

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายสองอีกชั่วโมง</u> PM Generator ประจำสัปดาห์

<u>สาเหตุ</u> PM Generator ประจำสัปดาห์

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240100002
วันที่ปฏิบัติ	11/01/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1290....ลิตร				
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....13.35....ชม.				
	START....13.20....ชม.				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.3....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	ความถี่	✔			
	ความถี่....50....HZ				
5	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....401....โวล์ต				
	S-T....401....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
6	วัดกระแส	✔			
	R....290....แอมป์				
	S....230....แอมป์				
	T....230....แอมป์				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
2	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น....0....PSI				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....60....F				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น....40....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....82.2....ชม.				
	START....82.1....ชม.				
6	เวลา	✔			
	START....13.20....น.				
	STOP....13.35....น.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด Pmประจำสัปดาห์

สาเหตุ Pmประจำสัปดาห์

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีซเพอร์ดี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240200003
วันที่ปฏิบัติ	15/02/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
3	วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1290....ลิตร				
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่อยู่ ATS	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
11	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์ฉนวนเครื่อง	✔			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คค่าความแร่งจำเพาะของ BATTERY	✔			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น....85....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น....34....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....65....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....13.15....ชม.				
	START....13.00....ชม.				
6	เวลา	✔			
	STOP....13.15....น.				
	START....13.00....น.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
2	ความถี่	✔			
	ความถี่....50....HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.4....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....401....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
	S-T....401....โวล์ต				
5	วัดกระแส	✔			
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
	T....0....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....13.15....ชม.				
	START....13.00....ชม.				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สาเหตุ PM ประจำสัปดาห์

ข้อแนะนำ -

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240200005
วันที่ปฏิบัติ	29/02/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....85....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....83....PSI				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....41....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....14.15....ชม.				
	START....14.00....ชม.				
6	เวลา	✔			
	STOP....14.15....น.				
	START....14.00....น.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร				
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
12	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ความดี	✔			
	ความดี....50....HZ				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....232....โวล์ต				
	S-T....231....โวล์ต				
	T-R....231....โวล์ต				
5	วัดกระแส	✔			
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
	T....0....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....14.15....ชม.				
	START....14.00....ชม.				

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ pmประจำสัปดาห์

ข้อแนะนำ -

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240300001
วันที่ปฏิบัติ	07/03/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดกระแส	✔			
	R....0....แอมป์				
	T....0....แอมป์				
	S....0....แอมป์				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....15.25....ชม.				
	START....15.10....ชม.				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
4	ความถี่	✔			
	ความถี่....50....HZ				
5	โหลดวัด BATTERY	✔			
	โหลดวัด BATTERY....27.4....แอมป์				
6	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....401....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
	S-T....401....โวล์ต				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1290....ลิตร				
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
10	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....42....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....82....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....82....PSI				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....45....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....15.25....ชม.				
	START....15.10....ชม.				
6	เวลา	✔			
	STOP....15.25....น.				
	START....15.10....น.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM Generator ประจำสัปดาห์

สาเหตุ PM Generator ประจำสัปดาห์

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240300003
วันที่ปฏิบัติ	21/03/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	START....83.1....ชม.				
	STOP....83.2....ชม.				
2	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....120....F				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....125....F				
4	เวลา	✔			
	START....11.55....น.				
	STOP....12.05....น.				
5	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....82....PSI				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....390....โวล์ต				
	T-R....390....โวล์ต				
	S-T....390....โวล์ต				
2	ความถี่	✔			
	ความถี่....50.0....HZ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	วัดกระแส	✔			
	T....0....แอมป์				
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....83.2....ชม.				
	START....83.1....ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.5....แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็ครอดับน้ำมันท่อเย็น	✔			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
4	ตรวจเช็คท่อยากาศไอเสีย	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
8	ตรวจเช็คท่อยากาศไอดี	✔			
9	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
11	ระดับน้ำมันชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันชื้อเพลิง....1296....ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
15	ตรวจเช็คหม้อน้ำท่อเย็น	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายสัปดาห์ ทดสอบ generator ประจำสัปดาห์

รายเดือน ทดสอบ generator ประจำสัปดาห์

ตำแหน่งน้ำ ตรวจสอบระดับหม้อน้ำและน้ำกลั่นก่อนทำการทดสอบทุกครั้ง

การแก้ไขผล ทดสอบ generator ประจำสัปดาห์ ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเครื่องเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเครื่องแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240300004
วันที่ปฏิบัติ	28/03/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา	✔			
	START....13.00....น.				
	STOP....13.15....น.				
2	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				
3	แรงดันน้ำมันชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันชื้อเพลิง....84....PSI				
4	แรงดันน้ำมันท่อเย็น	✔			
	แรงดันน้ำมันท่อเย็น....0....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำท่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำท่อเย็น....39....F				
6	อุณหภูมิน้ำมันท่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันท่อเย็น....0....F				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....14.15....ชม.				
	START....14.00....ชม.				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	START....14.00....ชม.				
	STOP....14.15....ชม.				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.4....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....401....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
	S-T....401....โวล์ต				
5	วัดกระแส	✔			
	R....231....แอมป์				
	S....231....แอมป์				
	T....231....แอมป์				
6	ความถี่	✔			
	ความถี่....50.0....HZ				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
3	ระดับน้ำมันชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันชื้อเพลิง....1286....ลิตร				
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
7	ตรวจเช็ครอดับน้ำมันท่อเย็น	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
11	ตรวจเช็คท่อยากาศไอดี	✔			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำท่อเย็น	✔			
13	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คท่อยากาศไอเสีย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ PMประจำเดือน

ข้อแนะนำ -

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240400001
วันที่ปฏิบัติ	04/04/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พัฒน Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำฉีนพ่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำฉีนพ่อลื่น....0....F				
2	เวลา	✔			
	STOP....13.15....น.				
	START....13.00....น.				
3	แรงดันน้ำฉีนเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำฉีนเชื้อเพลิง....68....PSI				
4	แรงดันน้ำฉีนพ่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำฉีนพ่อลื่น....0....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำพ่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำพ่อลื่น....85....F				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....13.45....ชม.				
	START....13.30....ชม.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
3	ระดับน้ำฉีนเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำฉีนเชื้อเพลิง....1285....ลิตร				
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็ควบบ MANUAL START	✔			
7	ตรวจเช็ครดับน้ำฉีนพ่อลื่น	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ชู ATS	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
11	ตรวจเช็คท่อยอากาศไอดี	✔			
12	ตรวจเช็ครดับน้ำพ่อลื่น	✔			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คค่าความแร่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
2	ความถี่	✔			
	ความถี่....50.00....HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.4....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....401....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
	S-T....401....โวล์ต				
	วัดกระแส	✔			
	R....270....แอมป์				
	T....260....แอมป์				
	S....267....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....13.45....ชม.				
	START....13.30....ชม.				

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำสัปดาห์

สาเหตุ PMประจำสัปดาห์

ข้อแนะนำ -

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240400002
วันที่ปฏิบัติ	11/04/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....45....F				
2	เวลา	✔			
	STOP.....10.25.....น.				
	START.....10.10.....น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	START.....10.10.....ชม.				
	STOP.....10.15.....ชม.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....43....F				
5	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....82....PSI				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดกระแส	✔			
	T.....0.....แอมป์				
	S.....0.....แอมป์				
	R.....0.....แอมป์				
2	ความถี่	✔			
	ความถี่.....50.....HZ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.3.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S.....401.....โวล์ต				
	T-R.....401.....โวล์ต				
	S-T.....401.....โวล์ต				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP.....10.25.....ชม.				
	START.....10.10.....ชม.				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่อยางหัวเสีย	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
3	ตรวจเช็ครดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✔			
5	ตรวจเช็ครดับน้ำหล่อเย็น	✔			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1290.....ลิตร				
9	ตรวจเช็คค่าความแข็งจำเพาะของ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
13	ตรวจเช็ครบบระบายความร้อน	✔			
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
15	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> PM generator ประจำสัปดาห์

<u>สาเหตุ</u> PM generator ประจำสัปดาห์

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ไขปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240400003
วันที่ปฏิบัติ	18/04/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็ครดับน้ำหล่อเย็น	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✔			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1296.....ลิตร				
8	ตรวจเช็ครบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
11	ตรวจเช็คค่าความแข็งจำเพาะของ BATTERY	✔			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
15	ตรวจเช็ครดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดแรงดัน	✔			
	R-S.....390.....โวล์ต				
	T-R.....397.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				
2	วัดกระแส	✔			
	R.....0.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	S....0....แอมป์				
	T....0....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
4	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	START....83.3....ชม.				
	STOP....83.4....ชม.				
5	ความถี่	✔			
	ความถี่....50.0....HZ				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....12.0....แอมป์				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	START....83.3....ชม.				
	STOP....83.4....ชม.				
2	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....120....F				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....85....F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
5	เวลา	✔			
	START....83.3....น.				
	STOP....83.4....น.				
6	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....125....PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM generator ประจำสัปดาห์

สาเหตุ PM genexator ประจำสัปดาห์

ข้อแนะนำ PM generator ประจำสัปดาห์

การแก้ไขฯ PM generator ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขถัด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240400004
วันที่ปฏิบัติ	25/04/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดการแส	✔			
	T....398....แอมป์				
	S....397....แอมป์				
	R....395....แอมป์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....12....แอมป์				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....83.4....ชม.				
	START....83.3....ชม.				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
5	ความถี่	✔			
	ความถี่....50....HZ				
6	วัดแรงดัน	✔			
	T-R....399....โวล์ต				
	R-S....395....โวล์ต				
	S-T....397....โวล์ต				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....96....PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....85....F				
3	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....120....F				
6	เวลา	✔			
	START....83.3....น.				
	STOP....83.4....น.				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....83.4....ชม.				
	START....83.3....ชม.				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
2	ตรวจเช็คท่อยากาศไอดี	✔			
3	ตรวจเช็คท่อยากาศไอเสีย	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์การในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
5	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1295....ลิตร				
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
15	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM gent ประจำสัปดาห์

สาเหตุ PM gent ประจำสัปดาห์

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240500001
วันที่ปฏิบัติ	02/05/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ความถี่	✔			
	ความถี่.....50.0.....HZ				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.1.....แอมป์				
3	วัดกระแส	✔			
	S.....232.....แอมป์				
	R.....232.....แอมป์				
	T.....232.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S.....401.....โวล์ต				
	T-R.....401.....โวล์ต				
	S-T.....401.....โวล์ต				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP.....14.15.....ชม.				
	START.....14.00.....ชม.				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....41.....F				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....0.....F				
3	เวลา	✔			
	START.....14.00.....น.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	STOP.....14.15.....น.				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP.....14.15.....ชม.				
	START.....14.00.....ชม.				
5	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....82.....PSI				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
3	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1270.....ลิตร				
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✔			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
10	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
11	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆของเครื่อง	✔			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำสัปดาห์

สาเหตุ PMประจำสัปดาห์

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240500002
วันที่ปฏิบัติ	09/05/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....33....F				
2	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1500....RPM				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....85....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....0....F				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....15.15....ชม.				
	START....15.00....ชม.				
7	เวลา	✔			
	STOP....15.15....น.				
	START....15.00....น.				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
2	ตรวจเช็คท่อยากไอเสีย	✔			
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1270....ลิตร				
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
5	ตรวจเช็คค่าความแร่งจำเพาะของ BATTERY	✔			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
13	ตรวจเช็คท่อยากไอดี	✔			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
15	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....15.15....ชม.				
	START....15.00....ชม.				
2	วัดกระแส	✔			
	T....0....แอมป์				
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
4	ความถี่	✔			
	ความถี่....50.0....HZ				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.7....แอมป์				
6	วัดแรงดัน	✔			
	T-R....231....โวล์ต				
	S-T....231....โวล์ต				
	R-S....231....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สาเหตุ PM ประจำสัปดาห์

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา เรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240500003
วันที่ปฏิบัติ	16/05/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
2	ความถี่	✔			
	ความถี่....50.0....HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....29.0....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....0....โวล์ต				
	T-R....0....โวล์ต				
	S-T....0....โวล์ต				
5	วัดกระแส	✔			
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
	T....0....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....83.7....ชม.				
	START....83.6....ชม.				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....85....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....81....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	จุดหยุดน้ำหล่อเย็น	✔			
	จุดหยุดน้ำหล่อเย็น....90....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP.....16.00.....ชม.				
	START.....15.50.....ชม.				
6	เวลา	✔			
	STOP.....16.00.....น.				
	START.....15.50.....น.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1296.....ลิตร				
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
10	ตรวจเช็คท่อไอจากไอดี	✔			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
13	ตรวจเช็คท่อไอจากไอเสีย	✔			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คค่าความอ่วงจำพาสของ BATTERY	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด ทดสอบ generator ที่ 11ประจำสัปดาห์

สาเหตุ ทดสอบ generator ที่ 11ประจำสัปดาห์

คำแนะนำ ทดสอบ generator ที่ 11ประจำสัปดาห์

การแก้ไขปัญหา ทดสอบ generator ที่ 11ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วทดสอบซ้ำ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240500004
วันที่ปฏิบัติ	23/05/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พัดน Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
2	ความถี่	✔			
	ความถี่....29.0....HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✔			
	R-S.....โวล์ต				
	T-R.....โวล์ต				
	S-T.....โวล์ต				
5	วัดกระแส	✔			
	S....83.6....แอมป์				
	R....84.5....แอมป์				
	T....83.7....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP.....ชม.				
	START.....ชม.				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	จุดหยุดน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	จุดหยุดน้ำมันหล่อเย็น....86....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....0....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น....81....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	จุดหยุดน้ำหล่อเย็น	✔			
	จุดหยุดน้ำหล่อเย็น....84....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP.....16.00.....ชม.				
	START.....15.50.....ชม.				
6	เวลา	✔			
	STOP.....16.00.....น.				
	START.....15.50.....น.				
7	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1295....ลิตร				
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
10	ตรวจเช็คท่อไอจากไอดี	✔			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
13	ตรวจเช็คท่อไอจากไอเสีย	✔			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			
15	ตรวจเช็คค่าความอ่วงจำพาสของ BATTERY	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด ทดสอบ gen

สาเหตุ ทดสอบ gen

คำแนะนำ ทดสอบ gen

การแก้ปัญหา ทดสอบ gen

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแจ้งซ่อม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-11-01
เลขที่ใบงาน	PM240500005
วันที่ปฏิบัติ	30/05/2024
ชื่ออาคาร	RPA | 11 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้อง Generator

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✔			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....54....F				
2	เวลา	✔			
	STOP....15.05....น.				
	START....14.50....น.				
3	ความเร็วรอบ	✔			
	ความเร็วรอบ....1499....RPM				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....82....PSI				
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....80....PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....53....F				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	START....14.50....ชม.				
	STOP....15.05....ชม.				
	ตรวจเช็กตู้ GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✔			
	STOP....15.05....ชม.				
	START....14.50....ชม.				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✔			
3	วัดแรงดัน	✔			
	R-S....401....โวล์ต				
	S-T....401....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
4	ความถี่	✔			
	ความถี่....50....HZ				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✔			
	ไฟชาร์จ BATTERY....29.8....แอมป์				
6	วัดกระแส	✔			
	T....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
	S....0....แอมป์				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คค่าความอ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
9	ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง	✔			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1290....ลิตร				
11	ตรวจเช็คท่อยางไอดี	✔			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
14	ตรวจเช็คท่อยางไอเสีย	✔			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✔			

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM Generator ประจำสัปดาห์

สาเหตุ PM Generator ประจำสัปดาห์

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแจ้งซ่อม (CM)
