ภาคผนวก

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
  เลขทะเบียน ว-236

ภาคผนวก ก
เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ อก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ. เลขที่ ทส 1009.3/24523 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ภาคผนวก ก-3 ใบอนุญาตการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

- ใบอนุญาตขุดดิน
- ใบอนุญาตถมดิน
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ประเภทควบคุมการใช้

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือเห็นชอบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ อก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566



ที่ อก ๐๓๐๔/๑๖๐๓๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่สญ. ๐๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ ๔ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาในฐานะหน่วยงานอนุญาต ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการขอยกเลิกพื้นที่ที่โรงผลิตสารปรับปรุงดิน (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างหนึ่งอย่างใด (๑) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์) ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะขอเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานอนุญาต ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๔,๗๗๓ ตารางเมตร หรือ ๒๑.๗๓ ไร่ (ร้อยละ ๑.๓๕ ของพื้นที่โครงการทั้งหมด) โดยไม่ทำให้ขนาดพื้นที่ในภาพรวมของโครงการเปลี่ยนแปลงไป (พื้นที่โครงการประมาณ ๒,๕๗๒,๙๑๒ ตารางเมตร หรือ ๑,๖๐๘.๐๗ ไร่) โครงการได้กำหนดพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงผลิตสารปรับปรุงดินไว้ด้านนอกพื้นที่โครงการ

๒. ทบทวนระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขอเปลี่ยนนิติบุคคล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในการบริหารจัดการ โครงการจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล

๒.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ ๒.๖ ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการขอเปลี่ยนแปลงโดยจะส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection pit) ของโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง Holding Pond ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

๒.๒ ขอเปลี่ยน ...

๒.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการน้ำทิ้งที่ผ่านมาตรฐานจากบ่อพักน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล ตามรายงานฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ำทิ้งที่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะถูกเก็บไว้ในบ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด ๖๕๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อนหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ และน้ำทิ้งที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จะส่งไปเก็บที่บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) ของโรงงานผลิตน้ำตาล ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จะขอส่งน้ำทิ้งที่เหลือใช้ประโยชน์จากบ่อพักน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล เข้าบ่อเก็บน้ำดิบของโรงงานผลิตน้ำตาล

๓. ทบทวนแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาต ตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว การเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เห็นควรอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และขอนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒
ส่วนที่ ๕
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๖ ต่อ ๑๕๐๖
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๖ ต่อ ๑๕๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๑๔๗๘๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๙๙๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ ทท.สวล. ๖๕๐๘๐๐๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ตั้งอยู่ที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ตั้งอยู่ที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และต่อมาบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ จัดทำรายงานโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ตั้งอยู่ที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสานนิติบุคคลผู้มีสิทธิ

ทำรายงาน...

ทำรายงานเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทิรา เอื้อมลณัตร)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือรับทราบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ.
เลขที่ ทส 1009.3/24523 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๒๔๕๒๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๐๔/๑๖๐๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ให้ กรอ. พิจารณาในฐานะหน่วยงานอนุญาต ซึ่ง กรอ. พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ ๔ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค ที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๖ (เกษร)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

ภาคผนวก ก-3

ใบอนุญาตการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

- ใบอนุญาตขุดดิน
- ใบอนุญาตถมดิน
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ประเภทควบคุมการใช้

ขถด.๒

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

เลขที่ ๔/๒๕๖๗

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เจ้าของที่ดิน โดยมี นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้รับมอบอำนาจ ว่ามีความประสงค์จะทำการ~~ขุดดิน~~/ถมดิน/~~ลึก~~/สูง - เมตร ~~พื้นที่ปาก บ่อ~~/ดินถม - ตารางเมตร ดังนี้

๑. พื้นที่คันกันน้ำ ๘๗๗๖ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร
๒. พื้นที่หมายเลข ๑ มีพื้นที่ ๑๘๑,๐๐๐ ตาราง สูงเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร
๓. พื้นที่หมายเลข ๒ มีพื้นที่ ๕๒๙,๙๕๐ ตาราง สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
๔. พื้นที่หมายเลข ๓ มีพื้นที่ ๕๙๙,๕๐๐ ตาราง สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร

ในโฉนดที่ดิน/~~น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑~~ เลขที่ ๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๔๕๘๘-๔๕๘๙,๕๐๖๗,๕๐๖๘,๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓ ๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒-๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒,๑๗๔๐๖ ,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕ หรือเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น - ที่ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบล/~~แขวง~~ ผักขะ อำเภอ/~~เขต~~ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว ซึ่งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ โดย บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เป็นเจ้าของที่ดิน กำหนดแล้วเสร็จ ๓๖๕ วัน มี นายเชิดศักดิ์ สังสมานันท์ สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๑๔๗๖๙ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ และ นายเชิดศักดิ์ สังสมานันท์ สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๑๔๗๖๙ เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ☐ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้.....

๒. ☑ ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการ~~ขุดดิน~~/ถมดิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้รับค่าธรรมเนียมถมดินพื้นที่ละ ๕๐๐.- บาท ค่าใช้จ่าย - บาท รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.- บาท (-สองพันบาทถ้วน-)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

อบต. ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

หมายเหตุ ๑.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒.ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง (พลิก)

<u>คำเตือน</u> ผู้ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน

(๒) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕

(๓) ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่

(๔) การฝ่าฝืน (๑) – (๓) อาจมีโทษปรับ โทษจำหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี

ที่ สก ๗๔๙๐๓/๓๙๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๖๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการออกใบรับแจ้งการถมดิน

เรียน **บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด**

อ้างถึง ใบแจ้งการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ตามใบแจ้ง~~ขุดดิน~~/ถมดิน เลขที่ ๔/๒๕๖๗ หนังสือรับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เลขที่ ๙๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ใบแจ้งถมดิน สูง ..-.. เมตร ~~พื้นที่ปากบ่อ~~/ดินถม ..-.. ตารางเมตร ดังนี้

๑. พื้นที่คันกันน้ำ ๘,๗๗๖ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร
๒. พื้นที่หมายเลข ๑ มีพื้นที่ ๑๘๑,๐๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร
๓. พื้นที่หมายเลข ๒ มีพื้นที่ ๕๒๙,๙๕๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
๔. พื้นที่หมายเลข ๓ มีพื้นที่ ๕๙๙,๕๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร

ในโฉนดที่ดิน/~~น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ป.๑~~ เลขที่

~~๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๔๕๘๘-๔๕๘๙,๕๐๖๗,๕๐๖๘,๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒-๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒, ๑๗๔๐๖,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕~~

เพื่อออกใบแจ้งการถมดิน นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว จึงให้ท่านขอรับใบแจ้งการถมดินตามแบบ ขถด.๒ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ก่อนรับใบแจ้งการขุดดินและถมดิน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการถมตามรายการที่ ๑ - ๔ รายการละ ..-๕๐๐.-.. บาท

จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -๒,๐๐๐.- บาท (-สองพันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านขอรับใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

กองช่าง อบต.ผักขะ
โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๖๗๗๐ ต่อ ๑๒
หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เจ้าของที่ดิน โดยมี นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้รับมอบอำนาจ ว่ามีความประสงค์จะทำการขุดดิน/~~ถมดิน~~/ลึก/สูง - เมตร จำนวน ๕ บ่อ พื้นที่ปากบ่อ/~~ดินถม~~ ดังนี้

๑. บ่อ T๑ พื้นที่ปากบ่อ ๑๕๘,๕๐๘ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๒. บ่อ T๒ พื้นที่ปากบ่อ ๑๑๕,๑๗๓ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๓. บ่อ T๓ พื้นที่ปากบ่อ ๖๒,๖๐๒ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๔. บ่อ T๔ พื้นที่ปากบ่อ ๓๗,๗๔๓ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๕. บ่อ T๕ พื้นที่ปากบ่อ ๔๑,๒๓๓ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร

ในโฉนดที่ดิน/~~น.ส.๓/น.ส.๓/ส.ค.๑~~ เลขที่ ๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๔๕๘๘-๔๕๘๙,๕๐๖๗,๕๐๖๘,๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓ ๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒-๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒,๑๗๔๐๖ ,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕ หรือเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น - ที่ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบล/~~แขวง~~ ผักขะ อำเภอ/~~เขต~~ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว ซึ่งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ โดย บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เป็นเจ้าของที่ดิน กำหนดแล้วเสร็จ ๓๖๕ วัน มี นายเชิดศักดิ์ สังสมานันท์ สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๑๔๗๖๙ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ และ นายเชิดศักดิ์ สังสมานันท์ สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๑๔๗๖๙ เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ☐ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้.....

๒. ☑ ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้รับค่าธรรมเนียมถมดินพื้นที่ละ ๕๐๐.- บาท
ค่าใช้จ่าย - บาท รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

หมายเหตุ ๑.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒.ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง (พลิก)

<u>คำเตือน</u> ผู้ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน

(๒) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕

(๓) ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่

(๔) การฝ่าฝืน (๑) – (๓) อาจมีโทษปรับ โทษจำหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี

ที่ สก ๗๔๙๐๓/ว๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๖๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการต่ออายุใบรับแจ้งการขุดดิน
เรียน **บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด**
อ้างถึง หนังสือรับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เลขรับที่ ๒๑๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

ตามคำขอต่ออายุใบรับแจ้งขุดดิน เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ใบแจ้งขุดดิน ลึก ....-..... เมตร พื้นที่ปากบ่อ/~~ดินถม~~ ....-..... ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๕ บ่อ ดั้งนี้

๑. บ่อ T๑ พื้นที่ปากบ่อ ๑๕๘,๕๐๘ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๒. บ่อ T๒ พื้นที่ปากบ่อ ๑๑๕,๑๗๓ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๓. บ่อ T๓ พื้นที่ปากบ่อ ๖๒,๖๐๒ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๔. บ่อ T๔ พื้นที่ปากบ่อ ๓๗,๗๔๓ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร
๕. บ่อ T๕ พื้นที่ปากบ่อ ๔๑,๒๓๓ ตารางเมตร ขุดดินลึก ๑๐.๕๐ เมตร

ในโฉนดที่ดิน/~~น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ก.๗~~ เลขที่
~~๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๔๕๘๘-๔๕๘๙,๕๐๖๗,๕๐๖๘,๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒-๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒, ๑๗๔๐๖,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕~~

เพื่อออกใบแจ้งการขุดดิน นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว จึงให้ท่านขอรับใบแจ้งการขุดดินตามแบบ ขถด.๒ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ก่อนรับใบแจ้งการขุดดินและถมดิน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินรายการที่ ๑ - ๕ รายการละ ....-๕๐๐.-.....บาท
รวม ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น....-๒,๕๐๐.-....บาท (..-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-..)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านขอรับใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

กองช่าง อบต.ผักขะ
โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๖๗๗๐ ต่อ ๑๒
หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-00114/67

วันที่ 18 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

ได้รับเงินจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00	
		รวมเงิน	2,500.00	

ตัวอักษร (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวมะลิ ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

อบต. ผักขะ

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร เลขที่บัญชี 378-2-17231-7 วันที่ 18 กันยายน 2567 : 2,500.00 บาท

รวม : 2,500.00 บาท



ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๓/๒๕๖๗

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น ๒๑ ถนน ศรีอยุธยา ~~ตำบล~~/แขวง พญาไท ~~อำเภอ~~/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ในใบอนุญาตเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ใบรับแจ้งเลขที่ ๑๘๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพัสดุ ขนาด ๓๐.๐๐x๗๒.๐๐ เมตร พื้นที่อาคาร/ความยาว ๒,๔๓๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ที่บ้านเลขที่ ๙๙๙ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบล/~~แขวง~~ ผักขะ อำเภอ/~~เขต~~ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐

โดยมี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

หรือ - ผู้ครอบครองอาคาร

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ ..... เลขที่ ๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๕๐๖๗,๕๐๖๘ ๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒,๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘ ,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒,๑๗๔๐๖,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕

เป็นที่ดินของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

.....

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๒/๒๕๖๗

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น ๒๑

ถนน ศรีอยุธยา ~~ตำบล~~/แขวง พญาไท ~~อำเภอ~~/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

ในใบอนุญาตเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ใบรับแจ้งเลขที่ ๑๘๙๖/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๒) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารห้องชั่งอ้อย ขนาด ๕.๐๐x๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่อาคาร/ความยาว ๖๕ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ที่บ้านเลขที่ ๙๙๙ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบล/~~แขวง~~ ผักขะ

อำเภอ/~~เขต~~ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐

โดยมี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

หรือ - ผู้ครอบครองอาคาร

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ ..... เลขที่

๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๕๐๖๗,๕๐๖๘ ๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒,๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘ ,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒,๑๗๔๐๖,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕

เป็นที่ดินของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

.....

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๔. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๔/๒๕๖๗

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น ๒๑ ถนน ศรีอยุธยา ~~ตำบล~~/แขวง ถนนพญาไท ~~อำเภอ~~/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ในใบอนุญาตเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ใบรับแจ้งเลขที่ ๑๘๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารเสาม่านกันฝุ่นกากอ้อย กว้าง ๒.๒๐ เมตร สูง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พื้นที่ ๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร ที่บ้านเลขที่ ๙๙๙ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบล/~~แขวง~~ ผักขะ อำเภอ/~~เขต~~ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐ โดยมี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร หรือ - ผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ ..... เลขที่ ~~๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๕๐๖๗,๕๐๖๘ ๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒,๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘ ,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒,๑๗๔๐๖,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕~~

เป็นที่ดินของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

.....

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๙. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๑๐. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ที่ สก ๗๔๙๐๓/๓๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
วัฒนานคร สระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๕)

เรียน **บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด**

อ้างถึง คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบ ข.๕

ตามคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๔/๒๕๖๗ หนังสือรับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เลขที่ ๑๘๐๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบ ข.๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว จึงให้ท่านขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อ.๕ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ก่อนรับใบรับรอง ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียม ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๕) ใบละ ๑๐๐ บาท

๑.๑ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน -๑๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -๑๐๐.- บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านขอรับใบรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับรองอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

กองช่าง อบต.ผักขะ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๖๖๐
หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 25 / 2567

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

ได้รับเงินจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00	
		รวมเงิน	**100.00**	
ตัวอักษร (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวมะลิ ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร		100.00 บาท
เลขที่บัญชี 378-2-17231-7 วันที่ 16 สิงหาคม 2567		
	รวม :	**100.00 บาท**

อ.๕



ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๖/๒๕๖๗

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น ๒๑

ถนน ศรีอยุธยา ~~ตำบล~~/แขวง ถนนพญาไท ~~อำเภอ~~/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

ในใบอนุญาตเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ ใบรับแจ้งเลขที่ ๗๓๐/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๒) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารปั๊มน้ำดับเพลิง พื้นที่อาคาร ๓๖.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ที่บ้านเลขที่ ๙๙๙ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบล/~~แขวง~~ ผักขะ

อำเภอ/~~เขต~~ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐

โดยมี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

หรือ - ผู้ครอบครองอาคาร

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ .....

เลขที่ ๙๖๘ เป็นที่ดินของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

.....

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ที่ สก ๗๔๙๐๓/๓๒๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
วัฒนานคร สระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๕)

เรียน **บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด**

อ้างถึง คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบ ข.๕

ตามคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๖/๒๕๖๗ หนังสือรับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เลขที่ ๑๘๐๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบ ข.๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว จึงให้ท่านขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อ.๕ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ก่อนรับใบรับรอง ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียม ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๕) ใบละ ๑๐๐ บาท

๑.๑ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๖/๒๕๖๗ จำนวน -๑๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -๑๐๐.- บาท (- หนึ่งร้อยบาทถ้วน -)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านขอรับใบรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับรองอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

กองช่าง อบต.ผักขะ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๖๖๐
หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 26 / 2567

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

ได้รับเงินจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00	
		รวมเงิน	**100.00**	
ตัวอักษร (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวมะลิ ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร	100.00	บาท
เลขที่บัญชี 378-2-17231-7 วันที่ 16 สิงหาคม 2567		
รวม :	**100.00**	**บาท**



ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๗/๒๕๖๗

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น ๒๑

ถนน ศรีอยุธยา ~~ตำบล~~/แขวง ถนนพญาไท ~~อำเภอ~~/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

ในใบอนุญาตเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ใบรับแจ้งเลขที่ ๒๑๒๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๓ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารโครงสร้างถังพักใส ความยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ อาคาร ,ขนาดกว้าง ๕.๘๐ x ๑๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ ๑,๖๖๙ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ที่บ้านเลขที่ ๙๙๙ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบล/~~แขวง~~ ผักขะ

อำเภอ/~~เขต~~ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐

โดยมี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

หรือ - ผู้ครอบครองอาคาร

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ ..... เลขที่

~~๙๖๕-๙๖๙,๙๘๐,๙๙๐,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๕๐๖๗,๕๐๖๘~~

~~๕๐๗๐,๕๐๗๓-๕๐๗๖,๕๐๗๘-๕๐๘๒,๕๐๙๙-๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗-๕๑๓๘,๕๒๕๒,๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘~~

~~,๘๘๔๒,๑๐๑๗๔,๑๑๓๑๒,๑๑๓๑๕,๑๗๐๔๒,๑๗๔๐๖,๑๙๕๑๗,๒๐๙๑๒-๒๐๙๑๕~~

เป็นที่ดินของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

.....

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ที่ สก ๗๔๙๐๓/๗๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
วัฒนานคร สระแก้ว ๒๗๑๖๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๕)

เรียน **บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด**

อ้างถึง คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบ ข.๕

ตามคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๗/๒๕๖๗ อาคาร โครงสร้างถังพักใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ อาคาร ขนาดกว้าง ๕.๘๐x๑๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ ๑,๖๖๙ ตารางเมตร หนังสือรับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เลขที่ ๑๘๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบ ข.๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว จึงให้ท่านขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อ.๕ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ก่อนรับใบรับรอง ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียม ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๕) ใบละ ๑๐๐ บาท

๑.๑ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๖/๒๕๖๗ จำนวน -๑๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -๑๐๐.- บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านขอรับใบรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับรองอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

กองช่าง อบต.ผักขะ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๖๖๐
หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 29 / 2567

วันที่ 21 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

ได้รับเงินจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00	
		รวมเงิน	100.00	
ตัวอักษร (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวมะลิ ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร	100.00 บาท
เลขที่บัญชี 378-2-17231-7 วันที่ 21 สิงหาคม 2567	
รวม :	100.00 บาท

ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-2 บันทึกเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก ข-3 สำเนาเอกสารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

ภาคผนวก ข-4 เอกสารการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก ข-5 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

ภาคผนวก ข-6 สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567

ภาคผนวก ข-7 การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-8 เอกสารแจ้งเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-9 แผนงานการก่อสร้าง

ภาคผนวก ข-10 เอกสารการดำเนินงานก่อสร้างทางเบี่ยงและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ภาคผนวก ข-11 แผนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักร และการดำเนินการตามแผน

ภาคผนวก ข-12 ข้อกำหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมา

ภาคผนวก ข-13 เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้าง

ภาคผนวก ข-14 แบบบันทึกผู้ขนส่งสิ่งปฏิกูล

ภาคผนวก ข-15 เอกสารประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้างานก่อสร้างให้กับหน่วยงาน

ภาคผนวก ข-16 เอกสารประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานครเพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร

ภาคผนวก ข-17 หนังสือแจ้งการจัดทำบันทึกทำความตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูล

ภาคผนวก ข-18 แผนงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา

ภาคผนวก ข-19 เอกสารการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา


ภาคผนวก ข-20 เอกสารผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-21 กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน/กฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมคนงาน
ภาคผนวก ข-22 บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-23 การอบรมคนงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-24 เอกสารขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยง (Work Permit)
ภาคผนวก ข-25 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
ภาคผนวก ข-26 เอกสารแสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับปฐมพยาบาล
ภาคผนวก ข-27 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-28 การประสานงานกับ อปพร. ของ อบต. ผักขะ ในด้านความปลอดภัย
ภาคผนวก ข-29 ทะเบียนประวัติแรงงาน
ภาคผนวก ข-30 เอกสารแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข-31 เอกสารประสานกับสถานีตำรวจในการป้องกันปราบปรามด้านต่างๆ ในช่วงก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-32 เอกสารแต่งตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก ข-33 การเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
ภาคผนวก ข-34 การตรวจสุขภาพพนักงานและคนงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-35 บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกโครงการ
ภาคผนวก ข-36 บันทึกปริมาณขยะ
ภาคผนวก ข-37 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ประจำปี 2567
ภาคผนวก ข-38 สรุปรายงานกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชน

ภาคผนวก ข-1

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน

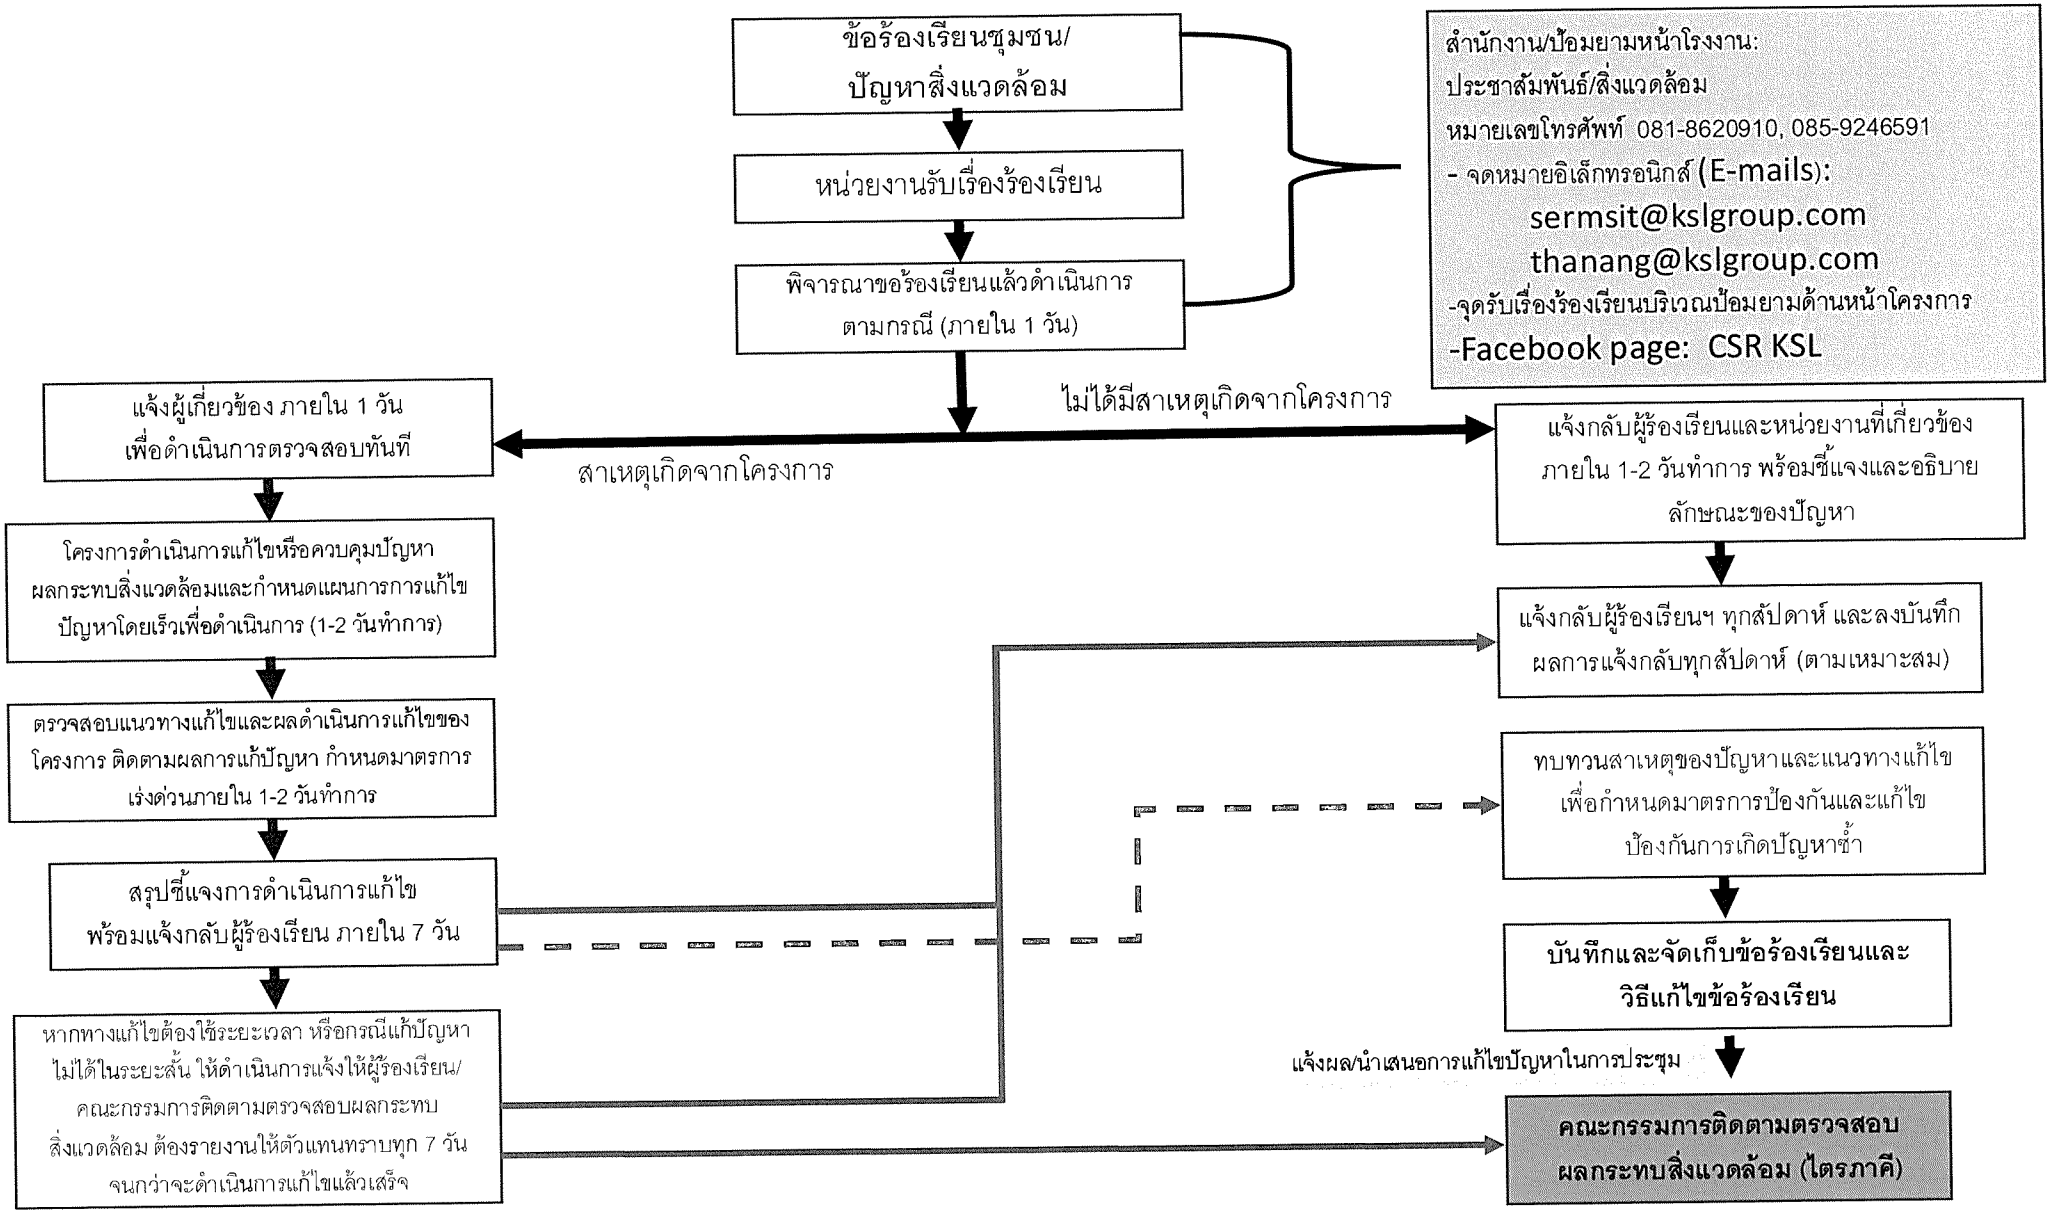
ข้อร้องเรียนชุมชน/
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
พิจารณาขอร้องเรียนแล้วดำเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน)
สำนักงาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:
ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8620910, 085-9246591
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mails):
sermsit@kslgroup.com
thanang@kslgroup.com
-จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ
-Facebook page: CSR KSL
ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากโครงการ
สาเหตุเกิดจากโครงการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อดำเนินการตรวจสอบทันที
แจ้งกลับผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1-2 วันทำการ พร้อมชี้แจงและอธิบาย
ลักษณะของปัญหา
โครงการดำเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดแผนการการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วเพื่อดำเนินการ (1-2 วันทำการ)
แจ้งกลับผู้ร้องเรียนฯ ทุกสัปดาห์ และลงบันทึก
ผลการแจ้งกลับทุกสัปดาห์ (ตามเหมาะสม)
ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลดำเนินการแก้ไขของ
โครงการ ติดตามผลการแก้ปัญหา กำหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันทำการ
ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
สรุปชี้แจงการดำเนินการแก้ไข
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน
บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนและ
วิธีแก้ไขข้อร้องเรียน
หากทางแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
แจ้งผล/นำเสนอการแก้ไขปัญหาในการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ไตรภาคี)

ภาคผนวก ข-2

บันทึกเรื่องร้องเรียน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

แบบฟอร์มบันทึกสรุปจำนวนข้อร้องเรียน

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	ข้อร้องเรียนสะสม 2567												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ด้านคุณภาพอากาศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ด้านคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ด้านทรัพยากรน้ำใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ด้านคมนาคมขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ด้านการจัดการของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ด้านระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ด้านอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ CSR

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

บันทึกข้อร้องเรียน

1. วันที่ร้องเรียน ..17../ก.ย./....67.....

2. ช่องทางการแจ้ง ....ลงด้วยตนเอง.....

3. ช่องทางติดต่อผู้ร้องเรียน

ชื่อ-สกุล... [redacted] .....อายุ.....ปี

[redacted]

4. เรื่องร้องเรียน

.....มีการถมที่ดินของโรงงานเดินไปในที่ดินของบ้านของเพจ และมีสารดินตกหล่นลงในพื้นที่.....

.....

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ขอร้องเรียนมายังทีมรับเรื่องของโครงการ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือดังนี้

1. .....ให้ทางโรงงานนำดินที่ถมลงในที่ดินของบ้านออก ตามเขตประมาณ 20 เมตร (ระยะตามจริงให้ทางนับจากถนนทางราชการ มีค่าเป็นหนึ่งแนวเขต)

2. .....ขอให้ทางบริษัทผู้ร้องเรียนที่ดินเดินการสอบสวนสาเหตุไปในแนวเขตที่ดินของบ้านเรือนใช้เป็นเงินจำนวน 10,000 บ

3. .....

และแนบเอกสารต่างๆ ประกอบ ได้แก่

1. .....จำนวน.....ชุด
2. .....จำนวน.....ชุด
3. .....จำนวน.....ชุด

5. ผู้รับแจ้ง ชื่อ-สกุล.. [redacted] ..ตำแหน่ง.....หน.ส่วนงานการเกษตร

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้กล่าวอ้างมานั้นเป็นเรื่องจริง

ลงชื่อ. [redacted] .....

(.....)

ผู้ร้องเรียน

[redacted]

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

6. ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง ☑ เกี่ยวข้อง ○ ไม่เกี่ยวข้อง

.....แจ้ง บริษัท ผู้รับเหมา เข้าดำเนินการ และรับผิดชอบ.....
.....
.....

7. ผู้รับผิดชอบ

1. .....ม. วิศวกร.....
2. .....
3. .....

8. วันเวลาคาดการณ์แล้วเสร็จ ...../...../..... * หลังจาก ฝนหยุด พร้อม จะดำเนินการ เรื่องดำเนินการโดยใช้ระยะเวลา 3-4วัน

9. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

1. .....ตกลง ดินเครื่องของแหวเปตที่ ดิน ร่วงเนื่องจากฝนตกหนัก.....
2. .....
3. .....

10. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. .....ดำเนินการ ให้ทาง ม. วิศวกร เข้าดำเนินการ ย้าย ดิน ออกจาก ตำแหน่ง ของ ปั้นจั่น.....
2. .....ประสานทาง ม. วิศวกร เข้าไป ตรวจสอบ ความเสียหาย ตามที่ เจ้าของ ดิน เรียกร้อง.....
3. .....

[redacted]

ตำแหน่ง.....ผจก. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน.....

ภาคผนวก ข-3

สำเนาเอกสารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 15365
วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา 10:51

ที่ สญ.010../2567

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 จำนวน 3 ฉบับ

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นิธาน จงสกุล

(นายนิธาน จงสกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com

2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor :	256707-1282
ชื่อโครงการ :	โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด (อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว)
รอบรายงาน :	ม.ค 67 - มิ.ย. 67
วันที่ยื่นรายงาน :	31/07/2567
เลขที่ IEE/EIA/EHIA :	256504-4
ผู้ยื่นรายงาน :	วรรณศิริ สุริยวงศ์
อีเมล :	Wannasiri.Suriyawong@eurofinsasia.com
โทรศัพท์ :	023737799

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
สำนัก
กอง
กอง
กองการศึกษา

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

1461
30 ต.ค. 67
10.00

ที่ สญ.011/2567

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่โครงการผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นิธาน จงสกุล

(นายนิธาน จงสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com
2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

สำนักงานปลัดกรมที่ 5 ปราจีนบุรี
เลขที่ ๓๗๑๐
วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๗
เวลา ๑๐.๑๕ น.

ที่ สญ.012.../2567

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ฉบับ

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่โครงการผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นิธาน จงสกุล

(นายนิธาน จงสกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com

2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

ภาคผนวก ข-4

เอกสารการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการ



ที่ วธ ๐๔๑๕/๙๙๖๐

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบโบราณสถานในบริเวณที่ตั้งและใกล้เคียงพื้นที่โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้า

เรียน นายฐิติวรรธน์ ยิบยินธรรม (ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด)

อ้างถึง หนังสือ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ สญ. ๐๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโบราณสถานในบริเวณที่ตั้งและใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ และแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโบราณสถานปราสาทบ้านน้อย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอให้สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ตรวจสอบโบราณสถานในบริเวณที่ตั้งและใกล้เคียงพื้นที่โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้า ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ในบริเวณที่ตั้งและใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ พบโบราณสถานที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งหมด ๑ แห่ง ได้แก่ โบราณสถานปราสาทบ้านน้อย จึงขอความร่วมมือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ไม่ให้บุกรุก ทำลาย หรือกระทำการใด ๆ ในเขตพื้นที่โบราณสถาน ตลอดจนเนินดินโบราณสถานและบารายที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบจากฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี โบราณสถานของกรมศิลปากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หากในระหว่างดำเนินการ มีการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือแหล่งโบราณคดี โปรดแจ้งสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นักโบราณคดีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

กลุ่มโบราณคดี
โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๒๖๑๐
โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๒๖๑๐

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ สญ012.../2567

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
รับที่ ๓๗๑๐
วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๗
เวลา ๑๐.๑๕ น.

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ฉบับ

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่โครงการผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com

2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

KHON KAEN SUGAP POWER PLANT CO., LTD.

999/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเตร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999/1 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
รับที่ ๑๗๖๑
วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๗
เวลา ๑๐.๓๕ น.

ที่ สญ.018/2567

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ฉบับ

2.แผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com

2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

สศก.ที่ ๕ ปราจีนบุรี

ที่ วธ ๐๔๑๕/๑๑๖๑

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบรายงานผลการศึกษาโบราณสถาน – แหล่งโบราณคดีภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

เรียน นายนิธาน จงสกุล

อ้างถึง หนังสือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ สญ ๐๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอส่งรายงานผลการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โรงงานและพื้นที่โดยรอบ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ตามรายละเอียดในมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตราการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) เพื่อให้การดำเนินการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย นั้น

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อมูลครบถ้วน ทั้งงานสำรวจทางโบราณคดี, การประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้าง ที่มีผลต่อแหล่งโบราณสถาน – แหล่งโบราณคดี รวมถึงมาตรการลดผลกระทบในระยะเวลาก่อสร้างและระยะดำเนินการ ซึ่งในรายงานระบุไว้ดังนี้

๑. ระหว่างการก่อสร้างหากพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุทุกประเภท, ฐานอาคารโบราณฯลฯ ให้หยุดดำเนินกิจกรรมทั้งหมดและแจ้งมายัง สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดยทันที เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
๒. ตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างที่โบราณสถานปราสาทบ้านน้อยทุกระยะ ๖ เดือน เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของโบราณสถานจนกว่าการก่อสร้างโรงงานฯจะแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ต่อไป

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ขอเรียนว่า สำนักฯเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน การพิจารณารายละเอียดในรายงานเป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือมายัง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบในระยะเวลาก่อสร้างและระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

กลุ่มโบราณคดี
โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๒๖๑๐
โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๒๖๑๐

ภาคผนวก ข-5

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)



คำสั่งจังหวัดสระแก้ว
ที่ ๖๘๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาล และ โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ด้วย บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงงาน ชุมชน และ ภาคราชการ

ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการฯผู้แทนภาคประชาชน

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ผักขะ

๑.๑	[redacted]	ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย
๑.๒		ตัวแทนหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเดื่อ
๑.๓		ตัวแทนหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยพะใย
๑.๔		ตัวแทนหมู่ที่ ๕ บ้านโป่งคอม
๑.๕		ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านทดหลวง
๑.๖		ตัวแทนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย
๑.๗		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดกล้า
๑.๘		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองยาง
๑.๙		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสลักใด

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.วัฒนานคร

๑.๑๐	[redacted]	ตัวแทนหมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก
๑.๑๑		ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านหนองคุ้ม
๑.๑๒		ตัวแทนหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างไผ่
๑.๑๓		ตัวแทนหมู่ที่ ๙ บ้านทางหลวง
๑.๑๔		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินผาสุก
๑.๑๕		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๔ บ้านวังเสียว

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หันทราย

๑.๑๖	[redacted]	ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหันทราย
๑.๑๗		ตัวแทนหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเหนือ
๑.๑๘		ตัวแทนหมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวใต้
๑.๑๙		ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านเนินผาสุข

/๑.๒๐ นายไสว...

๑.๒๐ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด
๑.๒๑ ตัวแทนหมู่ที่ ๘ บ้านดงทม
๑.๒๒ ตัวแทนหมู่ที่ ๙ บ้านบ่อหลวง
๑.๒๓ ตัวแทนหมู่ที่ ๑๐ บ้านบ่อบัวโบสถ์

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง

๑.๒๔ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง
๑.๒๕ ตัวแทนหมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง
๑.๒๖ ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมู
๑.๒๗ ตัวแทนหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านด่าน

๑.๒๘ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านด่าน
๑.๒๙ ตัวแทนหมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม
๑.๓๐ ตัวแทนหมู่ที่ ๕ บ้านโรงเรียน
๑.๓๑ ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านกุดม่วง

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คลองทับจันทร์

๑.๓๒ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย
๑.๓๓ ตัวแทนหมู่ที่ ๙ บ้านฝั่งคลอง

๒. คณะกรรมการฯผู้แทนภาคราชการ / นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๕ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๖ พลังงานจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๗ นายอำเภอวัฒนานคร หรือผู้แทน
๒.๘ นายอำเภออรัญประเทศ หรือผู้แทน
๒.๙ [redacted] ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ
๒.๑๐ ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ
๒.๑๑ ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านทดหลวง ต.ผักขะ
๒.๑๒ ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ต.ผักขะ
๒.๑๓ ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดกล้า ต.ผักขะ
๒.๑๔ ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๙ บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร
๒.๑๕ ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย

๓. คณะกรรมการฯผู้แทนโครงการฯ

๓.๑ ตัวแทนโครงการฯ ด้านการบริหารโรงงาน
๓.๒ ตัวแทนโครงการฯ ด้านวัตถุดิบและมวลชนสัมพันธ์
๓.๓ ตัวแทนโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม

/โดยให้...

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๔. เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน

๖. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน

๗. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๘. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนและพิจารณากำหนดอัตราการชดเชยกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรีญญา โพธิสัตย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว



คำสั่งจังหวัดสระแก้ว
ที่ ๒๙๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด นั้น

เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ว่ามีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ ได้เสียชีวิต ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ว่างลง โดยบริษัทฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เพื่อขอรายชื่อทดแทน และได้รายชื่อตัวแทนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงให้แก้ไขคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

จากเดิม ๒.๑๒ นายประสงค์ พงษ์ศรี ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ


แก้ไขเป็น ๒.๑๒ นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปริญญา โพธิสัตย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว



คำสั่งจังหวัดสระแก้ว
ที่ ๑๖๐๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด นั้น

เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ว่ามีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย ได้เสียชีวิต ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ว่างลง โดยบริษัทฯ ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เพื่อขอรายชื่อทดแทน และได้รายชื่อตัวแทนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงให้แก้ไขคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ผู้แทนภาคประชาชน

<u>ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คลองทับจันทร์</u>

จากเดิม ๑.๓๒ นายเสียง สีดาสกุล ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย

แก้ไขเป็น ๑.๓๒ นายมานพ ภูทองสุข ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปริญญา โพธิสัตย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ภาคผนวก ข-6

สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ครั้งที่ 02/2567 ในวันที่ 06 สิงหาคม 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

รายชื่อผู้เข้าประชุมฯ:

1. ผู้แทนภาคราชการ

[redacted] รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้ว

ประธานที่ประชุมฯ

นายอำเภอวัฒนานคร

ปลัดอำเภออรัญประเทศ (ผู้แทนนายอำเภออรัญประเทศ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการส่วนสิ่งแวดล้อม (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)

วิศวกรชำนาญการ (ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน (ผู้แทนพลังงานจังหวัดสระแก้ว)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านกุดกล้า ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลวัฒนานคร

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลหันทราย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม (ผู้แทนนางสาวจีรวรรณ นารี)

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง (ผู้แทนทนนายนิธิภัทร คงภักดี)

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักใด

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านดงทม
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านด่าน
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านโรงเรียน
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง (ผู้แทนนายประสิทธิ์ แต้มทอง)

ตัวแทนโครงการฯ ด้านการบริหารโรงงาน KSL
ตัวแทนโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม KSL
ตัวแทนโครงการฯ ด้านวัตถุดิบและมวลชนสัมพันธ์ KSL

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหันทราย
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ KSL
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมอาวุโส KSL
ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ KSL
วิศวกรสิ่งแวดล้อม KSL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ KSL



หัวหน้าแผนกศูนย์เอกสาร/เลขานุการ/เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ KSL
เจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม KSL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ KSL
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม KSL
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม KSL
เจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม KSL
เจ้าหน้าที่ IT KSL
ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) TET
ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) TET

บันทึกการประชุม

<u>เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน</u>

วาระที่ 1: **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

คุณแสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ

<u>วาระที่ 1.1 คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ฯ</u>

- ตามที่บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้ขอให้ทางจังหวัดสระแก้ว แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ทดแทนกรรมการตัวแทน ภาคประชาชน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกอย ตำบลคลองทับจันทร์ ที่ได้เสียชีวิตลงนั้น บัดนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่องแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) กรรมการตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ ได้แก่ นายมานพ ภูทองสุข ให้ที่ประชุมทราบฯ

<u>วาระที่ 1.2 การเปิดประกอบการโรงงานเพื่อรองรับการหีบอ้อย ในฤดูกาลผลิต 2567/2568</u>

- บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด จะดำเนินการเปิดประกอบกิจการโรงงาน เพื่อรองรับการหีบอ้อย ในฤดูกาลผลิต 2567/2568 โดยมีระยะเวลาในการหีบอ้อย ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 จะดำเนินการเปิดประกอบกิจการโรงงาน ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2568 (กำหนดราว 4 เดือน)

<u>วาระที่ 1.3 แจ้งขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักร โรงงานผลิตน้ำตาล</u>

- ด้วยโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้ขออนุญาตทดลองเครื่องจักรต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เพื่อทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์เครื่องจักร ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมทราบฯ

ประเด็นเสนอ : **เพื่อทราบ**

<u>มติที่ประชุม :</u> **รับทราบ**

วาระที่ 2: **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ

<u>การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 01 / 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567</u>

- ตามที่บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 01/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว บัดนี้ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยและส่งให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ : **เพื่อพิจารณา**

<u>มติที่ประชุม :</u> **รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว**

วาระที่ 3: **เรื่องสืบเนื่องที่ประชุมครั้งที่ 1/2567**

- ไม่มี

วาระที่ 4: **เรื่องความคืบหน้าข้อมูลโครงการฯ เพื่อทราบ**

คุณธนัง ไชยวงศ์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้นำเสนอ

วาระที่ 4.1 ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ

- **โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด** การก่อสร้างคันดินรอบโครงการ, อาคารห้องชั่งอาคารพัสดุ, อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อเคี่ยว, ถังเก็บกากน้ำตาล (โมลาส), อาคารไซโลน้ำตาลดิบ, อาคารหอหล่อเย็น, แนวตาข่ายกันฝุ่นชานอ้อย/เสาม่านกันกากอ้อย, อาคารศูนย์จัดหาวัตถุดิบ, อาคาร โรงกลึงซ่อมไฟฟ้า, อาคารวิเคราะห์และจป., ถังเก็บน้ำร้อน, อาคารเตรียมน้ำปูนขาว, อาคารผลิตน้ำประปา, อาคารหอหล่อเย็น โมลาส, ระบบบำบัดน้ำเสีย
- **โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด** การก่อสร้างอาคารตู้ควบคุมมอเตอร์, อาคารกังหันไอน้ำ,อาคาร Cooling Tower, อาคารหม้อไอน้ำ

วาระที่ 4.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

- ทางโครงการได้ดำเนินการบดอัดดินให้แน่น รวมทั้งปลูกหญ้าคลุมดิน ตามความเหมาะสม บริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสในการกัดเซาะของน้ำได้ง่าย เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา
- จัดทีมงานและรถน้ำเพื่อทำความสะอาดผิวการจราจรหน้าพื้นที่โครงการฯ เพื่อลดปริมาณดินสะสมบนผิวการจราจร
- ติดป้ายควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการฯ
- จัดทำไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
- มีพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย / สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- จัดอบรมและให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

- จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่เข้าสู่บ่อน้ำของโรงงานต่อไป
- กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook Fan page/กลุ่มไลน์ผู้นำชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัทหรือ ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม
- กำหนดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้วม รวมถึงน้ำบริโภค ให้เพียงพอ ภายในโครงการฯ
- จัดสรรพื้นที่สีเขียวประมาณ 164.81 ไร่ (ร้อยละ 10.25 ของพื้นที่โครงการ) โดยจะทำการปลูกไม้ยืนต้น ตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการฯ

คุณปัญจพร สมสา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ผู้นำเสนอ

<u>มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</u>

- จัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างปลอดภัย
- จัดให้มีเวชภัณฑ์/ยา และอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งรถฉุกเฉินประจำโครงการและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ตลอดเวลาพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที
- เพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ด้วยเครื่อง AED จากครูฝึกสอนของบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรค รวมถึงการตรวจสุขภาพของคนงานตามปัจจัยเสี่ยง เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด, การ X-ray ปอด, EKG, การตรวจสมรรภาพการได้ยิน, สารเสพติด และการตรวจร่างกายโดยทั่วไป
- จัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ จป.วิชาชีพ และจป.เทคนิค รวมจำนวน 18 คน
- จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk หรือการพูดคุยเรื่องของความปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมตระหนักและสร้างจิตสำนึก ให้การทำงานมีความปลอดภัย
- จัดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
- จัดให้มีระบบการวางแผนงานยกติดตั้งเครื่องจักร (Lifting plan) เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถของปั้นจั่นตาม Load Chat/อุปกรณ์ช่วยยก/ปจ.2/CER./แผนภาพจำลองการยก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดให้มีระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภท เช่น การทำงานบนที่สูง, การทำงานในที่อับอากาศ
- จัดให้มีการวัดความดัน/วัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานขึ้นที่สูงของผู้รับเหมา
- จัดให้มีนั่งร้าน/กระเช้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการทำงานบนที่สูง และกำหนดให้พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก (Safety harness) ตลอดเวลาที่ทำงาน
- จัดให้มีวิศวกรทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างตามแบบ (ปจ.2) โดยให้มีอายุการตรวจรับรอง 3 เดือน พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างของโครงการฯ

- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตงานก่อสร้าง เกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น ถังดับเพลิง
- จัดให้มีป้ายแสดงสัญลักษณ์/ป้ายเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/พื้นที่อันตราย พร้อมติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน ไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้อย่างชัดเจน
- จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก เขตก่อสร้าง และระบบควบคุมตรวจสอบการเข้าทำงานของผู้รับเหมาเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคล/ยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง

คุณธนัง **วาระที่ 4.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

ไชยวงศ์ **4.3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ**

วิศวกรสิ่งแวดล้อม<u>- โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล</u>

ผู้นำเสนอ <u>บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ใช้ผลการตรวจวัดร่วมกัน จำนวน 4 จุด</u>

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 7 - 14 พ.ค. 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1), รพ.สต. บ้านห้วยเดื่อ (A2), ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A3), ชุมชนบ้านห้วยพะไย (A4)

พารามิเตอร์ในการตรวจวัด : 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

- ฝุ่นละอองรวม TSP (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย < 0.33 mg/m³

ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) เท่ากับ 0.0273 mg/m³

รพ.สต. บ้านห้วยเดื่อ (A2) เท่ากับ 0.0293 mg/m³

ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A3)เท่ากับ 0.0361 mg/m³

ชุมชนบ้านห้วยพะไย (A4) เท่ากับ 0.0289 mg/m³

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน PM-10 (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย < 0.12 mg/m³

ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) เท่ากับ 0.0063 mg/m³

รพ.สต. บ้านห้วยเดื่อ (A2) เท่ากับ 0.0060 mg/m³

ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A3)เท่ากับ 0.0126 mg/m³

ชุมชนบ้านห้วยพะไย (A4) เท่ากับ 0.0087 mg/m³

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO_2 (ppm) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย < 0.17 ppm

ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) เท่ากับ 0.0020 ppm

รพ.สต. บ้านห้วยเดื่อ (A2) เท่ากับ 0.0037 ppm

ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A3)เท่ากับ 0.0043 ppm

ชุมชนบ้านห้วยพะไย (A4) เท่ากับ 0.0044 ppm

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO_2 (ppm) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย < 0.3 ppm

ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) เท่ากับ 0.0029 ppm

รพ.สต. บ้านห้วยเดื่อ (A2) เท่ากับ 0.0019 ppm

ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A3)เท่ากับ 0.0023 ppm

ชุมชนบ้านห้วยพะไย (A4) เท่ากับ 0.0040 ppm

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO_2 (ppm) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย < 0.12 ppm

ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) เท่ากับ 0.0029 ppm

รพ.สต. บ้านห้วยเดื่อ (A2) เท่ากับ 0.0019 ppm

ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A3)เท่ากับ 0.0023 ppm

ชุมชนบ้านห้วยพะไย (A4) เท่ากับ 0.0040 ppm

4.3.2 ระดับเสียงในบรรยากาศ

<u>โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสิ้นหลี จำกัด โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ใช้ผลการตรวจวัดร่วมกัน จำนวน 2 จุด</u>

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านห้วยพะไย (คุ้มบ้านป่าเพ็ก)(N1) ชุมชนบ้านทดน้อย (N2)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 7 - 14 พ.ค. 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

พารามิเตอร์ในการตรวจวัด : 1.ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

- ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย = 70 dBA

ชุมชนบ้านห้วยพะไย (คุ้มบ้านป่าเพ็ก)(N1)	**ชุมชนบ้านทดน้อย (N2)**
วันที่ 1 เท่ากับ 54.70 dBA	วันที่ 1 เท่ากับ 51.90 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 54.40 dBA	วันที่ 2 เท่ากับ 56.40 dBA
วันที่ 3 เท่ากับ 54.10 dBA	วันที่ 3 เท่ากับ 51.00 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 53.00 dBA	วันที่ 4 เท่ากับ 50.60 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 56.30 dBA	วันที่ 5 เท่ากับ 51.50 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 54.60 dBA	วันที่ 6 เท่ากับ 49.30 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 56.40 dBA	วันที่ 7 เท่ากับ 48.80 dBA

<u>โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสิ้นหลี จำกัด</u>

จุดตรวจวัด : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) และริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 7 - 14 พ.ค. 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

พารามิเตอร์ในการตรวจวัด : 1.ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

- ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย = 70 dBA

ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1)	**ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2)**
วันที่ 1 เท่ากับ 56.00 dBA	วันที่ 1 เท่ากับ 58.40 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 54.90 dBA	วันที่ 2 เท่ากับ 57.30 dBA

วันที่ 3 เท่ากับ 50.00 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 48.20 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 47.90 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 47.30 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 50.50 dBA

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3)

วันที่ 1 เท่ากับ 56.90 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 55.10 dBA
วันที่ 3 เท่ากับ 53.40 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 51.80 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 54.30 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 56.30 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 53.60 dBA

วันที่ 3 เท่ากับ 52.40 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 50.60 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 50.30 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 49.70 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 52.90 dBA

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

วันที่ 1 เท่ากับ 55.20 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 53.60 dBA
วันที่ 3 เท่ากับ 48.70 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 46.90 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 46.60 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 46.00 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 49.20 dBA

<u>โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</u>

จุดตรวจวัด: ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2), ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 7 - 14 พ.ค. 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

พารามิเตอร์ในการตรวจวัด : 1.ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

- ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย = 70 dBA

ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1)

วันที่ 1 เท่ากับ 55.20 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 54.50 dBA
วันที่ 3 เท่ากับ 54.70 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 53.30 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 56.80 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 54.80 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 56.80 dBA

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3)

วันที่ 1 เท่ากับ 60.60 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 62.80 dBA
วันที่ 3 เท่ากับ 64.80 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 59.50 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 59.40 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 57.40 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 60.90 dBA

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2)

วันที่ 1 เท่ากับ 60.60 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 62.80 dBA
วันที่ 3 เท่ากับ 58.30 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 57.40 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 55.30 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 58.40 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 59.30 dBA

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

วันที่ 1 เท่ากับ 58.60 dBA
วันที่ 2 เท่ากับ 60.80 dBA
วันที่ 3 เท่ากับ 56.30 dBA
วันที่ 4 เท่ากับ 55.40 dBA
วันที่ 5 เท่ากับ 53.30 dBA
วันที่ 6 เท่ากับ 56.40 dBA
วันที่ 7 เท่ากับ 57.30 dBA

4.3.3 คุณภาพน้ำผิวดิน

<u>โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ใช้ผลการตรวจวัดร่วมกัน</u>

จุดตรวจวัด : ห้วยพะไยด้านเหนือน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ 1,000 เมตร (SW1)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 9 พ.ค. 2567

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.76	-	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	10.3	NTU	-
3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	ผลการตรวจวัด	10.8	mg/L	-
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	198	mg/L	-
5. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	ผลการตรวจวัด	5.21	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. บีโอดี (BOD)	ผลการตรวจวัด	1.0	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	141.9	mg/L	-
8. ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	0.05	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	0.69	mg/L	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
10. ฟอสเฟตทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	0.14	mg/L	-
11. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. สารหนู(As)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
16. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.05	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	ผลการตรวจวัด	3.5×10^4	MPN	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
20. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	$>1.6 \times 10^5$	MPN	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : ห้วยพะไย บริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ (SW2)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 9 พ.ค. 2567

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	8.10	-	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	367.0	NTU	-
3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	ผลการตรวจวัด	60.8	mg/L	-
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	190	mg/L	-
5. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	ผลการตรวจวัด	5.18	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. บีโอดี (BOD)	ผลการตรวจวัด	0.8	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	111.1	mg/L	-

8. ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	0.14	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	0.17	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
10. ฟอสเฟตทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	0.12	mg/L	-
11. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.003	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.006	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. สารหนู(As)	ผลการตรวจวัด	0.0012	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
16. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.14	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	ผลการตรวจวัด	> 1.6×10^5	MPN	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
20. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	> 1.6×10^5	MPN	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : บริเวณจุดบรรจบของห้วยพรหมโหดและห้วยพะไย (SW3)
วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 9 พ.ค. 2567

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	8.56	-	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	13.7	NTU	-
3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	ผลการตรวจวัด	31.0	mg/L	-
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	156	mg/L	-
5. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	ผลการตรวจวัด	7.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. บีโอดี (BOD)	ผลการตรวจวัด	3.7	mg/L	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	62.7	mg/L	-
8. ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	0.57	mg/L	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
10. ฟอสเฟตทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	0.16	mg/L	-
11. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
16. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.09	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	ผลการตรวจวัด	> 1.7×10^3	MPN	ผ่านค่ามาตรฐาน
20. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	> 1.7×10^4	MPN	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจ : ห้วยพรหมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ /รับน้ำหลากของโครงการ 700 เมตร (SW4)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 9 พ.ค. 2567

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	8.84	-	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	13.0	NTU	-
3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	ผลการตรวจวัด	18.4	mg/L	-
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	162	mg/L	-
5. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	ผลการตรวจวัด	4.59	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. บีโอดี (BOD)	ผลการตรวจวัด	5.2	mg/L	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	76.1	mg/L	-
8. ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	0.52	mg/L	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
10. ฟอสเฟตทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	0.19	mg/L	-
11. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.003	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.007	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. สารหนู(As)	ผลการตรวจวัด	0.0007	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
16. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.37	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	ผลการตรวจวัด	> 1.4×10^2	MPN	ผ่านค่ามาตรฐาน
20. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	> 1.3×10^3	MPN	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : ห้วยพรหมโหด ด้านท้ายน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ 1,300 เมตร (SW5)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 9 พ.ค. 2567

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	8.40	-	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	11.6	NTU	-
3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	ผลการตรวจวัด	18.5	mg/L	-
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	152	mg/L	-
5. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	ผลการตรวจวัด	7.18	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. บีโอดี (BOD)	ผลการตรวจวัด	0.1	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	61.7	mg/L	-
8. ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	0.29	mg/L	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

10. ฟอสเฟตทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	0.04	mg/L	-
11. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.002	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
16. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.22	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	ผลการตรวจวัด	> 1.6×10^5	MPN	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน
20. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	ผลการตรวจวัด	> 1.6×10^5	MPN	ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

ข้อสังเกต

1. ห้วยพะไยด้านเหนือน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ 1,000 เมตร (SW1)
   - แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH_3-N) ค่าที่วัดได้ 0.69 mg/L (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 mg/L)
   - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ค่าที่วัดได้ 3.5×10^4 MPN/100 mL (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4,000 MPN/100 mL)
   - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ค่าที่วัดได้ > 1.6×10^5 MPN/100 mL (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20,000 MPN/100 mL)
2. ห้วยพะไย บริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ (SW2)
   - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ค่าที่วัดได้ > 1.6×10^5 MPN/100 mL (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4,000 MPN/100 mL)
   - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ค่าที่วัดได้ > 1.6×10^5 MPN/100 mL (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20,000 MPN/100 mL)
3. บริเวณจุดบรรจบของห้วยพรหมโหดและห้วยพะไย (SW3)
   - บีโอดี (BOD) ค่าที่วัดได้ 3.7 mg/L (ค่ามาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 4 ไม่เกิน 4.0 mg/L)
   - แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH_3-N) ค่าที่วัดได้ 0.57 mg/L (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 mg/L)
4. ห้วยพรหมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ 700 เมตร (SW4)
   - บีโอดี (BOD) ค่าที่วัดได้ 5.2 mg/L (ค่ามาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 4 ไม่เกิน 4.0 mg/L)
   - แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH_3-N) ค่าที่วัดได้ 0.52 mg/L (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 mg/L)
5. ห้วยพรหมโหด ด้านท้ายน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ 1,300 เมตร (SW5)
   - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ค่าที่วัดได้ > 1.6×10^5 MPN/100 mL (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4,000 MPN/100 mL)
   - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ค่าที่วัดได้ > 1.6×10^5 MPN/100 mL (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20,000 MPN/100 mL)

เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ำจากพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย ทำให้มีการพบปริมาณสารอินทรีย์และแบคทีเรียค่อนข้างสูง ซึ่งพบว่ามีค่าสูงตั้งแต่ช่วงก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการสำหรับในกิจกรรมการก่อสร้างไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยรอบ

4.3.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

จุดตรวจวัด : บริเวณทิศตะวันออกของโครงการ (UW1)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 14 พ.ค. 2567

1. อุณหภูมิ (Temperature)	ผลการตรวจวัด	31.4	°C	-
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.64	-	-
3. สี (Color)	ผลการตรวจวัด	3	Pt-Co Unit	-
4. ความเค็ม (Salinity)	ผลการตรวจวัด	1.00	ppt	-
5. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	56.2	NTU	-
6. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	ผลการตรวจวัด	2,235	µs/cm	-
7. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	1,292	mg/L	-
8. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	110.5	mg/L as $CaCO_3$	-
9. ไบคาร์บอเนต (HCO_3^{-})	ผลการตรวจวัด	110.5	mg/L	-
10. คาร์บอเนต (CO_3^{2-})	ผลการตรวจวัด	<1.0	mg/L	-
11. ไนไตรท์ (NO_2^{-})	ผลการตรวจวัด	<0.01	mg/L	-
12. ไนเตรท (NO_3^{-})	ผลการตรวจวัด	<0.01	mg/L	-
13. ฟอสเฟต (PO_4^{3-})	ผลการตรวจวัด	0.27	mg/L	-
14. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	ผลการตรวจวัด	4.74	mg/L	-
15. คลอไรด์ (Cl^{-})	ผลการตรวจวัด	49.9	mg/L	-
16. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.002	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. ปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.0033	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
20. โครเมียม (Cr)	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
21. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	-
22. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	1.61	mg/L	-
23. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.17	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
24. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
25. Fecal Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	49	MPN/100 mL	-
26. Total Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	79	MPN/100 mL	-

จุดตรวจวัด : บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ่อเก็บน้ำดิบ T1 (UW2)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 14 พ.ค. 2567

1. อุณหภูมิ (Temperature)	ผลการตรวจวัด	31.4	°C	-
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.20	-	-
3. สี (Color)	ผลการตรวจวัด	3	Pt-Co Unit	-
4. ความเค็ม (Salinity)	ผลการตรวจวัด	0.50	ppt	-
5. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	43.5	NTU	-
6. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	ผลการตรวจวัด	1,219	µs/cm	-
7. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	718	mg/L	-
8. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	62.7	mg/L as $CaCO_3$	-
9. ไบคาร์บอเนต (HCO_3^-)	ผลการตรวจวัด	62.7	mg/L	-
10. คาร์บอเนต (CO_3^{2-})	ผลการตรวจวัด	< 1.0	mg/L	-
11. ไนไตรท์ (NO_2^-)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
12. ไนเตรท (NO_3^-)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
13. ฟอสเฟต (PO_4^{3-})	ผลการตรวจวัด	0.37	mg/L	-
14. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	ผลการตรวจวัด	5.32	mg/L	-
15. คลอไรด์ (Cl^-)	ผลการตรวจวัด	26.7	mg/L	-
16. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.009	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. ปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.0014	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
20. โครเมียม (Cr)	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
21. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	-
22. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	1.28	mg/L	-
23. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.19	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
24. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
25. Fecal Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	4.7×10^2	MPN/100 mL	-
26. Total Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	2.4×10^4	MPN/100 mL	-

จุดตรวจวัด : บริเวณทิศใต้ของบ่อคอนเดนเซอร์(UW3)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 14 พ.ค. 2567

1. อุณหภูมิ (Temperature)	ผลการตรวจวัด	30.3	°C	-
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.58	-	-
3. สี (Color)	ผลการตรวจวัด	4	Pt-Co Unit	-
4. ความเค็ม (Salinity)	ผลการตรวจวัด	0.10	ppt	-
5. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	68.9	NTU	-

6. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	ผลการตรวจวัด	304	µs/cm	-
7. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	162	mg/L	-
8. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	67.9	mg/L as $CaCO_3$	-
9. ไบคาร์บอเนต (HCO_3^-)	ผลการตรวจวัด	67.9	mg/L	-
10. คาร์บอเนต (CO_3^{2-})	ผลการตรวจวัด	< 1.0	mg/L	-
11. ไนไตรท์ (NO_2^-)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
12. ไนเตรท (NO_3^-)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
13. ฟอสเฟต (PO_4^{3-})	ผลการตรวจวัด	1.66	mg/L	-
14. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	ผลการตรวจวัด	11.17	mg/L	-
15. คลอไรด์ (Cl^-)	ผลการตรวจวัด	5.9	mg/L	-
16. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.012	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. ปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.0042	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
20. โครเมียม (Cr)	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
21. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	-
22. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	1.72	mg/L	-
23. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.07	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
24. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	0.07	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
25. Fecal Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	4.9×10^2	MPN/100 mL	-
26. Total Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	3.5×10^4	MPN/100 mL	-

จุดตรวจวัด : บริเวณทิศตะวันตกของลานกองเชื้อเพลิง (UW4)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด: 14 พ.ค. 2567

1. อุณหภูมิ (Temperature)	ผลการตรวจวัด	31.4	°C	-
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.80	-	-
3. สี (Color	ผลการตรวจวัด	6	Pt-Co Unit	-
4. ความเค็ม (Salinity)	ผลการตรวจวัด	0.10	ppt	-
5. ความขุ่น (Turbidity)	ผลการตรวจวัด	40.6	NTU	-
6. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	ผลการตรวจวัด	332	µs/cm	-
7. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	170	mg/L	-
8. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	78.1	mg/L as $CaCO_3$	-
9. ไบคาร์บอเนต (HCO_3^-)	ผลการตรวจวัด	78.1	mg/L	-
10. คาร์บอเนต (CO_3^{2-})	ผลการตรวจวัด	< 1.0	mg/L	-
11. ไนไตรท์ (NO_2^-)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
12. ไนเตรท (NO_3^-)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-

13. ฟอสเฟต (PO_4^{3-})	ผลการตรวจวัด	0.28	mg/L	-
14. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	ผลการตรวจวัด	7.69	mg/L	-
15. คลอไรด์ (Cl^-)	ผลการตรวจวัด	6.4	mg/L	-
16. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.002	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
17. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
18. ปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
19. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
20. โครเมียม (Cr)	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
21. ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/L	-
22. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	0.87	mg/L	-
23. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.06	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
24. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	< 0.04	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
25. Fecal Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	< 1.8	MPN/100 mL	-
26. Total Coliform Bacteria	ผลการตรวจวัด	2.4×10^4	MPN/100 mL	-

<u>โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</u>

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (UW1)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 14 พ.ค. 2567

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.84	-	-
2. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	214	mg/L	-
3. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	42.7	mg/L as $CaCO_3$	-
4. ไนเตรท (NO_3^-)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
5. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	ผลการตรวจวัด	13.17	mg/L	-
6. คลอไรด์ (Cl)	ผลการตรวจวัด	6.9	mg/L	-
7. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ผลการตรวจวัด	0.55	mg/L	-
8. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.003	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
10. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
11. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.003	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.0006	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. ซีลีเนียม (Se)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. เหล็ก (Fe)	ผลการตรวจวัด	1.16	mg/L	-
16. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.09	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า (UW2)

วันที่ดำเนินการตรวจวัด: 14 พ.ค. 2567

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.19	-	-
2. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	246	mg/L	-
3. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	141.9	mg/L as $CaCO_3$	-
4. ไนเตรท (NO_3)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
5. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	ผลการตรวจวัด	8.17	mg/L	-
6. คลอไรด์ (Cl)	ผลการตรวจวัด	12.8	mg/L	-
7. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ผลการตรวจวัด	0.34	mg/L	-
8. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.021	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
10. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
11. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.004	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. ซีลีเนียม (Se)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. เหล็ก (Fe)	ผลการตรวจวัด	1.44	mg/L	-
16. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.47	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณหอหล่อเย็น (UW3)				
วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 14 พ.ค. 2567				
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.53	-	-
2. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	ผลการตรวจวัด	186	mg/L	-
3. ความกระด้าง (Total Hardness)	ผลการตรวจวัด	90.5	mg/L as $CaCO_3$	-
4. ไนเตรท (NO_3)	ผลการตรวจวัด	< 0.01	mg/L	-
5. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	ผลการตรวจวัด	5.60	mg/L	-
6. คลอไรด์ (Cl)	ผลการตรวจวัด	10.4	mg/L	-
7. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ผลการตรวจวัด	0.52	mg/L	-
8. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.02	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
9. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	0.013	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
10. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.001	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
11. นิกเกิล (Ni)	ผลการตรวจวัด	0.006	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
12. ปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
13. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
14. ซีลีเนียม (Se)	ผลการตรวจวัด	< 0.0005	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน
15. เหล็ก (Fe)	ผลการตรวจวัด	0.26	mg/L	-
16. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	0.27	mg/L	ผ่านค่ามาตรฐาน

4.3.5 คุณภาพดิน

<u>โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด</u>

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเก็บน้ำตาลทรายขาว (S1) ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 8 พ.ค. 2567

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.213	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
4. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.972	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	396.9	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	26.3	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	16.8	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเก็บน้ำตาลทรายขาว (S1) - ความลึก 0.3-2.0 เมตร

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.213	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
4. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.972	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	396.9	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	26.3	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	16.8	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (S2) ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.465	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
4. สารหนู(As)	ผลการตรวจวัด	0.937	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	306.7	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	26.6	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	6.2	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	27.1	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (S2) ความลึก 0.3-2.0 เมตร

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.222	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

4. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	2.641	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	245.3	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	24.6	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	21.2	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองชานอ้อย (S3) ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.347	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
4. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	1.862	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	106.1	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	4.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	3.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองชานอ้อย (S3) ความลึก 0.3-2.0 เมตร

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.650	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
4. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	2.403	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	21.2	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	5.9	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	4.2	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.283	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
4. สารหนู(As)	ผลการตรวจวัด	2.874	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	262.5	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	10.5	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	16.2	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) ความลึก 0.3-2.0 เมตร

1. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
2. แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
3. ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	0.584	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
4. สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	1.921	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
5. แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	211.8	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6. นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	10.8	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7. ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	8.1	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8. สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	14.6	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

<u>โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</u>

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า (S1) ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : 8 พ.ค. 2567

1.ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.13	-	-
2.สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	1: 1	-	-
3.ไนโตรเจน (N)	ผลการตรวจวัด	400	mg/kg	-
4.ฟอสฟอรัส (P)	ผลการตรวจวัด	8.1	mg/kg	-
5.โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6.แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7.สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.527	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8.โพแทสเซียม (K)	ผลการตรวจวัด	0.939	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
9.ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	60.6	mg/kg	-
10.แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	16.9	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
11.นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	1,242.7	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
12.ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	17.7	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
13.สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	12.9	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
14.ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	16.7	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า (S1) ความลึก 0.3-2.0 เมตร

1.ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	7.84	-	-
2.สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	1 : 1	-	-
3.ไนโตรเจน (N)	ผลการตรวจวัด	300	mg/kg	-
4.ฟอสฟอรัส (P)	ผลการตรวจวัด	8.9	mg/kg	-
5.โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6.แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7.สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.266	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

8.โพแทสเซียม (K)	ผลการตรวจวัด	2.199	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
9.ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	64.8	mg/kg	-
10.แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	17.2	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
11.นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	2,613.9	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
12.ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	23.0	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
13.สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	11.7	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
14.ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	10.0	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณหอหล่อเย็น (S2) ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร

1.ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	8.15	-	-
2.สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	1 : 1	-	-
3.ไนโตรเจน (N)	ผลการตรวจวัด	400	mg/kg	-
4.ฟอสฟอรัส (P)	ผลการตรวจวัด	5.8	mg/kg	-
5.โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6.แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7.สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.278	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8.โพแทสเซียม (K)	ผลการตรวจวัด	1.688	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
9.ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	< 1.0	mg/kg	-
10.แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	13.3	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
11.นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	202.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
12.ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	17.3	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
13.สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	6.2	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
14.ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	12.9	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

จุดตรวจวัด : พื้นที่สีเขียวบริเวณหอหล่อเย็น (S2) ความลึก 0.3-2.0 เมตร

1.ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ผลการตรวจวัด	8.54	-	-
2.สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน	ผลการตรวจวัด	1 : 1	-	-
3.ไนโตรเจน (N)	ผลการตรวจวัด	400	mg/kg	-
4.ฟอสฟอรัส (P)	ผลการตรวจวัด	3.7	mg/kg	-
5.โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	ผลการตรวจวัด	< 0.4	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
6.แคดเมียม (Cd)	ผลการตรวจวัด	< 0.05	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
7.สารหนู (As)	ผลการตรวจวัด	0.238	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
8.โพแทสเซียม (K)	ผลการตรวจวัด	2.120	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
9.ทองแดง (Cu)	ผลการตรวจวัด	54.9	mg/kg	-
10.แมงกานีส (Mn)	ผลการตรวจวัด	15.0	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
11.นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้	ผลการตรวจวัด	317.8	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

12.ตะกั่ว (Pb)	ผลการตรวจวัด	14.6	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
13.สังกะสี (Zn)	ผลการตรวจวัด	8.6	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน
14.ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)	ผลการตรวจวัด	8.0	mg/kg	ผ่านค่ามาตรฐาน

คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ

<u>วาระที่ 4.4 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน</u>

- ต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว ให้คำแนะนำโรงงาน และรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567
- ต้อนรับ พลตรีประพนธ์ กิติญาณทรัพย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 พร้อมคณะ (กอ.รมน.) รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมงานโครงการในระยะก่อสร้าง เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย 100 กิโลกรัม กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุปี 2567 ให้กับ อบต.ผักขะ โดยมีคุณวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ นายก อบต.ผักขะ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567 ให้กับ อบต.หันทราย โดยคุณสถิตย์ ถาวรศิล นายก อบต.หันทราย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย 50 กิโลกรัม กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุปี 2567 ให้หมู่ 2 บ้านหนองขาม ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วโดยมีคุณสุพจน์ ขันขึง ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย 50 กิโลกรัม กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567 ให้หมู่ 5 บ้านโรงเรียน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีคุณธนะพัฒน์ อุภัยพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย 50 กิโลกรัม กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567 ให้หมู่ 14 บ้านวังเสียว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีคุณสามารถ โสมน้อย ผู้ใหญ่บ้านวังเสียว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2567
- สนับสนุนของชำร่วย กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีคุณละมูล แม่นปืน ผู้ใหญ่บ้านห้วยพะไยเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567
- สนับสนุนของชำร่วย กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567 หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีคุณเกองเงิน สวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านทดน้อย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำดื่มจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีคุณวาสนา ใจประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านเนินผาสุก คณะกรรมการ EIA เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำดื่ม 600 ขวด ในการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองแวง ปี 2567 ให้กับ อบต.หนอง โดยมีคุณวารุณี พงษ์ประเสริฐ นายก อบต.หนองแวงเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2567

- สนับสนุนน้ำดื่ม 1,008 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลวัฒนานคร สำหรับกิจกรรม "มหกรรมรวมพลคน สระแก้ว รักษ์สุขภาพฯ" โดยมีคุณลัดดา สมมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการ รพ.วัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำดื่มให้กับอำเภออรัญประเทศ จัดโครงการ "ตรวจการได้ยินให้กับประชาชนที่มีปัญหาหรือ บกพร่องทางการได้ยิน" โดยมีคุณปริทรรศน์ ศรีพรหม ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภออรัญประเทศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
- สนับสนุนน้ำดื่ม 600 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร สำหรับจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ของอำเภอวัฒนานคร โดยมี คุณศักดิ์ชาย หม่องกระโทก ปลัดอำเภอวัฒนานคร ผู้แทนนายอำเภอวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
- สนับสนุนรถดับเพลิงของบริษัท ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณริมทางหลวง 33 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2567
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ วัดห้วยเดื่อ เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณอารีย์ กงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านห้วยเดื่อ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณนายณัฐวุฒิ อาศัยราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านทางหลวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณเละมูล แม่นปืน ผู้ใหญ่บ้านห้วยพะไย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 7 เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณกองเงิน สวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านทดน้อย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณเคำปน คำบริบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกอย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณน้อย ทิพย์โอสถ ผู้ใหญ่บ้านฝั่งคลอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถาม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณเอนัชชาวี ดวงใจ ผู้ใหญ่บ้านอ่างไผ่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถาม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณสุพจน์ ชำนาญปืน ผู้ใหญ่บ้านหนองคุ้ม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหมู่ 1 บ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ ศาลาบ้านหมู่ 1 เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 67 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณกาญจนา เรืองกระโทกกำนันตำบลบ้านด่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณอรัญญา ผลาหาญ กำนันตำบลผักขะ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการฯ และข้อมูลมาตรการ EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีคุณสาคร บริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านทดหลวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม
- สนับสนุนพัดลมให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สำหรับบริการประชาชน โดยมีคุณนงเยาว์ เพ็ชรสมบัติ ผอ.รพ.สต.หันทราย ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวเหนือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
- สนับสนุนพัดลมให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สำหรับบริการประชาชน โดยมี คุณวรรเพ็ญ ชมดง ผอ.รพ.สต.ห้วยเดื่อ, ผู้ใหญ่บ้านกุดกล้า เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
- สนับสนุนพัดลมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สำหรับบริการประชาชน โดยมีคุณอำนาจ ว่องไว ผอ.รพ.สต.หนองหอย เป็นผู้รับมอบวันที่ 10 เม.ย. 67
- สนับสนุนพัดลมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สำหรับบริการประชาชน โดยมีคุณสุชาดา มะลัยทอง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแวง เป็นผู้รับมอบวันที่ 11 เม.ย. 67
- สนับสนุนพัดลมให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สำหรับบริการประชาชน โดยมี คุณสมจิต ผอ.รพ.สต.บ้านโรงเรียน ผู้รับมอบ วันที่ 11 เมษายน 2567
- สนับสนุนพัดลมให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว สำหรับบริการประชาชน โดยมีนายแพทย์สมคิด ยืนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

- สนับสนุนพัดลมให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สำหรับบริการประชาชน โดยมีคุณลัดดา สมมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการ รพ.วัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
- ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ EIA เข้าร่วมสังเกตการณ์ การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ บ้านบ่อบัวโบสถ์ และ เครื่องตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บ้านทดน้อย เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย KSL / อาหารว่าง งานประเพณีบุญกลางบ้าน หมู่ 14 บ้านวังเสียว ต.วัฒนานคร โดยมี คุณสามารถ โสมน้อย ผู้ใหญ่บ้านวังเสียว และคุณบุญถือ เกื้อกูล กรรมการ EIA เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย KSL / อาหารว่าง ในงานประเพณีบุญกลางบ้าน หมู่ 5 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง โดยมีคุณเบญจลือ บุตรหนัน กำนันตำบลหนองแวง, คุณทำนอง สังข์ชม ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย KSL / อาหารว่าง ในงานประเพณีบุญกลางบ้าน บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ โดยมีคุณคำปน บริบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกอย พร้อมด้วยชาวบ้านหนองกอย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2567
- สนับสนุนน้ำตาลทราย KSL / อาหารว่าง ในงานประเพณีบุญกลางบ้าน บ้านหนองบัวใต้ ต.หันทราย โดยมี คุณวิวัต จันทร์สมร ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวใต้ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567
- สนับสนุนน้ำดื่ม KSL จำนวน 360 ขวด ในกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ให้กับอำเภออรัญประเทศ โดยมีคุณบุษราภรณ์ หนูแก้ว ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภออรัญประเทศ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
- สนับสนุนน้ำดื่ม KSL จำนวน 600 ขวด กิจกรรมบริจาคเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบ ให้กับที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร โดยมีคุณจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567
- สนับสนุนน้ำดื่ม KSL จำนวน 600 ขวด ในการแข่งขันกีฬา ราชสีห์สัมพันธ์ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร โดยมีคุณวิลาสินี เทียนทอง กำนันตำบลวัฒนานคร, คุณบุษปวัน เทียนทอง อดีตกำนันตำบลวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 8 ก.ค. 2567
- สนับสนุนเงิน 10,000 บาท และน้ำดื่ม 600 ขวด ให้กับโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายแพทย์สุขุม พิริยพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567
- สนับสนุนเงิน 2,000 บาท ให้กับโครงการกิจกรรมเดินวิ่ง Walk and Run แบ่งปันรอยยิ้มให้เด็ก โดยมี คุณนิธิวดี สุวรรณะสิริภัทร ผู้อำนวยการกลุ่ม สพท.สระแก้ว เขต 1 ผู้รับมอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
- เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และทำความสะอาดอุปกรณ์ผลิตน้ำ ของโรงเรือนผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน หมู่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ โดยมีคุณกองเงิน สวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน รับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

- เข้าร่วมพิธีเปิด มหกรรมรวมพล คนสระแก้ว รักษ์สุขภาพ Kick Off ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,008 ขวด สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวัฒนานคร เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2567
- เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ โดยถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานแก่วัดในเขตตำบลผักขะ 7 แห่ง วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2567
- รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุน "โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" จาก นายโฆษิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2567
- ดำเนินการทำความสะอาด กวาดล้างผิวถนนสุวรรณศร บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้าง เพื่อชะล้างฝุ่น เศษดิน และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ราวเดือน ม.ค. 67 -ปัจจุบัน รวม 22 ครั้ง
- ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อม ทางเบี่ยง พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 3 ช่องทาง ด้านหน้าทางเข้าโครงการฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรบนท้องถนน และมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อไปฯ
- การส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนในพื้นที่เป็นลำดับแรก เพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแผนอัตรากำลังพนักงานประจำทั้งหมด จำนวน 250 คน พนักงานชั่วคราวฤดูหีบ จำนวน 200 คน ปัจจุบันพนักงานประจำ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ย้ายจากพนัสนิคม 52 คน คิดเป็น 43% พื้นที่สระแก้ว รวม 33 คน คิดเป็น 28% นอกพื้นที่รวม 35 คน คิดเป็น 29% (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567)
- การรับสมัครพนักงานประจำ โครงการจะเปิดรับสมัครผู้สนใจในโครงการฯ สำหรับประชาชนในตำบล ผักขะและพื้นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ อัตรารับเข้าคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ดังนี้ 1. สายงานฝ่ายผลิต ราวประมาณ 40 คน และ 2. สายงานฝ่ายสนับสนุน ราวประมาณ 40 คน

คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ

<u>วาระที่ 4.5 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง EIA</u>

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฯ เพื่อเสนอหน่วยงานอนุญาต)

<u>วาระที่ 4.5.1 การเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการฯ</u>

1. การออกแบบถนนและอาคารเพื่อวางผังเครื่องจักร ซึ่งระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงาน EIA ขนาด/รูปแบบแนวถนน/ขนาดอาคาร พื้นที่ที่จะทำการติดตั้งเครื่องจักรนั้น เป็นแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และเมื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง หรือเมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องจักรแต่ละประเภทเพื่อนำมาติดตั้ง จึงจะทราบขนาดหรือรายละเอียดที่ชัดเจน โดยขนาดอาคารที่ก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต อ.1 มีเพียงแนวถนนกับห้องชั่งอ้อยที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้การจราจรของรถบรรทุกอ้อยเคลื่อนที่ได้คล่องตัวจากเดิม
2. การขอลดพื้นที่บางส่วนประมาณ 6 ไร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อเนื่องของโรงงานฯ

ประเด็นเสนอ : เพื่อทราบ

<u>มติที่ประชุม :</u> รับทราบ

<u>วาระที่ 4.5.2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบประตูผันน้ำ/รับน้ำหลาก จากห้วยพะไย</u>

- ทางบริษัทฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะกรรมการ EIA เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างประตูผันน้ำฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงประตูผันน้ำฯ โดยทีมวิศวกรชลประทาน จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฯ

ประเด็นเสนอ : เพื่อทราบ

<u>มติที่ประชุม :</u> รับทราบ

วาระที่ 5: เรื่องพิจารณา

คุณแสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ

<u>วาระที่ 5.1: เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ขอกำหนดการประชุมคณะกรรมการ EIA</u>

-อ้างถึงสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.3/14781 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 "ความถี่ในการประชุม (1) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลา ปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการ EIA สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้จัดทำรายงานฯ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ได้แก่

ครั้งที่ 1: รอบการจัดทำรายงานฯ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
ระยะเวลาการจัดส่งหน่วยงาน ภายใน 31 กรกฎาคม
จัดประชุมคณะกรรมการ EIA ในเดือนตุลาคม

ครั้งที่ 2: รอบการจัดทำรายงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ระยะเวลาการจัดส่งหน่วยงาน ภายใน 31 กรกฎาคม
จัดประชุมคณะกรรมการ EIA ในเดือนเมษายน

เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดหีบอ้อยของโรงงาน ซึ่งจะเปิดหีบอ้อยประมาณช่วงเดือน ธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี พร้อมจะจัดทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้แก่คณะกรรมการทราบล่วงหน้า

ประเด็นเสนอ : เพื่อพิจารณา

<u>มติที่ประชุม :</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ EIA ครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม และครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน

วาระที่ 6: **เรื่องอื่นๆ**

นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ

<u>วาระที่ 6.1: เรื่องปรึกษาหารือความปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะบริเวณหน้าโครงการฯ</u>

- ทางโครงการมีความห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะ บริเวณหน้าโครงการฯ เนื่องจากได้มีพ่อค้าแม่ค้าหลายราย ตั้งแผงร้านค้า ขายสินค้าประเภทต่างๆ ในช่วงเช้าของทุกๆ วัน บริเวณริมถนนสุวรรณศร ซึ่งทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าว เกิดความแออัด และมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในการนี้ จึงขอปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

ประเด็นเสนอ : **เพื่อพิจารณา**

<u>มติที่ประชุม :</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบหมายให้นายอำเภอวัฒนานคร ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป**

คุณกมสัน ศิลาผ่อง ตัวแทนภาคประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย >> มีข้อห่วงกังวลเรื่องการจัดตั้งร้านค้าบริเวณสามแยกทางเข้าวัดทางหลวง ต.วัฒนานคร การสัญจรของคนในชุมชนค่อนข้างลำบาก และมักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเนื่องด้วยรถรับส่งพนักงาน/รถบรรทุกของโครงการฯ มักจอดกีดขวางไหล่ทางจราจรบ่อยครั้ง จึงฝากเสนอให้ทางนายอำเภอวัฒนานครช่วยดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ร่วมกับโครงการฯ

พ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.กอ.รมน.สระแก้ว >> ข้อห่วงกังวลเรื่องการจัดตั้งร้านค้าบริเวณสามแยกทางเข้าวัดทางหลวง ต.วัฒนานคร มอบหมายให้นายอำเภอวัฒนานคร ดำเนินการจัดประชุมพร้อมกับเรื่องการค้าขายหน้าโครงการก่อสร้าง KSL

พ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.กอ.รมน.สระแก้ว >> เสนอที่ประชุมรับรองข้อมูล "คุณภาพน้ำผิวดินที่เกินค่ามาตรฐาน" ซึ่งพบว่าทางโครงการฯ ยังไม่ได้ดำเนินการใช้น้ำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลตรวจที่ไม่ได้ตามมาตรฐานนั้น อาจเกิดจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวฯ มีปริมาณฝนตกชุกปะปนกับมูลสัตว์ที่เกิดจากกิจกรรมที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงในบริเวณนั้นลงสู่คลองสาธารณะ จึงมีส่วนทำให้น้ำเน่าเสีย ซึ่งที่ประชุมรับรองข้อมูล

คุณสกุลรัตน์ ศิริพันธุ์โนน ตัวแทนโครงการฯ กล่าวทักทายผู้เข้าประชุมฯ >> แจ้งให้ทราบว่า ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 จะเริ่มดำเนินการเปิดรับอ้อยเข้าหีบในฤดูหีบ 67/68 และฝากคณะกรรมการทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

ปิดประชุมเวลา 14:50 น.

(นายวัชรพงษ์ สันติภพ)
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ KSL
ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี)
ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ KSL
ผู้ทวนสอบรายงานประชุม

ภาคผนวก ข-7

การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน.036/2567

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เรียน นายมานพ ภูทองสุข กรรมการตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย ต.คลองทับจันทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 ชุด

ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย ต.คลองทับจันทร์ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ซึ่งตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ นั้น

ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงขอเชิญท่านเข้าอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

กำหนดการ

การอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ณ บ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เวลา	**หัวข้อ**
12.00 น.-12.10 น.	- ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
12.00 น.-13.30 น.	- อบรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
13.30 น.-14.00 น.	- ถาม-ตอบ ในประเด็นต่างๆ
14.00 น.	- เสร็จสิ้นการอบรม

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

อบรมให้ความรู้คณะกรรมการ EIA Monitoring นายมานพ ภูทองสุข
ม.1 บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ภาคผนวก ข-8

เอกสารแจ้งเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 15619
วันที่ 04 ต.ค. 2567
เวลา ..... น.

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 103/2567

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน :
1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวลักษิกา ยอดอาจ เบอร์โทร 09 8232 2305 อีเมล์ luksika@kslgroup.com
3. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO.,LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

อำเภอวัฒนานคร 4409

วันที่ - 7 ต.ค. 2567

เวลา.....น.

ที่ วน. 103/2567

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายอำเภอวัฒนานคร หรือผู้แทน

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลทันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวลักษิกา ยอดอาจ เบอร์โทร 09 8232 2305 อีเมล์ luksika@kslgroup.com
3. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

09.30 7/14/67

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 103/2567

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายปัญญา ช่างฟอก ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๔๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวลักษิกา ยอดอาจ เบอร์โทร 09 8232 2305 อีเมล์ luksika@kslgroup.com
3. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 103/2567

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายบุญมา นวลตา ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวลักษิกา ยอดอาจ เบอร์โทร 09 8232 2305 อีเมล์ luksika@kslgroup.com
3. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

ม.2 บันทึกข้อ เรื่อง คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 103/2567

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว

(.....)

...../...../.....

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวลักษิกา ยอดอาจ เบอร์โทร 09 8232 2305 อีเมล์ luksika@kslgroup.com
3. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 103/2567

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
(นาย เสริมสิทธิ์ ศิลปอง)
...../...../.....

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๖๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร


ผู้ประสานงาน :
1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวลักษิกา ยอดอาจ เบอร์โทร 09 8232 2305 อีเมล์ luksika@kslgroup.com
3. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

ภาคผนวก ข-9

แผนงานการก่อสร้าง

No.	Items	Days	2565												2566												2567											
			เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
1	CONCEPTUAL DESIGN AND ENGINEERING																																			
	- Eng. Design (PFD/ Mass-Steam balance)																																			
	- Machinery Lists, Machine Lay out, Plant Lay out																																			
	- Piping & Instrument Diagram																																			
	- Electricity & Single Line Diagram	240																																		
	- Project Budgets																																			
	- Machineries & Equipments Design																																			
	- Material Take-off & Specification																																			
	- Operation Plan																																			
2	EIA Application Approved																																			
	- Meeting กับชาวบ้าน ครั้งที่ 2																																			
	- รายงานฉบับหลัก (main Report) ฉบับส่ง สผ.																																			
	- ***ยื่นเรื่องให้กับ สผ.***	120																																		
	- สผ. ให้การรับรอง EIA (น้ำตาล)	30																																		
	- สผ. ให้การรับรอง EIA (ไฟฟ้า)	30																																		
2.1	การขออนุญาตหน่วยงาน ราชการ/อ.1/รง.3 และ กกพ.																																			
	- ยื่นขออนุญาต อ.1 จาก อบต.ท้องถิ่น	150																																		
	- ยื่นขอ อนุญาตเชื่อมทางกับทางหลวง	90																																		
	- ยื่นขอ รง.4 (อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และกรมโรงงานฯ)	90																																		
	- ยื่นขอ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (กกพ.)	90																																		
3	Procurement (contract for EPC 4 package+1 PMC)	100																																		
	- TOR by KSL for EPC	30																																		
	- First technical proposal submission & clarification	15																																		
	- Second technical proposal submission & clarification	15																																		
	- Commercial proposal submission & clarification	15																																		
	- Final Commercial proposal & sign Contract for EPC / Turnkey Project	15																																		
	- Purchase Main Machine Boiler (Sign Contract for EPC Power plant)																																			
	- Sign Contract for Project Management Control (PMC)																																			
3.1	Procurement Main Machine	100																																		
	- Purchase Main Automation Control (MAC)																																			
	- Purchase Evaporator main machine																																			
	- Purchase Raw Pan main machine																																			
	- Purchase Centrifugal main machine																																			
	- Purchase Pump Package																																			
	- Purchase Valve Package																																			
	- Purchase Water Treatment Plant																																			
	- Purchase Bagasses Yard and Reclaim House																																			
	- Purchase Molasses Tank package																																			
	- Purchase Cooling Tower package																																			
	- Purchase Raw sugar Silo package																																			
	- Purchase Main Machine ,บ้านพัก,ออฟฟิศ,Other																																			
4	CIVIL																																			
	- Countour เพิ่มเติมจากปี 2554	21																																		
	- Soil Test ปรับปรุงทำเพิ่มเติมจากปี 2554	21																																		
	- งานออกแบบ Balance ดิน	16																																		
	- งานขออนุญาตขุด/ถมดิน จาก อบต.ท้องถิ่น	30																																		
	งานขุดปรับดิน	225																																		
	- งานหาผู้รับเหมาท้องถิ่น งานขุดดิน-ถมดิน	15																																		
	- site preparation (การจัดเตรียมสำนักงานและบ้านพักคนงาน)	15																																		
	- งานปักหมุดขอบเขตที่ดินโครงการ	15																																		
	- งานปักหมุดบ่อที่จะขุด และแนวพื้นที่ที่จะถม	15																																		
	- งานเคลียร์ริ่งผิวดิน	28																																		
	- งานขุดบ่อ/ถมดิน บริเวณอาคารหลัก	60																																		
	- งานขุดบ่อ/ถมดิน/ระบบ RawWater intake กันคูน้ำรอบโครงการ	90																																		
	- งานขุดบ่อ/ถมดิน บริเวณอาคารรอง, ถนน และบริเวณอื่นๆ	150																																		

No.	Items	Days
5	FOUNDATION & STRUCTURAL WORK	
	- Road & Gutter	210
	- Truck Scale	60
	- Raw sugar Silo	240
	- Staff House/Store House	240
	- Milling House	**210**
	- Boiler House	**150**
	- T.G. House	180
	- Bagasses Yard and Reclaim House	210
	- Evaporator House & Lime House	210
	- Raw Pan & Centrifugal House	210
	- Water Treatment Plant	120
	- Cooling tower	210
	- Molasses Tank	180
	- Others Building	270
6	MACHINE DELIVERY TO SITE	
	-Steam Turbine Generator (9 M from signed contract)	270
	- Bolier (until close shipment)	240
	-Evaporator main machine	150
	-Raw pan main machine	150
	-Centrifugal	180
	-Pump Package	180
	-Valve Package	150
6.1	ERECTION& INSTALLATION	
	- Milling/ Diffuser	240
	- Boiler (Safety Valve Setting)	270
	- T.G. (Power Generation)	150
	- Steam transformer	150
	- Evaporator	240
	- Raw Pan & Centrifugal House	240
	- Water Treatment Plant	120
	- Cooling tower	120
	- Final Molasses Tank	210
	- ตรวจรับงาน/แก้ไขงาน	60
7	PIPING WORK	180
	-Awarded contract	7
	-Procurement	60
	-Installation	165
8	ELECTRICAL WORK	180
	-Awarded contract	7
	-Engineering and procurement	90
	- Installation	150
	- Insulation test and Motor test run	30
9	CONTROL & INSTRUMENTATION WORK	210
	-Awarded contract	7
	-Engineering and procurement	90
	- Installation	150
	- Loop and function test	30
10	UTILITIES WORK	180
	-Awarded contract	7
	- Foundation and piperack	90
	- Piping installation	120
11	INSULATION WORK	180
12	COMMISSIONING	

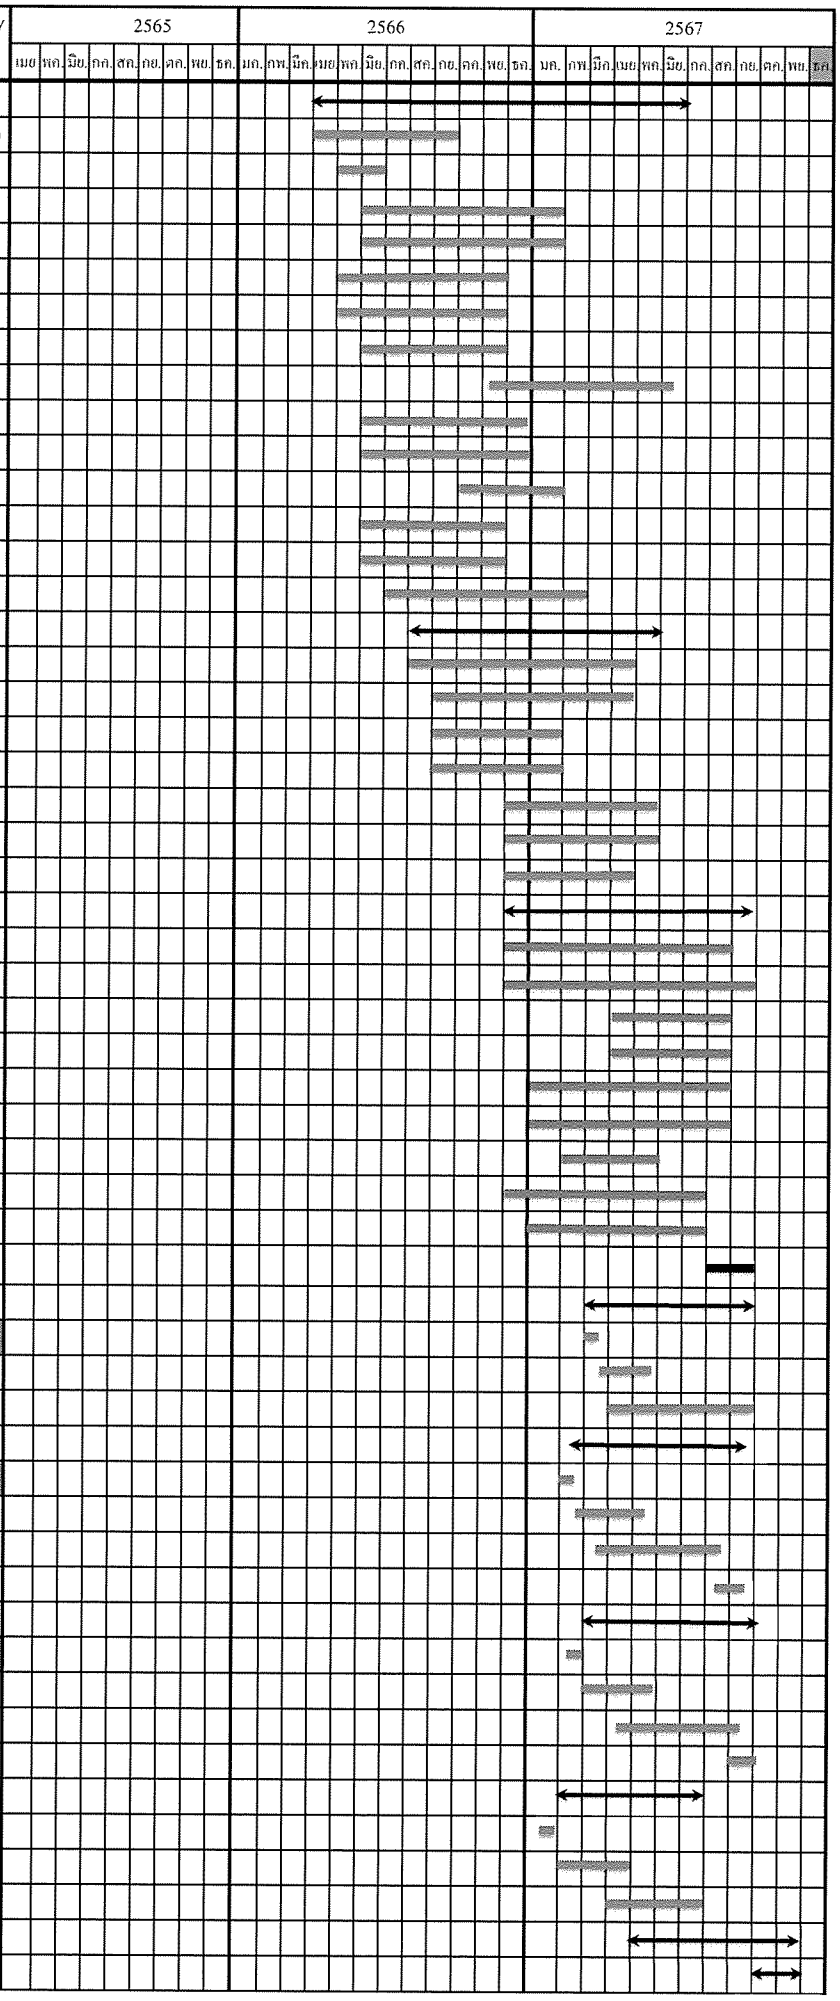

No.	Items	Days	2565										2566										2567											
			เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
	- Electrical Test Run / No load trial run	30																															
	- Water Test Run	30																															
	- Steam Test Run	15																															
	- Cane Crushing Start	-																															

มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ภาคผนวก ข-10

เอกสารการดำเนินงานก่อสร้างทางเบี่ยงและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร



ที่ คค ๐๖๐๖๑/๔๗๗

แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร)
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง

เรียน นายทัศนัย จิตหวัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสืออนุญาตที่ สป.๑/ต./๑๔๐๖/๒๐๘๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารขออนุญาตฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โดย นายทัศนัย จิตหวัง ผู้ยื่นขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน โนนจิก–อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.๒๘๐+๔๗๐.๔๓, กม. ๒๘๐+๗๙๑.๓๗ และที่ กม.๒๘๐+๘๙๐.๔๔ ด้านซ้ายทาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) โดย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาต (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว) ทั้งนี้หากก่อนดำเนินการดำเนินการกรุณาแจ้งให้แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทราบ ล่วงหน้า ๗ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.กลิ่นมาลี

(นายพรพิชิต กลิ่นมาลี)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

งานสารสนเทศ
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๓๑ ต่อ ๑๘
โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๓๒

แขวงทางหลวงสระแก้ว วัฒนานคร
เลขที่รับ ๔๗๔๙
วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๔๖

สำนักอำนวยความปลอดภัย โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๕๒๖ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๗๑๓

สป. ๑/ต./๑๔๐๖/ ๒๐๙๐ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขออนุญาตทำทางเชื่อม ในเขตทางหลวง

เรียน ผส.ทล.๑๐ (นครราชสีมา) , ผอ.ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ตามบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ที่ สทล.๑๐.๘/๑๐๓๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขออนุญาตทำทางเชื่อม ในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) นั้น

ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทำทางเชื่อมได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ให้ผู้ขอฯ ก่อสร้างตามแบบอนุญาต

๒. ให้ผู้ขอฯ ก่อสร้างทางเชื่อมเข้า – ออก ที่ กม.๒๘๐+๔๗๐.๔๓, กม.๒๘๐+๗๙๑.๓๗ และ กม.๒๘๐+๘๙๐.๔๔ ด้านซ้ายทาง โดยทางเชื่อมแต่ละจุดให้ก่อสร้างเป็น ผิว คสล. หนา ๐.๒๓ เมตร ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวม ๑๒.๐๐ เมตร และรัศมีทางเชื่อม ๑๒.๕๐ เมตร

๓. ให้ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘.๐๐ เมตร บริเวณใต้ทางเชื่อมตามมาตรฐานกรมทางหลวง จำนวน ๓ จุด ที่ กม.๒๘๐+๔๗๐.๔๓, กม.๒๘๐+๗๙๑.๓๗ และ กม.๒๘๐+๘๙๐.๔๔ ด้านซ้ายทาง

๔. ให้ผู้ขอฯ ก่อสร้างขยายช่องจราจรทำเป็นช่องจราจรลดความเร็ว ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวตามแบบขออนุญาต โดยให้โครงสร้างช่องจราจรส่วนที่ขยายเป็นลักษณะเดียวกับโครงสร้างทางหลวงและเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง

๕. ให้ผู้ขอฯ ก่อสร้างขยายช่องจราจรทำเป็นช่องจราจรเร่งความเร็ว ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวตามแบบขออนุญาต โดยให้โครงสร้างช่องจราจรส่วนที่ขยายเป็นลักษณะเดียวกับโครงสร้างทางหลวงและเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง

๖. การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นจราจร หรือเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้ขอฯ ต้องก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยก่อนดำเนินการให้ประสานแขวงทางหลวง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

๗. ให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง ๙.๐๐ เมตร ตามมาตรฐานกรมทางหลวง บริเวณช่องจราจรลดความเร็ว และช่องเร่งความเร็ว โดยก่อนดำเนินการให้ประสานแขวงทางหลวง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องรูปแบบ ตำแหน่ง และจำนวน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง

๘. ให้ก่อสร้างรางตื้นขนาดอย่างน้อยกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณทางเชื่อมในเขตที่ดินของผู้ขอฯ

๙. ผู้ขอฯ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างต่อแขวงทางหลวง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

๑๐. ผู้ขอฯ...

อรัญประเทศ
ขท. ๑๐
เพื่อทราบ ☐ ถือปฏิบัติ ☑ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามระเบียบ ☐ อนุมัติตามแสดง ☐ เข้าร่วมประชุม

พ. กลิ่นมาลี
(นายพรพิชิต กลิ่นมาลี)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

๑๐. ผู้ขอฯ ต้องบริหารจัดการให้รถเข้า - ออก ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรบนทางหลวง และสร้างความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง หากเกิดปัญหาต้องดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของแขวงทางหลวง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๑. ผู้ขอฯ ต้องบริหารจัดการน้ำในเขตทางหลวงให้ไหลได้อย่างสะดวก โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง หากเกิดปัญหาต้องดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของแขวงทางหลวง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๒. ผู้ขอฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดปัญหาต้องดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของแขวงทางหลวง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๓. กรณีผู้ขอฯ ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่แขวงทางหลวงกำหนด ให้ขอต่อระยะเวลาก่อสร้างได้ โดยให้แขวงทางหลวงเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและกำหนด

๑๔. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาต หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตหรือการดำเนินการภายหลังจากได้รับอนุญาตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายปิยะพนธ์ เกิดมงคล)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

นันทวัน/ร่าง/พิมพ์
/ตรวจ
D:ทางเชื่อม /๑๔๐๖

หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

คำขออนุญาตก่อสร้างทาง หรือถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้า - ออกทางหลวง

(คำขอสำหรับเอกชน)

เขียนที่ หมวดทางหลวงอรัญประเทศ

วันที่...3.....เดือน..กันยายน.....พ.ศ....2564....

ข้าพเจ้า.....นายทัศนัย จิตหวัง.....อายุ....51.....ปี อยู่บ้านเลขที่...99.....หมู่ที่....21...ตำบล...สระขวัญ.....อำเภอเมือง สระแก้ว....จังหวัดสระแก้ว....ขออนุญาตสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่....พิเศษ.....ในเขตทางหลวงหมายเลข.....33.....ตอน..... โนนจิก –อรัญประเทศ(เขตแดนไทย/กัมพูชา).....ที่ กม. .....280+470.43, 280+791.37.....และที่กม. ...280+890.44....ด้าน.....ซ้าย.....ทางเพื่อประสงค์เป็นทางเข้า - ออก .....โรงงานน้ำตาล.....กับที่ดินของ..... บริษัท น้ำตาล นิวกว้างสุ้นหลี จำกัด.....ซึ่งมีหนังสือสำคัญตาม..... โฉนดที่ดิน.....เลขที่.....10174.....เลขที่ดิน.....353.....ได้แนบแผนผังมาเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมนี้จำนวน 5 ชุด และเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวงข้าพเจ้า.....นายทัศนัย จิตหวัง.....(ผู้ขออนุญาต) ขอให้คำรับรองและทำสัญญาตามกรมทางหลวง ดังนี้

1. ผู้ขออนุญาตจะทำการก่อสร้างตามแบบเลขที่.....พิเศษ.....ที่ได้รับอนุญาตและดำเนินการก่อสร้าง โดยความควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง

2. ผู้ขออนุญาตจะดำเนินการหาวัสดุก่อสร้างเอง ตามแผนผังที่กรมทางหลวงอนุญาต จะไม่ใช้ วัสดุในเขตทางหลวง

3. แผนผังมาตรฐานของกรมทางหลวงก็ดี แผนผังอื่นใดที่กรมทางหลวงได้วางไว้เป็นพิเศษ หรือได้รับอนุญาตเฉพาะรายเพื่อทำการนี้ก็ดี ผู้ขออนุญาตจะไม่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการตกลงยินยอมจากกรมทางหลวงเป็นลายลักษณ์อักษร

4. กรมทางหลวงสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะออกแบบ แก้ไข เพิ่มเติม สิ่งก่อสร้างของผู้ขออนุญาตที่ได้รับอนุญาตทำไว้ ให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของกรมทางหลวง หรือเพื่อความปลอดภัยแก่ทางหลวง หรือเพื่อบำรุงรักษาทางหลวงประการใดก็ดี และในกรณีที่มีการแก้ไขนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาตที่ได้รับอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามที่กรมทางหลวงสั่งให้แก้ไข เพิ่มเติม โดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้กรมทางหลวง จะแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร แต่หากอยู่ในสถานการณ์อันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือในสถานการณ์เร่งด่วน ผู้รับอนุญาตจะต้องแก้ไขโดยเร็วตามที่กรมทางหลวงกำหนด หรือยินยอมให้กรมทางหลวงเข้าทำการแก้ไขเสียเอง โดยยินยอมชดใช้ค่างานนี้ให้แก่กรมทางหลวงด้วย

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขออนุญาตจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน.....90...วัน เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าผู้ขออนุญาตยังทำการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้ขออนุญาตหลีกเลี่ยงไม่ทำตามแผนผัง ที่กำหนด หรือมีเหตุที่ไม่สมควรให้ต่อเวลาทำการอีกต่อไป ผู้ขออนุญาตจะยินยอมให้กรมทางหลวงสั่งตัดสิทธิ์ถอนใบอนุญาต และปิดการจราจร โดยฝังเครื่องปิดกั้นหรือตัดส่วนหนึ่งส่วนใดในทางเชื่อมออก แต่ถ้าหากภายหลัง ปรากฏว่า ผู้ขออนุญาตเจตนาที่จะทำขึ้นใหม่ให้ถูกต้องตามความประสงค์ของทางราชการ ก็อาจจะยินยอมให้ผู้ขออนุญาตทำการนี้ขึ้นใหม่ก็ได้

6. ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขออนุญาต และระเบียบของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้ทุกประการ

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต

(นายทัศนัย จิตหวัง)

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายมนตรี บุตรพินธ์)	(นายประมวล ถี่ถ้วน)	(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์) รส.ทล.10.1
ชม.ขท.อรัญประเทศ	รอ.ขท.(ป.) สระแก้ว(วัฒนานคร)	รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร)

รอ.ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร) (ว)
รักษาราชการแทน

<u>คำรับรองของผู้ขออนุญาต</u>

ตามที่ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวง ตามแบบเลขที่.....พิเศษ.....
ในทางหลวงหมายเลข....33....ตอน.....โนนจิก – อรัญประเทศ(เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม. 280+470.43, 280+791.37 และ กม. 280+890.44.....เพื่อเป็นทางเข้า-ออก...โรงงานน้ำตาล.....
ตามคำขออนุญาต ลงวันที่.....3 กันยายน 2564.....นั้น

ข้าพเจ้า ขอให้คำรับรองต่อกรมทางหลวง ดังต่อไปนี้

1. จะเว้นที่ดินของตนเองใช้ทำถนน กว้าง 6.00 ม. ด้านหน้าอาคาร
2. จะไม่ตัดฟันต้นไม้ในเขตทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. จะไม่ขุดดินในเขตทางเพื่อใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
4. จะไม่วางสิ่งของต่างๆ ในเขตทางหลวง
5. จะทำทางเชื่อมให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
6. ถ้าข้าพเจ้าทำผิดเงื่อนไขดังกล่าวมาแล้ว ตามข้อ 1-5 นี้ ข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามแต่กรมทางหลวงจะเรียกร้องทุกประการ รวมทั้งสิทธิที่กรมทางหลวงจะบอกเลิกการอนุญาตด้วย โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

7. ข้าพเจ้าจะก่อสร้างทางเชื่อมเพื่อเป็นทางเข้า – ออก ตามแบบเลขที่ 37/1(2) พร้อมทั้งแบบรูปตัดโครงสร้างส่วนขยายช่องจราจร และแบบรูปตัดโครงสร้างทางเชื่อม ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในกำหนดที่ระบุในคำร้อง คือ.....90 ..วัน โดยวิธีการ ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมาบริษัทฯ

8. มีเครื่องจักรกล คือ ☑ รถบรรทุก ☑ รถตักหน้าตักหลัง ☑ รถบด ☑ รถเกรด ☑ รถแมคโคร ☐ อื่นๆ ระบุ.....อุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง.....

ลงชื่อ ..... ผู้ขออนุญาต
(นายทัศนัย จิตหวัง)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางทวีทรัพย์ ต้นแต๋ตระกูล)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางมณีวรรณ ควงภูมิเมธ)

ลงชื่อ ..... .ชม.ขท.อรัญประเทศ
(นายมนตรี บุตรพินธ์)

ลงชื่อ ..... รส.ทล.10.1 รักษาราชการแทน
(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์) ผอ.ขท. สระแก้ว (วัฒนานคร)

ที่...หมวดทางหลวงอรัญประเทศ...

วันที่...๒....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2564....

เรื่อง การตรวจสอบการขออนุญาต...ทำทางเชื่อม เข้า – ออก กับกรมทางหลวง....

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

ตามที่.....นายทัศนัย จิตหวัง..... ได้ขออนุญาตทำทางเชื่อมกับกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่....พิเศษ..ในทางหลวงหมายเลข.....33.....ตอน .....โนนจิก – อรัญประเทศ(เขตแดนไทย/กัมพูชา)
ที่ กม. .....280+470.43, 280+791.37.....และที่ กม. .....280+890.44...ด้าน...ซ้าย.....ทาง เพื่อเป็นทางเข้า - ออก .....โรงงานน้ำตาล..... นั้น

คณะผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้ร่วมทำการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตตามแบบเลขที่.....พิเศษ.....เมื่อวันที่..๓.....เดือน....กันยายน...พ.ศ. ....2564... ปรากฏว่ามีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรฐานทางหลวง.....ชั้นพิเศษ..... ผิวจราจรชนิด.....แอสฟัลท์ติกคอนกรีต.....
ไหล่ทางชนิด.....แอสฟัลท์ติกคอนกรีต.....เขตทางด้านที่ขออนุญาตกว้าง.....20.00.....เมตร
2. แนวทาง (...../.....) ตรง (.....) โค้ง รัศมี.....-.....เมตร
3. ความลาดของทางหลวง.....-.....%
4. หน้าที่ดินด้านที่ติดเขตทางหลวงจาก กม. ....280+360....ถึง กม. ..280+947.50....(...587.50....เมตร)
5. จุดศูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจาก (...-.....) ทางแยกที่มีการจราจร (....-....) ทางสาธารณะ (...-....) ทางเชื่อม (.....เมตร)
6. ที่ดินมีความกว้าง (..../..) เพียงพอ (.....) ไม่เพียงพอ ที่จะดำเนินการตามข้อกำหนด เงื่อนไขของกรมทางหลวงได้
7. ท่อทางเชื่อมที่ขออนุญาต (.....) ตรง (.....) ไม่ตรง กับแนวท่อ Cross
8. บริเวณหน้าที่ดิน (.....) มี (...../..) ไม่มี ท่อ Cross
9. ในบริเวณรัศมี 100 เมตร, 250 เมตร และ 500 เมตร จากตำแหน่งที่ขออนุญาตตามข้อกำหนดแต่ละแบบที่ขออนุญาตมี ท่อ ค.ส.ล. ขนาด.....เมตร ห่างจากศูนย์กลาง.....เมตร
10. บริเวณหน้าที่ดิน (..../...) มี (.....) ไม่มี สิ่งสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ (แสดงรายละเอียดในแบบที่ขออนุญาต)
11. การทำทางเข้า – ออก (.....) ตัด (...../...) ไม่ต้องตัด ต้นไม้ในเขตทางหลวง (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดลงในแบบที่ขออนุญาต)
12. แผนที่สังเขป (ได้ลงรายละเอียดไว้ด้านหลังแบบฟอร์มนี้ด้วยแล้ว)

ได้ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขออนุญาตแล้ว จึงลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายประมวล ...)
รอ.ขท.สระแก้ว (วัฒนาคร) (ว)

ลงนาม ..... รอ.ขท.(ป)สระแก้ว(วัฒนานคร)

ลงนาม ..... ชม.ขท.อรัญประเทศ

ลงนาม ..... ผู้ขออนุญาต

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายวิวัฒน์ ศรีสมหมาย อายุ 46 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนน บริเวณโรงเลื่อยและบ้านพัก ตรอก/ซอย -
ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว
ที่ทำงาน - โทรศัพท์ที่บ้าน 095 1153347 ที่ทำงาน -
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา
แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย. 37064 และขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2542 โดยข้าพเจ้าเป็น ควบคุมการก่อสร้าง, วางผัง, ตามแบบก่อสร้าง
เป็นอาคารชนิด ทางเชื่อมถนนสุวรรณศร หมายเลข 33 ตามแบบมาตรฐานทางหลวงแผ่นดิน เพื่อใช้เป็น ทางเชื่อม
ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างซุ้นหลี จำกัด เชื่อมทางกับ ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 19174,19517
ตำบล ผักขระ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ตามผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้าง

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... วิศวกร
(นายวิวัฒน์ ศรีสมหมาย)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขออนุญาตเชื่อมทาง

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(ลงชื่อ) ..... พยาน

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพไปด้วย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้ เป็นลายลักษณ์อักษร



ใช้ในการรับรองการวางผังการควบคุมงาน ก่อสร้าง ...งหลวงแผ่นดิน

ผังเชื่อมทางกับทางหลวงแผ่นดินสายสุวรรณเศร หมายเลข 33 เพื่อใช้ เชื่อมทาง

ของ บริษัท นิวกว้างซุ้นหลี จำกัด

สถานที่ ตำบล ผักขระ อำเภอ วัฒนนาคาร จังหวัดสระแก้ว

216264





ที่ คค ๐๖๐๖๑/ ๑๓๐ ๗

แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร)
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตขอขยายเวลาการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบเลขที่พิเศษ ครั้งที่ ๓

เรียน บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โดย นายธุติวรรธน์ ยิบยินธรรม ผู้รับมอบอำนาจ

อ้างถึง หนังสือ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ที่ คค ๐๖๐๖๑/๘๘๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสืออ้างถึง แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ได้พิจารณาอนุญาตขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างทางเชื่อมกับ ทางหลวงแบบเลขที่พิเศษในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนโนนจิก–อรัญประเทศ(เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.๒๘๐+๔๗๐.๔๓, กม. ๒๘๐+๗๙๑.๓๗ และที่ กม. ๒๘๐+๘๙๐.๔๔ ด้านซ้ายทาง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ได้รับแจ้งจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างทางเชื่อมออกไปอีก เนื่องจากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขออนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างทางเชื่อม (ครั้งที่ ๓) ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน (นับจากวันที่ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กรมทางหลวงจะยกเลิกการอนุญาตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.กลิ่นมาลี

(นายพรพิชิต กลิ่นมาลี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

งานสารสนเทศ
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๓๑ ต่อ ๑๘
โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๓๒

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
新 廣 順 利 糖 廠 有 限 公 司
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

ที่ สญ. 009 / 2566 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
เลขที่รับ ๕๖๑
วันที่ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๔๖ น.

เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างทางเชื่อม

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

อ้างถึง ใบอนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ที่ คค.06061/517 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสืออนุญาตที่ คค.06061/1301 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้ยื่นเอกสารขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 และได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา ทำทางเชื่อมกับทางหลวง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น

ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ให้แล้วเสร็จจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อโปรดพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ออกไปอีก จนกว่าทางบริษัทฯ จะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างทำทางเชื่อมฯ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐิติวรรธน์ ยิบยินธรรม)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน
นายนิธาน จงสกุล
โทร. 083 0196216

สำนักงานใหญ่ : 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 6426229-39 แฟกซ์ (02) 6426228
OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 21 ST. FLOOR, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI, RAJTHAVEE, BANGKOK 10400 THAILAND TEL. (662) 6426229-39 FAX : (662) 6426228

ภาคผนวก ข-11

แผนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักร และการดำเนินการตามแผน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

แบบตรวจสอบรถเครนและรถบรรทุก Mobile Crane & Hiab Truck Daily Check list

ประเภทปั้นจั่น		ชื่อ [illegible] บริษัท [illegible]
จัดความสามารถ [illegible] ตัน		หมายเลข กป.2 วันหมดอายุ
หมายเลข [illegible]		แบบตรวจสอบสำหรับเดือน [illegible]


รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.ตรวจสอบระดับน้ำและน้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
2.ตรวจวัดระดับน้ำมัน,ไฮดรอลิกและยางน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.ตรวจสอบสายพาน รอก และยึด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
4.ตรวจสภาพรวมระบบการให้สัญญาณและ คู่มือการปฏิบัติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
5.ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์																																
1.เสียงเครื่องยนต์ ไอเสีย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
2.การทำงานของ จอ แกช และมาตรวัดต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
4.สภาพรอกและการตั้งตาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
5.ตำบังคับและปุ่มควบคุมต่างๆทำงานได้ถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
6.ระบบล็อค กลอนถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
7.ระบบตัดต่อไฟฟ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
8.สัญญาณการยกน้ำหนักกันและระบบตัดการทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
9.ระบบไฟสัญญาณไฟเตือนเมื่อเกิดวิบูล ซ้าย-ขวา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
รายการตรวจสอบพื้นที่การทำงาน																																
1.พื้นที่ตั้งเครนมีความแข็งแรงมั่นคง ได้ระดับ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
2.จุดตั้งเครนห่างจากแนวสายไฟฟ้าและมีแยะห่างเพื่อความ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.พื้นที่บริเวณที่ทำงานและมีป้ายเตือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
4.มีผู้ให้สัญญาณและสวมเสื้อสะท้อนแสงชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												

○ = ผ่านใช้งานได้ดี
△ = ชำรุดต้องปรับปรุง
X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทัน

ผู้ตรวจสอบ หัวหน้างาน [illegible]
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [illegible]

แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST



หมายเลขเครื่อง CC1 สถานที่ Boiler 1

บริษัท [illegible] เดือน [illegible]

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.โครงสร้างตู้เชื่อม การ์ดครอบใบพัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
2.สภาพสายไฟต่อเข้าตู้เชื่อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อมได้มาตรฐาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4.สายดินที่ตู้เชื่อมไม่หลุดหลวม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
5.สายกราวด์ สายเชื่อมไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
6.จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้ขันแน่นมีเทปพัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
7.จุดต่อสายเชื่อม แน่นมีเทปพัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
8.หัวเชื่อมมีสภาพดีไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
9.หัวหนีบจับกราวด์มีสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
10.สวิทช์ ปิด-เปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
11.สติกเกอร์ตู้เชื่อม ไม่หมดอายุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
12.ตู้เชื่อมวางไว้ที่แห้งและปลอดภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
13.มีถังดับเพลิงบริเวณที่ตั้งตู้เชื่อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

○ = ผ่านใช้งานได้ดี
△ = ชำรุดต้องปรับปรุง
X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทัน

ผู้ตรวจสอบ หัวหน้างาน [illegible]
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [illegible]

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ชุดตัดแก๊สประจำวัน

GAS CUTTING SET DAILY CHECKLIST

KLN (THAILAND)

หมายเลขเครื่อง 002 สถานที่ Boiler 1

บริษัท ...ช่างชัยพาณิช... เดือน ...ตุลาคม...



รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.มีข้อมูลสารเคมีติดไว้ที่เครื่องตัดแก๊ส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
2.มีวิธีการใช้งานติดไว้อย่างชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.ถังแก๊สยึดและตั้งไว้ที่มั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4.วาล์วหัวถังเปิด-เปิด ได้สนิท	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
5.เกจวัดสามารถปรับได้และอ่านค่าได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
6.สปริงตั้งตัวกันไฟย้อนกลับที่แรงปรับแรงดัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
7.สายแก๊สต่อเข้ากับหัวถังและหัวตัดอย่างถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
8.สายแก๊สอยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
9.สภาพหัวตัดแก๊สพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
10.มีการตรวจสอบรอยรั่วของสายแก๊ส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
11.ไม่มีการรั่วซึมของจุดข้อต่อและวาล์วหัวตัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
12.จุดข้อต่อมีเส้นรัดรัดแน่นหนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
13.มีอุปกรณ์จุดแก๊สประจำชุดทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
14.บริเวณตั้งชุดตัดแก๊สต้องไม่มีประกายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
15.มีถังดับเพลิงบริเวณที่ตั้งหัวตัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

○ = ผ่านใช้งานได้ดี

△ = ชำรุดต้องปรับปรุง

x = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทัน

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้างาน ...ทวม เกตุดำ...

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ...อิ๊ด...



ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง





ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง


















ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

บริษัท นำตาลนิวกว้างสุ้นหลี สระแก้ว
แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์

Power Peak

ลำดับ	ว/ด/ป	ผู้ตรวจเช็ค	เครื่องมือ/อุปกรณ์	สภาพ		ภาพประกอบอุปกรณ์
				ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	27/08/67		ตู้เชื่อม	OK		
2	27/08/67		หินเจียร์	OK		
3	27/08/67		หินเจียร์	OK		
4	27/08/67		ปลั๊ก Power 3 ทาง	OK		
5	27/08/67		ปลั๊ก Power 3 ทาง	OK		
6	27/08/67		Fiber	OK		
7	27/08/67		สายไฟพ่วง	OK		
8	27/08/67		สายไฟพ่วง	OK		

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

9	27/08/67		สว่านเจาะปูน	OK		
10	27/08/67		สว่านเจาะปูน	OK		
11	27/08/67		สว่านเจาะเหล็ก	OK		
12	27/08/67		ตู้เชื่อม	OK		
13	27/08/67		หินเจียร์	OK		
14	27/08/67		ปลั๊ก Power 3 ทาง	OK		

ภาคผนวก ข-12

ข้อกำหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมา

ข้อกำหนดการจัดการขยะในสัญญาจ้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.พักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

เรื่อง กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการก่อสร้างฯ

.....

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโครงการก่อสร้างฯ รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอประกาศกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

22. การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องทำการป้องกันสะเก็ดไฟ และต้องจัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ถังต่อจุดปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

23. ห้ามพนักงาน นำหรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว ในบริเวณพื้นที่ทำงาน

24. พนักงาน ต้องทิ้งขยะตามสถานที่ที่กำหนดและจัดแยกขยะตามประเภทเพื่อง่ายต่อการจัดการ

25. ห้ามพนักงานทิ้งขยะ น้ำมัน หรือสารเคมี ทุกประเภท ลงในรางระบายน้ำ

26. เมื่อนำรถเข้าจอดในบริเวณโครงการ ให้จอดในพื้นที่ ที่กำหนดเท่านั้น และต้องทำการดับเครื่องทุกครั้ง

27. พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

28. ห้ามพนักงานเข้าภายในพื้นที่โครงการโดยพละการ ก่อนได้รับอนุญาต

29. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ และผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษ ต่อพนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ที่กระทำการฝ่าฝืนตามแต่กรณี

30. ห้ามพนักงานนำทรัพย์สินทุกชนิด ของบริษัทฯ และของผู้ว่าจ้างออกนอกโครงการ ก่อนได้รับอนุญาต

ภาคผนวก ข-13

เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้าง


บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ระยะก่อสร้างโครงการ)

ปัจจุบันความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล มีความคืบหน้า 80 %
งานปรับถมดิน: โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำมาปรับพื้นที่บริเวณคันคูน้ำและถนนรอบโครงการฯ
งานโครงสร้าง: โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อาคารลูกหีบ อาคารหม้อต้ม อาคารหม้อเคี่ยว อาคารไซโลเก็บน้ำตาล อาคารพัสดุ อาคารถังเก็บโมลาสและอาคารห้องชั่ง ฯลฯ


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

1.ขั้นตอนการก่อสร้าง

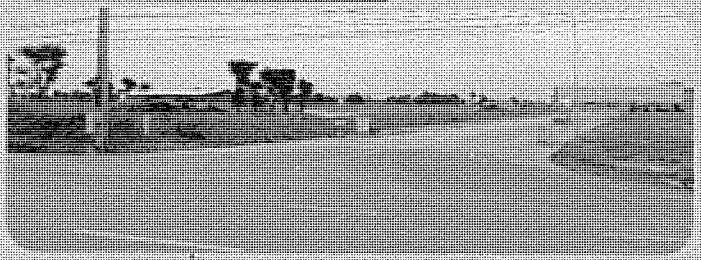

- จัดทำทางเบี่ยงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบบริเวณด้านหน้าโครงการ

2.ทรัพยากรดิน

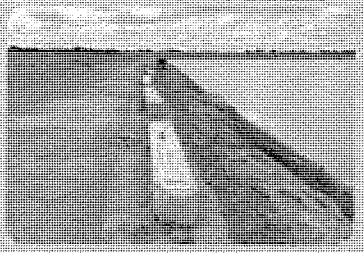





- จัดทำดาดคอนกรีต/ปลูกหญ้าคลุมดิน/บดอัดดิน ให้แน่นบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการกัดเซาะของน้ำได้ง่ายตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

3.คุณภาพอากาศ

- พรมน้ำ/ฉีดน้ำล้างพื้นที่ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ (ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก) เช่น พรมน้ำถนนดินภายในโครงการ ล้างถนนหน้าโครงการ

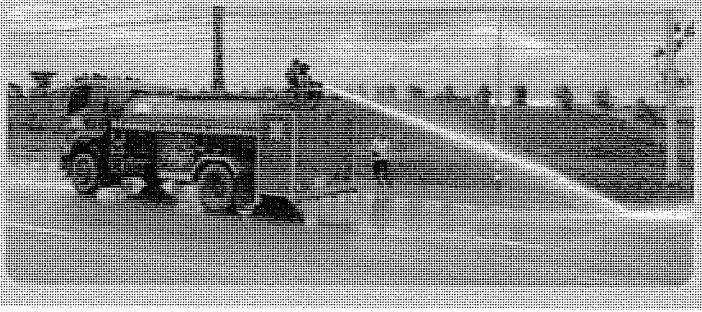

4.ระดับเสียง

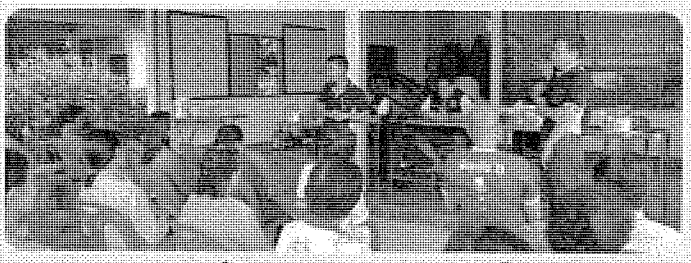

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้างโครงการให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และตลอดระยะการก่อสร้าง ที่มีกิจกรรมก่อให้เกิดเสียงดัง


5.คุณภาพน้ำ




- มีห้องน้ำสุขาชั่วคราวและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของบริษัทผู้รับเหมาให้เพียงพอกับพนักงานก่อสร้างในโครงการ

6.การคมนาคมขนส่ง

- มีระบบการจัดการจราจรและเจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวกรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ




7.การจัดการของเสีย

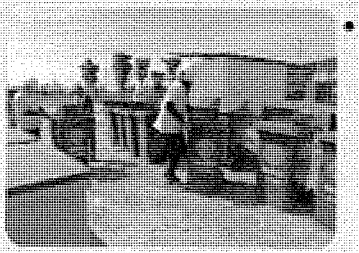

- มีพื้นที่จัดเก็บขยะเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง


8.ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

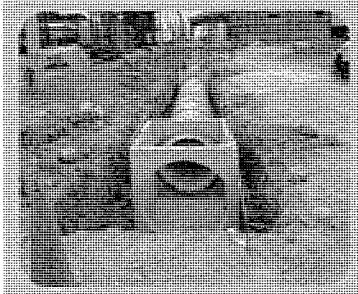


- มีรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำฝนในพื้นที่โครงการให้ไหลลงสู่บ่อน้ำของโครงการต่อไป

9.ระบบการจัดการความปลอดภัย


- อบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

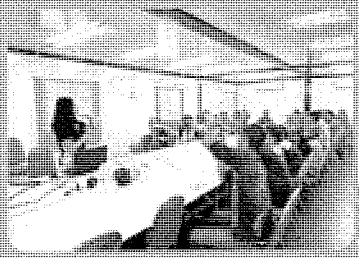

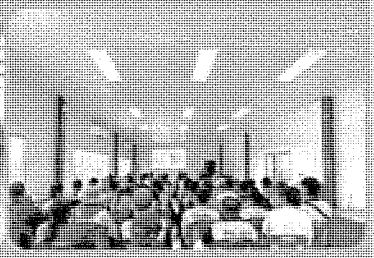

10.เศรษฐกิจและสังคม

- ประสานงาน/ร่วมมือกับผู้นำชุมชน อาทิ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน และมาตรการด้านความปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน รวมถึงรับสมัครงานผู้ที่เข้าทำงานในโครงการ สำหรับประชาชนใน ต.ผักขะ ต.วัฒนานคร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนในพื้นที่รอบโครงการเป็นอันดับแรก

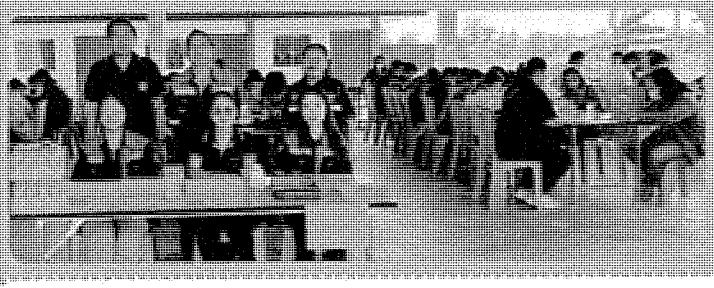


11.การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น FACEBOOK FANPAGE/กลุ่มไลน์ผู้นำชุมชน (LINE GROUP) เว็บไซต์บริษัท หรือช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม




12.สาธารณสุขและสุขภาพ

- จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอรวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจำโรงงานตลอดเวลาให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

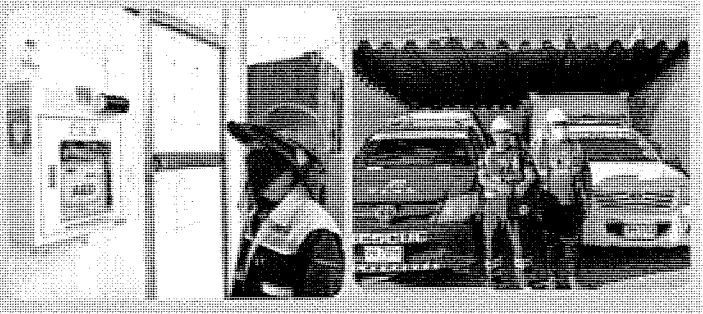

13.พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

- จัดสรรพื้นที่สีเขียวประมาณ 164.81 ไร่ (ร้อยละ 10.25 ของ พื้นที่โครงการ) ซึ่งจะทำการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกกำหนดให้มีความสูงในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

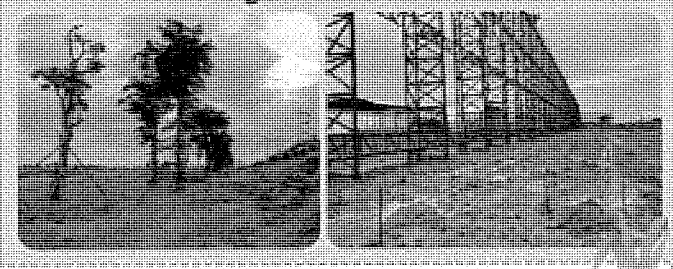

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี :เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ TEL. : 081-862-0910 E-MAIL : SERMSIT@KSLGROUP.COM
- คุณวัชรพงษ์ สันติภาพ :เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ TEL. : 087-627-6141 E-MAIL : WATCHARAPONG@KSLGROUP.COM
- คุณลักษิกา ยอดอาจ :เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม TEL. : 088-232-2305 E-MAIL : LUKSIKA@KSLGROUP.COM
- คุณภควดี โพธิผล :เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม TEL. : 063-196-0248 E-MAIL :PAKAWADEE@KSLGROUP.COM

ภาคผนวก ข-14

แบบบันทึกผู้ขนส่งสิ่งปฏิกูล

แบบบันทึกของผู้กำจัดสิ่งปฏิกูล ๒

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการกำจัดสิ่งปฏิกูล อ.บ.ท. เกษม 2002

หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ ย.ท. 149/2567 อนุญาตโดย .....

ที่อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบล ร่มหวัน อำเภอ ปะคำ

จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 080-8396009

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการขนสิ่งปฏิกูล อ.บ.ท. เกษม 2002

หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ ย.ท. 149/2562 อนุญาตโดย อ.บ.ท. เกษม 2002

ที่อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบล ร่มหวัน อำเภอ ปะคำ

จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 080-8396009

หมายเลขทะเบียนรถสูบสิ่งปฏิกูล 71-0749 ชื่อคนขับรถ สมชาย โทรศัพท์ 080-8396009

ชื่อพนักงานเก็บขน สมชาย หอมหวล โทรศัพท์ 080-8396009

ได้นำสิ่งปฏิกูลมาส่งให้ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการกำจัดสิ่งปฏิกูล ณ อาคารสถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้ เพื่อดำเนินการกำจัด

<u>การบันทึกการปฏิบัติงาน</u>

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปฏิกูล (ลูกบาศก์เมตร)	เวลารถเข้า	เวลารถออก	รายชื่อผู้ขอรับบริการ
27/11/67	1500	14.40	16.30 น.	๑ ปิยนันท์ สุดเสงี่ยม 27/11/67 ๒ ..... ๓ .....

ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาแบบบันทึกของผู้ขนสิ่งปฏิกูลจำนวน....ฉบับ เพื่อประกอบกับแบบบันทึกของผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ สมชาย หอมหวล ผู้ขนสิ่งปฏิกูล

(.....)

คำรับรองของผู้กำจัดสิ่งปฏิกูล : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูล ตามวัน/เวลา/ปริมาณที่ระบุในตารางข้างต้นจริงและได้ดำเนินการกำจัดตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ลงชื่อ สมชาย หอมหวล ผู้กำจัดสิ่งปฏิกูล

(.....)

<u>หมายเหตุ</u> : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสองฉบับ ดังนี้ ๑. ต้นฉบับให้ผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๒. สำเนามอบให้ผู้ขนสิ่งปฏิกูล ๓. สำเนามอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบสรุปการขนสิ่งปฏิกูลหรือการกำจัดสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ๓

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการขนสิ่งปฏิกูล/ผู้ประกอบการกำจัดสิ่งปฏิกูล อบต.เกษียร 2002

หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ ส.ท. 149/2567 อนุญาตโดย อบต.เกษียร 2002

ที่อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบล โคกกรวด อำเภอ ปักธงชัย

จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 080-6304009

ขอรายงานผลการปฏิบัติ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประเภทการให้บริการ	จำนวนผู้ใช้บริการ	ปริมาณสิ่งปฏิกูล (ลูกบาศก์เมตร)
☑ ดำเนินการขนสิ่งปฏิกูล	1 ราย	1500 ลบ.
☐ ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล	..... ครั้ง	

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขนสิ่งปฏิกูล/กำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน.....
จากผู้ใช้บริการในปริมาณที่ระบุไว้ข้างต้นจริง และได้ดำเนินการ ขนสิ่งปฏิกูล/กำจัดสิ่งปฏิกูล ตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว

ลงชื่อ สมชาย มั่นคง ผู้ขนสิ่งปฏิกูล

(.....)

ลงชื่อ วิชัย พงษ์ดี ผู้กำจัดสิ่งปฏิกูล

(.....)

หมายเหตุ : เอกสารต้นฉบับส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป

[redacted]

[redacted]

ภาคผนวก ข-15

เอกสารประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้างานก่อสร้างให้กับหน่วยงาน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
เลขรับที่ 2298
วันที่ 27 / ก.ย. / 67
12.00

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 098/2567

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯมายังท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เลาหวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 098/2567

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯมายังท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เลาหวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

23 ก.ย. 67

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 098/2567

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯมายังท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เลาหวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

(นางสาวขญาณ์นันท์ จับทร์วุธียี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
27 ก.ย. 2567

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณเดร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 098/2567

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯมายังท่านเพื่อให้ท่านได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เลาหวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

รับที่
27 ก.ย. 2567

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 098/2567

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการฯมายังท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เลาหวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

รับโดยตรง
27/ก.ย./2567

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นางสาวภควดี โพธิผล เบอร์โทร 06 3196 0248 อีเมล์ pakawadee@kslgroup.com

ภาคผนวก ข-16

เอกสารประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร



ที่ ตช. ๐๐๑๗.(๑๐)(๑๒)/๓๔๗๖

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามหนังสือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ วน. ๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็คทรอนิคส์) บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราความเรียบร้อย ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถป้องปรามเหตุอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกจราจรได้ นั้น

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์) ณ บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


พันตำรวจเอก

(พิพัฒน์ เต็งถาวร)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร

งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
โทร. ๐-๓๗๒๖-๑๕๐๗-๘
โทรสาร. ๐-๓๗๒๖-๑๔๙๙

8/11/66

การติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)

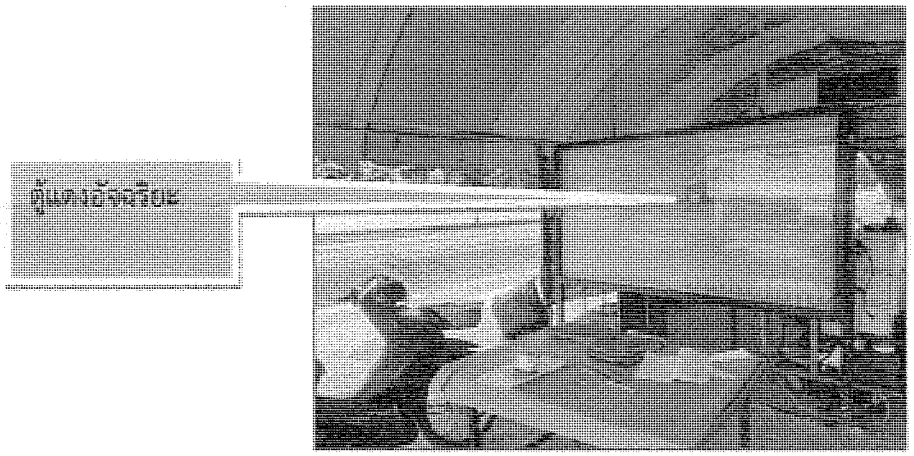



ภาคผนวก ข-17

หนังสือแจ้งการจัดทำบันทึกทำความตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูล



ที่ สก ๖๑๐๐๓/๒๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร
ถนนวัฒนานคร-คลองหาด สก ๒๗๑๖๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การอนุเคราะห์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยทั่วไป

เรียน ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

อ้างถึง หนังสือ อบต.ผักขะ ที่ สก ๗๔๙๐๑/๑๙๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ๑ ฉบับ
๒. วิธีคิดคำนวนการเกิดขยะต่อวัน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลวัฒนานครดำเนินการบริหารจัดการปฏิกูลและขยะทั่วไป ให้กับทางบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ยังไม่มีรถบรรทุกขยะ และยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลวัฒนานครยินดีให้บริการในการจัดเก็บขยะดังกล่าว ในส่วนของขยะทั่วไป บริเวณ โรงงานผลิตน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล และบริเวณบ้านพัก โดยกำหนดเวลาในการจัดเก็บ ในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บเริ่มต้นใน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะในอัตรา ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือนที่มีปริมาณวันเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ๒,๐๐๐ บาท) โดยสามารถชำระครั้งแรกสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีรายละเอียด วิธีคำนวน และอัตราค่าธรรมเนียมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมอบหมายให้ นายธนากร ประพฤติธรรม ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๑๐๕๐๔๔๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสงประทีป เทียนทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๒๑

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวัฒนานคร
เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่	รายการ	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)	หมายเหตุ
๑	อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐(๔)		
๑.๑	ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ		
	เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตร	๒๕๐	
	เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร	๑๕๐	
	เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร		
๑.๒	ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป		
	(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน		
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร	๒๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร	๔๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร	๖๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร	๘๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร	๑๐๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร	๒๐๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร	๓๐๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร	๔๐๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร	๕๐๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร	๑,๐๐๐	
	- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร	๒,๐๐๐	
	(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว		
	- ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๐	
	- ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ	๑๕๐	

<u>วิธีคิดคำนวนการเกิดขยะต่อวัน</u>

สูตร ปริมาตร(ลบ.ม.) = น้ำหนัก(กก.)/ความหนาแน่น(กก./ลบ.ม.)

; อัตราการเกิดขยะ ๑.๑๘ กก./คน/วัน
; ความหนาแน่น ๕๐๐ กก./ลบ.ม.
; จำนวนประชากร ๖๐๐ คน

ดังนั้น จะมีขยะเกิดขึ้น = ๖๐๐ x ๑.๑๘ = ๗๐๘ กก./วัน

ปริมาตร(ลบ.ม.) = ๗๐๘ (กก./วัน)/๕๐๐ (กก./ลบ.ม.)

= ๑.๔๑๖ ลบ.ม./วัน

ภาคผนวก ข-18

แผนงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

โครงการ : ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		พ.	พ.	ศ.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อ.	จ.	อ.	จ.	ส.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อ.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อ.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อ.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อ.	จ.	
1	**การบริหารงานด้านความปลอดภัย**																																								
	1.1 ประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์																																								
	1.2 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (คปอ.)																																								
	1.3 การสวมสวน / พานทางป้องกันอุบัติจากการทำงาน																																								กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
2	**การอบรม / ให้ความรู้**																																								
	2.1 อบรมพนักงานใหม่																																								เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา
	2.2 ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (JSA)																																								มีอัตราและโอน.เกิดอุบัติจากการทำงาน
3	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน**																																								
	3.1 การตรวจสอบแบบฟอร์มเช็คลิสต์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน																																								
	3.2 ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของผู้ปฏิบัติงาน																																								
	3.3 ตรวจสอบการทำงานบนที่สูง																																								ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
	3.4 ตรวจสอบการทำงานที่อาจให้เกิดประกายไฟ																																								ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
4	**การตรวจสอบเครื่องมือ,อุปกรณ์ไฟฟ้า**																																								
	4.1 ตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า																																								
	4.2 ตรวจสอบสภาพสายไฟย่อย																																								
5	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย**																																								
	5.1 ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประจำโครงการ																																								
	5.2 ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บสารเคมี (ไวไฟ) Workshop (สโตร์โครงการ)																																								
6	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานยก**																																								
	6.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ช่วยยก																																								ตรวจสอบสลิง,สลิงห้าใย
	6.2 ตรวจสอบสภาพ Crane																																								ตรวจสอบสภาพวงสลิง
7	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานบนที่สูง**																																								
	7.1 ตรวจสอบสภาพโครงค้ำ																																								
	7.2 ตรวจสอบราวกันตก (Hand Rail)																																								
	7.3 ตรวจสอบตาข่าย (อุปกรณ์ป้องกันตก)																																								
8	**กิจกรรมด้านความปลอดภัย**																																								
	8.1 Safety talk																																								
	8.2 Safety patrol/Safty Audit																																								
	8.3 ตู้แดงรวง และซ่อมแซมสลิง																																								
	8.4 กิจกรรม 5 ส.																																								
	8.5 ประชาสัมพันธ์,ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน																																								

*** หมายเหตุ แผนงานการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(นายธนะพัฒน์ เลิศชีรานันท์)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
วันที่ 1 ก.ค. 67

(นาย)
ผู้จัดการโครงการ
วันที่ 1 ก.ค. 67

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

โครงการ : ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	19	30	หมายเหตุ
		พ.	ศ.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อ	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	
1	**การบริหารงานด้านความปลอดภัย**																																							
	1.1 ประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์					—								—							—							—							—					
	1.2 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (คปอ.)																								—															
	1.3 การตรวจตรา / หาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
2	**การอบรม/ให้ความรู้**																																							
	2.1 อบรมพนักงานใหม่	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา
	2.2 ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (JSA)	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		มีลักษณะใหม่เกิดอุบัติจากการทำงาน
3	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน**																																							
	3.1 การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยในการทำงาน	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	3.2 ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของผู้ปฏิบัติงาน	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	3.3 ตรวจสอบการทำงานบนที่สูง	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
	3.4 ตรวจสอบการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
4	**การตรวจสอบเครื่องมือ,อุปกรณ์ไฟฟ้า**																																							
	4.1 ตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	4.2 ตรวจสอบสภาพตู้จ่ายไฟย่อย	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
5	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย**																																							
	5.1 ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประจำโครงการ	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	5.2 ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บสารเคมี (น้ำมัน) Workshop (ช่างโครงการ)	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
6	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานยก**																																							
	6.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ช่วยยก	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		ตรวจสอบสลิง,หลังม้าไม้
	6.2 ตรวจสอบสภาพ Crane	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		ตรวจสอบมาตราลวดสลิง
7	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานบนที่สูง**																																							
	7.1 ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	7.2 ตรวจสอบราวกันตก (Hand Rail)	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	7.3 ตรวจสอบสภาพ (อุปกรณ์ป้องกันตก)	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
8	**กิจกรรมด้านความปลอดภัย**																																							
	8.1 Safety talk	—			—				—			—				—				—				—			—				—			—				—		
	8.2 Safety patrol/Safty Audit	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	8.3 สุ่มตรวจ แอลกอฮอล์และสารเสพติด		—							—							—								—						—							—		
	8.4 กิจกรรม 5 ส.	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		
	8.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—		

*** หมายเหตุ แผนงานการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(นายธนะพัฒน์ เกิดจิราพันธ์)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
วันที่ 1/มิ.ย./67

(นาย.....)
ผู้จัดการโครงการ
วันที่ 1/มิ.ย./67

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / Occupational Health Safety and Environment Master Plan

PROJECT SAFETY MANUAL

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ Action	Jan-27 weeks 1 2 3 4	Feb-27 weeks 1 2 3 4	Mar-27 weeks 1 2 3 4	Apr-27 weeks 1 2 3 4	May-27 weeks 1 2 3 4	Jun-27 weeks 1 2 3 4	Jul-27 weeks 1 2 3 4	Aug-27 weeks 1 2 3 4	Sep-27 weeks 1 2 3 4	Oct-27 weeks 1 2 3 4	Nov-27 weeks 1 2 3 4	Dec-27 weeks 1 2 3 4	หมายเหตุ Remark
1	ขั้นตอนการโครงการก่อสร้าง Prepares the project builds														
1.1	จัดประชุมทีมงานเพื่อจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในงานโครงการ และผลการเปลี่ยนไขของลูกจ้าง	PLAN ACTUAL													All Staff
1.2	ชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างให้บริษัทผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในโครงการทราบ	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
1.3	ประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับงานทราบ	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
1.4	บริษัทฯ ผู้รับเหมาที่ได้รับงาน จัดทำหนังโครงสร้างองค์กรของโครงการที่ได้รับ	PLAN ACTUAL													Subcontractor
1.5	บริษัทฯ ผู้รับเหมาแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับการชี้แจงมาตรการความปลอดภัย	PLAN ACTUAL													Subcontractor
1.6	การจำแนกอันตรายจุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาควบคุม	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
1.7	การประเมินความเสี่ยงในลักษณะงานก่อสร้างและมาตรการการควบคุมการป้องกัน	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
2	แผนการฝึกอบรม HSE Training														
2.1	ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงานใหม่ General safety for new staff	PLAN ACTUAL													All Staff
2.2	การปฏิบัติงานกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย Safe crane operation	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.3	การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน Safety awareness in working	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
2.4	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety in Electrical work	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.5	ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อมไฟฟ้า Safety in electrical welding	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.6	ความปลอดภัยในการทำงานตัดแก๊ส Safety in gas cutting	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.7	การปฏิบัติงานบนที่สูง Working at height and Prevention of falling & dropping	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.8	ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ Confinde Space work														
3	การตรวจสอบความปลอดภัย Safety inspection														
3.1	การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในการทำงาน Workplace environmental monitoring	PLAN ACTUAL													Once a month
3.2	การตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้างาน Safety inspection by supervisor	PLAN ACTUAL													Everyday
3.3	การตรวจสอบความปลอดภัยประจำสัปดาห์ Weekly safety inspection	PLAN ACTUAL													Every week
3.4	การตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือน	PLAN													Once a month

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / Occupational Health Safety and Environment Master Plan

PROJECT SAFETY MANUAL

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ Action	Jan-27 weeks 1 2 3 4	Feb-27 weeks 1 2 3 4	Mar-27 weeks 1 2 3 4	Apr-27 weeks 1 2 3 4	May-27 weeks 1 2 3 4	Jun-27 weeks 1 2 3 4	Jul-27 weeks 1 2 3 4	Aug-27 weeks 1 2 3 4	Sep-27 weeks 1 2 3 4	Oct-27 weeks 1 2 3 4	Nov-27 weeks 1 2 3 4	Dec-27 weeks 1 2 3 4	หมายเหตุ/Remark
	Monthly safety inspection	ACTUAL													
3.5	การตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าในโครงการ	PLAN													By Electrical engineer
	Temporary distribution panel reinspection	ACTUAL													
3.6	การตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	PLAN													Before enter construction site
	Electrical hand tools and machine reinspection	ACTUAL													
3.7	การตรวจสอบอุปกรณ์ยกขน	PLAN													By safety officer
	Lifting equipment reinspection	ACTUAL													
3.8	การตรวจสอบนั่งร้าน	PLAN													By safety officer
	Scaffolding reinspection	ACTUAL													
3.9	การตรวจสอบเครื่องจักรกล	PLAN													By safety officer
	Machine reinspection	ACTUAL													
4	การจัดทำรายงาน และประชุมด้านความปลอดภัย														
	Safety report and safety meeting														
4.1	การประชุมผู้รับเหมาก่อนเข้าทำงาน	PLAN													Before sub. start work
	Kick off meeting	ACTUAL													
4.2	การประชุมรายสัปดาห์	PLAN													Every Thursday
	Weekly safety meeting	ACTUAL													
4.3	การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยของโครงการ	PLAN													Site safety committee
	Site safety committee meeting	ACTUAL													
4.4	รายงาน ซปว.	PLAN													By safety officer
	Safety village vocational report	ACTUAL													
4.5	รายงานผลงานโครงการด้านความปลอดภัย	PLAN													Site representative
	Safety action report	ACTUAL													
4.6	รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริหาร	PLAN													Once a month
	Monthly safety report	ACTUAL													
4.7	การสอบสวน และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ	ACTUAL													Site safety committee
	Accident investication report	REPORT													
4.8	อบรมดับเพลิงขั้นต้นและอบรมหนีไฟ	PLAN													
	Basic firefighting and fire evacuation training	ACTUAL													
5	กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย														
	Safety activity promotion														
5.1	จัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย	PLAN													
	Provide safety committee	ACTUAL													
5.2	จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน	PLAN													Once a month
	Monthly safety plan	ACTUAL													
5.3	การสนทนาด้านความปลอดภัย	PLAN													Everyday
	Safety tool box talk	ACTUAL													
5.4	ป้ายโครงการ,ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย	PLAN													
	Safety policy board , project board	ACTUAL													
5.5	บอร์ดสถิติด้านความปลอดภัย	PLAN													
	Safety statistic board	ACTUAL													
5.6	ติดตั้งบอร์ดข่าวสารด้านความปลอดภัยและโปสเตอร์	PLAN													
	Provide safety information board and poster	ACTUAL													

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / Occupational Health Safety and Environment Master Plan

PROJECT SAFETY MANUAL

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ Action	Jan-27 weeks 1 2 3 4	Feb-27 weeks 1 2 3 4	Mar-27 weeks 1 2 3 4	Apr-27 weeks 1 2 3 4	May-27 weeks 1 2 3 4	Jun-27 weeks 1 2 3 4	Jul-27 weeks 1 2 3 4	Aug-27 weeks 1 2 3 4	Sep-27 weeks 1 2 3 4	Oct-27 weeks 1 2 3 4	Nov-27 weeks 1 2 3 4	Dec-27 weeks 1 2 3 4	หมายเหตุ/Remark
5.7	โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เป้าหมาย 365 วัน Zero accident project target 365 days	PLAN ACTUAL													
6	การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน Preparation for the state of emergency														
6.1	จัดทำแผนฉุกเฉิน Provide emergency plan	PLAN ACTUAL													
6.2	จัดทำป้ายจุดรวมพล Provide assembly point	PLAN ACTUAL													
6.3	ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี Install fire extinguisher	PLAN ACTUAL													
6.4	ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีตามชุดต่างๆ Fire extinguisher inspection	PLAN ACTUAL													Once a month
6.5	จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน Provide emergency telephone	PLAN ACTUAL													
6.6	ตรวจความปลอดภัยพื้นที่แต่ละพื้นที่และประชุม Safety Patrol and Safety Audit	PLAN ACTUAL													Every Week
7	โครงการส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม Encourage sanitation and environment promotion														
7.1	การจัดเก็บบ้าน ความสะอาด Housekeeping	PLAN ACTUAL													Every Week
7.2	จัดให้มีตู้ยา ปฐมพยาบาล Provide first aid kid	PLAN ACTUAL													
7.3	จัดให้มีเปลสนาม-รถพยาบาล Provide field translation	PLAN ACTUAL													
7.4	จัดให้มีที่พักสูบบุหรี่ Provide smoking area	PLAN ACTUAL													

สัญลักษณ์ :
แผนงาน/Plan
การปฏิบัติ/Actual

เสนอโดย/Present by : .....
(ธนะพัฒน์ เลิศจีรานันท์)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)/Safety Manager

อนุมัติ/Approved by : .....
( )
ผู้จัดการโครงการ/Project Manager

ภาคผนวก ข-19

เอกสารการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ



จป.ระดับวิชาชีพ จำนวน 9 คน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	เลข กสร.	จป.ระดับ
1	นางสาวปัญจพร สมสา	บ.KSL	05-227-2567-000005	จป.วิชาชีพ
2	นางสาวชุติมา บัวดอก	บ.KSL	05-227-2567-000006	จป.วิชาชีพ
3	นางสาวจุฑามาศ เทือกภูเขียว	บ.KSL	05-227-2567-000016	จป.วิชาชีพ
4	น.ส.สิริวรรณ น้อยอ่อน	บ.SK Power	05-227-2566-000014	จป.วิชาชีพ
5	น.ส.ปวิตรา โพธิ์นอก	บ.TANITA	05-227-2566-000012	จป.วิชาชีพ
6	น.ส.วายาพร จบกมล	บ.ก้องเกียรติ	05-227-2567-000003	จป.วิชาชีพ
7	นางสาวสุดารัตน์ ถนอมศักดิ์	บ.KLIM	05-227-2567-000002	จป.วิชาชีพ
8	นายธนะพัฒน์ เลิศจิรานันทน์	บ.KLIM	05-227-2567-000011	จป.วิชาชีพ
9	น.ส.นพมาศ บทศรี	บ.ดีมายเออร์	-	จป.วิชาชีพ

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ

จป.ระดับเทคนิค จำนวน 6 คน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	เลข กสร.	จป.ระดับ
1	นายนิรันดร์ บุตรด้วง	บ.KLIM	03-227-2566-000001	จป.เทคนิค
2	นางสมวงค์ ศรีพุทธา	บ.KLIM	03-227-2566-000002	จป.เทคนิค
3	นางอริสา ปราบพาล	บ.KLIM	03-227-2567-000013	จป.เทคนิค
4	นางสาวอารีลักษณ์ ยาประดิษฐ์	บ.KLIM	03-227-2567-000007	จป.เทคนิค
5	นายกฤษฎา ศรีพุทธา	บ.KLIM	03-227-2567-000012	จป.เทคนิค
6	นางสาวญาสุมินทร์ จันทจร	บ.KLIM	03-227-2567-000015	จป.เทคนิค

จป.ระดับบริหาร จำนวน 1 คน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	เลข กสร.	จป.ระดับ
1	นายกรกฤต วิศวธนพงษ์	บ.ฟุกเฮงหลง	02-227-2566-000028	จป.ระดับบริหาร

จป.ระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 คน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	เลข กสร.	จป.ระดับ
1	นายนัฐวุฒิ สมยา	บ.ฟุกเฮงหลง	01-227-2566-000101	จป.ระดับหัวหน้างาน

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ



ที่ สก ๐๐๓๐/๐๔๐๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ รง.จป.๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๒ คน

๑. นางสาวปัญจพร สมสา ทะเบียนเลขที่ ๐๕-๒๒๗-๒๕๖๗-๐๐๐๐๐๕
๒. นางสาวชุติมา บัวดอก ทะเบียนเลขที่ ๐๕-๒๒๗-๒๕๖๗-๐๐๐๐๐๖

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลอ อ่วมทอง)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ

KUM (THAILAND)

ที่ สก ๐๐๓๐/๑๔๔๐

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ บริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการก่อสร้างบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวัฒนานคร) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค จำนวน ๑ คน

๑. นายนิรันดร์ บุตรด้วง ทะเบียนเลขที่ ๐๓-๒๒๗-๒๕๖๖-๐๐๐๐๐๑

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ อินยา)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ

TANITA
FABRICATION CO., LTD.

ที่ สก ๐๐๓๐/๑๓๗๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด

ตามที่ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

๑. นางสาวปวิตรา โพธิ์นอก ทะเบียนเลขที่ ๐๕-๒๒๗-๒๕๖๖-๐๐๐๐๑๒

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ อินยา)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ





ที่ สก ๐๐๓๐/๐๑๒๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ บริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด ก่อสร้าง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

๑. นางสาววายาพร จบกมล ทะเบียนเลขที่ ๐๕-๒๒๗-๒๕๖๗-๐๐๐๐๐๓

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ อินยา)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ



ที่ สก ๐๐๓๐/๑๒๙๕

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

๑. นางสาวสิริวรรณ น้อยอ่อน ทะเบียนเลขที่ ๐๕-๒๒๗-๒๕๖๖-๐๐๐๐๑๔

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปราณี มานะบัง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD

ที่ สก ๐๐๓๐/๑๖๘๙

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่ บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โครงการก่อสร้าง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน ๑ คน

๑. นายนัฐวุฒิ สมยา ทะเบียนเลขที่ ๐๑-๒๒๗-๒๕๖๖-๐๐๐๑๐๑

ระดับบริหาร จำนวน ๑ คน

๑. นายกรกฤต วิศวธนพงษ์ ทะเบียนเลขที่ ๐๒-๒๒๗-๒๕๖๖-๐๐๐๐๒๘

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ อินยา)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD

ที่ สก ๐๐๓๐/ ๐๘๒๐

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามที่ บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อสร้างบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค จำนวน ๑ คน

๑. นายพูลศักดิ์ สมานทอง ทะเบียนเลขที่ ๐๓-๒๒๗-๒๕๖๗-๐๐๐๐๐๙

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลอ อวิมทอง)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

ภาคผนวก ข-20

เอกสารผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

แบบ น. ๒

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

วันที่....๑๖.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๖...

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายนพดล ปิยะทัต.....อายุ....๗๔.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....

เลขประจำตัวประชาชน.....๓ ๕๒๙๙ ๐๐๑๗๓ ๙๙ ๖.....อยู่บ้านเลขที่....๓๑๗/๑๙๒....ตรอก/ซอย.....-.....

ถนน.....หมู่ที่.....๑๓....ตำบล/แขวง.....ท่าสาย.....อำเภอ/เขต.....เมืองเชียงราย.....จังหวัด.....เชียงราย.....

รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์.....-.....สถานที่ทำงาน.....-.....โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท....สถาปัตยกรรมควบคุม.....สาขา...สถาปัตยกรรมหลัก.....แขนง.....ระดับ.....สามัญสถาปนิก.....

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ส-สถ ๖๙๖.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม ☐ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร

☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด..คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด....๒๔x๘๔ m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น....อาคารเทอร์ไบน์...

(๒) ชนิด....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๖๐x๑๑๗ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย.....

(๓) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๓๖x๙๗ m .....จำนวน.....๒.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ.....

(๔) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด.....๑๒x๓๐..... m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคาร MCC.....

(๕) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด.....๗x๑๐..... m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....

โดยมี.....บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....

อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร.....จังหวัด....สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ก. ☐ อื่นๆ ..... เลขที่

.....๑๒๖๓,๑๒๖๔,๑๒๖๐,๕๑๐๑,๕๑๐๒,๕๑๐๓,๕๑๓๒.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด....

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมาพร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... วิศวกร/สถาปนิก
(นายพนดล ปิยะทัต)

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต/ผู้แจ้ง
(.....)ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ น. ๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

วันที่....๑๖...เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายนพดล ปิยะทัต.....อายุ.....๗๔.....ปี สัญชาติ.....ไทย....เลขประจำตัวประชาชน.....๓ ๕๒๙๙ ๐๐๑๗๓ ๙๙ ๖.....อยู่บ้านเลขที่....๓๑๗/๑๙๒..... ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....หมู่ที่.....๑๓.....ตำบล/แขวง.....ท่าสาย..... อำเภอ/เขต....เมืองเชียงราย.....จังหวัด.....เชียงราย.....รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์..... ทำงานที่.....โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท.สถาปัตยกรรมควบคุม..สาขา..สถาปัตยกรรมหลัก..แขนง.....ระดับ.....สามัญสถาปนิก..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน....ส-สถ ๖๙๖.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ. .....เลขที่...../..... ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

☐ ใบอนุญาตตามแบบ อ .....เลขที่...../.....ลงวันที่..... เดือน.....พ.ศ. ..... แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว

เพื่อทำการ.....ควบคุมงาน.....ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย..... ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร..... จังหวัด.....สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....เป็นอาคาร

(๑) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑.... หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารเทอร์ไบน์.,..... พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒๐๑๖.๐๐ ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๒) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑..หลัง...เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย..., พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐๒๐.๐๐ ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๒...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ..... พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๔๙๒.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๔) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารMCC.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๖๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๕) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
.....ขณะนี้ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ.....
.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขออนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....๑๖.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....๒๕๖๖.....
จนกว่าจะทำการ.....ก่อสร้าง.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(.....นายนพดล ปิยะทัต.....)

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต/
ผู้ได้รับอนุญาต
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

สภาสถาปนิก
12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02 318 2112 โทรสาร 02 318 2131-2

หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
เลขที่ 66-46555-03 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ สภาสถาปนิกขอรับรองว่าผู้มีชื่อตามหนังสือฉบับนี้ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และ ณ วันที่ออกหนังสือนี้ ไม่ถูกพักใช้หรือไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รับผิดชอบในชนิดงาน:	ออกแบบ, บริหารและอำนวยการก่อสร้าง (ควบคุมงาน)
จะทำการ:	ก่อสร้าง
ใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ:	ข.1 - ข.7

ผู้ได้รับอนุญาต	เลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก	เลขประจำตัวประชาชน
นาย นพดล ปิยะหัต	**000896**	**3529900173996**
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	เลขที่ใบอนุญาต	ประเภท
สาขา	**ส-สถ 696**	**-**
สถาปัตยกรรมหลัก	ระดับ	วันหมดอายุ
	สามัญสถาปนิก	**30 กรกฎาคม 2570**

ขอบเขตงานที่ได้รับอนุญาต

สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้สำหรับอาคารโดยไม่จำกัดความสูงและพื้นที่ของอาคาร ยกเว้นชนิดงานให้คำปรึกษา

ข้อมูลโครงการ

ที่บ้านเลขที่ 999 ถนน สุวรรณศร หมู่ที่ 4ตำบล/แขวง ผักขะ อำเภอ/เขต วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160
โดย บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำดาล ขอนแก่น จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 1263,1264,1260,5101,5102,5103,5132 เป็นที่ดินของ บริษัท น้ำดาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

รายละเอียดอาคาร

ลำดับ	ชนิดอาคาร	จำนวนชั้นบนดิน (ชั้น)	จำนวนชั้นใต้ดิน (ชั้น)	จำนวน (หลัง)	เพื่อใช้เป็น
1	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารเทอร์ไบน์
2	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารเก็บกากอ้อย
3	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารหม้อไอน้ำ
4	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารMCC
5	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารห้องน้ำ



เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายน้ำดราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิก
หนังสือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เท่านั้น
ผู้รับหนังสือรับรองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง โดย scan QR code ด้านบน

รายละเอียดอาคาร

ลำดับ	ชนิดอาคาร	จำนวนชั้นบนดิน (ชั้น)	จำนวนชั้นใต้ดิน (ชั้น)	จำนวน (หลัง)	เพื่อใช้เป็น
6	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	ลานกองขี้เถ้าและปอดกตะกอน
7	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	ม่านกันฝุ่นขี้เถ้า
8	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อรับน้ำทิ้ง/น้ำโบดาวน์
9	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
10	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด
11	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน
12	ค.ส.ล.	1	0	1	อาคารเก็บของเสีย
13	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	สะพานกากอ้อย
14	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	ถังเก็บน้ำร้อน



เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายน้ำดราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิก
หนังสือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เท่านั้น
ผู้รับหนังสือรับรองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง โดย scan QR code ด้านบน

ใช้สำหรับรับรองการออ

ด้านสถาปั

1.อาคารเทอร์ไบน

2.อาคารเก็บกากออย จำนวน 1 หลัง

3.อาคารหม้อไอน้ำ จำนวน 2 หลัง

4.อาคาร MCC จำนวน 1 หลัง

5.อาคารห้องน้ำ

ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ

ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนา

เท่านั้

แบบ น. ๒

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

วันที่....๑๓.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๖...

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายบวร มณีรัตน์.....อายุ..๖๓.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....

เลขประจำตัวประชาชน.....๓ ๕๗๐๑ ๐๑๓๗๓ ๘๔ ๘.....อยู่บ้านเลขที่....๒๖๓/๑๖....ตรอก/ซอย.....-.....

ถนน.....-.....หมู่ที่.....๙....ตำบล/แขวง....รอบเวียง.....อำเภอ/เขต...เมืองเชียงราย...จังหวัด.....เชียงราย.....

รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์.....-.....สถานที่ทำงาน.....-.....โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท....วิศวกรรมกรรมควบคุม.....สาขา...โยธา.....แขนง.....ระดับ.....สามัญวิศวกร.....

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....สย. ๗๔๒๙.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม ☐ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร

☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด..คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด....๒๔x๘๔ m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น....อาคารเทอร์ไบน์.....

(๒) ชนิด....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๖๐x๑๑๗ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย.....

(๓) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๓๖x๙๗ m .....จำนวน.....๒.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ.....

(๔) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๑๒x๓๐ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคาร MCC.....

(๕) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด....๗x๑๐ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....

โดยมี.....บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....

อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร.....จังหวัด...สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ก. ☐ อื่นๆ ..... เลขที่


.....๑๒๖๓,๑๒๖๔,๑๒๖๐,๕๑๐๑,๕๑๐๒,๕๑๐๓,๕๑๓๒.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด....

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมาพร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

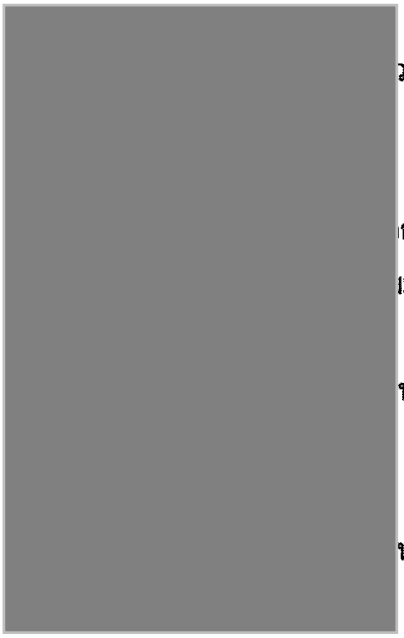

วกร/สถาปนิก

อนุญาต/ผู้แจ้ง

มาตรา ๓๙ ทวิ

น

น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ น. ๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

วันที่....๑๓...เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ..๒๕๖๖.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายบวร มณีรัตน์.....อายุ.....๖๓.....ปี สัญชาติ.....ไทย....เลขประจำตัวประชาชน.....๓ ๕๗๐๑ ๐๑๓๗๓ ๘๔ ๘.....อยู่บ้านเลขที่....๒๖๓/๑๖..... ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....หมู่ที่.....๙.....ตำบล/แขวง.....รอบเวียง..... อำเภอ/เขต....เมืองเชียงราย.....จังหวัด.....เชียงราย.....รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์..... ทำงานที่.....โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท.วิศวกรรมควบคุม..สาขา.....โยธา.....แขนง.....ระดับ.....สามัญวิศวกร..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน....สย. ๗๔๒๙.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ. .....เลขที่...../..... ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

☐ ใบอนุญาตตามแบบ อ .....เลขที่...../.....ลงวันที่..... เดือน.....พ.ศ. ..... แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว

เพื่อทำการ.....ควบคุมงาน.....ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย..... ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร..... จังหวัด.....สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....เป็นอาคาร

(๑) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑.... หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารเทอร์ไบน์..... พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒๐๑๖.๐๐ ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน..... คัน

(๒) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑..หลัง...เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย.... พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐๒๐.๐๐ ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๒...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ..... พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๔๙๒.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๔) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารMCC..... พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๖๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๕) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน
และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
.....ขณะนี้ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ.....
.....
.....
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขออนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....๑๓.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....๒๕๖๖.....
จนกว่าจะทำการ.....ก่อสร้าง.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ[redacted]วบคุมงาน
(
ลงชื่อ[redacted]ออนุญาต/
ได้รับอนุญาต
ลงชื่อ[redacted]าน
(
ลงชื่อ[redacted]าน
(

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความต้องการ

๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕, ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗
www.coe.or.th

ที่ D-COE๒๕๔๐๒๕/๒๕๖๖

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายบวร มณีรัตน์ เลขทะเบียนใบอนุญาต สย.๗๔๒๙ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉบับปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขณะนี้ไม่ได้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.1 - ข.7

ประเภทงาน	งานออกแบบและคำนวณ และ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
งานที่รับผิดชอบ	ก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างชนิด	อาคารโครงสร้าง คสล.และ โครงสร้างเหล็ก 1-4 ชั้น
เจ้าของ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

บวร

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate

สภาวิศวกร COUNCIL OF ENGINEERS

โดยสามารถตรวจสอบด้วยเลข Ref No. ผ่านเว็บไซต์ www.coe.or.th หรือตรวจสอบผ่าน QR CODE

ออกให้ ณ วันที่ 2023-06-13 14:01:23
Ref : 664075489

ใช้สำ [redacted]

1.อาคารเทอร์ไบน์ จำนวน 1 หลัง

2.อาคารเก็บกากอ้อย จำนวน 1 หลัง

3.อาคารหม้อไอน้ำ จำนวน 2 หลัง

4.อาคา [redacted]

5.อาคา

ของบ

ตำบลผั

เท่านน

บ๑๔

ภาคผนวก ข-21

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน/ กฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมคนงาน

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

เรื่อง กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการก่อสร้างฯ

.....

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโครงการก่อสร้างฯ รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอประกาศกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. พนักงานทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเริ่มงาน

2. ผู้รับเหมาช่วง ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยแยกตามจำนวนพนักงานดังนี้

1) ตั้งแต่ 1 คน ถึง 19 คน จป.หัวหน้างาน

2) ตั้งแต่ 20 คน ถึง 49 คน จป.เทคนิค

3) ตั้งแต่ 50 คน ถึง 99 คน จป.เทคนิคขั้นสูง

4) ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จป.วิชาชีพ

และหากเป็นลักษณะงานดังต่อไปนี้ งานที่บนที่สูง, งานที่อับอากาศ, งานไฟฟ้าแรงสูง, งานเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, งานยกติดตั้งเครื่องจักรชิ้นงานขนาดใหญ่ และให้รวมไปถึงงานอื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อพนักงานและทรัพย์สิน ต้องจัดให้มี จป.วิชาชีพ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงการเป็น จป. ระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบฉบับนี้กำหนด กับทางบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มปฏิบัติงานภายในโครงการ

3. พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ตามกฎข้อบังคับ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา หน้ากากกันสะเก็ด รองเท้าหุ้มส้น รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย อื่นๆ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

4. ห้ามพนักงานผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และแรงงานที่ผิดกฎหมาย เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ

5. พนักงานทุกคน ที่เข้ามาปฏิบัติงาน ต้องมีสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิประกันชีวิต

6. พนักงาน ต้องติดบัตรประจำตัวให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

7. พนักงานทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดพนักงานก่อสร้างของบริษัท ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในโครงการ

8. พนักงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ต้องผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเป็นวิศวกร มีเอกสาร กว.ไฟฟ้า เท่านั้น

9. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ อย่างเคร่งครัด

10. ห้ามพนักงาน ทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

11. ห้ามพนักงานหยอกล้อเล่นกัน หรือทะเลาะวิวาทในขณะที่ปฏิบัติงาน

12. พนักงานต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้งาน และทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเลิกงานทุกวัน

13. ห้ามพนักงานนำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่โรงงาน

14. ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ขณะที่ปฏิบัติงาน และอนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

15. อุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน โดยจะทำการตรวจสอบซ้ำทุก 1 เดือน

16. ชุดตัดแก๊สที่นำเขามาปฏิบัติงานภายในโครงการต้องมีรถเข็น พร้อมทำการผูกยึดป้องกันถังล้ม ตลอดเวลา และต้องจัดให้มีวาล์วกันย้อน ทั้งที่หัวตัด และที่วาล์วจำนวน 4 จุด

17. อุปกรณ์ที่มีการ์ดป้องกันที่นำเข้ามาภายในโครงการ ห้ามไม่ให้ถอดการ์ดป้องกันออกขณะที่ปฏิบัติงาน

18. นั่งร้านที่นำเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และในการติดการตั้งนั่งร้านเพื่อใช้งานต้องติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านให้ครบถ้วน มีบันไดทางขึ้นลง มีราวกั้นกันตก มีการค้ำยัน โดยตั้งนั่งร้านอย่างมั่นคงแข็งแรง และก่อนใช้งานนั้งร้านต้องได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน เท่านั้น

19. เครนและอุปกรณ์ช่วยยกต้องมีสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีเอกสารในการตรวจสอบเครน (ปจ.2) และเอกสารผ่านการอบรมของคนขับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกยึด ผู้ควบคุม และห้ามไม่ให้ยกเกินน้ำหนักพิกัดยกที่สามารถยกได้ของเครนเด็ดขาด

20. การปฏิบัติงานบนที่สูง ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบคาดเอว และให้สวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

21. งานติดตั้งหลังคาอาคารต้องจัดให้มีการติดตั้งตาข่ายกันตก และเชือกช่วยชีวิต สำหรับให้พนักงานคล้องเกี่ยวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคลมชักลมบ้าหมู โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

22. การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องทำการป้องกันสะเก็ดไฟ และต้องจัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ถังต่อจุดปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

23. ห้ามพนักงาน นำหรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว ในบริเวณพื้นที่ทำงาน

24. พนักงาน ต้องทิ้งขยะตามสถานที่ที่กำหนดและจัดแยกขยะตามประเภทเพื่อง่ายต่อการจัดการ

25. ห้ามพนักงานทิ้งขยะ น้ำมัน หรือสารเคมี ทุกประเภท ลงในรางระบายน้ำ

26. เมื่อนำรถเข้าจอดในบริเวณโครงการ ให้จอดในพื้นที่ ที่กำหนดเท่านั้น และต้องทำการดับเครื่องทุกครั้ง

27. พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

28. ห้ามพนักงานเข้าภายในพื้นที่โครงการโดยพละการ ก่อนได้รับอนุญาต

29. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ และผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษ ต่อพนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ที่กระทำการฝ่าฝืนตามแต่กรณี

30. ห้ามพนักงานนำทรัพย์สินทุกชนิด ของบริษัทฯ และของผู้ว่าจ้างออกนอกโครงการ ก่อนได้รับอนุญาต

31. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในโครงการต้องรายงานให้ทางบริษัทฯ รับทราบโดยเร่งด่วน

32. ก่อนเริ่มงานพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน (Morning Talks) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย

33. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากขณะที่ปฏิบัติงานมีการประกาศกฎระเบียบหรือมาตราการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

34. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย (โดยรวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในกฎระเบียบนี้) พร้อมทั้งต้องควบคุมดูแลพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

ขอให้บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

นางสาวปัญจพร สมสา จป.วิชาชีพ ประจำโครงการ
ติดต่อประสานงานโทร 095-6157498

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

ตารางรายละเอียดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานและการเปรียบเทียบปรับ







ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงินค่าปรับ(บาท)
1	ผู้รับจ้างและ ผู้ควบคุมงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาดำเนินการ ในโครงการแล้ว ต้องเข้ารับการ ชี้แจง และ อบรม เรื่องความปลอดภัยจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	10,000 - 20,000
2	ห้ามสูบบุหรี่ในโรงงาน เว้นแต่จะสูบในที่ที่บริษัทฯ กำหนดให้สูบได้เท่านั้น	10,000 - 20,000
3	อุปกรณ์ที่เป็นถังบรรจุความดัน เช่น ถังลม ถังแก๊ส ห้ามวางนอนกับพื้น และต้องมีการยึดเพื่อป้องกันการล้มของถังด้วย	5,000 - 10,000
4	งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ หรือ วัสดุที่มีความร้อนสูงทั้งหมดต้องมีการป้องกันจากจุดที่ทำงานไปยังวัสดุติดไฟ เช่น การเชื่อม-ตัดในบริเวณที่มีกากอ้อย ต้องใช้กระสอบป่านชุบน้ำให้เปียกชุ่ม ปกคลุมพื้นที่ที่จะทำการเชื่อม เพื่อป้องกันการลุกไหม้จากสะเก็ดไฟ	20,000 - 40,000
5	ผู้รับจ้างต้องกำหนดเขตการจัดเก็บน้ำมัน สารไวไฟ และถังบรรจุความดันสูง โดยมีการแยกประเภทชัดเจน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดที่มีการจุดไฟหรือบริเวณที่มีประกายไฟและบริเวณที่มีสารไวไฟ	10,000 - 20,000
6	ห้ามเผาขยะ ก่อกองไฟ หุงต้ม หรือประกอบอาหารใด ๆ ในโรงงาน หรือนำอาหารไปรับประทาน หรือนอนในโรงงาน ยกเว้นสถานที่หรือบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาต	20,000 - 40,000
7	ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากตู้เชื่อมไฟฟ้า และ ปิดวาล์วถังแก๊ส ในช่วงเวลาที่ ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้งให้เก็บสายไฟ หัวตัดแก๊ส และ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย	5,000 - 20,000
8	ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือส่วนประกอบที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายตู้เชื่อม ที่มีฉนวนหุ้มเปื่อย หรือ ขาด	20,000 - 40,000
9	การประมาทเลินเล่อที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในสถานที่ทำงาน และ ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่า ค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินที่เสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่ากากอ้อย ค่าเครื่องจักร ฯลฯ บวกค่าปรับตั้งแต่ 10,000-1,000,000 บาท	ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าปรับ 10,000-1,000,000

หมายเหตุ: ตารางเปรียบเทียบปรับนี้มีแนบท้ายในสัญญาการจ้างงานผู้รับเหมาทุกราย






ภาคผนวก ข-22

บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้าง







รายงานผลการตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 13 กรกฎาคม 67

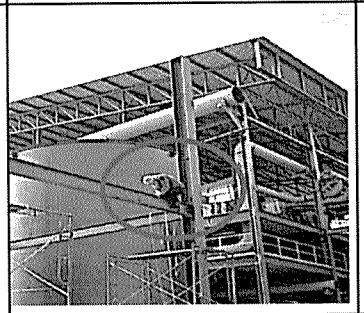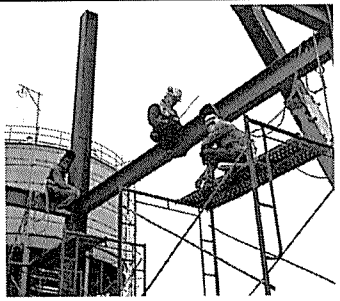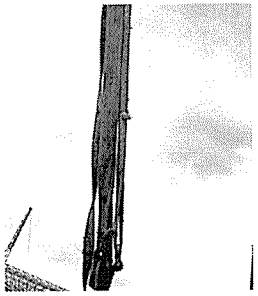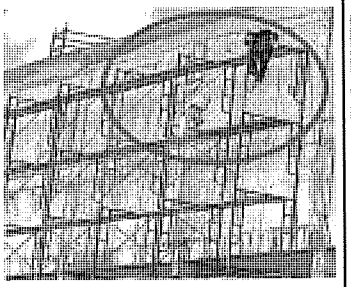ลำดับ	รายการข้อบกพร่อง	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังแก้ไข	แนวทางการก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการแก้ไข
1	การใช้งานเครื่องเจียร์ไม่สวมใส่การ์ดครอบ			แก้ไขให้ใส่การ์ดครอบเครื่องเจียร์ และการใช้งานทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งาน	API	แก้ไขเรียบร้อย
2	การทำงานบนที่สูงโดยไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย			ตักเตือนให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่สูง	บ.ก้องเกียรติ	แก้ไขเรียบร้อย
3	พบพนักงานใช้ผ้าใบยกชิ้นงานที่ชำรุด			ยกเลิกการใช้งาน และแก้ไขให้เปลี่ยนผ้าใบเส้นใหม่	TANITA	แก้ไขเรียบร้อย
4	พนักงานทำงานบนนั่งร้านไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย			ตักเตือนให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่สูง	TANITA	แก้ไขเรียบร้อย

รายงานผลการตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 9 กันยายน 67

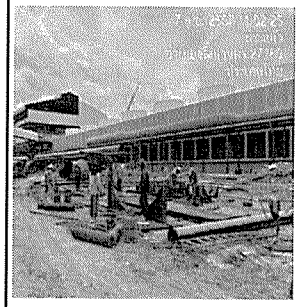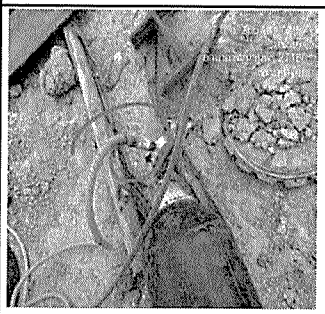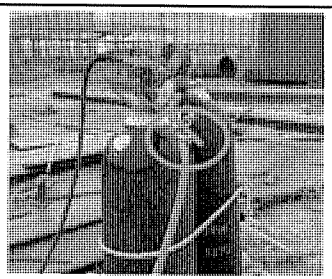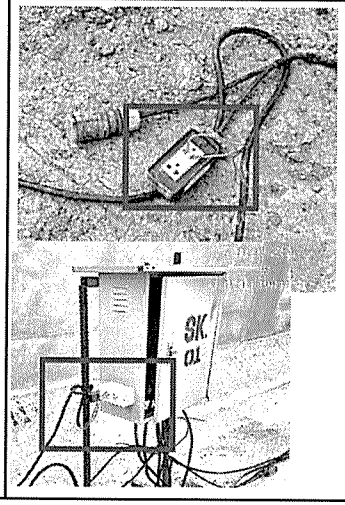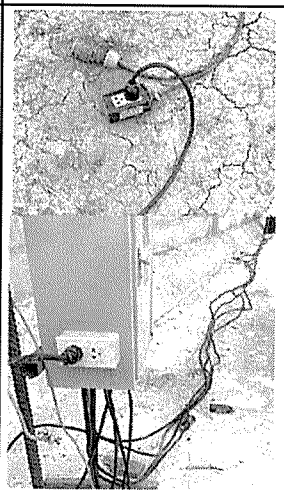ลำดับ	รายการข้อบกพร่อง	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังแก้ไข	แนวทางการก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการแก้ไข
1	พบการวางถังลมนอนไปพื้น			ตักเตือนห้ามวาถังลมนอนไปกับพื้น ให้วางตั้งขึ้นและให้มีเชือกผูกกันถังล้ม	TANITA	แก้ไขเรียบร้อย
2	สายเชื่อมไม่มีเข็มขัดรัดกันย้อน ใช้ลวดรัดแทนกันย้อน			แนะนำให้ใช้เข็มขัดรัดกันย้อน	TANITA	แก้ไขเรียบร้อย
3	สายไฟชำรุดไม่มีหัวปลั๊กไฟ			ให้แก้ไขให้ใช้สายไฟแบบมีหัวปลั๊ก ที่ได้มาตราฐาน	SK Power	แก้ไขเรียบร้อย

รายงานผลการตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 67

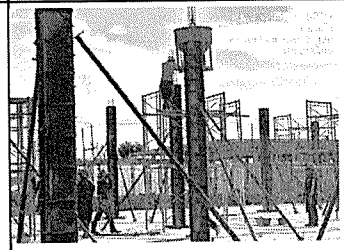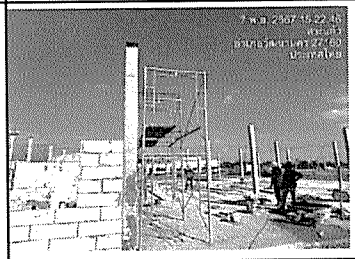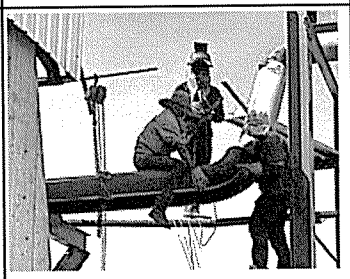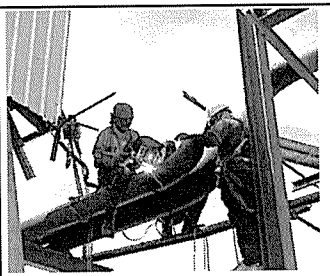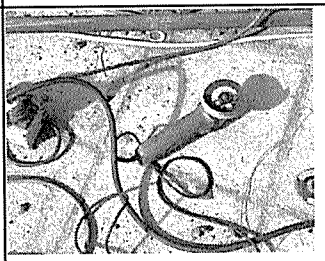ลำดับ	รายการข้อบกพร่อง	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังแก้ไข	แนวทางการก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการแก้ไข
1	พนักงานแต่งกายไม่ถูกกฎระเบียบ ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย			ตักเตือนและเน้นย้ำเรื่องการแต่งกายให้สวมใส่หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น	TW	แก้ไขเรียบร้อย
2	นั่งร้านไม่มีแผ่นพื้นยืน			แนะนำให้ใส่แผ่นพื้นนั่งร้านสำหรับยืนทำงาน	TW	แก้ไขเรียบร้อย
3	การทำงานบนที่สูงโดยไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย			ตักเตือนให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่สูง	CAK	แก้ไขเรียบร้อย
4	การใช้งานเครื่องเจียร์ไม่สวมใส่การ์ดครอบ			แก้ไขให้ใส่การ์ดครอบเครื่องเจียร์ และการใช้งานทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งาน	บ.ก้องเกียรติ	แก้ไขเรียบร้อย

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(นางสาวชุติมา บัวดอก)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ภาคผนวก ข-23

การอบรมคนงานก่อสร้าง

รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัท KLIM

ที่	บริษัท	ก.ค 67
1	บ.วินัย	3
2	บ.เอทีเอส	26
3	บ.โอแอนด์เจ	27
4	บ.บีเอสไอ	3
5	บ.สองสีสี	14
6	บ.พีเอสซี	64
7	บ.เจเคพี.888	19
8	บ..ภัทรพงษ์	3
9	บ.เอสพีเอส	25
10	บ.เควีอี	33
11	บ.เค-ลิม โค	7
12	บ.เสมานคร	1
13	บ.เสาศิลา	5
14	บ.เพาเวอร์คูล	12
15	บ.ธนัท	6
16	บ.เวิลด์ออโต้	11
17	บ.กฤษณะ	4
18	บ.ดี-ฟอร์ส	3
19	บ.เอ็มยูไอ	14
20	บ.เอ็มดับบิวเอ	3
21	บ.เอพีไอ	3
22	บ.อินเตอร์ฟรีไซร์	5
23	บ.ซีเกิลล์	6
24	บ.หนึ่งห้าสอง	10
25	บ.เอ็นจีเอส	2
26	บ.ฟรีเทค	6
27	บ.ช่างทิพย์	10
28	บ.มยุรี	4
รวม		329

ที่	บริษัท	ส.ค 67
1	บ.วินัย	1
2	บ.เอทีเอส	49
3	บ.โอแอนด์เจ	21
4	บ.ส.ทองยศ	22
5	บ.พีเอสซี	112
6	บ.เจเคพี.888	11
7	บ.พิมพิสาร	5
8	บ.เอสพีเอส	24
9	บ.เควีอี	16
10	บ.เค-ลิม โค	5
11	บ.เสมานคร	12
12	บ.ทีบีเค	1
13	บ.เสาศิลา	1
14	บ.เพาเวอร์คูล	6
15	บ.เวิลด์ออโต้	5
16	บ.มยุรี	9
17	บ.วาเมท	58
18	บ.นิกรแอนด์นิตติยา	48
19	บ.แก้วมณี	34
20	บ.บีเอสพี	4
21	บ.ซีซีเอ็ม	6
22	บ.เอพี	1
รวม		451

ที่	บริษัท	ก.ย 67
1	บ.วินัย	1
2	บ.เอทีเอส	22
3	บ.โอแอนด์เจ	34
4	บ.พีเอสซี	59
5	บ.เจเคพี.888	39
6	บ.พิมพิสาร	12
7	บ.ภัทรพงษ์	4
8	บ.เอสพีเอส	2
9	บ.เควีอี	12
10	บ.เค-ลิม โค	4
11	บ.เสมานคร	1
12	บ.เพาเวอร์คูล	6
13	บ.เวิลด์ออโต้	3
14	บ.มยุรี	2
15	บ.วาเมท	28
16	บ.นิกรแอนด์นิตติยา	49
17	บ.แก้วมณี	7
18	บ.เอ็นทีแอนด์บี	11
19	บ.อภิชาติ	7
20	บ.ทองหล่อ	4
21	บ.พีเคฟอร์ริ่ง	3
22	บ.กิตติ	9
23	บ.ช่างต็อป	3
รวม		322

ที่	บริษัท	ต.ค 67
1	บ.วินัย	2
2	บ.เอทีเอส	17
3	บ.โอแอนด์เจ	18
4	บ.เจเคพี.888	18
5	บ.พิมพิสาร	1
6	บ.ภัทรพงษ์	1
7	บ.เอสพีเอส	9
8	บ.เควีอี	1
9	บ.เวิลด์ออโต้	2
10	บ.ช่างทิพย์	1
11	บ.วาเมท	30
12	บ.นิกรแอนด์นิต	32
13	บ.แก้วมณี	5
14	บ..อภิชาติ	3
15	บ.ทองหล่อ	8
16	บ.กิตติ	1
17	บ.กัณณิการ์	10
18	บ.เคทีพี	4
19	บ.ซีทีที	2
20	บ.บุญจันทร์	2
21	บ.เอซีดับบิว	14
รวม		181

ที่	บริษัท	พ.ย 67
1	บ.วินัย	2
2	บ.เอทีเอส	6
3	บ.โอแอนด์เจ	5
4	บ.เจเคพี.888	6
5	บ.ภัทรพงษ์	1
6	บ.เควีอี	1
7	บ.เวิลด์ออโต้	8
8	บ.วาเมท	23
9	บ.อภิชาติ	7
10	บ.ทองหล่อ	3
11	บ.พีเคฟอร์ริ่ง	2
12	บ.กิตติ	6
13	บ.กัณณิการ์	2
14	บ.เอซีดับบิว	3
15	บ.เคที	2
16	บ.ยูเอสที	10
รวม		87

ที่	บริษัท	ธ.ค 67
1	บ.วินัย	4
2	บ.พิมพิสาร	2
3	บ.เค-ลิม โค	3
4	บ.เออีซี.ออโต้	7
5	บ.ชำนาญ	6
รวม		22

เดือน	จำนวน
ก.ค	329
ส.ค	451
ก.ย	322
ต.ค	181
พ.ย	87
ธ.ค	22
รวม	1392

รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ที่	บริษัท	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67
1	บ.ทานิตะ แฟบริเคชั่น	57	74	58	29	-	23
2	บ.อีโก้ ดีไซน์	9	7	20	7	10	-
3	บ.ดีดับบลิว	1	10	20	59	13	17
4	บ.เพาเวอร์พีค	1	15	11	4	8	11
5	บ.ฟุกเฮงหลง	-	3	4	3	9	-
6	บ.ซีเอเค	-	33	24	40	1	-
7	บ.ดีมายเออร์	3	24	4	-	6	4
8	บ.คอนโทรลอจิค	7	29	-	14	1	-
9	SK เพาเวอร์	9	24	14	-	-	-
10	บ.เอพีไอ	5	5	28	-	-	-
11	บ.พรีเมียร์ไลนิ่ง	7	5	-	-	-	-
12	บ.สุภาพร	11	-	19	-	-	-
13	บ.อิชิตะ	7	5	-	-	-	-
14	บ.ไทยแมท	3	-	8	-	-	-
15	บ.พรีคาสท์ คิงดอม	-	32	-	-	-	-
16	บ.แอดวานท์	10	-	-	-	-	-
17	บ.เวลแมน	26	-	-	-	-	9
18	บ.เอ็มเทค	5	-	7	-	-	-
19	บ.หนุมานคอร์ป	-	8	-	-	-	-
20	บ.สแตนดาร์แอร์คูล	-	8	3	-	-	-
21	บ.สมิทส์ แมชชินเนอรี	-	4	6	3	-	-
22	บ.เคเบิ้ลแมน	-	-	13	-	-	-
23	บ.ยูนิไฟด์	-	-	6	-	15	-
24	บ.ซีเมนส์	-	-	-	2	-	-
25	บ.อินโนเว็ค	-	-	-	10	-	-
รวม		161	286	245	171	63	64

สรุปเดือน	จำนวน
ก.ค 67	161
ส.ค 67	286
ก.ย. 67	245
ต.ค. 67	171
พ.ย. 67	63
ธ.ค. 67	64
รวม	990

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ่นหลี จำกัด

☐บันทึกการประชุม/☑บันทึกฝึกอบรม/☐บันทึกการสัมมนา

หมายเลขเอกสาร: PN-F-HR-19
วันที่บังคับใช้: 1 ธันวาคม 2560
ครั้งที่แก้ไข: 03
หน้า : - ต่อ : -

วันที่ 05 ตุลาคม 2567 **หน้าที่ ...1..../...1.....**

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้าง/มาตรการจัดการขยะ(ของเสีย) 3R.

เวลา 08.30น.-12.00 น.

สถานที่ ห้องประชุม Site งานสระแก้ว วิทยากร คุณชุติมา บัวดอก จป.ว

ที่	ชื่อ – สกุล	บริษัท	ประกันสังคม	ประกันอุบัติเหตุ	ลายมือชื่อ
1	[redacted]	บ.CAK	✓		–
2		บ.CAK	✓		
3		บ.CAK	✓		
4		บ.CAK	✓		
5		บ.CAK	✓		
6		บ.CAK		✓	
7		บ.CAK		✓	
8		บ.CAK		✓	
9		บ.CAK		✓	
10		บ.CAK		✓	
11		บ.CAK		✓	
12		บ.CAK		✓	
13		บ.CAK		✓	
14		บ.CAK		✓	
15		บ.CAK		✓	
16		บ.CAK		✓	
17		บ.CAK		✓	
18		บ.CAK		✓	
19		บ.CAK		✓	
20		บ.CAK		✓	
21		บ.CAK		✓	

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลมิตรกว้างสุ่นหลี จำกัด

☐บันทึกการประชุม/☑ บันทึกฝึกอบรม /☐บันทึกการสัมมนา

หมายเลขเอกสาร: PN-F-HR-19
วันที่บังคับใช้: 1 ธันวาคม 2560
ครั้งที่แก้ไข: 03
หน้า : - ต่อ : -

วันที่ 11 ตุลาคม 2567 **หน้าที่ ...1..../...1.....**

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้าง/มาตรการจัดการขยะ(ของเสีย) 3R.

เวลา 08.00น.-12.00 น.

สถานที่ ห้องประชุม Site งานสระแก้ว **วิทยากร** คุณชุติมา บัวดอก จป.ว

ที่	ชื่อ – สกุล	บริษัท	ประกันสังคม	ประกันอุบัติเหตุ	ลายมือชื่อ
1	[redacted]	บ.CAK		✓	
2		บ.CAK		✓	
3		บ.CAK		✓	
4		บ.CAK		✓	
5		บ.CAK		✓	
6		บ.CAK		✓	
7		บ.CAK		✓	
8		บ.CAK		✓	
9		บ.CAK		✓	
10		บ.CAK		✓	
11		บ.CAK		✓	
12		บ.CAK		✓	
13		บ.ฟุกเฮงหลง		✓	
14		บ.สมิทธ์		✓	
15		บ.สมิทธ์		✓	
16		บ.สมิทธ์		✓	
17		บ.ทีดับบลิว		✓	
18		บ.ทีดับบลิว		✓	
19		บ.ทีดับบลิว		✓	
20		บ.ทีดับบลิว		✓	
21		บ.ทีดับบลิว		✓	
22		บ.ทีดับบลิว	✓	✓	

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสุ่นหลี จำกัด

☐บันทึกการประชุม/☑ บันทึกฝึกอบรม /☐บันทึกการสัมมนา

หมายเลขเอกสาร: PN-F-HR-19
วันที่บังคับใช้: 1 ธันวาคม 2560
ครั้งที่แก้ไข: 03
หน้า : - ต่อ : -

วันที่ 29 ตุลาคม 2567

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้าง/มาตรการจัดการขยะ(ของเสีย) 3R.

เวลา 08.30น.-12.00 น.

สถานที่ ห้องประชุม Site งานสระแก้ว วิทยากร คุณชุติมา บัวตอก จป.ว ,คุณกัญจนา แม่นปืนDC

ที่	ชื่อ – สกุล	บริษัท	ประกันสังคม	ประกันอุบัติเหตุ	ลายมือชื่อ
1		บ.คอนโทรลอจิค		✓	
2		บ.คอนโทรลอจิค		✓	
3		บ.คอนโทรลอจิค		✓	
4		บ.CAK	✓		
5		บ.CAK		✓	
6		บ.CAK		✓	
7		บ.ทีดับบลิว		✓	
8		บ.ทีดับบลิว		✓	
9		บ.ทีดับบลิว		✓	
10		บ.ทีดับบลิว			
11		บ.ทีดับบลิว	✓		
12		บ.ทีดับบลิว	✓		
13		บ.ทีดับบลิว	✓		
14		บ.ทีดับบลิว	✓		
15		บ.ทีดับบลิว	✓		–
16		บ.ทีดับบลิว	✓		
17		บ.ทีดับบลิว	✓		
18		บ.ทีดับบลิว	✓		
19		บ.ทีดับบลิว	✓		
20		บ.ทีดับบลิว	✓		
21		บ.ทีดับบลิว	✓		

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย

Tanita Fabrication Co.,Ltd.

Trainning Record

เรื่อง (Subject) : ☑ คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ☐ หลักสูตรอื่นๆ ระบุ

วันที่รับเอกสาร (Date) : 19 / 10 / 2563 สถานที่ (Location) : KSL สระแก้ว

ชื่อผู้ฝึกอบรม (Trainer Name) : ปาริตา ไพชื่นอก

ลำดับ Item	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง Position	ลงชื่อพนักงาน Trainee Signature	หมายเหตุ Remark
1	[redacted]			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

* หากพนักงานใหม่ไม่ผ่านการประเมินจะต้องฝึกอบรมและประเมินผลใหม่จนกว่าจะผ่าน

ปาริตา

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน


พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย





การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน


พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย

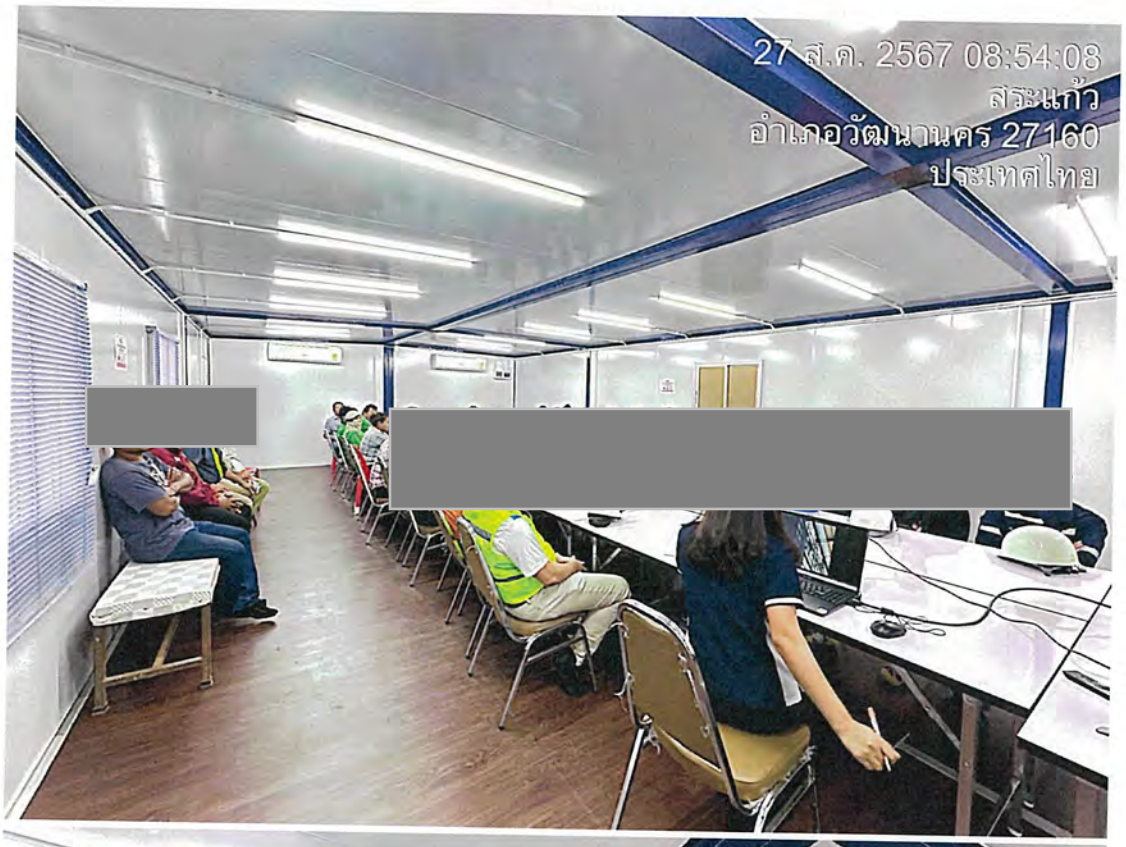



การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน


พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย

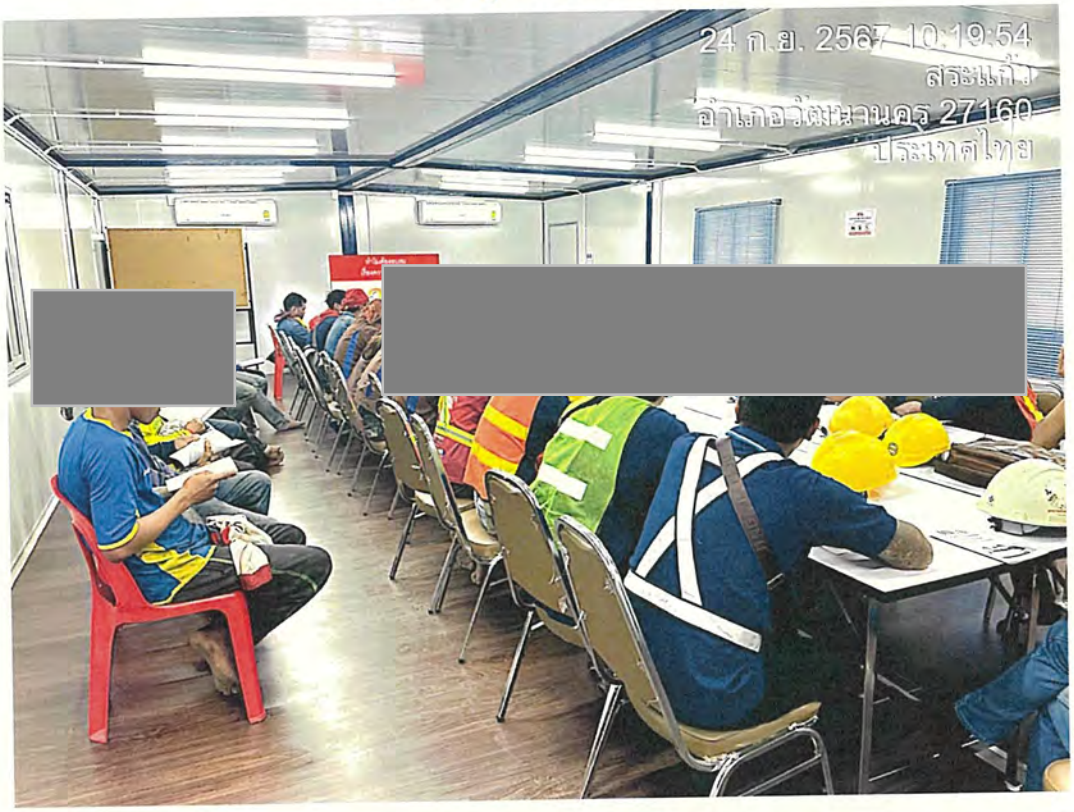




การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน


พร้อมแจกคู่มือความปลอดภัย

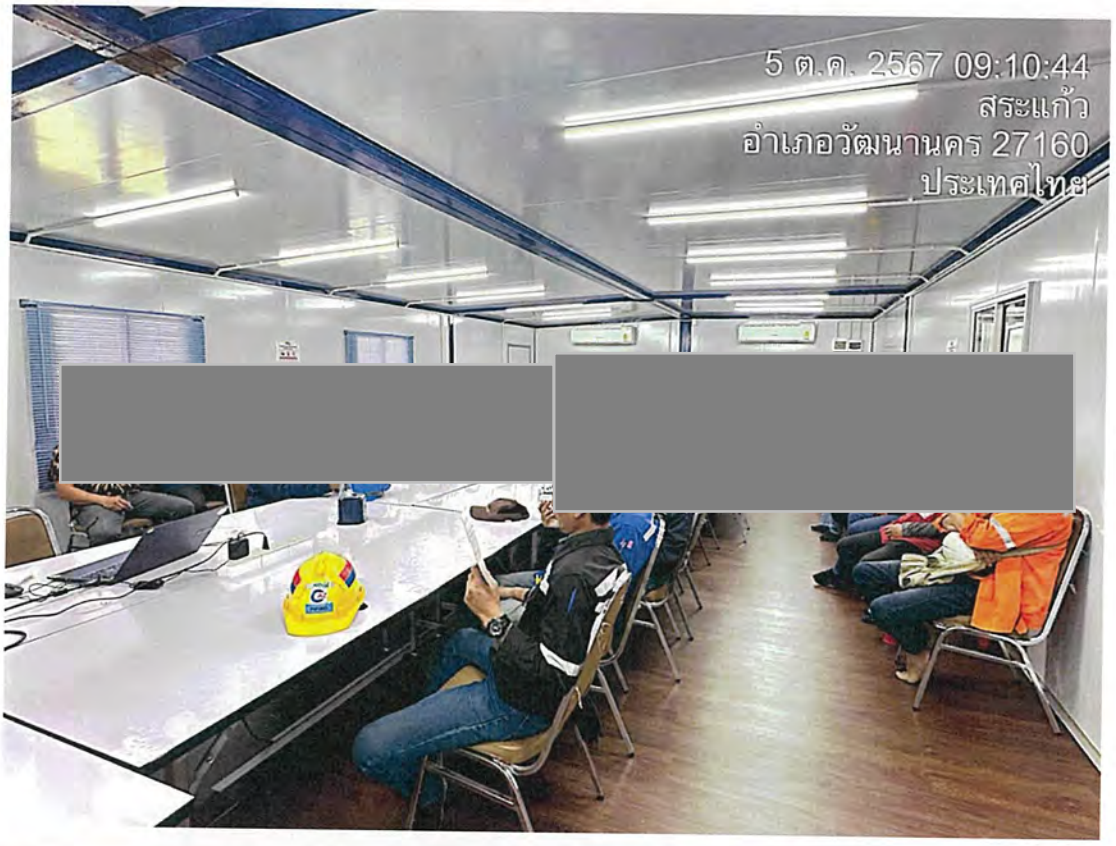

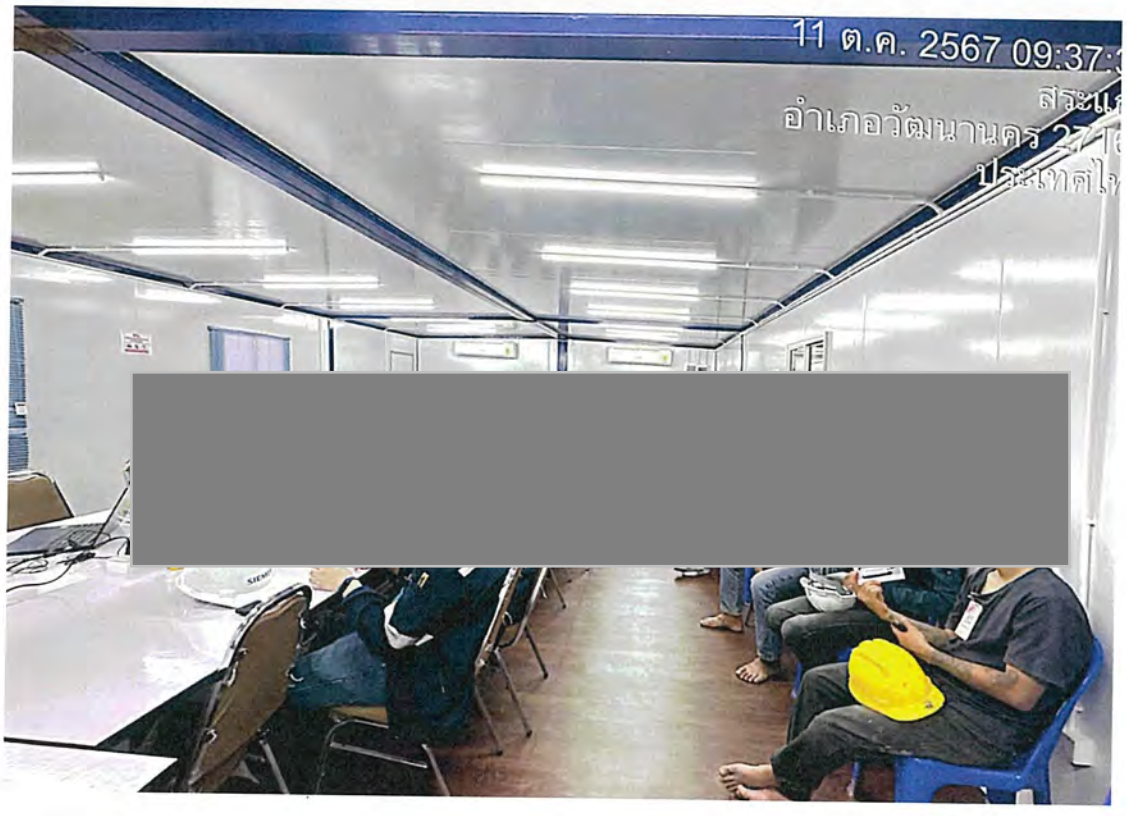



การอบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ



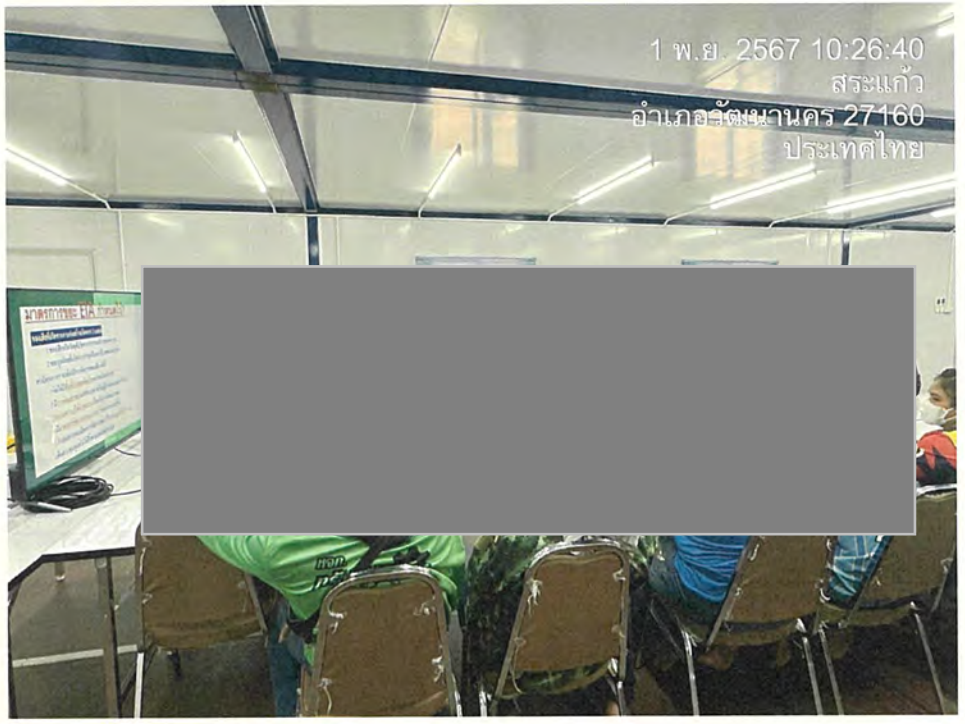

การอบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

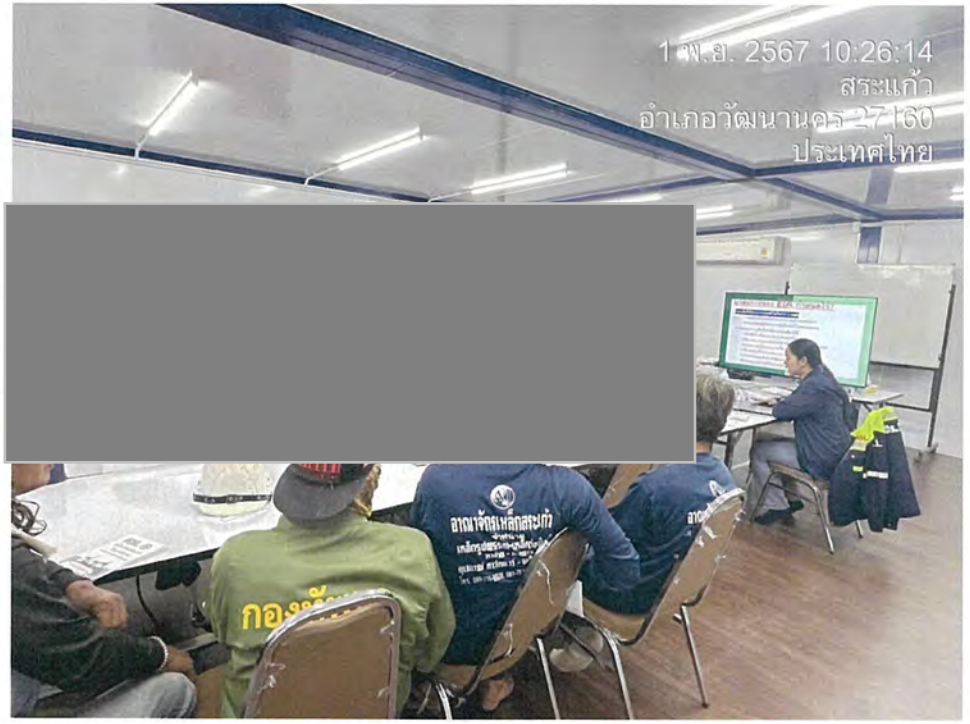

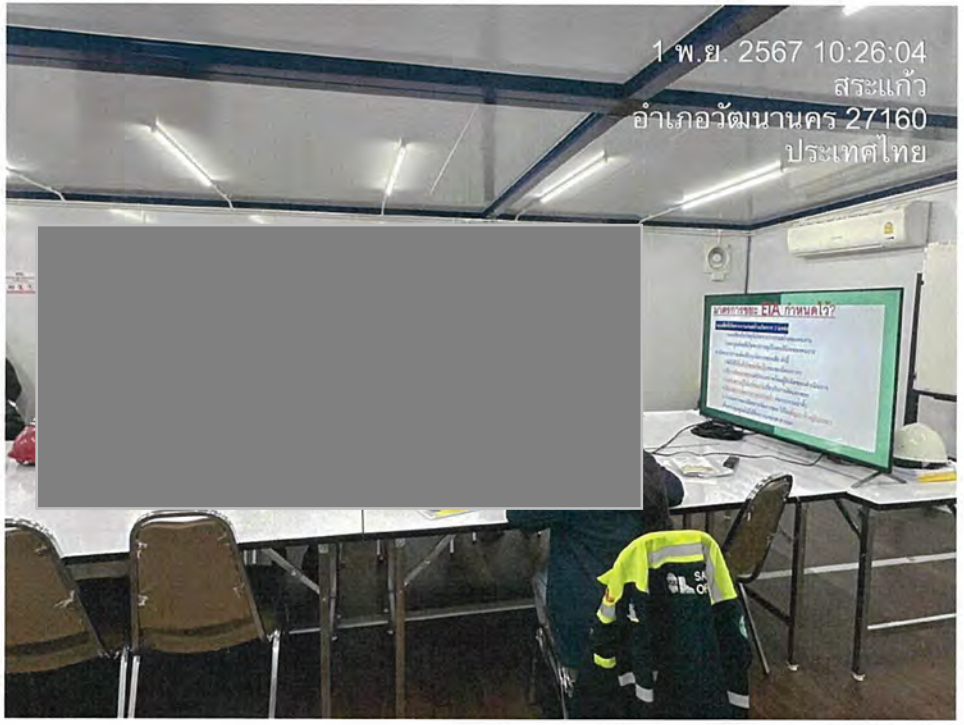


ภาคผนวก ข-24

เอกสารขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยง (Work Permit)

ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)

ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานที่อับอากาศ

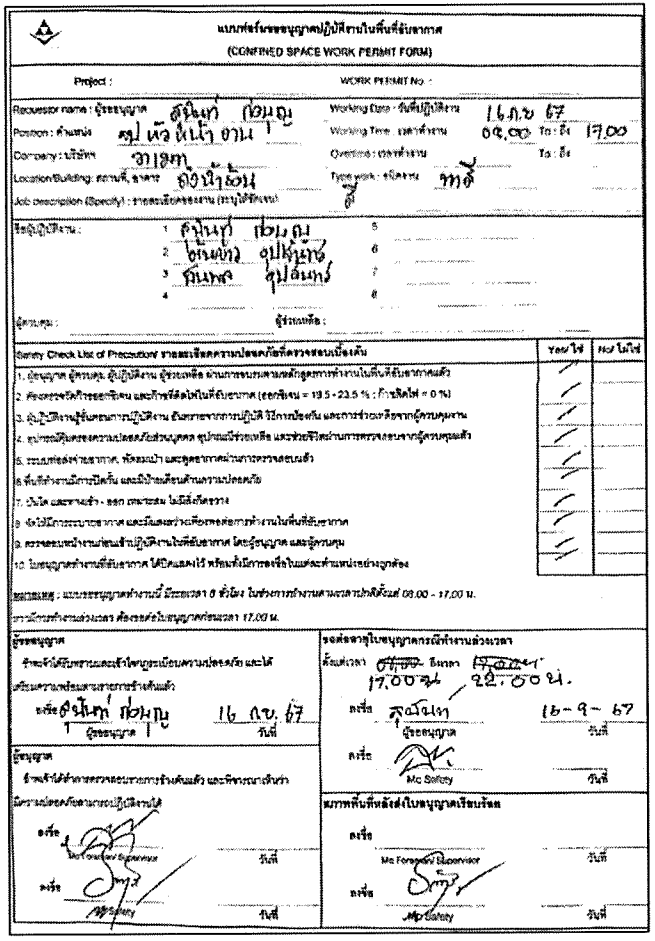

แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
(CONFINED SPACE WORK PERMIT FORM)

Project :

WORK PERMIT No. :

Requestor name : ผู้ขออนุญาต ภูนินท์ ท่อมญู
Position : ตำแหน่ง หน.หัวหน้างาน
Company : บริษัท งาน
Location/Building : สถานที่, อาคาร ถังน้ำล้น
Job description (Specify) : รายละเอียดของงาน (ระบุให้ชัดเจน)
Working Date : วันที่ปฏิบัติงาน 16 ก.ย 67
Working Time : เวลาทำงาน 09.00 To : ถึง 17.00
Overtime : ล่วงเวลางาน To : ถึง
Type work : ประเภทงาน ทดี

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน :
1 ภูนินท์ ท่อมญู
2 ธันพัทร อุปพันธ์
3 ทินพล อุปอินทร์
4
5
6
7
8

ผู้ควบคุม : ผู้ช่วยเหลือ :

Safety Check List of Precaution/ รายละเอียดความปลอดภัยที่ต้องตรวจสอบเบื้องต้น	ระบุใช่	ระบุไม่ใช่
1. ผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผ่านการอบรมหลักสูตรการทำงานในพื้นที่อับอากาศแล้ว	/	
2. ต้องตรวจวัดก๊าซออกซิเจน และก๊าซที่ติดไฟได้ในที่อับอากาศ (ออกซิเจน = 19.5 - 23.5 % : ก๊าซติดไฟ = 0 %)	/	
3. ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผลกระทบปฏิบัติงาน อันเกิดจากการปฏิบัติ วิธีการป้องกัน และการช่วยเหลือจากผู้ควบคุมงาน	/	
4. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิตสำหรับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน	/	
5. ระบบการส่งจ่ายอากาศ, พัดลมเป่า และดูดอากาศสำหรับการตรวจสอบแล้ว	/	
6. พื้นที่ทำงานมีการปิดกั้น และมีป้ายเตือนด้านความปลอดภัย	/	
7. วัสดุ และอาคารข้าง - ล่าง (เพื่อระบุ ไม่มีสิ่งก่อสร้าง)	/	
8. ติดตั้งมีการระบายอากาศ และมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานในพื้นที่อับอากาศ	/	
9. ควรตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดยผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุม	/	
10. ใบขออนุญาตทำงานที่อับอากาศ ได้มีการแสดงไว้ พร้อมทั้งมีการลงชื่อในแต่ละตำแหน่งอย่างถูกต้อง	/	


หมายเหตุ : แบบขออนุญาตทำงานนี้ มีระยะเวลา 8 ชั่วโมง ในช่วงการทำงานตามเวลาปกติตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.
การมีการทำงานล่วงเวลา ต้องแจ้งล่วงหน้าขออนุญาตก่อนเวลา 17.00 น.

ผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้ผ่านระบบความปลอดภัย และได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการดำเนินแล้ว
ลงชื่อ ภูนินท์ ท่อมญู ผู้ขออนุญาต 16 ก.ย. 67 วันที่

ผู้อนุญาต
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมาตรการดำเนินแล้ว และพิจารณาดำเนินว่า
มีความปลอดภัยตามการปฏิบัติงานไป
ลงชื่อ Mr Foreman Supervisor วันที่
ลงชื่อ Mr Safety วันที่

รอต่ออายุใบอนุญาตกรณีทำงานล่วงเวลา
ถึงแก่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.
ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต 16-9-67 วันที่
ลงชื่อ Mr Safety วันที่

มาตรการปิดพื้นที่หลังส่งใบขออนุญาตเรียบร้อย
ลงชื่อ Mr Foreman Supervisor วันที่
ลงชื่อ Mr Safety วันที่

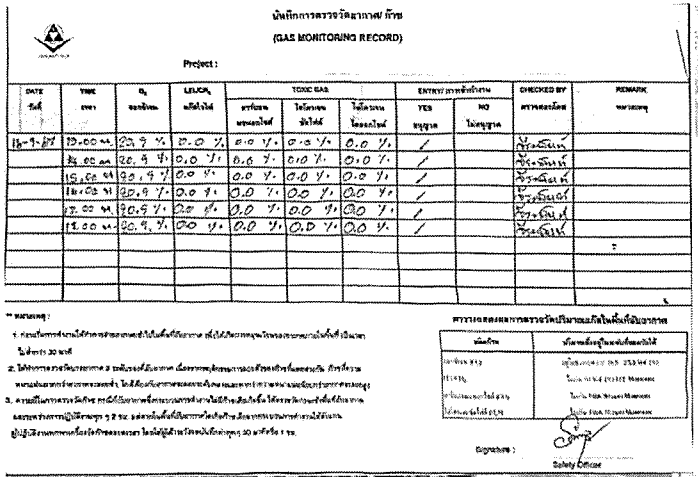

บันทึกการตรวจวัดอากาศ/ ก๊าซ
(GAS MONITORING RECORD)

Project :

DATE วันที่	TIME เวลา	O_2 ออกซิเจน	LEL/CH_4 แก๊สไวไฟ	TOXIC GAS			ENTRY/การเข้าทำงาน		CHECKED BY ตรวจสอบโดย	REMARK หมายเหตุ
				การ์บอน มอนอกไซด์	ไฮโดรเจน ซัลไฟด์	ไฮโดรเจน ไซยาไนด์	YES บุคคล	NO ไม่บุคคล		
16-9-67	13.00 น.	20.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	/		ภูนินท์	
	14.00 น.	20.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	/		ภูนินท์	
	15.00 น.	20.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	/		ภูนินท์	
	16.00 น.	20.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	/		ภูนินท์	
	17.00 น.	20.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	/		ภูนินท์	
	18.00 น.	20.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	/		ภูนินท์	

** หมายเหตุ :
1. ก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศต่อเนื่องไปยังพื้นที่อับอากาศ ต้องได้รับการตรวจวัดอากาศก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน ไม่เกิน 30 นาที
2. ให้ทำการตรวจวัดอากาศทุก 2 ชม./ครั้ง หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ถ้าค่าที่วัดได้ออกนอกเหนือเกณฑ์ที่กำหนดต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที
3. ความถี่ในการตรวจวัดนี้ หากมีการหยุดพักการทำงานในที่อับอากาศเกิน 30 นาทีขึ้นไป ให้ตรวจวัดอากาศก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ และบุคคลที่ทำการปฏิบัติงานทุก 1-2 ชม. ต้องกลับขึ้นมาที่ปากทางเข้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 5 นาที
ผู้ปฏิบัติงานต้องพกเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ไว้ตัวผู้ปฏิบัติงานทุก 30 นาทีครั้ง 1 ชม.

ตรวจรายละเอียดการตรวจวัดปริมาณแก๊สในพื้นที่อับอากาศ

ผลการวัด	ตำแหน่งที่ผู้ตรวจวัดต้องยืนวัด
ก่อนเข้าทำงาน	ผู้ตรวจวัดต้องยืนวัดที่ระดับ 150 cm (5ft)
ระหว่างทำงาน	ในบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานทำงาน
ก่อนและหลังพักงาน	ในบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานทำงาน
ก่อนและหลังกลับขึ้นสู่ผิวดิน	ปากทางเข้าพื้นที่อับอากาศ

Signature :
Safety Officer



บริษัทเชฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด
บริษัทเวิร์ล เซอร์วิส พลัส จำกัด

ขอมอบบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายณรงศักดิ์ เพียงตน
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน (จัดโดยนายจ้าง)
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาฝึกอบรม ๒๔ ชั่วโมง

Certificate No.SMHS







ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)

ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานที่อับอากาศ

แบบฟอร์มขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

(Confined Space Work Permit) วันที่ขอ 2 กันยายน 2567

บริษัท น้ำตาลนิวเวิลด์ไรซ์ จำกัด

ชื่อ - สกุล นายกรกฤต วิศวธนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงาน บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขออนุญาตให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จำนวน 6 คน คือ

1) นายพงศธร สุวรรณภาพ	Cer No. RCF.03022022	2) นายอำพร สุวรรณภาพ	Cer No. RCF.04022022
3) นายกิตติศักดิ์ ทิพย์วงษ์	Cer No. RCF.07022022	4) นายสุชิต รักษงาชาติ	Cer No. RCF.08022022
5) นายพีรพัฒน์ กุลธรทาอาษา	Cer No. RCF.02092023	6) นายรัมภ์ศักดิ์ วรนารถวิรัช	Cer No. RCF.01092023

เข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จากประกอบ/ งานเชื่อม สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารหม้อต้ม / ถังหม้อต้ม Falling Film #089

ในวันที่ 2 - 7 กันยายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.

โดย ผู้ควบคุมงาน คือ นายนัฐวุฒิ สมยา Cer No. RCF.01022022

ผู้ช่วยเหลือ คือ นายกบ์ทัพ จรัสจนิกรกุล Cer No. RCF.02022022

Cer No.

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ตรวจด้วยเครื่องมือตรวจวัด)

รายการตรวจวัด	ก่อนปฏิบัติงาน	ระหว่างปฏิบัติงาน	ระหว่างปฏิบัติงาน	ระหว่างปฏิบัติงาน
	เวลา 07.50 น.	เวลา 10.00 น.	เวลา 13.00 น.	เวลา 15.00 น.
%ออกซิเจน ระหว่าง 19.5-23.5 %	20.9		20.9	
% ก๊าซติดไฟ LFT / LEL < 10 %	0		0	
% H2S < 10 ppm (NIOSH)	0		0	
% CO < 35 ppm (NIOHS)	0		0	

มาตรการด้านความปลอดภัย (✓) ใช้ (✗) ไม่ใช้

สิ่งที่ตรวจ	ผล	หมายเหตุ
ตัดป้ายเข้มเตือน (พื้นที่อับอากาศ,พื้นที่ทำแรง) และกั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบ	✓	
ตัดแยกระบบไฟฟ้า,น้ำ และปิดใช้กุญแจล็อก,สวิทช์ ติดป้ายแจ้ง (Lock Out , Tag Out)	✗	ไม่เกี่ยวข้องกับระบบในการทำงาน
พื้นที่ปฏิบัติงาน และบริเวณโดยรอบไม่มีกองวัสดุกีดขวาง	✓	
ระบายอากาศก่อนลง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน (เป่าลม,ดูดอากาศ)	✓	ใช้ Blower ขนาด 12"
เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ถังออกซิเจน,อุปกรณ์ช่วยหายใจ,ชีอกช่วยชีวิต เป็นต้น	✓	
มีบันทึกรายชื่อผู้ขอบุญาต,ผู้ควบคุมงาน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ปฏิบัติงาน(ผ่านการอบรมงานในที่อับอากาศ)	✓	

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

☒หมวกนิรภัย ☒ถุงมือป้องกัน ☒เข็มขัด,สายรัดตัว,สายรัดช่วยชีวิต
☒หน้ากากกรองแสงอ่วน ☒ตีปิดหูลุก (ตามประเภทงาน) และเชือกนิรภัย
☒ชุดป้องกัน (ตามประเภทงาน) ☒รองเท้านิรภัย ○อื่นๆ (ระบุ)

อันตรายที่ถูกจ้างอาจได้รับในกรณีอุบัติเหตุ และวิธีหลีกหนีภัย

อันตรายในกรณีอุบัติเหตุ	วิธีการหลีกหนีภัย

ผู้ขออนุญาต	หน.งาน/วิศวกร	ผู้อนุญาตฯ/ป.ป.
นายกรกฤต วิศวธนพงษ์	นายนัฐวุฒิ สมยา	ปัญจพร สมสี

RCF. 01022022

บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง"

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย นัฐวุฒิ สมยา

ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

ฮอนที่ตั้งในการอบรมภาคทฤษฎี บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 42 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำใส ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย


อบรมวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง)

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ใช้ได้ถึง วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2570

(นาย สุรสิทธิ์ พุทธิเสน)
วิทยากร

(นาย กรกฤต วิศวธนพงษ์)
นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ ต้องอบรมทบทวนภายใน 30 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ 5 ปี

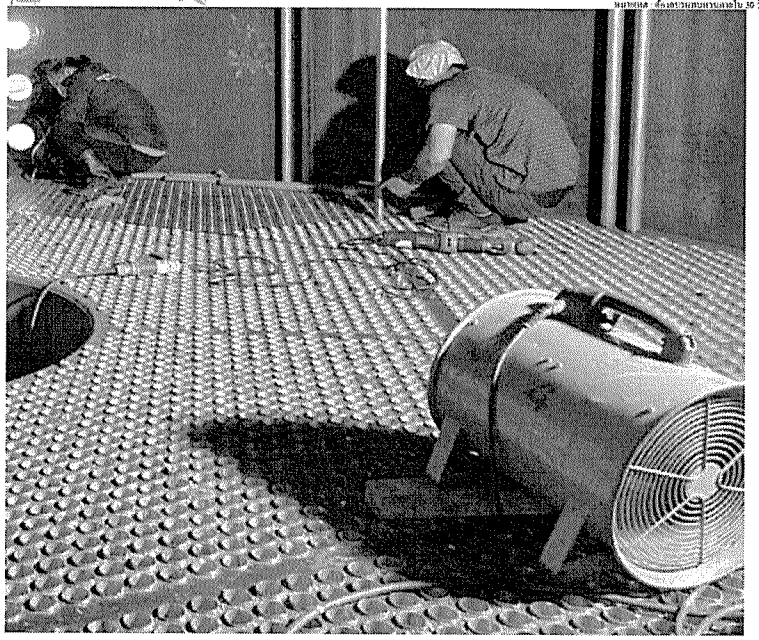

ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)

ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานที่อับอากาศ

แบบฟอร์มขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

(Confined Space Work Permit) วันที่เขียน _____

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด

ชื่อ - สกุล นายปรีชา สิงห์โต ตำแหน่ง หัวหน้างาน. บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด.

ขออนุญาตให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จำนวน 3 คน คือ

1) นายปรีชา สิงห์โต. Cer No. - 2) _____ Cer No. _____

3) นายสมภพ เพียรชน. Cer No. - 4) _____ Cer No. _____

5) น.ส.โชติกา แสงงาม. Cer No. - 6) _____ Cer No. _____

เข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานใส่ Tube เข้า Tube. ตามที่ปฏิบัติงาน ตามหมายเลขท่อ.

ในวันที่ 16-17/6/67. เวลา 08.00- 20.00 น.

โดย ผู้ควบคุมงาน คือ นายชาญณรงค์ รัตนากร Cer No. _____

ผู้ช่วยเหลือ คือ นายชัยวัฒน์ พลีรักษ์. Cer No. _____

_____ Cer No. _____

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ตรวจด้วยเครื่องมือตรวจวัด)

รายการตรวจวัด	ก่อนปฏิบัติงาน	ระหว่างปฏิบัติงาน	ระหว่างปฏิบัติงาน	ระหว่างปฏิบัติงาน
	เวลา 06.00	เวลา	เวลา 13.00	เวลา
%ออกซิเจน ระหว่าง 19.5-23.5 %	20.8		20.8	
% ก๊าซติดไฟ LFT / LEL < 10 %	0		0	
% H2S < 10 ppm (NIOSH)	0		0	
% CO < 35 ppm (NIOHS)	0		0	

มาตรการด้านความปลอดภัย (✓) ใช้ (✗) ไม่ใช้

สิ่งที่ตรวจ	ผล	หมายเหตุ
ติดป้ายแจ้งเตือน (พื้นที่อับอากาศ,พื้นที่เจ็บป่วย) และกั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบ	/	
ตัดแยกระบบไฟฟ้า,น้ำ และปิดใส่กุญแจสวาร์ว,สวิตช์ ติดป้ายแจ้ง (Lock Out , Tag Out)	/	
พื้นที่ปฏิบัติงาน และบริเวณโดยรอบไม่มีกองวัตถุที่อาจพังทลาย	/	
ระบายอากาศก่อนลง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน (เป่าลม,ดูดอากาศ)	/	
เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ถังออกซิเจน,อุปกรณ์ช่วยหายใจ,เชือกช่วยชีวิต เป็นต้น	/	
มีบันทึกรายชื่อผู้ขอบุญาต,ผู้คุมงาน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ปฏิบัติงาน(ผ่านการอบรมงานในที่อับอากาศ)		

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

✓หมวกนิรภัย ✓ถุงมือป้องกัน ○เข็มขัด,สายรัดตัว,สายรัดช่วยชีวิต

✓หน้ากากกรองแสงแว้น ✓ที่ปิดหูมูก (ตามประเภทงาน) และเชือกนิรภัย

✓รองเท้าป้องกัน (ตามประเภทงาน) ✓รองเท้านิรภัย ○อื่นๆ (ระบุ) _____

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน และวิธีหลีกหนีภัย

อันตรายในกรณีฉุกเฉิน	วิธีการหลีกหนีภัย
ไฟไหม้,ระเบิด	รถดับเพลิงฉุกเฉิน,ไฟเสียงสัญญาณ

ผู้ขออนุญาต	หน.งานวิศวกร	ผู้อนุญาต,ชป.

บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด *(จัดอบรมโดยนายจ้าง)*

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อรับรองว่า

นายปรีชา สิงห์โต


ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน" ในการทำงานที่อับอากาศ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

สถานที่อบรม บริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 24 ชั่วโมง

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ให้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565


(นายคำรงศ์ ชูเมือง) วิทยากร
จป.วิชาชีพ/ประธานชมรมจป.นครสวรรค์และภาคเหนือตอนล่าง

(นายชวลิต จันทรโภรทอง) นายจ้าง/ผู้แทน
ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท

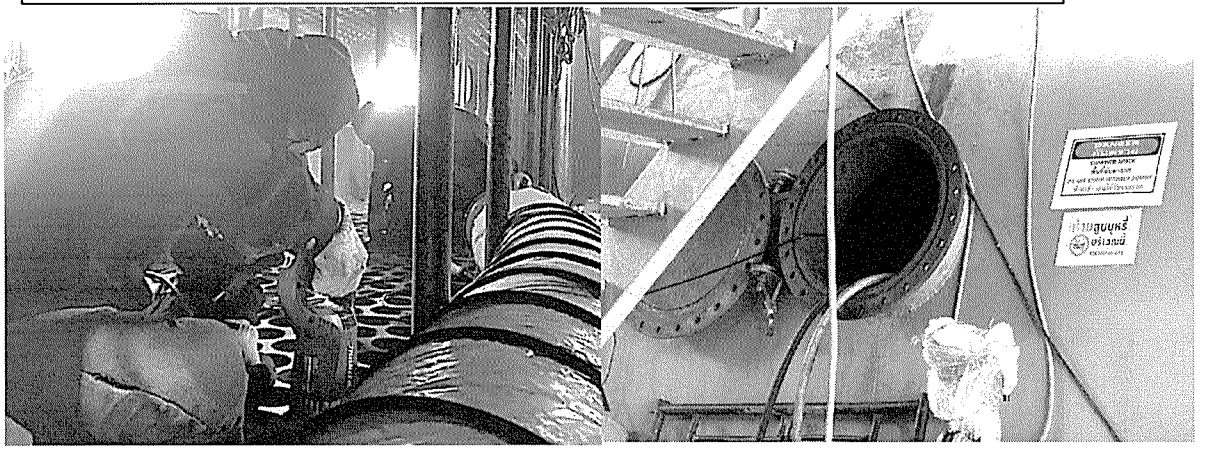

ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)

ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง

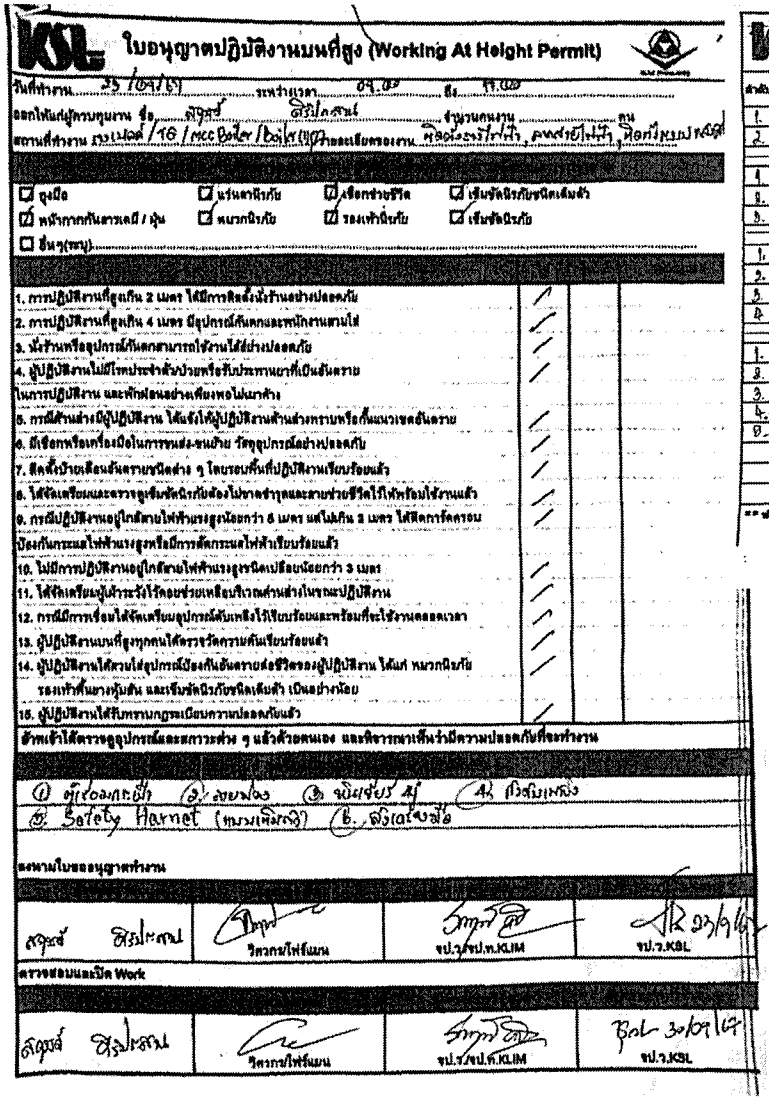

KSL ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Working At Height Permit)

วันที่ทำงาน 23/09/67 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 17.00

ออกให้แก่ผู้ควบคุมงาน ชื่อ สัญชัย สิริโปรสาน จำนวนคนงาน 1 คน

สถานที่ทำงาน อาคาร MCC Boiler / Boiler (ชั้นที่ทำงานและเขียนตรงงาน หลังคาเหนือห้องไฟฟ้า, คอนเวย์ไฟฟ้า ชั้นที่ทำงานปฏิบัติ)

☑ ถุงมือ ☑ แว่นตานิรภัย ☑ เข็มขัดนิรภัย ☑ เชือกนิรภัยชนิดเส้นคู่

☑ หน้ากากกันสารเคมี / ฝุ่น ☑ หมวกนิรภัย ☑ รองเท้านิรภัย ☑ เชือกนิรภัย

☐ อื่นๆ(ระบุ).....

1. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 2 เมตร ได้มีการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย	✓		
2. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร มีอุปกรณ์กันตกและพนักงานสวมใส่	✓		
3. นั่งร้านหรืออุปกรณ์กันตกสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	✓		
4. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีโรคประจำตัวบางหรือรับประทานยาที่เป็นอันตราย ในการปฏิบัติงาน และพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เมาค้าง	✓		
5. การมีผ้าม่านผู้ปฏิบัติงาน ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างทราบหรือกั้นแนวเขตอันตราย	✓		
6. มีเชือกหรือเครื่องมือในการขนส่ง-ขนถ่าย วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	✓		
7. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณด้านล่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	✓		
8. ได้จัดเตรียมและตรวจอุปกรณ์นิรภัยต้องไม่ชำรุดและสายช่วยชีวิตได้ให้พร้อมใช้งานแล้ว	✓		
9. การมีปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 3 เมตร ได้ติดการ์ดกรอบป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	✓		
10. ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือยน้อยกว่า 3 เมตร	✓		
11. ได้จัดเตรียมผู้ดำระวังไว้คอยช่วยเหลือบริเวณด้านล่างในขณะปฏิบัติงาน	✓		
12. การมีการเรียมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา	✓		
13. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงทุกคนได้ตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้ว	✓		
14. ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหัวเหล็กพื้นหนา และเข็มขัดนิรภัยชนิดเส้นคู่ เป็นอย่างน้อย	✓		
15. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยแล้ว	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจอุปกรณ์และสภาวะต่าง ๆ แล้วด้วยตนเอง และพิจารณาเห็นว่ามีความปลอดภัยที่จะทำงาน

① ถุงมือหนังยาว ② ปลอกแขน ③ หน้ากากกรองฝุ่น ④ กางเกงยีนส์


⑤ Safety Harnet (ทบวนเพิ่มเติม) ⑥ รองเท้าเซฟตี้

ลงนามในใบขออนุญาตทำงาน

สัญชัย สิริโปรสาน	วิศวกรไฟฟ้าแผนก	จป.ว/จป.ท.KLIM	จป.ว.KSL

ตรวจสอบและปิด Work

สัญชัย สิริโปรสาน	วิศวกรไฟฟ้าแผนก	จป.ว/จป.ท.KLIM	จป.ว.KSL

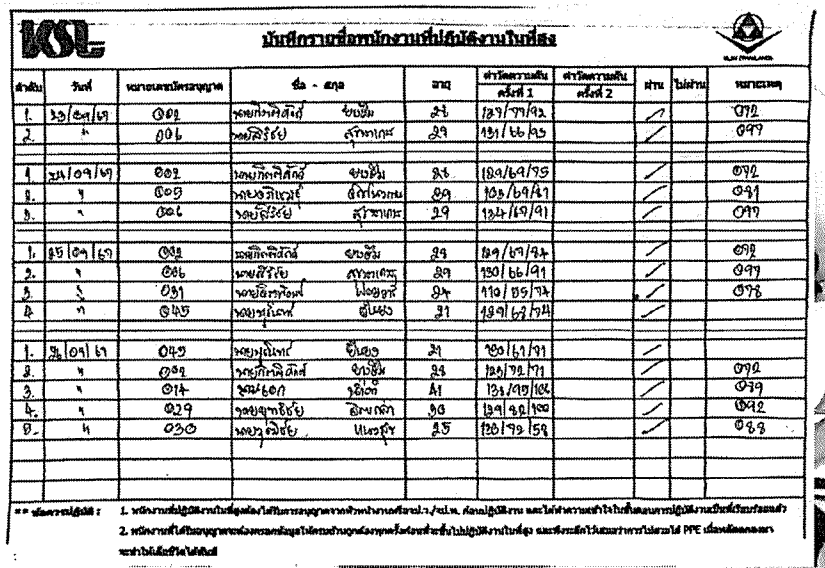


KSL บันทึกรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

ลำดับ	วันที่	หมายเลขบัตรประชาชน	ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำรวจความดัน ครั้งที่ 1	ตำรวจความดัน ครั้งที่ 2	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1.	23/09/67	0001	นายภัทรศิลป์ ขยมขัน	26	139/77/92		✓		0712
2.	"	0006	นายสิริชัย สุวิทาเกษ	29	131/66/85		✓		0977
1.	24/09/67	0001	นายภัทรศิลป์ ขยมขัน	26	139/69/95		✓		0712
2.	"	0005	นายอริเชฐ์ ศิริโปรสาน	29	133/69/87		✓		0911
3.	"	0006	นายสิริชัย สุวิทาเกษ	29	134/69/91		✓		0977
1.	25/09/67	0001	นายภัทรศิลป์ ขยมขัน	29	139/69/94		✓		0712
2.	"	0006	นายสิริชัย สุวิทาเกษ	29	130/66/91		✓		0977
3.	"	0011	นายปิยพรพ์ ไม่ยอมรู้	24	110/85/74		✓		0778
4.	"	0015	นายพุทโธ ชูโนยง	31	139/69/94		✓		
1.	26/09/67	0015	นายพุทโธ ชูโนยง	31	130/61/91		✓		
2.	"	0001	นายภัทรศิลป์ ขยมขัน	29	135/72/71		✓		0712
3.	"	0014	จุดแดก ปลิโต	41	131/79/82		✓		0979
4.	"	0029	นายชูชาติชัย อิสระกิจ	30	139/82/100		✓		0912
5.	"	0030	นายวุฒิชัย แนวบุ๊ย	25	126/72/59		✓		0823

** หมายเหตุผู้ปฏิบัติ : 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหรือ จป.ว./จป.ท. ก่อนปฏิบัติงาน และได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานบนที่สูงก่อนทำงาน

2. พนักงานที่ได้รับอนุญาตแล้วจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งก่อนขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูง และห้ามถอดไว้ในขณะทำงานโดยเด็ดขาด

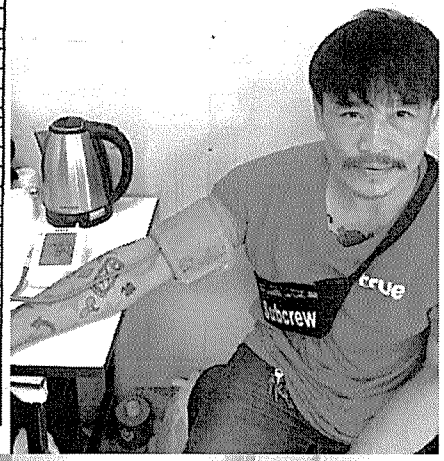





ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)

ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง

ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Working At Height Permit)

วันที่ทำงาน 19-25 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึง 20.00 น.

ออกให้แก่ผู้ควบคุมงาน ชื่อ ชาญ วิทิพนท์ หมวดโครงสร้าง จำนวนคนงาน 34 คน

สถานที่ทำงาน คาซาโฟล์เดียว รายละเอียดของงาน 3rd fl. Supply, Cable Tray, Conduit.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ต้องสวมใส่ตามลักษณะการทำงาน

☑ ถุงมือ ☑ แว่นตานิรภัย ☐ เรือกช่วยชีวิต ☑ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว
☐ หน้ากากกันสารเคมี / ฝุ่น ☑ หมวกนิรภัย ☑ รองเท้านิรภัย ☐ เข็มขัดนิรภัย
☐ อื่นๆ(ระบุ).....

	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 2 เมตร ได้มีการผูกรัดนั่งร้านอย่างปลอดภัย	✓		
2. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร มีอุปกรณ์กันตกและพนักงานสวมใส่	✓		
3. นั่งร้านหรืออุปกรณ์กันตกสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	✓		
4. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีโรคประจำตัวป่วยหรือรับประทานยาที่เป็นอันตราย	✓		
ในการปฏิบัติงาน และพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เมาค้าง			
5. กรณีต้นล่างมีผู้ปฏิบัติงาน ให้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างทราบหรือกั้นแนวเขตอันตราย	✓		
6. มีเชือกหรือเครื่องมือในการขนส่งขนถ่าย วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	✓		
7. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	✓		
8. ได้จัดเตรียมและตรวจอุปกรณ์นิรภัยต้องไม่ชำรุดและสายช่วยชีวิตไว้พร้อมใช้งานแล้ว	✓		
9. กรณีปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 3 เมตร ได้ติดการ์ดครอบ		✓	
ป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว			
10. ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือยน้อยกว่า 3 เมตร	✓		
11. ได้จัดเตรียมผู้เฝ้าระวังไว้คอยช่วยเหลือบริเวณด้านล่างโซนที่ปฏิบัติงาน	✓		
12. กรณีมีการเชื่อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา	✓		
13. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงทุกคนได้ตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้ว	✓		
14. ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย	✓		
รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เป็นอย่างน้อย			
15. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยแล้ว	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูอุปกรณ์และสภาวะต่าง ๆ แล้วด้วยตนเอง และพิจารณาเห็นว่ามีความปลอดภัยที่จะทำงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงาน

สว่าน, ทินเนอร์, สีรอง, Hand Tool

ลงนามในขออนุญาตทำงาน

ผู้รับอนุญาต	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบ/อนุญาต	รับทราบการปิด Work
สุทธนาท์	ชาญ วิทิพนท์ วิศวกร/โฟร์แมน	จป.	จป.วKSL

ตรวจสอบและปิด Work


ผู้รับอนุญาต	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบ/อนุญาต	รับทราบการปิด Work
สุทธนาท์ 26/8/24	ชาญ วิทิพนท์ วิศวกร/โฟร์แมน	จป.	จป.วKSL


หน้าที่ 1

บันทึกรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูง

ลำดับ	วันที่	หมายเลขบัตรอนุญาต	ชื่อ - สกุล	อายุ	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 1	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 2	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
9	20/8/67	CTG-019	ชัยยงค์ หงษ์ทอง	26	124/64		✓		
10	"	CTG-015	สมชัย สมแก้ว	50	119/67		✓		
11	"	CTG-023	สิทธิศักดิ์ ใสหนองสรู	23	114/67		✓		
	21/8/67								
1	"	CTG-001	สมชาย สีกลัง	54	136/64		✓		
2	"	CTG-002	ศักดิ์กฤษ์ พะเยิน	51	114/67		✓		
3	"	CTG-003	ธนิวัฒน์ ล้ำพงษ์	51	131/69		✓		
4	"	CTG-004	ปัญ กิตติรักษ์	54	137/80		✓		
5	"	CTG-010	พงศ์ศักษณ์ ทิ่งศิลา	20	107/65		✓		
6	"	CTG-011	ณัฐพัน ใสพงษ์ทร์	20	119/66		✓		
7	"	CTG-012	ชนาธิป ทุ่มกลกิจา	21	121/64		✓		
8	"	CTG-013	ศักดิ์ชัย ใสเพิ่มทรง	24	110/76		✓		
9	"	CTG-014	ชัยพงษ์ หลงสัมพันธ์	26	132/79		✓		
10	"	CTG-015	สมชัย สมแก้ว	50	104/86		✓		
11	"	CTG-023	สิทธิศักดิ์ ใสหนองสรู	23	106/88		✓		
1	22/8/67	CTG-001	สมชาย สีกลัง	54	126/70		✓		
2	"	CTG-002	ศักดิ์กฤษ์ พะเยิน	51	119/75		✓		
3	"	CTG-003	ธนิวัฒน์ ล้ำพงษ์	51	118/66		✓		

** ข้อควรปฏิบัติ :
1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูงต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหรือจป.ว./จป.ท. ก่อนปฏิบัติงาน และได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. พนักงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนขึ้นไปปฏิบัติงานในที่สูง และฝึกซ้อมหนีไฟสม่ำเสมอ หากไม่ใส่ PPE เมื่อพบผลลัพธ์ลงมาจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที
3. พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่สูงต้องมีค่าความดันไม่เกิน 140/90 mmHg

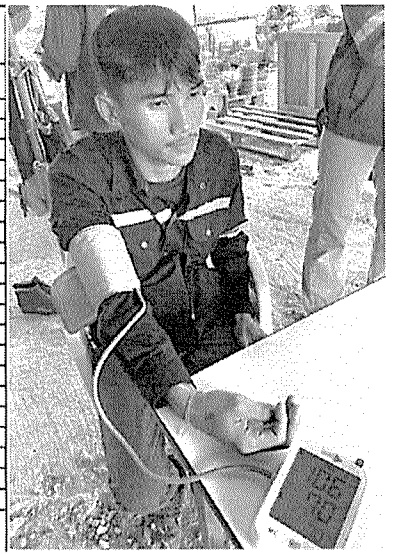

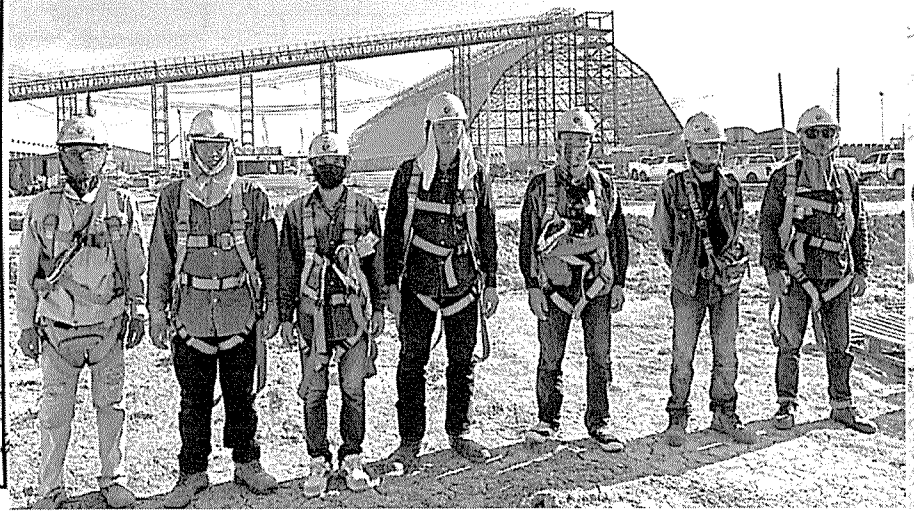



ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)

ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง

ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Working At Height Permit)

วันที่ทำงาน 21 ต.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08:00 - 17:00 ถึง 27 ต.ค. 2567

ออกให้แก่ผู้ควบคุมงาน ชื่อ นายวุฒิชัย ศิริภาพ จำนวนคนงาน 20 คน

สถานที่ทำงาน All plant รายละเอียดของงาน งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา/ผนัง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ต้องสวมใส่ตามลักษณะการทำงาน

☑ ถุงมือ ☑ แว่นตานิรภัย ☑ เชือกช่วยชีวิต ☑ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

☑ หน้ากากกันสารเคมี / ฝุ่น ☑ หมวกนิรภัย ☑ รองเท้านิรภัย ☑ เข็มขัดนิรภัย

☐ อื่นๆ(ระบุ)

	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 2 เมตร ได้มีการติดตั้งโครงร้านอย่างปลอดภัย	✓		
2. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร มีอุปกรณ์กันตกและพนักงานสวมใส่	✓		
3. นั่งร้านหรืออุปกรณ์กันตกสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	✓		
4. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีโรคประจำตัว/ป่วยหรือรับประทานยาที่เป็นอันตราย ในการปฏิบัติงาน และพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่มาทำงาน	✓		
5. กรณีต้นส่งมีผู้ปฏิบัติงาน ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างทราบหรือกั้นแนวเขตอันตราย	✓		
6. มีเชือกหรือเครื่องมือในการขนส่ง-ขนย้าย วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	✓		
7. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	✓		
8. ได้จัดเตรียมและตรวจดูเข็มขัดนิรภัยต้องไม่ชำรุดและสายช่วยชีวิตไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว	✓		
9. กรณีปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 3 เมตร ได้ติดการ์ดครอบ ป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	✓		
10. ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือยน้อยกว่า 3 เมตร	✓		
11. ได้จัดเตรียมผู้ให้ระวังไว้คอยช่วยเหลือบริเวณด้านล่างในขณะปฏิบัติงาน	✓		
12. กรณีมีการเชื่อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา	✓		
13. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงทุกคนได้ตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้ว	✓		
14. ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เป็นอย่างน้อย	✓		
15. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยแล้ว	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูอุปกรณ์และสภาวะต่าง ๆ แล้วด้วยตนเอง และพิจารณาเห็นว่ามีความปลอดภัยที่จะทำงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงาน

ตู้เชื่อม , สว่าน , หินเจียร์ , เครื่องใช้ต่าง

ลงนามใบขออนุญาตทำงาน

ผู้ขออนุญาต	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบ/อนุญาต	รับทราบการปิด Work
	วิศวกร/โฟร์แมน	จป.ว./จป.ท.PPT	จป.ว.KSL


ตรวจสอบและปิด Work

ผู้ขออนุญาต	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบ/อนุญาต	รับทราบการปิด Work
	วิศวกร/โฟร์แมน	จป.ว./จป.ท.PPT	จป.ว.KSL

บันทึกรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูง

ลำดับ	วันที่	หมายเลขบัตรอนุญาต	ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำรวจความดัน ครั้งที่ 1	ตำรวจความดัน ครั้งที่ 2	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	21 ต.ค. 67	PP - 018	นาย สิทธิ์ [illegible]	24	111 / 72		✓		
2	21 ต.ค. 67	PP - 006	นาย [illegible]	35	131 / 81		✓		
3	21 ต.ค. 67	PP -	นาย [illegible]	20	115 / 75		✓		
4	21 ต.ค. 67	PP - 010	นาย [illegible]	22	116 / 70		✓		
5	21 ต.ค. 67	PP - 004	นาย [illegible]	45	116 / 81		✓		
6	21 ต.ค. 67	PP - 015	นาย [illegible]	29	112 / 73		✓		
7	21 ต.ค. 67	PP - 016	นาย [illegible]	22	121 / 72		✓		
8	21 ต.ค. 67	PP - 033	นาย [illegible]	29	129 / 84		✓		
9	21 ต.ค. 67	PP - 026	นาย [illegible]	19	111 / 69		✓		
10	21 ต.ค. 67	PP - 029	นาย [illegible]	29	130 / 75		✓		

** พนักงานปฏิบัติ :
1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูงต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหรือ จป.ว./จป.ท. ก่อนปฏิบัติงาน และได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. พนักงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทุกครั้งก่อนขึ้นที่ไปปฏิบัติงานในที่สูง และต้องสวมใส่ PPE เมื่อต้องทำงานในพื้นที่ที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ทันที
3. พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่สูงต้องมีค่าการวัดความดันไม่เกิน 140/90 mmHg

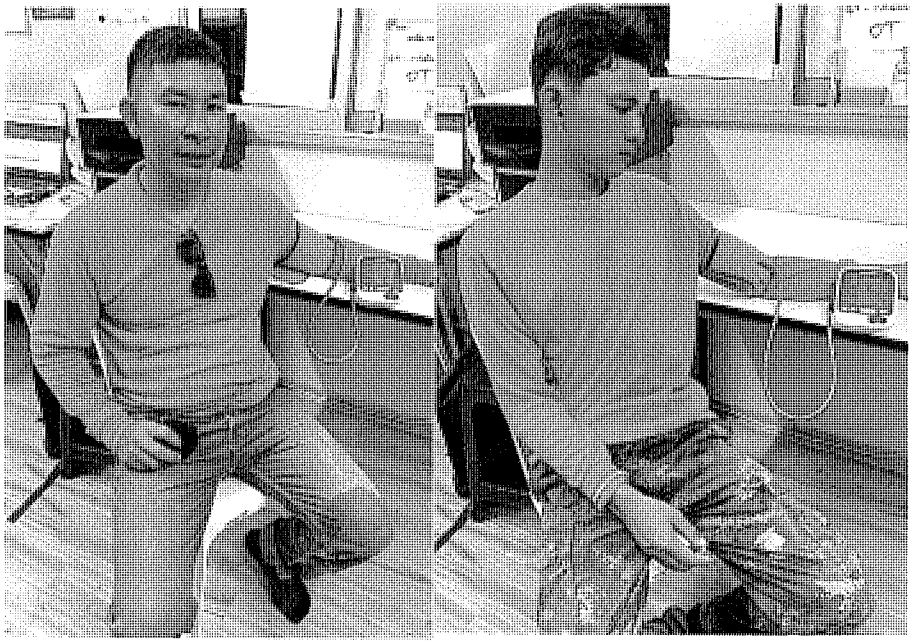

เอกสารขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด (DEMIER CO.,LTD)
97/1 ซอยลาดพร้าว 114 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ (662) 934-3229

วันที่ 2/10/67

เรียน ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ

เรื่อง ขอส่งรายพนักงานเข้าอบรม ครั้งที่ 20

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน

ทางบริษัทดีมายเออร์จำกัด ขอส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรมครั้งที่ 20 จำนวน 4 คน

โครงการ CONTINUOUS VACUUM PAN 300m3 SYSTEM ณ.โรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.สระแก้ว

โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจันทวี สมศักแว่น
2. นายสมพร เติ่มบุญ
3. นายประเวศ กูลอินทร์
4. นายสุระเชษฐ์ ช่างทอง


จึงเรียนมาเพื่อทราบ วัฒนา รัตคะรมย์


(นายวัฒนา รัตคะรมย์)


PROJECT SITE

เอกสารบัตร ประชาชน









เอกสารขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

11 พฤศจิกายน 2567

เรียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ

เรื่อง ขอส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรม ครั้งที่ 14

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน


ทางบริษัท เพาเวอร์ พีค เทคโนโลยี จำกัด ขออนุญาตนำส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรม ครั้งที่ 14 จำนวน 6 คน ในวันอังคารที่ 12/ 11 / 2567 เพื่อทำงานโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลมิตรกว้างสุ้นหลี จ. สระแก้ว งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทราวด์/ล่อฟ้า โดยมีรายชื่อดังนี้


1. นายธวัชชัย ปัญญาใส
2. นายกิตติศักดิ์ สาทน
3. นายวัชรพล วิเทียนสาย
4. นายยุรนันต์ แสนโบราญ
5. นายสมศักดิ์ เจริญใจ
6. นายอารัญ ดลปัดชา


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวหทัยธรรมธิป โสดเขา)
เจ้าที่ความปลอดภัย ฯ

ใช่ในการเข้าทำงานที่ KSL สระแก้วเท่านั้น







594/90 โครงการเอ้าร์ เดอะ อัมบูร์ก ถนน หทัยราษฎร์ แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 02-1302204 แฟกซ์ : 02-1302214 (สำนักงานใหญ่)

594/90 โครงการเอ้าร์ เดอะ อัมบูร์ก ถนน หทัยราษฎร์ แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 02-1302204 แฟกซ์ : 02-1302214 (สำนักงานใหญ่)

เอกสารขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท ซีโค่ดีไซน์ แอนด์ บิลดไทย จำกัด

12 ตุลาคม 2567

เรียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ

เรื่อง ขอส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรม วันอังคารที่ 15 ตุลาคมคม 2567

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน

ทางบริษัท ซีโค่ดีไซน์ แอนด์ บิลดไทย จำกัด ขออนุญาตนำส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรม จำนวน 7 คน เพื่อทำงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คลล. 1 ชั้น จังหวัดสระแก้ว โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อพนักงาน

1. นายเกียรติศักดิ์ ปัดตายะ
2. นายพันธการณ์ เพ็ชรตะกั่ว
3. นายเจษฎา ปัดตายะ
4. นายวินัย บรรจงปรุ
5. นายธนาคม ปุ่นยะมาตย์
6. นายมาก แถบเมืองบัก
7. นายพุฒ คำวา

รถกระบะทะเบียน 1 สล 4280

จึงเรียนมาเพื่อทราบ .....

(นายสงชาย ปิ่มขุนทด)

บริษัท ซีโค่ดีไซน์ แอนด์ บิลดไทย จำกัด









เอกสารขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท ทีดับบลิวคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด
TW CONSTRUCTION & DESIGN COMPANY LIMITED

28 พฤศจิกายน 2567

เรียน โรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (KSL)
เรื่อง แจ้งรายชื่อพนักงานขอเข้าอบรม

ด้วยบริษัท ทีดับบลิวคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด รับงานโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร มีความประสงค์ขออนุญาตพนักงานเมทัลชีทเข้าพื้นที่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายอาเหมี่ยว มายอะ
2.นายกีรติ เสงสกุล
3.นายประจักษ์ หอมประไพย์
4.นายVAB ENG
5.นายKYAW AGE
6.นายKHUN BWAR
7.นายKYAW LWIN
8.นายKHUN MAUNG
9.นาย MONG
10.นางสาวNAN NU


จึงเรียนมาเพื่อทราบโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางสาวฉาชฎา สกุลโกสิน)
บริษัท ทีดับบลิวคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

บริษัท ทีดับบลิวคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด
TW CONSTRUCTION & DESIGN COMPANY LIMITED







เอกสารขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด (Tanita Fabrication Co.,Ltd)
288/92 หมู่ที่ 14 ซอยกิ่งแก้ว 37/4 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

8 พฤศจิกายน 2567

เรียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ

เรื่อง ขอส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรม

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน

ทางบริษัท ทานิตะ แฟบริคชั่น จำกัด ขออนุญาตนำส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรมจำนวน 4 คน เพื่อทำการก่อสร้างโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด จ.สระแก้ว งานอาคารณเตรียมปูนขาว โดยมีรายชื่อดังนี้

1 นายจักรพล หมู่สีเสียด
2 นายไพรัช นรสิงห์
3 นางสาวนงรักษ์ กฤษณาวงษ์
4 นายกฤษณะ แก้วห้อย
5 นายธานวุฒิ บัวกล้า
6 นายเหมราช ฉุ้ยโฉ
7 นายณัฐวุฒิ ทิพย์ปัญญา
8 นายอมรเทพ โพธิ์เข็ม
9 นายชยุต อินทอง



บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด (Tanita Fabrication Co.,Ltd)
288/92 หมู่ที่ 14 ซอยกิ่งแก้ว 37/4 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


8 พฤศจิกายน 2567

ภาคผนวก ข-25

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




สรุปสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน/อุบัติการณ์ในโครงการก่อสร้าง 2567

โครงการก่อสร้าง(บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด)

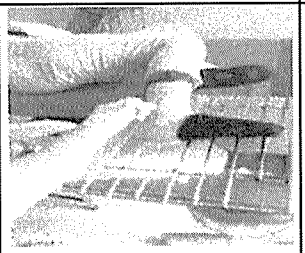ที่	บริษัท	วันที่	รายละเอียด	ภาพประกอบ	ระดับความรุนแรง				แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เล็กน้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
1	ก้องเกียรติ	6 ก.ค. 67	-MR.ROEM CHHAT ขณะขนย้ายเหล็กบนรถบรรทุกเฮี๊ยบ เหล็กบีมที่ขนย้ายกระแทกถูกมือได้รับบาดเจ็บ ***หยุดงาน 1 วัน***			✓			1.ห้ามโดยสารบนรถเฮี๊ยบขณะการขนย้ายชิ้นงาน	
2	ก้องเกียรติ	25 ส.ค. 67	MR.RIM CHHAT ขนย้ายแผ่นเหล็กลงจากรถและเหยียบน็อตสกรูที่อยู่บนพื้นได้รับบาดเจ็บ			✓			1. 5 ส.	
3	KLIM	08 ก.ย 67	นายกุศล ศรีมงคล ขณะเจียรผนังปูนที่อาคาร Cooling Tower เครื่องเจียรหลุดมือ สะบัดโดยขาข้างขวาได้รับบาดเจ็บ เย็บ 7 เข็ม ***หยุดงาน 1 วัน***			✓			1. อบรม/ทบทวนวิธีการทำงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย 2.เลือกใช้อุปกรณ์ PPE (ถุงมือหนัง ปลอกขาหนัง) 3. เมื่อหยุดการใช้งานให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้ง	


สรุปสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน/อุบัติการณ์ในโครงการก่อสร้าง 2567

โครงการก่อสร้าง(บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด)

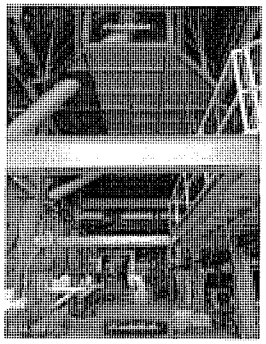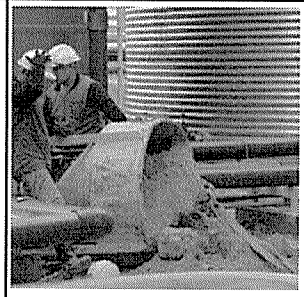ที่	บริษัท	วันที่	รายละเอียด	ภาพประกอบ	ระดับความรุนแรง				แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เล็กน้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
4	KLIM	11 ก.ย 67	นายสาย โคแสงรักษา บ.JKP888 ขณะกำลังนั่งพักอยู่บนนั่งร้านชั้นที่4 อาคาร bagasse house (เป็นช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง) มีอาการคล้ายเป็นลมและหมดสติ ทำการช่วยเหลือด้วยCPR และเครื่องAED ประสานรพ.วัฒนาเข้ารับผู้ป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ***เสียชีวิต***					✓	1. ต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มเข้าทำงาน 2. กำหนดอายุพนักงานที่ทำงานที่สูง และ สวมใส่อุปกรณ์PPEทุกครั้ง 3. ตรวจวัดความดัน เป้าแอลกอฮอล์ ก่อนขึ้นทำงานที่สูง	หัวใจล้มเหลว
5	ก้องเกียรติ	23 ต.ค 67	นายภูริวัฒน์ บรรจง ขึ้นไปขันน็อตวาล์วใต้หม้อเคี่ยว เสียหลักพลัดตกช่องเปิดที่เตรียมไว้สำหรับสอดท่อ ความสูงประมาณ 6 เมตร คนเจ็บมีอาการเลือดไหลออกจากจมูก และนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที***หยุดงาน 2 วัน***				✓		1. อบรมทบทวน safety talk เกี่ยวกับการทำงาน 2. ต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มเข้าทำงาน และตรวจวัดความดัน 3. เน้นย้ำพนักงานที่ทำงานที่สูงให้สวมใส่อุปกรณ์PPEทุกครั้ง	
6	TANITA	17 พ.ย.67	นางจันทร์เพ็ญ สถิตย์เสถียร ขณะโรยทรายรอบอาคาร Water treathmant plant ขาเครนทรุดตัว ทำให้พ็อกเก็ทบรรจุทรายกระแทกแขนข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บ ***หยุดงาน16วัน***					✓	1. จะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ยืนเครนก่อนทุกครั้ง ต้องใช้ตีนช้าง (Outrigger ยันพื้นที่มั่นคงแข็งแรง และใช้แผ่นรองเสมอ) 2. กำชับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปั้นจั่น ไม่ควรยืนอยู่ด้านหน้าสิ่งของ หรือใต้สิ่งของที่กำลังยก	


สรุปสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน/อุบัติการณ์ในโครงการก่อสร้าง 2567

โครงการก่อสร้าง(บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด)

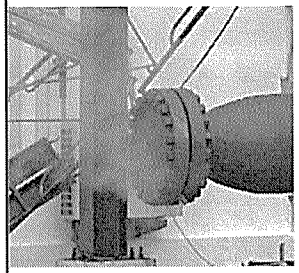ที่	บริษัท	วันที่	รายละเอียด	ภาพประกอบ	ระดับความรุนแรง				แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เล็กน้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
7	KLIM	18 พ.ย. 67	นายอภิชาติ จักรพล ขณะเดินตรวจหน้างานที่อาคาร TG โดนไอน้ำร้อนที่เกิดจากการรั่วไหลของหน้าแปลนได้รับบาดเจ็บ ***ไม่หยุดงาน***			✓			1. จัดให้มีการ์ดครอบหน้าแปลนท่อไอ 2. เมื่อมีการ test ระบบ ให้พนักงานออกจากพื้นที่บริเวณนั้นทุกครั้ง	
8	TW	18 พ.ย. 67	นายปรีชา โสพรม ขณะใช้หินเจียร์ตัดอิฐบล็อกที่กำลังก่อสร้างห้องน้ำของโรงอาหาร ใบเจียร์แตกสบัดมาโดนขาข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บ เย็บ 5 เข็ม ***หยุดงาน3วัน***			✓			1. อบรม/ทบทวนวิธีการทำงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย 2. เลือกใช้อุปกรณ์ PPE (ถุงมือหนัง ปลอกขาหนัง) 3. เมื่อหยุดการใช้งานให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้ง	
9	KSL	9 ธ.ค. 67	นายเสน่ห์ โพลังเศรษฐี พนักงานแผนกหม้อปั่น ขณะเดินไปดูหน้างานในบริเวณจุดนั่งพัก ซึ่งมีผู้รับเหมากำลังขันหัวเชื่อมอยู่ด้านบนทำไขควงหลุดมือหล่นใส่ศรีษะพนักงานได้รับบาดเจ็บ		✓				1. กั้นเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ ที่อาจมีของตกหล่น 2. เน้นย้ำพนง.ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน	

สรุปสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน/อุบัติการณ์ในโครงการก่อสร้าง 2567

โครงการก่อสร้าง(บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด)

ที่	บริษัท	วันที่	รายละเอียด	ภาพประกอบ	ระดับความรุนแรง				แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เล็กน้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
10	วิศวภัณฑ์ วิศวภัณฑ์	18 ธ.ค. 67	นายศรัณยู ศรีเนตร (พนักงานขับรถแทรกเตอร์) ขณะดันกากอ้อย เกิดควันขึ้นบริเวณห้องเครื่องจึงนำรถออกจากกรองกากอ้อยไปยังลาดจอดเกิดไฟลุกไหม้และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้					✓	1. ให้ควบคุมตรวจสอบสภาพรถ การทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นทั้งคันก่อนใช้งาน 2. จัดเวลาในการใช้รถดันกากอ้อยเพื่อไม่ให้รถสะสมความร้อนมากจนเกิดไป 3. ควรมีถังดับเพลิงประจำรถตลอดเวลาปฏิบัติงาน	
รวม		10			1	5	2	2		


น.ส.ปัญจพร สมสา จป.ว ผู้จัดทำรายงาน

ภาคผนวก ข-26

เอกสารแสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับปฐมพยาบาล

รถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ



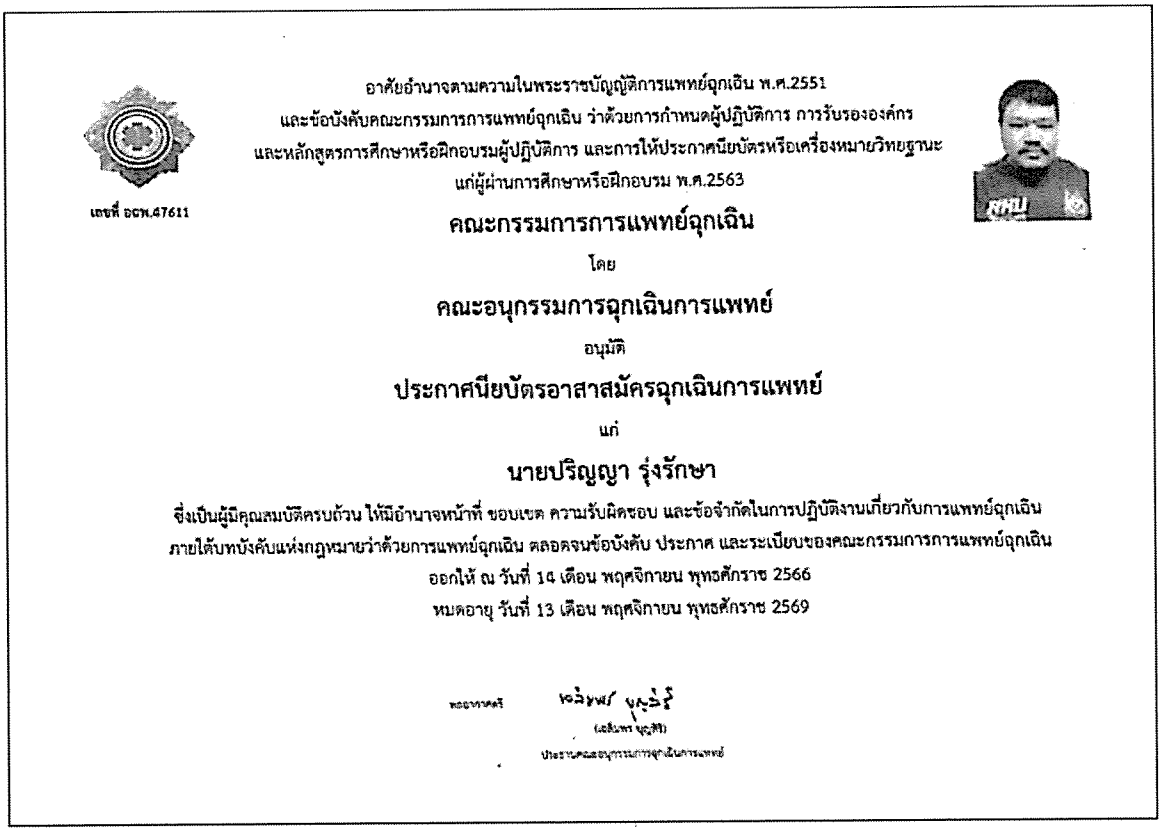

เลขที่ อฉพ.47611

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
และข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กร
และหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.2563

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย

คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

อนุมัติ

ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

แก่

นายปริญญา รุ่งรักษา

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
หมดอายุ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2569

(แสวง บุญมี)
ประธานคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

หน่วยปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์และยา





หน่วยปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์และยา




ภาคผนวก ข-27

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้าง

บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

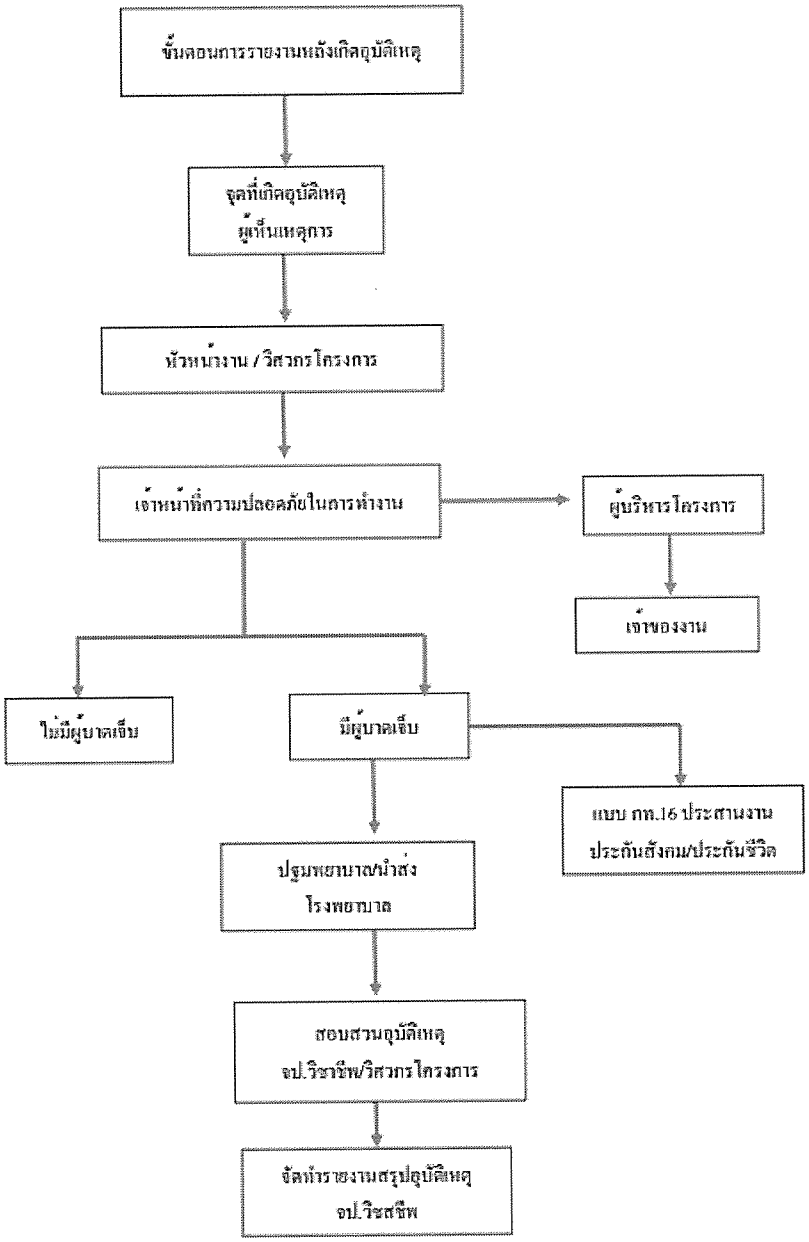


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน


ด้บเพลิง อบต.ผักขะ	097-3203651
ด้บเพลิงวัฒนานคร	089-9392898
สายด่วนด้บเพลิง	037-261221 ต่อ 4 199
โรงพยาบาลวัฒนานคร	037-261270 , 1669
สถานีตำรวจวัฒนานคร	037-261499
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	037-261399
การประปาวัฒนานคร	037-261405

KLIM (THAILAND)	**เอกสารสนับสนุน** (Supporting Documents)	หมายเลขเอกสาร : SD-SAF-01
		แก้ไขครั้งที่ : 00
	แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของโครงการ (Project Safety Plan)	หน้า : 41 of 72
		วันที่อนุมัติใช้ : มิถุนายน 2567

แนวทางปฏิบัติรับเหตุฉุกเฉิน

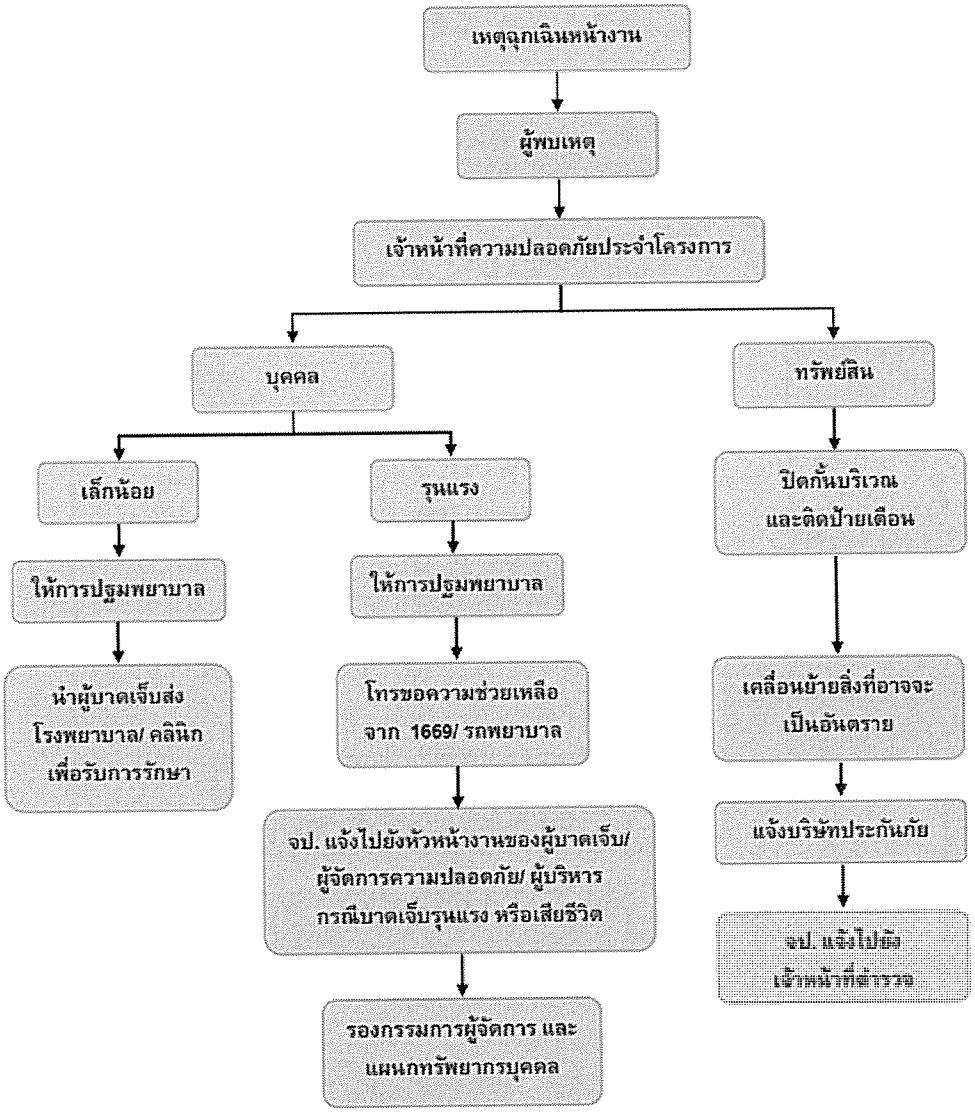


แผนผจญเพลิง

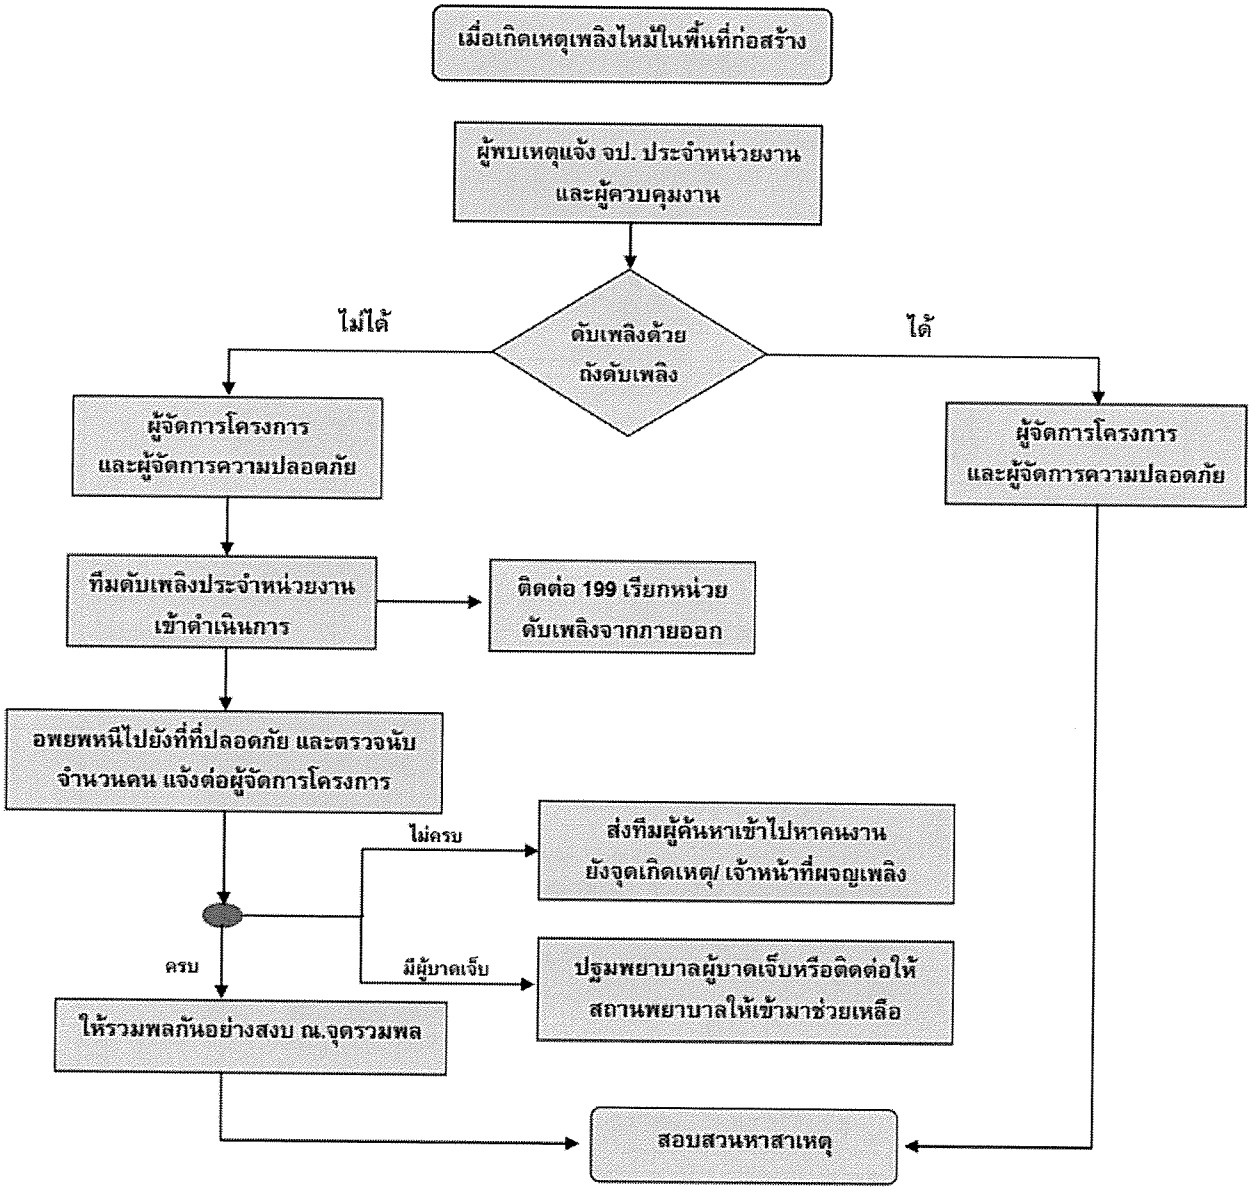

หมายเหตุ : เมื่อเหตุการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องจัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์

การติดต่อสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของ

บริษัท คุณหมิง ไลท์อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

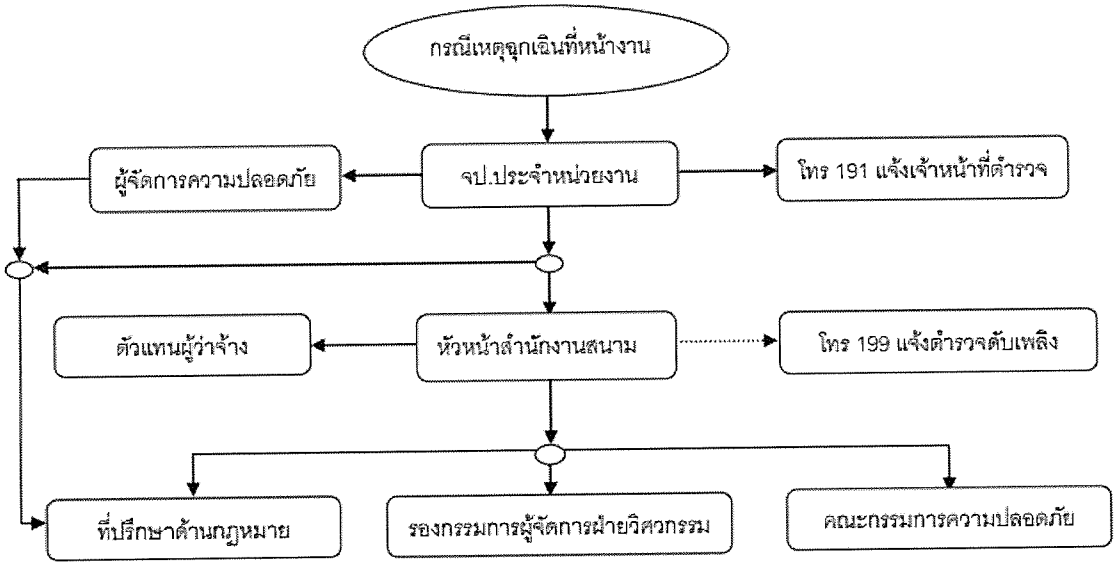

จุดเชื่อมต่อ

เส้นทางหลักการติดต่อสื่อสาร

เส้นทางเลือกการติดต่อสื่อสาร

บุคลากรของ บริษัทคุณหมิง อินดัสตรี แมชชินเนอร์ยี่ (ประเทศ)ไทย จำกัด

บุคลากรภายนอกของ บริษัทคุณหมิง อินดัสตรี แมชชินเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด

10.6 ขั้นตอนการปฏิบัติ

ในกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนแผนกทรัพยากรบุคคลของโครงการเป็นผู้ดำเนินการดังนี้

10.6.1 ไปยังที่เกิดเหตุโดยด่วน

10.6.2 แจ้งผู้จัดการโครงการ/ แจ้งแผนกทรัพยากรบุคคล/ แจ้งผู้จัดการความปลอดภัย

10.6.3 แจ้งแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดเตรียมเอกสารมอบอำนาจให้ผู้แทนแผนกทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

10.6.4 ติดต่อโรงพยาบาลตำรวจ นำศพส่งสถาบันนิติเวช และสถานีตำรวจท้องที่เพื่อยุติกรณีติดต่อญาติผู้ตายเพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศล

10.6.5 นำเสนอขอความช่วยเหลือตามเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยใช้หลักฐานใบมรณะบัตร พร้อมทั้งเตรียมเอกสารรับรองเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อให้ญาตินำไปที่สำนักงานประกันสังคม

10.6.6 ในส่วนของบริษัท ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือญาติผู้ตาย ร้องขอผ่านทางผู้จัดการโครงการ ซึ่งทางผู้จัดการโครงการ ติดต่อโดยตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว ให้ทางแผนกทรัพยากรบุคคลช่วยทำ เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือ ส่งต่อไปยังฝ่ายบัญชี และการเงินต่อไป

การฝึกอบรมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน





การฝึกอบรมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน





การฝึกอบรมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



ภาคผนวก ข-28

การประสานงานกับ อปพร. ของ อบต. ผักขะ ในด้านความปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
☑ สำนักปลัด งาน.....
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา

ที่ วน. 002/2566 วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
เลขรับที่ ๒๑๔๖
วันที่ 10 / พ.ย. / ๖๖
เวลา 16.00 น. น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

ด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างส่วนต่างๆ ภายในโครงการฯ ซึ่งในปัจจุบันแผนงานการก่อสร้างต่างๆ ได้มีความก้าวหน้าไปเป็นลำดับ และระหว่างการก่อสร้างมีพนักงาน เครื่องจักร รถยนต์ประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา และตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดให้โครงการฯ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรื่องต่างๆ นั้น

ทางโครงการฯ จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่าน สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ EIA ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เลาหวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

ภาคผนวก ข-29

ทะเบียนประวัติแรงงาน

สรุปจำนวนคนงานทั้งหมดของแต่ละบริษัท

ที่	บริษัท	จำนวน
1	บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	202
2	พนักงานชั่วคราว	70
3	พนักงานจ้างเหมา	60
4	บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	259
5	บริษัท ทานิดะ แฟบริเคชั่น จำกัด	70
6	บริษัท ฟุกเฮงหลง จำกัด	66
7	บริษัท ชูล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	11
8	บริษัท ดีมายเอออร์ จำกัด	21
9	บริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด	19
10	บริษัท เพาเวอร์ พีค เทคโนโลยี จำกัด	57
11	บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10
12	หจก.ยูนิไฟด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	25
13	บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด	24
14	บริษัท ทีดับบลิว คอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด	7
15	บริษัท โซลิดวัน จำกัด	8
ยอดทั้งหมด		**909**

ภาคผนวก ข-30

เอกสารแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ประกาศที่ วน.01/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานรับเรื่องร้องเรียน การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ การระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการดำเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนั้น

ทางโครงการฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน” ขึ้น ดังรายนามต่อไปนี้

[redacted]

ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนงานรับเรื่องร้องเรียน ระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ
2. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุ วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียนตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จากข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
4. เร่งรัด ติดตาม และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทราบ
5. ชี้แจงการดำเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ [redacted]

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาคผนวก ข-31

เอกสารประสานกับสถานีตำรวจในการป้องกันปราบปรามด้านต่างๆ ในช่วงก่อสร้าง



ที่ ตช. ๐๐๑๗.(๑๐)(๑๒)/๓๔๗๖

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามหนังสือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ วน. ๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็คทรอนิคส์) บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราความเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถป้องปรามเหตุอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกจราจรได้ นั้น

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์) ณ บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


พันตำรวจเอก [redacted]


ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร

งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
โทร. ๐-๓๗๒๖-๑๕๐๗-๘
โทรสาร ๐-๓๗๒๖-๑๔๙๙

8/11/66

การติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)

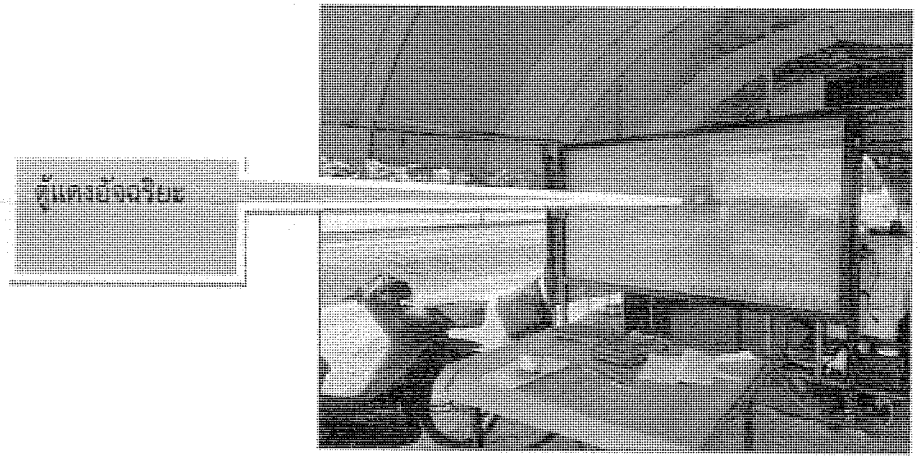

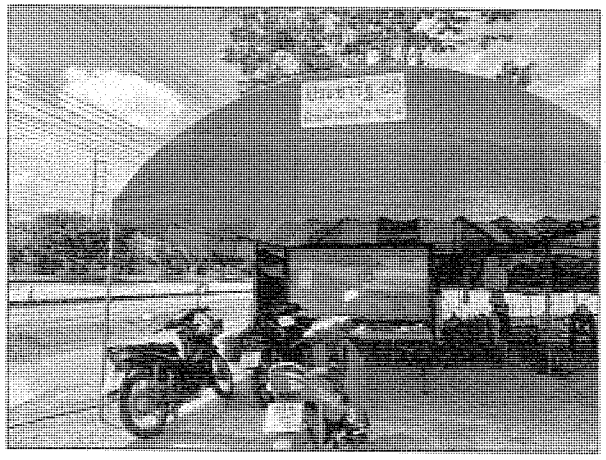

ภาคผนวก ข-32

เอกสารแต่งตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ประกาศที่ วน.02/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นั้น ทางโครงการฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานประชาสัมพันธ์” ขึ้น ดังรายนามต่อไปนี้



ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร
3. กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม
4. ติดประกาศบริเวณหน้าพื้นที่โครงการและชุมชน เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ
5. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในรัศมี 0-5 กิโลเมตร หรือประชุมร่วมกับเทศบาล/อบต. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง เพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการให้กับชุมชน
7. กำกับดูแลมิให้คนงานของโครงการ รบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่น
8. รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ_[redacted]_

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่


สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาคผนวก ข-33

การเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
- โดยมี นายกองเงิน สวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม นายสนั่น บุนนาก กรรมการ EIA พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 40 คน

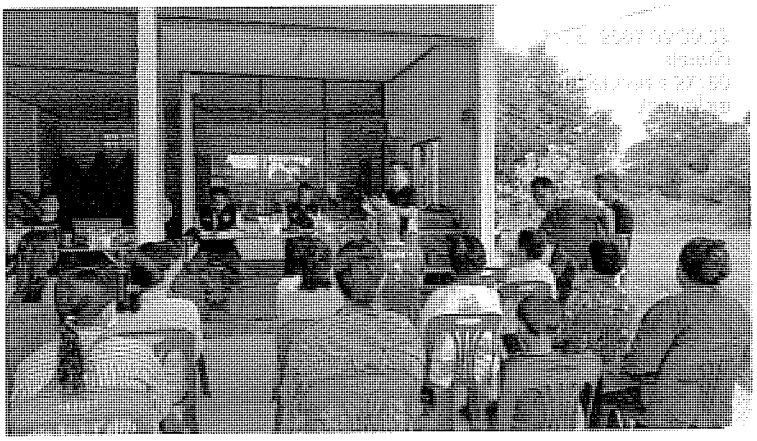

We are Natural Energy Innovation for All

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
- โดยมี นางละมูล แม่นปืน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม กำนันตำบลผักขะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3,9,10,11,12 ต.ผักขะ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 50 คน



We are Natural Energy Innovation for All

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
- โดยมี นายทองสา ประสังกุล์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 40 คน




New Kwang Soon Lee Sugar

We are Natural Energy Innovation for All

VDO เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
- โดยมี นายมานิตย์ กิตติยานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม นายกันหา วันแก้ว กรรมการ EIA พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 40 คน

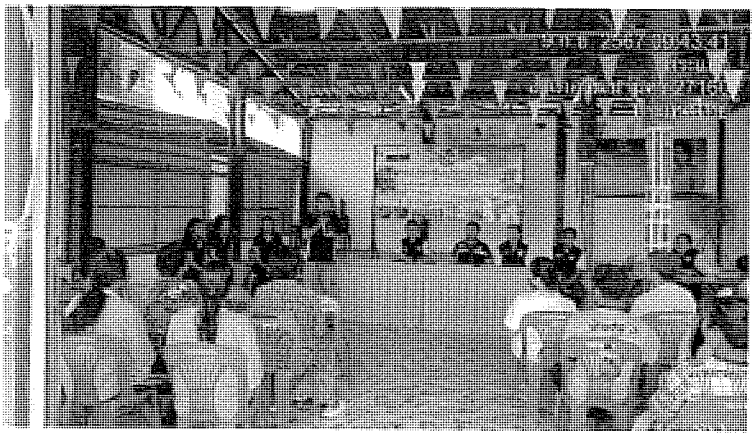

New Kwang Soon Lee Sugar

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
- โดยมี นายเกียรติรัฐพล หันทะยุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม นายสมพงษ์ กันชื่อ กรรมการ EIA พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 40 คน



We are Natural Energy Innovation for All

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 10 กันยายน 2567
- โดยมี นายวุฒิ ประกอบผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม นายบุญพิทักษ์ วายลม กรรมการ EIA พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 50 คน



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลาหมู่บ้าน
- โดยมี นายทำนอง สังข์ชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง เป็นประธานการประชุม นายวัลลภ บุญณะอินทร์ กรรมการ EIA พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 40 คน



We are Natural Energy Innovation for All

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน
- โดยมี นายธงชัย ตั้งเทียมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ต.วัฒนานคร เป็นประธานการประชุม นายสุทิน แหวนสูงเนิน กรรมการ EIA พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 25 คน



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 19.00 น.
- โดยมี นายสามารถ โสมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว ต.วัฒนานคร เป็นประธานการประชุม นายบุญถือ เกื้อกูล กรรมการ EIA พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 50 คน



ภาคผนวก ข-34

การตรวจสุขภาพพนักงานและคนงานก่อสร้าง

สรุปผลตรวจสุขภาพพื้นฐานคนงานก่อสร้าง ก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง

เลขที่บัตรโรงพยาบาล
670411385

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
วันที่ตรวจ 4 มิถุนายน 2567

ชื่อ Mr.HENG KIMHOUR เพศ ชาย
เลขที่บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย 0108708759153 passport_no
สัญชาติ กัมพูชา เชื้อชาติ กัมพูชา อายุ 32 ปี
วันเดือนปีเกิด 4 เมษายน 2535 ชื่อนายจ้าง นายเกษม เมืองงาม
ที่อยู่นายจ้าง 62 ม.6 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ที่อยู่ต่างประเทศ กัมพูชา

ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 155 ซม. น้ำหนัก 54 กก.
ความดันโลหิต 98 / 62 มม.ปรอท ชีพจร 74 ครั้ง/นาที.
ตาสีผิว เสภาพร่างกายจิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรคปอดระยะติดต่อ	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐	ไม่	☐	ตั้งครรภ์		
ผลการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยวิธี RT PCR	☐	ไม่พบเชื้อ	☐	พบเชื้อ		

สรุปผลการตรวจสุขภาพ
☑ 1. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพแต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา
☐ 3. ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก
☐ 3.1 สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
เพราะ.....
☐ 3.2 เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

แพทย์ผู้ตรวจ
นพ.อุดม จันทามงคล
(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) ประทับตราโรงพยาบาล

เลขที่บัตรโรงพยาบาล
670411386

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
วันที่ตรวจ 4 มิถุนายน 2567

ชื่อ Mr.CHHIT RANN เพศ ชาย
เลขที่บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย 0103703638609 passport_no
สัญชาติ กัมพูชา เชื้อชาติ กัมพูชา อายุ 30 ปี
วันเดือนปีเกิด 15 กันยายน 2536 ชื่อนายจ้าง นายเกษม เมืองงาม
ที่อยู่นายจ้าง 62 ม.6 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ที่อยู่ต่างประเทศ กัมพูชา

ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 155 ซม. น้ำหนัก 54 กก.
ความดันโลหิต 102 / 59 มม.ปรอท ชีพจร 76 ครั้ง/นาที.
ตาสีผิว เสภาพร่างกายจิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรคปอดระยะติดต่อ	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	☐	ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐	ไม่	☐	ตั้งครรภ์		
ผลการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยวิธี RT PCR	☐	ไม่พบเชื้อ	☐	พบเชื้อ		

สรุปผลการตรวจสุขภาพ
☑ 1. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพแต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา
☐ 3. ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก
☐ 3.1 สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
เพราะ.....
☐ 3.2 เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

แพทย์ผู้ตรวจ
นพ.อุดม จันทามงคล
(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) ประทับตราโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวัฒนานคร ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ชื่อนายจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูล่า เอ็นจิเนียริ่งไทร. 0816403214

ติวที่ 5

ตรวจ ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☑ 1 ปี ☐ 2 ปี นติ ครม ☐ 2 ปี OSS
ต่อบัตร ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ 1 ปี ☐ 2 ปี นติ ครม ☐ 2 ปี OSS

☐ เปลี่ยนนายจ้าง วันที่มาตรวจ - 7 มิ.ย. 2567
☐ ผู้ติดตาม(0-7ปี) รับใบรับรองแพทย์, บัตรประกัน วันที่ 10 มิ.ย. 2567

หมายเหตุ : รับใบรับรองแพทย์ภายใน 2 วัน เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ซื้อบัตรประกัน ใช้สิทธิได้หลังขึ้นทะเบียน 15 วัน
ต่อบัตรประกัน มาต่อล่วงหน้า 15 วัน
ติดต่อสอบถาม ไทร. 037261772-4 ต่อ 804

(4)

8-ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ('41003')		170.00
12-ค่าบริการทางพยาบาล (")	1,600.00	
รวม	1,930.00	170.00
ชำระเงินสด (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	รวมเงิน	2,100.00

(ตัวหนังสือ)
ลงชื่อ.....นางศิลารัตน์ ปาสาจะ.....ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เล่มที่ 404
เลขที่ 0499


ใบเสร็จรับเงิน
โรงพยาบาลวัฒนานคร กระทรวงสาธารณสุข
231 หมู่ 11 ถ.วัฒนา-แซร์ธอ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โทร. 0 3726 1772-5


วันที่ 7 มิถุนายน 2567
เลขประจำตัวผู้ป่วย 000242856 ชื่อ นายราวิดRAVITH ฮีVY
โรค ประเภทผู้ป่วย : ผู้ป่วยนอก

รายการ	จำนวนเงิน (บาท) เบิกไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	เบิกได้
7-ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (")	330.00	
8-ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ('41003')		170.00
12-ค่าบริการทางพยาบาล (")	1,600.00	
รวม	1,930.00	170.00
ชำระเงินสด (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	รวมเงิน	2,100.00

(ตัวหนังสือ)
ลงชื่อ.....นางศิลารัตน์ ปาสาจะ.....ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลตรวจสุขภาพพื้นฐานคนงานก่อสร้าง ก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง

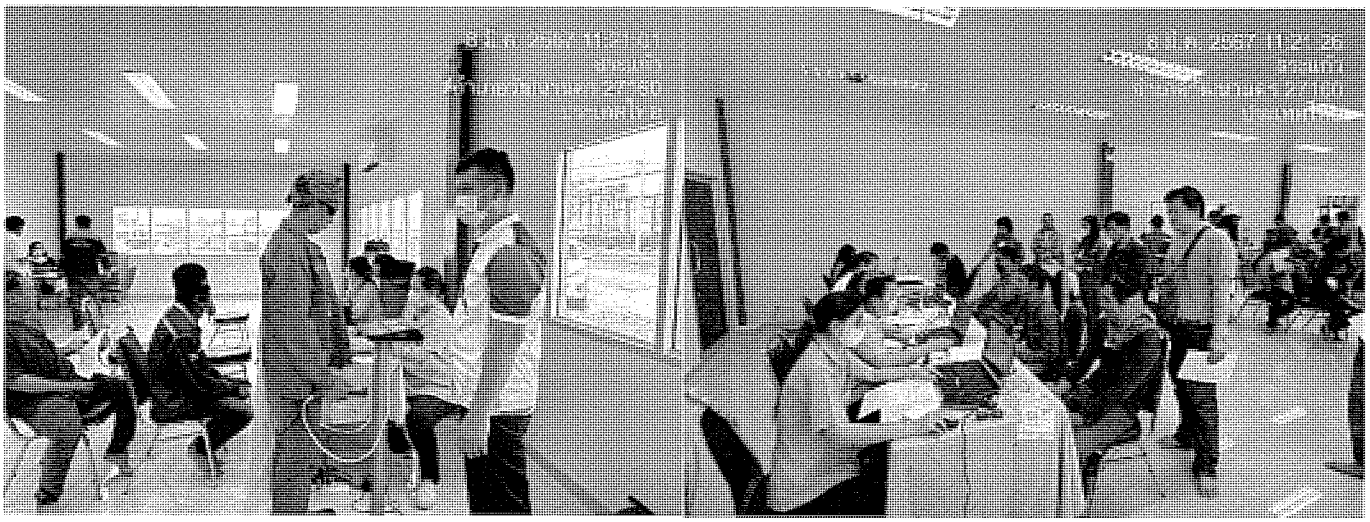

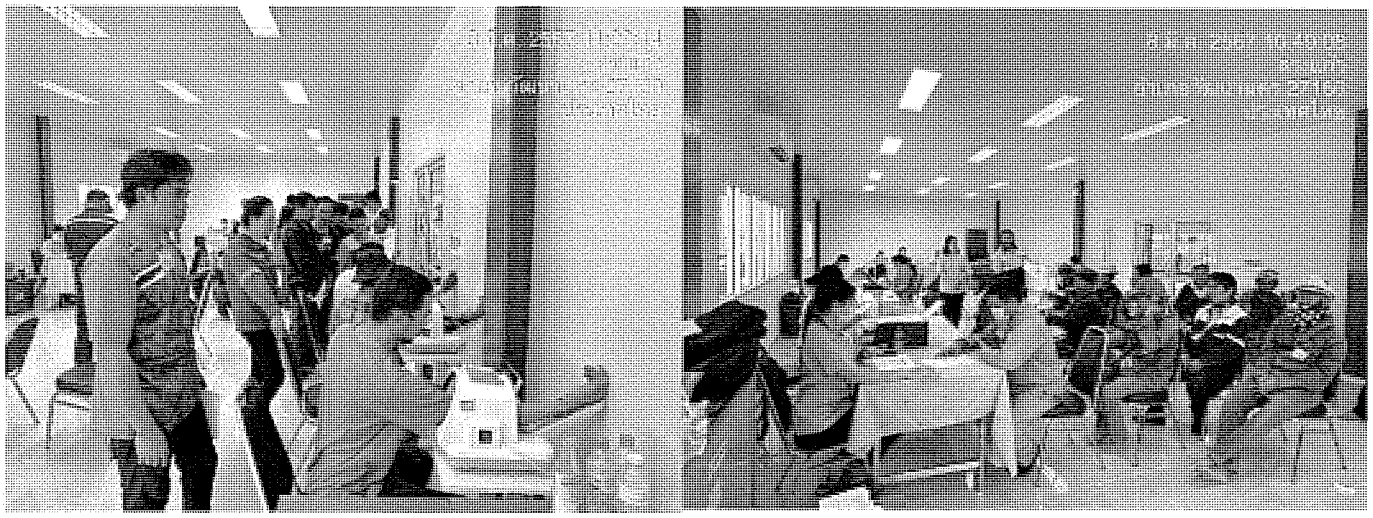




KASEMRAD
INTERNATIONAL HOSPITAL
RATTANATHIBETH

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

วันที่ตรวจ 12 กรกฎาคม 2567

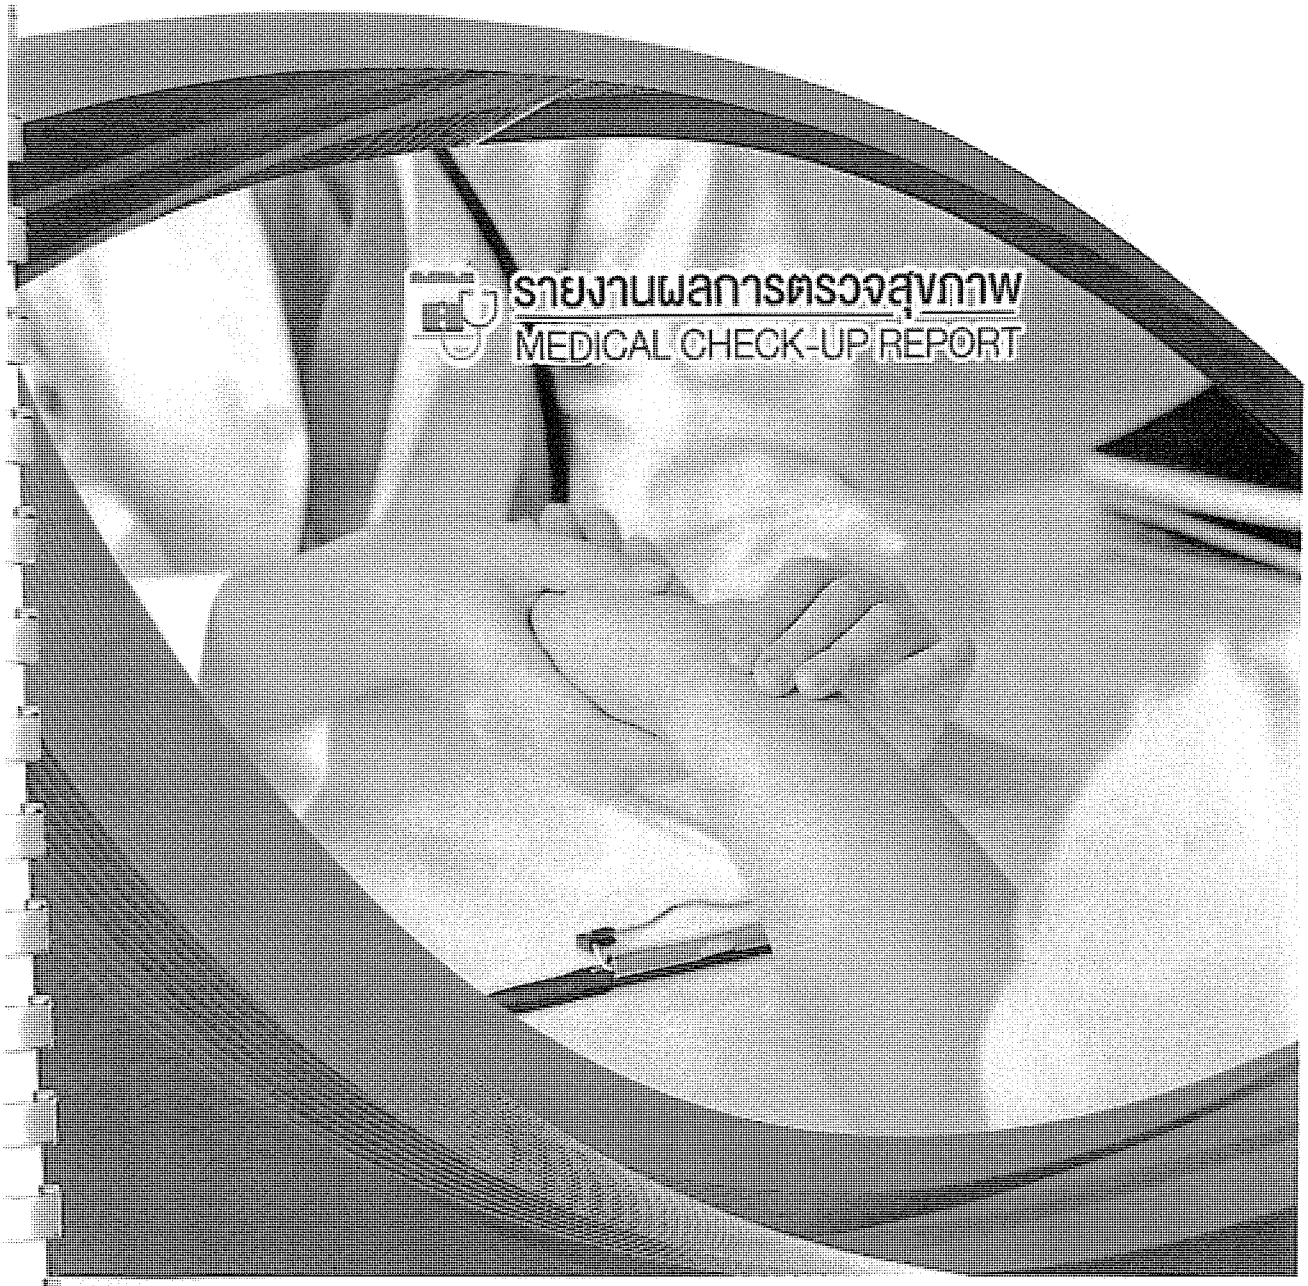

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
1216 2 02 594 0020-65 1936
E-Mail : Kasemrad_mk@yahoo.com

Scanned with CamScanner

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATIBETH

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด (Rattanatibeth General Hospital co.,ltd.)
60 หมู่ 6 ถ.กลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
www.kasemrad.co.th/interrattanatibeth www.facebook.com/rtbinter
Call Center 1218 TEL 02 594 0020-65 FAX 02 594 0067

หนังสือรับรองผลการตรวจสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรอง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้ทำการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2567 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 กระทำการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตที่ 10201022645 ดำเนินการโดย บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้ทำการสรุปผล และรวบรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองผลการตรวจสุขภาพว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงในเรื่องมาตรฐานในการบริการ และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในเรื่องการตรวจการบันทึกการแจ้ง และรายงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกจ้าง และมาตรฐานด้านวิชาการทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาววันลยา ปทาน)
หัวหน้าหน่วยบันทึกข้อมูลและรายงานผล

.....

(นพ.จิรเมธ พจน์จริยาพร)

.....

น.พ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Scanned with CamScanner

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ่นหลี จำกัด ประจำปี 2567							
โปรแกรมการตรวจ							
รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	97	0	100.0	0.0	14	97	111
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)	96	1	99.0	1.0	14	97	111
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	57	41	58.2	41.8	13	98	111
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	87	9	90.6	9.4	15	96	111
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	86	12	87.8	12.2	13	98	111
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	37	61	37.8	62.2	13	98	111
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	59	39	60.2	39.8	13	98	111
ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)	95	3	96.9	3.1	13	98	111
ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)	77	21	78.6	21.4	13	98	111
ตรวจการทำงานของไต (Bun)	95	3	96.9	3.1	13	98	111
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	90	8	91.8	8.2	13	98	111
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	94	4	95.9	4.1	13	98	111
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	85	13	86.7	13.3	13	98	111
ตรวจเกาต์ (Uric)	62	36	63.3	36.7	13	98	111
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)	97	1	99.0	1.0	13	98	111
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	18	4	81.8	18.2	2	22	24
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	68	29	70.1	29.9	14	97	111
ดัชนีมวลกาย (BMI)	25	72	25.8	74.2	14	97	111

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



12 ก.ค. 2567 08:00:03
สิริมงคล
อำเภอวัฒนานคร 27160
ประเทศไทย

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

ภาคผนวก ข-35

บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกโครงการ

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก KSL

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กวยเ	5ขผ-5805	พิชิตชา	0545	1934	2	มหิกานต์
2	ตู้	1ผค-3758	สมชัติ	0549	0554	4	มหิกานต์
3	กระบะ	บห-6029	ไชยชัย	0629	1732	1	เศรียเปรมรัฐ
4	กอเ	ขค-5105	กฤษดา	0639	2130	5	มหิกานต์
5	เก๋ง	ขม-9221	กฤษณะ	0643	1944	1	มหิกานต์
6	เก๋ง	9กฌ-7442	วิฒน์	0702	1954	1	มหิกานต์
7	กอเ	ขผ-2051	กฤษดา	0708	1706	2	มหิกานต์
8	ตู้เย็น	ขย-3339	ชูชาติ	0709	1853	1	มหิกานต์
9	กอเ	ผก-7535	ชัยศักดิ์	0712	1710	2	มหิกานต์
10	กอเ	3ท-5294	ชัชชัย	0712	1705	2	มหิกานต์
11	กอเ	ขผ-3529	มนตรี	0714	1907	1	มหิกานต์
12	กอเ	ขว-9009	สุวิมล	0716	1905	1	มหิกานต์
13	กอเ	ขก-6684	ชาญชัย	0717	1906	1	มหิกานต์
14	กอเ	กห-589	ธรชัยชัย	0734	1946	1	มหิกานต์
15	เก๋ง	กม-1145	ปิยะศักดิ์	0735	1505	1	มหิกานต์
16	เก๋ง	กอ-9709	เกรียงศักดิ์	0736	1525	2	มหิกานต์
17	เก๋ง	กห-1525	สุชาติ	0736	1742	1	มหิกานต์
18	เก๋ง	ฝผ-7035	ปิยะทัศน์	0738	1718	1	มหิกานต์
19	กอเ	3ฌข-4739	ปกหัป	0739	2111	2	ผู้ขับขี่เดิร์	
20	กอเ	บอ-3639	สุรัยา	0740	1706	1	มหิกานต์
21	เก๋ง	4กฌ-1498	ณย. เหมือน	0741	1624	1	มหิกานต์
22	เก๋ง	ขย-3042	มงคลชัย	0742	1705	2	มหิกานต์
23	กอเ	3ฌล-5547	ฮิทอ	0742	1716	1	มหิกานต์
24	เก๋ง	กห-9632	ปุ่ง มอก	0742	1727	2	มหิกานต์
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		39	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก KSL

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กวบ	3ฌฆ-9688	มงคุณวรรณ	0742	1709	1	มหิกานต์
2	เก๋ง	กห-184	ณัฐวุฒิ	0745	1705	1	มหิกานต์
3	เก๋ง	ขล-5510	ชัยชัย	0645	1659	2	มหิกานต์
4	กอเ	กบ-1543	มอส	0745	1829	1	มหิกานต์
5	กอเ	4ขข-7642	ไชยชัย	0746	1954	2	มหิกานต์
6	เก๋ง	ขฉ-3885	อ. เพื่อ	0748	1711	1	มหิกานต์
7	ตู้เย็น	1กต-9338	ธิดาพา	0748	1729	1	มหิกานต์
8	ตู้เย็น	1กจ-1946	ภูมินทา	0749	1804	1	มหิกานต์
9	เก๋ง	3ฝง-6196	สกุลรัตน์	0750	1210	1	ผู้ขับขี่เดิร์
10	เก๋ง	บห-5155	ธีรัช	0751	1823	2	มหิกานต์
11	เก๋ง	กอ-6780	เกษรินา	0755	1707	1	มหิกานต์
12	กวบ	4ขต-2346	ชัยชัยณ์	0756	1924	1	มหิกานต์
13	กอเ	ยอ 6416	อดิศักดิ์	0756	1714	1	มหิกานต์
14	เก๋ง	ขง-3865	เกษรา	0757	1752	1	มหิกานต์
15	กวบ	กห-7983	ศุภโชค	0757	1707	1	มหิกานต์
16	เก๋ง	5ขผ-6581	ศิตศ์ ศศิกร์	0758	2325	2	มหิกานต์
17	กอเ	งล-3945	มกามล	0759	1949	1	มหิกานต์
18	กวบ	ขห-4102	ศิลปาณ์	0759	1923	1	มหิกานต์
19	มอ	6กอ-9821	ไข่	0801	1752	1	มหิกานต์
20	เก๋ง	กจ-2512	พิมพวรรณ	0803	1716	1	มหิกานต์
21	เก๋ง	2ขค-8480	มณพร	0812	1920	2	มหิกานต์
22	เก๋ง	ตห-2435	เพ็ญ	0813	1848	2	มหิกานต์
23	เก๋ง	รขจ-3806	วันชัย	0816	1454	1	ผู้ขับขี่เดิร์
24	กวบ	3ฌล-2113	สมชุมณ์	0819	1902	6	มหิกานต์
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		34	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก KSL

วันที่ 29-11-64

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	บข-1894	สุรัช	0830	1836	1	มาทำงาน
2	ตู้	ผง-2906	อรินทร	0820	1220	7	มาทำงาน
3	เก๋ง	ฮพพ-357	ปิยพัฒน์	1445	1637	2	มาทำงาน
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		10	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท ลูกค้า

วันที่ 29-11-64

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	ขต-7214	สมชาย	0641	1734	4	มาทำงาน
2	เก๋ง	4งง-4917	ธงชัย	0644	1740	1	มาทำงาน
3	จยย.	3กฒ-1666	ณพ.ชินทร์	0649	0850	1.	มาทำงาน
4	เก๋ง	4กต-2128	สุดใจทอง	0650	1836	1.	มาทำงาน
5	เก๋ง	3ข-2605	บุญส่ง	0651	1852	3	มาทำงาน
6	กระบะ	ผอ-3168	สามารถ	0704	1856	8	มาทำงาน
7	เก๋ง	ฆผ-2178	ปรมาภรณ์	0707	1652	2.	มาทำงาน
8	กระบะ	ผม-3849	อุทัย	0707	1812	4	มาทำงาน
9	กระบะ	บง-2257	มั่นทาง	0711	1831	2	มาทำงาน
10	กระบะ	4ขพ-4152	สมบัติ	0711	1817	2	มาทำงาน
11	เก๋ง	กอ-2256	ไพฑูรย์	0712	1830	1	มาทำงาน
12	กระบะ	3ฒ4-6862	สายรัก	0715	1734	6	มาทำงาน
13	กระบะ	กพ-6614	กลวัทย์	0717	1830	2	มาทำงาน
14	กระบะ	ขอ-5943	วิโรจน์	0718	1756	2	มาทำงาน
15	กระบะ	1ขพ-356	สมพง	0719	1851	6.	มาทำงาน
16	กระบะ	นม-5222	สายธาร	0719	1742	3	มาทำงาน
17	กระบะ	นง-7975	ปัญจันทร์	0720	1913	2	มาทำงาน
18	กระบะ	งค-1840	ปรีดิ์	0724	1843	3	มาทำงาน
19	กระบะ	กย-9196	มานพ	0722	1913	5	มาทำงาน
20	กระบะ	กอ-7316	จักรินทร์	0723	1910	3	มาทำงาน
21	กระบะ	นน-4172	ศิริชัย	0723	1843	10.	มาทำงาน
22	เก๋ง	นห-836	ณัฐพงศ์	0723	1810	1	มาทำงาน
23	กระบะ	กอ-8172	ศราวุฒ	0723	1813	4	มาทำงาน
24	กระบะ	2ผง-5382	วิรัตน์	0725	1216	4	มาทำงาน
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		80	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท โกลิม

วันที่ 29-11-64

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กวาน	ก- 1296	สมัย อาวอย	0725	1814	1	มนทกาน
2	กวาน	ผว-2585	จันสกิตย์	0725	1845	4	มนทกาน
3	กวาน	ขต. 6329	ทอง แสง	0726	1786	6	มนทกาน
4	กวาน	ผศ-8093	กวัน	0727	1830	12	มนทกาน
5	กวาน	ผท-5256	สวิต	0727	1914	3	มนทกาน
6	กวาน	ผว-4853	แหลม ทอง	0728	1815	15	มนทกาน
7	กวาน	ลพบ-8184	สุพลกาน	0729	1830	2	มนทกาน
8	กวาน	ขว-6970	พงษ์พันธ์	0730	1832	6	มนทกาน
9	เกิ้ง	กห-7210	ปอง พล	0733	1835	1	มนทกาน
10	กวาน	ขค-2042	มิ ชัย	0730	1830	6	มนทกาน
11	กวาน	ลพบ-8262	อภิชาติ	0731	1750	4	มนทกาน
12	กวาน	ขท-1162	สัง หกิต์	0731	1834	2	มนทกาน
13	กวาน	ชกต-5913	ไทสล	0731	1812	2	มนทกาน
14	กวาน	ขค-8218	ชูชาติ	0732	1825	2	มนทกาน
15	เกิ้ง	กต-8030	อภิชา	0832	1906	1	มนทกาน
16	กวาน	ขค-6981	สำเนาะ	0733	1719	1	มนทกาน
17	กวาน	ผว-3314	สุวิจวงศ์	0734	1930	4	มนทกาน
18	กวาน	ผท-4196	สมาน	0736	1934	3	มนทกาน
19	กวาน	ลพบ-6835	อิศรเดช	0736	1712	6	มนทกาน
20	กวาน	ผค-3962	อภิชัย	0737	1938	4	มนทกาน
21	กวาน	ขค-2562	ชูชัน	0738	1912	5	มนทกาน
22	กวาน	ขค-4962	สิริพงศ	0738	1925	9	มนทกาน
23	กวาน	ขว-8094	ไชยา	0739	1839	6	มนทกาน
24	กวาน	ขห-7285	ลัดย	0739	1848	12	มนทกาน
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		194	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ สุริยา สุวรรณ์ ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท โกลิม

วันที่ 29-11-64

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กวาน	ขย-6308	ธนชา	0739	1856	11	มนทกาน
2	กวาน	ขพ-2417	อดิศักดิ์	0739	1853	4	มนทกาน
3	กวาน	ขอ-7059	สวัสดิ์	0740	1750	4	มนทกาน
4	เกิ้ง	กล-2772	หงษ	0740	1856	2	มนทกาน
5	กวาน	ผท-1445	มนตรี	0741	1910	2	มนทกาน
6	เกิ้ง	ฉบ-4136	ขจร	0741	1715	1	มนทกาน
7	กวาน	กต-8883	อำพร	0741	1722	1	มนทกาน
8	กวาน	กท-3157	ตาล	0741	1710	2	มนทกาน
9	เกิ้ง	ขล-8712	สำอาง	0741	1718	1	มนทกาน
10	กวาน	ขห-6011	บุญมาก	0743	1812	4	มนทกาน
11	กวาน	ขท-6214	สมพงษ์	0744	1710	8	มนทกาน
12	กวาน	ขอ-6759	แสวัน	0747	1712	4	มนทกาน
13	กวาน	กล-4760	ถนอม	0747	1706	6	มนทกาน
14	กวาน	ลพบ-8697	อรพงษ์	0747	0705	3	มนทกาน
15	กวาน	ขศ-3536	สมิธิชา	0748	1814	1	มนทกาน
16	กวาน	ขว-6744	สงวงศ์	0748	1818	4	มนทกาน
17	กวาน	ขห-606	ปุยพันธ์	0749	1740	4	มนทกาน
18	กวาน	กข-990	ชัญญา	0750	1810	3	มนทกาน
19	กวาน	ขท-5406	พงษ พิไชย	0751	1814	1	มนทกาน
20	เกิ้ง	กอ-9412	สมร	0751	1735	5	มนทกาน
21	กวาน	ลพบ-9442	อรกุล	0751	1734	6	มนทกาน
22	กวาน	ผห-7631	สมพงษ์	0752	1730	7	มนทกาน
23	กวาน	ขค-1910	ศิริชัย	0752	1734	4	มนทกาน
24	กวาน	ลพบ-3198	ชัญญา	0753	1714	3	มนทกาน
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		97	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ สุริยา สุวรรณ์ ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท 6ดวิน

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	บธ-1216	ไพบูลย์	0739	1748	8	มนุษยนาค
2	เก๋ง	ขกอ-407	บุรินทร์	0734	1850	1	มนุษยนาค
3	กระบะ	ขน-3941	สุพจน์	0755	1848	4	มนุษยนาค
4	กระบะ	บย-9770	สรัญรัตน์	0755	1980	5	มนุษยนาค
5	กระบะ	ก-4112	กฤษดา	0759	1730	1	มนุษยนาค
6	เก๋ง	2กย-6688	สมศักดิ์	0738	1702	3	มนุษยนาค
7	กระบะ	บต-7586	ชนะ	0800	1712	2	มนุษยนาค
8	กระบะ	1ฒย-220	สัยณวงศ์	0800	1835	4	มนุษยนาค
9	กระบะ	บน-1279	สิริพนธ์ชัย	0801	1827	3	มนุษยนาค
10	กระบะ	6กก-4473	ชาญชัย	0801	1712	1	มนุษยนาค
11	กระบะ	ผน-7181	เอนก	0804	1910	1	มนุษยนาค
12	กระบะ	กอ-5434	ปนเปรม	0805	1816	2	มนุษยนาค
13	กระบะ	บย-2364	อิทธินันท์	0806	1756	6	มนุษยนาค
14	เก๋ง	4ขฒ-9235	ชนาธิป	0809	1850	1	มนุษยนาค
15	เก๋ง	2กฒ-3486	ชัชฎา	0810	1840	1	มนุษยนาค
16	กระบะ	บต-9481	สงวน	0811	1718	2	มนุษยนาค
17	กระบะ	กอ-5993	ชีรชัย	0813	1735	2	มนุษยนาค
18	กระบะ	3ตง-3082	ไพรัตน์	0813	1925	2	มนุษยนาค
19	กระบะ	4กบ-7656	สำเร็จ	0814	1912	1	มนุษยนาค
20	กระบะ	บธ-843	สิทธิ์พงษ์	0814	1718	5	มนุษยนาค
21	กระบะ	กน-3611	วิโรจ	0815	1912	1	มนุษยนาค
22	เก๋ง	4ขฒ-2292	ศิริเดช	0819	1912	1	มนุษยนาค
23	เก๋ง	3ขฒ-3531	พรเพ็ญ	0821	2136	2	มนุษยนาค
24	กระบะ	ขน-2330	วรุฒ	0821	1820	4	มนุษยนาค
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		63	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ สำเร็จ สุขวรรณ์ ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท 6ดวิน

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	ขร-4107	ยงยุ	0835	1918	4	มนุษยนาค
2	เก๋ง	5ขข-3900	มันธ์มิสิทธ์	0839	1718	2	มนุษยนาค
3	กระบะ	ขร-4474	ปิยุทธ์	0840	1822	5	มนุษยนาค
4	กระบะ	1ขส-1512	มานัส	0904	1710	8	มนุษยนาค
5	เก๋ง	9กง-6761	ณรงค์	0904	1850	1	มนุษยนาค
6	กระบะ	บอ-2882	สัมพันธ์	0911	1724	2	มนุษยนาค
7	กระบะ	ขน-2519	ไพรัช	0918	1712	1	มนุษยนาค
8	กระบะ	9กน-7976	ปฐมพนธ์	0929	1816	2	มนุษยนาค
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		25	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ สำเร็จ สุขวรรณ์ ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท ECO

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]-1803	[illegible]	0726	1895	4	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]-6815	[illegible]	0739	1812	8	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]-3002	[illegible]	0739	1832	7	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]-9033	[illegible]	0803	1805	1	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]-5059	[illegible]	0840	1923	1	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]-3681	[illegible]	0939	1705	2	[illegible]
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		23	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....[illegible].....ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท TW

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]-4493	[illegible]	0718	1740	3	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]-8379	[illegible]	0732	1732	5	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]-4118	[illegible]	0804	1830	6	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]-8983	[illegible]	0810	1636	8	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]-8841	[illegible]	0918	1902	11	[illegible]
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		34	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....[illegible].....ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท ยูนิไฟน์

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	บข-9595	พงษธร	0735	1750	5	มหาดงาน
2	เก๋ง	กง-385	สิริชา	0846	1904	1	มหาดงาน
3	กระบะ	บม-4671	ธันวิชญ์	0819	1915	7	มหาดงาน
4	กระบะ	1ของ-2280	เกียงศักดิ์	0836	1750	3	มหาดงาน
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		16	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก S.K. POWER

S.K. POWER PLANT 2500 Co.,Ltd.

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	ผพ-6238	ไพรัตน์	0657	1918	2	มหาดงาน
2	กระบะ	3ฉอ-9781	จำนงค์	0714	1956	8	มหาดงาน
3	กระบะ	1ฉอ-9492	ไพฑูลย์	0714	1915	10	มหาดงาน
4	กระบะ	บม-6921	กรัช	0716	1924	15	มหาดงาน
5	เก๋ง	กอ-6415	มนตรี	0741	1856	2	มหาดงาน
6	เก๋ง	5ขท-2190	มงคล	0742	1850	1	มหาดงาน
7	เก๋ง	1ขท-3605	ภัทร์	0714	1835	1	มหาดงาน
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		39	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก ก้องเกียรติวิศวกลการ

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	บย-7552	ปาเจโร	0710	1914	4	ปกติทุกคน
2	กระบะ	ขย-9936	อนุชิต	0718	1728	4	ปกติทุกคน
3	กระบะ	บอ-1585	วิทยา	0721	1718	4	ปกติทุกคน
4	กระบะ	ขกง-1995	สมชัยศักดิ์	0726	1810	1	ปกติทุกคน
5	กระบะ	ขย-2810	ไมทูลย์	0729	1718	6	ปกติทุกคน
6	เก๋ง	กต-21	สงโง้	0730	1658	1	ปกติทุกคน
7	กระบะ	ง๓-3192	ปรีชา	0730	1714	1	ปกติทุกคน
8	กระบะ	กต-2942	สุพจน์	0736	1726	4	ปกติทุกคน
9	6ล้อ	83-7654	ทวีศักดิ์	0742	1702	45	ปกติทุกคน
10	กระบะ	บง-3879	บอว	0743	1712	2	ปกติทุกคน
11	เก๋ง	ฉกพ-5114	เกตุ	0744	1702	1	ปกติทุกคน
12	ตู้คอน	ผท-4880	ภูษิชิตพล	0750	1758	4	ปกติทุกคน
13	กระบะ	ผย-2393	สกล	0751	0715	2	ปกติทุกคน
14	กระบะ	บอ-3082	ไกรสิ	0753	1730	1	ปกติทุกคน
15	กระบะ	ผย-7254	ปัญญพงษ์	0755	1716	1	ปกติทุกคน
16	กระบะ	กย-8332	ศรัณพงษ์	0801	1718	1	ปกติทุกคน
17	เก๋ง	บอ-3743	สมชาย	0836	1713	1	ปกติทุกคน
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		87	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ศรีพงษ์ สุวรรณ์.....ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท เพาเวอร์พีค

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	ขห-2193	สุวรรน	0715	1750	3	ปกติทุกคน
2	กระบะ	กต-7543	ศักพล	0725	1750	4	ปกติทุกคน
3	กระบะ	ขห-8317	สมชาย	0734	1810	13	ปกติทุกคน
4	กระบะ	ขย-8553	อัฐพูน	0753	1730	2	ปกติทุกคน
5	กระบะ	๒กต-9935	อนุชิต	0754	1725	5	ปกติทุกคน
6	กระบะ	ขย-18	วิรัชไมตรี	0757	1907	1	ปกติทุกคน
7	กระบะ	๔ขย-4776	อนันต์	1011	1752	1	ปกติทุกคน
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		29	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ศรีพงษ์ สุวรรณ์.....ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก ชูล่า

วันที่ 29-11-64

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	เอสซ้อ	84-2494	บุญเกื้อ	0708	1902	1	ขนกลาง
2	กลม	ผท-7601	ปิยะ	0926	1915	6	ขนกลาง
3	กลม	ผจ-588	สุรเดช	0732	1915	7	ขนกลาง
4	กลม	บท-9663	ศิริพงษ์	0745	1912	1	ขนกลาง
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		15	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา รปภ.ประจำป้อม....1.....

PMC 83

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก PMC 83

วันที่ 29-11-64

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กอบ	ฆฉ-1095	อดิศ	0816	1810	2	ขนกลาง
2	กลม	ขย-1780	โตมอล	0843	1834	1	ขนกลาง
3	กลม	ตย-1046	ภัทร์ ศักดิ์	0916	1826	1	ขนกลาง
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		4	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้ รปภ.ประจำป้อม....1.....

API
ADVANCE INTEGRATE

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก API

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	1ฒว-5001	ปรเมศวร์	0748	1754	10	มหกรรม
2	กระบะ	2ฒต-1188	ปรเมศวร์	0751	1924	5	มหกรรม
3	กระบะ	บข-6212	ศุภเมศวร์	0803	1930	4	มหกรรม
4	เก๋ง	1กล-526	ปรเมศวรมหา	0836	1751	1	มหกรรม
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		20	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ศุภเมศวร์.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

FOOK HENG LONG ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก ฟุกเฮงหลง

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	1ฒท-5538	สมชาย	0703	1718	5	มหกรรม
2	กระบะ	บพ-8073	อำนวย	0706	1835	1	มหกรรม
3	กระบะ	บล-7427	ปรเมธวี	0716	1735	4	มหกรรม
4	กระบะ	บบ-1460	ศรีชัย	0717	0705	2	มหกรรม
5	กระบะ	3บธ-5067	ชัยพล	0721	1730	3	มหกรรม
6	เก๋ง	กล-1555	ปรเมศวร	0738	1826	1	มหกรรม
7	กระบะ	บม-2916	เชี่ยง	0738	1716	7	มหกรรม
8	กระบะ	บอ-3094	ปฏิพัทธ์	0733	1830	7	มหกรรม
9	กระบะ	กท-9844	สุพจน์	0739	1734	6	มหกรรม
10	กระบะ	1ฒล-3195	มั่งมี	0734	1716	1	มหกรรม
11	กระบะ	ฒบ-806	สุนทร	0803	1735	2	มหกรรม
12	เก๋ง	กท-7964	สุวิรอน์	0803	1734	1	มหกรรม
13	กระบะ	บอ-2338	วิชิต	0809	1710	1	มหกรรม
14	กระบะ	กล-2561	ธนพัทธ์	0809	1915	4	มหกรรม
15	เก๋ง	9กล-1838	กรกช	0812	1830	1	มหกรรม
16	กระบะ	1ฒต-2016	ศรกมนต์	0900	1701	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		49	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ศุภเมศวร์.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

ICHITA รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก บริษัท อิชิตะ

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กลน	1ขว-1599	ชิตาธวัช	0823	1826	2	มาทำงาน
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		2	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ..... ผู้รับ: รปภ.ประจำป้อม....1.....

วิศวภัณฑ์ รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก วิศวภัณฑ์

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กอะ	บข-2633	เอน	0705	1705	2	มาทำงาน
2	กอบ	บพ-2144	แขน	0719	1658	3	มาทำงาน
3	กอง	บน-684	ตุ้ย	0731	1700	3	มาทำงาน
4	กอบ	บน-838	ธีรพงษ์	0739	1650	1	มาทำงาน
5	เก๋ง	กท-457	ต้อง	0822	1635	1	มาทำงาน
6	เก๋ง	กบ-5431	ก้านตา	0839	1632	1	มาทำงาน
7	กอบ	บพ-3866	ธุรพงศ์	0839	1630	1	มาทำงาน
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		12	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ..... ผู้รับ: รปภ.ประจำป้อม....1.....

DEMIER

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก ดีมายเออร์

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	กบ-7345	สมพร	0737	1901	6	มาทำงาน
2	เก๋ง	ฮย-8179	ชัยรัตน์	0746	1902	1	มาทำงาน
3	กระบะ	ขอนแก่น-7107	วิชมา	0747	1718	1	มาทำงาน
4	กระบะ	กน-2679	วิรัตน์	0748	1902	2	มาทำงาน
5	กระบะ	บร-6564	สมบูพ	0749	1902	6	มาทำงาน
6	กระบะ	ขอนแก่น-7110	พงษพาณิ	0803	1925	1	มาทำงาน
7	กระบะ	ขอนแก่น-1107	วิชรกร	0906	1658	4	มาทำงาน
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		24	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

TANITA
FABRICATION CO.,LTD

รายงานการรถยนต์ เข้า - ออก ทานิตะ

วันที่ 29-11-67

ลำดับ	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาเข้า	เวลาออก	จำนวนคน	หมายเหตุ
1	กระบะ	ขส-2091	สมบูด	0613	1642	1	มาทำงาน
2	กระบะ	ขห-9911	มาย	0700	1930	3	มาทำงาน
3	กระบะ	ขอ-5694	มาลี	0709	1912	2.	มาทำงาน
4	กระบะ	ขก-9049	รัชพล	0723	1924	2	มาทำงาน
5	เก๋ง	รบก-1969	ปกิตตา	0728	1930	1	มาทำงาน
6	กระบะ	ขย-8064	สาล	0731	1930	1	มาทำงาน
7	กระบะ	ขพ-3436	สุน	0733	1952	5	มาทำงาน
8	กระบะ	ขอ-1924	สมพร	0738	1910	7	มาทำงาน
9	กระบะ	บอ-5648	พงษ์ย	0743	1916	2	มาทำงาน
10	กระบะ	ขอนแก่น-9001	มพัน	0745	1912	1	มาทำงาน
11	กระบะ	ตล-2920	สุวิชา	0746	1933	1	มาทำงาน
12	เก๋ง	ขกก-386	สมสักด์	0749	1913	1	มาทำงาน
13	กระบะ	ผล-5545	ผดุงพพ	0753	1850	5	มาทำงาน
14	กระบะ	ฉย-7808	ชัยชัย	0800	1912	4	มาทำงาน
15	กระบะ	ขก-7206	คำพอง	0807	1912	4.	มาทำงาน
16	กระบะ	ขค-3882	เมทกวร	0809	1910	5	มาทำงาน
17	กระบะ	กห-1813	เกรียงไกร	0811	1912	1	มาทำงาน
18	กระบะ	ขบ-2377	ไชยน์	0813	1920	4	มาทำงาน
19	กระบะ	ขอนแก่น-4733	วิรอม	0813	1916	1	มาทำงาน
20	กระบะ	ขม-322	สุวิมล	0833	1930	3	มาทำงาน
21	กระบะ	ขง-5944	คำปอง	0849	1918	2	มาทำงาน
22	กระบะ	กห-6932	วิชัยร	0848	1905	1	มาทำงาน
23	กระบะ	ขอ-9266	คำพอง	0922	1924	5	มาทำงาน
24	กระบะ	ขย-3120	สมาถัยรอม	0943	1912	1	มาทำงาน
				สรุปจำนวนคนเข้า-ออก		63	

หมายเหตุ : กรณีเข้าทำงานภายในโรงงาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอื่นๆ นำมายื่นที่ป้อมยาม

ลงชื่อ.....ผู้รา: รปภ.ประจำป้อม....1.....

ภาคผนวก ข-36

บันทึกปริมาณขยะ

KSL GROUP KSL-WN บริษัท น้ำตาลบึงกาฬวังสุทธิ จำกัด	**บันทึกปริมาณขยะ**	หมายเลขเอกสาร : PN-EF14.xx วันที่บังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : - ต่อ : -

☑ **พื้นที่ สนง./โรงอาหาร/อาคารผลิต** ☐ **บริเวณบ้านพัก พนง.(ภายนอก)** **เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567**

ว/ด/ป	ปริมาณขยะ (กก.)								หมายเหตุ
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะรีไซเคิล				ขยะอันตราย			รวม
		กระดาษ	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	เศษโลหะ	สารตะกั่ว	หลอดไฟ	ถ่ายไฟฉาย	
6/7/2567	870								**870**	
11/7/2567	770								**770**	
19/7/2567	1110								**1110**	
23/7/2567	1,150								**1150**	
26/7/2567	610								**610**	
30/7/2567	1330								**1330**	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
รวม	5840								**5840**	

หมายเหตุ : ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะแห้ง/เปียก ที่เกิดจากโรงอาหาร, สำนักงาน และอาคารผลิต (ส่งให้เทศบาลฯ กำจัด)
ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระดาษ, อลูมิเนียม, เศษโลหะ
ขยะอันตราย คือ ขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องส่งกำจัดภายนอก ได้แก่ สารตะกั่วLAB, หลอดไฟ, ถ่ายไฟฉาย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ : _____

_____

ผู้บันทึก แผนกห้องชั่ง **ผู้ตรวจสอบ/EMR Team** _____

KSL-WN บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสุ่นหลี จำกัด	**บันทึกปริมาณขยะ**	หมายเลขเอกสาร : PN-EF14.xx วันที่บังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : - ต่อ : -

☑ **พื้นที่ สนง./โรงอาหาร/อาคารผลิต** ☐ **บริเวณบ้านพัก พนง.(ภายนอก)** **เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567**

ว/ด/ป	ปริมาณขยะ (กก.)									หมายเหตุ
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะรีไซเคิล				ขยะอันตราย			นน.รวม	
		กระดาษ	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	เศษโลหะ	สารตะกั่ว	หลอดไฟ	ถ่ายไฟฉาย		
3/8/2567	1080								**1080**	
6/8/2567	1000								**1000**	
9/8/2567	980								**980**	
13/8/2567	1,290								**1290**	
14/8/2567	1410								**1410**	
17/8/2567	960								**960**	
20/8/2567	820								**820**	
23/8/2567	1170								**1170**	
27/8/2567	1080								**1080**	
30/8/2567	1150								**1150**	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
รวม	10940								**10940**	

หมายเหตุ : ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะแห้ง/เปียก ที่เกิดจากโรงอาหาร, สำนักงาน และอาคารผลิต (ส่งให้เทศบาลฯ กำจัด)
ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระดาษ, อลูมิเนียม, เศษโลหะ
ขยะอันตราย คือ ขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องส่งกำจัดภายนอก ได้แก่ สารตะกั่วLAB, หลอดไฟ, ถ่ายไฟฉาย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ : _____

_____

ผู้บันทึก แผนกห้องชั่ง , **ผู้ตรวจสอบ/EMR Team** _____

KSL-WN บริษัท ห้าดาลนิวกว้างสุ่นหลี จำกัด	**บันทึกปริมาณขยะ**	หมายเลขเอกสาร : PN-EF14.xx วันที่บังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : - ต่อ : -

☑ **พื้นที่ สนง./โรงอาหาร/อาคารผลิต** ☐ **บริเวณบ้านพัก พนง.(ภายนอก)** **เดือน กันยายน พ.ศ. 2567**

ว/ด/ป	ปริมาณขยะ (กก.)									หมายเหตุ
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะรีไซเคิล				ขยะอันตราย			น.น.รวม	
		กระดาษ	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	เศษโลหะ	สารตะกั่ว	หลอดไฟ	ถ่ายไฟฉาย		
3/9/2567	1250								**1250**	
6/9/2567	520								**520**	
14/9/2567	1750								**1750**	
15/9/2567	2,650								**2650**	
17/9/2567	410								**410**	
20/9/2567	420								**420**	
25/9/2567	530								**530**	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
รวม	7530								**7530**	

หมายเหตุ : ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะแห้ง/เปียก ที่เกิดจากโรงอาหาร, สำนักงาน และอาคารผลิต (ส่งให้เทศบาลฯ กำจัด)
ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระดาษ, อลูมิเนียม, เศษโลหะ
ขยะอันตราย คือ ขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องส่งกำจัดภายนอก ได้แก่ สารตะกั่วLAB, หลอดไฟ, ถ่ายไฟฉาย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ : _____

_____

ผู้บันทึก แผนกห้องชั่ง , **ผู้ตรวจสอบ/EMR Team**_____

KSL KSL-WN บริษัท น้ำตาลทิวกว้างคุ้นหมี จำกัด	**บันทึกปริมาณขยะ**	หมายเลขเอกสาร : PN-EF14.xx วันที่บังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : - ต่อ : -

☑ **พื้นที่ สนง./โรงอาหาร/อาคารผลิต** ☐ **บริเวณบ้านพัก พนง.(ภายนอก)** **เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567**

ว/ด/ป	ปริมาณขยะ (กก.)									หมายเหตุ
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะรีไซเคิล				ขยะอันตราย			นน.รวม	
		กระดาษ	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	เศษโลหะ	สารตะกั่ว	หลอดไฟ	ถ่ายไฟฉาย		
1/10/2567	1100								**1100**	
5/10/2567	1470								**1470**	
11/10/2567	600								**600**	
18/10/2567	1,150								**1150**	
22/10/2567	1510								**1510**	
25/10/2567	470								**470**	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
รวม	6300								**6300**	

<u>หมายเหตุ :</u> ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะแห้ง/เปียก ที่เกิดจากโรงอาหาร, สำนักงาน และอาคารผลิต (ส่งให้เทศบาลฯ กำจัด)
ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระดาษ, อลูมิเนียม, เศษโลหะ
ขยะอันตราย คือ ขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องส่งกำจัดภายนอก ได้แก่ สารตะกั่วLAB, หลอดไฟ, ถ่ายไฟฉาย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ : _____

_____

ผู้บันทึก <u>**แผนกห้องชั่ง**</u> **.** **ผู้ตรวจสอบ/EMR Team**_____

บริษัท น้ำตาลนิวกว่างตุ้นหงี จำกัด	**บันทึกปริมาณขยะ**	หมายเลขเอกสาร : PN-EF14.xx วันที่บังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : - ต่อ : -

☑ **พื้นที่ สนง./โรงอาหาร/อาคารผลิต** ☐ **บริเวณบ้านพัก พนง.(ภายนอก)** **เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2567**

ว/ด/ป	ปริมาณขยะ (กก.)									หมายเหตุ
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะรีไซเคิล				ขยะอันตราย			นน.รวม	
		กระดาษ	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	เศษโลหะ	สารตะกั่ว	หลอดไฟ	ถ่ายไฟฉาย		
2/11/2567	960								**960**	
8/11/2567	900								**900**	
15/11/2567	2070								**2070**	
17/11/2567	1,660								**1660**	
19/11/2567	870								**870**	
23/11/2567	760								**760**	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
รวม	7220								**7220**	

<u>หมายเหตุ :</u> ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะแห้ง/เปียก ที่เกิดจากโรงอาหาร, สำนักงาน และอาคารผลิต (ส่งให้เทศบาลฯ กำจัด)
ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระดาษ, อลูมิเนียม, เศษโลหะ
ขยะอันตราย คือ ขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องส่งกำจัดภายนอก ได้แก่ สารตะกั่วLAB, หลอดไฟ, ถ่ายไฟฉาย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ : _____

_____

ผู้บันทึก แผนกห้องชั่ง **ผู้ตรวจสอบ/EMR Team** _____

บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสุ่นหลี จำกัด	**บันทึกปริมาณขยะ**	หมายเลขเอกสาร : PN-EF14.xx วันที่บังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : - ต่อ : -

☑ **พื้นที่ สนง./โรงอาหาร/อาคารผลิต** ☐ **บริเวณบ้านพัก พนง.(ภายนอก)** **เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ว/ด/ป	ปริมาณขยะ (กก.)									หมายเหตุ
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะรีไซเคิล				ขยะอันตราย			นน.รวม	
		กระดาษ	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	เศษโลหะ	สารตะกั่ว	หลอดไฟ	ถ่ายไฟฉาย		
4/12/2567	850								**850**	
6/12/2567	930								**930**	
7/12/2024	1550								**1550**	
10/12/2024	1,260								**1260**	
13/12/2024	710								**710**	
17/12/2024	890								**890**	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
รวม	6190								**6190**	

หมายเหตุ : ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะแห้ง/เปียก ที่เกิดจากโรงอาหาร, สำนักงาน และอาคารผลิต (ส่งให้เทศบาลฯ กำจัด)

ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระดาษ, อลูมิเนียม, เศษโลหะ

ขยะอันตราย คือ ขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องส่งกำจัดภายนอก ได้แก่ สารตะกั่วLAB, หลอดไฟ, ถ่ายไฟฉาย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ : _____

_____

ผู้บันทึก แผนกห้องซั่ง . **ผู้ตรวจสอบ/EMR Team**_____

ภาคผนวก ข-37

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ประจำปี 2567

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

1. ความเป็นมา

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA จากหน่วยงานอนุญาต ตามหนังสือเลขที่ อก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และ สผ. รับทราบรายงานฯ ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/24523 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ปีละ 1 ครั้ง


ทั้งนี้ในระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24 -26 กันยายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

2. วัตถุประสงค์


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข สุขภาพ การได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการดำเนินการของโครงการ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2567


3. พื้นที่ดำเนินการศึกษา

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการต่าง ๆ ในระยะก่อสร้างโครงการ เพื่อรับทราบผลกระทบที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว ประเด็นข้อวิตกกังวลของประชาชน โดยรอบโครงการ ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลัก จำนวน 33 หมู่บ้าน แสดงดัง**รูปที่ 3-1** บรรยากาศการสำรวจแสดงใน**รูปที่ 3-2**

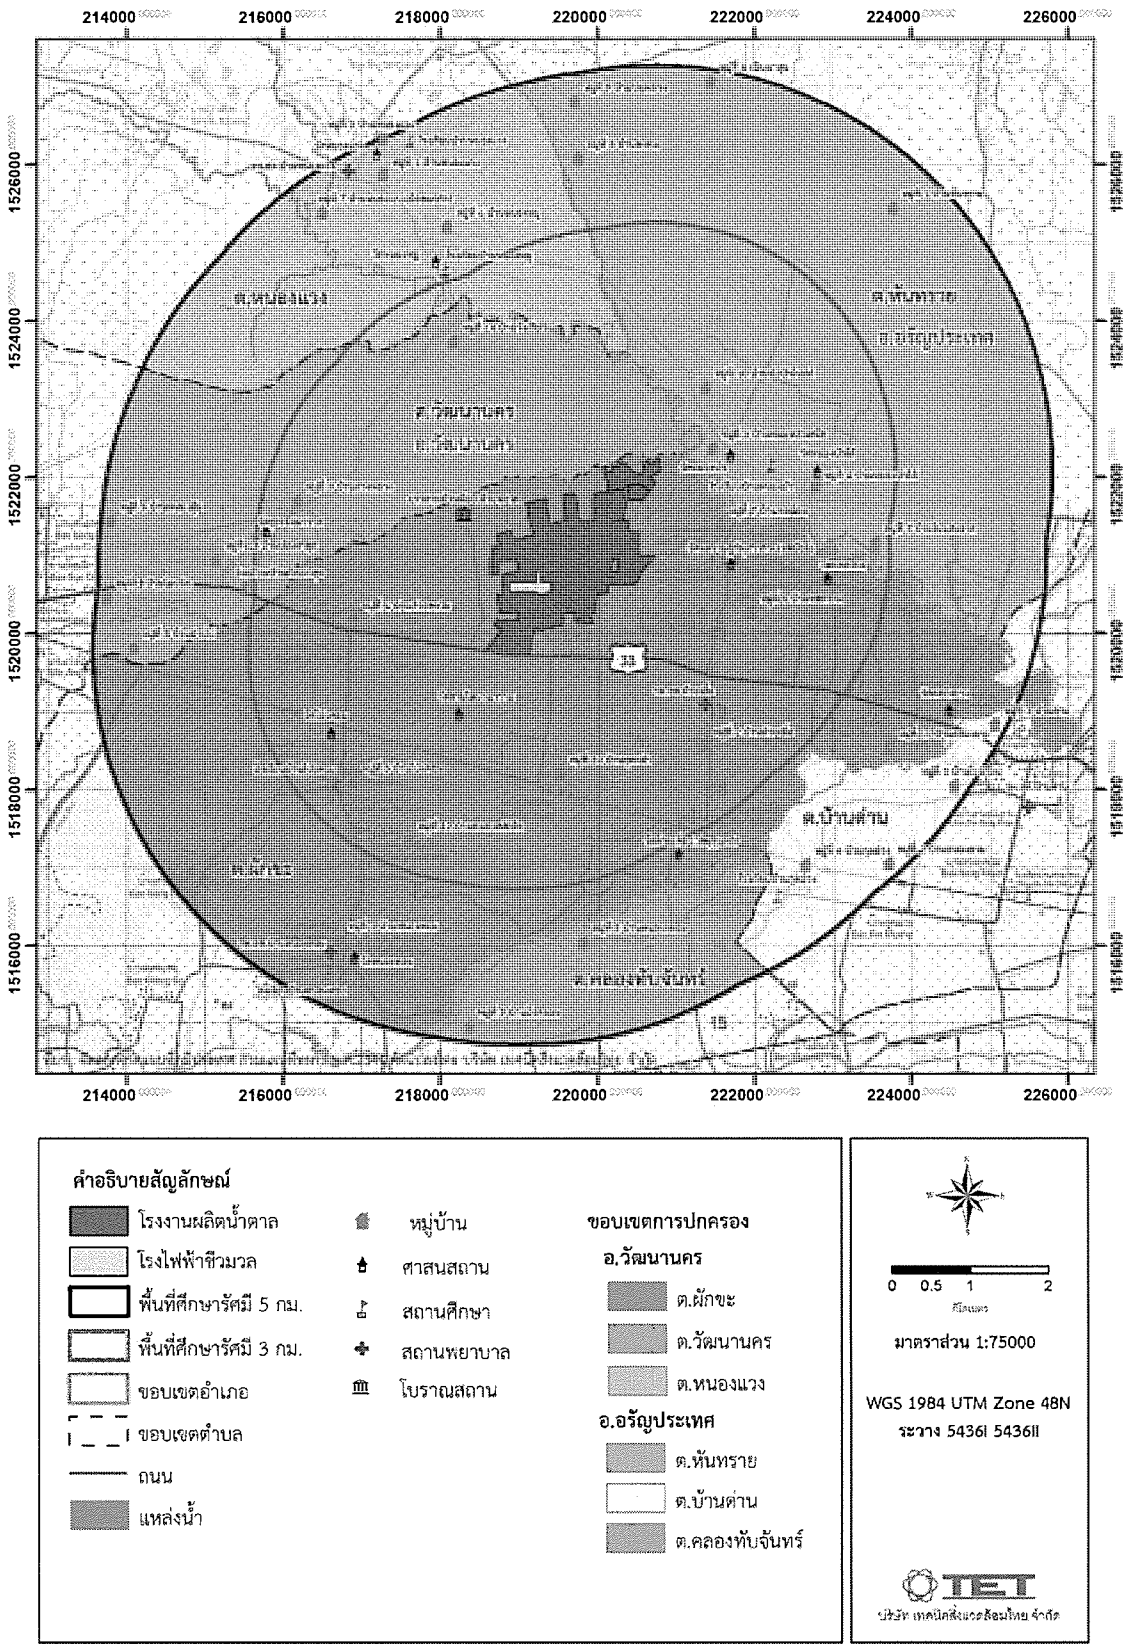


รูปที่ 3-1 ขอบเขตพื้นที่ที่ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

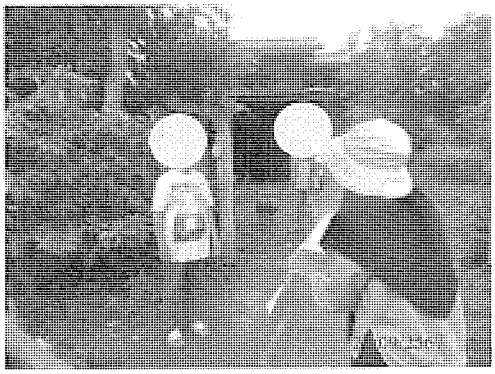


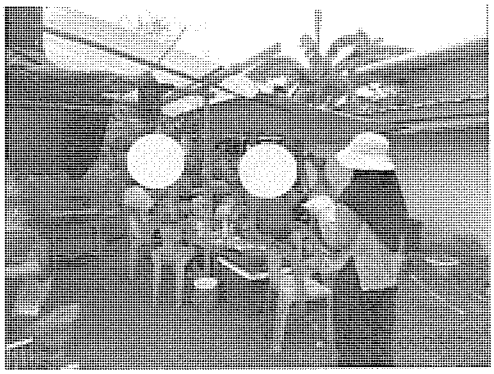

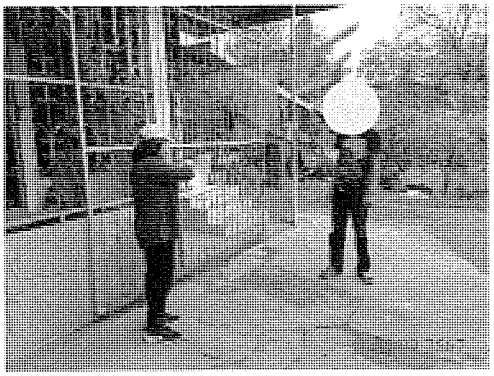

รูปที่ 3-2 ภาพบรรยากาศการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

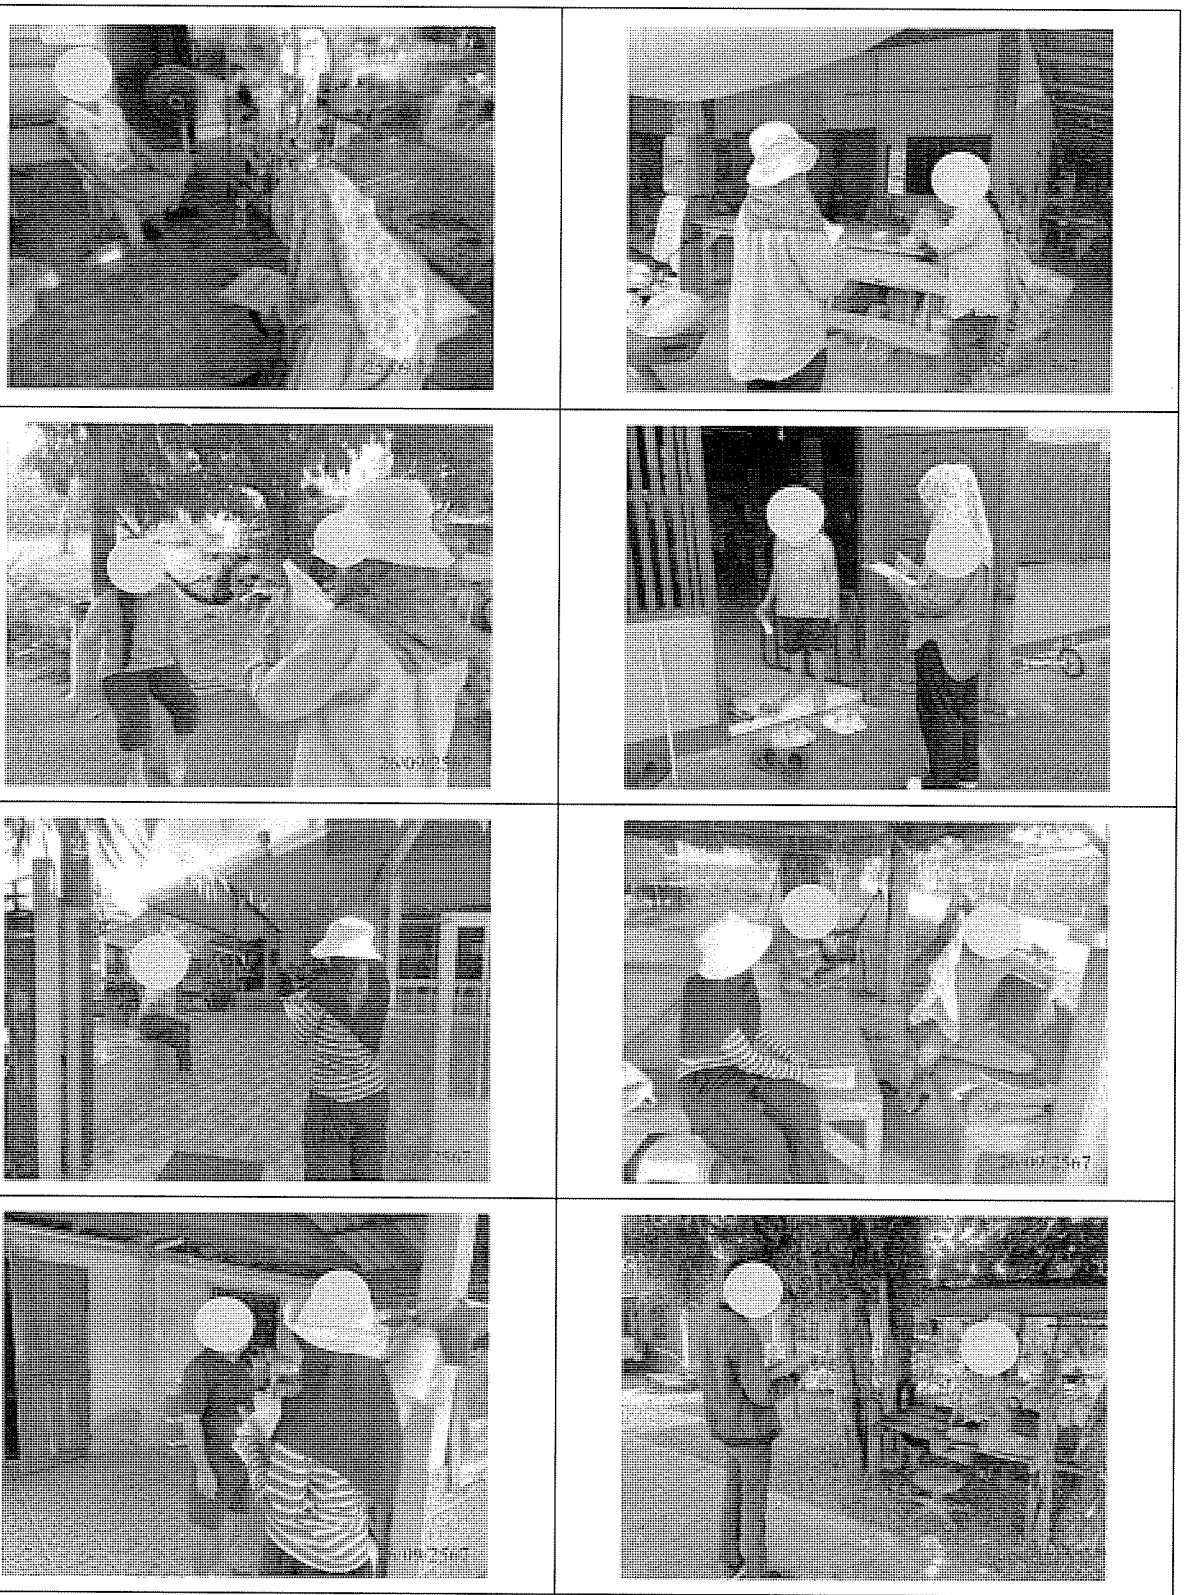

รูปที่ 3-2 (ต่อ) ภาพบรรยากาศการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

4. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

4.1 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสำรวจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือน และกลุ่มผู้นำชุมชน

การสุ่มตัวอย่างกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณจำนวนของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรแน่นอน (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550 และYamane, T., 1973: 1088) ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จำนวนหลังคาเรือนจากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2566 เป็นฐานในการคำนวณจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \text{---------- (1)}$$

โดยที่ n คือ จำนวนตัวอย่าง

N คือ จำนวนหน่วยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)

แทนค่า

$$n = \frac{6,693}{1 + (6,693 \times (0.05)^2)}$$

$$n = 377.44 \text{ หรือ } 378$$

เมื่อได้จำนวนตัวอย่างระดับครัวเรือนที่ต้องสำรวจทั้งหมดแล้วจึงนำมากระจายตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนให้เหมาะสมตามขนาดของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยคำนวณจำนวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ดังสมการ (2) (รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548)

$$A = \frac{n_1 n}{N} \quad \text{---------- (2)}$$

แทนค่า

A คือ จำนวนตัวอย่างของแต่ละชุมชน

n_1 คือ จำนวนครัวเรือนของแต่ละชุมชน

N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา

n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการที่ (1)

จำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจรวมทั้งหมด 412 ราย แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือน จำนวน 379 ราย และกลุ่มตัวอย่างระดับผู้นำชุมชน จำนวน 33 รายรายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ 4.1-1**

ตารางที่ 4.1-1 จำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจ แยกรายหมู่บ้าน

ลำดับ	ชุมชน	ระยะห่างจากโครงการ	จำนวนหลังคาเรือน	จำนวนตัวอย่างที่สำรวจ	
				กลุ่มครัวเรือน	กลุ่มผู้นำ
	ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร				
1	หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย	3-5	203	11	1
2	หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ	1-3	233	13	1
3	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย	0-1	189	11	1
4	หมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม	1-3	303	17	1
5	หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง	1-3	171	10	1
6	หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย	0-1	137	8	1
7	หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า (กุดตะกร้า)	1-3	89	5	1
8	หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง	3-5	115	6	-
9	หมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักใด	1-3	105	6	-
	ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร				
10	หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก	3-5	528	30	1
11	หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม	3-5	239	13	1
12	หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่	3-5	158	9	1
13	หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง	1-3	320	18	1
14	หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก	3-5	131	7	1
15	หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว	1-3	82	5	-
	ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร				
16	หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	3-5	134	8	-
17	หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง	3-5	170	10	1
18	หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	3-5	182	10	1
19	หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง (น้อยนาคำ)	3-5	106	6	1
	ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ				
20	หมู่ที่ 1 บ้านหันทราย	3-5	240	14	1
21	หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ	0-1	194	11	1
22	หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้	1-3	260	15	1
23	หมู่ที่ 6 เนินผาสุข	3-5	162	9	1
24	หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	1-3	76	4	1
25	หมู่ที่ 8 บ้านดงทม	3-5	118	7	1
26	หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง	3-5	50	3	1
27	หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์	1-3	219	12	1

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) จำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจ แยกรายหมู่บ้าน

ลำดับ	ชุมชน	ระยะห่างจากโครงการ	จำนวนหลังคาเรือน	จำนวนตัวอย่างที่สำรวจ	
				กลุ่มครัวเรือน	กลุ่มผู้นำ
	ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ				
28	หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	3-5	881	50	1
29	หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม	3-5	282	16	1
30	หมู่ที่ 5 บ้านโรงเรียน	3-5	260	15	-
31	หมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง	3-5	163	9	1
	ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ				
32	หมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย	3-5	125	7	1
33	หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง	3-5	68	4	1
รวมจำนวนครัวเรือนทั้งหมด			**6,693**	-	-
จำนวนสำรวจ			-	**379**	**28**

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ เดือนกันยายน 2567

4.2 วิธีการและเครื่องมือ

การสัมภาษณ์ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีประสบการณ์ภาคสนาม คอยให้คำแนะนำ และชี้แนะพนักงานสัมภาษณ์ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ชัดเจน การสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือบันทึกช่วยจำ โดยออกแบบแบบสอบถามให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ดัง**ตารางที่ 4.2-1**

ตารางที่ 4.2-1 โครงสร้างแบบสอบถาม จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นสอบถาม	กลุ่มเป้าหมาย	
	ผู้นำชุมชน	ครัวเรือน
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	√	√
2. ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน/ชุมขน (อาชีพหลัก/รอง รายได้ รายจ่าย ฯ)	√	√
3. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข	√	√
4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม และปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน	√	√
5. การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด	√	√
5. การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	√	√

5. ผลการสำรวจความคิดเห็น

5.1 ผลสำรวจความคิดเห็น ผู้นำชุมชน

กลุ่มผู้นำชุมชนที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมด 28 ราย การนำเสนอผลการศึกษา เป็นการนำเสนอแยกรายบุคคล ดังแสดงใน**ตารางที่ 5.1-1**

ตารางที่ 5.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
1. **ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ ตำแหน่ง** : ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนาเดิม** : จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ** : อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่ อาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย **ปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน** : ปัญหายาเสพติดมีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ** : การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ เป็นปัญหาที่ประสบในปัจจุบันมีผลกระทบในระดับน้อยทั้งหมด	- ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดในชุมชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลวัฒนานคร และ รพ.สต.บ้านหนองหอย ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ - การใช้น้ำในครัวเรือน น้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญคือ น้ำบรรจุถัง/ขวด สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน คือ น้ำประปา ซึ่งน้ำดื่มและน้ำใช้มีคุณภาพดีและเพียงพอ - การจัดการน้ำเสีย น้ำทิ้งในครัวเรือน ในครัวเรือน จะระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง และนำไปรดน้ำต้นไม้ - การจัดการขยะมูลฝอย จัดการโดยการเผา หรือฝังกลบ	- ในช่วงปีที่ผ่านมาภายในชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ประมาท มีผลกระทบระดับน้อย	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล** : รู้จักโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด จากการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดี-ผลเสียที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่าน** : การดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีผลเสียต่อชุมชน ด้านผลดีที่ได้รับทั้งหมดเป็นผลดีด้านเศรษฐกิจ โดยมีผลดีในระดับน้อย ถึงปานกลาง ได้แก่ - มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ - สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ชุมชนเจริญขึ้น - มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี - มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน **ความคิดเห็นต่อโครงการ** : โครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย ผู้นำชุมชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
2. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนาเดิม :** จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่ อาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย **ปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน :** ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับมาก และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาค่าครองชีพสูง	- ภายในชุมชนไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อมีปัญหาสุขภาพต้องเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลวัฒนานคร หรือ รพ.สต.ห้วยเดื่อ ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาด้านการขาดแพทย์เฉพาะทาง - การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งในครัวเรือนส่วนใหญ่ ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง หรือท่อระบายน้ำสาธารณะ - การจัดการขยะมูลฝอย เป็นการจัดการภายในครัวเรือนโดยการกองแล้วเผา และการฝังกลบ	- ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร (การเพิ่ม/ลดของจำนวนประชากร) - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน มีผลกระทบในระดับปานกลาง คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเขม่า/ควัน ปัญหาเสียงดังรบกวน ทั้งหมดเกิดจากการจราจรในพื้นที่ มีผลกระทบในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ำเสีย	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการจากการพบเห็นด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของโครงการ และการประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่าน :** ผลดีที่ได้รับ คือ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ ทำให้สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น และมีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี **ผลเสียที่ได้รับในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน น้ำเสีย กลิ่นเหม็น และเขม่าควัน ทั้งหมดมีผลกระทบระดับน้อย **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** ไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ และไม่มีความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** ต้องการให้โครงการเข้าพบประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
3. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย ตำบลผักขะ ตำแหน่ง** : ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา** : เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ** : อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน คือ การเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่) ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม **ปัญหาสังคม** : ปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น **ปัญหาเศรษฐกิจ** : ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับปานกลางทั้งหมด	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ แต่เมื่อมีการเจ็บป่วย ส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลอรัญประเทศ) ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการบริการ - การใช้น้ำในครัวเรือน น้ำอุปโภคบริโภคของครัวเรือน มีคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอ น้ำบริโภคที่สำคัญคือ น้ำถัง/ขวด และน้ำอุปโภคที่สำคัญคือ น้ำประปา - การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ใช้การกองแล้วเผา - การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งของครัวเรือน เป็นการระบายลงพื้นดิน และระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	- การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา คือการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร และด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร มีผลกระทบในระดับปานกลางทุกปัญหา ที่มาของปัญหาส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และความประมาทของผู้ใช้	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล** : รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา** : คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ (ผลดีระดับมาก) สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การศึกษา ศาสนา และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของขุมขน มีผลดีในระดับปานกลาง และทำให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (ผลดีระดับน้อย) - ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ** : คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นพอสมควรกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ข้อเสนอแนะ** : ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมมากขึ้น และรับฟังความคิดเห็นโดยเข้าร่วมประชุมกับชุมชนมากขึ้น

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
4. **ผู้นำชุมชนหมู่ 7 บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ทำไร่) อาชีพรองคือ การรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ปัญหายาเสพติดและปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง และปัญหารายได้ต่ำ มีผลกระทบในระดับปานกลางทุกปัญหา	- ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดในชุมชน สถานบริการด้านสาธารณสุขที่เข้ารับบริการได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนานคร และรพ.สต.ห้วยเดื่อ ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการบริการ - การใช้น้ำในชุมชน น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน สำหรับน้ำใช้ คือ น้ำบ่อ/บาดาล ซึ่งน้ำดื่ม น้ำใช้ในครัวเรือนมีคุณภาพดี และปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวรเรือนโดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย จัดการโดยการกองแล้วเผา	- การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนในระยะ 1 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้านประชากร (การเพิ่ม/ลดของประชากรในชุมชน) - ปัจจุบันชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง และจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การศึกษา ศาสนา มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และทำให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้งหมดมีผลดีในระดับปานกลาง - ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีพอๆ กับผลเสีย และมีความเชื่อมั่นพอสมควรกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** โครงการควรมีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
5. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** การเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ทำไร่) เป็นอาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน สำหรับอาชีพรอง คือ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม **ปัญหาสังคม :** ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน มีผลกระทบระดับน้อย ปัญหาค่าครองชีพสูง และปัญหารายได้ต่ำ มีผลกระทบในระดับปานกลาง ทั้งสองประเด็น	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วย กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ และรพ.สต.หนองแวง ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาด้านการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำดื่มที่สำคัญของชุมชน ด้านน้ำใช้คือน้ำประปา ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพและปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชน - ปัจจุบันชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ และสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น มีผลดีในระดับปานกลาง - ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** ไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ มีความเชื่อมั่นพอสมควรกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** อยากให้โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน และช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
6. **ผู้นำชุมขนหมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง** : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา** : เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ** : การเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ทำไร่) เป็นอาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน สำหรับอาชีพรองคือ รับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม** : ปัจจุบันไม่พบปัญหาสังคมในชุมชน **ปัญหาเศรษฐกิจ** : ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วย กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัฒนา โรงพยาบาลอรัญประเทศ และรพ.สต.ห้วยเดื่อ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาด้านการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำดื่มที่สำคัญของชุมชน ด้านน้ำใช้คือน้ำประปา ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพและปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชน - ปัจจุบันชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล** : รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลเจ้าหน้าที่ของโครงการและการประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา** : คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น และมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง - มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การศึกษา ศาสนา มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และทำให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีผลดีในระดับน้อย - ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ** : คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นพอสมควรกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ข้อเสนอแนะ** : อยากให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
7. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน สำหรับอาชีพรอง คือ ค้าขาย **ปัญหาสังคม :** ปัญหาการทะเลาะวิวาท มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย ปัญหาค่าครองชีพสูง และปัญหารายได้ต่ำ มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับความดันโลหิต และโรคเบาหวาน กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัฒนา และคลินิก ที่ผ่านมามีปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ - แหล่งน้ำดื่มที่สำคัญของชุมชน คือ น้ำถัง/ขวด และน้ำฝน ด้านน้ำใช้ คือ น้ำประปา และน้ำบ่อ/บาดาล ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้มีคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา บางส่วนทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชน - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง มีผลกระทบในระดับน้อย และปัญหาเขม่า/ควัน มีผลกระทบในระดับปานกลาง แหล่งที่มาของปัญหาที่สำคัญเกิดจากการจราจร	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น และมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** คือ ปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาเขม่าควัน มีผลกระทบในระดับน้อยทั้งสองประเด็น **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** ไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ มีความเชื่อมั่นพอสมควรกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
8. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลักของคัวเรือนในชุมชน สำหรับอาชีพรอง คือ เกษตรกรรม **ปัญหาสังคม :** ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้วย มีผลกระทบในระดับปานกลางทุกปัญหา **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน มีผลกระทบระดับปานกลาง - ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วย - แหล่งน้ำดื่มที่สำคัญของชุมชน คือ น้ำถัง/ขวด และน้ำฝน ด้านน้ำใช้ คือ น้ำประปา และน้ำบ่อ/บาดาล และน้ำฝน ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน จัดการ โดยการระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมขน - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาเสียงดังรบกวน แหล่งที่มาคือ การจราจร ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร เกิดจากปริมาณรถหนาแน่น มีผลกระทบในระดับน้อย ทั้งสองปัญหา	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น และมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** คือ ปัญหาเสียงดังรบกวน มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** ไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ และประเด็นความเชื่อมั่นต่อมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาเคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะของพนักงาน มีการแจ้งไปยังโครงการและได้รับการแก้ไขบางส่วน **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
9. **ผู้นำชุมขนหมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลักของคัวเรือนในชุมชน สำหรับอาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับปานกลางทุกปัญหา **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วย กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ปัญหาการให้บริการที่ผ่านมา คือ ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ ปัญหาบริการล่าช้า ปัญหาขาดแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ - แหล่งน้ำดื่มที่สำคัญของชุมชน คือ น้ำถัง/ขวด ด้านน้ำใช้คือ น้ำประปา และน้ำบ่อ/บาดาล และน้ำฝน ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.	- ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนเล็กน้อยด้านประชากร การประกอบอาชีพ และระบบสาธารณูปโภคของชุมชน - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ มีผลกระทบระดับปานกลาง ปัญหาเขม่า/ควัน ปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ำเสีย มีผลกระทบในระดับน้อย ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร มีผลกระทบในระดับมาก แหล่งที่มาของปัญหา ส่วนใหญ่มาจากการจราจร และชุมชน	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ จากญาติพี่น้อง และการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น มีการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และทำให้เกิดการอนุรักษ์ มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาน้ำเสีย ปัญหากลิ่นเหม็น และปัญหาเขม่าควัน มีผลกระทบในระดับปานกลาง ผลเสียด้านปัญหาสุขภาพอนามัน มีผลกระทบในระดับน้อย **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นสูงในมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
				- ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - เคยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการเกี่ยวกับการบริจาคน้ำตาลในกิจกรรมของชุมชน **ข้อเสนอแนะ** : ต้องการให้โครงการดูแลด้านการจราจรหน้าโรงงาน และให้รับคนงานในพื้นที่เข้าทำงานให้มากขึ้น
10. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง** : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา** : เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ** : เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของสมาชิกในชุมชน **ปัญหาสังคม** : ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อยทุกปัญหา **ปัญหาเศรษฐกิจ** : ปัญหาการว่างงาน มีผลกระทบในระดับน้อย สำหรับปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- ในรอบปีที่ผ่านมาพบการเจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชนด้วยโรคไข้หวัดเมื่อต้องพบแพทย์ส่วนใหญ่ไปที่โรงพยาบาลวัฒนานคร และ รพ.สต.หนองแวง ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีเพียงพอและคุณภาพดี	- ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนเล็กน้อยด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเขม่า/ควัน ปัญหาน้ำเสีย และปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ มีผลกระทบในระดับน้อย แหล่งที่มาของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากการจราจร โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาพื้นที่เกษตรกรรม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล** : รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา** : คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมขนเจริญขึ้น มีการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และทำให้เกิดการอนุรักษ์ มีผลดีในระดับปานกลาง

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
		- การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน จัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา และฝังกลบ		**ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมพอสมควร - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - กิจกรรมที่โครงการให้การสนับสนุนชุมชน คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และด้านสิ่งแวดล้อม **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี
11. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** ย้ายมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา	**อาชีพ :** ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพหลักและอาชีพรองที่พบมากในชุมชน **ปัญหาสังคม :** ปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับน้อย ปัญหาแอลกอฮอล์ และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อเจ็บป่วยต้องพบแพทย์ จะเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ และรพ.สต. เจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชนด้วยโรคไข้หวัด เมื่อต้องพบแพทย์ ส่วนใหญ่ไปที่ โรงพยาบาลวัฒนานคร และ	- ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนเล็กน้อยด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเขม่า/ควัน ปัญหาน้ำเสีย และปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ มีผลกระทบในระดับน้อย	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน มีผลดีในระดับมาก

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
	ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง และปัญหารายได้ต่ำ มีผลกระทบในระดับปานกลาง	รพ.สต.หนองแวง ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีเพียงพอและคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน จัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา และฝังกลบ	แหล่งที่มาของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากการจราจร โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาพื้นที่เกษตรกรรม	สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และทำให้เกิดการอนุรักษ์ มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมพอสมควร - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - กิจกรรมที่โครงการให้การสนับสนุนชุมชน คือ การเข้าร่วมประชุมกับชุมชน **ข้อเสนอแนะ :** อยากให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
12. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย ตำบลทับจันทร์ อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดในจังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักที่พบมากในชุมชน คือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรอง คือ การรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ปัจจุบันไม่พบปัญหาสังคมในชุมชน **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน มีผลกระทบในระดับน้อย	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบการเจ็บป่วยกรณีที่มีการเจ็บป่วยและต้องพบแพทย์ส่วนใหญ่ไปพบแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศหรือรพ.สต.คลองทับจันทร์ ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีเพียงพอและคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา	- ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนเล็กน้อยด้านประชากรและด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร มีผลกระทบในระดับน้อย สาเหตุหลักเกิดจากผู้ขับขี่ประมาท	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** ไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ - มีความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการในระดับสูง - กิจกรรมที่ทำร่วมกับโครงการในช่วงที่ผ่านมา คือ การประชุมร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน **ข้อเสนอแนะ :** อยากให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับผู้นำชุมชน ช่วยส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
13. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) **ปัญหาสังคม :** ปัญหายาเสพติด และปัญหาลักขโมย มีผลกระทบในระดับปานกลาง สำหรับปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับปานกลางทั้งหมด	- การเจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชนที่พบในรอบปีที่ผ่านมา คือ ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก กรณีต้องไปพบแพทย์ส่วนใหญ่ใช้บริการที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ และ รพ.สต.คลองทับจันทร์ ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีเพียงพอและคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา	- ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนปานกลาง เกี่ยวกับประชากร และสิ่งแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาเขม่า/ควัน มีผลกระทบระดับปานกลาง และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร มีผลกระทบในระดับน้อย แหล่งที่มาของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจาก การเผาและความประมาทของผู้ขับขี่	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** เป็นผลดีด้านเศรษฐกิจของชุมชน คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา ศาสนา โดยได้รับผลดีในระดับปานกลางถึงมาก **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** เป็นผลกระทบจากด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่นละออง เขม่า/ควัน น้ำเสีย กลิ่นเหม็น เสียงดังรบกวน เป็นต้น มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีพอๆ กับผลเสียและมีความเชื่อมั่นพอสมควรต่อมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - กิจกรรมที่โครงการให้การสนับสนุนชุมชน คือ การเข้าร่วมประชุมกับชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
				ข้อเสนอแนะ : อยากให้โครงการมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกับชุมชน และรับคนในพื้นที่เข้าทำงาน
14. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ **ตำแหน่ง** : ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา** : เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ** : อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองคือ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม** : ปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับน้อย สำหรับปัญหายาเสพติด และปัญหาชุมชนแออัด มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ** : ปัญหาการว่างงาน และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับมาก	- ในช่วงที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านสุขภาพของสมาชิกในชุมชน กรณีต้องไปพบแพทย์ส่วนใหญ่ใช้บริการที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีเพียงพอและคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการนำไปรดน้ำต้นไม้ - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการฝังกลบ	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากเดิมมาก สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ ด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเขม่า/ควัน มีผลกระทบระดับมาก ปัญหาเสียงดังรบกวนและปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ มีผลกระทบในระดับปานกลาง ปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร มีผลกระทบในระดับน้อย	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล** : รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา** : เป็นผลดีด้านเศรษฐกิจของชุมชน คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา ศาสนา ผลดีที่ได้รับอยู่ในระดับน้อยเกือบทั้งหมด ยกเว้นผลดีต่อการจ้างงานในพื้นที่มีผลดีปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ** : ผลเสียที่ประสบในปัจจุบันคือ ฝุ่นละออง มีผลกระทบระดับมาก ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญาของเสียจากกิจกรรมของโครงการ มีผลกระทบในระดับปานกลาง

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
				ความคิดเห็นต่อโครงการ : คิดว่าโครงการมีผลเสียมากกว่าผลดี และไม่เชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านเคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ แต่ไม่ระบุว่าเรื่องใด แต่โครงการมีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่โครงการทำร่วมกับชุมชน คือ กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย **ข้อเสนอแนะ** : อยากให้ดูแลชุมชนโดยเฉพาะผลกระทบด้านน้ำกิน น้ำใช้ ควรเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้ กรณีเกิดผลกระทบต้องเร่งแก้ไข

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
15. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านบ่ออ่างไผ่ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองคือ ค้าขาย **ปัญหาสังคม :** ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อยทั้งหมด **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาการว่างงาน และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย สำหรับปัญหาค่าครองชีพสูง และปัญหารายได้ต่ำ มีผลกระทบในระดับมาก	- ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนคือ การขาดการออกกำลังกาย เมื่อต้องเข้าพบแพทย์ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีปัญหาด้านการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีเพียงพอและคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน จัดการ โดยการนำไปรดน้ำต้นไม้ - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาเขม่าควันเกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำเกิดจากไม่มีทางระบายน้ำ มีผลกระทบในระดับน้อยทั้งสองประเด็น	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** เป็นผลดีด้านเศรษฐกิจของชุมชน คือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา ศาสนา มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ผลดีที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบ/ผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านเคยไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - กิจกรรมที่โครงการทำร่วมกับชุมชน คือ การเข้าร่วมประชุมกับชุมชน **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
16. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ ตำบลหันทราย อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) **ปัญหาสังคม :** ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด และปัญหาชุมชนแออัด มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาการว่างงาน และปัญหารายได้ต่ำ มีผลกระทบในระดับปานกลาง สำหรับปัญหาค่าครองชีพสูง และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับมาก	- เมื่อต้องเข้าพบแพทย์ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีปัญหาด้านการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีเพียงพอและคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการฝังกลบ	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร มีผลกระทบในระดับน้อย	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ได้รับผลดีในระดับน้อย **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบ/ผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีพอๆกับผลเสีย และมีความเชื่อมั่นพอสมควรต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านเคยไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
17. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลหันทราย อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์) อาชีพเสริมที่พบคือ รับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวมีผลกระทบในระดับน้อย สำหรับปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย และปัญหารายได้ต่ำ มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- การเจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชนในรอบปีที่ผ่านมาคือ โรคระบบทางเดินหายใจ เมื่อต้องเข้าพบแพทย์ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ที่ปัญหาที่ประสบคือ เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ และบุคลากรไม่เพียงพอ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีคุณภาพดี แต่มีปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากเดิมมาก - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละอองมีผลกระทบในระดับมาก ปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาน้ำท่วม/การระบายน้ำมีผลกระทบในระดับปานกลาง	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่โครงการ และแผ่นพับ/ประกาศ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ได้รับผลดีในระดับน้อย **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ปัญหาฝุ่นละออง มีผลกระทบในระดับมาก ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหากลิ่นเหม็น และปัญหาสุขภาพอนามัย มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลเสียมากกว่าผลดี และไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
18. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ รับจ้างทั่วไป อาชีพรองรองคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์) **ปัญหาสังคม :** ปัญหาการทะเลาะวิวาท มีผลกระทบในระดับน้อย ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบันคือ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน แต่ไม่ได้ระบุระดับผลกระทบที่ได้รับ	- เมื่อเกิดการเจ็บป่วยสมาชิกในชุมชนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานคร และโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ที่ผ่านมามีปัญหาการให้บริการ คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีคุณภาพดี และปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากเดิมเล็กน้อย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือด้านประชากร สิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเขม่าควัน ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการจราจรในพื้นที่ นอกจากนี้มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย น้ำท่วม/การระบายน้ำ และขยะมูลฝอย ระดับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่โครงการ และการประชุมชี้แจงโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และทำให้เกิดการอนุรักษณ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้รับผลดีในระดับปานกลางทั้งหมด **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ปัญหาที่ได้รับในช่วงที่ผ่านมาคือ ปัญหาฝุ่นละออง มีผลกระทบในระดับน้อย **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
19. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านหันทราย ตำบลหันทราย อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) **ปัญหาสังคม :** ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหารายได้ต่ำเป็นปัญหาที่ประสบในปัจจุบันมีผลกระทบในระดับปานกลาง	- โรคที่พบการเจ็บป่วยในช่วงที่ผ่านมาคือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ และคลินิกซึ่งไม่มีปัญหาด้านการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำอุปโภค/น้ำใช้ที่สำคัญในครัวเรือน ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนมีคุณภาพดี และปริมาณเพียงพอ - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละออง มีผลกระทบระดับปานกลาง แหล่งที่มาเกิดจากการจราจร ปัญหาน้ำท่วม/การระบายน้ำ เกิดจากฝนตก ท่อระบายน้ำอุดตัน มีผลกระทบในระดับน้อย	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลจากการพบเห็นด้วยตนเอง **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ได้รับผลดีในระดับปานกลางทั้งหมด **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ปัญหาที่ได้รับในช่วงที่ผ่านมาคือ ปัญหาฝุ่นละออง มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** คิดว่าโครงการมีผลดีพอ ๆ กับผลเสีย และมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
20. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว **ปัญหาสังคม :** ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย มีผลกระทบในระดับปานกลาง และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน และปัญหาค่าครองชีพสูง มีผลกระทบในระดับปานกลาง สำหรับปัญหารายได้ต่ำและไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบการเจ็บป่วยในชุมชน สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่รับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ และรพ.สต.บ้านด่าน ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน มีปริมาณและคุณภาพดี สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน คือ น้ำประปา มีปัญหาเรื่องคุณภาพไม่ดี คือน้ำขุ่นมีกลิ่น ที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับปรุง - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละอองและปัญหาเขม่าควัน มีผลกระทบในระดับน้อย แหล่งที่มาส่วนใหญ่เกิดจากการก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** ไม่ได้รับผลดีจากกิจกรรมของโครงการ **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร แต่ไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - ที่ผ่านมาโครงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนบ้าง **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มี

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
		- การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา และทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.		
21. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย **ปัญหาสังคม :** ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำและไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบการเจ็บป่วยในชุมชน สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ และรพ.สต.บ้านด่าน ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปาเป็นแหล่งน้ำอุปโภคที่สำคัญ พบว่าทั้งน้ำอุปโภคและบริโภคของชุมชน มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาฝุ่นละอองและปัญหาเขม่าควัน มีผลกระทบในระดับน้อย แหล่งที่มาส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** ไม่ได้รับผลดีจากกิจกรรมของโครงการ **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร คิดว่าโครงการมีผลดีพอ ๆกับผลเสีย - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - ที่ผ่านมาโครงการไม่มีการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน **ข้อเสนอแนะ :** อยากให้โครงการเข้าแนะนำให้ความรู้เรื่องการปลูกอ้อยกับชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
		- การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา และทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.		ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสื่อสารกับ CSR ของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้ชุมชนรับทราบ
22. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง** : ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา** : เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ** : อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย **ปัญหาสังคม** : ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับปานกลาง ปัญหาลักขโมย และปัญหาการทะเลาะวิวาท มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ** : ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำและไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบการเจ็บป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการขุมชน เมื่อเจ็บป่วยสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัฒนานคร และรพ.สต. หนองแวง ที่ผ่านมาพบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปาเป็นแหล่งน้ำอุปโภคที่สำคัญ พบว่าทั้งน้ำอุปโภคและบริโภคของชุมชน มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหากลิ่นรบกวน และปัญหาน้ำเสีย แหล่งที่มาของปัญหามาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล** : รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา** : ทำให้มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ มีผลดีในระดับน้อย และโครงการทำให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ** : ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ** : มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร คิดว่าโครงการมีผลดีพอ ๆกับผลเสีย - ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - ที่ผ่านมาโครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
		ที่โล่ง ปล่อยลงแหล่งน้ำ/คลอง และระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา และทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.		**ข้อเสนอแนะ :** ไม่มีข้อเสนอแนะ
23. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ ค้าขาย **ปัญหาสังคม :** ที่ประสบในปัจจุบันคือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับปานกลาง ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำและไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบการเจ็บป่วย เมื่อเจ็บป่วยสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัฒนานคร และรพ.สต. หนองแวง ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาจากการใช้บริการ - น้ำถัง/ขวด เป็นแหล่งน้ำบริโภค/น้ำดื่มที่สำคัญของครัวเรือน และน้ำประปาเป็นแหล่งน้ำอุปโภคที่สำคัญ น้ำดื่มน้ำใช้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนจัดการ โดยการระบายลงพื้นดิน/	- ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ปัจจุบันไม่พบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** ไม่ได้รับผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร คิดว่าโครงการมีผลดีพอ ๆ กับผลเสีย - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
		ที่โล่ง และระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ - การจัดการขยะมูลฝอย โดยการกองแล้วเผา และทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.		**ข้อเสนอแนะ :** ไม่มีข้อเสนอแนะ
24. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมขนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับปานกลาง และปัญหาการทะเลาะวิวาท มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำและไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับน้อย	ไม่ให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ไม่ให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง ผลดีด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้เจริญขึ้น มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับน้อย **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลเสียจากกิจกรรมของโครงการ

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
				ความคิดเห็นต่อโครงการ : มีความเชื่อมั่นสูงต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - โครงการมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมกิจกรรมชุมชน **ข้อเสนอแนะ** : ไม่มีข้อเสนอแนะ
25. **ผู้นำขุมชนหมู่ที่ 6 บ้านทางหลวง ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร** **ตำแหน่ง** : ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา** : เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ** : อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม** : ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ปัญหาเศรษฐกิจ** : ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำและไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- เมื่อมีการเจ็บป่วย ต้องรับการรักษาพยาบาลจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานคร และ รพ.สต. ที่ผ่านมามีปัญหาด้านการบริการ คือ บุคลากรไม่เพียงพอ - แหล่งน้ำดื่ม/น้ำบริโภคของชุมชน คือ น้ำถัง/ขวด แหล่งน้ำใช้/น้ำอุปโภค คือ น้ำประปา ซึ่งมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน จัดการโดยระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง	- ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ ด้านประชากรในชุมชน - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบันคือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเขม่าควัน และปัญหาเสียงดังรบกวน มีผลกระทบระดับปานกลาง แหล่งที่มาของปัญหาเกิดจากการก่อสร้าง การ	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล** : รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา** : มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ** : ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหากลิ่นเหม็น มีผลกระทบในระดับปานกลาง **ความคิดเห็นต่อโครงการ** : มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พอสมควร คิดว่าโครงการมีผลดีพอ ๆ กับผลเสีย

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
		- การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จัดการโดยกองแล้วเผา	เผาขยะ และเผาพื้นที่เกษตรกรรม	- ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มีข้อเสนอแนะ
26. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุข ตำบลหันทราบ อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน และปัญหาค่าครองชีพสูง เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- เมื่อมีการเจ็บป่วย ต้องรับการรักษาพยาบาลจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานคร และ รพ.สต. หันทราบ ที่ผ่านมามีปัญหาด้านการบริการ คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ - แหล่งน้ำดื่ม/น้ำบริโภคของชุมชน คือ น้ำถัง/ขวด แหล่งน้ำใช้/น้ำอุปโภค คือ น้ำประปา ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้มีปริมาณเพียงพอ แต่พบว่าน้ำใช้มีปัญหาเรื่องคุณภาพ คือ น้ำขุ่น/มีตะกอน	- ในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ปัจจุบันไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** ไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ แต่มีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร - ที่ผ่านไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
		- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน จัดการโดยระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จัดการโดยกองแล้วเผา		- โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลต่าง ๆ **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มีข้อเสนอแนะ
27. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ที่ประสบในปัจจุบันคือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับปานกลาง ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหารายได้ต่ำและไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบในระดับปานกลาง	- เมื่อมีการเจ็บป่วย ต้องรับการรักษาพยาบาลจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศและ รพ.สต. หันทราย ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ - แหล่งน้ำดื่ม/น้ำบริโภคของชุมชน คือ น้ำถัง/ขวด แหล่งน้ำใช้/น้ำอุปโภค คือ น้ำประปา น้ำใช้ด้านต่าง ๆ ในชุมชนมีความเพียงพอและมีคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน จัดการโดยระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จัดการโดยกองแล้วเผา	- ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ปัจจุบันไม่พบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** ผลดีที่เคยได้รับคือ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับน้อย **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
				- โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน **ข้อเสนอแนะ :** อยากให้มีการรับสมัครคนในพื้นที่เข้าทำงานมากขึ้น
28. **ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านดงทม ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ** **ตำแหน่ง :** ผู้ใหญ่บ้าน **ภูมิลำเนา :** เกิดที่จังหวัดสระแก้ว	**อาชีพ :** อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) อาชีพรองที่พบคือ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป **ปัญหาสังคม :** ที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบในระดับปานกลาง ปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว มีผลกระทบในระดับน้อย **ปัญหาเศรษฐกิจ :** ไม่พบปัญหาด้านเศรษฐกิจ	- เมื่อมีการเจ็บป่วย ต้องรับการรักษา พยาบาลจะเข้ารับการรักษาที่โรง พยาบาลอรัญประเทศ และรพ.สต. ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ - แหล่งน้ำดื่ม/น้ำบริโภคของชุมชน คือ น้ำถัง/ขวด แหล่งน้ำใช้/น้ำอุปโภค คือ น้ำประปา ทั้งน้ำอุปโภคและน้ำบริโภคในชุมชนมีความเพียงพอ และมีคุณภาพดี - การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน จัดการโดยระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง - การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จัดการโดยกองแล้วเผา	- ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ปัจจุบันไม่พบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	**การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงงานน้ำตาล :** รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาล จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ **ผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา :** ผลดีที่เคยได้รับคือ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีผลดีในระดับปานกลาง **ผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ :** ไม่เคยได้รับผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ **ความคิดเห็นต่อโครงการ :** มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพอสมควร คิดว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ - โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน **ข้อเสนอแนะ :** ไม่มีข้อเสนอแนะ

5.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจรวมทั้งหมด 379 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

เพศและอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 64.9 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 35.1 เป็นเพศชาย โดยอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 39.3) รองลงมา ร้อยละ 28.8 อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 18.2 อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 7.9 อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี และร้อยละ 5.8 อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ตามลำดับ

การศึกษา และภูมิลำเนา/การย้ายถิ่น เมื่อสอบถามถึงระดับการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.5) จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รองมา ร้อยละ 14.8 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 13.5 จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.5) เป็นประชากรดั้งเดิมหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด (พื้นที่จังหวัดสระแก้ว) มีเพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้นที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เช่น กรุงเทพฯ จังหวัดในภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เช่น อุดรธานี ศรีษะเกษ) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.9) ย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ รองลงมา ร้อยละ 28.6 ติดตามครอบครัว/พ่อแม่ และร้อยละ 9.5 แต่งงานกับคนในพื้นที่ ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

อาชีพหลัก และอาชีพเสริม/รอง อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ทำไร่) เป็นอาชีพหลักของครัวเรือนที่มีผู้เมื่อสอบถามถึงอาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ลำดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 38.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่อาชีพหลัก รองลงมา ร้อยละ 31.9 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และร้อยละ 21.9 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 26.8) ตามลำดับ ส่วนการประกอบอาชีพเสริม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.5 ไม่มีอาชีพเสริม มีเพียงร้อยละ 9.5 ที่ระบุว่ามีอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 54.1 ค้าขาย ร้อยละ 35.1 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 10.8 ตามลำดับ สำหรับภาวะการเงินของครอบครัว ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.8 มีรายได้เพียงพอและมีเงินออม รองลงมา ร้อยละ 33.2 มีรายได้เพียงพอและไม่มีเงินออม และร้อยละ 17.9 มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ตามลำดับ

ปัญหาทางสังคม ปัญหาสังคมที่มีผู้ระบุว่าชุมชนประสบในปัจจุบันสูงสุด (ร้อยละ 12.9) คือ ปัญหาแรงงานต่างถิ่น/แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย รองลงมาในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 12.4) คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาการลักขโมย ร้อยละ 6.3 มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง แสดงดัง**ตารางที่ 5.2-1**

ตารางที่ 5.2-1 ปัญหาทางด้านสังคมในชุมชน

ปัญหาทางสังคม	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. แรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น	87.1	12.9	59.2	38.8	2.0
2. ยาเสพติด	87.6	12.4	34.0	61.7	4.3
3. ลักขโมย	93.7	6.3	45.8	45.8	8.4
4. การทะเลาะวิวาท	97.9	2.1	75.0	12.5	12.5
5. ขุมชนแออัด	98.2	1.8	71.4	14.3	14.3

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 24 -26 กันยายน พ.ศ. 2567

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สำหรับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีผู้ระบุว่าประสบในปัจจุบันสูงสุด คือ ปัญหารายได้ต่ำ (ร้อยละ 39.3) มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 36.9) มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาค่าครองชีพสูง ร้อยละ 20.6 มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ร้อยละ 15.6 มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย แสดงดัง**ตารางที่ 5.2-2**

ตารางที่ 5.2-2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน

ปัญหาทางเศรษฐกิจ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. รายได้ต่ำ	60.7	39.3	40.3	55.0	4.7
2. การว่างงาน	63.1	36.9	45.7	50.0	4.3
3. ค่าครองชีพสูง	79..4	20.6	59.0	34.6	6.4
4. ไม่มีที่ดินทำกิน	84.4	15.6	73.3	23.3	3.4

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 24 -26 กันยายน พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

เมื่อสอบถามถึงการเจ็บป่วย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 57.8 ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา-ปัจจุบัน ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย มีเพียงร้อยละ 42.2 ที่ระบุว่าเคยมีการเจ็บป่วย ซึ่งโรคที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 39.3) คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด รองลงมาคือโรคต่อมไร้ท่อ เช่น คอพอก เบาหวาน และไขมัน (ร้อยละ 24.3) และโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และภูมิแพ้ (ร้อยละ 17.3) ตามลำดับ ซึ่งการรักษาเมื่อเจ็บป่วยเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.5) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลสระแก้ว เป็นต้น รองลงมาคือ คลินิก ร้อยละ 4.7 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ ร้อยละ 0.8 เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงการให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.2 ระบุว่าไม่มีปัญหาในการให้บริการ มีเพียงร้อยละ 1.8 (7 ราย) ที่พบว่ามีปัญหาในการให้บริการ ได้แก่ บริการล่าช้า และบุคลากรไม่เพียงพอ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

แหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.2) ระบุว่าแหล่งน้ำดื่ม คือ น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง มีเพียงร้อยละ 0.5 ที่ระบุว่าดื่มน้ำจากน้ำประปาผ่านเครื่องกรอง และ 1 ราย (ร้อยละ 0.3) ดื่มน้ำฝน ทั้งหมดระบุว่าน้ำดื่มมีความเพียงพอ และคุณภาพดี สำหรับแหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.0 ระบุว่าใช้น้ำประปา ที่เหลือ ร้อยละ 3.7 ใช้น้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ คือ ใช้น้ำบ่อ/บาดาล และน้ำฝน ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.5 ระบุว่าน้ำใช้มีความเพียงพอ มีเพียงร้อยละ 0.5 ที่ระบุว่าไม่เพียงพอ ด้านคุณภาพน้ำใช้ ระบุว่า มีคุณภาพดี ร้อยละ 94.7 มีเพียง ร้อยละ 5.3 ระบุว่า น้ำขุ่น/มีตะกอน ซึ่งเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.6) ระบุว่าไม่ได้ทำการแก้ไขหรือปรับปรุงน้ำก่อนนำไปใช้ มีเพียง ร้อยละ 2.4 ที่มีการทำให้ตกตะกอนก่อนนำมาใช้ในครัวเรือน

การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งและการจัดการมูลฝอยของครัวเรือน เมื่อสอบถามถึงการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.8) ระบุว่า ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง รองลงมา ร้อยละ 20.5 ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ที่เหลือ ร้อยละ 1.0 ปล่อยลงแหล่งน้ำ/คลอง และร้อยละ 0.7 นำไปรดต้นไม้ สำหรับการจัดการมูลฝอยของครัวเรือน ร้อยละ 50.5 ระบุว่า เทขยะกองแล้วเผา รองลงมา ร้อยละ 47.5 ระบุว่า ทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต. ร้อยละ 1.3 ทิ้งกลางแจ้ง และร้อยละ 0.8 ฝังกลบ ตามลำดับ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ เมื่อสอบถามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนช่วงระยะ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 53.3 ระบุว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม สำหรับผู้ที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 46.7) แบ่งเป็น ร้อยละ 29.3 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย ร้อยละ 13.7 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมปานกลาง และร้อยละ 3.7 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ตามลำดับ การเปลี่ยแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผู้ระบุสูงสุด (ร้อยละ 45.8) คือ การเปลี่ยนด้านประชากร (การเพิ่ม/ลด ของประชากรในชุมชน) รองลงมา ร้อยละ 38.4 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ/เศรษฐกิจของชุมชน ร้อยละ 32.9 มีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณูปโภคของชุมชน ร้อยละ 24.5 มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 4.2 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการสาธารณสุข ตามลำดับ

สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน ที่มีผู้ระบุสูงสุด คือ ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 34.0) ส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร และการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9 ของผู้ระบุว่าประสบปัญหา) มีผลกระทบในระดับน้อย ปัญหารองลงมาคือ ปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ (ร้อยละ 18.7) มีผลกระทบในระดับปานกลางสูงสุด (ร้อยละ 59.2 ของผู้ประสบปัญหา) และปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ12.1) ส่วนใหญ่ระบุว่ามีผลกระทบระดับน้อย (ร้อยละ 63.0 ของผู้ที่ประสบปัญหา) แสดงดัง**ตารางที่ 5.2-3**

ตารางที่ 5.2-3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนประสบในปัจจุบัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			แหล่งที่มา	ร้อยละ
			น้อย	ปานกลาง	มาก		
1. ฝุ่นละออง	66.0	34.0	63.9	33.8	2.3	1. การจราจร 2. การก่อสร้าง 3. โรงงานอุตสาหกรรม 4. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 5. มาตามลม, การผาอ้อย	81.5 11.6 4.1 0.7 2.1
2. น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ	81.3	18.7	32.4	59.2	8.5	1. ฝนตก 2. ท่อระบายน้ำอุดตัน 3. ไม่มีทางระบายน้ำ	71.1 6.2 22.7
3. เสียงดังรบกวน	87.9	12.1	63.0	34.8	2.2	1. การจราจร 2. การก่อสร้าง 3. โรงงานอุตสาหกรรม	87.2 6.4 6.4
4. กลิ่นรบกวน	95.0	5.0	31.6	57.9	10.5	1. การจราจร 2. ขยะมูลฝอย 3. โรงงานอุตสาหกรรม 4. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์	21.1 10.5 10.5 57.9
5. เขม่า/ควัน	95.3	4.7	4.5	50.0	5.0	1. การจราจร 2. การเผาขยะ 3. โรงงานอุตสาหกรรม 4. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 3. มาตามลม, การผาอ้อย	36.8 15.8 5.3 36.8 5.3
6. อุบัติเหตุจากการจราจร	98.2	1.8	57.1	28.6	14.3	1. ปริมาณรถหนาแน่น 2. ผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง	30.0 70.0
7. ขยะมูลฝอย	99.5	0.5	0.0	50.0	50.0	1. ที่พักอาศัย	100.0
8. น้ำเสีย	99.7	0.3	0.0	100.0	0.0	1. ชุมชน	100.0

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 24 -26 กันยายน พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 6 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

การรับทราบ/รู้จัก โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.8) เคยทราบ/รู้จักโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ ทราบจากการเห็นด้วยตนเอง (ร้อยละ 86.4) รองลงมา ทราบจากญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน (ร้อยละ 7.1) ทราบจากการประชุมชี้แจงโครงการ (ร้อยละ 3.8) ทราบจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ (ร้อยละ 2.2) ทราบจากผู้นำชุมชน และแผ่นพับ/การติดประกาศ มีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 0.3) มีเพียง ร้อยละ 3.2 (12 ราย) ที่ระบุว่า ไม่รู้จัก

ผู้ที่ระบุว่าไม่เคยรู้จักหรือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครวการโรงงานผลิตน้ำตาล มาก่อนพบว่าอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ (1 ราย) หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร (1 ราย) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหนองแวง (1 ราย) หมู่ที่ 2 บ้านหันทราย ตำบลหันทราย (2 ราย) หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลหันทราย (1 ราย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ ตำบลหันทราย (1 ราย) หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน (3 ราย) หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านด่าน (1 ราย) และหมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ (1 ราย)

การดำเนินงานในปัจจุบัน จากการสอบถามเกี่ยวกับผลดี ผลเสียที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โดยแบ่งประเด็นสอบถามเป็น ผลดีที่ได้รับและผลเสียที่ได้รับ พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าได้รับผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีสูงกว่าผลเสีย (รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ 5.2-4**) ดังนี้

- **ผลดี** ที่มีผู้ระบุว่าได้รับสูงสุดคือ โครงการทำให้เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ (ร้อยละ 47.0) ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลดีในระดับน้อย และปานกลางมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 49.2 ของผู้ที่ได้รับผลดี) รองลงมาคือ ทำให้สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น (ร้อยละ 34.8) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.9) ระบุว่าได้รับผลดีในระดับปานกลาง โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ร้อยละ 25.1) ส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับผลดีในระดับน้อย (ร้อยละ 64.6)

- **ผลเสีย** สัดส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าได้รับผลเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการไม่สูงนัก (ต่ำกว่าร้อยละ 10.0) โดยผลเสียที่มีผู้ระบุว่าได้รับจากโครงการมีทั้งหมด 4 ประเด็น ประเด็นที่มีผู้ระบุสูงสุด (ร้อยละ 6.3) ดังนี้

(1) ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.8 ของผู้ได้รับผลเสีย) ระบุว่ามีผลกระทบในระดับน้อย *หมู่บ้านที่มีผู้ระบุว่าได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง คือ หมู่ 6 บ้านทดหลวง (3 ราย) หมู่ 7 บ้านทดน้อย (5 ราย) หมู่ 9 บ้านทางหลวง (1 ราย) หมู่ 10 บ้านเนินผาสุก (1 ราย) หมู่ 1 บ้านหันทราย (1 ราย) หมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ (6 ราย) หมู่ 4 บ้านหนองบัวใต้ (3 ราย) หมู่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ (1 ราย) หมู่ 5 บ้านโรงเรียน (2 ราย) และหมู่ 6 บ้านกุดม่วง (1 ราย)*

(2) ปัญหาน้ำเสีย (ร้อยละ 3.1) ผู้ที่ระบุว่ามีผลกระทบระดับน้อย และมากมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50.0 เท่ากัน) *หมู่บ้านที่มีผู้ระบุว่าได้รับผลกระทบเรื่องน้ำเสีย คือ หมู่ 7 บ้านทดน้อย (1 ราย) หมู่ 1 บ้านหนองแวง (10 ราย) และหมู่ที่ 5 บ้านโรงเรียน (1 ราย)*

(3) ปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 2.4) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.6 ของผู้ที่ได้รับผลเสีย) ระบุว่ามีผลกระทบในระดับปานกลาง *หมู่บ้านที่มีผู้ระบุว่าได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวน คือ หมู่ 4 บ้านห้วยพะใย (1 ราย) หมู่ 7 บ้านทดน้อย (1 ราย) หมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ (5 ราย) หมู่ 4 บ้านหนองบัวใต้ (1 ราย) และหมู่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ (1 ราย)*

ตารางที่ 5.2-4 ผลดี-ผลเสีย ของการดำเนินการของ โรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
ผลดี					
1. มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ	53.0	47.0	49.2	49.2	1.7
2. สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น	65.2	34.8	22.5	72.9	4.6
4. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	74.9	25.1	64.6	31.3	4.1
3. มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	78.6	21.4	54.3	44.4	1.2
5. ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	91.3	8.7	45.5	54.5	0.0
ผลเสีย					
1. ฝุ่นละออง	93.7	6.3	70.8	20.8	8.2
2. น้ำเสีย	96.9	3.1	50.0	0.0	50.0
3. เสียงดังรบกวน	97.6	2.4	44.4	55.6	0.0
4. กลิ่นเหม็น	98.4	1.6	33.3	50.0	16.7
5. เขม่าควัน	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. มีการทิ้งกากของเสีย	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. สารเคมีรั่วไหล	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. มีปัญหาสุขภาพอนามัย	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 24 -26 กันยายน พ.ศ. 2567

(4) ปัญหากลิ่นเหม็น (ร้อยละ 1.6) ครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 50.0) ระบุว่ามีผลกระทบในระดับปานกลาง *หมู่บ้านที่มีผู้ระบุว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น คือ หมู่ 7 บ้านทดน้อย (2 ราย) หมู่ 13 บ้านเนินผาสุก (1 ราย) หมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ (3 ราย)*

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อโครงการมีร้อยละ 34.0 ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ สำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นพบว่าในภาพรวมผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อโครงการ กล่าวคือ ร้อยละ 44.4 ระบุว่า การมีโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย รองลงมา ร้อยละ 20.3 มีผลดีพอๆ กับผลเสีย มีเพียงร้อยะ 1.3 เท่ากันที่ระบุว่าโครงการมีผลเสียมากกว่าผลดี *ซึ่งผู้ที่ระบุว่าโครงการมีผลเสียมากกว่าผลดี จำนวน 5 ราย อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านทดน้อย (1 ราย) หมู่ 9 บ้านทางหลวง (1 ราย) หมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ (2 ราย) และหมู่ 5 บ้านโรงเรียน (1 ราย)*

เมื่อสอบถามความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่า ร้อยละ 48.9 ระบุว่าไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ เนื่องจากโครงการยังไม่เปิดดำเนินการผลิตน้ำตาลแต่อย่างใด รองลงมา ร้อยละ 34.4 มีความเชื่อมั่นพอสมควร ร้อยละ 13.4 มีความเชื่อมั่นสูง และร้อยละ 3.2 ไม่เชื่อมั่น


เมื่อสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.4 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ มีเพียงร้อยละ 16.6 ที่เคยเข้า

ร่วมกิจกรรม เช่น ร่วมประชุม สำหรับข้อเสนอแนะ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.6 ไม่มีข้อเสนอแนะ มีเพียงร้อยละ 3.4 ที่มีข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังนี้

- มีการถมที่สูงทำให้พื้นที่ได้รับความเดือดร้อน *(หมู่ 4บ้านห้วยพะใย)*
- ช่วยทำความสะอาดหน้าถนน *(หมู่ 4 บ้านห้วยพะใย หมู่ 6 บ้านทดหลวง และหมู่ 7 บ้านทดน้อย)*
- ให้ปรับปรุงถนนบริเวณโรงงาน *(หมู่ 7 บ้านทดน้อย และหมู่ 12 บ้านหนองสลักได)*
- อยากให้ดูแลเรื่องกลิ่นเหม็น *(หมู่ 7 บ้านทดน้อย)*
- อยากให้ปรับปรุงเรื่องฝุ่นละออง *(หมู่ 7 บ้านทดน้อย และหมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ)*
- โรงงานต้องไม่สร้างผลกระทบต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียง *(หมู่ 9 บ้านบ่อหลวง และหมู่ 5 บ้านโรงเรียน)*
- อยากให้ดูแลเรื่องรถบรรทุกเข้าออกโรงงาน *(หมู่ 6 บ้านกุดม่วง)*
- อยากให้โครงการสนับสนุนรถเก็บขยะ *(หมู่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์)*
- อยากให้รับสมัครงานของคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนคนนอกพื้นที่ *(หมู่ 6 บ้านกุดม่วง)*

6. บทสรุป


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 407 ราย แบ่งเป็นกลุ่มตัวแทนครัวเรือน จำนวน 379 ราย และกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 28 ราย พบว่าส่วนใหญ่รู้จักโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลฯ มาแล้ว จากช่องทางต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ จากการพบเห็นด้วยตนเอง และจากการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ **(รูปที่ 6-1)**

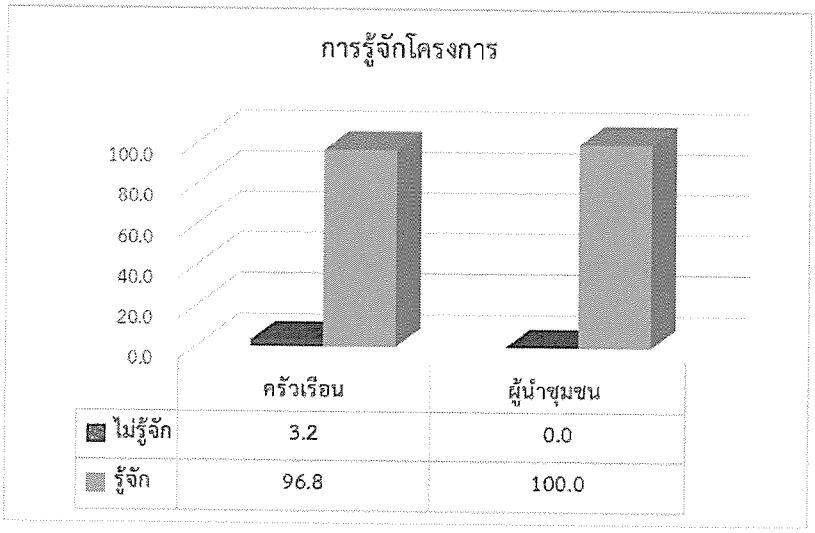

	ครัวเรือน	ผู้นำชุมชน
ไม่รู้จัก	3.2	0.0
รู้จัก	96.8	100.0

รูปที่ 6-1 แผนภูมิเปรียบเทียบการรับรู้/รู้จักโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล

ความคิดเห็นต่อโครงการ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อโครงการ กล่าวคือ สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสียมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ มีผลดีพอๆ กับผลเสีย ดังแสดงในรูปที่ 6-2

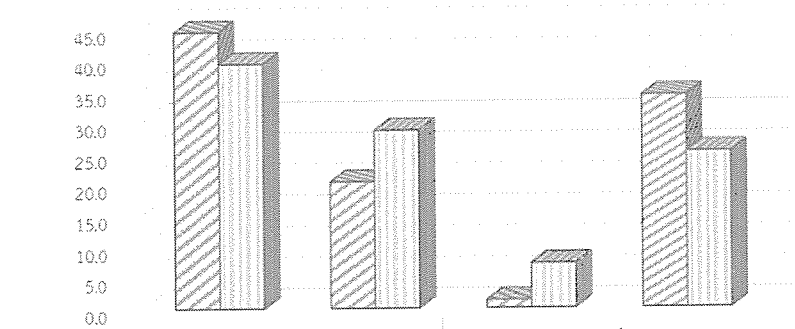

	มีผลดีมากกว่าผลเสีย	มีผลดีพอๆ กับผลเสีย	มีผลเสียมากกว่าผลดี	ไม่แสดงความคิดเห็น
ครัวเรือน	44.4	20.3	1.3	34.0
ผู้นำชุมชน	39.3	28.6	7.1	25.0

รูปที่ 6-2 แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

สำหรับผลกระทบที่เคยได้รับจากกิจกรรมของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นผลกระทบด้านบวก/ผลดี เกี่ยวกับเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ ทำให้เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ เศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น มีความเจริญขึ้น และมีการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

ภาคผนวก ข-38

สรุปรายงานกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

วาระที่ 4.5
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนับสนุนน้ำดื่ม KSL จำนวน 600 ขวด ในการแข่งขันกีฬา ราชสีห์สัมพันธ์ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร


โดยมีคุณวิลาสินี เทียนทอง กำนันตำบลวัฒนานคร, คุณบุษปวัน เทียนทอง อดีตกำนันตำบลวัฒนานคร รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2567



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักได ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 4 สิงหาคม 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายบุญเลิศ เพียโคตร ผู้ใหญ่บ้านหนองสลักได เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

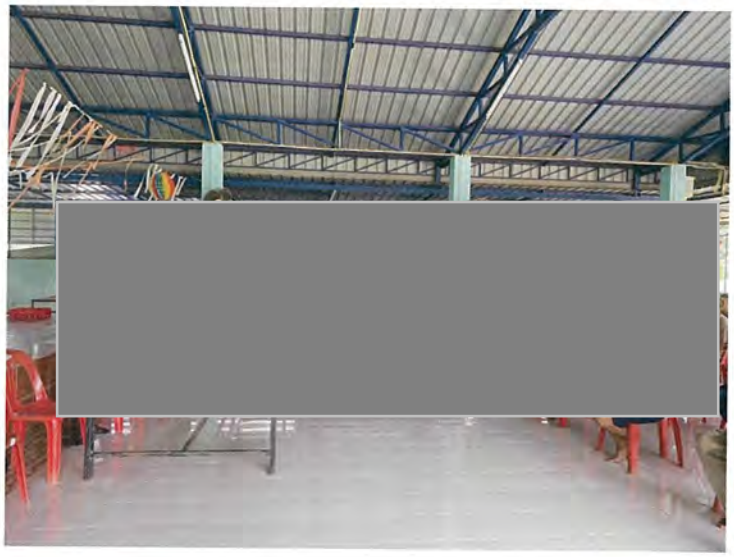



3

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนตู้เย็น 1 เครื่อง ขนาด 8 คิว เพื่อเป็นของขวัญในการจัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวัฒนานคร ประจำปี 2567

โดยมี คุณอรัญญา ผลาหาญ กำนันตำบลผักขะ/ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวัฒนานคร รับมอบ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67



4

การรับสมัครพนักงานประจำ ในเขตตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง

ทางโครงการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าทำงาน สำหรับประชาชนในตำบลผักขะ และพื้นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 3
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ซึ่งมีผู้สนใจมาสมัครพนักงาน ประมาณ 100 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2567



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท ในกิจกรรม "มหกรรมของดี วิถีวัฒนานคร" ประจำปี 2567


โดยมี คุณจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอวัฒนานคร, พัฒนาการอำเภอ และปลัดอำเภอวัฒนานคร รับมอบ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2567



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนงบประมาณ 2,000 บาท ในกิจกรรม งานเกษียณอายุผู้ใหญ่บ้าน นายคำปน คำบริบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกอย

ณ บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2567

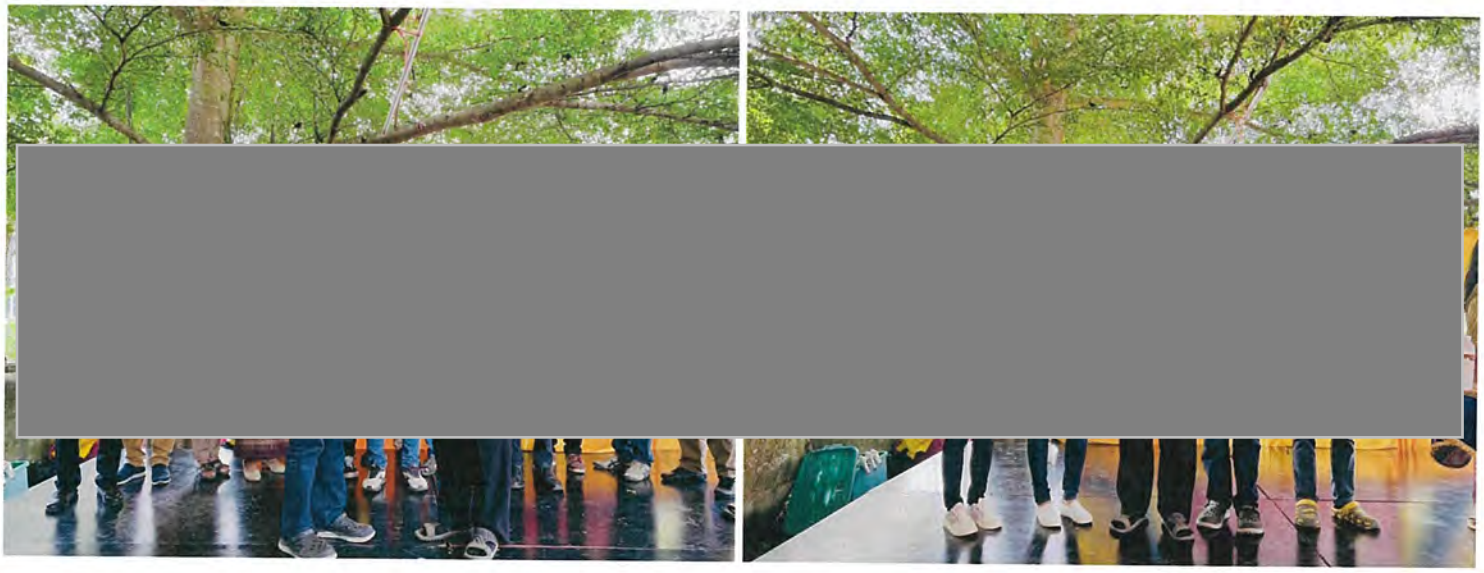

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท ในกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ตำรวจภูธรภาค 2

โดยมี พันตำรวจเอกพิพัฒน์ เต็งถาวร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2567



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 7 กันยายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายกองเงิน สวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านทดน้อย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 8 กันยายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนางละมูล แม่นปืน ผู้ใหญ่บ้านห้วยพะใย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 8 กันยายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายทองสา ประสังกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองหมู เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

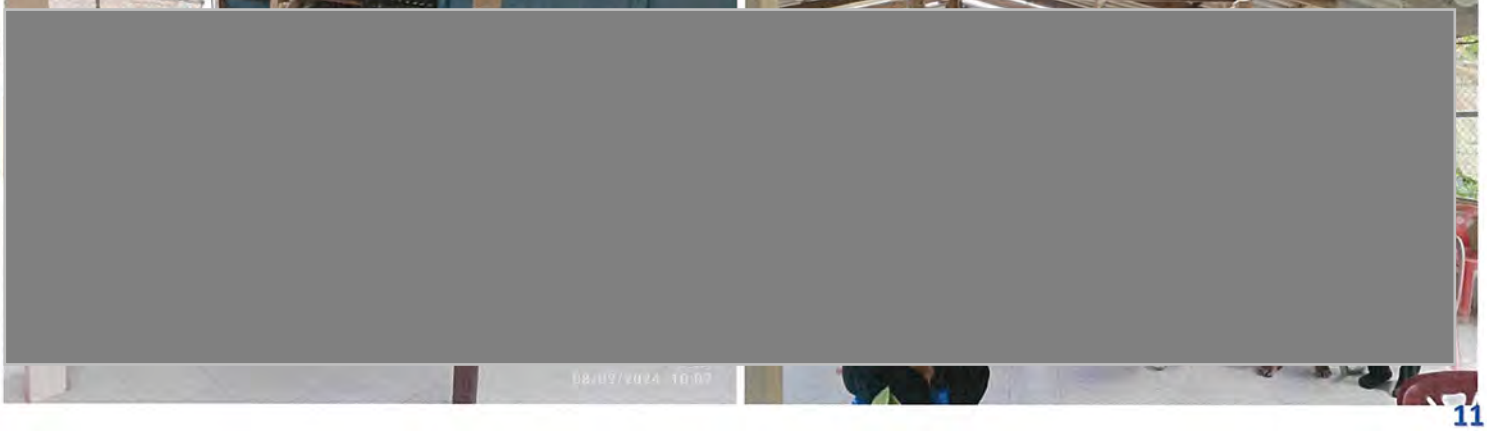




โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 9 กันยายน 2567


เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายมานิตย์ กิตติยานนท์ ผู้ใหญ่บ้านกุตกล้า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม





เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 3 บ.หนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 9 กันยายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายเกียรติรัฐพล หันทยุง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวเหนือ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

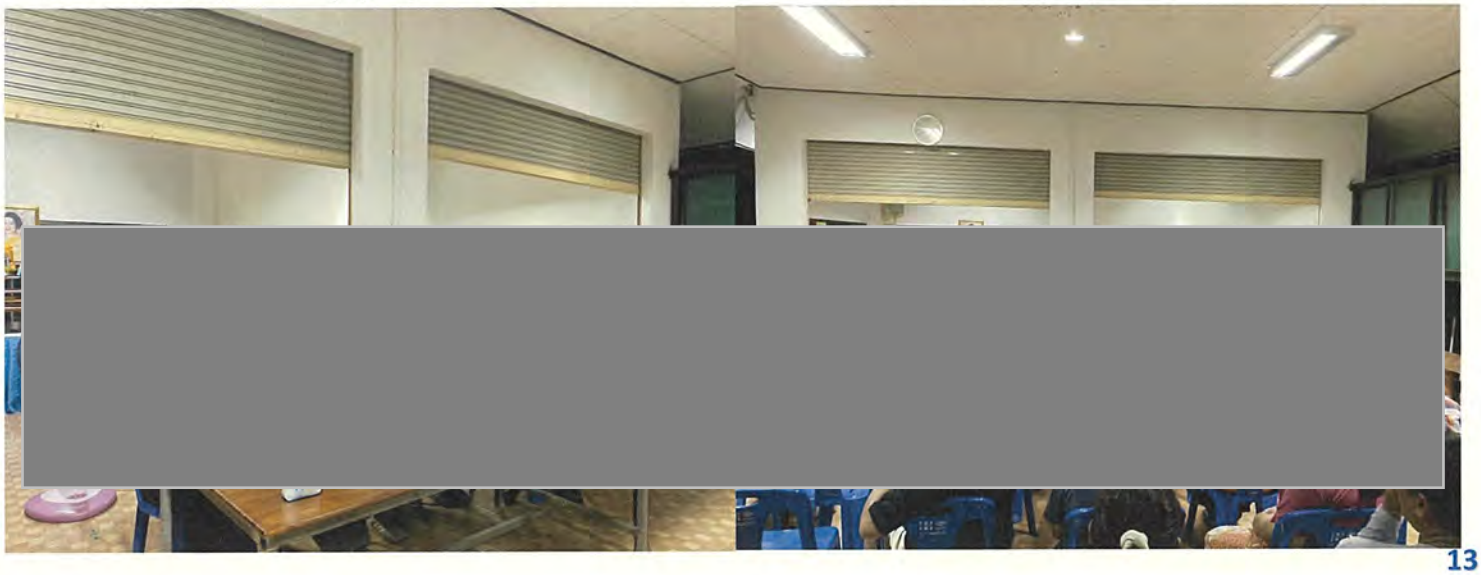

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 10 กันยายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายวุฒิ ประกอบผล ผู้ใหญ่บ้านหนองหอย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



สนับสนุนน้ำตาลทราย 1,5000 กิโลกรัม และ น้ำดื่ม 1,500 ขวด ในเทศกาลกินเจ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าวัฒนานคร

สำหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารเจ และจัดโรงทานบริจาคอาหารให้แก่ผู้ยากไร้ในเทศกาลถือศีล - กินเจ ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2567
โดยมี นายชัยรัตน์ แสงทอง ประธานศาลเจ้า และกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า วัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 5 ตุลาคม 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายทำนอง สังข์ชม ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 5 ตุลาคม 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีนายธงชัย ตั้งเทียมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านโนนจิก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 7 ตุลาคม 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีนายสามารถ โสมน้อย ผู้ใหญ่บ้านวังเสียว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสระแก้ว

เพื่อใช้คัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน โดยมีนางพาณี วสนาท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ ทั้ง 6 แห่ง ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท ในกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 17 ตุลาคม 2567

โดยมี พ.ต.อ.พิพัฒน์ เต็งถาวร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ



สนับสนุนน้ำตาลทราย จำนวน 50 กิโลกรัม ในกิจกรรมล้วงไห ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เพื่อระดมทุนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแวง โดยมี นางศิรดา แขกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนเงิน 236,000 บาท สำหรับการแสดงของศิลปิน ก้อง ห้วยไร่ ในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2568

สำหรับกิจกรรมบนเวทีกลาง งาน "สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว" ประจำปี 2568
โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567



ร่วมทำบุญ 10,000 บาท ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2567 วัดหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยมี นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ นายก อบต.ผักขะ ประธานทอดกฐินสามัคคี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567




สนับสนุนน้ำดื่ม 600 ขวด คณะนักกีฬาจังหวัดสระแก้ว ร่วมการแข่งขัน "ชลบุรีเกมส์" ครั้งที่ 40 / กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7

โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายมนตรี เนินบก ผู้ใหญ่บ้านกุดม่วง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

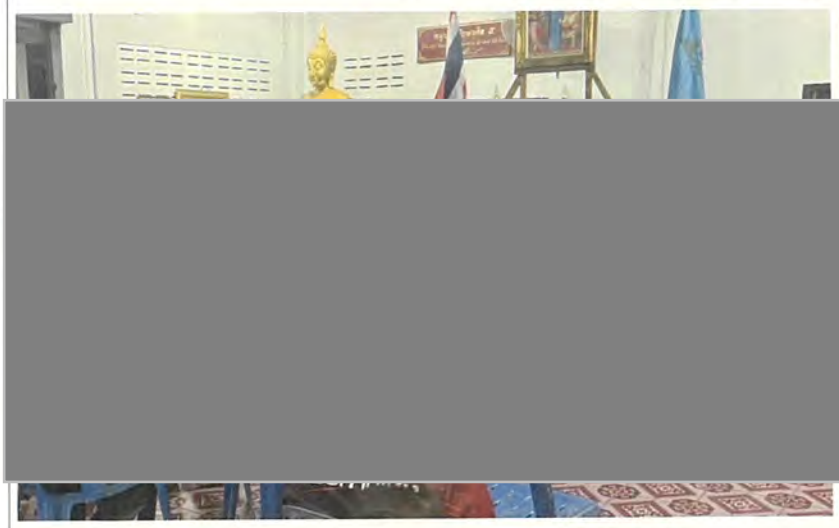



ร่วมออกโรงทานงานทอดกฐิน วัดทดหลวง ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น





เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมี นางฉิชานันท์ แม่นปืน ผู้ใหญ่บ้านห้วยพะใย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายทองหล่อ สายทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนางประมวล สอนแสง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม



ร่วมออกโรงทานงานทอดกฐิน วัดหนองบัวใต้ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น





ร่วมออกโรงทานงานทอดกฐิน วัดหนองหมู ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น





จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยมีผู้บริหารและพนักงานในเครือ KSL Group ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567





จัดกิจกรรมปลูกไม้ผล 80 ต้น ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยมีผู้บริหารและพนักงานในเครือ KSL Group ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

จัดกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมและทาสีสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยมีผู้บริหารและพนักงานในเครือ KSL Group ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567





สนับสนุนน้ำดื่ม 360 ขวด และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภออรัญประเทศ และปลัดอำเภออรัญประเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ออกโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี วัดสุธรรมมาวาส ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยนำขนม และน้ำดื่ม KSLแจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธีทำบุญกฐิน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567





ออกโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี วัดทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยนำเครื่องดื่มโอเลี้ยง ชาไทย และชาเขียว แจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธีทำบุญกฐิน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เตรียมการรับมือกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567






ร่วมเปิดบูธรับสมัครพนักงาน กิจกรรม "วันนัดพบแรงงาน" ของจังหวัดสระแก้ว

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน อันเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ณ ห้างแม็คโคร จ.สระแก้ว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567



เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงทม ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 9 ธันวาคม 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยมีนายวิมนต์ ซาภู ผู้ใหญ่บ้าน, นายไสว บูรณะอินทร์ คณะกรรมการ EIA พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

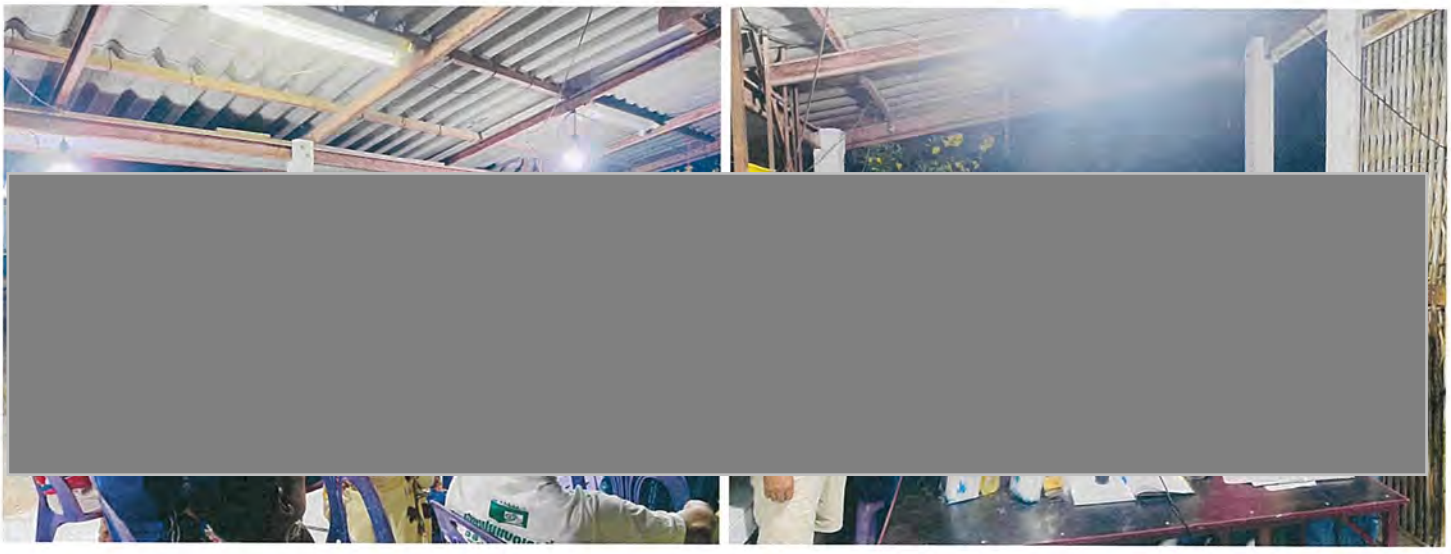

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 11 ธันวาคม 2567

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีนายบุญลือ บุตรหนัน กำนันตำบลหนองแวง, นายวิชัย อินทร์ผดุง คณะกรรมการ EIA พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม





เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ ศาลากลางบ้าน วันที่ 14 ธันวาคม 2567


เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีนายประจวบ มุ่งดี ผู้ใหญ่บ้าน, นายไสว ซ้ำคำ คณะกรรมการ EIA พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม





สนับสนุนเงิน 2,000 บาท การจัด "คอนเสิร์ตรอบพิเศษ" ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว วันที่ 16 ธันวาคม 2567

เพื่อผลักดัน และฟื้นฟูวัฒนธรรม - ประเพณีท้องถิ่น ให้เกิดความแพร่หลาย นำไปสู่การเป็น Soft Power ของท้องถิ่น โดยมี นางสาวสุภาพร สิรวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

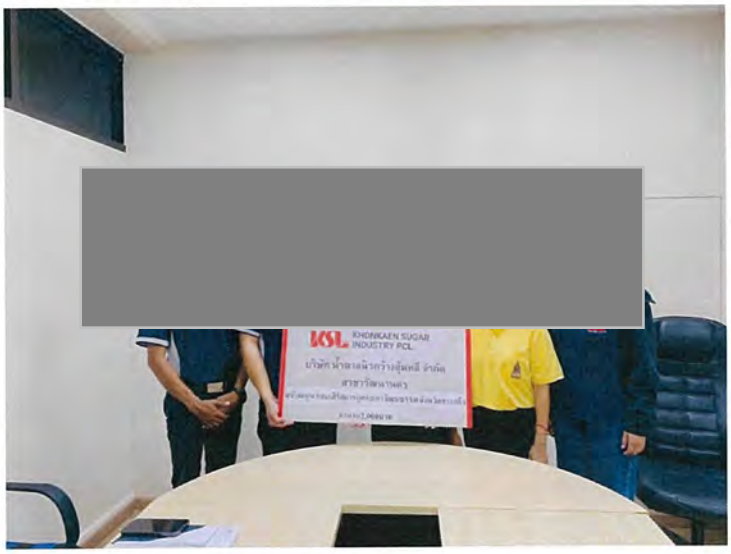



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนน้ำดื่ม 600 ขวด งานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเปลือก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยมีนายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอวัฒนานคร และนายสมจิตร สังข์ชม พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567



เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2568 ของจังหวัดสระแก้ว

โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สนับสนุนน้ำตาลทราย 50 กิโลกรัม จุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2568 ของจังหวัดสระแก้ว

โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายอุทัย ขันทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567





สนับสนุนของขวัญ กิจกรรม "ปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วัฒนานคร ประจำปี 2567"

โดยมีนางครุณี ประยูรวงษ์ คณะครู และกรรมการฝ่ายกิจกรรม เป็นผู้รับมอบ ณ อบต.วัฒนานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567





สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท จุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ 2568 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนางอรัญญา ผลาหาญ กำนันตำบลผักขะ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปกครอง ทั้ง 13 หมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567





สนับสนุนจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2568 อบต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 30 ธันวาคม 2567

สนับสนุนน้ำตาลทรายสำหรับใช้ประโยชน์ในจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2568 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยมี นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ พร้อมด้วย อปพร. เป็นผู้รับมอบ



สนับสนุนจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2568 หมู่บ้านเนินผาสุก ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


โดยมี นายวาสนา ใจประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ ณ จุดบริการประชาชนบ้านเนินผาสุก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567



สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท กิจกรรม "ผู้นำชุมชนตำบลหันทราย" ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ ธนจำรัส กำนันตำบลหันทราย เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกำนันตำบลหันทรายวันที่ 30 ธันวาคม 2567



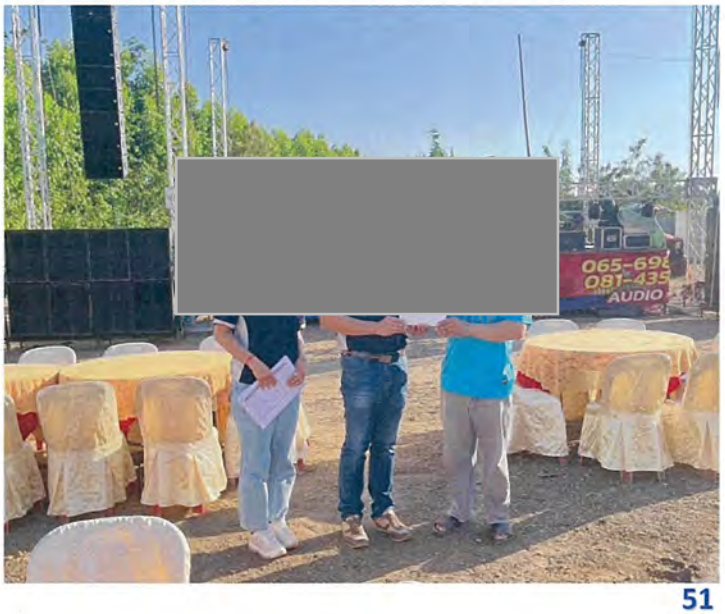

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ร่วมกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ 2568 “ราชสีห์ผักขะ” ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยมี นางสาวอรัญญา ผลาหาญ กำนันตำบลผักขะ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนจำนวน 13 หมู่บ้าน จัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568



