บทที่ 3
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินงาน

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการได้มอบหมายให้บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพน้ำ การน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการบ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 3.2-1**

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด/ พื้นที่ดำเนินการ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ/ ข้อมูลอ้างอิง
1. คุณภาพน้ำ				
	- ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A และอาคาร B) - บ่อพักน้ำ (อาคาร A และ อาคาร B) - บ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ	**<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u>** - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria **<u>ความถี่</u>** - ทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 5 จุด ได้แก่ บริเวณส่วนแยกกากตะกอนของอาคาร A และอาคาร B บริเวณบ่อพักน้ำของอาคาร A และอาคาร B และบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ เก็บตัวอย่างทุก 4 เดือน จากการผลการวิเคราะห์ พบว่าดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตาฐานกำหนด **รายละเอียดแสดงในหัวข้อที่ 3.1**	- ภาคผนวกที่ 3
2. การใช้น้ำ	- เส้นท่อประปา	**<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u>** - การแตกรั่วซึมของท่อประปา **<u>ความถี่</u>** - เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาเป็นประจำ เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบการชำรุดหรือแตกหักจะทำการซ่อมแซมทันที	- ภาคผนวกที่ 2-6
3. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณห้องพักขยะในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร	**<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u>** - ปริมาณขยะตกค้าง - ความสะอาด **<u>ความถี่</u>** - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยในแต่ละชั้น และบริเวณห้องพักขยะรวมอย่างสม่ำเสมอ	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-13 - รูปที่ 2-14

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด/ พื้นที่ดำเนินการ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ/ ข้อมูลอ้างอิง
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน **ความถี่** - 3 เดือน/ครั้ง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ เช่น ระบบสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อยืน ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวจ่ายน้ำดับเพลิง บันไดหนีไฟ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) กริ่งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดของอุปกรณ์จะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที	- รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-8
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน **ความถี่** - 3 เดือน/ครั้ง		
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- สภาพดี เห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน **ความถี่** - 3 เดือน/ครั้ง		
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง - เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน **ความถี่** - 3 เดือน/ครั้ง		
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - การเข้าถึงได้สะดวก **ความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง		
	- ถังเก็บน้ำใช้, ดับเพลิง	- สภาพของถัง - ระดับน้ำในถัง **ความถี่** - ทุก 3 เดือน - เดือนละ 1 ครั้ง		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด/ พื้นที่ดำเนินการ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ/ ข้อมูลอ้างอิง
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	4. อุปกรณ์ดับเพลิง - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน **ความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ เช่น ระบบสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อยืน ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวจ่ายน้ำดับเพลิง บันไดหนีไฟ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) กริ่งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดของอุปกรณ์จะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที	- รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-8
	5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	**ดัชนีที่ตรวจวัด** - สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง **ความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง		
5. ระบบระบายอากาศ	- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	**ดัชนีที่ตรวจวัด** - ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง **ความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศ ช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ	- รูปที่ 2-22
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	**ดัชนีที่ตรวจวัด** - ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัย **ความถี่** - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการไม่มีร้องเรียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานโครงการ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทันที	-

3.2.1 ผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

1) การดำเนินการ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 5 จุด คือ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) บ่อพักน้ำ (อาคาร A) ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) บ่อพักน้ำ (อาคาร B) และบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ มีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีวิธีการเก็บตัวอย่างวิธีวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์**แสดงดังตารางที่ 3.2.1-1** แสดงตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำดัง**รูปที่ 3.2.1-1**

ตารางที่ 3.2.1-1 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	วิธีการตรวจวิคราะห์
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric Method (4500-H^+ B.)
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)
- ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103-105 $^{\circ}C$ (2540 D.)
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B and C)

การดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ โครงการได้มอบหมายให้บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 5 จุด ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) บ่อพักน้ำ (อาคาร A) ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) บ่อพักน้ำ (อาคาร B) และบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ โดยทำการตรวจวิเคราะห์ทุกๆ 4 เดือน ทำการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 และวันที่ 9 ธันวาคม 2568 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดัง**ตารางที่ 3.2.1-2** และ**รูปที่ 3.2.1-1** (รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดัง**ภาคผนวกที่ 3**)

- **ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)**

ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จำนวน 5 จุด ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.0-7.5 ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.0-7.6

บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร A) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.4-7.6 บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร B) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.3-7.5 จากผลวิเคราะห์น้ำบริเวณบ่อพักน้ำ อาคาร A และอาคาร B พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)

และบริเวณบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ มีค่าอยู่ระหว่าง 7.4-7.5 จากผลวิเคราะห์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)

- **ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)**

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) จำนวน 5 จุด ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) มีค่าอยู่ระหว่าง 35.0-40.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) มีค่าอยู่ระหว่าง 41.0-205 มิลลิกรัมต่อลิตร

บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร A) มีค่าอยู่ระหว่าง 26.5-30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร B) มีค่าอยู่ระหว่าง 20.0-16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลวิเคราะห์บริเวณบ่อพักน้ำ อาคาร A และอาคาร B พบว่า มีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

และบริเวณบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ มีค่าอยู่ระหว่าง 10.0-14.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลวิเคราะห์ พบว่า มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)

- **ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)**

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) จำนวน 5 จุด ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) มีค่าอยู่ระหว่าง 20.8-21.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) มีค่าอยู่ระหว่าง 41.3-1,560 มิลลิกรัมต่อลิตร

บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร A) มีค่าอยู่ระหว่าง 11.8-20.7 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร B) มีค่าอยู่ระหว่าง 17.0-19.4 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลวิเคราะห์บริเวณบ่อพักน้ำ อาคาร A และอาคาร B พบว่า มีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

และบริเวณบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ มีค่าอยู่ระหว่าง 15.0-17.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลวิเคราะห์ พบว่า มีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)

- **ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)**

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) จำนวน 5 จุด ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) มีค่าน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 5-5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร

บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร A) มีค่าเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร B) มีค่าเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลวิเคราะห์บริเวณบ่อพักน้ำ อาคาร A และอาคาร B พบว่า มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

และบริเวณบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ มีค่าเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลวิเคราะห์ พบว่า มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)


แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) จำนวน 5 จุด ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) มีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) มีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร

บ่อพักน้ำ (อาคาร A) มีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร บ่อพักน้ำ (อาคาร B) มีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร

และบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ มีค่าอยู่ระหว่าง 54,000->160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร

จากผลการวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม

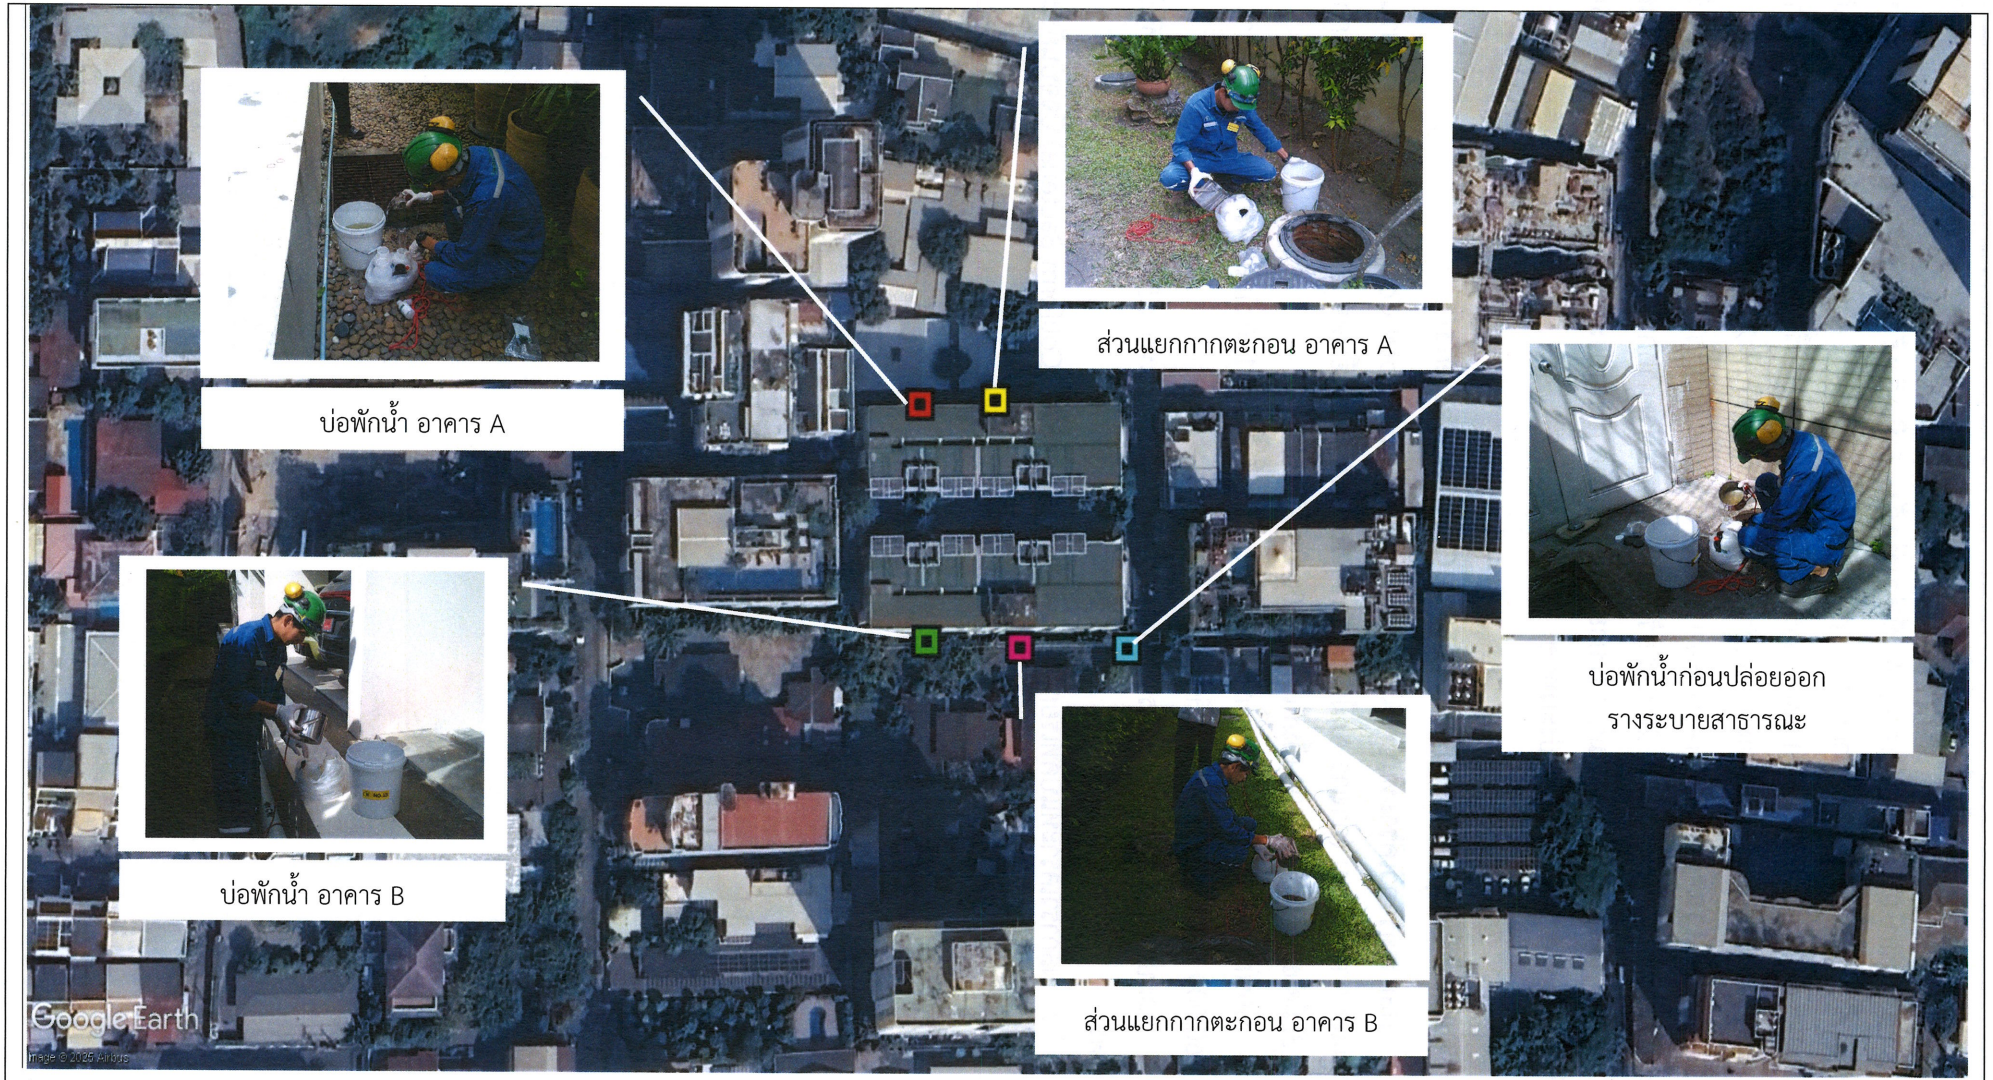

ที่มา : แผนที่ทางอากาศ Google Earth , 2568

รูปที่ 3.2.1-1 แสดงตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
พื้นที่ดำเนินการ : ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A และ B)
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 8 สิงหาคม 2568 และวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์			
		วันที่ 8 สิงหาคม 2568		วันที่ 9 ธันวาคม 2568	
		บริเวณส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A)	บริเวณส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B)	บริเวณส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A)	บริเวณส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B)
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.5	7.6	7.0	7.0
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	40.0	41.0	35.0	205
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/l	20.8	41.3	21.3	1,560
4. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5	<5	<5	5.4
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)[1/]	MPN/100 ml	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000
ลักษณะตัวอย่าง		**เหลืองขุ่น มีตะกอนมีกลิ่น**	**เหลืองขุ่น มีตะกอนมีกลิ่น**	**เหลืองขุ่น มีตะกอนกลิ่น**	**น้ำตาลขุ่น มีตะกอนมีกลิ่น**

หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต

ตารางที่ 3.2.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
พื้นที่ดำเนินการ : บ่อพักน้ำ (อาคาร A และ B)
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 8 สิงหาคม 2568 และวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์				มาตรฐาน[2/]
		วันที่ 8 สิงหาคม 2568		วันที่ 9 ธันวาคม 2568		
		บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร A)	บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร B)	บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร A)	บริเวณบ่อพักน้ำ (อาคาร B)	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.6	7.3	7.4	7.5	**5.5-9.0**
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	26.5	20.0	30.0	16.0	**≤40**
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/l	11.8	19.4	20.7	17.0	**≤50**
4. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5	<5	<5	<5	**≤20**
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)[1/]	MPN/100 ml	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000	-
ลักษณะตัวอย่าง		**เหลืองขุ่น มีตะกอน**	**เหลืองขุ่น มีตะกอน**	**เหลืองขุ่น มีตะกอน**	**เหลืองขุ่น มีตะกอน**	-

หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
: [2/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต

ตารางที่ 3.2.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
พื้นที่ดำเนินการ : บ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 8 สิงหาคม 2568 และวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์		มาตรฐาน[2/]
		วันที่ 8 สิงหาคม 2568	วันที่ 9 ธันวาคม 2568	
		บ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ	บ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.4	7.5	5.5-9.0
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	10.0	14.0	≤30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/l	17.0	15.0	≤40
4. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5	<5	≤20
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)[1/]	MPN/100 ml	54,000	>160,000	-
ลักษณะตัวอย่าง		**เหลืองขุ่น มีตะกอน**	**เหลืองขุ่น มีตะกอน**	

หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
: [2/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต

3) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 5 จุด ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) บ่อพักน้ำ (อาคาร A) ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B) บ่อพักน้ำ (อาคาร B) และบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2566 - 2568 แสดงดัง**ตารางที่ 3.2.1-3** และ**รูปที่ 3.2.1-2**

ตารางที่ 3.2.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2566 - 2568

พื้นที่ดำเนินการ	วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์					สภาพตัวอย่าง
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TCB[1/2/] (MPN/100 ml)	
1. ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A)	28 เม.ย. 66	7.2	48.7	458	20.0	1,600	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 ส.ค. 66	7.2	51.0	113	<5	1,600	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	12 ธ.ค. 66	6.9	163	360	<5	9,200	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 เม.ย. 67	7.2	58.0	70.8	<5	16,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	1 ส.ค. 67	7.3	40.0	36.8	<5	16,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	4 ธ.ค. 67	7.4	78.0	59.3	<5	920	เขียวขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	10 เม.ย. 68	7.7	46.0	45.0	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	8 ส.ค. 68	7.5	40.0	20.8	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	9 ธ.ค. 68	7.0	35.0	21.3	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	ค่าต่ำสุด – ค่าสูงสุด	6.9-7.7	35.0-163	20.8-458	<5-20.0	920->160,000	-

หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
[2/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต

ตารางที่ 3.2.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2566 - 2568

พื้นที่ดำเนินการ	วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์					สภาพตัวอย่าง
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TCB [1/2/] (MPN/100 ml)	
2. ส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร B)	28 เม.ย. 66	7.2	48.2	376	18.6	1,600	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 ส.ค. 66	7.2	71.5	120	<5	1,600	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	12 ธ.ค. 66	6.9	54.0	98.0	<5	16,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 เม.ย. 67	6.9	46.0	95.9	<5	3,500	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	1 ส.ค. 67	7.2	3,500	1,530	23.0	16,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	4 ธ.ค. 67	7.3	110	319	<5	1,600	น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	10 เม.ย. 68	7.8	32.0	105	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	8 ส.ค. 68	7.6	41.0	41.3	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	9 ธ.ค. 68	7.0	205	1,560	5.4	>160,000	น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	ค่าต่ำสุด – ค่าสูงสุด	6.9-7.8	32.0-3,500	41.3-1,560	<5-23.0	1,600->160,000	-

หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
[2/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต

ตารางที่ 3.2.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2566 - 2568

พื้นที่ดำเนินการ	วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์					สภาพตัวอย่าง
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TCB [1/2/] (MPN/100 ml)	
3. บ่อพักน้ำ (อาคาร A)	28 เม.ย. 66	7.4	28.5	24.5	<5	220	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 ส.ค. 66	7.3	34.0	29.5	<5	540	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	12 ธ.ค. 66	7.0	32.0	22.0	<5	1,600	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 เม.ย. 67	7.1	14.0	15.5	<5	1,600	เหลืองใส มีตะกอน
	1 ส.ค. 67	7.1	23.0	34.0	<5	54,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	4 ธ.ค. 67	7.6	46.0	51.0	<5	920	เขียวขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	10 เม.ย. 68	7.6	30.0	39.7	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	8 ส.ค. 68	7.6	26.5	11.8	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	9 ธ.ค. 68	7.4	30.0	20.7	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	ค่าต่ำสุด – ค่าสูงสุด	7.0-7.6	14.0-46.0	11.8-51.0	<5	220->160,000	-
ค่ามาตรฐาน [3/]		**5.0-9.0**	**≤40**	**≤50**	**≤20**	-	-
ค่ามาตรฐาน [4/]		**5.5-9.0**	**≤40**	**≤50**	**≤20**	-	-

หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
[2/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
[3/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
[4/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต

ตารางที่ 3.2.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2566 - 2568

พื้นที่ดำเนินการ	วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์					สภาพตัวอย่าง
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TCB [1/2/] (MPN/100 ml)	
4. บ่อพักน้ำ (อาคาร B)	28 เม.ย. 66	7.4	18.0	38.0	<5	350	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 ส.ค. 66	7.3	32.0	25.5	<5	920	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	12 ธ.ค. 66	7.2	36.5	36.5	<5	9,200	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	11 เม.ย. 67	7.1	27.0	29.7	<5	54,000	เหลืองใส มีตะกอน
	1 ส.ค. 67	7.4	25.0	26.8	<5	9,200	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	4 ธ.ค. 67	7.5	32.0	93.0	<5	920	น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	10 เม.ย. 68	7.9	23.0	61.0	<5	>160,000	เหลืองใส มีตะกอน
	8 ส.ค. 68	7.3	20.0	19.4	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	9 ธ.ค. 68	7.5	16.0	17.0	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	ค่าต่ำสุด – ค่าสูงสุด	7.1-7.9	16.0-36.5	17.0-93.0	<5	350->160,000	-
ค่ามาตรฐาน [3/]		**5.0-9.0**	**≤40**	**≤50**	**≤20**	-	-
ค่ามาตรฐาน [4/]		**5.5-9.0**	**≤40**	**≤50**	**≤20**	-	-

หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
[2/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
[3/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
[4/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต


ตารางที่ 3.2.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


โครงการ : บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2566 - 2568

พื้นที่ดำเนินการ	วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์					สภาพตัวอย่าง
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TCB [1/2/] (MPN/100 ml)	
5. บ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกรางระบายสาธารณะ	11 ส.ค. 66	7.3	28.2	23.0	<5	540	เหลืองใส มีตะกอน
	12 ธ.ค. 66	7.4	20.8	29.3	<5	16,000	เหลืองใส มีตะกอน
	11 เม.ย. 67	6.2	19.8	28.0	<5	9,200	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	1 ส.ค. 67	7.8	10.0	<10	<5	130	เหลืองใส มีตะกอน
	4 ธ.ค. 67	7.4	30.0	35.0	<5	920	เขียวขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
	10 เม.ย. 68	7.6	24.0	26.8	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	8 ส.ค. 68	7.4	10.0	17.0	<5	54,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	9 ธ.ค. 68	7.5	14.0	15.0	<5	>160,000	เหลืองขุ่น มีตะกอน
	ค่าต่ำสุด – ค่าสูงสุด	6.2-7.8	10.0-30.0	<10-35.0	<5	130->160,000	-
ค่ามาตรฐาน [3/]		**5.0-9.0**	**≤40**	**≤50**	**≤20**	-	-
ค่ามาตรฐาน [4/]		**5.5-9.0**	**≤30**	**≤40**	**≤20**	-	-


หมายเหตุ : [1/] วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
[2/] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
[3/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
[4/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567)


บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต

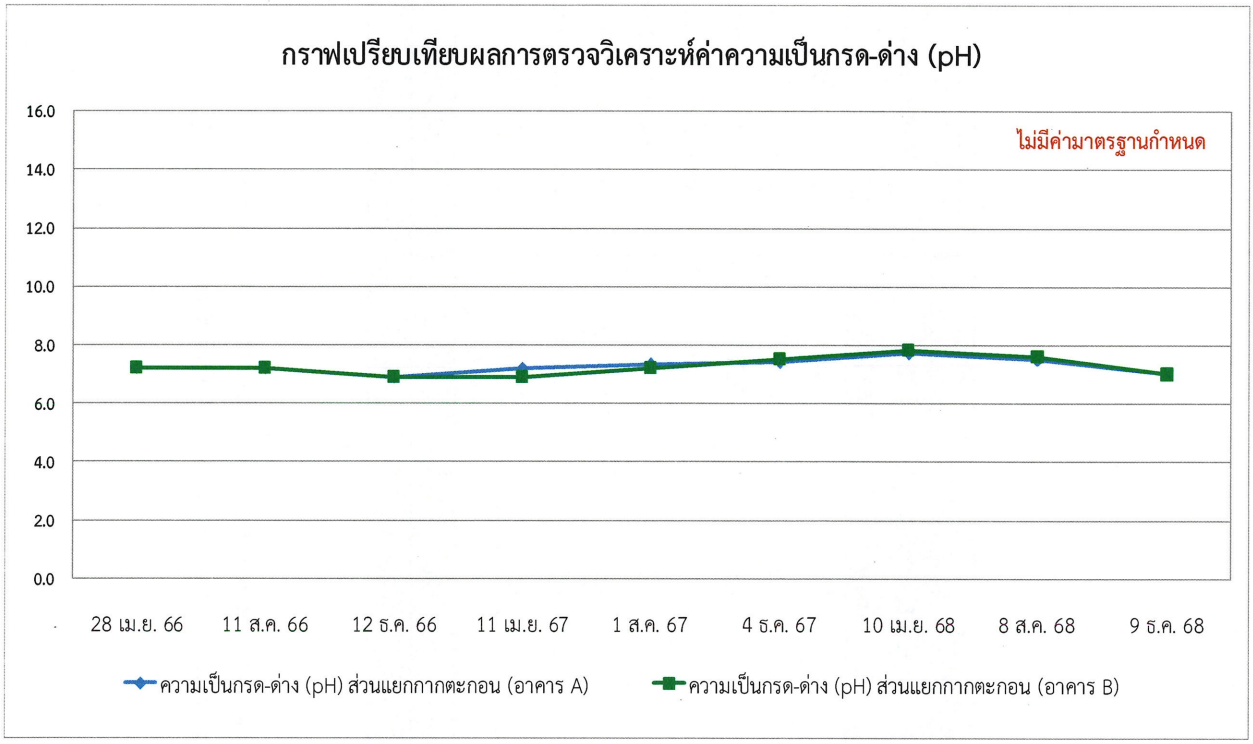

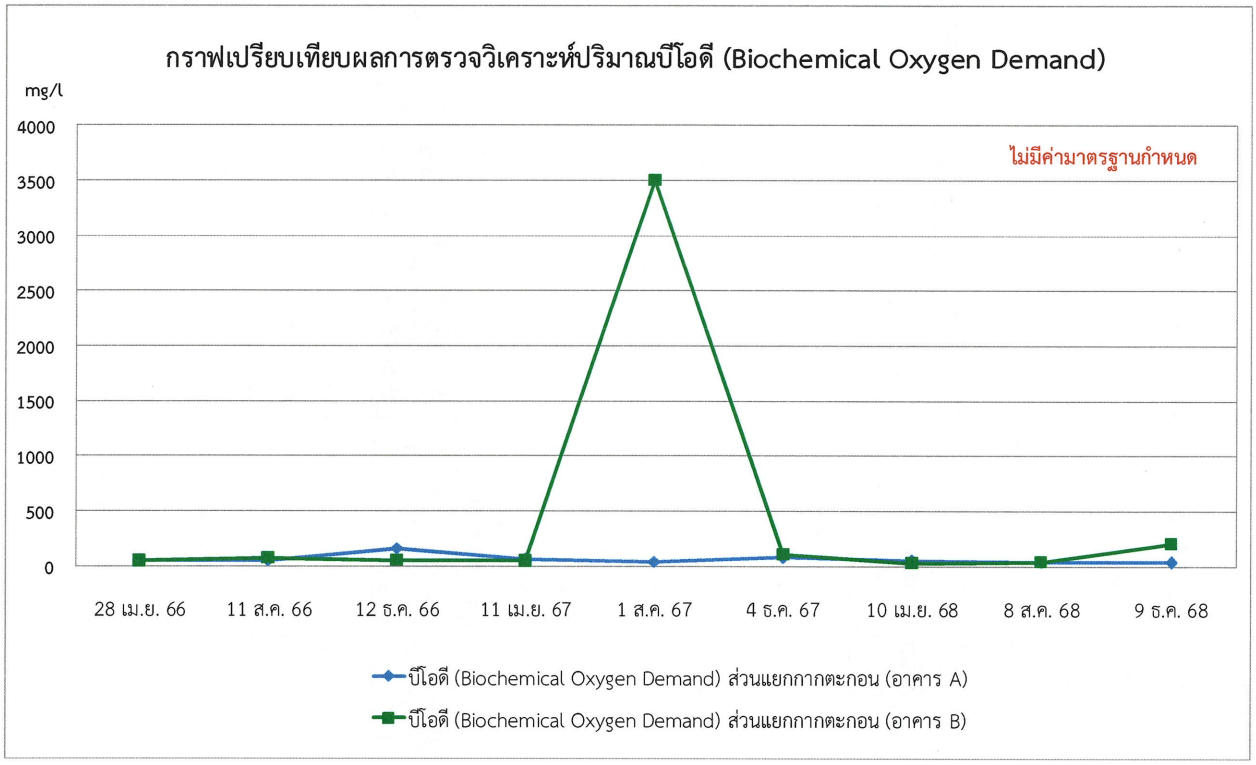



รูปที่ 3.2.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

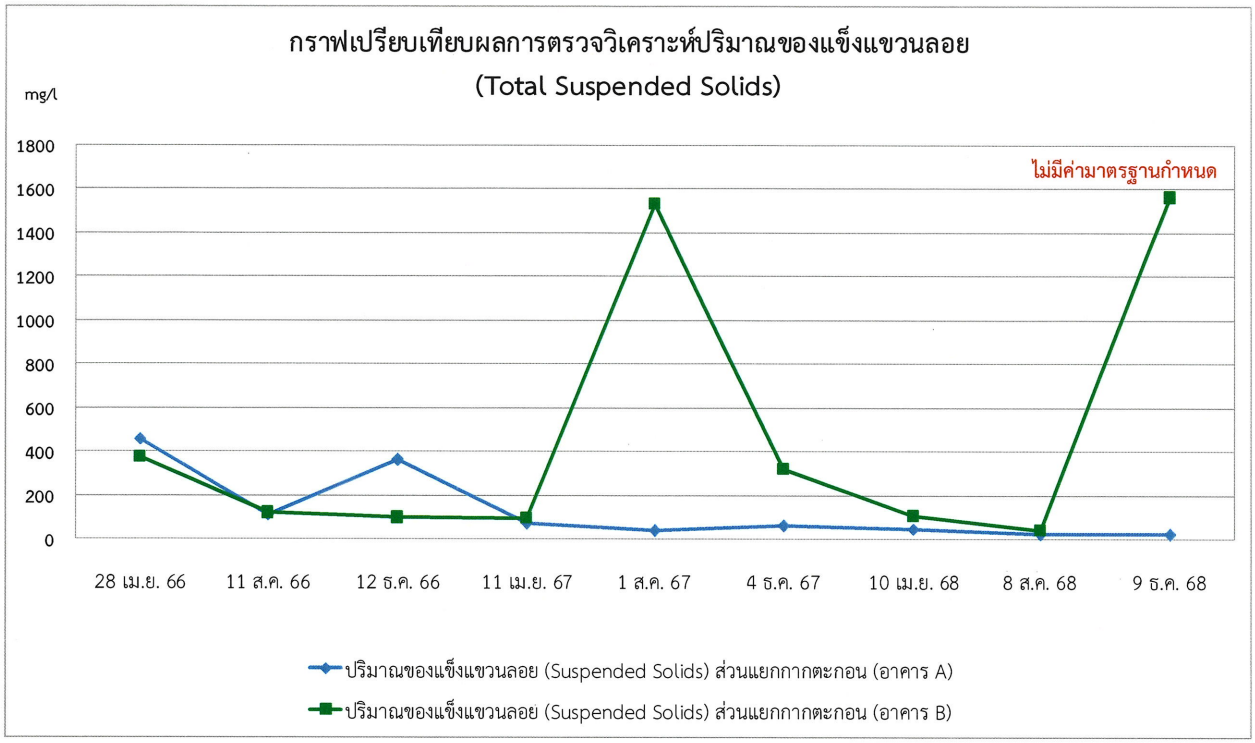

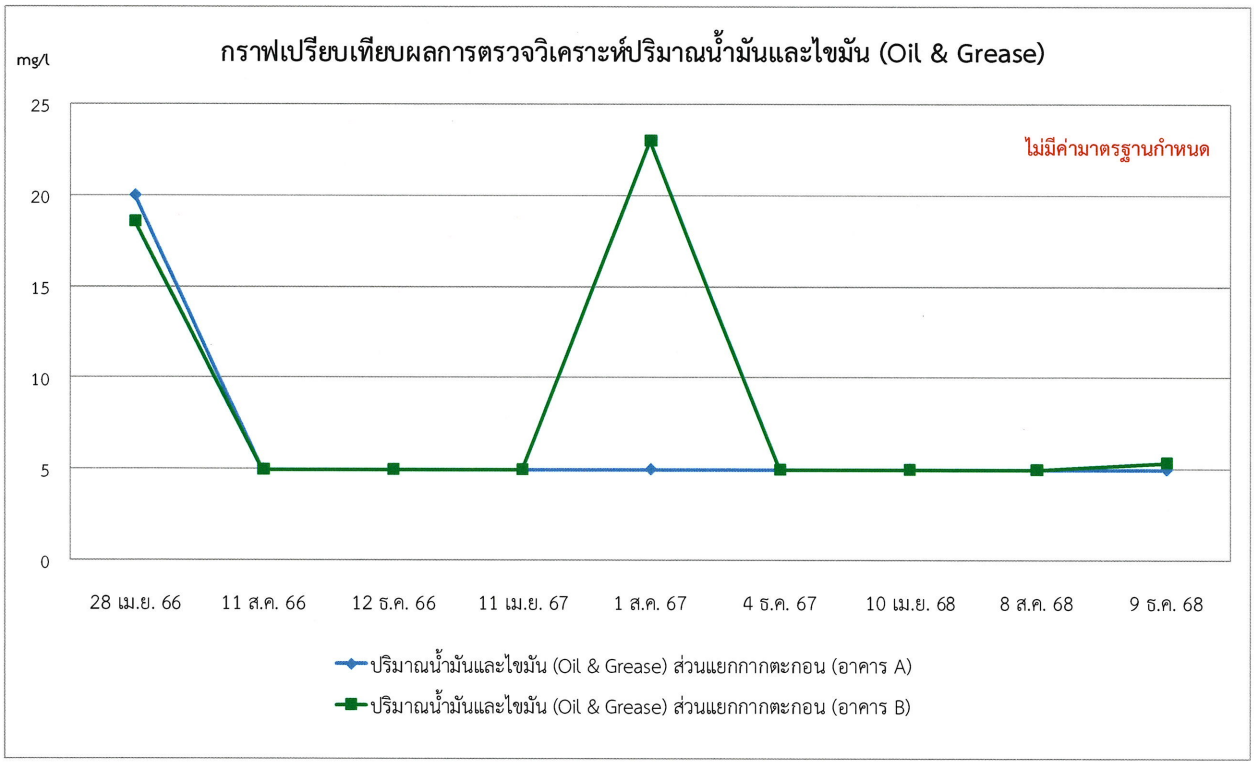



รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

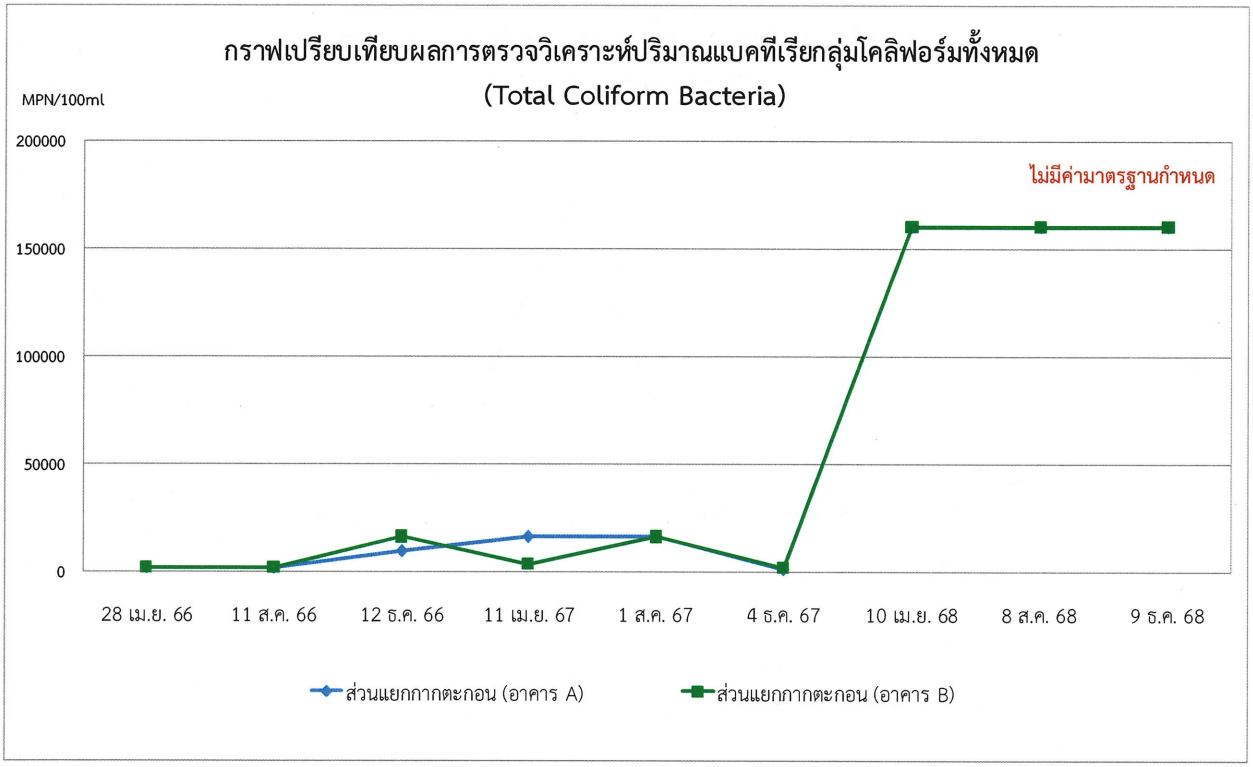

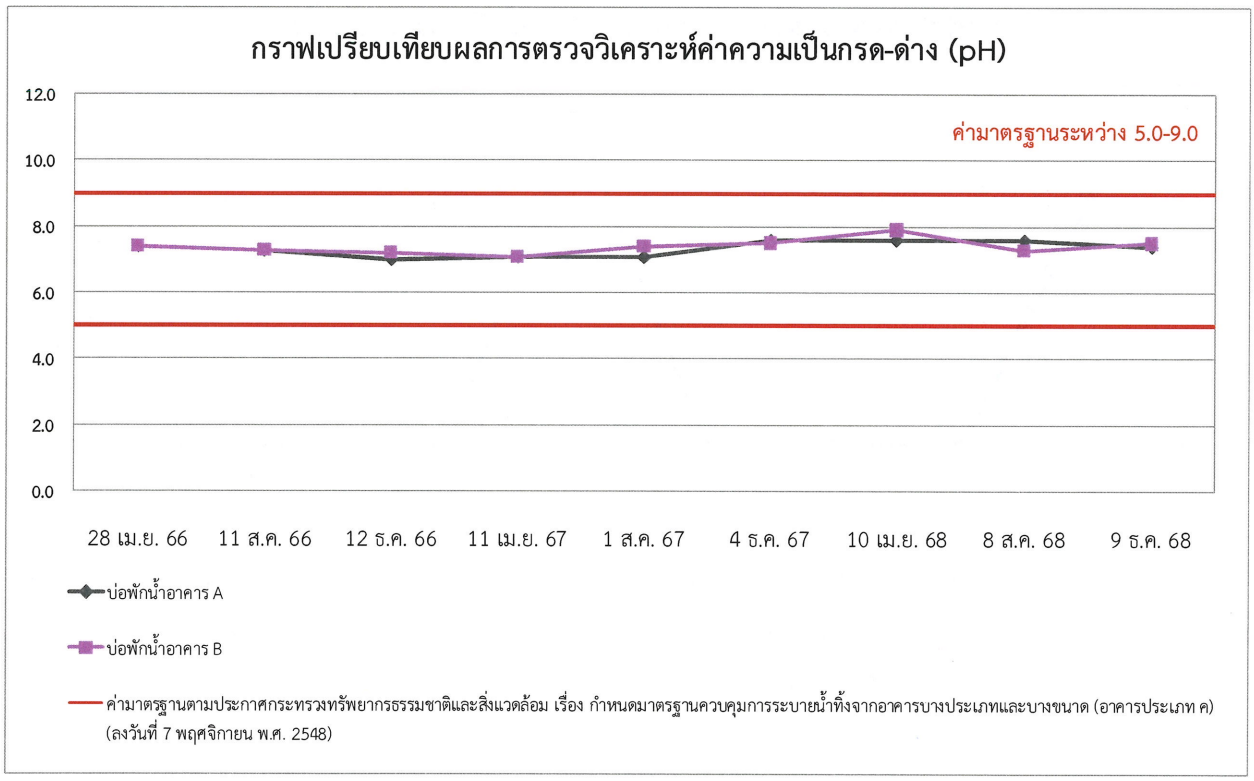



รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

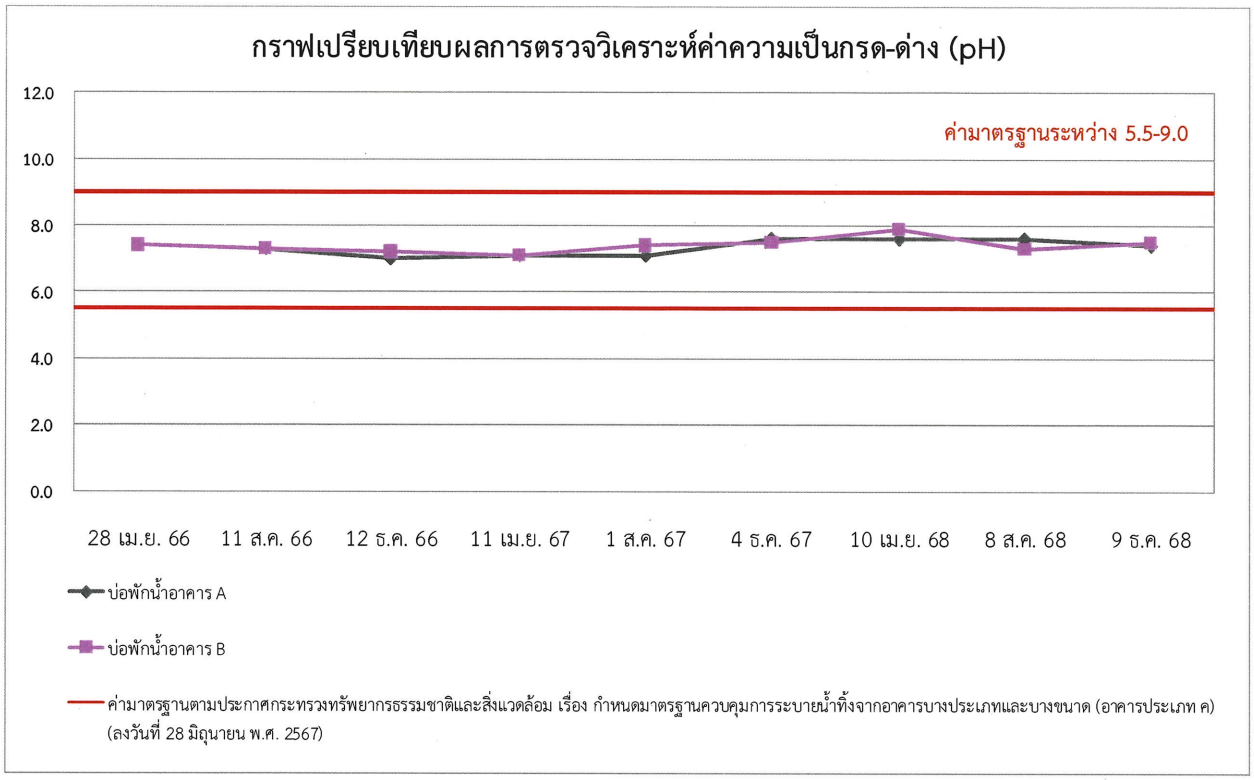

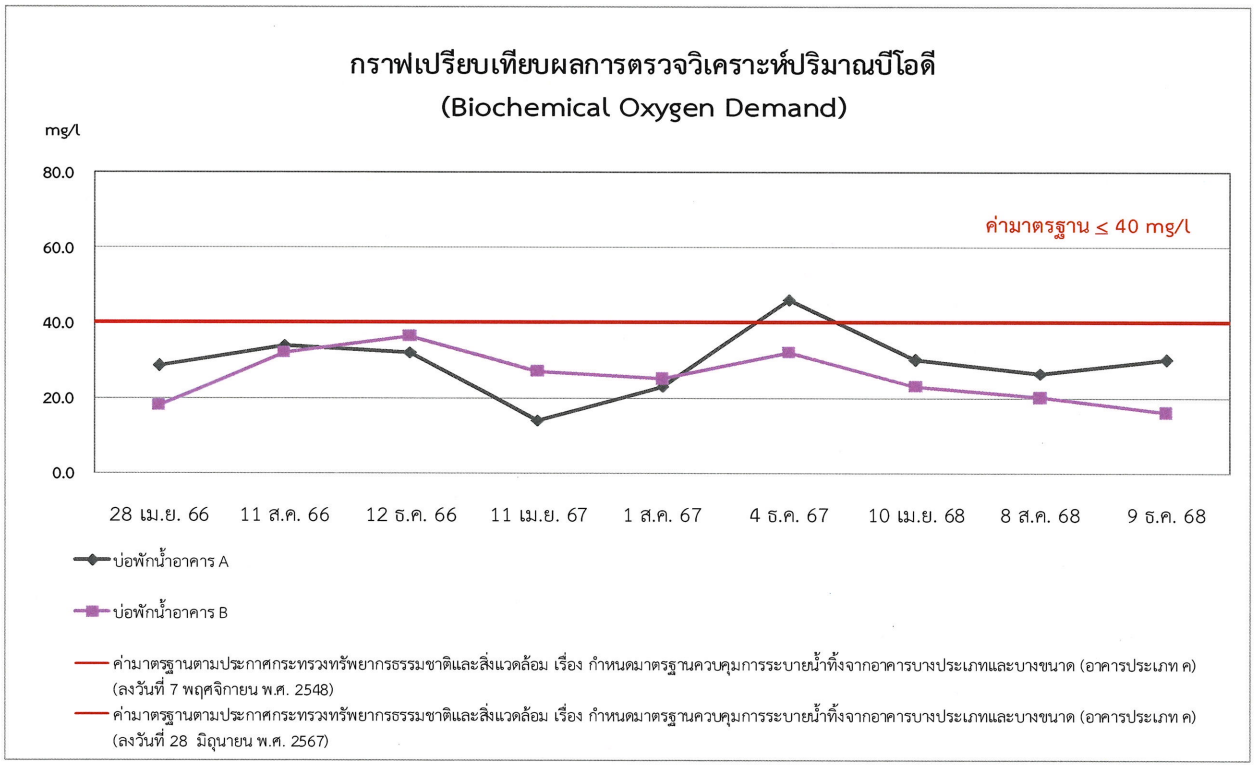



รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

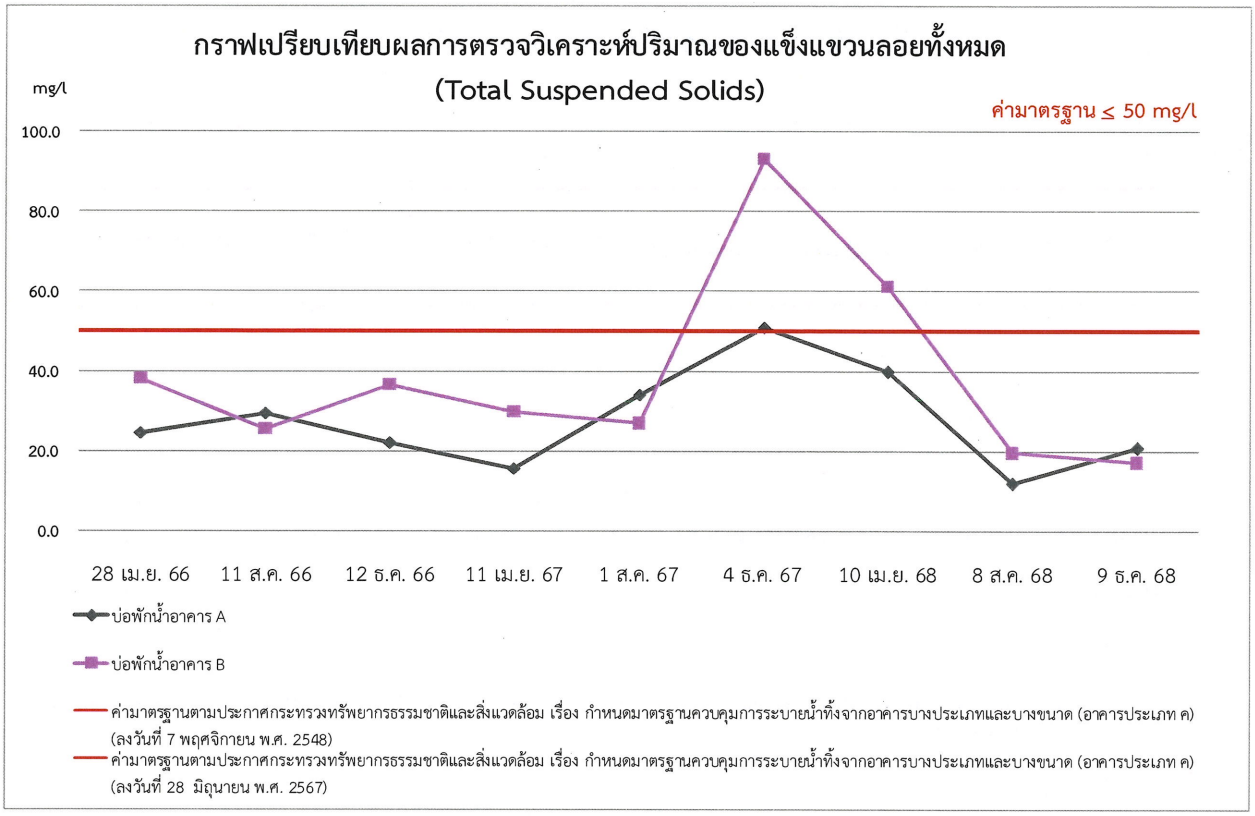

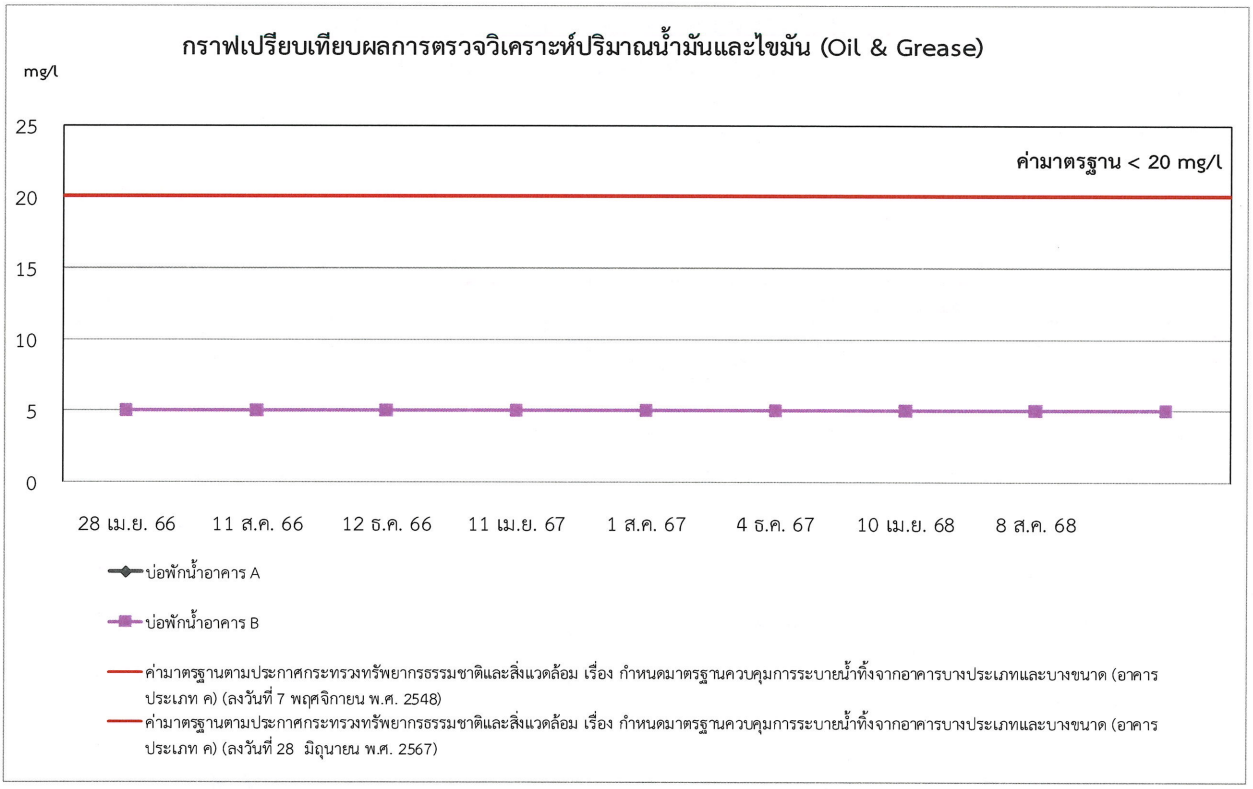



รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

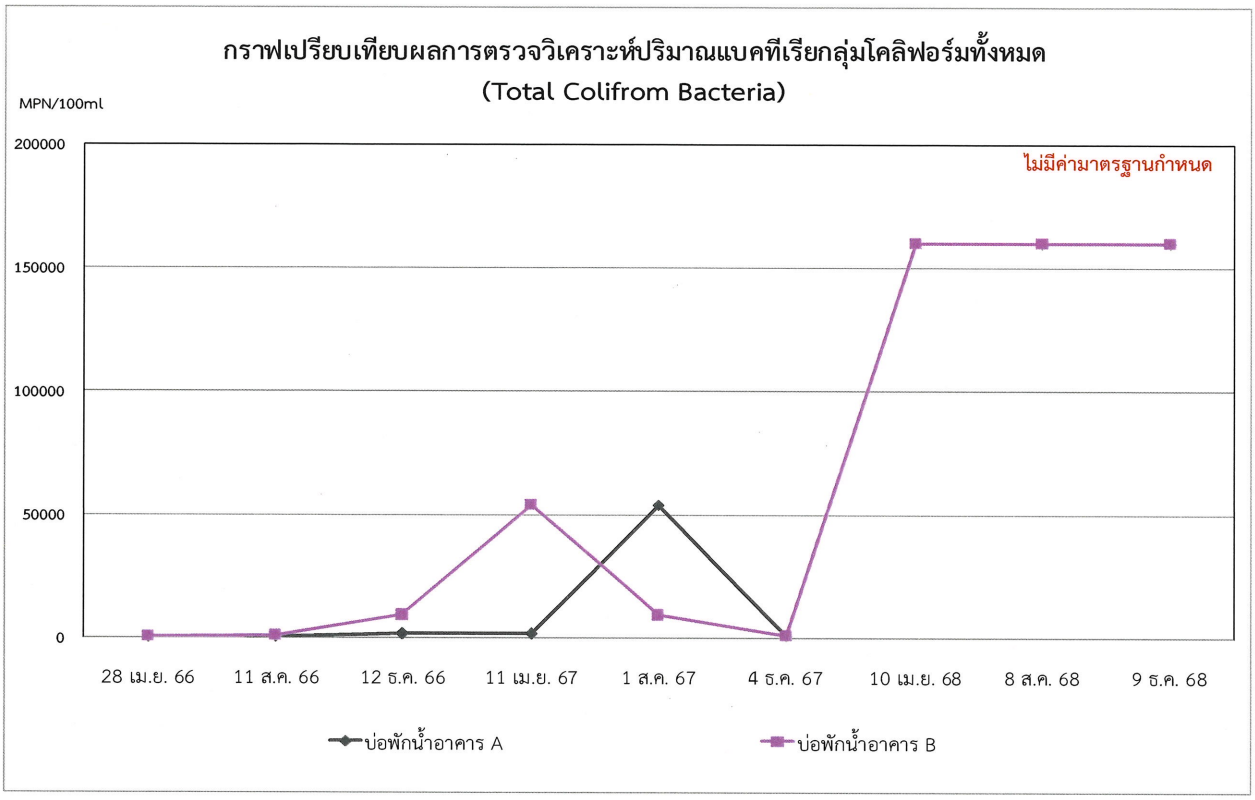

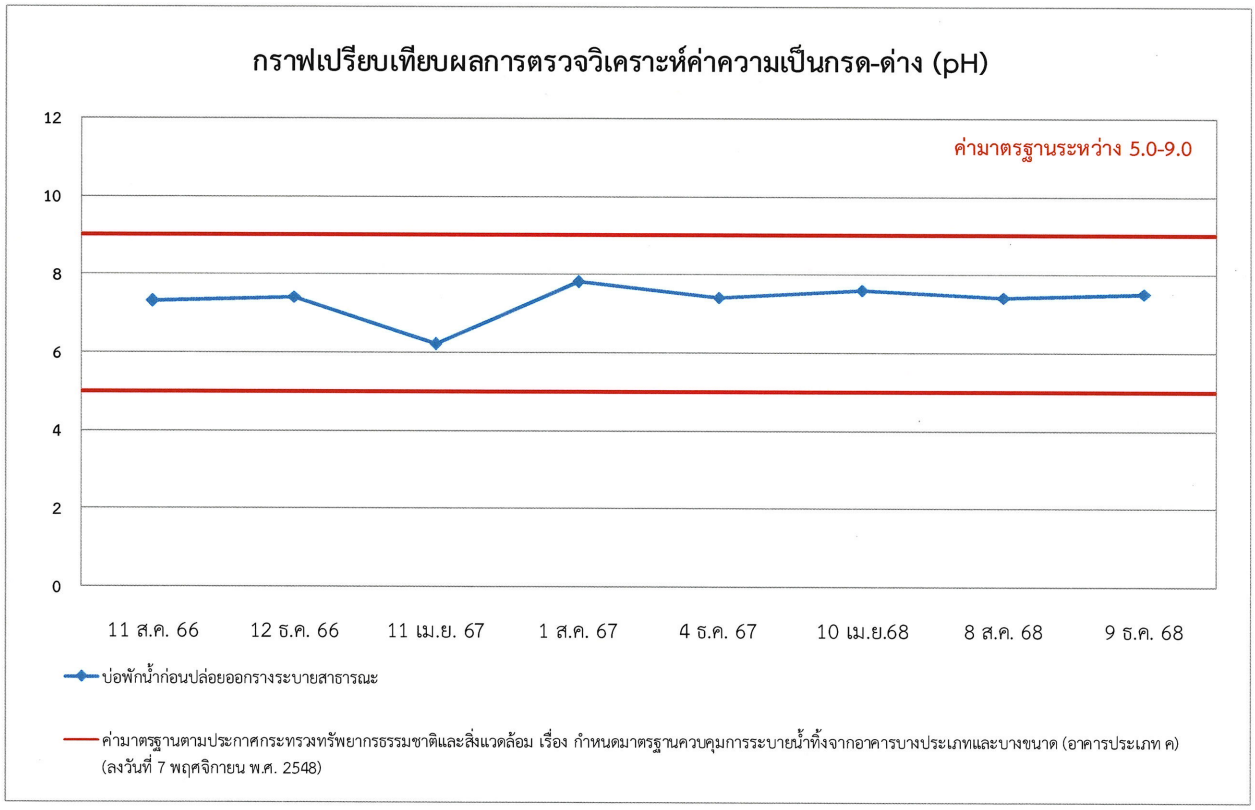



รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

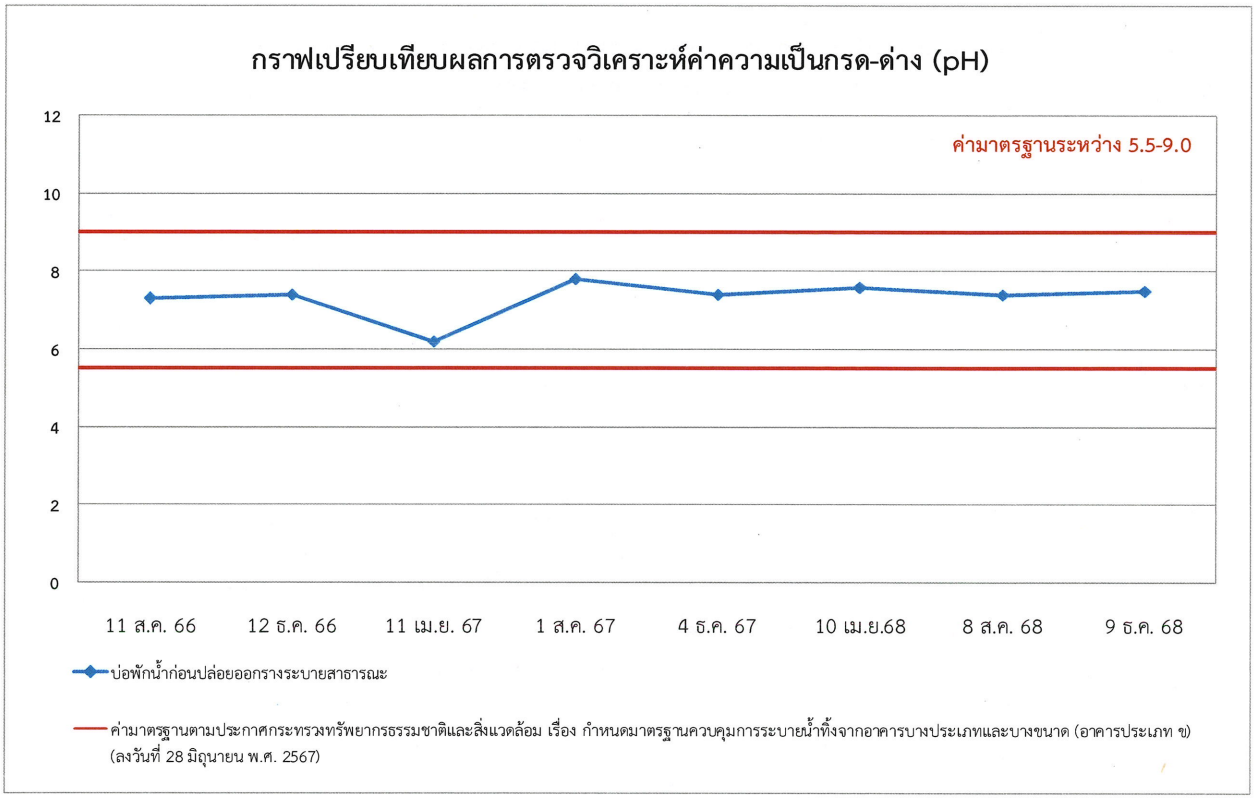

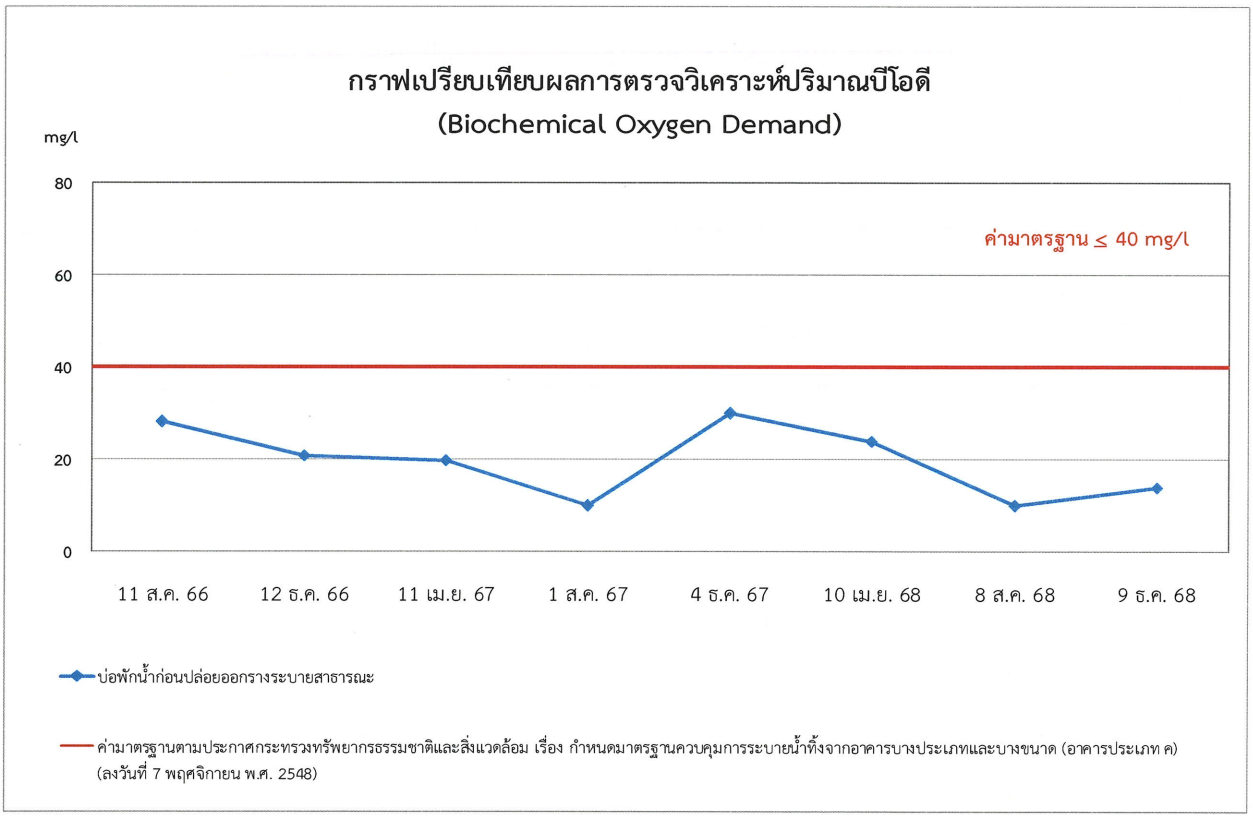



รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
(ระหว่างปี 2566 - 2568)

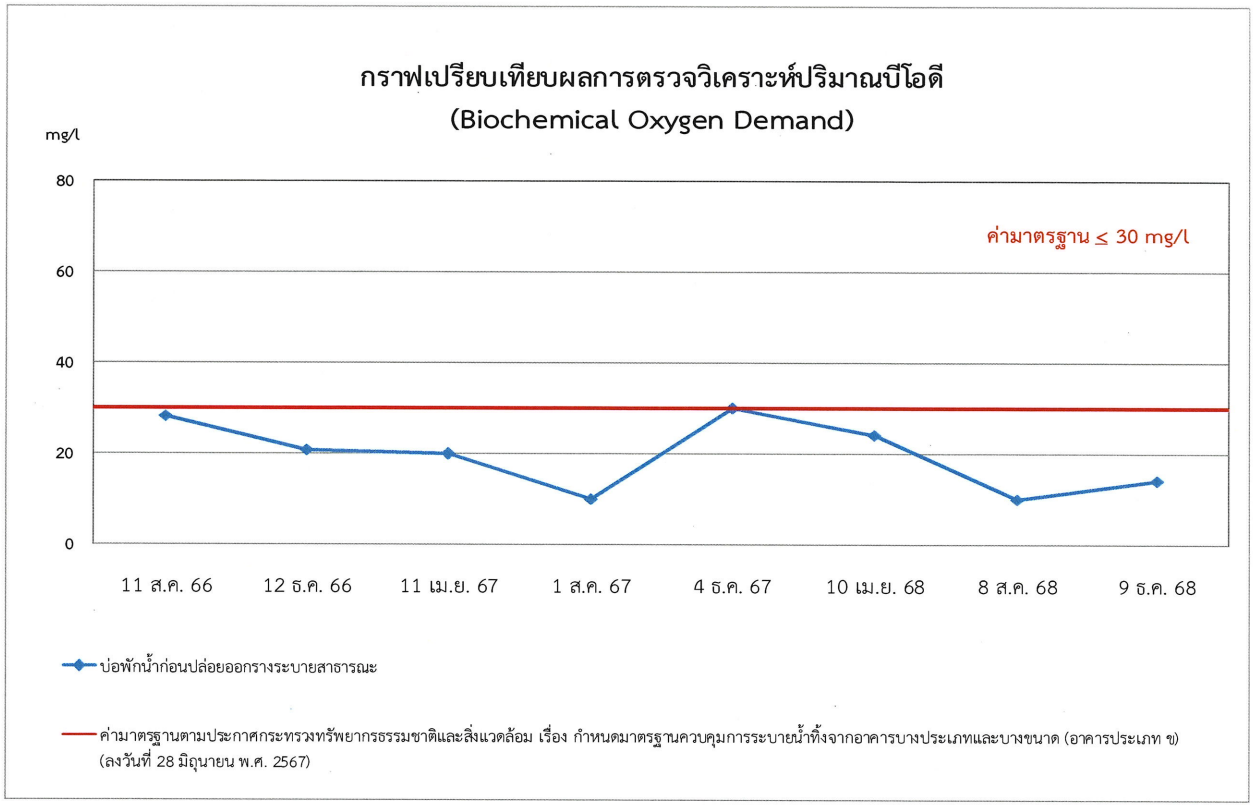

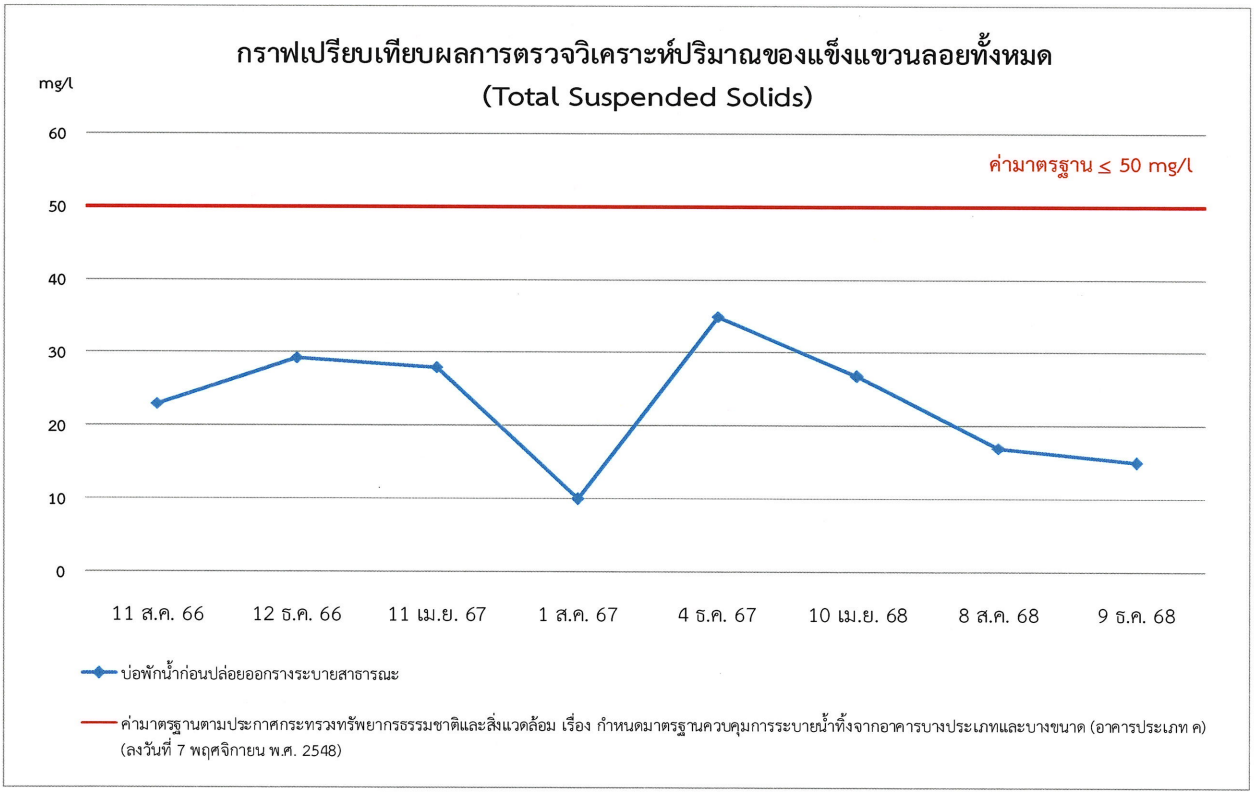


รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

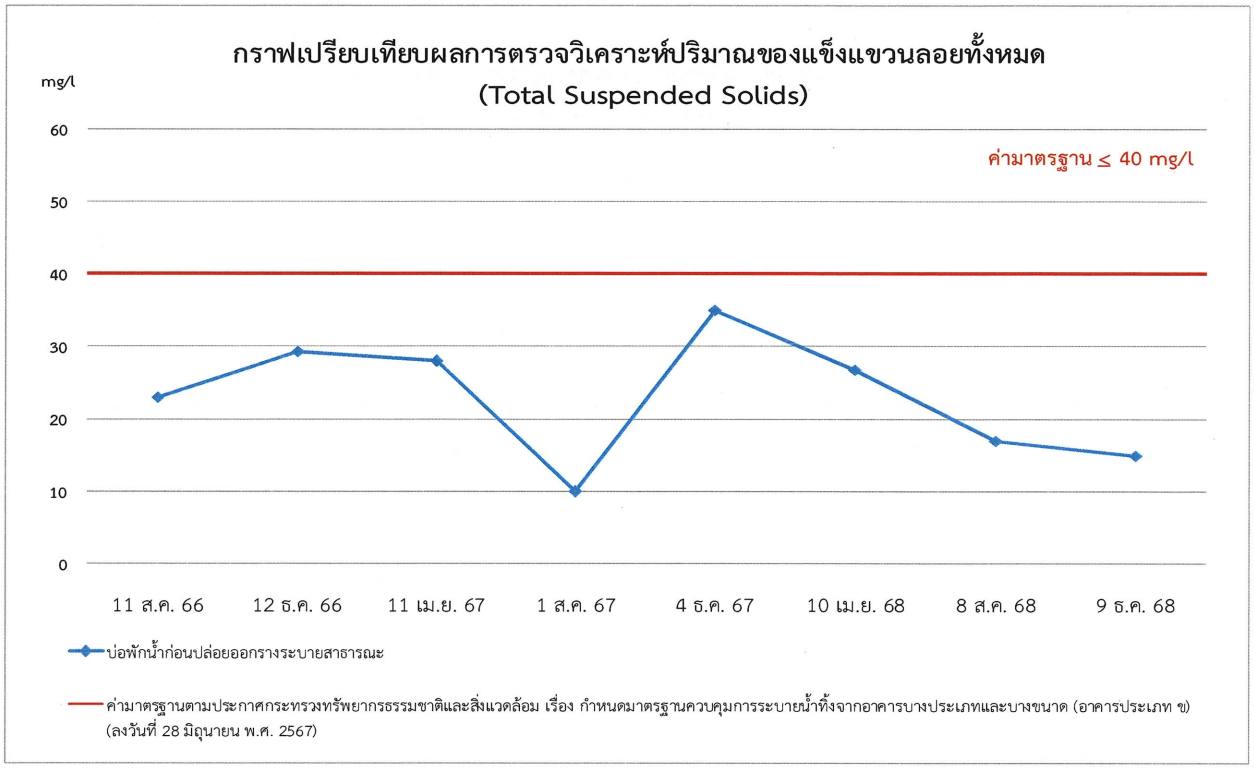

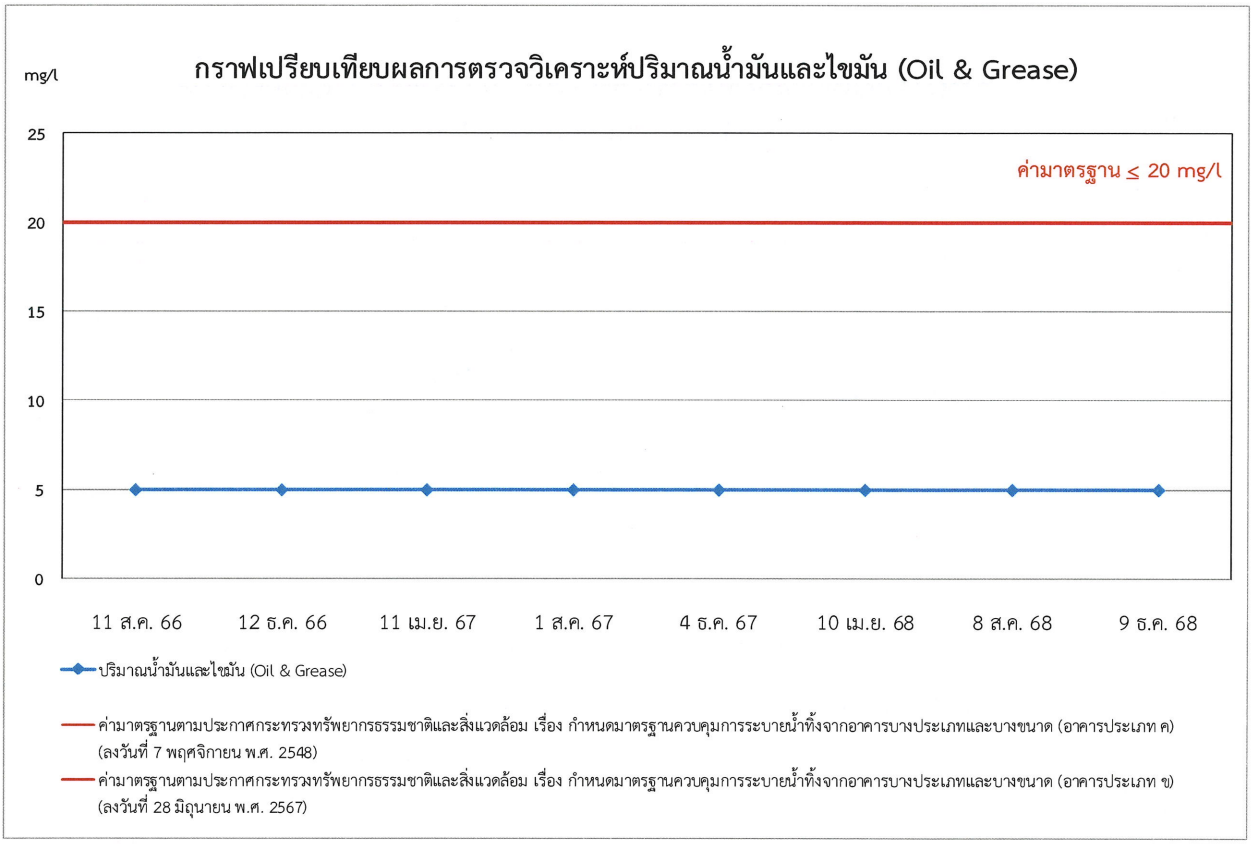

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)

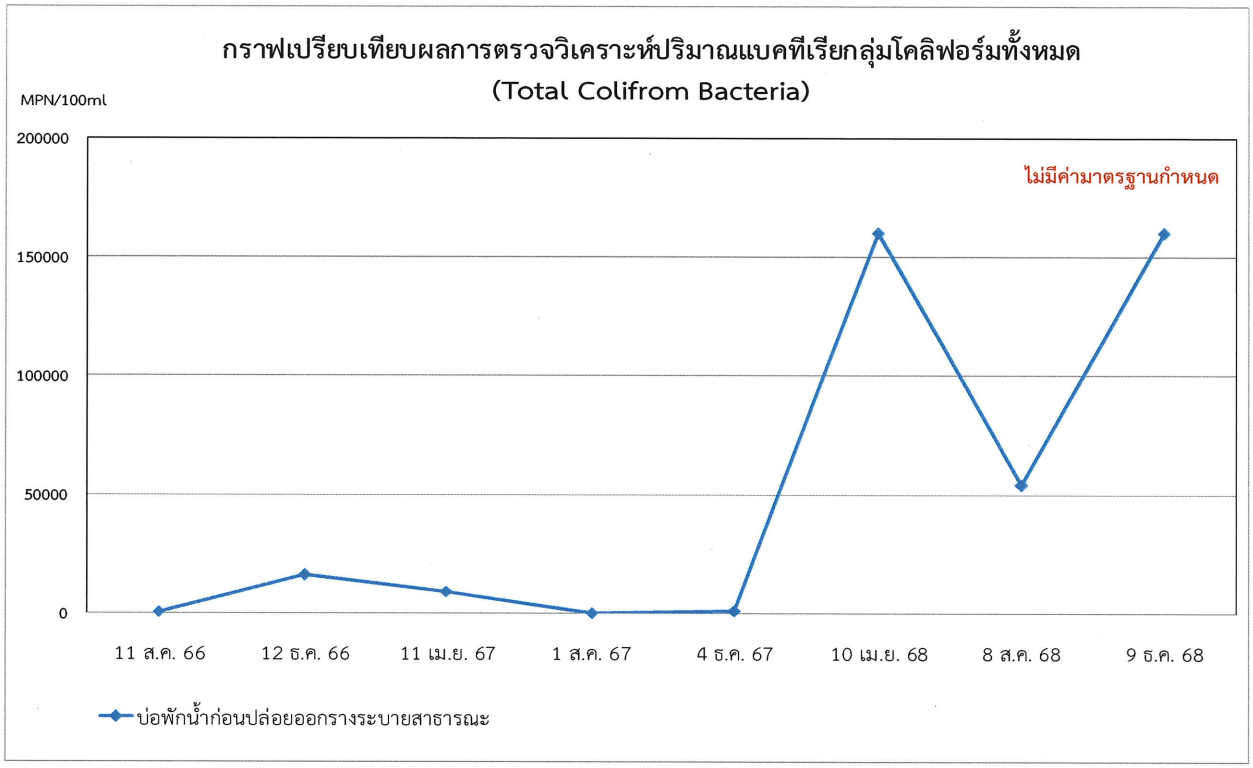

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ระหว่างปี 2566 - 2568)
