ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

หนังสือเห็นชอบ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009/ 9970

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพ ฯ 10400

8 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/9247 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 38 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 3-3-53 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 7124 7125 7316 ฯลฯ รวม 13 โฉนด) จำนวนห้องพัก 460 ห้อง ซึ่งตามที่ระบุในรายงานฯ ดำเนินกิจการโครงการประเภทอาคารชุด จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 45/2550 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เสนอรายงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

2/สำนักงาน....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 45/2550 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[redacted]

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

เงื่อนไขที่โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 38 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 3-3-53 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 7124 7125 7316 ฯลฯ รวม 13 โฉนด) จำนวนห้องพัก 460 ห้อง ซึ่งตามที่ระบุในรายงานฯ ดำเนินกิจการโครงการประเภทอาคารชุด โดยบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาคผนวก 2

- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10)
- รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)
- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
- เอกสารอนุญาตก่อสร้าง

ภาคผนวก 3

ใบรับรองการตรวจสอบอาคารแบบ ร.1

Online

อ้างอิง
๐๐๐๐๐๐๐๑๗๗/๒๕๖๘
เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

เขียนที่ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา
วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท โดย นางสาวเบญจพร โอตตัปปะวงศ์

☑ เจ้าของอาคาร ☐ตัวแทนเจ้าของอาคาร ☐ผู้ครอบครองอาคาร ☐ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร

☑ เป็นนิติบุคคลประเภท อาคารชุด จดทะเบียนเมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๒ เลขทะเบียน ๒๘/๒๕๕๒ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ ชั้น ๑ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวเบญจพร โอตตัปปะวงศ์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒๘ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง บางยอ อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โทร -

ขอยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารตามแบบ ใบอนุญาต เลขที่ ๒๘๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๐๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่บ้านเลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ชนิด อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นบนดิน ๓๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์ อยู่อาศัย อาคารชุด

โดย ☑เป็นการตรวจสอบประจำปี ☐ เป็นการตรวจสอบใหญ่ ☐ เป็นการตรวจป้าย

ข้อ ๓ โดยมี บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ นิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ ๐๔๒๓/๕๐ สำนักงานชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ นิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๔ ตรอก/ซอย เกษมสันต์ ๑ ถนน พระราม ๑ ตำบล/แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนเลขที่ น.๐๐๔๑/๒๕๕๐ ออกให้ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๔ หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ ออกไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

(๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด

(๔) สำเนาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด

(๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และบันทึกในระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด

เลขที่ ๑๗๒๙/๒๕๖๗

แบบ ร.๑

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๑๙๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ฉ๕๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท โดย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด เลขทะเบียน น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. .....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๑ [redacted] พ.ศ. ๒๕๖๙

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 99790F14F04A

ภาคผนวก 4

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	๒๗/๑/๖๔
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/7/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/7/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/18
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/9/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค	ช่างหัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	7/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	7/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/24
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	7/8/16
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	9/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/8/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

27/4/69

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	.....
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/5/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	11/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/8/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง ✓	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31							บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	24/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	9/10/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/16
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	√		√		√		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	√		√		√		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	√		√		√		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	√		√		√		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	√		√		√		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	√		√		√		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	√		√		√		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	√		√		√		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	√		√		√		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	√		√		√		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	√		√		√		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	√		√		√		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท อาคาร SRAS	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/11/68 รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/7/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	√		√		√		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	ลิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/65
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/11/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	21/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/7/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

ลง[redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/7/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	9/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

ลง

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	7/8/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/8/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/9/69
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 07/4/66

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	24/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/9/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/9/69
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
			✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

ล

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/10/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/10/18
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/10/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/10/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/10/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/11/68
อาคาร	SRAS.....		รหัสอุปกรณ์	FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	/		/		/		/		/		/				/	
FHCL7- 2	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 3	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 4	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 5	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 19	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 30	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....
อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 27/09/64
รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 27/09/68

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 07/11/68

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		/		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		/		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/11/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	/		/		/				-		/				/	
FHC- P2	/		/		/				-		/				/	
FHC- P2A	/		/		/				-		/				/	
FHC- P3	/		/		/				-		/				/	
FHC- P3A	/		/		/				-		/				/	
FHC- P4	/		/		/				-		/				/	
FHC- P4A	/		/		/				-		/				/	
FHC- P5	/		/					/	-		/					
FHC- P5A	/		/		-			/	-		/					

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/64
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/64
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/7/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/7/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/4/64
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/4/68
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 7/12/14
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	๙/๑/๖๔
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	. สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	22/4/14
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร ..SRAS.....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 27/4/68

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค /	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/68
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร ..SRAS.....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 04/9/68

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/9/68
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/64
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/10/64
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร ..SRAS.....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 27/10/64

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ			

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/10/64
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/11/66
อาคาร ..SRAS..		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/11/64
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/11/64
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/11/64
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/11/64
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ


ภาคผนวก 5

- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**
ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

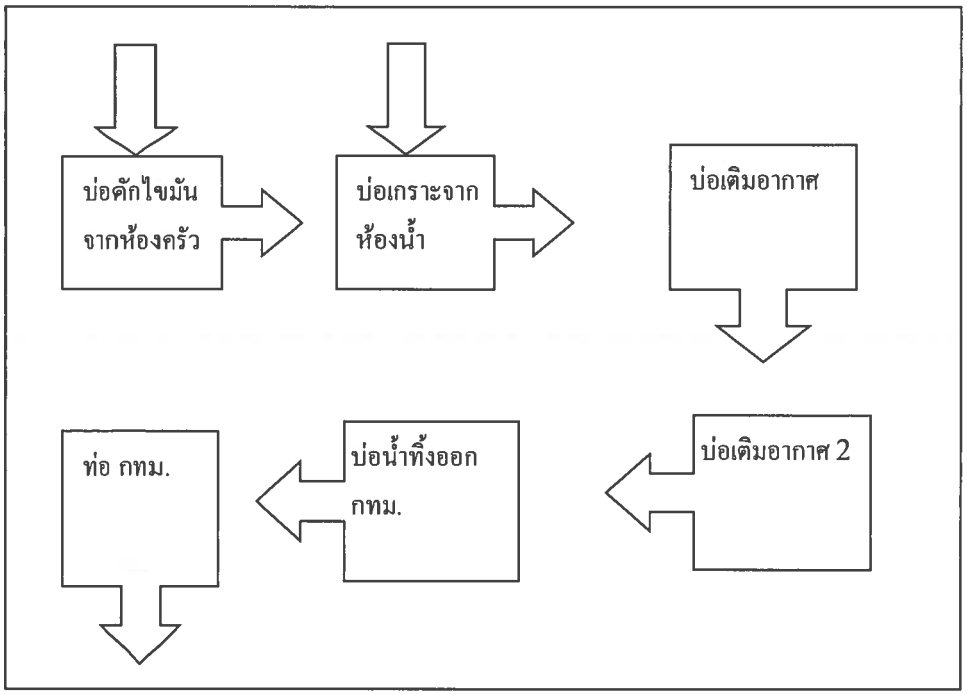

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/2568	376.30	126	123.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/7/2568	376.30	126	123.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/7/2568	375.92	122	119.56	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/7/2568	369.84	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/7/2568	373.77	99	97.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/7/2568	378.08	145	142.10	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/7/2568	377.61	140	137.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/7/2568	384.82	217	212.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/7/2568	373.96	101	98.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/7/2568	379.67	162	158.76	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/7/2568	376.67	130	127.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/7/2568	367.12	28	27.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/7/2568	367.31	30	29.40	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/7/2568	371.05	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/7/2568	370.68	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/7/2568	384.16	210	205.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/7/2568	377.14	135	132.30	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/7/2568	369.74	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/7/2568	373.30	94	92.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสี (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
20/7/2568	377.14	135	132.30	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
21/7/2568	371.52	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
22/7/2568	384.35	212	207.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
23/7/2568	367.68	34	33.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
24/7/2568	380.04	166	162.68	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
25/7/2568	371.80	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
26/7/2568	376.02	123	120.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
27/7/2568	371.99	80	78.40	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
28/7/2568	371.90	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
29/7/2568	375.36	116	113.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
30/7/2568	388.00	251	245.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
31/7/2568	367.78	35	34.30	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับร[redacted]ลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดก[redacted]สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.. [redacted] าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted]

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
11,627.03หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
รวมทั้งเดือน 3498หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
รวมทั้งเดือน 3428.04 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..
0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

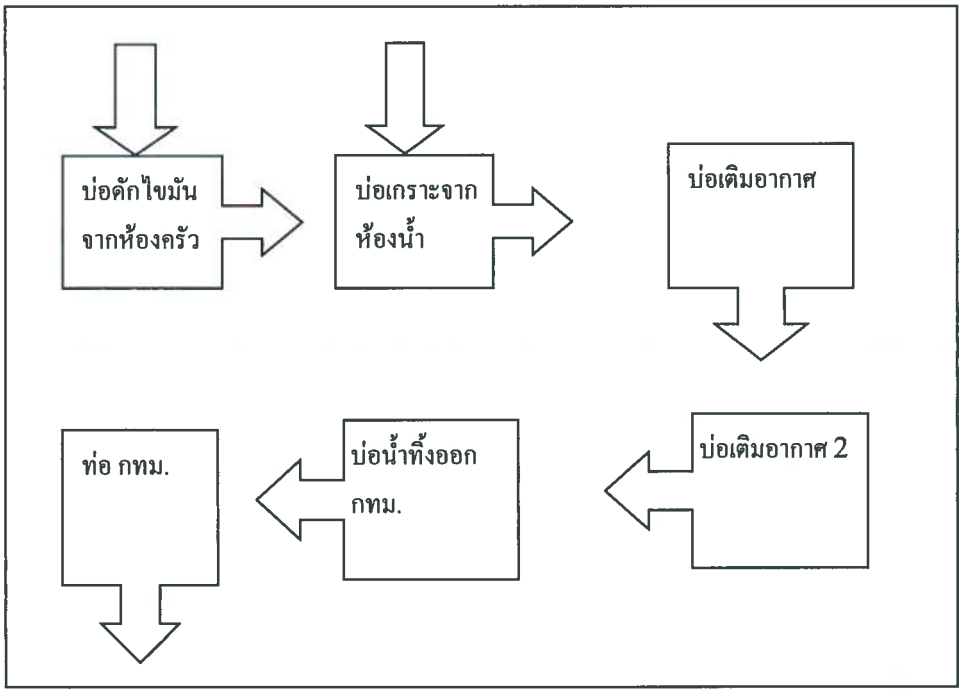

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/8/2568	369.09	49	48.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/8/2568	377.61	140	137.20	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/8/2568	377.89	143	140.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/8/2568	370.59	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/8/2568	376.77	131	128.38	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/8/2568	383.41	202	197.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/8/2568	379.48	160	156.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/8/2568	371.71	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/8/2568	374.80	110	107.80	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/8/2568	376.20	125	122.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/8/2568	371.15	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/8/2568	383.88	207	202.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/8/2568	378.08	145	142.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/8/2568	375.46	117	114.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/8/2568	376.30	126	123.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/8/2568	372.93	90	88.20	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/8/2568	367.96	37	36.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/8/2568	373.96	101	98.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/8/2568	377.14	135	132.30	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสี (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
20/8/2568	385.75	227	222.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/8/2568	377.70	141	138.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/8/2568	374.71	109	106.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/8/2568	373.96	101	98.98	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/8/2568	377.51	139	136.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/8/2568	379.57	161	157.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/8/2568	373.77	99	97.02	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/8/2568	379.67	162	158.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/8/2568	369.46	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/8/2568	373.21	93	91.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/8/2568	379.95	165	161.70	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/8/2568	374.71	109	106.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรอง[redacted]ลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิ[redacted]สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มีนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิ ท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11654.37 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3610 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3537.80 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**
ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

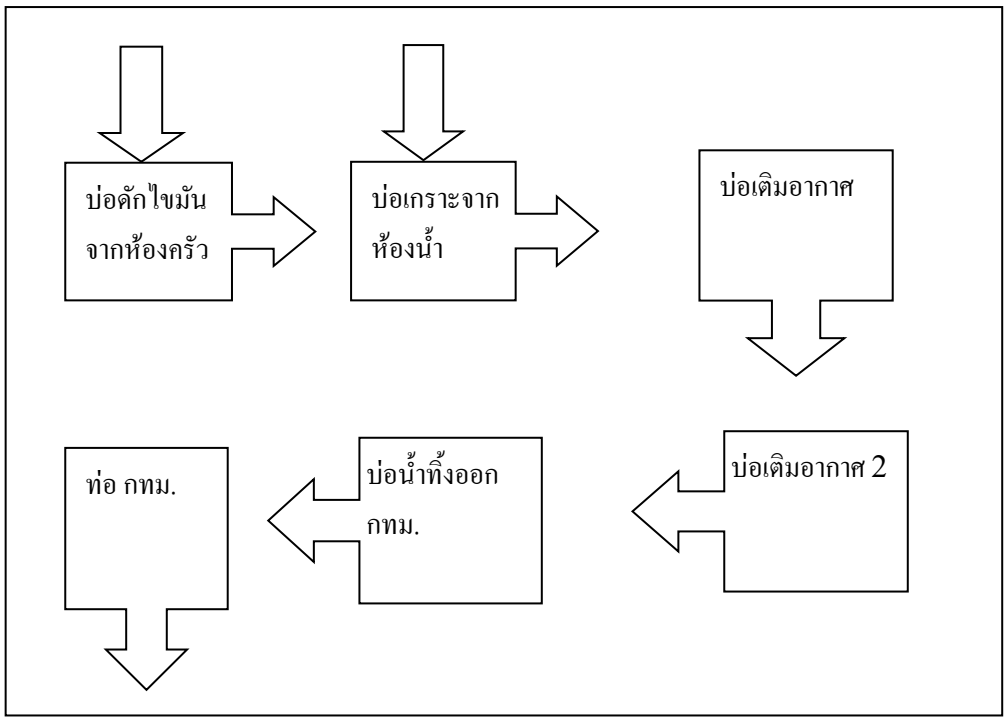

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2568	384.26	211	206.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/9/2568	373.40	95	93.10	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/9/2568	380.98	176	172.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/9/2568	372.65	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/9/2568	376.58	129	126.42	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/9/2568	371.90	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/9/2568	380.42	170	166.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/9/2568	368.25	40	39.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/9/2568	377.33	137	134.26	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/9/2568	387.25	243	238.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/9/2568	369.18	50	49	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/9/2568	370.96	69	67.62	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/9/2568	379.29	158	154.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/9/2568	371.24	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/9/2568	370.87	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/9/2568	373.86	100	98	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/9/2568	381.63	183	179.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/9/2568	376.95	133	130.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/9/2568	379.76	163	159.74	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
20/9/2568	372.74	88	86.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/9/2568	372.37	84	82.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/9/2568	379.76	163	159.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/9/2568	374.33	105	102.90	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/9/2568	373.86	100	98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/9/2568	386.78	238	233.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/9/2568	374.52	107	104.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/9/2568	371.24	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/9/2568	372.74	88	86.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/9/2568	379.48	160	156.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/9/2568	380.70	173	169.54	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



างข้างต้นถูกต้องทุกประการ

จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. ……

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย…**.....**

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11285.28 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3714 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3639.72 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและ

สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

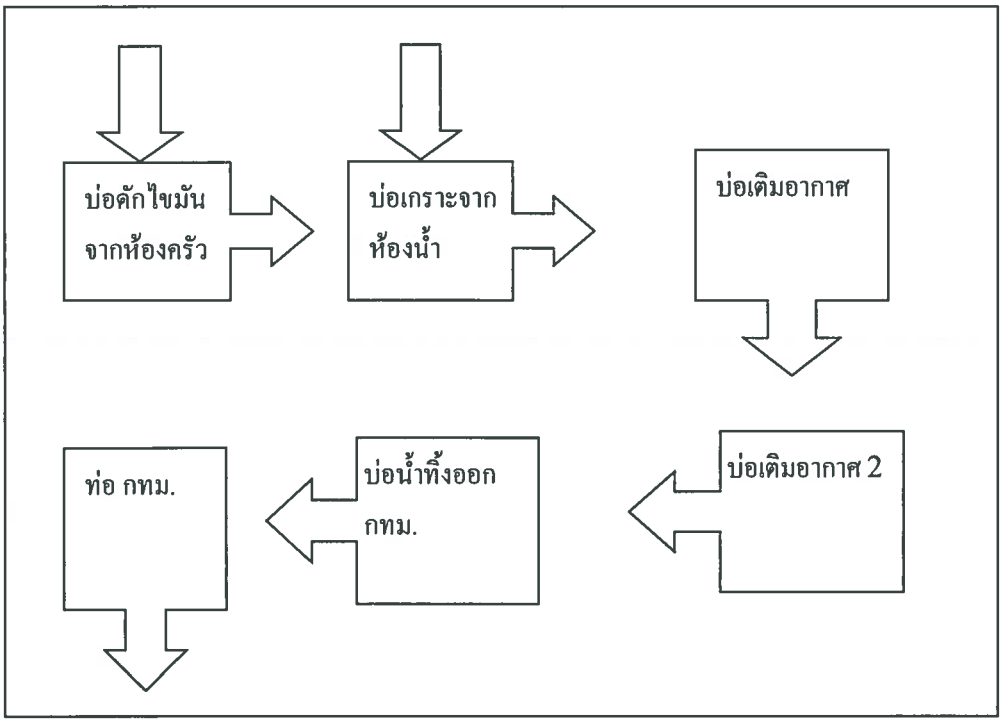

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2568	374.05	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/10/2568	371.52	75	73.50	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/10/2568	387.07	241	236.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/10/2568	371.99	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/10/2568	370.96	69	67.62	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/10/2568	374.89	111	108.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/10/2568	375.55	118	115.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/10/2568	382.10	188	184.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/10/2568	373.21	93	91.14	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/10/2568	379.86	164	160.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/10/2568	373.86	100	98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/10/2568	371.43	74	72.52	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/10/2568	382.20	189	185.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/10/2568	380.14	167	163.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/10/2568	380.42	170	166.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/10/2568	366.56	22	21.56	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/10/2568	371.24	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/10/2568	384.16	210	205.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/10/2568	368.81	46	45.08	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
20/10/2568	378.08	145	142.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/10/2568	372.93	90	88.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/10/2568	386.32	233	228.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/10/2568	373.86	100	98	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/10/2568	373.96	101	98.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/10/2568	374.05	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/10/2568	384.07	209	204.82	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/10/2568	370.68	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/10/2568	376.11	124	121.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/10/2568	375.74	120	117.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/10/2568	380.04	166	162.68	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/10/2568	375.08	113	110.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]งข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้[redacted]ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11660.92 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3860 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3782.80 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**
ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

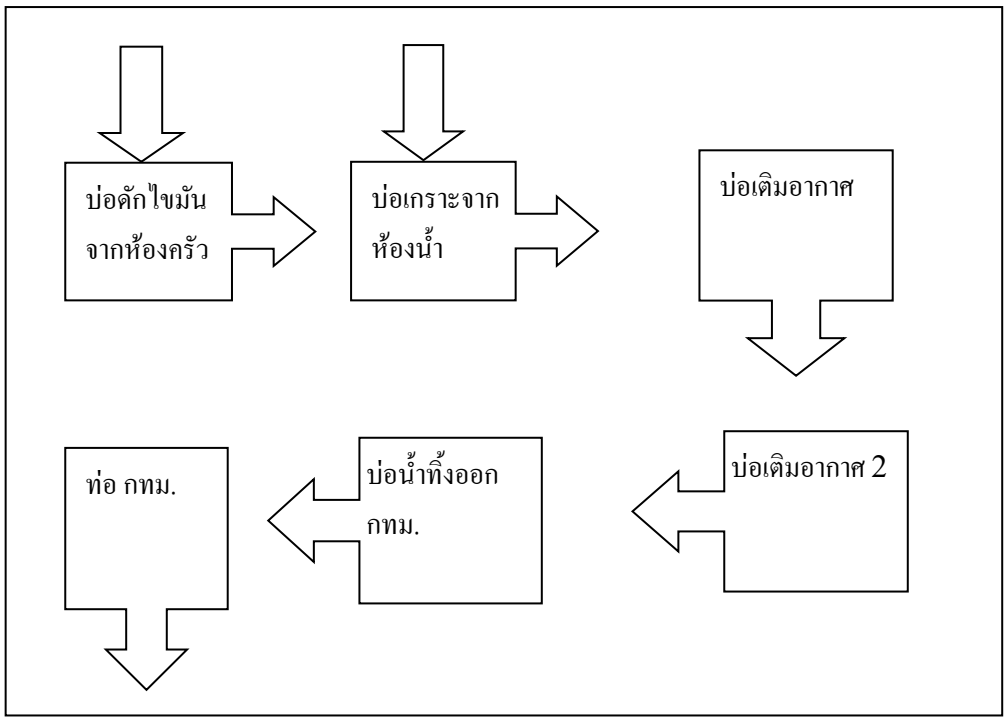

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2568	373.58	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
2/11/2568	377.80	142	139.16	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
3/11/2568	371.43	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
4/11/2568	378.83	153	149.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
5/11/2568	376.11	124	121.52	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
6/11/2568	374.80	110	107.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
7/11/2568	376.11	124	121.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
8/11/2568	380.04	166	162.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
9/11/2568	376.95	133	130.34	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
10/11/2568	376.77	131	128.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
11/11/2568	371.05	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
12/11/2568	370.77	67	65.66	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
13/11/2568	383.23	200	196	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
14/11/2568	378.83	153	149.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
15/11/2568	369.84	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
16/11/2568	373.49	96	94.08	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
17/11/2568	376.30	126	123.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
18/11/2568	378.45	149	146.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
19/11/2568	382.48	192	188.16	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/11/2568	373.58	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/11/2568	379.20	157	153.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/11/2568	368.90	47	46.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/11/2568	379.29	158	154.84	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/11/2568	377.89	143	140.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/11/2568	374.52	107	104.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/11/2568	376.20	125	122.50	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/11/2568	373.77	99	97.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/11/2568	378.92	154	150.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/11/2568	373.60	98	96.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/11/2568	369.93	58	56.84	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้

[redacted]

ือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. ……

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย…**.....**

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11272.73 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3607 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3534.86 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

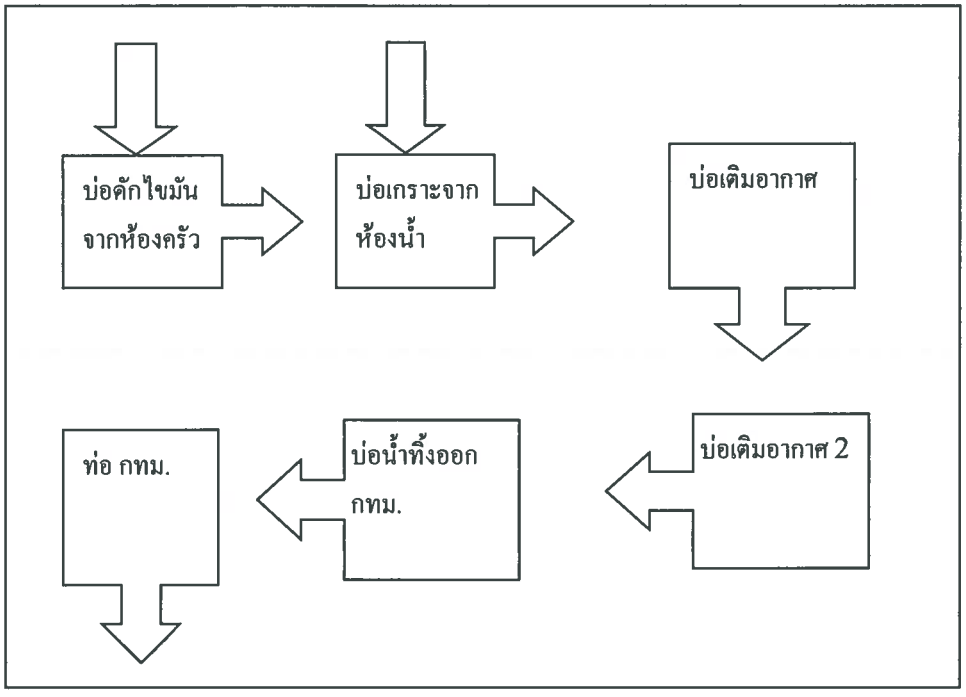

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/2568	370.02	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/12/2568	390.06	273	267.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/12/2568	376.77	131	128.38	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/12/2568	369.84	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/12/2568	372.18	82	80.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/12/2568	373.68	98	96.04	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/12/2568	373.68	98	96.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/12/2568	377.70	141	138.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/12/2568	375.17	114	111.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/12/2568	379.95	165	161.70	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/12/2568	369.18	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/12/2568	377.33	137	134.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/12/2568	372.74	88	86.24	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/12/2568	377.05	134	131.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/12/2568	373.77	99	97.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/12/2568	374.05	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/12/2568	377.61	140	137.20	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/12/2568	374.80	110	107.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/12/2568	377.33	137	134.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/12/2568	376.11	124	121.52	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/12/2568	371.62	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/12/2568	371.62	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/12/2568	386.78	238	233.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/12/2568	386.13	231	226.38	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/12/2568	377.89	143	140.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/12/2568	368.90	47	46.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/12/2568	376.86	132	129.36	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/12/2568	369.93	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/12/2568	377.70	141	138.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/12/2568	383.69	205	200.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/12/2568	365.53	11	10.78	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด[redacted]รองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]ำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11,645.66 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3,697 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3623.06 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250711479
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JULY 02, 2025	RECEIVED DATE	: JULY 02, 2025
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: JULY 02-21, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: JULY 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	38.5	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	58.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250711480
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JULY 02, 2025	RECEIVED DATE	: JULY 02, 2025
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: JULY 02-21, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: JULY 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	7.8	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	46.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.5×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 0490725 วันที่ (Date) 14 กรกฎาคม 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] หลังปาบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6807043

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] เหลืองขุ่น, ตะกอนน้ำตาล

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 3 กรกฎาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 3 กรกฎาคม 2568 - 14 กรกฎาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 2 กรกฎาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังปาบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.20	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนเนื้อเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250811724
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: AUGUST 06, 2025	RECEIVED DATE	: AUGUST 06, 2025
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 06-19, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: AUGUST 19, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	106.0	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	120.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250811725
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: AUGUST 06, 2025	RECEIVED DATE	: AUGUST 06, 2025
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 06-19, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: AUGUST 19, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	4.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	40.4	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	42.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.2×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1730825 **วันที่ (Date)** 17 สิงหาคม 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังป่าบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6808150

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] เหลืองใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 8 สิงหาคม 2568 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 8 สิงหาคม 2568 - 17 สิงหาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 6 สิงหาคม 2568 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังป่าบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่สุ่มตัวอย่างเอง

[redacted]

ผู้เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3-356-R-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250911959
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 04, 2025	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME	: 10:20	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 04-15, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: SEPTEMBER 15, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.8 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	138.0	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	44.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250911960
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 04, 2025	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME	: 10:20	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 04-15, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: SEPTEMBER 15, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	5.5 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	40.8	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	14.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1190925 **วันที่ (Date)** 13 กันยายน 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังปาปัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6809105

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] เหลืองใส, มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 5 กันยายน 2568 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 5 กันยายน 2568 - 13 กันยายน 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 4 กันยายน 2568 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังปาปัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN251012173
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: OCTOBER 03, 2025	RECEIVED DATE	: OCTOBER 03, 2025
SAMPLING TIME	: 10:15	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 03-13, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: OCTOBER 16, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	107.0	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	68.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel. 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN251012174
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: OCTOBER 03, 2025	RECEIVED DATE	: OCTOBER 03, 2025
SAMPLING TIME	: 10:15	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 03-13, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: OCTOBER 16, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	40.4	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	54.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 0621025 วันที่ (Date) 13 ตุลาคม 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังปาปัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6810053

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] เหลืองปุน, มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 4 ตุลาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 4 ตุลาคม 2568 - 13 ตุลาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 3 ตุลาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังปาปัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	14.43	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการไม่รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่างเอง

ผู้เปลี่ยนแปลงเอกสาร J-556-FI-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามทำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN251112471
CHARACTERISTICS OF WATER	: เขียวขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 06, 2025	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 06, 2025
SAMPLING TIME	: 10:30 น.	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 06-19, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: NOVEMBER 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	124.6	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	80.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN251112472
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 06, 2025	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 06, 2025
SAMPLING TIME	: 10:30 น.	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 06-19, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: NOVEMBER 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	22.2	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	36.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1×10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1331125 **วันที่ (Date)** 15 พฤศจิกายน 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] หลังปาบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6811112

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] เหลืองขุ่น, มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 6 พฤศจิกายน 2568 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 6 พฤศจิกายน 2568 - 15 พฤศจิกายน 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 6 พฤศจิกายน 2568 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังบำบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.20	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN251212704
CHARACTERISTICS OF WATER	: ดำ ขุ่นมาก มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นรุนแรง	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: DECEMBER 04, 2025	RECEIVED DATE	: DECEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 04-17, 2025
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: DECEMBER 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	215.0	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	272.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN251212705
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: DECEMBER 04, 2025	RECEIVED DATE	: DECEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 04-17, 2025
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: DECEMBER 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.6 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	16.4	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	30.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 2381225 **วันที่ (Date)** 15 ธันวาคม 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] หลังบำบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6812193

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] สีเหลือง, มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 6 ธันวาคม 2568 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 6 ธันวาคม 2568 - 15 ธันวาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 4 ธันวาคม 2568 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
		หลังบำบัด			
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	1.10	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ภาคผนวก 7

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก 5

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวปนัดดา พันธ์กะจับ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวจามจุรี คำปุย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวภานุชนารถ เชี่ยวชาญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาววันวิสา หวังแววกลาง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖
๗) นายปริญญา กล่ำน้อย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗
๘) นายโกวิท บุพา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘
๙) นายพีรพล ถวิลหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2]
		2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2]
4	pH	Electrometric Method[2]
5	Sulfide	Iodometric Method[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : ***10 มกราคม 2568***
หมดอายุ วันที่ : ***9 มกราคม 2572***
ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ : [redacted]

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : HIT-2513-0439

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	Dissolved Oxygen and BOD Meter		
Meter Model :	HI5421-02	**Serial No. :**	04240005101
Probe Model :	HI76438	**Serial No. :**	KC1N66J5P
Manufacturer :	Hanna Instruments	**Made in :**	Romania
Condition As-Received :	Used Product	**Reference :**	RE250379
Ambient Temperature :	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity :**	(50 ± 15)% RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	20 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-11 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : ☑ Mr. Pichit Petthong

☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by :

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of thru Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	24T1281
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171

2. Reference Standard Materials : DO calibration standard traceable to Hanna Instrument Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna	0.0 ± 0.1 @25°C	S0028/23	March 2028

Calibration Result

Inspection the accuracy of the Dissolved Oxygen (DO) Meter by using the following certificate reference material value.

Unit Under Calibration	CRM Standard DO	Actual value Reading	Error value Reading	Uncertainty of Measurement (±)
DO Electrode S/N KC1N66J5P	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A
	8.3 mg/L	8.26 mg/L	-0.04 mg/L	0.33 mg/L

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : HIT-2513-0438

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	**Serial No. :**	04160019101
Probe Model :	HI1131B	**Serial No. :**	11271C0N
Resolution (pH) :	0.01	**Resolution (mV) :**	0.1
Manufacturer :	Hanna Instruments	**Made in :**	Romania
Condition As-Received :	Used Product	**Reference :**	RE250378
Ambient Temperature :	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity :**	(50 ± 15)% RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	24 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : ☑ Mr. Pichit Petthong

☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by :

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E299	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Thermometer with sensor	HI98509	36943D	24T1281	
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	4.008 ± 0.006@25°C	996963	16 May 2025
pH 7.0	CPA chem	6.987 ± 0.007@25°C	1015026	19 July 2025
pH 10.0	CPA chem	10.010 ± 0.009@25°C	996965	16 May 2025

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (± mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement (±pH)
pH Electrode S/N 11271C0N	4.008	4.01	173.8	0.009
	6.987	6.98	4.5	0.010
	10.010	10.01	-170.6	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : HIT-2510-0369

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	**Serial No. :**	04160019101
Probe Model :	HI7662-W	**Serial No. :**	0615024N
Resolution :	0.1 °C	**Temperature Range :**	(-20 to 120)°C
Manufacturer :	Hanna Instruments	**Made in :**	Romania
Condition As-Received :	Used Product	**Reference :**	RE250379
Ambient Temperature :	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity :**	(50 ± 15)% RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	5 March 2025		
Issue date :	6 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments.		

Calibrated by : ☑ Mr. Pichit Petthong

☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : Mr. [redacted]

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator with sensor	Fluke 753	43160061	25I123	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

Calibration Result :

Function : Temperature measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Probe : Stainless steel temperature probe and 1 m (3.3') cable.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error Value (°C)	Uncertainty (±°C)
20.0	20.00	20.0	0.00	0.18
25.0	25.00	25.0	0.00	0.18
30.0	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CDT-116-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER	: EUTECH
MODEL/TYPE	: ECO SCAN TEMP5
SERIAL NUMBER	: 816366
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd. 67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1, Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.
RECEIVED DATE	: 01 Jul 2024
MEASUREMENT DATE	: 03 Jul 2024
ISSUE DATE	: 04 Jul 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0101-23

Reference Used During Calibration:
1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09, Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 14 Sep 2024

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:
☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: ..

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-116-67

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 3: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3 mm. Length 116 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
110	20.047	20.1	0.0	0.26
110	25.043	25.0	0.0	0.26
110	30.034	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM25-1336
Page : 1 of 3

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BSA224S-CW
Serial No. : 35790699
Identification No. : N/A
Calibration Place : On Site Calibration was Carried out at th Laboratory Enrironmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set E1.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

Calibrated by : Mr.Suppason Kcawkum

Approved by :

Issue date :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025


Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 200 g
Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
100	100.0001	100.0000	100.0001	100.0003	100.0002	100.0001	0.0003

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight	(g)	UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0000	0.0000
	At 20 %	20	20.0000	0.0000
	At 40 %	40	40.0001	-0.0001
100	At 60 %	60	60.0001	-0.0001
	At 80 %	80	80.0002	-0.0002
	At 100 %	100	100.0001	-0.0001

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Result : Before Adjustment ปรับก่อน
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0501	-0.00007	0.000058
0.10000	0.1005	-0.00047	0.000058
0.20000	0.2002	-0.00020	0.000059
0.50000	0.5003	-0.00030	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0005	-0.00049	0.000064
49.99999	50.0008	-0.00081	0.000090
99.99998	100.0014	-0.00142	0.00014
149.99997	150.0021	-0.00210	0.00027
199.99996	200.0023	-0.00234	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment หลังปรับ

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	0.00000	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1001	0.00010	0.000058
0.20000	0.2000	0.00000	0.000059
0.50000	0.5002	0.00020	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0001	0.00009	0.000064
49.99999	50.0002	0.00025	0.000090
99.99998	100.0001	0.00015	0.00014
149.99997	150.0005	0.00057	0.00027
199.99996	200.0000	0.00007	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2374
Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : KWF
Model : SOV70B
Serial No. : KWF2021021902
Identification No. : OKLA-LAB-013/170621
Calibration Place : **On site calibration was carried out at th Laboratory Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.**

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY · INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD. · IMC

Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by :

Issue date :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 104, 180 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	104.039	104.963	105.217	104.164	104.451	104.033	104.570	105.168	104.635	0.82
180	180.431	181.588	180.850	180.819	180.829	180.240	180.081	180.682	180.685	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.3 to 104.6	0.45	1.1	1.8
180.0	180.4 to 180.6	1.0	1.7	3.2

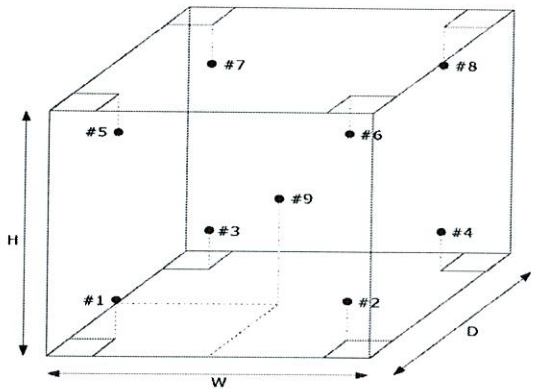

#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2372
Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Incubator
Manufacturer : S-Cool
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : OKLA-LAB-011/190
Calibration Place : **On site calibration was carried out at th Laboratory Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.**

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY · INCTECH · IMC

Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by

Issue date

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	19.570	19.223	19.044	19.241	19.733	19.622	19.052	19.328	19.518	0.31

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.10	0.56	0.80

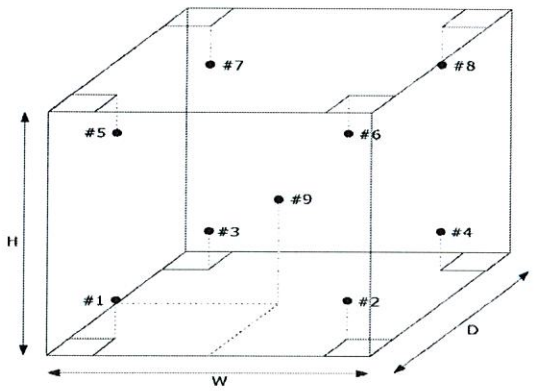

#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2373
Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Freezer (Refrigerator)
Manufacturer : Sanden
Model : SPB-0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : **On site calibration was carried out at th Laboratory Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.**

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY · INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD. · IMC

Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by :

Issue date :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 4 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
4	3.611	4.126	3.430	4.142	3.751	4.393	3.436	3.890	4.103	0.41

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.0	0.27	0.94	1.3

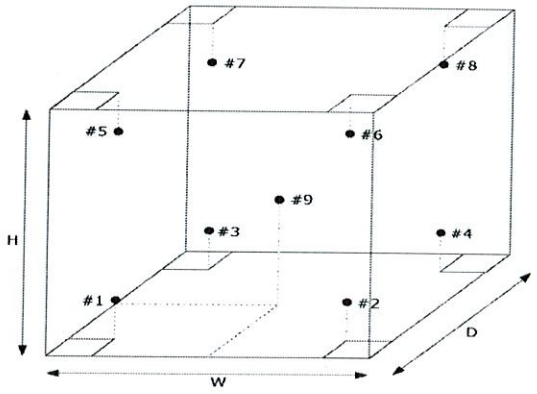

#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CRT-061-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER	: KEPLER Instrument
MODEL/TYPE	: KTH-02
SERIAL NUMBER	: 234011889
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: Okla Testing and consulting services Co., Ltd. 67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra, Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.
RECEIVED DATE	: 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE	: 19 Dec 2024
ISSUE DATE	: 19 Dec 2024

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:
The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	˚C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: .....

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-061-67

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.
Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Determined (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty ±(°C)
20.00	20.06	20.6	0.5	0.31
25.00	25.04	25.3	0.3	0.31
30.00	30.04	29.6	-0.4	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.
Calibration Range: 35%RH to 70%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ±(%RH)
23.04	34.74	36	1	1.0
23.04	44.71	43	-2	1.3
23.00	59.68	58	-2	1.8
23.03	69.61	66	-4	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CRT-062-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER	: KEPLER Instrument
MODEL/TYPE	: KTH-02
SERIAL NUMBER	: 234011890
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: Okla Testing and consulting services Co., Ltd. 67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra, Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.
RECEIVED DATE	: 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE	: 19 Dec 2024
ISSUE DATE	: 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	˚C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:
The `measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: .

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-062-67

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.
Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Determined (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty ±(°C)
20.00	20.06	20.2	0.1	0.31
25.00	25.04	25.4	0.4	0.31
30.00	30.04	30.3	0.3	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.
Calibration Range: 35%RH to 70%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ±(%RH)
23.03	34.75	34	-1	1.0
23.03	44.71	43	-2	1.3
23.05	59.61	58	-2	1.8
23.04	69.59	67	-3	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-8**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette

Manufacturer : ISOLAB Class : A

Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml

ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C

Relative Humidity : (50 ± 10) %

Air Pressure : 1014.5 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Wipa Tovadee

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241003	67-200410-2	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : ( )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-8**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 38.96 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	5.0000
15	14.9944
25	24.9967

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA
THAILAND
NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.22
100	100.30

Uncertainty of measurement with in ± 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA
NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.32

Uncertainty of measurement with in ± 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA

THAILAND

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder

Manufacturer : Borosil Class : A

Capacity : 500 ml Graduation : 5 ml

ID No. : 0334-58

Environment :

Ambient Temperature	:	(20 ± 3)	°C
Relative Humidity	:	(50 ± 10)	%
Air Pressure	:	1009.6	mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.63

Uncertainty of measurement with in ± 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 5.22 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1012
0.5	0.4994
1	0.9903

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.60 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5022
2.5	2.4836
5	4.9838

Uncertainty of measurement with in ± 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 11.06 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0027
5	4.9761
10	9.9770

Uncertainty of measurement with in ± 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-6** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.2 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-6**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 14.98 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9818

Uncertainty of measurement with in ± 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-4** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.3 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-4**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.981

Uncertainty of measurement with in ± 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-5** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.9 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : _____
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-5**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	500.04

Uncertainty of measurement with in ± 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

ภาคผนวก 8

เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิง
