บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1 ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยผลการสำรวจสภาพโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. สภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากรดิน/การใช้ที่ดิน/สุนทรียภาพ	1) ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร ส่วนตกแต่งอาคารและ รั้วรอบโครงการ 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3,015 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ สีเขียวชั้นล่างเท่ากับ 1,702 ตารางเมตร และกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,028 ตารางเมตร	1) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ไม้ยืนต้น 2) ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแลรักษา 3) รักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนัง กระจกรอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตต้องได้รับการทำความสะอาดหรือทาสีใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม	• ตรวจสอบทุก 6 เดือน	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยทันที	ภาคผนวก ข ภาพที่ 1, 3, 10

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ	1) การทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศของโครงการ 2) ตรวจสอบป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 3) ทำความสะอาดชั้นจอดรถอย่างสม่ำเสมอ	1) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นำเสนอในรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	• ตรวจสอบทุก 6 เดือน	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากมีการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยทันที	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3, 6
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ	1) ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำประกอบด้วย • ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) • บีโอดี (BOD) • สารแขวนลอย (SS) • สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) • ซัลไฟด์ (Sulfide) • ทีเคเอ็น (TKN) • น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	1) บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกระบบระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 2) จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียในระยะดำเนินการ	• การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมผลรายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน • ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง • การจัดเก็บสถิติ ตามแบบ ทส.1 จัดทำทุกวัน	• จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้าตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขของมาตรการฯ	ภาคผนวก ค, ง

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ (ต่อ)	2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อตะกอน และรางระบายน้ำ	1) บ่อตกตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ	• ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	• ตรวจสอบปริมาณตะกอน และรางระบายน้ำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ	ภาคผนวก ข ภาพที่ 5
4. คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	1) ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับสระว่ายน้ำของโครงการที่ใช้เกลือในการฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย • pH • คลอรีนอิสระคงเหลือ • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย • ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย • อี.โคไล (E.coli) • Staphylococcus aureus • Pseudomonas aeruginosa	1) น้ำในสระว่ายน้ำจากผิวน้ำสระ 1 ตัวอย่าง 2) น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลางสระ 1 ตัวอย่าง	• pH ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย • ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย,ฟีคัลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย,อี.โคไล (E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseubomonas aeruginosa ดำเนินการตรวจวัดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง	• จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้าตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขของมาตรการฯ	ภาคผนวก ง

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	เอกสารอ้างอิง
5. ความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ	1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบสระว่ายน้ำ ราวจับ และอุปกรณ์ส่วบควบของสระว่ายน้ำ เช่น ไฟส่องสว่าง เป็นประจำทุกวัน หากพบอุปกรณ์ชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	1) กระเบื้องปูพื้น และผนังสระว่ายน้ำ ราวจับ บันได และฝาปิดรางน้ำล้นรอบสระ 2) อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำและปั๊มน้ำ 3) อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต 2 อัน ห่วงชูชีพ 2 อัน ไม้ช่วยชีวิต 1 อัน และชุดปฐมพยาบาล 4) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	• ตรวจวัดทุกเดือนและรวบรวมรายงานส่ง ทุก 6 เดือน	• ตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบสระว่ายน้ำ ราวจับ และอุปกรณ์ส่วบควบของสระว่ายน้ำ เป็นประจำทุกวัน หากพบอุปกรณ์ชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	ภาคผนวก ข ภาพที่ 9
6. ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หม้อแปลง ฯลฯ	1) ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 2) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ	• ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุก 6 เดือน	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากมีการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยทันที	ภาคผนวก ข ภาพที่ 6

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ	เอกสารอ้างอิง
7. การจราจร	1) สถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออก 2) อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยการจราจรภายในโครงการ	1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 2) ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือนต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	• บันทึกอุบัติเหตุ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง • ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน และรวบรวมรายงานส่งทุก 6 เดือน	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึก ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากมีการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยทันที	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3
8. การมีส่วนร่วมของประชาชน	1) ข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือนร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ	1) จุดรับเรื่องร้องเรียนที่นิติบุคคลของโครงการ	• ปีละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	• กำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนที่นิติบุคคลของโครงการ	
	2) สภาพเศรษกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน	1) สำรวจกลุ่มบ้านติดและบ้าน 100 เมตร	• ปีละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	• กำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนที่นิติบุคคลของโครงการ	
		2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ สำรวจในระยะ 1,000 เมตรจากขอบเขตโครงการ	• สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ โดยแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	• กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตพิจารณา	

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะจำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ น้ำในสระว่ายน้ำที่บริเวณผิวน้ำ จำนวน 1 จุด และน้ำในสระว่ายน้ำที่ความลึกกึ่งกลางสระ จำนวน 1 จุดเดือนละ 1 ครั้ง








ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทำการเก็บตัวอย่างน้ำตามที่มาตรการฯกำหนด ส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ได้ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ **นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1** ของ **นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1**
จัดทำรายงานโดย **บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด**
ระหว่างเดือน **กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย**
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี **x = 667063.89 y = 1537100.04 47P**

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด(๑)						ค่ามาตรฐาน(๒)	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ(๓)
		14-ก.ค.	11-ส.ค.	8-ก.ย.	6-ต.ค.	5-พ.ย.	8-ธ.ค.		
pH	-	7.9	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	5-9	
BOD	mg/l	6	14	8	8	17	92	$\leq$ 20	
SS	mg/l	12	38	21	41	63	68	$\leq$30	
TDS	mg/l	760	793	769	747	382	810	$\leq$1000	
Sulfide	mg/l	ND.	ND.	ND.	ND.	0.5	0.6	$\leq$1.0	
TKN	mg/l	16	22	24	25	23	25	$\leq$35	
Oil & Grease	mg/l	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.3	$\leq$20	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ **นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1** ของ **นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1**
จัดทำรายงานโดย **บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด**
ระหว่างเดือน **กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ**
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี **x = 667063.89 y = 1537100.04 47P**

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด(๑)						ค่ามาตรฐาน(๒)	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ(๓)
		14-ก.ค.	11-ส.ค.	8-ก.ย.	6-ต.ค.	5-พ.ย.	8-ธ.ค.		
pH	-	7.9	7.1	7.3	7.4	7.8	7.1	5-9	
BOD	mg/l	5	7	5	6	6	6	$\leq$ 20	
SS	mg/l	9	9	14	9	2	10	$\leq$30	
TDS	mg/l	653	520	293	364	329	638	$\leq$1000	
Sulfide	mg/l	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	$\leq$1.0	
TKN	mg/l	9	7	10	12	10	9	$\leq$35	
Oil & Grease	ml/l/hr	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	$\leq$20	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ **นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1** ของ **นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1**
จัดทำรายงานโดย **บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด**
ระหว่างเดือน **กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **สระว่ายน้ำ (จุดตื้น)**
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี **x = 667063.89 y = 1537100.04 47P**

ดัชนีคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด(๑)						ค่ามาตรฐาน(๒)	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ(๓)
		14-ก.ค.	11-ส.ค.	8-ก.ย.	6-ต.ค.	5-พ.ย.	8-ธ.ค.		
Total Coliform Bactteria	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	<10	
Fecal Coliform Bactteria	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	<10	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

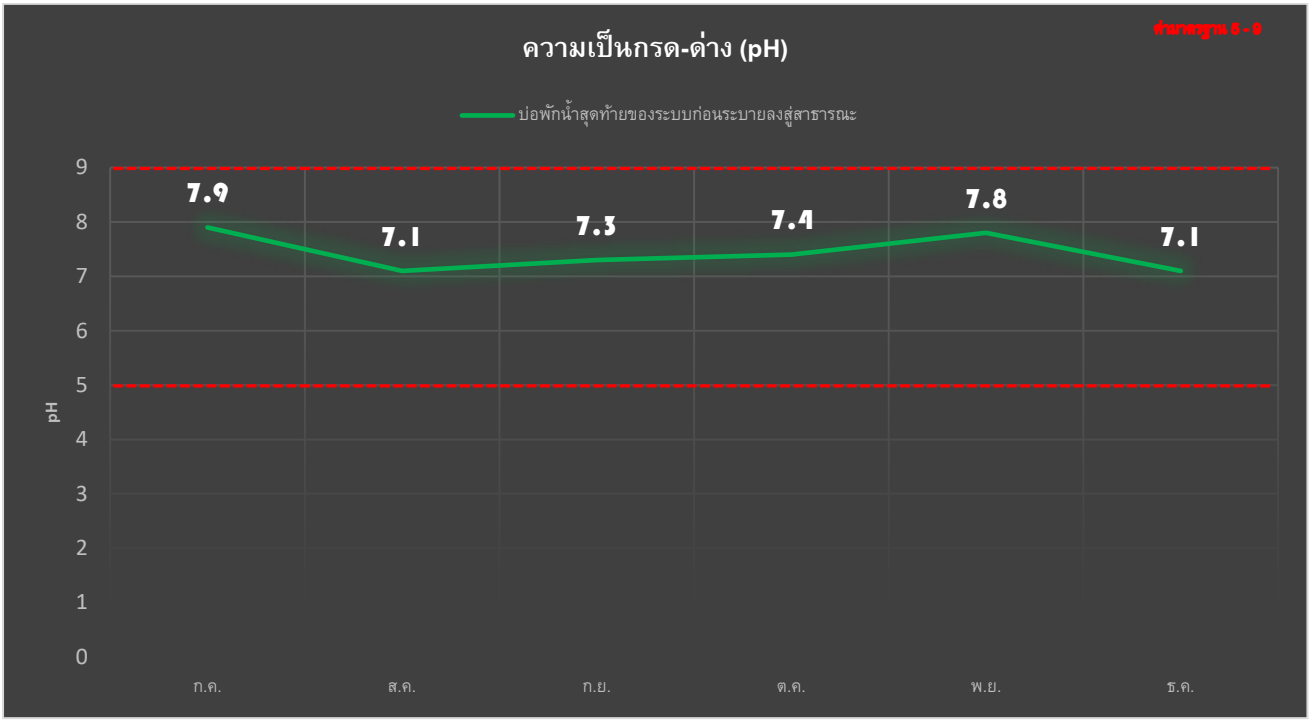
หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

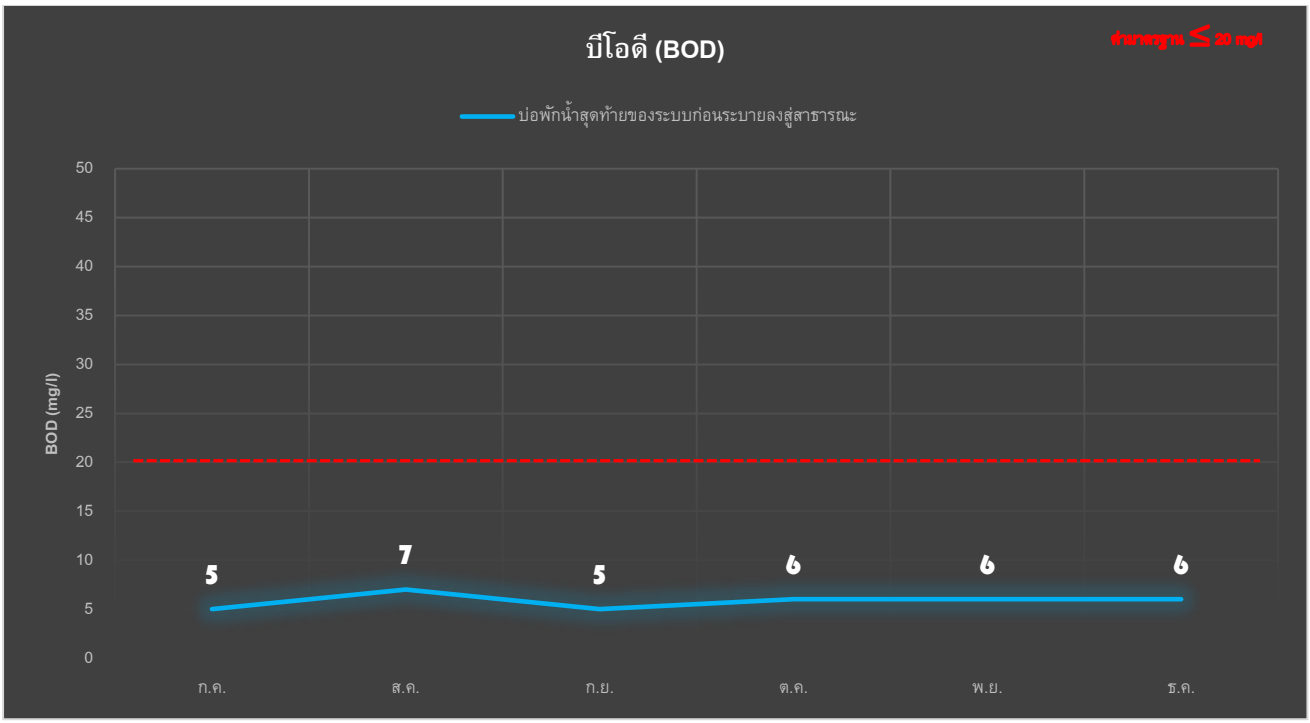
การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

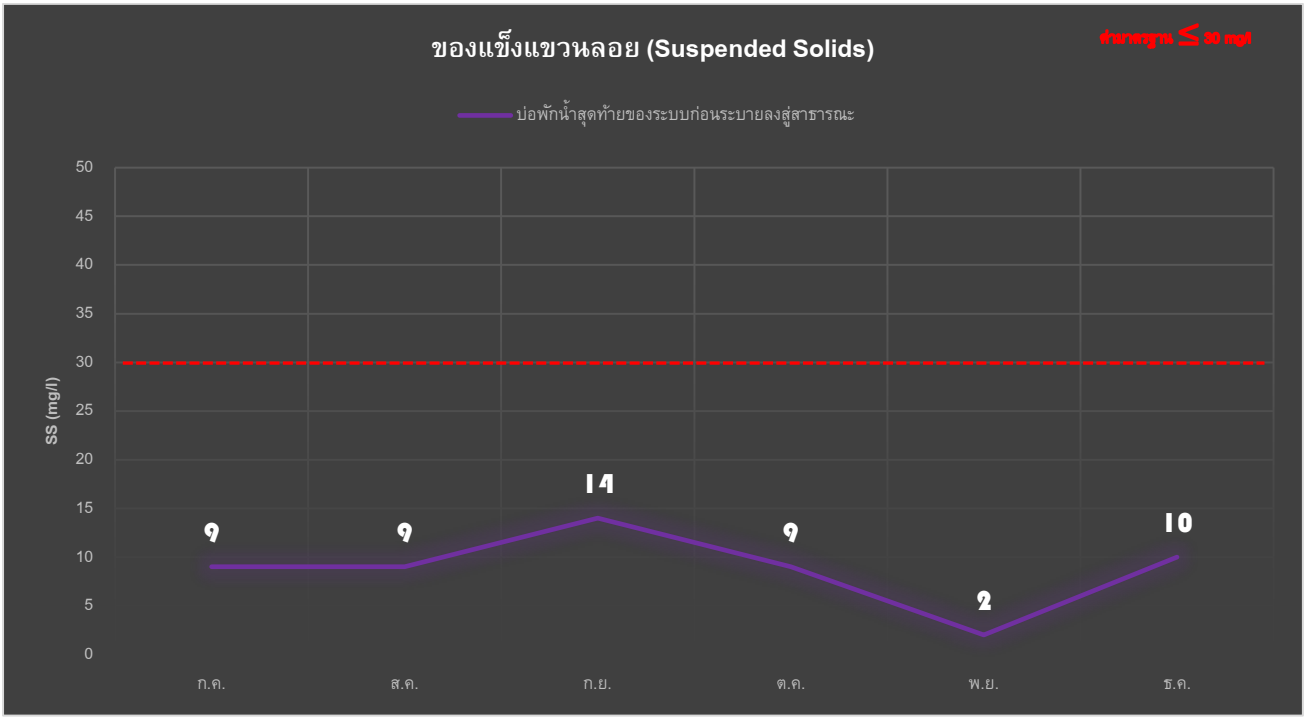
โครงการ **นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1** ของ **นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1**
จัดทำรายงานโดย **บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด**
ระหว่างเดือน **กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **สระว่ายน้ำ (จุดลึก)**
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี **x = 667063.89 y = 1537100.04 47P**

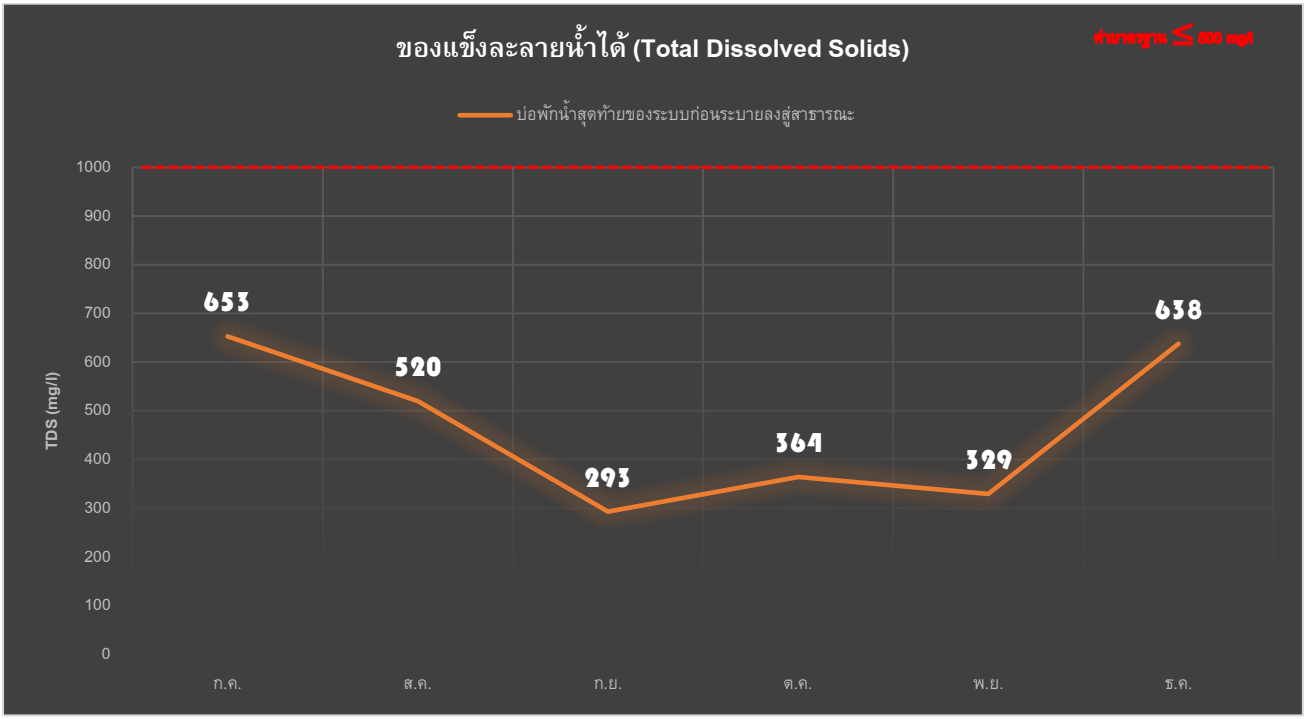
ดัชนีคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด(๑)						ค่ามาตรฐาน(๒)	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ(๓)
		14-ก.ค.	11-ส.ค.	8-ก.ย.	6-ต.ค.	5-พ.ย.	8-ธ.ค.		
Total Coliform Bactteria	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	<10	
Fecal Coliform Bactteria	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	<10	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

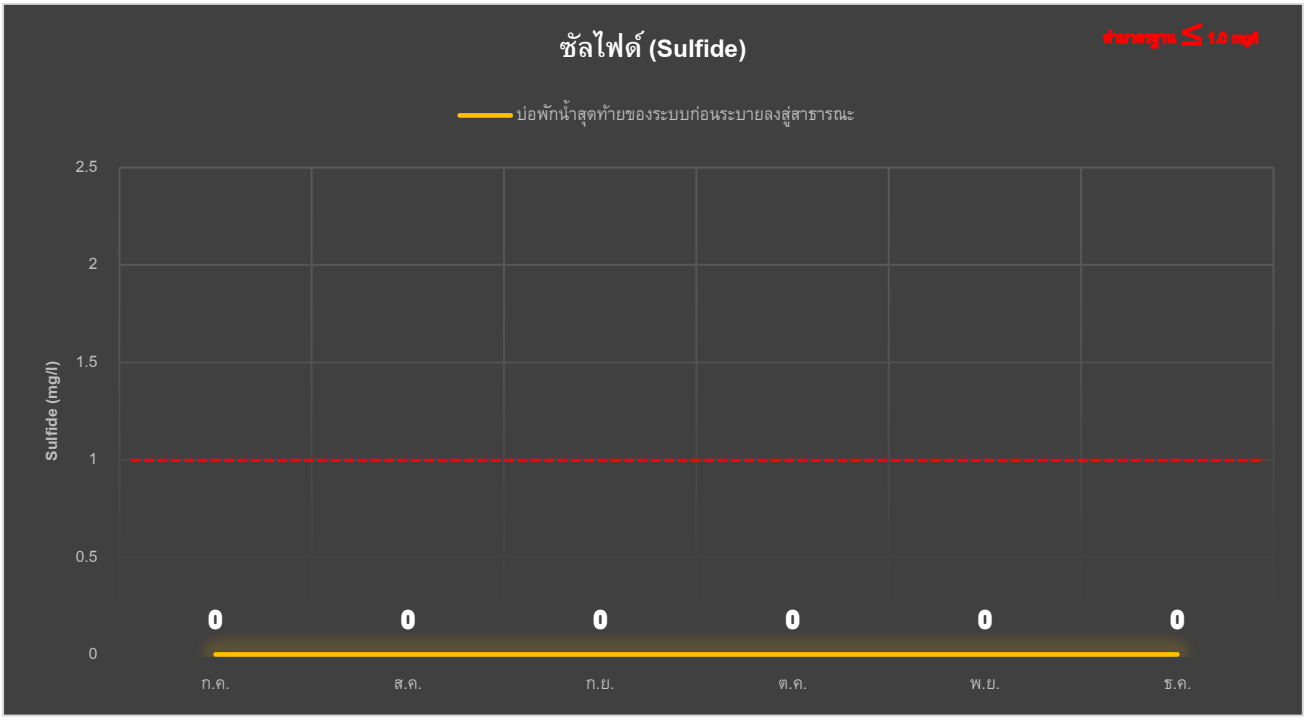
หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

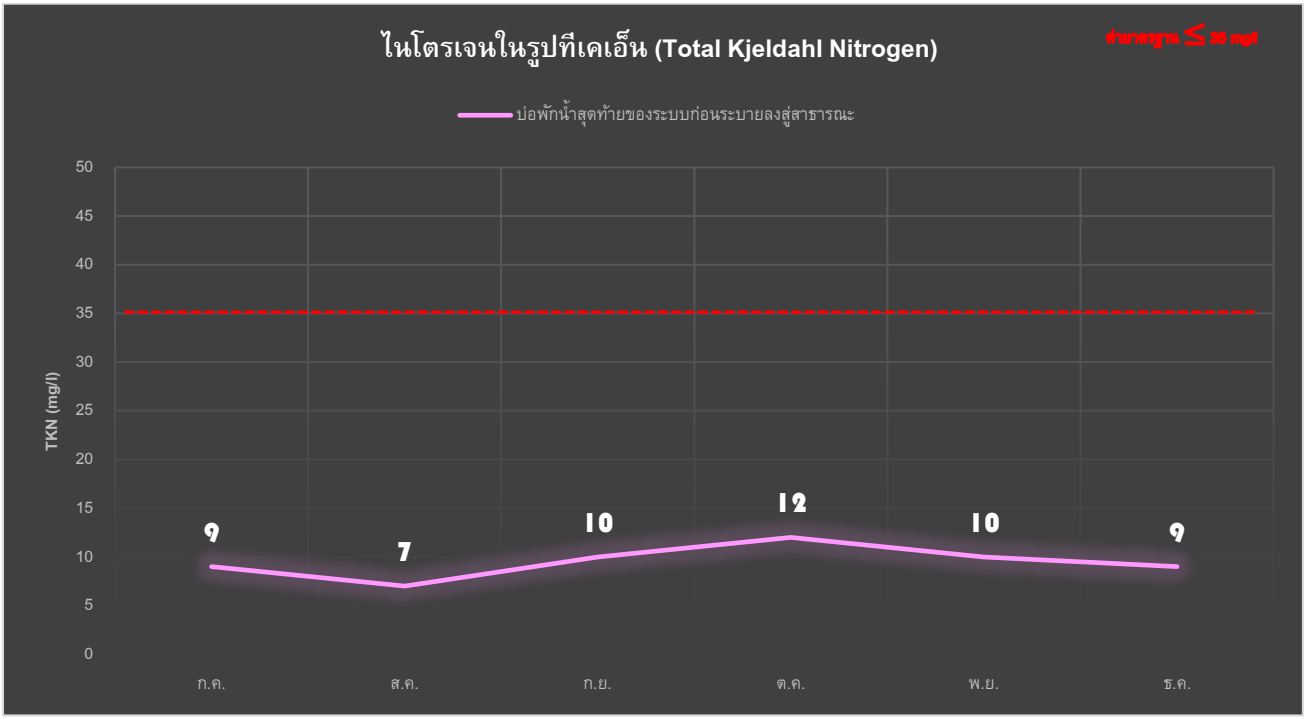

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ค่ามาตรฐาน 5 - 9
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่สาธารณะ
pH
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7.9
7.1
7.3
7.4
7.8
7.1
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

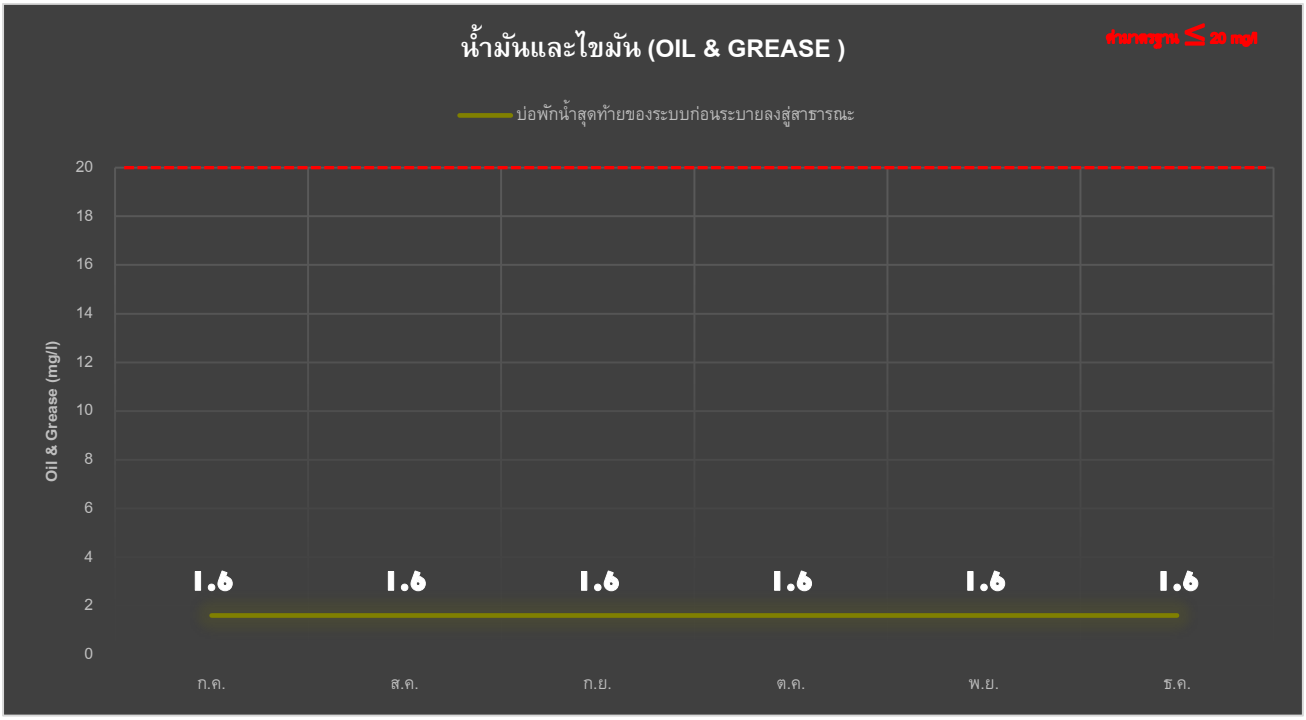

บีโอดี (BOD)
ค่ามาตรฐาน ≤ 20 mg/l
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่สาธารณะ
BOD (mg/l)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
5
7
5
6
6
6
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.


ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
ค่ามาตรฐาน ≤ 30 mg/l
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่สาธารณะ
SS (mg/l)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
9
9
14
9
2
10
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.


ของแข็งละลายน้ำได้ (Total Dissolved Solids)
ค่ามาตรฐาน ≤ 600 mg/l
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่สาธารณะ
TDS (mg/l)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
653
520
293
364
329
638
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.


ซัลไฟด์ (Sulfide)
ค่ามาตรฐาน ≤ 1.0 mg/l
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่สาธารณะ
Sulfide (mg/l)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0 0 0 0 0 0
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.


ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
ค่ามาตรฐาน ≤ 35 mg/l
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่สาธารณะ
TKN (mg/l)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
9 7 10 12 10 9
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.


น้ำมันและไขมัน (OIL & GREASE)
มาตรฐาน ≤ 20 mg/l
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่สาธารณะ
Oil & Grease (mg/l)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
