ภาคผนวก ค

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ระยะดำเนินการ)

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-1		บำรุงรักษาดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ค-2		ป้ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงค่าความเข้มข้นของมลสารในอากาศแบบเป็นปัจจุบัน บริเวณแยกหางฮุง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (จอแสดงผลการตรวจวัด) ที่บริเวณโรงพยาบาลแม่เมาะ
ค-3		ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer)

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-4	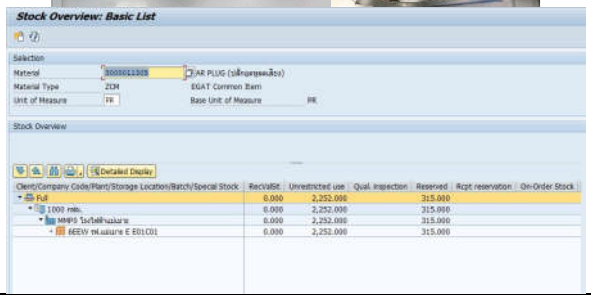	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 80 เดซิเบลเอ และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-5	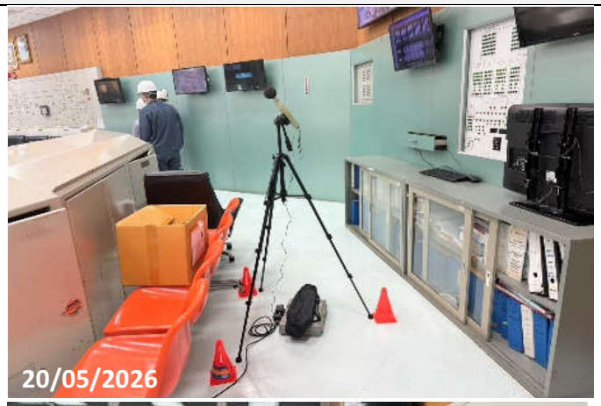 	ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณห้องควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 11 และ 14
ค-6		จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ
ค-7	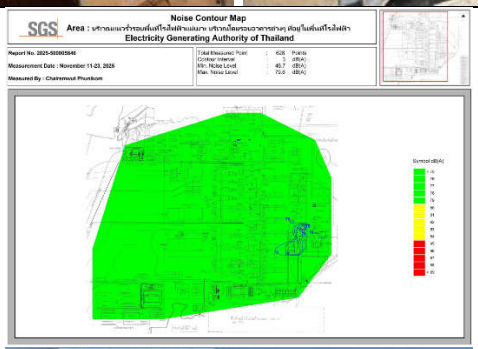 	กำหนดให้จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) กำหนดเขตพื้นที่เสียงดัง ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการ 2 ปี/ครั้ง โดยปี 2568 ดำเนินการเมื่อวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2568 และจะดำเนินการอีกครั้งในปี 2570

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-8	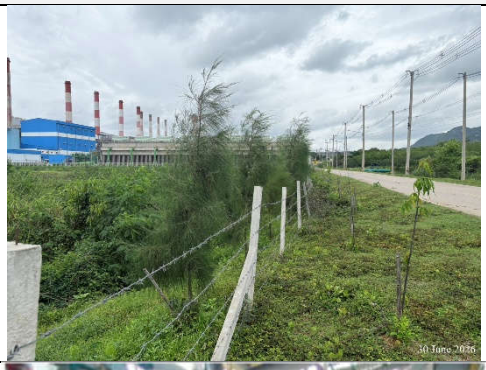	กำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเป็นแนวกั้นเสียง
ค-9		บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ
		เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดชีววิธีจากกิจกรรมโรงไฟฟ้าทั้งหมด และตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระและไตรฮาโลมีเทนในน้ำทิ้งที่ระบายออกจากบ่อพักน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า โดยต้องทำการตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกเดือน และไตรฮาโลมีเทน ปีละ 2 ครั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ
ค-10	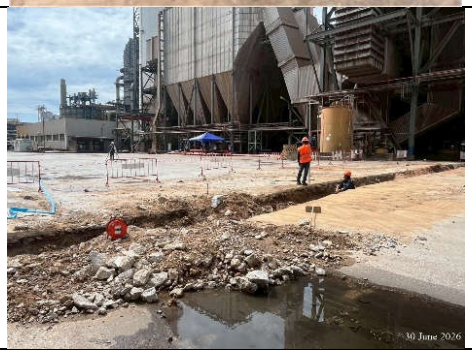	ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณจุดขนส่งยิปซัมและระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพสามารถดักน้ำชะดินบริเวณที่มีการขนส่งยิปซัม

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-11		นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโรงไฟฟ้าแล้วนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้า
ค-12	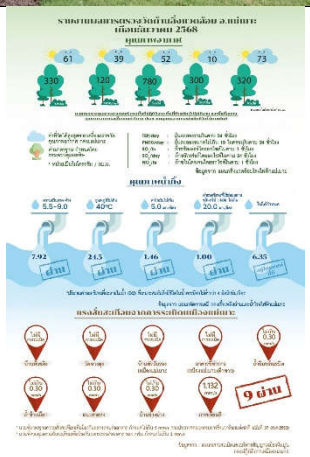 	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในวารสารสวัสดีแม่เมาะฉบับประจำเดือน การประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประชุมประจำเดือน
ค-13	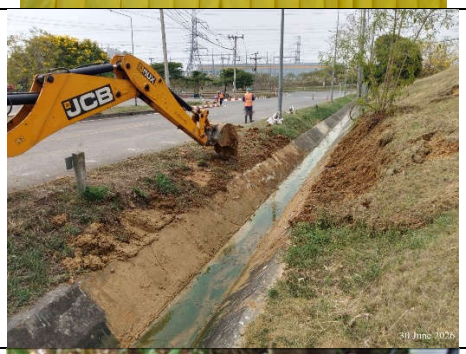	บำรุงรักษา ตรวจสอบระบบรางระบายน้ำและบ่อตกตะกอนอยู่เสมอ
ค-14	 Flow, pH, Conductivity probe	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitor) ณ จุดที่ระบายน้ำออก จากบ่อพักน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า (Diversion Pond)

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
	   	ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อพักน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า (Diversion Pond) ระบบแสดงผลข้อมูลน้ำทิ้งแบบเนียร์เรียลไทม์
ค-15	 	เขื่อนกิ่วลม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่มีการสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ระดับน้ำ 285.510 ม.รทก. ปริมาณน้ำใช้ได้ 101.42 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณเก็บกักปกติ 106.220 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/69)

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
		อ่างเก็บน้ำแม่จาง เขื่อนแม่จางระดับน้ำ 350.14 ม.รทก. ปริมาณน้ำใช้งานได้ 63.916 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณเก็บกักปกติ 102.118 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่สูบไปใช้ 14,194,439 ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/69)
	 	อ่างเก็บน้ำแม่ขาม เขื่อนแม่ขามระดับน้ำ 345.13 ม.รทก. ปริมาณน้ำใช้งานได้ 14.638 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณเก็บกักปกติ 35.843 ล้าน ลบ.ม ปริมาณน้ำที่สูบไปใช้ 1,339,621 ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/69)
ค-16	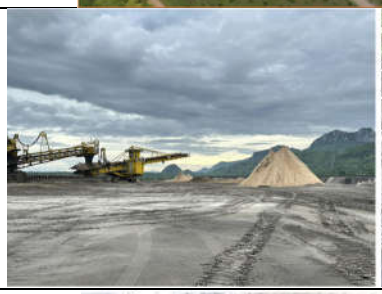 	กากตะกอนที่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้าจะทำการรวบรวมและนำไปทิ้งที่บ่อทิ้งขี้เถ้าของโรงไฟฟ้า
ค-17	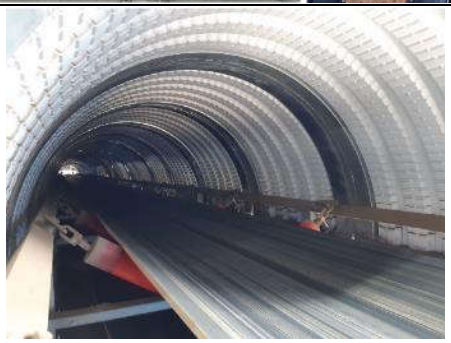	ออกแบบระบบสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหินเป็นระบบปิดโดยสมบูรณ์

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-18		ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถฉีดพรมน้ำได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่บ่อเก็บเถ้าถ่านหิน รวมถึงมีการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
ค-19		ทำความสะอาดตะแกรงที่ใช้สูบน้ำเป็นประจำ
ค-20	 	ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ของการสะสมของสารปรอท ในเนื้อปลาในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ผ่านวารสารสวัสดี แม่เมาะ รวมถึงบรรยาย เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนชน พร้อมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ป้ายห้ามจับสัตว์น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-21	 	ป้ายจำกัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค-22	 	กำหนดมาตรการควบคุมไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออก ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น
ค-23		ทำการซ่อมแซมถนนเมื่อพบว่าชำรุด

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-24		ตรวจสอบสภาพท่อน้ำ รางระบายน้ำ และซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยดำเนินการซ่อมแซม
ค-25	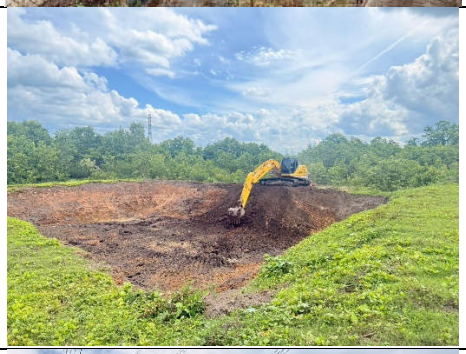	งานขุดลอกตะกอนบ่อตกตะกอนก่อนลง Ash Water lake บ่อที่ 1-3 (บ่อ คสล.หลังตึกเขียว)
		งานขุดลอกบ่อตกตะกอน Main drain – bio wetland (บ่อที่ 1 และ บ่อที่ 2)

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-26	 	เถ้าหนักจากกระบวนการเผาไหม้ จะถูกสายพานลำเลียงไปทิ้งยังบ่อทิ้งขี้เถ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บ่อทิ้งขี้เถ้า
ค-27	 	เถ้าลอยจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหิน จะลำเลียงไปเก็บไว้ในไซโล และขายให้กับเอกชนเพื่อไปผสมทำคอนกรีต
ค-28	  	การตรวจสอบสภาพสายพานลำเลียง

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
		การตรวจสอบไซโล การตรวจสอบสายพานลำเลียงยิปซัม
ค-29		ยิปซั่ม จากกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จำหน่ายให้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ผง
ค-30		เรซิ่นเสื่อมสภาพที่รอการกำจัด รวบรวมใส่ถุงพลาสติกแล้วนำมาบรรจุในถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร
ค-31		คัดแยกประเภทขยะ เป็น 4 ประเภท

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
		ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด เพื่อรอการจัดเก็บนำไปกำจัด
ค-32		คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ
ค-33		อาคารจัดเก็บขยะควบคุมพิเศษด้านหลังโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 8-13 และคัดแยกของเสียอันตรายจากสำนักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า ซากแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย โดยทำการรวบรวมในถังสำหรับเก็บของเสียอันตรายก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดต่อไป
ค-34		น้ำมันที่เสื่อมสภาพ ได้เก็บรวบรวมในลานจัดเก็บน้ำมันใช้แล้วของโรงไฟฟ้า และจัดเตรียมถังเปล่าเพื่อใช้สำหรับเก็บรวบรวมน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วให้มีความพอเพียงกับความต้องการของงานบำรุงรักษา
ค-35		ลานตากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำถูกนำไปฝังกลบบริเวณบ่อเก็บเถ้าถ่านหิน

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-36		ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านวารสารสวัสดีแม่เมาะ เพจเฟซบุค กฟผ.แม่เมาะ  ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทาง website: https://cmc-center.egat.co.th/vos/index.php ช่องทางการร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของ กฟผ. ผ่าน 6 ช่องทาง
ค-37		เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่น เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและวิทยุท้องถิ่น (อสมท.) เสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า รวมถึง Facebook live เพจ กฟผ.แม่เมาะ และวารสารสวัสดีแม่เมาะ
ค-38		บำรุง ดูแล ซ่อมแซม ต้นไม้ ในบริเวณที่จัดไว้เป็นพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า จำนวน 343 ไร่ หรือร้อยละ 33 ของพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งหมด ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-39	 	จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ (ทีมฉุกเฉิน กกม-ห.) ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไว้ให้บริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน กกม-ห. เปิดให้บริการตลอด 24 ช.ม. รถพยาบาล Stand by 24 ช.ม. พร้อมรับอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน-ส่งต่อผู้ป่วย
ค-40	 	กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น งานบำรุงรักษาตามวาระ กิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กิจกรรม Safety Walk down เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานทุกวินาที รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ตลอดจนป้องกันความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุด้านบุคคล และเป็นแบบอย่างที่ดี

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-41	 	กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการการทำงาน เช่น กิจกรรมวันรวมพลังความปลอดภัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี กิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ-ฟม.) กิจกรรมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัย และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในองค์กร รวมถึงมีการจัดทำป้ายโปสเตอร์ ป้ายเตือน แนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงาน โรคจากการทำงาน รายไตรมาส การจัดอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานตระหนัก
ค-42	 	จุดรักษาการณ์รักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง และให้มีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อส่งข่าวระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ
ค-43	 	โครงการถนนสีขาว จัดทำป้ายโปสเตอร์ ป้ายเตือน เพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
	 	การประกาศงดจำหน่ายวัตถุพลอยได้ในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ค-44		อบรมพนักงาน ลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง
ค-45	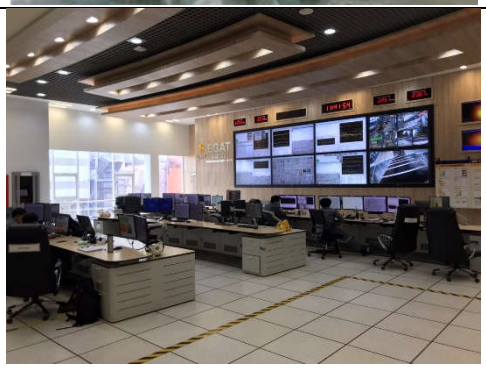	จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ เป็นต้น

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
	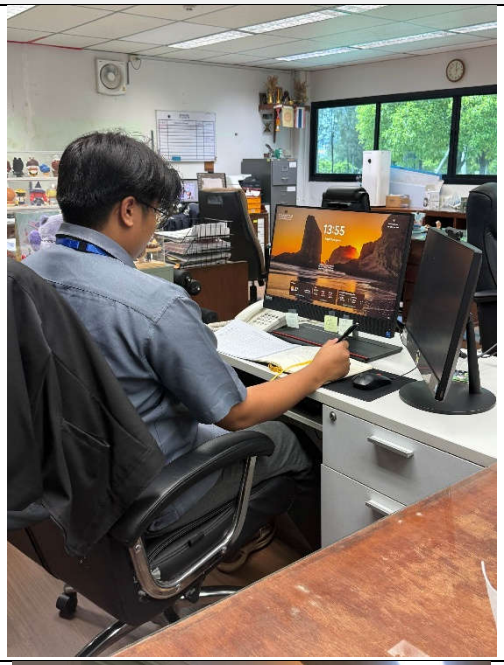	
ค-46	 	จัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงโดยตรง และจัดให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำเกินไป
ค-47		จัดพื้นที่ปฏิบัติงานและทางสัญจรของพนักงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-48		ฝึกบัว และอ่างล้างตาสำหรับชำระล้างกรณีฉุกเฉิน
ค-49		ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ และระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ค-50	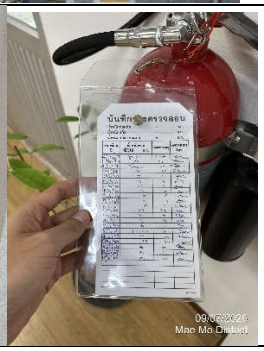	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นประจำทุกเดือน โดยตรวจสอบสภาพการใช้งาน ให้มีความพร้อมใช้

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-51	 	ซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 3 และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินการก่อวินาศกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2569 ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ได้มีการซ้อมแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น อำเภอแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ อบต.สบป้าด อบต.บ้านดง เป็นต้น
ค-52	 	พื้นที่เก็บสารเคมีทุกชนิดมีป้ายเตือนอันตรายข้อมูลสารเคมีแต่ละชนิด ระบบกักเก็บสารเคมีโดยทำขอบกั้นรอบถังสารเคมีแต่ละชนิด (Concrete Curbing)

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-52 (ต่อ)		อาคารเก็บสารเคมีมีหลังคาสูงโปร่ง มีพัดลมระบายอากาศ
		พื้นที่เก็บสารเคมีทุกชนิดมีป้ายเตือนอันตราย ข้อมูลสารเคมีแต่ละชนิด
ค-53	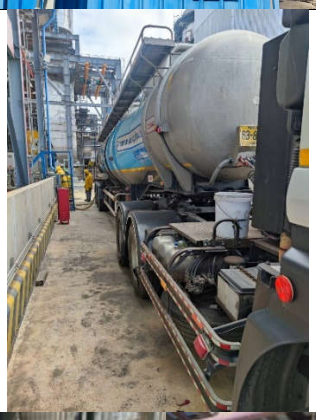	การขนถ่ายสารเคมีเป็นระบบปิด โดยขนถ่ายสารเคมีจากรถขนส่งทางท่อทำให้โอกาสการรั่วไหลน้อยมาก
		ปั๊มและท่อสูบส่งเคลื่อนย้าย ขนถ่ายสารเคมี

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-53 (ต่อ)		
ค-54		ผู้ปฏิบัติงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ทำงานกับสารเคมี ชุดอุปกรณ์ SCBA สำหรับก๊าซคลอรีน
ค-55	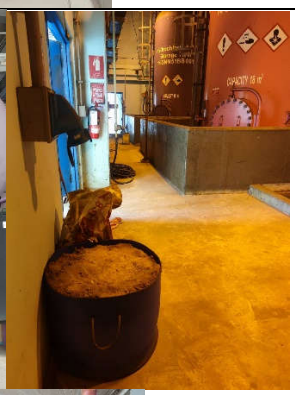	จัดเตรียมทรายดูดซับสารเคมีที่อาจรั่วไหล และอุปกรณ์กำจัดการหกรั่วไหลของสารเคมีบริเวณอาคารเก็บสารเคมี ทรายสำหรับใช้ดูดซับสารเคมีที่อาจรั่วไหล

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-56		จัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นระบบ พร้อมป้ายข้อมูล SDS
ค-57		ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร
ค-58	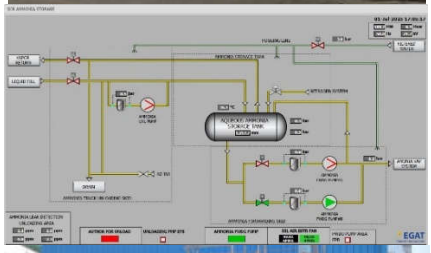	ถังเก็บแอมโมเนียเหลว อุปกรณ์แสดงการรายงานสภาพภายในถัง สร้างกำแพงคอนกรีตโดยรอบ

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-58 (ต่อ)	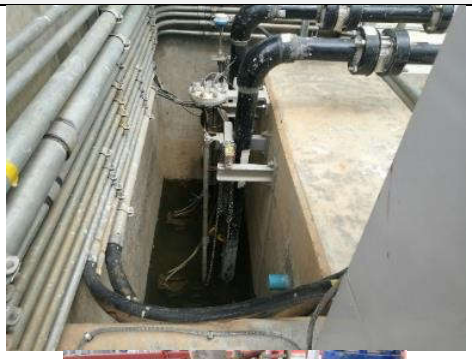 	ปั๊มสูบไปท่อ central Neutralization Vapor Pressure Relief/Vacuum Breaker Valve
ค-59		เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มีเปลือกหุ้มภายนอกเป็นโลหะ โครงเหล็ก และมีการต่อสายดินสำหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นโลหะ
ค-60	 	ป้ายเตือนให้ใส่หมวกนิรภัยก่อนเข้าเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รูปที่	รูป	มาตรการ / คำบรรยาย
ค-61	 	เก็บตัวอย่าง PM10 PM2.5 VOCs ปล่องระบายมลสาร Unit 9, 10, 12 และ 14 สำหรับ “โครงการวิจัยเชิงลึกในประเด็นคุณลักษณะและโอกาสในการเกิดผลกระทบของฝุ่น PM-10 ฝุ่น PM-2.5 และ โอโซน (Ozone) ในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” เริ่มดำเนินงานวิจัยแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ร่วมกับ รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค-62		ทีมวิจัย นำโดยศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน สำหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง การตกสะสมของสารกรดในดิน และความสามารถของดินในการรองรับสารกรด บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่ามีการตกสะสมของสารกรด
ค-63		โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ตารางที่ ค-1 การเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ และประชุมหมู่บ้าน ประจำเดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

เดือน	ข้อมูล	รูปภาพการประชุม
มกราคม	ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ	
กุมภาพันธ์	ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ	
มีนาคม	ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ	
เมษายน	ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ	
พฤษภาคม	ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ	
มิถุนายน	1. ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ 2. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ : ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ ชั้น 2	

ตารางที่ ค-2 แจ้งข่าวสารเรื่องคนที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทที่รับเหมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	รูปภาพ
มกราคม - มิถุนายน 2569	เนื่องด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จะดำเนินการจ้างเหมา และจัดซื้ออุปกรณ์ ประจำปี 2569 จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานอำเภอแม่เมาะ ตามนโยบายกระจายรายได้สู่ราษฎรในท้องถิ่น ในช่วงครึ่งปีหลังในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคมของทุกปี จึงยังไม่ได้ดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรกนี้	-

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

เดือน	รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม
มกราคม	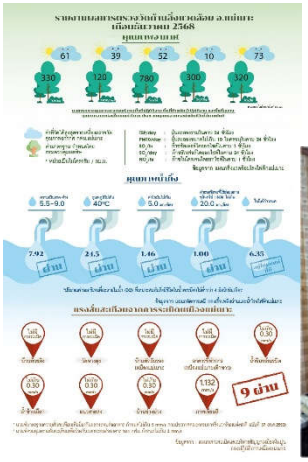
กุมภาพันธ์	

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

เดือน	รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม
	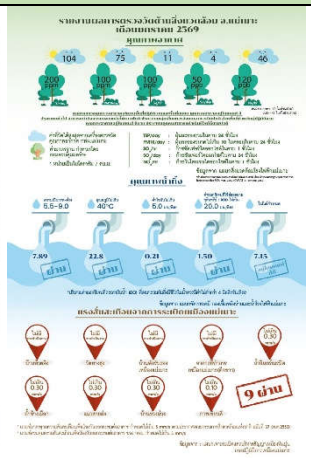
มีนาคม	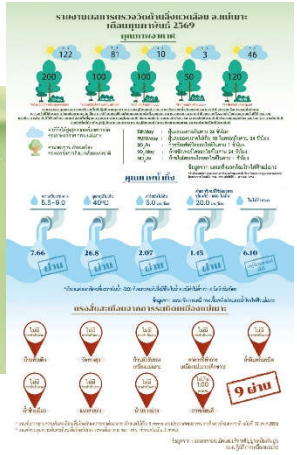

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

เดือน	รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม
เมษายน	
พฤษภาคม	

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

เดือน	รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม
	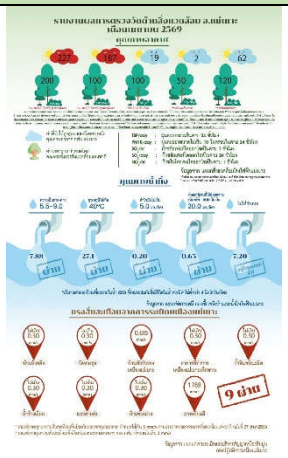
มิถุนายน	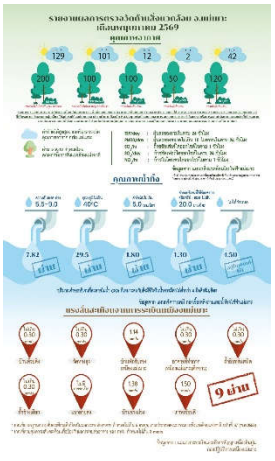

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
1.กิจกรรมด้านเยาวชนการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน		
มกราคม	1.ร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 อาทิ ของเล่นและขนม ให้กับหน่วยงาน และโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ อ.เมืองลำปาง 2. มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 3,000 บาท โดยมีนายมณฑล อินเจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) เป็นผู้รับมอบ 3.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ กีฬามหาสนุกครั้งที่ 13 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ	
กุมภาพันธ์	1.ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2569 “แม่เมาะคัพ” ครั้งที่ 18 โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน เปิดการแข่งขันฯ ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลแม่เมาะ 2.ร่วมกิจกรรม และมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "Open House ABMS" ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 25,000 บาท โดยมีนายมณฑล อินเจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) เป็นผู้รับมอบ	
มีนาคม	1.ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชากอล์ฟเบื้องต้น ประจำปี 2569	
เมษายน	1. วันที่ 9 เมษายน 2569 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดกิจกรรม EGAT Internship Journey : Learn Grow Empower รุ่นที่ 1/2569 ให้กับนักศึกษาฝึกงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน จำนวน 36 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและการทำงานในอนาคต	
พฤษภาคม	1.สนับสนุนการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนวัดบ้านแขม จำนวน 5,000 บาท 2.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.ลำปาง คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569” รอบคัดเลือกอำเภอแม่เมาะ ณ สนามกีฬาฟุตบอลลานฮอเหมืองแม่เมาะ ได้รับเกียรติจาก นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เป็นประธานในพิธี 3.ร่วมกิจกรรมและมอบงบประมาณสนับสนุน พิธีวันสถาปนาโรงเรียน	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
	ประชาราชวิทยา ครบรอบ 48 ปี จำนวน 3,000 บาท	
มิถุนายน	1.มอบงบประมาณสนับสนุนค่าน้ำมันรถขนเศษหินคลุกแก่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 3,000 บาท 2.ร่วมงาน 50 ปี แม่เมาะวิทยา พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียน และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 3.มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2569 จำนวน 120 ขวด แก่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และได้เยี่ยมชมบูทชุมนุม แกนนำ อย.น้อย โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ชมผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "สรรค์สร้างโลกใหม่ ไร้ยาเสพติด" การประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "Mae Moh Short & Sharp รู้เท่าทันยาเสพติด" ณ หอประชุมเตโชวัฒนา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา	
2. กิจกรรมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม		
มกราคม	1.ร่วมกับกองจิตอาสา มอบงบประมาณสนับสนุนงานทำบุญครบรอบชาตกาล 102 ปี พระครูสุนทรปัญญาคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดสบป้าด จำนวน 3,000 บาท ให้แก่วัดสบป้าด หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายสิงห์คาน มหามิตร (ผู้ใหญ่บ้านสบป้าด) เป็นผู้รับมอบ 2.ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์มณีนาแขม และฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสุเมธวรกิจ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ณ วัดนาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	
กุมภาพันธ์	1.มอบงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม จำนวน 3,000 บาท โดยมี นายสันต์ แก้วประเทศ เป็นผู้รับมอบ	
มีนาคม	1.ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุเจดีย์บารมีพบโชค ณ ที่พักสงฆ์ใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 2. ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดกอรวก ประจำปี 2569 3.ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2569 ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
เมษายน	1.ร่วมงาน และมอบงบประมาณสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าปิ้น วัดเมาะหลวง 2.ร่วมงาน และมอบงบประมาณสนับสนุนงานผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2569 สบทบทุนสร้างวิหารสำนักสงฆ์บ้านทาน 3.ร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ตำบลสบป้าด โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000 บาท 4.ร่วมเดินขบวนสงกรานต์ในกิจกรรมเมืองเมาะจุ้มสะหรี่ ป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ สวนสาธารณะดอกแขม ตำบลแม่เมาะ	
พฤษภาคม	1.ร่วมงานทำบุญโรงครัว สำนักสงฆ์เวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ	
มิถุนายน	1.ร่วมงานประเพณีเดือน 9 ใส่ขันดอกน้อมวันทา สักการะบูชาศาลหลักเมืองแม่เมาะ ประจำปี 2569 และประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ 2.ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์ บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดย กฟผ. ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000 บาท และกองจิตอาสา กผม1-ฟ. ร่วมทำบุญ จำนวน 2,000 บาท 3.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายพนม	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
	พร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งกล้วยโพธาราม	
3. กิจกรรมด้านสังคมและการเมืองเช่น กิจกรรมจิตอาสา การกุศลและสาธารณะประโยชน์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน		
มกราคม	1.ร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ-นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายบก) และทำแนวกันไฟ ณ บริเวณลานกางเต็นท์ม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2.ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอแม่เมาะ ครั้งที่ 70 ประจำพุทธศักราช 2569 "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" โดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 3.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช ผักตบชวา และขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 4.มอบผ้าห่มกันหนาวแก่สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 40 ผืน โดยมี พ.ต.อ.พินิจ เนตรปัญญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ	
กุมภาพันธ์	1.มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 50 ผืน, น้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค และปฏิทินปีใหม่ 2569 ให้กับอำเภองาว และกิ่งกาชาดอำเภองาวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ โดยมีนายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาวเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภองาว ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	
มีนาคม	1.ร่วมกิจกรรมมอบอาหารให้ช้างต้น ช้างสำคัญ และช้างในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2.ร่วมงานสานสัมพันธ์ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแลง ครั้งที่ 1 3.ร่วมงานวันนักข่าวของสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง โดยภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สื่อมวลชนจังหวัดลำปางที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง และในภาคค่ำร่วมพบปะสร้างสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
	จังหวัดลำปาง และสมาชิกสมาคมฯ ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง เพื่อนำรายได้จากการจัดงานเป็นสวัสดิการแก่ผู้สื่อข่าวในสังกัด และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ	
เมษายน	1.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2.คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวเด็บบี้ ดุสิตนานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายกฤษณะ พินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดลำปาง เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์และปีใหม่เมือง ประจำปี 2569	
พฤษภาคม	1.ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา และพิธีสูมาคารวะผู้อาวุโส หอการค้าจังหวัดลำปาง ประจำปี 2569 ณ วัดนาก่วมเหนือ 2.รดน้ำดำหัว และขอพรจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 3.รดน้ำดำหัวและขอพรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 4.ร่วมกิจกรรมและมอบงบประมาณสนับสนุนการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2569 จำนวน 2,000 บาท	
มิถุนายน	1.ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ (อาคารจำป่าแดด) 2.เข้าพบพันตำรวจเอกกฤษฎา พงษ์สุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะคาเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการสนับสนุนโครงการ	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
	ตำรวจพันธุ์ดี ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา 3.ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมเพิ่มพูลทักษะชีวิต รำลึกพระคุณครู ต้อนรับรุ่นน้อง มองความสำเร็จรุ่นพี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ณ อาคารสโมสรประชาคม อำเภอแม่เมาะ	
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ		
4.1 ส่งเสริมความรู้กลุ่มดูงานชีววิถีเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ชุมชน		
มกราคม	1.วันที่ 20 มกราคม 2569 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่โรงเรียน และชุมชน แก่คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนแม่สันวิทยา ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษา และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความยั่งยืน	
กุมภาพันธ์	1.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่โรงเรียน และชุมชน แก่คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 72 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษา และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความยั่งยืน	
มีนาคม	ไม่มีกิจกรรม	-
เมษายน	ไม่มีกิจกรรม	-
พฤษภาคม	ไม่มีกิจกรรม	-
มิถุนายน	1.วันที่ 15 มิถุนายน 2569 จัดกิจกรรม “โครงการชีววิถีสู่โรงเรียน” ณ โรงเรียนวัดบ้านแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยทีมงานได้ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ของศูนย์ฯ 2.วันที่ 19 มิถุนายน 2569 จัดกิจกรรม“โครงการชีววิถีสู่โรงเรียน” ณ	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
	โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ในการนี้ทางทีมงานโครงการชีววิถีสู่โรงเรียน ได้รวบรวมสิ่งของและงบประมาณสนับสนุนจากผู้ร่วมบริจาคในโครงการ “เติมเต็มอาหารกลางวัน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน โดยมีนายนิวัติ พอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ส้าน เป็นผู้รับมอบ โดยทีมงานได้ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ของศูนย์ฯ	
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ		
4.2 ส่งเสริมด้านอาชีพชุมชน ชีววิถีสู่ชุมชน และส่งเสริมการตลาด		
มกราคม	โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง กฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนมกราคม 2569 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 28-29 มกราคม 2569	
กุมภาพันธ์	โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง กฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2569	
มีนาคม	โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง กฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนมีนาคม 2569 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2569	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
เมษายน	โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง กฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนเมษายน 2569 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 28-29 เมษายน 2569	
พฤษภาคม	โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง กฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2569 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569	
มิถุนายน	โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง กฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2569 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2569	
4.3 แผนพัฒนาชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา		
มกราคม	โครงการนิคมชุมชนเกษตร : เตรียมข้อมูลเข้าที่ประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง	-
กุมภาพันธ์	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำวาระเรื่องขุดน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัน/เดือน/ปี	โครงการ	รูปภาพ
มีนาคม	โครงการนิคมชุมชนเกษตร : ติดตามความก้าวหน้าเรื่องการเจาะบ่อบาดาล และจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อขอใบอนุญาตดำเนินการเจาะบ่อบาดาล	
เมษายน	โครงการนิคมชุมชนเกษตร : ประสานความก้าวหน้าเรื่องการขุดเจาะบาดาล และวันที่ 29 เมษายน 2569 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ (เกษตรอินทรีย์) ครั้งที่ 2/2569 โดยเห็นชอบให้ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตำบลบ้านดง” เป็นผู้บริหารและดำเนินการโครงการต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป	
พฤษภาคม	โครงการนิคมชุมชนเกษตร : ดำเนินการเร่งรัดการขุดเจาะบาดาลให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2569	-
มิถุนายน	ส่งมอบ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตำบลบ้านดง” ให้ชุมชน เป็นผู้บริหารและดำเนินการโครงการต่อ	
4.4 กิจกรรมด้านสาธารณสุขและอนามัยชุมชน		
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน	จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจรักษา เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย และคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น และยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2569 ผู้มารับบริการทั้งสิ้น 2,895 ราย ออกหน่วยแพทย์ 27 ครั้ง	รูปภาพตามตารางที่ ค-8

ตารางที่ ค-5 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ/การประชุม/การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเช่น การจัดประชุม, อบรม, ศึกษาดูงาน, ลงพื้นที่ฯ

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	รูปภาพ
มกราคม	ไม่มีกิจกรรม	-
กุมภาพันธ์	ไม่มีกิจกรรม	-
มีนาคม	20 มีนาคม 2569 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการ “แอ่วผ่อ กฟผ. เติมต่อสิ่งแวดล้อมดี ๆ ตี้แม่เมาะบ้านเฮา” โดยมีการ บรรยาย เรื่องการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ ของ กฟผ. ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโรงไฟฟ้า (EHIA) และเหมืองแม่เมาะ (EIA) ตลอดจนบรรยายเรื่องแผนส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตต่าง ๆ และเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันดูแลเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อสงสัย โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

ตารางที่ ค-5 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ/การประชุม/การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเช่น การจัดประชุม, อบรม, ศึกษาดูงาน, ลงพื้นที่ฯ

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	รูปภาพ
	ระดับอำเภอ นำคณะฯ รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมพื้นที่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	
เมษายน	ไม่มีกิจกรรม	-
พฤษภาคม	ไม่มีกิจกรรม	-
มิถุนายน	ไม่มีกิจกรรม	-

ตารางที่ ค-6 กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	รูปภาพ
มกราคม	ไม่มีกิจกรรม	-
กุมภาพันธ์	ไม่มีกิจกรรม	-
มีนาคม	21 มีนาคม 2569 จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านสวนป่าแม่จางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำแนวกันไฟ การทำฝายชะลอน้ำ ฝายบกจากวัสดุธรรมชาติ และการบวชป่าหรือการบวชต้นไม้ ซึ่งเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าจากการประยุกต์พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชน ไม่มีใครกล้าทำลาย ช่วยป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำให้ต้นไม้มีโอกาสเติบโตและสร้างความชุ่มชื้นพื้นดินได้เต็มที่	
เมษายน	ไม่มีกิจกรรม	-
พฤษภาคม	ไม่มีกิจกรรม	-

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	รูปภาพ
มิถุนายน	1.วันที่ 16 มิถุนายน 2569 จัดกิจกรรมงานปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูสภาพเหมือง ประจำปี 2569 โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม 2.วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ตอนบน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ โดยมีคุณวีระศักดิ์ ทามิน (ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ) เป็นประธานในพิธีเปิด	

ตารางที่ ค-7 การเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	รูปภาพ
มกราคม	คณะเข้าศึกษาดูงาน 6 คณะ จำนวน 369 คน	 13 มกราคม 2569 คณะเสนาธิการทหารอากาศ
กุมภาพันธ์	คณะเข้าศึกษาดูงาน 6 คณะ จำนวน 297 คน	 2 กุมภาพันธ์ 2569 คณะโรงเรียนทหารการเงิน
มีนาคม	คณะเข้าศึกษาดูงาน 5 คณะ จำนวน 459 คน	 7 มีนาคม 2569 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

เมษายน	คณะเข้าศึกษาดูงาน 1 คณะ จำนวน 83 คน	 22 เมษายน 2569 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พฤษภาคม	คณะเข้าศึกษาดูงาน 2 คณะ จำนวน 53 คน	 23 พฤษภาคม 2569 คณะมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์แคโรไลนา USA
มิถุนายน	คณะเข้าศึกษาดูงาน 6 คณะ จำนวน 293 คน	 30 มิถุนายน 2569 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางฯ
รวมผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น 26 คณะ จำนวน 1,554 คน		

ตารางที่ ค-8 การจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2569
โดย กองการแพทย์แม่เมาะ

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย กองการแพทย์แม่เมาะ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กิจกรรมการตรวจรักษา
- กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ ท่าบริหารยืดเหยียด กล้ามเนื้อ การเก็บรักษายาและการใช้ยาอย่างปลอดภัย การให้ความรู้มลพิษจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
1	13 ม.ค. 69	ปงชัย	5	แม่เมาะ	155	
2	22 ม.ค. 69	ปงแท่น	1	นาสัก	80	
3	27 ม.ค. 69	สวนป่าแม่จาง	3	สบป้าด	62	
4	5 ก.พ. 69	หางฮุง	3	แม่เมาะ	29	
5	10 ก.พ. 69	ทาน (เช้า)	4	จางเหนือ	143	

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
6	10 ก.พ. 69	หาดประชาสามัคคี (บ่าย)	8	จางเหนือ	53	
7	12 ก.พ. 69	สวนป่าแม่เมาะ(เก่า)	7	บ้านดง	85	
8	17 ก.พ. 69	สบจาง	6	นาสัก	164	
9	19 ก.พ. 69	ใหม่นาแขม	7	แม่เมาะ	148	
10	24 ก.พ. 69	ปงต้นปิน	6	สบป้าด	100	
11	12 มี.ค. 69	หัวฝาย	1	บ้านดง	112	

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
12	17 มี.ค. 69	ชุมชนบ้านม่อนทุ่งกล้วย	8	แม่เมาะ	124	
13	19 มี.ค. 69	นาแช่	2	จางเหนือ	174	
14	24 มี.ค. 69	ห้วยคิง	6	แม่เมาะ	92	
15	2 เม.ย. 69	บ้านดง(เก่า)	2	บ้านดง	97	
16	9 เม.ย. 69	เมาะหลวง	8	แม่เมาะ	153	

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
17	23 เม.ย. 69	ข่วงม่วง	8	นาสัก	99	
18	7 พ.ค. 69	ใหม่ฉลองราช	8	สบป้าด	71	
19	12 พ.ค. 69	สบเติ๋น	2	สบป้าด	68	
20	14 พ.ค. 69	ใหม่ห้วยรากไม้	2	แม่เมาะ	62	
21	19 พ.ค. 69	จางเหนือพัฒนา	7	จางเหนือ	206	
22	21 พ.ค. 69	จำปุย	4	บ้านดง	72	

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
23	26 พ.ค. 69	วังตม	5	จางเหนือ	100	
24	4 มิ.ย. 69	นาสันติราษฎร์	6	จางเหนือ	109	
25	16 มิ.ย. 69	เวียงสวรรค์	9	แม่เมาะ	109	
26	18 มิ.ย. 69	ปางป๋วย	2	นาสัก	87	
27	23 มิ.ย. 69	นาสัก	4	นาสัก	141	
รวมทั้งหมด					**2,895**	

สถิติผู้มารับบริการ ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ มกราคม-มิถุนายน 2569 ผู้มารับบริการทั้งสิ้น 2,895 ราย ออกหน่วยแพทย์ จำนวน 27 ครั้ง พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล พร้อมกับกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

เอกสารที่ ค-1

คุณภาพอากาศ : บำรุงรักษาและดูแลการทำงานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ

แผนบำรุงรักษาระบบเครื่องมือวัด CEM

% ปิดงานใบสั่งงาน PM / CM

Work_Type	Open	Backlog	Cancel	Complete	NotClose	% Complete
APMO	165			165	57	100.00
Total	**165**			**165**	**57**	**100.00**

Order	LinkOrder	Date	Type	Location	Description	Craft	Status
MX1764594		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD20GH002	DCS FGD.Solid ReMOVal (Extension 20)	MMP0-1G0	TECO
MX1764593		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD20GH001	DCS FGD.Solid ReMOVal (Controller 20)	MMP0-1G0	TECO
MX1764596		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD21GH002	DCS FGD.Process Water (Extension 21)	MMP0-1G0	TECO
MX1764595		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD21GH001	DCS FGD.Process Water (Controller 21)	MMP0-1G0	TECO
MX1764597		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD22GH001	DCS FGD.Electrical (Controller 22)	MMP0-1G0	TECO
MX1764592		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD19GH002	DCS FGD.Dewatering (Extension 19)	MMP0-1G0	TECO
MX1764591		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD19GH001	DCS FGD.Dewatering (Controller 19)	MMP0-1G0	TECO
MX1764587		2026-05-25	APMO	MMP-T14CBD17GH001	DCS Controller and Extension 17-22	MMP0-1G0	TECO
MX1765141		2026-05-25	APMO	MMP-T14QUH10CQ004	CEMS SO2 Analzer	MMP0-1G0	TECO
MX1765144		2026-05-25	APMO	MMP-T14QUH10CQ007	CEMS O2 Analyzer	MMP0-1G0	TECO
MX1765152		2026-05-25	APMO	MMP-T14QUH10CF001	CEMS Flow Monitor	MMP0-1G0	TECO
MX1765143		2026-05-25	APMO	MMP-T14QUH10CQ006	CEMS CO2 Analyzer	MMP0-1G0	TECO
MX1765142		2026-05-25	APMO	MMP-T14QUH10CQ005	CEMS CO Analyzer	MMP0-1G0	TECO
MX1765140		2026-05-25	APMO	MMP-T14QUH10CQ003	CEMS Analyzer Nox, SO2, CO, CO2, O2	MMP0-1G0	TECO
MX1764999		2026-05-25	APMO	MMP-T14HTW30AN001-M01	BUF.In/Out Dmpr Outlet Guill Saf Motor 1-2	MMP0-1G0	TECO
MX1765150		2026-05-25	APMO	MMP-T14HTC12CP014	BUF#2 Stall Warning Diff.Pressure #2	MMP0-1G0	TECO
MX1765149		2026-05-25	APMO	MMP-T14HTC12CP013	BUF#2 Stall Warning Diff.Pressure #1	MMP0-1G0	TECO
MX1765151		2026-05-25	APMO	MMP-T14HTC12CP015	BUF#2 Stall Warning Absolute Pressure	MMP0-1G0	TECO

เอกสารที่ ค-1

รายงานการบำรุงรักษาและดูแลการทำงานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ Sampling Gas Inlet/Outlet

Flue Gas Outlet Calibration Report

วันที่ : 08/05/2025	Standard Gas		AS FOUND				AS LEFT			
AKS No. : 12WF19Q001	Zero Gas : N2	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	ERROR	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	ERROR
เครื่องวัด ABB URAS14	Cylinder No. 76431155013113								
Component SO2	Exp Date : -								
S/N : F-NO.3.415038.1	Analytical Accuracy		ppm	ppm	Accept Error < ±2%		ppm	ppm	Accept Error < ±2%
Range : 0 - 600 ppm	: Nitrogen Purity 99.99 %								
	Span Gas : 499 PPM	Zero	0.00	-2.00	-0.40	Zero	0.00	-	
ลักษณะงาน	Cylinder No. : EB0129014								
☐CM	Exp Date : 04-Nov-2027	Span	499.00	497.00	-0.40	Span	499.00	-	
☑PM ครั้งที่ 10 ของปี 2568	Analytical Accuracy :								

วันที่ : 08/05/2025	Standard Gas		AS FOUND				AS LEFT			
AKS No. : 12WF19Q004	Zero Gas : N2	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	ERROR	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	ERROR
เครื่องวัด ABB URAS14	Cylinder No. 76431155013113								
Component Nox	Exp Date : -								
S/N : F-NO.3.415038.1	Analytical Accuracy		ppm	ppm	Accept Error < ±2%		ppm	ppm	Accept Error < ±2%
Range : 0-1000 ppm									
	Span Gas : 798 PPM	Zero	0.00	-1.00	-0.13	Zero	0.00	-	
ลักษณะงาน	Cylinder No. : EB0129014								
☐CM	Exp Date : 04-Nov-2027	Span	798.00	794.00	-0.50	Span	798.00	-	
☑PM ครั้งที่ 10 ของปี 2568	Analytical Accuracy :								

วันที่ : 08/05/2025	Standard Gas		AS FOUND				AS LEFT			
AKS No. : 12WF19Q003	Zero Gas : N2	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	ERROR	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	ERROR
เครื่องวัด ABB URAS14	Cylinder No. 76431155013113								
Component CO	Exp Date : -								
S/N : F-NO.3.415038.1	Analytical Accuracy		ppm	ppm	Accept Error < ±2%		ppm	ppm	Accept Error < ±2%
Range : 0-1200 ppm	: Nitrogen Purity 99.99 %								
	Span Gas : 996 PPM	Zero	0.00	1.00	0.10	Zero	0.00	-	
ลักษณะงาน	Cylinder No. : EB0129014								
☐CM	Exp Date : 04-Nov-2027	Span	996.00	994.00	-0.20	Span	996.00	-	
☑PM ครั้งที่ 10 ของปี 2568	Analytical Accuracy :								

วันที่ : 08/05/2025	Standard Gas		AS FOUND				AS LEFT			
AKS No. : 12WF19Q004	Zero Gas : N2	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	%ERROR	INPUT %(FS)	STD GAS Value	Indication Value	%ERROR
เครื่องวัด ABB MAGNOS 106	Cylinder No. 76431155013113								
Component O2	Exp Date : -								
S/N : F-NO.3.359846.3	Analytical Accuracy		Vol %	Vol %	Accept Error < ±2%		Vol %	Vol %	Accept Error < ±2%
Range : 0-25 Vol %	: Nitrogen Purity 99.99 %								
	Span Gas : 21VOL%	Zero	0.00	0.02	0.10	Zero	0.00	-	
ลักษณะงาน	Cylinder No. : 5899								
☐CM	Exp Date : 8-Aug-2025	Span	21.00	21.03	0.14	Span	21.00	-	
☑PM ครั้งที่ 10 ของปี 2568	Analytical Accuracy :								

สรุปผลการสอบเทียบและปรับแต่ง

☑ อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์สมรรถนะ

☐ อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์สมรรถนะ

☐ แก้ไขโดย _____

หมายเหตุ _____

% error (Zero) = Indication Value - Standard Value*100 / span

% error (Span) = Indication Value - Standard Value*100 / standard Value

ผู้ปฏิบัติงาน ธีตินันท์ ผ่องอำไพ

(น.ส. ธีตินันท์ ผ่องอำไพ)

ผู้รับรอง นที ลีดิษยากรณ์

(นายนที ลีดิษยากรณ์)

MF-00-MM36-00-03-02/Rev.01

เอกสารที่ ค-1

แผนบำรุงรักษาระบบ ESP SCR และ FGD โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

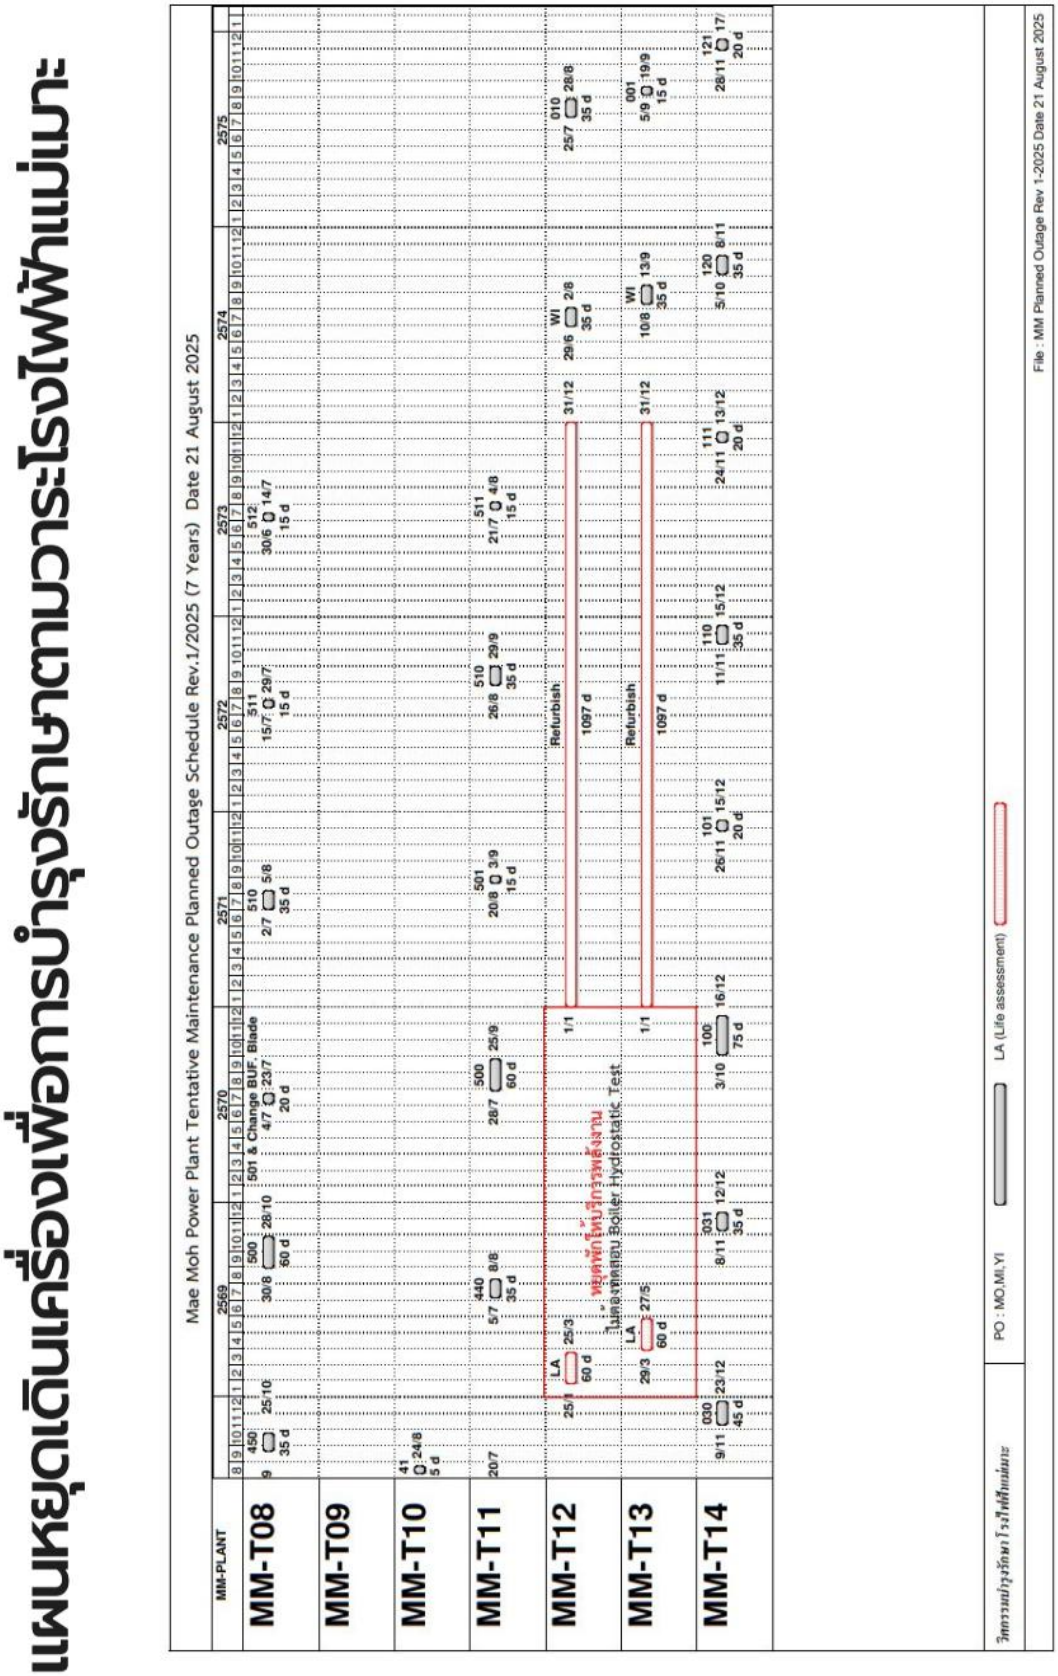

เอกสารที่ ค-1

เอกสารควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 ธ.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	1/12

กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง
ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 ส.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	5/12

POWER SERVICES BOILER	Commissioning Procedure Unit 08, 09, 10, 11	CONTRACT NO.: 3000001316 (ZLVA) 5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOH, THAILAND	
	DOCUMENT NO. 8900C Commissioning Procedure-UM10	Page 16 of 35	
	Revision No. 06	Date 17 June 2016	

Total Main Steam Flow, kg/s	0	80	132	199	265
Pre-Modification Windbox to Furnace Δp, mmWG	58	58	150	150	150
Windbox/Furnace Δp, mmWG	58	58	120	120	120

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligation or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant, for any errors or delays in the information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at any time without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 มี.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	6/12

POWER SERVICES BOILER	Commissioning Procedure Unit 08, 09, 10, 11	CONTRACT NO.: 7000001316 (ZLVA) 5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOH, THAILAND
	DOCUMENT NO. B900C Commissioning Procedure-U#10	Page 17 of 35
	Revision No. 06	Date 17 June 2016

Total Main Steam Flow, kg/s	0	75	150	200	225	230	265
Pre-Modification O2 Curve, %	12	12	4	4	2.7	2.7	2.7
Recommended O2 Curve, %	12	12	4.5	4.5	3.6	3.5	3.5
Total Main Steam Flow (Post Modi, kg/s	0	75	150	200	225	265	
Post-Modification O2 Curve, %	12	12	4.5	4.5	3.6	3.5	

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligation or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant, for any errors or delays in the information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at any time without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.

เอกสารที่ ค-1

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 ส.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	7/12

POWER SERVICES BOILER	Commissioning Procedure Unit 08, 09, 10, 11	CONTRACT NO.: 3000001316 (ZLVA) 5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOH, THAILAND	
		DOCUMENT NO. 8900C Commissioning Procedure-UM10	Page 18 of 35
		Revision No. 06	Date 17 June 2016

Feeder Speed, T/H	0	20	48	80
Pre-Modification Fuel Air Damper Position, %	20	20	100	100
Fuel Air Damper Position, %	20	20	55	55

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligation or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant, for any errors or delays in the information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at any time without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.

เอกสารที่ ค-1

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 มี.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	8/12

POWER SERVICES
BOILER

Commissioning Procedure
Unit 08, 09, 10, 11

CONTRACT NO.: 3000001316 (ZLVA)
5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOH, THAILAND

DOCUMENT NO.: 8900C Commissioning Procedure-UM10 | Page 19 of 35
Revision No. 06 | Date 17 June 2016

Load (Actual MW)	100	200	300	350
Pre-Modification Auxiliary Air CFS Damper Position, % (when Pulveriser 5 not in-service)	0	0	0	0
Auxiliary Air CFS Damper Position, % (when Pulveriser 5 not in-service)	0	0	20	20

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligation or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant, for any errors or delays in the information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at any time without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 ก.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	10/12

POWER SERVICES
BOILER

Commissioning Procedure
Unit 08, 09, 10, 11

CONTRACT NO.: 3000001316 (ZLVA)
5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOH, THAILAND

DOCUMENT NO. 89000: Commissioning Procedure-U#10 | Page 21 of 35

Revision No. | 06 | Date | 17 June 2016

Total Main Steam Flow, kg/s	0	125	140	170	220	265
Lower SOFA2 Damper Position, % (Top damper)	0	0	8	25	40	40
Lower SOFA1 Damper Position, % (Bottom Damper)	0	0	8	22	35	35

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligation or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant, for any errors or delays in the information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at any time without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.

เอกสารที่ ค-1

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 ส.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	11/12

POWER SERVICES
BOILER

Commissioning Procedure
Unit 08, 09, 10, 11

CONTRACT NO.: 3000001316 (2LVA)
5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOH, THAILAND

DOCUMENT NO. B900C Commissioning Procedure-U#10 | Page 22 of 35

Revision No. 06 | Date 17 June 2016

Total Main Steam Flow, kg/s	0	125	150	200	220	265
CCOFA Damper Position, %	0	0	0	15	35	35

MMPP-10 Total Air Flow Curve

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligations or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant, for any errors or delays in the information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at anytime without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.

เอกสารที่ ค-1

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 ส.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	12/12

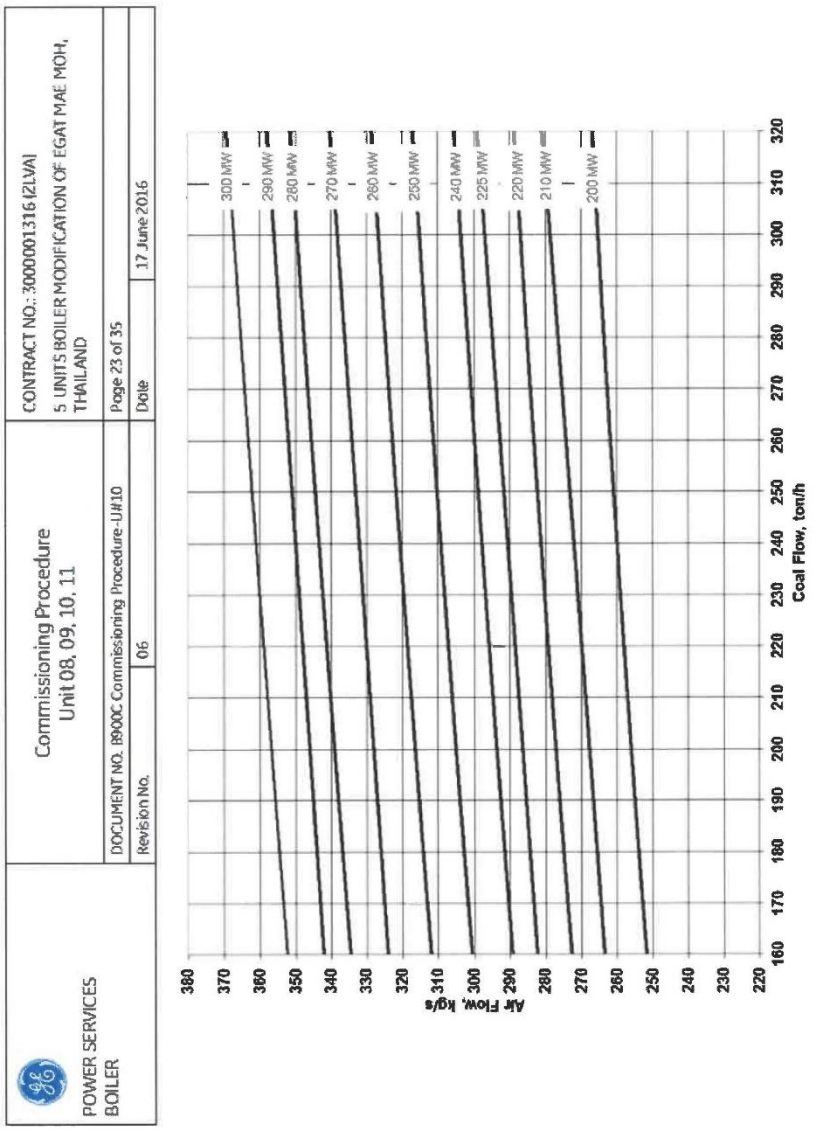

เอกสารที่ ค-1

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	วิธีปฏิบัติ / ข้อแนะนำ	หมายเลขเอกสาร :	MIS-00-OP25-00-10
	เรื่อง ข้อแนะนำกรณีเดินเครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO	การแก้ไขครั้งที่ :	0
		วันที่เริ่มใช้ :	24 ธ.ค. 2560
	จัดทำโดย : หปภม2-ฟ.	แผ่นที่ :	9/12

POWER SERVICES
BOILER

Commissioning Procedure
Unit 08, 09, 10, 11

CONTRACT NO.: 3000001316 (ZLVA)
5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOH, THAILAND

DOCUMENT NO. B900C Commissioning Procedure-UM10 | Page 20 of 35
Revision No. 06 | Date 17 June 2016

Total Main Steam Flow, kg/s	0	125	140	170	220	265
Upper SOFA2 Damper Position, % (Top damper)	0	0	8	25	50	50
Upper SOFA1 Damper Position, % (Bottom damper)	0	0	8	25	40	45
%MCR	0.0	47	57	75	83	100

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligation or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant. For any errors or delays in the information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at any time without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.

เอกสารที่ ค-1

ผลการควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องระบายมลสารทางอากาศ (MM-T14)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

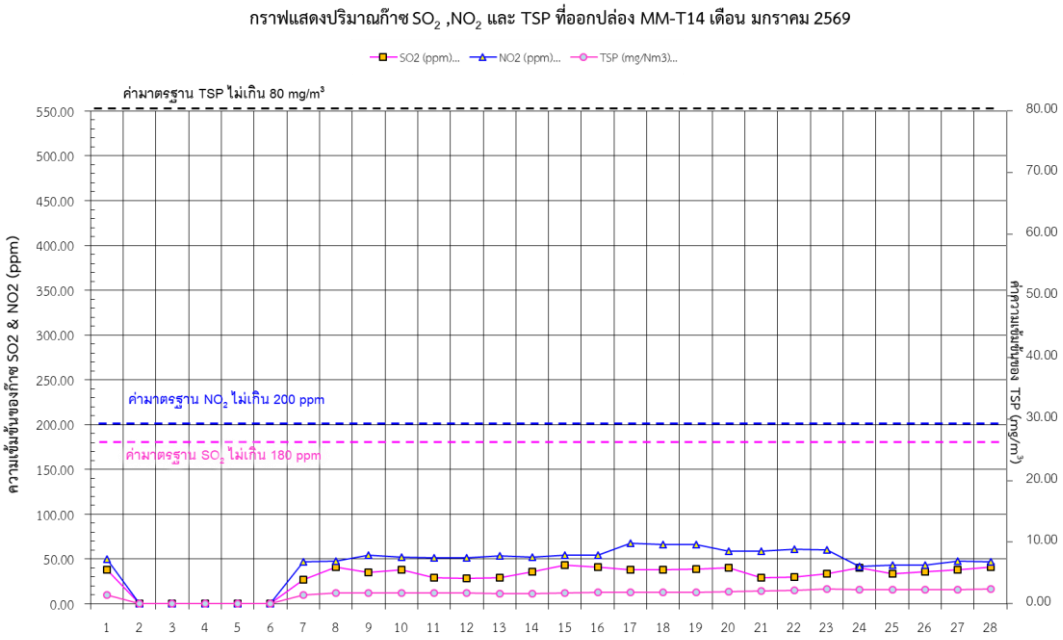

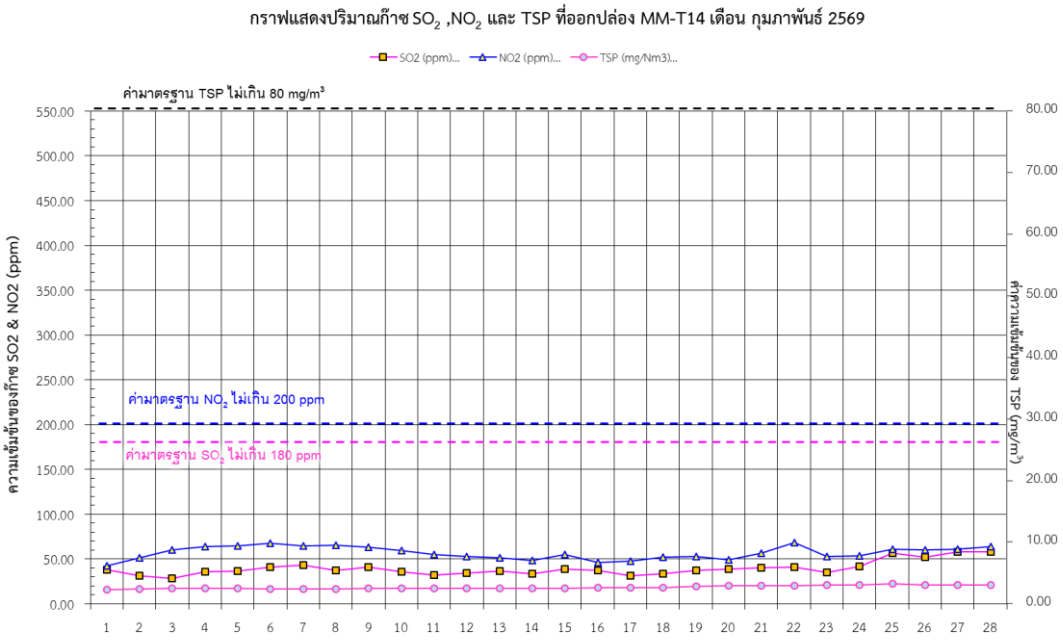

เอกสารที่ ค-1

กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 ,NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน มีนาคม 2569

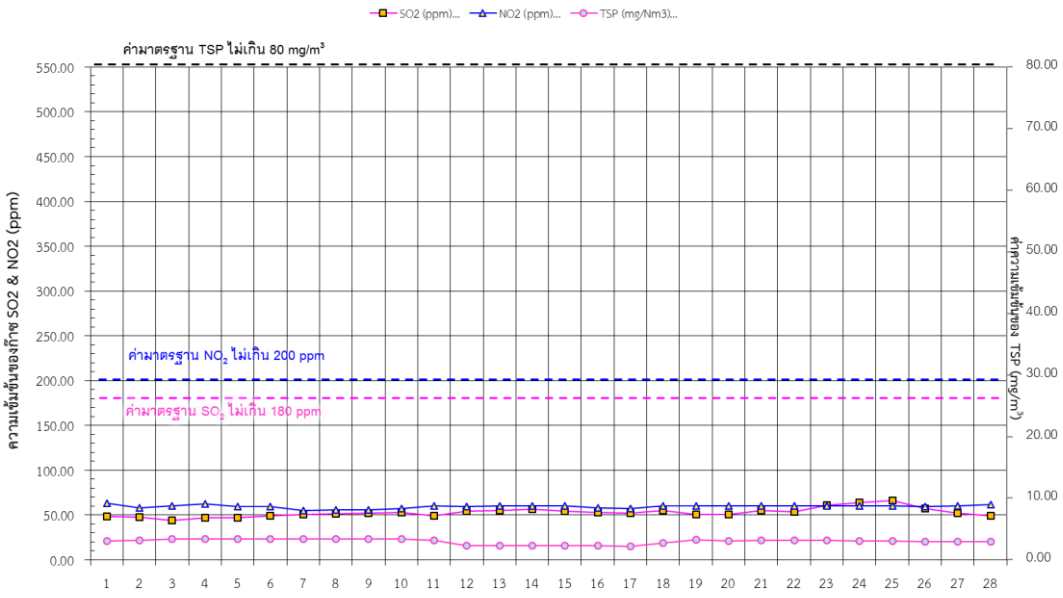

กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 ,NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน เมษายน 2569

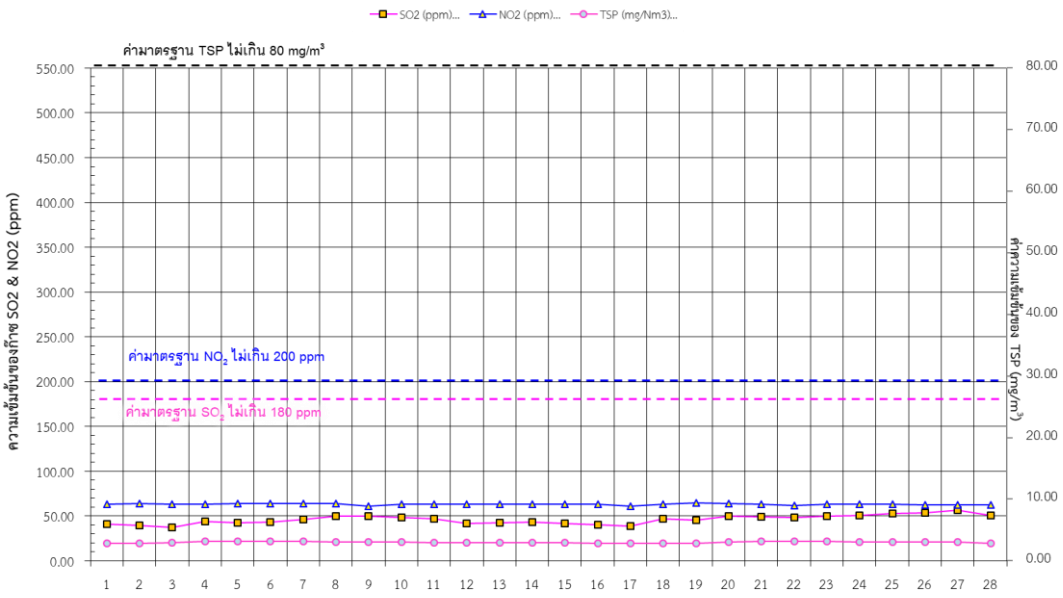

เอกสารที่ ค-1

กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 ,NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน พฤษภาคม 2569

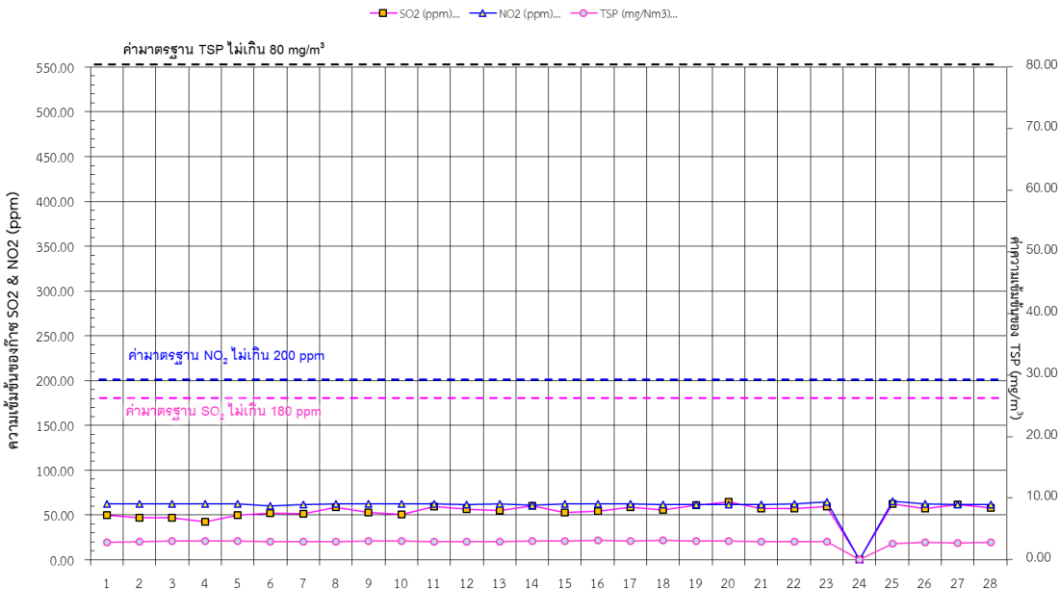

กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 ,NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน มิถุนายน 2569

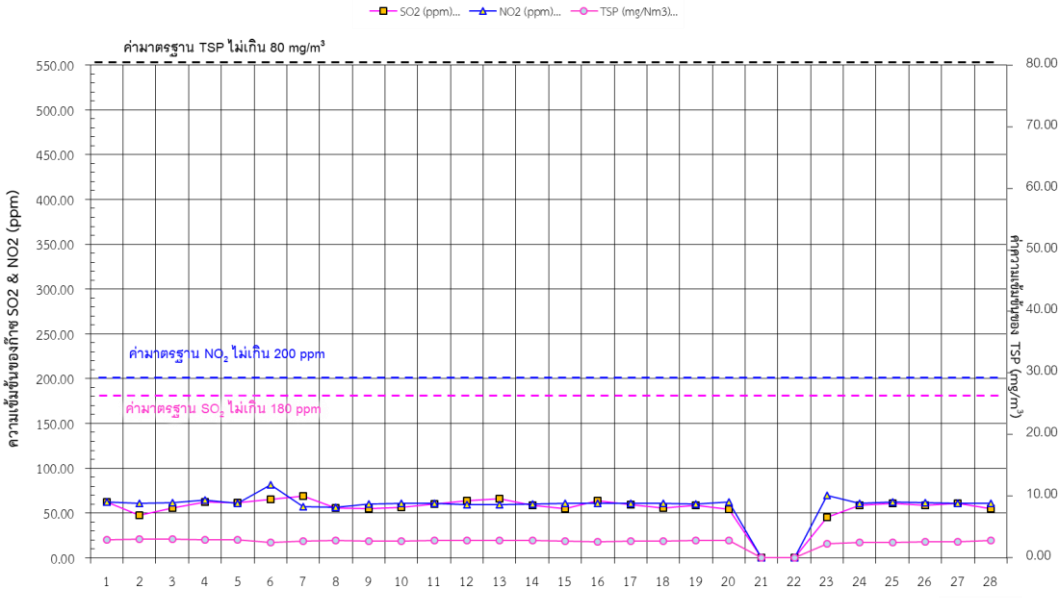

เอกสารที่ ค-1

ควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์ โดยควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้
และอัตราส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิง

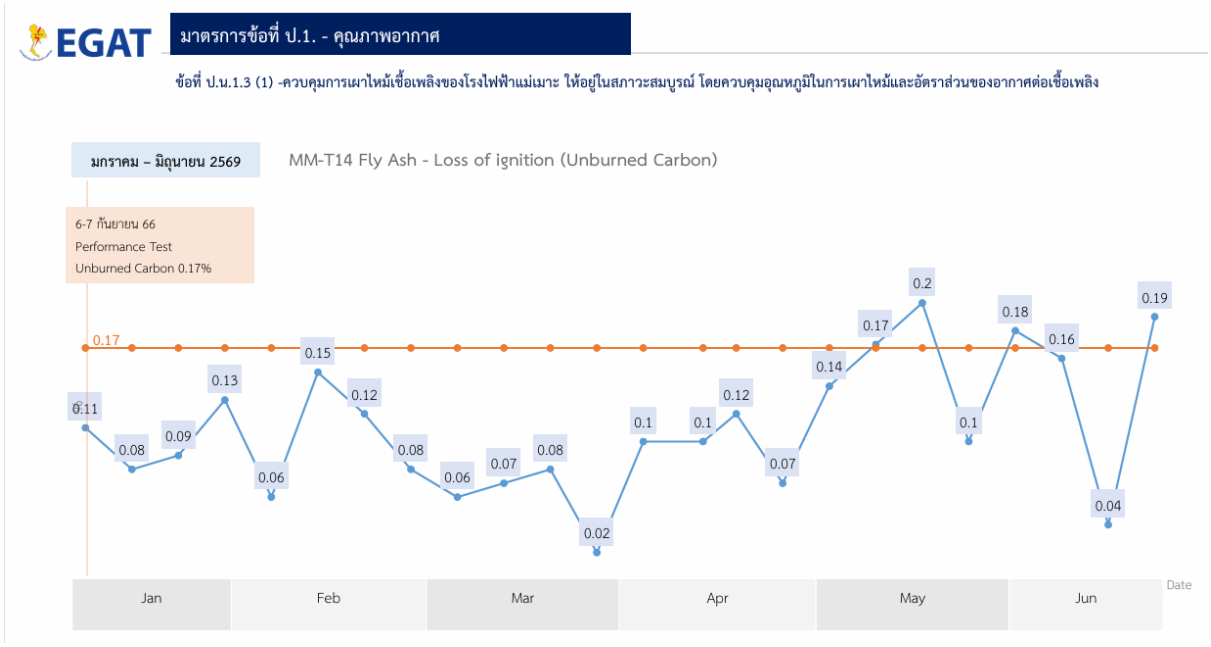

เอกสารที่ ค-2

แผนดำเนินการตรวจวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ประจำปี พ.ศ. 2569

แผนปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

ชื่อแผน	แผนงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน	เพื่อประเมิน ควบคุมและป้องกันสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน	% ความก้าวหน้าของการตรวจวัด	100%
ผู้รับผิดชอบของแผน	หปอม-ฟ.	สภาพแวดล้อมตามแผน	

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรมรองรับและสิ่งที่ต้องดำเนินการ	เกณฑ์น้ำหนักของแต่ละกิจกรรม (%)		ปี 2569												ปี 2570			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1	การตรวจวัดความดังเสียงและรายงาน	แผน	4		0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					วท.บุชิตา
		จริง																	
2	การตรวจวัดความดังเสียงสะสมและรายงาน	แผน	5					5											วท.บุชิตา
		จริง																	
3	การตรวจวัดแสงสว่างและรายงาน	แผน	11					11											วท.บุชิตา
		จริง																	
4	การตรวจวัดแสงสว่างกลางคืนและรายงาน	แผน	6					6											วท.บุชิตา
		จริง																	
5	การตรวจวัดความร้อนและรายงาน	แผน	4					4											วท.บุชิตา
		จริง																	
6	การตรวจวัดรังสีและรายงาน	แผน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				วท.บุชิตา
		จริง																	
7	การตรวจวัดรังสีรั่วไหลและรายงาน	แผน	4						2	2									วท.บุชิตา
		จริง																	
8	การตรวจวัดไอระเหยสารเคมีและรายงาน	แผน	7					7											วท.บุชิตา
		จริง																	
9	การตรวจวัดฝุ่น Respirable dust แบบพื้นที่และรายงาน	แผน	7					7											วท.บุชิตา
		จริง																	

เอกสารที่ ค-2

แผนการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2569

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปี.....2569.....

- ☒ การตรวจวัดแสง
- ☐ การตรวจวัดเสียง
- ☐ การตรวจวัดความร้อน
- ☐ การตรวจวัดไอระเหยสารเคมี
- ☐ การตรวจวัดเสียงสะสม
- ☐ การตรวจวัดรังสี
- ☐ การตรวจวัดฝุ่น Respirable Dust
- ☐ การตรวจวัดก๊าซ
- ☐ การตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์เครื่องปรับอากาศ
- ☐ การตรวจวัดความทึบแสงของฝุ่นด้วยเครื่อง Smoke Opacity Meter
- ☐ อื่นๆ .....

สถานที่	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
กปชม-ฟ., กปถม-ฟ.												
กบรม5-ฟ., กปฟร-ธ.												
กบพม-บ., กยธม-ฟ., กบหม-ฟ.												
กผม1-ฟ., กผม2-ฟ.												
กจพม-ห., กอน-ห.												
กชนม-ฟ.												
กบรม1-ฟ., กบรม2-ฟ.												
กบรม3-ฟ., กบรม4-ฟ.												
อื่นๆ												

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ห้อง ชฟฟ2., อฟม., อรม., BDx, หปอม-ฟ., หบดน1-ห., หสลม-ฟ., หรปม-ฟ., หชฟม-ย., โรงอาหาร

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ
(นางสาวนุชิดา หุนศรีสกุล)	(นายยุทธนา ศรีหิรัญ)
ตำแหน่ง วท. 7 หปอม-ฟ.	ตำแหน่ง ช.อฟม-1.
วันที่	วันที่

ต้นฉบับ - หปอม-ฟ.

สำเนา - หน่วยงาน

MF-00-ASS-02-01/Rev.06

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปี.....2569.....

- ☒ การตรวจวัดแสงกลางคืน
- ☐ การตรวจวัดเสียง
- ☐ การตรวจวัดความร้อน
- ☐ การตรวจวัดไอระเหยสารเคมี
- ☐ การตรวจวัดเสียงสะสม
- ☐ การตรวจวัดรังสี
- ☐ การตรวจวัดฝุ่น Respirable Dust
- ☐ การตรวจวัดก๊าซ
- ☐ การตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์เครื่องปรับอากาศ
- ☐ การตรวจวัดความทึบแสงของฝุ่นด้วยเครื่อง Smoke Opacity Meter
- ☐ อื่นๆ .....

สถานที่	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
กปชม-ฟ., กปถม-ฟ.												
กชนม-ฟ.												
กผม1-ฟ., กผม2-ฟ.												

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ
(นางสาวนุชิดา หุนศรีสกุล)	(นายยุทธนา ศรีหิรัญ)
ตำแหน่ง วท. 7 หปอม-ฟ.	ตำแหน่ง ช.อฟม-1.
วันที่	วันที่

ต้นฉบับ - หปอม-ฟ.

สำเนา - หน่วยงาน

MF-00-ASS-02-01/Rev.06

- กฟผ. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะดำเนินการตรวจวัดแสงสว่าง ประมาณ ช่วงเดือน สิงหาคม 2569

เอกสารที่ ค-2

แนบจำแนกประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนตัว

การประเมินผลการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สภาพการใช้งาน การจัดเก็บ การบำรุงรักษา

หมวดงาน ...ความปลอดภัย..... แผนก ...หปอม-ฟ..... กอง ....-..... ฝ่าย ...อฟม.....

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

หัวข้อการประเมิน	พิจารณาจากลักษณะงานที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล																						รวม	คิดเป็นร้อยละ (%)
	ศีรษะ		ใบหน้า / ดวงตา		การได้ยิน		ลำตัว		มือ / แขน		ขา / เท้า		การหายใจ		ตกจากที่สูง		อื่นๆ(ระบุ)							
1. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่ / จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องสวมใส่	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0					8/8	100
2. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่ถูกวิธี / จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0					8/8	100
3. สภาพอุปกรณ์ป้องกันฯพร้อมใช้งาน / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่สวมใส่	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0					8/8	100
4. การจัดเก็บที่ดี / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่จัดเก็บ	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0					8/8	100
5. การบำรุงรักษา "การทำความสะอาด" / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่จัดเก็บ	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0					8/8	100
6. การบำรุงรักษา "การเปลี่ยนชิ้นส่วน" / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่จัดเก็บ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0/0	-
รวม	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0						

หมายเหตุ : รายงานทุก 2 เดือน โดยหัวหน้างาน นำเสนอ หัวหน้าแผนก

ต้นฉบับ : หน่วยงาน

สำเนา : หปอม-ฟ.

ผู้รายงาน ปรารถนา วงศ์คำ (หัวหน้างาน)

(นางสาวปรารถนา วงศ์คำ)

วันที่ 29 / 1 / 69

ผู้ทบทวน ..... หัวหน้าแผนก

(นางสาวจุไรรัตน์ ธีไหล)

วันที่ 30 / 01 / 69

เอกสารที่ ค-2

แผนซ่อมบำรุงยานพาหนะ เพื่อลดโอกาสของการเกิดเสียงดัง

แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ			ปีงบประมาณ 2569
ชื่อแผน	แผนการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย
วัตถุประสงค์	รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	ผลสำเร็จของงานบำรุงรักษาตามแผน	100%
ผู้รับผิดชอบแผน	หบคม-ฟ.		

กิจกรรม		น้ำหนัก	ปีงบประมาณ 2568												ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0926 รถดับเพลิง		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance หรปม-ฟ		-													
1.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
1.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
1.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำPM	แผน	10					5						5		
	จริง	5					5								
2. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0927 รถดับเพลิง		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance หรปม-ฟ		-													
2.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
2.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่องทำ PM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
2.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำ PM	แผน	10					5						5		
	จริง	5					5								
3. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0957 รถพยาบาล		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance กอน-ห		-													
3.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	4	2						2						
	จริง	2	2												
3.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM	แผน	4	2						2						
	จริง	2	2												
3.3 นำรถบัสพยาบาล เข้าทำ PM	แผน	12		6						6					
	จริง	-													
4. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0905 รถเก็บขยะ		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance กยธม-ฟ.		-													
4.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	4			2						2				
	จริง	2			2										
4.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่องทำ PM	แผน	4			2						2				
	จริง	2			2										
4.3 นำรถขยะ 03-0905 เข้าทำPM	แผน	10				5						5			
	จริง	5				5									
5. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0906 รถเก็บขยะ		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance กยธม-ฟ		-													
5.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	4					2						2		
	จริง	2					2								
5.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM	แผน	4					2						2		
	จริง	2					2								
5.3 นำรถขยะ 03-0906 เข้าทำPM	แผน	10						5						5	
	จริง	5						5							
เป้าสะสม		**100**	**4**	**10**	**14**	**31**	**45**	**50**	**54**	**60**	**64**	**81**	**95**	**100**	
ผลการดำเนินการจริงสะสม		**44**	**4**	**4**	**8**	**25**	**39**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	

เดือน	เป้าหมาย	ค่าจริง	คำอธิบายผลการดำเนินการ
มกราคม	4	4	ออกเรื่องทำpmรถพยาบาล
กุมภาพันธ์	10	4	รถพยาบาลติดงานเตรียม โรงไฟฟ้า 12,13
มีนาคม	14	8	ออกเรื่อง ทำpm รถขยะ 03-0905
เมษายน	31	25	ทำpm รถขยะ และออกเรื่องpm รถดับเพลิง 03-0926 03-0927
พฤษภาคม	45	39	ทำpm รถดับเพลิง 03-0926 03-0927 และตรวจเช็คทั่วไป และออกเรื่องทำpmรถขยะ 03-0906
มิถุนายน	50	44	ทำpm รถขยะ 03-0906 และตรวจเช็คระบบHYD
กรกฎาคม	54	44	
สิงหาคม	60	44	
กันยายน	64	44	
ตุลาคม	81	44	
พฤศจิกายน	95	44	
ธันวาคม	100	44	

เอกสารที่ ค-3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงานการบริการงานบำรุงรักษาของกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หมายเลขเอกสาร	: MP-00-CMC-01
	เรื่อง การบริการบำรุงรักษาของกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	การแก้ไขครั้งที่	: 01
		วันที่เริ่มใช้	: - 9 S.A. 2558
	จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารงานคุณภาพ บจย-ฟ.	แผ่นที่	: 1 of 12

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

การบริการงานบำรุงรักษาของกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การคมนาคม

ตัวอย่างแผนทำ PM ยานพาหนะ

แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ			ปีงบประมาณ 2569
ชื่อแผน	**แผนการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ**	**ดัชนีชี้วัด**	**เป้าหมาย**
วัตถุประสงค์	**รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า**	**ผลสำเร็จของงาน บำรุงรักษาตามแผน**	**100%**
ผู้รับผิดชอบแผน	**หบคม-ฟ.**		

กิจกรรม		น้ำหนัก	ปีงบประมาณ 2569												ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0926		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance หรปม-ฟ		-													
1.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
1.2 งานยานพาหนะ ออกเรือง ทำPM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
1.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำPM	แผน	10					5						5		
	จริง	5					5								
2. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0927		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance หรปม-ฟ		-													
2.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
2.2 งานยานพาหนะ ออกเรืองทำ PM	แผน	6				3						3			
	จริง	3				3									
2.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำ PM	แผน	10					5						5		
	จริง	5					5								
3. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0957		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance กอน-ห		-													
3.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	4	2						2						
	จริง	2	2												
3.2 งานยานพาหนะ ออกเรือง ทำPM	แผน	4	2						2						
	จริง	2	2												
3.3 นำรถบัสพยาบาล เข้าทำ PM	แผน	12		6						6					
	จริง	-													
4. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0905 รถเก็บขยะ		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance กยธม-ฟ.		-													
4.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	4			2						2				
	จริง	2			2										
4.2 งานยานพาหนะ ออกเรืองทำ PM	แผน	4			2						2				
	จริง	2			2										
4.3 นำรถขยะ 03-0905 เข้าทำPM	แผน	10				5						5			
	จริง	5				5									
5. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0906 รถเก็บขยะ		-													นกรณ์ ทองบ่อ
Preventive Maintenance กยธม-ฟ		-													
5.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM	แผน	4					2						2		
	จริง	2					2								
5.2 งานยานพาหนะ ออกเรือง ทำPM	แผน	4					2						2		
	จริง	2					2								
5.3 นำรถขยะ 03-0906 เข้าทำPM	แผน	10						5						5	
	จริง	5						5							
เป้าสะสม		**100**	**4**	**10**	**14**	**31**	**45**	**50**	**54**	**60**	**64**	**81**	**95**	**100**	
ผลการดำเนินการจริงสะสม		**44**	**4**	**4**	**8**	**25**	**39**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	

เดือน	เป้าหมาย	ค่าจริง	คำอธิบายผลการดำเนินการ
มกราคม	4	4	ออกเรื่องทำpmรถพยาบาล
กุมภาพันธ์	10	4	รถพยาบาลติดงานเตรียม โรงไฟฟ้า 12,13
มีนาคม	14	8	ออกเรื่อง ทำpm รถขยะ 03-0905
เมษายน	31	25	ทำpm รถขยะ และออกเรื่องpm รถดับเพลิง 03-0926 03-0927
พฤษภาคม	45	39	ทำpm รถดับเพลิง 03-0926 03-0927 และตรวจเช็คทั่วไป และออกเรื่องทำpmรถขยะ 03-0906
มิถุนายน	50	44	ทำpm รถขยะ 03-0906 และตรวจเช็คระบบHYD
กรกฎาคม	54	44	
สิงหาคม	60	44	
กันยายน	64	44	
ตุลาคม	81	44	
พฤศจิกายน	95	44	
ธันวาคม	100	44	

เอกสารที่ ค-3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การคมนาคม

ตัวอย่างเอกสารตรวจสภาพยานพาหนะก่อนการใช้งาน

รายการตรวจอุปกรณ์ก่อนการใช้งานสำหรับ
รถลาดยาง รถผสมคอนกรีต รถขุด รถบรรทุกน้ำ รถตัก รถแทรกเตอร์, FORK LIFT
รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องปั้มลม และรถอื่นๆ

สังกัด (ฝ่าย/กอง/แผนก) .....อฟม./....-.../หสลม-ฟ.....				ชื่อรถ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กฟผ.02-4094 ฟม.(นข7631)
ลำดับ	**รายการตรวจสอบ**	**ปกติ**	**ผิดปกติ**	**หมายเหตุ**
1.	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
2.	ระดับความร้อน	✓		
3.	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	✓		
4.	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
5.	ระดับน้ำมันเบรก	✓		
6.	ระดับน้ำมันครัชท์	✓		
7.	ความดันลมยาง	✓		
8.	อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		
9.	ระบบไฟฟ้า	✓		
10.	ไฟแสงสว่าง ไฟเลี้ยว ไฟหรี่ ไฟเบรก ไฟถอย	✓		
11.	มาตรวัดต่างๆ หรือสัญญาณเตือน	✓		
12.	ระบบช่วงล่าง	✓		
13.	ถังดับเพลิง	✓		
14.	ทำความสะอาด (ล้าง&ดูดฝุ่น)	✓		
15.	อื่นๆ			

ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
เพิ่มเติม.....
.....
.....
.....

รายงานความเสียหาย (โปรดระบุความเสียหายที่ปรากฏก่อนการใช้งานประจำ).....
.....
.....
.....

ผู้ตรวจสอบ.....สากล แสนอุส่าห์.....
(...นายสากล แสนอุส่าห์.....)
วันที่ตรวจสอบ.....20/01/2569.....

* ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ ส่งผู้จัดการแผนกจัดเก็บเป็นบันทึกของหน่วยงาน

MF-00-ASC-44-06/Rev.02

เอกสารที่ ค-4

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การคมนาคม

คู่มือการทำงาน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านจราจร (อุบัติเหตุหมู่)

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	คู่มือการทำงาน	หมายเลขเอกสาร	: MI-00-SES-00-03
	เรื่อง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านจราจร (อุบัติเหตุหมู่)	การแก้ไขครั้งที่	: 00
		วันที่เริ่มใช้	: - 1 ก.ค. 2562
	จัดทำโดย : แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	แผ่นที่	: 1/9

กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านจราจร (อุบัติเหตุหมู่)

เอกสารที่ ค-5

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การใช้น้ำ

คู่มือการทำงาน แผนฉุกฉินรองรับภัยแล้ง

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	คู่มือการทำงาน	หมายเลขเอกสาร	: MI-00-ASS-07-11
	เรื่อง แผนฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง	การแก้ไขครั้งที่	: 01
		วันที่เริ่มใช้	15 มี.ค. 2562
	จัดทำโดยโดย : แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	แผ่นที่	: 1/45

กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

แผนฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง

เอกสารที่ ค-6

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ตารางการปล่อยน้ำผ่าน Irrigation Gate จากอ่างเก็บน้ำแม่จาง ปี 2566-มิถุนายน 2569

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

เดือน	**ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 66**	**ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 67**	**ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 68**	**ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 69**
ม.ค.	0	0	0	0
ก.พ.	181,800	0	0	0
มี.ค.	0	0	0	0
เม.ย.	282,000	697,200	1,648,800	604,800
พ.ค.	86,400	0	2,579,701	0
มิ.ย.	190,800	0	2,592,000	0
ก.ค.	0	0	2,592,000	
ส.ค.	817,200	359,710	2,678,400	
ก.ย.	251,400	2,539,800	2,678,400	
ต.ค.	0	0	1,418,400	
พ.ย.	0	0	0	
ธ.ค.	0	0	0	

เอกสารที่ ค-7

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

คู่มือการทำงาน งานขุดลอกตะกอนขี้เถ้าจากบ่อดักตะกอน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	คู่มือการทำงาน	หมายเลขเอกสาร : MI-00-CVD2-00-02
	เรื่อง งานขุดลอกตะกอนขี้เถ้าจากบ่อดักตะกอน	การแก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่เริ่มใช้ :- 8 พ.ค. 2557
	จัดทำโดย : แผนกงานบริเวณ	แผ่นที่ : 1/11

กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

งานขุดลอกตะกอนขี้เถ้าจากบ่อดักตะกอน

เอกสารที่ ค-8

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การจัดการกากของเสีย

รายงานการตรวจสอบสภาพสายพานเถ้าถ่านหินและยิปซัม

Belt Status แผนก หบถม-ฟ.							
Conveyor Name	ความยาวสายพาน(m.)	ชนิดสายพาน	Brand Conveyor	เปลี่ยนเมื่อ	สภาพสายพาน(%)	อายุการใช้งาน(ปี)	หมายเหตุ
Unit Ash No.8	328	ST500*650*8*6	Wuxi Boton	11/2567	80%	2	
Unit Ash No.11	320	ST800*800*8*6	Wuxi Boton	09/2568	95%	1	
Unit Ash 1 MM-T1	100	EP400/3*1200*8*6	Yokohama	08/2567	85%	2	
Unit Ash 2 MM-T1	206	ST500*1200*8*6	Lead House	12/2568	80%	1	
New Collecting 1 MM-T1	107	ST500*1000*8*6	Wuxi Boton	02/2567	65%	2	
New Collecting 2 MM-T2	107	ST500*1000*8*6	Wuxi Boton	11/2568	90%	1	
New Collecting 3 MM-T3	107	ST500*1000*8*6	Wuxi Boton	08/2567	65%	2	
Collecting 1	2,055	ST800*800*8*6	Lead House	06/2567	60%	2	
Collecting 2	2,055	ST800*800*8*6	Shangdong Yihe	11/2567	80%	2	
Collecting 3	2,100	ST800*1400*8*6	Lead Horse	12/2567	80%	2	
First Main 1	761	ST800*1400*8*6	Wuxi Boton	09/2568	90%	1	
First Main 2	761	ST800*800*8*6	Wuxi Boton	05/2566	70%	3	
First Main 3	765	ST800*800*8*6	Wuxi Boton	09/2567	80%	2	
Second Main 1	2,734	ST800*1400*8*6	Lead House	11/2568	90%	1	
Second Main 2	2,734	ST800*800*8*6	Wuxi Boton	06/2565	65%	4	
Second Main 3	2,195	ST800*800*8*6	Wuxi Boton	09/2566	70%	3	
Fixed 1	1,121	ST800*1400*8*6	Lead House	11/2568	90%	1	
Third Main 3	835	ST800*1400*8*6	Shangdong Yihe	10/2567	80%	2	
First Transfer 1	839	ST800*1400*8*6	Shangdong Yihe	10/2567	80%	2	
First Transfer 2	840	ST800*1400*8*6	Lead House	11/2568	80%	2	
First Transfer 3	900	ST800*1400*8*6	Wuxi Boton	09/2566	70%	3	
Second Transfer 1	420	ST800*1400*8*6	Shangdong Yihe	10/2567	80%	2	
Second Transfer 2	420	ST1000*1200*8*6	Lead House	11/2568	90%	1	
Second Transfer 3	420	ST800*1400*8*6	Shangdong Yihe	11/2567	90%	2	
Third Transfer 1	420	ST800*1400*8*6	Wuxi Boton	11/2566	70%	3	
Third Transfer 2	420	ST800*1400*8*6	Lead House	11/2568	90%	1	
Third Transfer 3	420	ST800*1400*8*6	Transboss	11/2567	80%	2	
Fourth Transfer 1	740	ST800*1400*8*6	Wuxi Boton	03/2568	90%	1	
Shiftable 1	2,000	ST800*1400*8*6	Wuxi Boton	03/2568	90%	1	
Shiftable 2	1,720	ST800*1400*8*6	Lead House	11/2568	90%	1	
Shiftable 3	2,000	ST800*1400*8*6	Transboss	12/2565	70%	4	
Discharge Boom 1	44	ST800*1400*8*6		สายพาน เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน			
Discharge Boom 2	44	ST800*1400*8*6					
Discharge Boom 3	44	ST800*1400*8*6					
Stacker 1	74	ST800*1400*8*6					
Stacker 2	74	ST800*1400*8*6					
Stacker 3	74	ST800*1400*8*6					
Ash Reclaimer	16	EP500*100*8*6		06/2566	90%	3	
Update	2/7/2569	By	EKASIT KHAMPASEE				

เอกสารที่ ค-9

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การจัดการกากของเสีย

รายงานการผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน ยิปซัม และเถ้าถ่านหิน

ปริมาณเถ้าถ่านหินและยิปซัมที่ผลิตได้

การจำหน่ายเถ้าถ่านหินและยิปซัม

การกำจัดไปยังบ่อเถ้าถ่านหินและยิปซัม

No.	DESCRIPTION	Unit	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	ต.ค.-69	พ.ย.-69	ธ.ค.-69	สะสม (ม.ค.-มิ.ย.)
1	ปริมาณ Waste ที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต)	ton	124,782	161,295	221,094	209,175	216,876	241,339	0	0	0	0	0	0	1,174,560
2	ปริมาณเถ้าถ่านหินที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต)	ton	76,099	95,609	123,686	118,476	126,248	152,408	0	0	0	0	0	0	692,526
3	ปริมาณยิปซัมที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต)	ton	48,683	65,686	97,408	90,699	90,628	88,931	0	0	0	0	0	0	482,035
4	ปริมาณเถ้าลอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต)	ton	51,843	66,364	86,456	83,019	87,724	105,154	0	0	0	0	0	0	480,558
5	ปริมาณเถ้าหนักที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต)	ton	24,257	29,246	37,231	35,457	38,524	47,254	0	0	0	0	0	0	211,967
6	ปริมาณเถ้าลอยที่ส่งขาย	ton	21,374	43,730	53,620	36,185	44,749	44,526	0	0	0	0	0	0	244,184
7	ปริมาณเถ้าหนักที่ส่งขาย	ton	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
8	ปริมาณยิปซัมที่ส่งขาย	ton	29,909	41,198	45,530	27,412	35,606	32,530	0	0	0	0	0	0	212,185
9	ปริมาณวัตถุผลอยได้ที่ส่งขายทั้งหมด	ton	51,283	84,928	99,150	63,597	80,355	77,056	0	0	0	0	0	0	456,369
10	ปริมาณเถ้าลอยที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ	ton	30,469	22,634	32,836	46,834	42,975	60,628	0	0	0	0	0	0	236,374
11	ปริมาณเถ้าหนักที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ	ton	24,257	29,246	37,231	35,457	38,524	47,254	0	0	0	0	0	0	211,967
12	ปริมาณยิปซัมที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ	ton	18,774	24,488	51,878	63,287	55,022	56,401	0	0	0	0	0	0	269,850
13	ปริมาณเถ้าถ่านหินและยิปซัมที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ	ton	73,499	76,367	121,944	145,578	136,521	164,283	0	0	0	0	0	0	718,191

เอกสารที่ ค-10

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : สาธารณสุข และสุขภาพ

กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
โดย กองการแพทย์แม่เมาะ

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย กองการแพทย์แม่เมาะ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กิจกรรมการตรวจรักษา
- กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ ท่าบริหารยืดเหยียด กล้ามเนื้อ การเก็บรักษายาและการใช้ยาอย่างปลอดภัย เป็นต้น
- กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขการเยี่ยมบ้านประจำเดือน

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
1	13 ม.ค. 69	ปงชัย	5	แม่เมาะ	155	
2	22 ม.ค. 69	ปงแท่น	1	นาสัก	80	
3	27 ม.ค. 69	สวนป่าแม่จาง	3	สบป้าด	62	
4	5 ก.พ. 69	หางฮุง	3	แม่เมาะ	29	

เอกสารที่ ค-10

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
5	10 ก.พ. 69	ทาน (เช้า)	4	จางเหนือ	143	
6	10 ก.พ. 69	หาดประชาสามัคคี (บ่าย)	8	จางเหนือ	53	
7	12 ก.พ. 69	สวนป่าแม่เมาะ(เก่า)	7	บ้านดง	85	
8	17 ก.พ. 69	สบจาง	6	นาสัก	164	
9	19 ก.พ. 69	ใหม่นาแขม	7	แม่เมาะ	148	
10	24 ก.พ. 69	ปงต้นปิน	6	สบป้าด	100	

เอกสารที่ ค-10

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
11	12 มี.ค. 69	หัวฝาย	1	บ้านดง	112	
12	17 มี.ค. 69	ชุมชนบ้านม่อนทุ่งกล้วย	8	แม่เมาะ	124	
13	19 มี.ค. 69	นาแช่	2	จางเหนือ	174	
14	24 มี.ค. 69	ห้วยคิง	6	แม่เมาะ	92	
15	2 เม.ย. 69	บ้านดง(เก่า)	2	บ้านดง	97	

เอกสารที่ ค-10

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
16	9 เม.ย. 69	เมาะหลวง	8	แม่เมาะ	153	
17	23 เม.ย. 69	ข่วงม่วง	8	นาสัก	99	
18	7 พ.ค. 69	ใหม่ฉลองราช	8	สบป้าด	71	
19	12 พ.ค. 69	สบเติ๋น	2	สบป้าด	68	
20	14 พ.ค. 69	ใหม่ห้วยรากไม้	2	แม่เมาะ	62	

เอกสารที่ ค-10

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
21	19 พ.ค. 69	จางเหนือพัฒนา	7	จางเหนือ	206	
22	21 พ.ค. 69	จำปุย	4	บ้านดง	72	
23	26 พ.ค. 69	วังตม	5	จางเหนือ	100	
24	4 มิ.ย. 69	นาสันติราษฎร์	6	จางเหนือ	109	
25	16 มิ.ย. 69	เวียงสวรรค์	9	แม่เมาะ	109	

เอกสารที่ ค-10

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนผู้มารับบริการ	รูปภาพ
26	18 มิ.ย. 69	ปางป่วย	2	นาสัก	87	
27	23 มิ.ย. 69	นาสัก	4	นาสัก	141	
รวมทั้งหมด					**2,895**	

สถิติผู้มารับบริการ ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ มกราคม-มิถุนายน 2569 ผู้มารับบริการทั้งสิ้น 2,895 ราย ออกหน่วยแพทย์ จำนวน 27 ครั้ง พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล พร้อมกับกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

เอกสารที่ ค-11

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ประกาศผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒
ที่ ๒ /๒๕๖๘
เรื่อง นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๙

เพื่อให้การดำเนินงานนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า๒ จึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ ชฟฟ๒. ที่ ๒ /๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๘

ข้อ ๒ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายดังนี้

(๑) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(๒) ให้มีการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ด้านน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคุม ป้องกัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน

(๓) ให้การสนับสนุน งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(๕) ติดตามและประเมินสมรรถนะการดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบอย่างมีประสิทธิผล

(๖) เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงการแนะนำให้คำปรึกษาและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

.../๒

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ต่อ)

(๗) ปรับปรุงมาตรฐานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(๘) มุ่งหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการเป็น Carbon Neutrality

(๙) ให้ถือว่าการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

จึงประกาศนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม)
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

เอกสารที่ ค-11

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒
ที่ ค. ๒๑/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.)

โดยที่เห็นปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.) เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.) เป็นไปตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๒ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค. ๓๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.)

ข้อ ๒ ให้มี “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” เรียกโดยย่อว่า “คปอ-ฟม.” ประกอบด้วย

(๑) ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒	เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๓) ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๔) หัวหน้ากองเชื้อเพลิง ถ่าน และน้ำ อฟม.	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๕) หัวหน้ากองโยธา อฟม.	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๖) หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ๑ อรม.	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๗) หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ๔ อรม.	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๘) หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ๕ อรม.	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๙) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือ อพอ.	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๑๐) หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย อฟม.	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(๑๑) นายบุญยิ่ง เพ็ชรอุไร	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๒) นายกฤษฎา ทองเต็ม	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๓) นายวิเชียร ไฉไลไมตรีมิตร	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๔) นายปวีณ ขาวผ่อง	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๕) นายสุพัฒน์ ประพฤติชอบ	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๖) น.ส.วิไลรัตน์ บุญราศรี	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๗) น.ส.นนทนัน วิเชียรสาร	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๘) น.ส.จิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๑๙) ว่าที่ ร.ต.พันธุ์เมธา จุมปาหลวง	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(๒๐) นายอังกูร กามล	เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

เอกสารที่ ค-11

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (ต่อ)

(๒๑) หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อฟม. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๒ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง

(๒) จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

(๓) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(๕) พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(๖) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

(๗) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(๘) จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

(๙) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

(๑๑) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(๑๒) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๒ มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

แผนกงานบุคคลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. ๒๐๓๖

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ประจำเดือน) ปี 2569

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 6/2569
วัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2569
พื้นที่ อาคาร ZG-2, ZG 3/1 ถึง ZG 3/5

คณะกรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายอลงกรณ์	พุ่มรักธรรม	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายเชิดชัย	วิชา	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
3.	นายปริญญา	สาระไชย	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
4.	นายวิเชียร	ทำไธสง	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
5.	นายเสรี	คำแผลง	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
6.	นายภัทรพล	วิเชียรกุล	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
7.	นายกฤษฎา	ทองเต็ม	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
8.	นายวิเชียร	ไฉไลไมตรีมิตร	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
9.	ว่าที่ ร.ต.พันธุ์เมธา	จุมปาหลวง	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
10.	น.ส.นนทนัน	วิเชียรสาร	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
11.	นายสุพัฒน์	ประพฤติชอบ	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
12.	น.ส.จิรัชฌา	จิตพรพิพัฒน์	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
13.	นายปวีณ	ขาวผ่อง	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
14.	น.ส.จุไรรัตน์	ธีไหล	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

1.	นายชัยวุฒิ	แลกันทะ	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
2.	นายพงษ์สวัสดิ์	เรืองเดชาวิวัฒน์	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
3.	น.ส. อัมพวรรณ	เรืองแสง	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
4.	นายจรัล	ทาไชยวงค์	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
5.	น.ส.วิไลรัตน์	บุญราศรี	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
6.	นายอังกูร	กามล	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายพิเชษฐ์	ปวงแก้ว	วศ.9 กชนม-ฟ.
2.	นายจักรี	เตโช	ช.9 กยธม-ฟ.
3.	น.ส. ตวงพร	ผสมทรัพย์	หพม-ห.
4.	นายเสวก	ไชยสาลี	หจคม-ธ.
5.	นายอานนท์	วงศ์ฝั้น	หงอม-ฟ.
6.	นายเอกสิทธิ์	มหรรฆสุวรรณ	วศ.8 กผม1-ฟ.
7.	นายเดช	ริดชิววงศ์	ช.7 หปถม-ฟ.
8.	น.ส.นุชิดา	หุ่นศรีสกุล	วท.7 หปอม-ฟ.
9.	น.ส.ปรารถนา	วงศ์คำ	ช.7 หปอม-ฟ.
10.	นายกิตติธัช	มนัสตรง	ช.6 หบฟม3-ฟ.
11.	นายสรานนท์	พุทธสอน	ช.4 หงอม-ฟ.

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

แผนดำเนินการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

ชื่อแผน	แผนดำเนินการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(ตปอ-พม.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน	เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและลูกจ้างเหมาค่าบริการ ตลอดจนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	ความก้าวหน้าการปฏิบัติการตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการตามแผนสำเร็จ100%
ผู้รับผิดชอบแผน	ตปอ-พม.		

กิจกรรม	น้ำหนัก		ปีงบประมาณ														ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
			2568			2569											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ด้านความปลอดภัยฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	แผน	6		6														คณะกรรมการฯ
	จริง																	
2. ลงนามนับที่ข้อตกลงผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	แผน	6			6													คณะกรรมการฯ
	จริง																	
3. รายงานและสอบและทราบการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อ ฝพฝ2. เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและ ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอก	แผน	10				0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	คณะกรรมการฯและเลขาฯ
	จริง																	
4. การส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย	แผน																	คณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง
4.1 การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก	แผน	4									4							
	จริง																	
4.2 การจัดงานวันแห่งความปลอดภัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569	แผน	4													4			คณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง
	จริง																	
5. กฎระเบียบ, คู่มือ, ข้อบังคับและมาตรฐานการทำงาน	แผน	3.5				1.4	1.4	0.7										คณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง
5.1 พิจารณาและทบทวนข้อบังคับ,คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จริง																	
5.2 กำหนดระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	แผน	3.5						0.7	1.4	1.4								คณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง
	จริง																	
6. ตรวจสอบและสำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผน	10				0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	คณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง
	จริง																	
7. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ	แผน	10				0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	คณะกรรมการฯ
	จริง																	
8. ติดความความก้าวหน้าเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุม	แผน	10				0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	เลขานุการฯ
	จริง																	
9. สำรวจและตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุด้านบุคคล ทรัพย์สินและกระบวนการผลิต	แผน	10				0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	หปอม-พ.
	จริง																	
10. รายงานผลการดำเนินการอบรมด้านความปลอดภัย ฯ	แผน	8						2			2			2			2	หปอม-พ.
	จริง																	
11. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำปี	แผน	10															10	เลขานุการฯ
	จริง																	
12. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	แผน	5															5	เลขานุการฯ
	จริง																	
รวม		100																
งานตามแผน (%)	ปริมาณแต่ละครั้ง			6.0	6.0	5.6	5.6	7.6	5.6	5.6	6.2	8.2	4.2	6.2	4.2	8.2	6.2	15.0	
	ปริมาณสะสม																		
งานที่ปฏิบัติได้จริง	ปริมาณแต่ละครั้ง			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	ปริมาณสะสม																		

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คู่มือและข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

จัดทำโดย หปอม-ฟ.

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๙

ระหว่างผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

กับ อรม. อฟม. สก.ชฟฟ๒

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนงานลดอุบัติเหตุด้านบุคคลและทรัพย์สิน

แบบฟอร์ม 2 : กิจกรรมหลักและกำหนดเวลาของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการรวมถึงเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของกิจกรรม

ชื่อแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ : ลดอุบัติเหตุด้านบุคคลและทรัพย์สิน

ผลผลิตของแผน (Output)	เป้าหมาย										คำอธิบายตัวชี้วัด
	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	
1. ดัชนีประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงาน (DII x 1000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. DII คือดัชนีการประสบอันตรายของผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง กฟผ.
2. ความสูญเสียด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (บาท/GWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2. มูลค่าความสูญเสียซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุของเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (ที่ได้ประกันภัยไว้กับบริษัท) ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ เป็น x บาทต่อ 1 ล้านหน่วยผลิตไฟฟ้า (GWh.)

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ปี 2569												2570	2571	2572	2573	ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
1	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ฝ่าย/กอง/แผนก
2	การปฏิบัติงานตามแผนงาน คปอ-พม.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					หปอ-พ.
3	ผู้บริหารตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ฝ่าย/หัวหน้ากอง/หัวหน้าแผนก)	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37					อฟม./อรม.
4	การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย(Safety Talk Box Tool พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร, Morning Talk ,5 ส for Safety)	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					หปอ-พ./หน่วยงาน
5	การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (สวมใส่ PPE 100 %)	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					หปอ-พ./หน่วยงาน
6	ประชุมชี้แจงผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37					หปอ-พ.
7	การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในงาน MI/MO/งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน/งานรณรงค์ความปลอดภัยฯ นอกงาน	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37					ทุกกอง ที่เกี่ยวข้อง (อฟม.. อรม.),หปอ-พ.
8	ชี้แจงผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนเข้าทำงาน	5	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41					หปอ-พ./หน่วยงานผู้ควบคุมสัญญาจ้าง
9	Program Tag & Work Permit Online 100% 9.1 การจัดทำ Program Tag & Work Permit Online 9.2 หน่วยงานใช้ Program Tag & Work Permit Online	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37					อฟม..อรม.
10	พฤติเพื่อความปลอดภัย (STOP WORK for SAFETY)	3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25					หปอ-พ./หน่วยงานผู้ควบคุมสัญญาจ้าง
11	สนับสนุนให้ จป.หัวหน้างาน ทำหน้าที่ตามกฎหมาย 10 ข้อ ควบคู่ไปกับงานประจำ	3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25					อฟม..อรม.
12	ประสานงานตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					หปอ-พ.
13	ตรวจสอบระบบ Fire Protection ทุกอาคารให้พร้อมใช้งาน(ระบบน้ำและระบบโฟม)	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ทุกกอง (อฟม.. อรม.)
14	ตรวจทดสอบและซ่อมบำรุง ระบบFire Alarm ทุกอาคารในโรงไฟฟ้า	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					หปอ-พ.
15	กิจกรรมลดความสูญเสียด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					อฟม..อรม.

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แบบบันทึกการสนทนาความปลอดภัย ก่อนเริ่มงาน Safety Talk Record)

แบบฟอร์มบันทึกการสนทนาความปลอดภัย

SAFETY TOOLBOX TALK RECORD

บันทึกการสนทนาความปลอดภัย

แผนก...หอจม4-ฟ... กอง... กชนม-ฟ.... ฝ่าย... อฟม....

ชื่อผู้รับจ้าง... แม่เมาะวงศ์วัน... เลขที่สัญญา... ..

ชื่องาน... งานขจัดถ่านติดค้างที่ระบบสายพานลำเลียงถ่าน... สถานที่... อาคารระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน... วันที่.22 มิ.ย. 2569...

Work Oder No.. ...

Safety Talk item (Mark ✓ on items)

- ☑ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
- ☑ การชนวัตถุ (วิ่งหรือกระแทกกับวัตถุ)
- ☑ การถูกชน (กระแทกโดยวัตถุที่เคลื่อนที่)
- ☑ การลื่นบนระดับเดียวกัน (ลื่นและล้ม, สะดุด)
- ☑ การถูกหนีบ ถูกบีบ ถูกงับ
- ☑ การถูกอัด ถูกทับ (บดขยี้, ถูกตัดขาด)
- ☑ การถูกทิ่มแทง ถูกแขวน
- ☑ การสัมผัสความร้อน ความเย็น ฝุ่นละออง
- ☑ การยศาสตร์ (การออกแรงเกินกำลัง, เกินพิกัด, ใช้แรงในพื้นที่บังคับ, เอี้ยวตัว, ก้มตัว ฯลฯ)
- ☑ ความพร้อมของสภาพร่างกาย และจิตใจ
- ☑ Lock Out / Tag Out / กฎความปลอดภัย
- ☑ การทำความสะอาด / การคัดแยกขยะ
- ☑ กรณีเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที
- ☑ กรณีพบสภาพการณ์/การกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที
- ☐ การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
- ☐ การป้องกันไฟและระเบิด
- ☐ การทำงานในที่อับอากาศ
- ☐ การทำงานเหนือผิวน้ำ
- ☐ การป้องกันอุบัติเหตุจากการเชื่อม
- ☐ การทำงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ/รื้วกั้นรอบหลุมลึก
- ☐ เครนและเครื่องตอกเสาเข็ม
- ☐ การทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
- ☐ การทำงานเกี่ยวกับงานประดำน้ำ
- ☐ การทำงานเกี่ยวกับรังสี
- ☐ การทำงานในที่สูง / การตกจากที่ต่างระดับ
- ☐ การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
- ☐ การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น/งานลิฟต์ขนส่งขนาดใหญ่/งาน อุปกรณ์ยกย้ายขนาดใหญ่
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

Please specify (โปรดระบุ)...

..

Agenda items discussed / หัวข้อการประชุม : (Safety Talk) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ..9.. คน

.....

..ติดต่อพนักงานเดินเครื่องก่อนและเครื่องจักรต้องหยุดทำงาน จึงจะเข้าทำงานได้

-ไปทำงานต้องมี Buddyเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกคนสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ทันที

-ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(PPE)ทุกครั้งที่ออกหน้างาน..

.....

Any other business / เนื้อหาอื่นเพิ่มเติม : (Tool Box Talk) .....

.....

..ให้ทำตามระเบียบ กฟผ. เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารระบบสายพาน เสพสารเสพติด...

.....

เอกสารที่ ค-12

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีขั้นตอนการดำเนินการตรวจวัดแสงสว่าง ตามขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำแผนการตรวจวัดแสงสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมข้อมูลจาก การสำรวจเบื้องต้นและประเมินอันตรายสภาวะแวดล้อมในการทำงาน การประเมินความเสี่ยง และข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องด้านสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ

↓

2. แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดส่งแผนการตรวจวัดแสงสว่างให้เจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือไม่ ถ้าไม่ครอบคลุมให้หน่วยงานแจ้งกลับมาที่แผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

↓

3. หากหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้หน่วยงานแจ้งร้องขอการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามใบร้องขอการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

↓

4. แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการประสานงานฝ่ายความปลอดภัย เพื่อตรวจวัดแสงสว่างตามแผนงานที่กำหนด และจัดทำรายงานการตรวจวัดรวมถึงข้อเสนอแนะปรับปรุงส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่

4.1 กรณีที่ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่วิเคราะห์หาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขและหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

4.2 หลังจากหน่วยงานดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้แจ้งแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำและรายงานผลการตรวจวัดฯ

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

ตัวอย่างแผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2569

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปี.....2569.....

☒ การตรวจวัดแสง ☐ การตรวจวัดเสียง ☐ การตรวจวัดความร้อน

☐ การตรวจวัดไอระเหยสารเคมี ☐ การตรวจวัดเสียงสะสม ☐ การตรวจวัดรังสี

☐ การตรวจวัดฝุ่น Respirable Dust ☐ การตรวจวัดก๊าซ ☐ การตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์เครื่องปรับอากาศ

☐ การตรวจวัดความทึบแสงของฝุ่นด้วยเครื่อง Smoke Opacity Meter ☐ อื่นๆ .....

สถานที่	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
กปซม-พ., กปฉม-พ.												
กบรม5-พ., กปพร-ธ.												
กบพม-บ., กยธม-พ., กบหม-พ.												
กผม1-พ., กผม2-พ.												
กจพม-ห., กอน-ห.												
กชมม-พ.												
กบรม1-พ., กบรม2-พ.												
กบรม3-พ., กบรม4-พ.												
อื่นๆ												

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง หอง ชฟฟ2., อพม., อรม., BDx, หปอม-พ., หบคม1-ห., หสสม-พ., หรปม-พ., หชพม-ย., โรงอาหาร

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ
.....	.....
(นางสาวมุทิตา หุ่นศรีสกุล)	(นายยุทธนา ศรีหริญ)
ตำแหน่ง วท. 7 หปอม-พ.	ตำแหน่ง ช.อพม-1.
วันที่	วันที่

ต้นฉบับ - หปอม-พ.
สำเนา - หน่วยงาน

MF-00-ASS-02-01/Rev.06

เอกสารที่ ค-12

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

การจัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน

การจัดพื้นที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำเกินไป

เอกสารที่ ค-12

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและลักษณะท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง

กฟผ. ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และหลักสูตร ท่าทางการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ (ELS) ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม และจะมีการสรุปผลการอบรมในช่วงธันวาคมของทุกปี

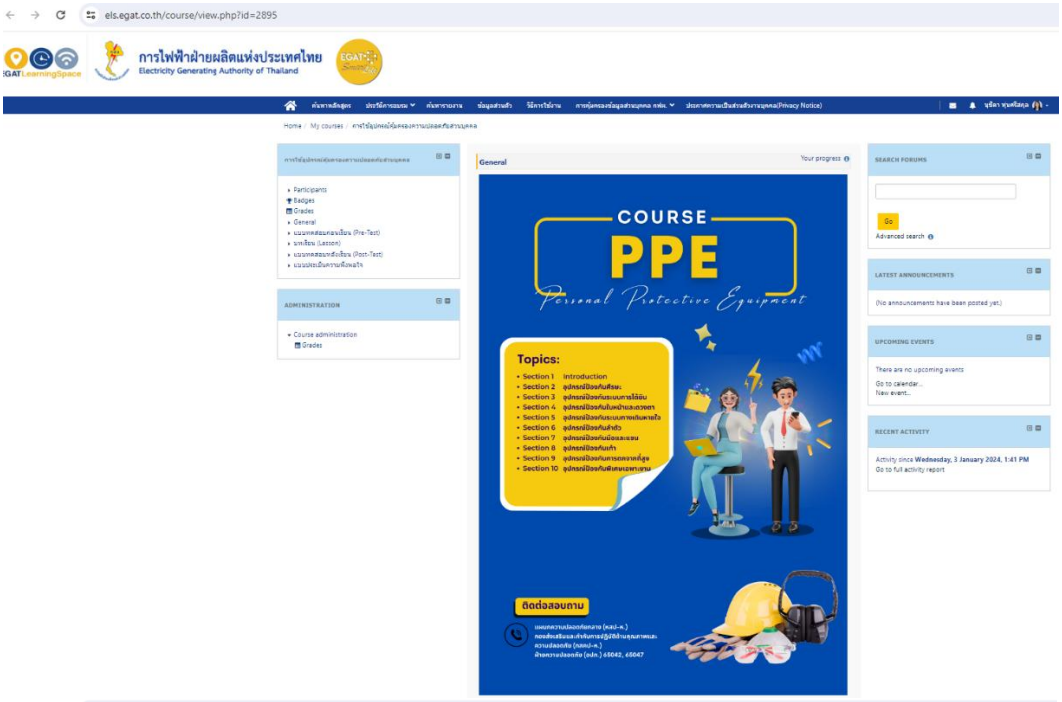

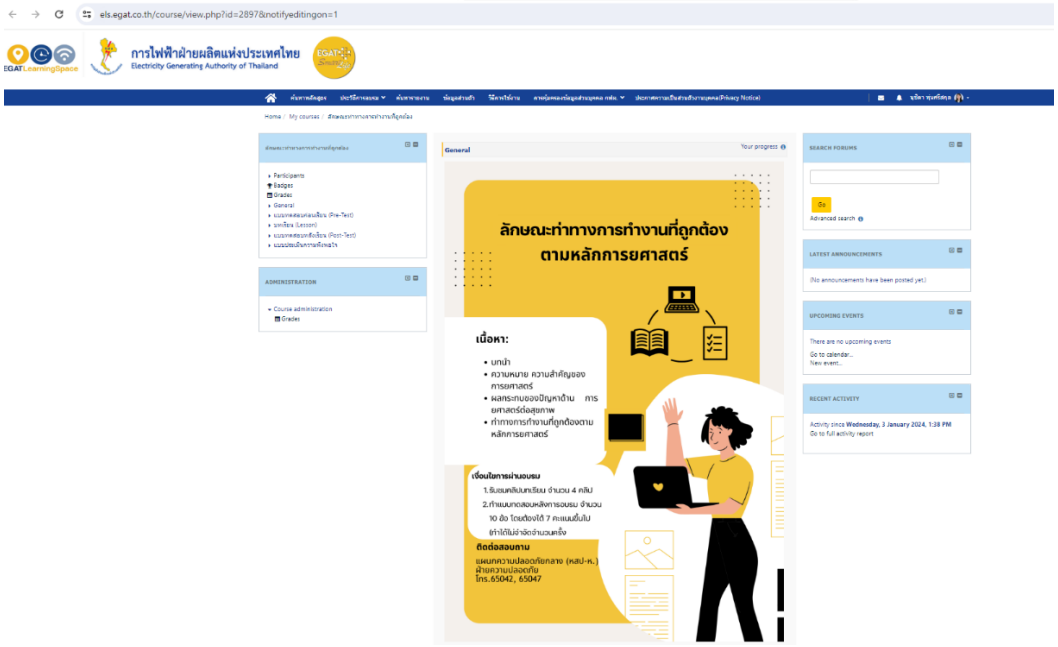

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แบบจำแนกประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

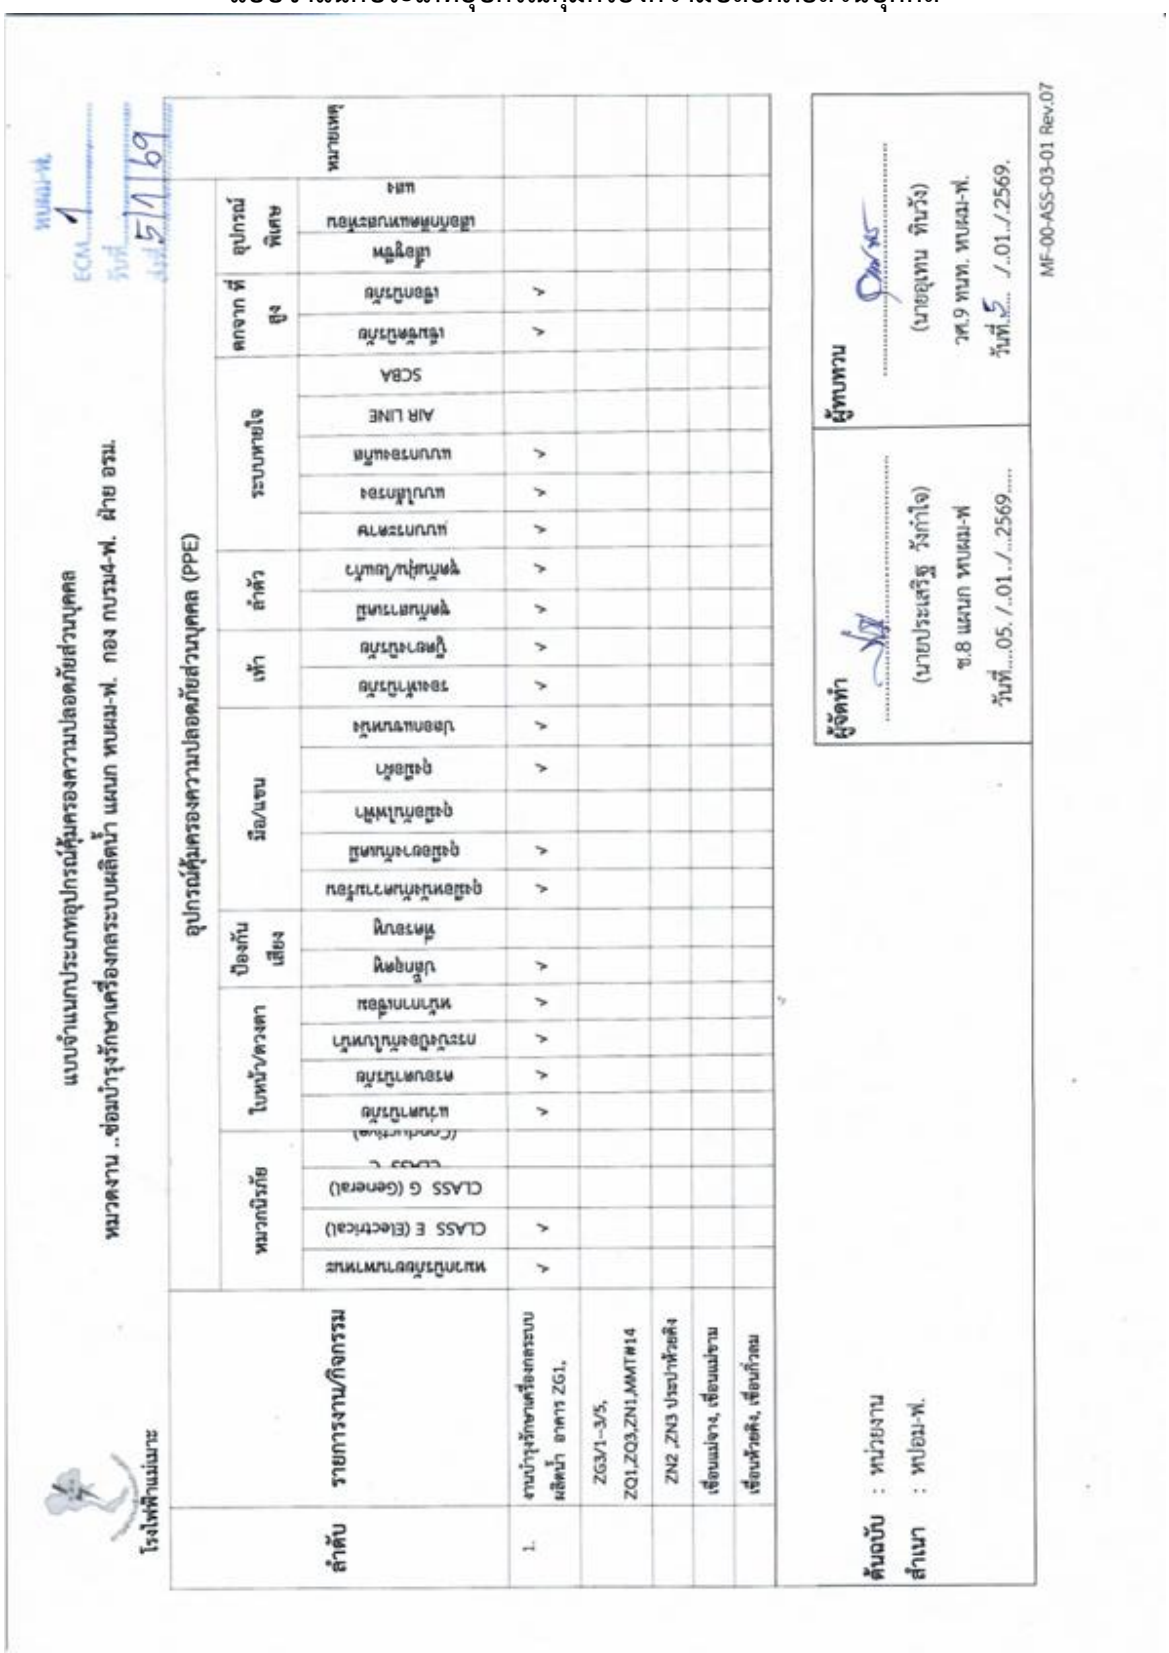

แบบจำแนกประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หมวดงาน ..ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลระบบผลิตน้ำ แผนก หนผม-พ. กอง กบรม4-พ. ฝ่าย อรม.

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| ลำดับ | รายการงาน/กิจกรรม | อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) | | |

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แบบประเมินผลการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

การประเมินผลการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สภาพการใช้งาน การจัดเก็บ การบำรุงรักษา

หมวดงาน ...ความปลอดภัย..... แผนก ...หปอม-ฟ..... กอง ....-..... ฝ่าย ...อฟม.....

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

หัวข้อการประเมิน	พิจารณาจากลักษณะงานที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล													คิดเป็นร้อยละ (%)
	ศีรษะ	ใบหน้า / ดวงตา	การได้ยิน	ลำตัว	มือ / แขน	ขา / เท้า	การหายใจ	ตกจากที่สูง	อื่นๆ(ระบุ)	รวม	
1. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่ / จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องสวมใส่	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	8/8	100
2. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่ถูกวิธี / จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	8/8	100
3. สภาพอุปกรณ์ป้องกันฯพร้อมใช้งาน / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่สวมใส่	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	8/8	100
4. การจัดเก็บที่ดี / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่จัดเก็บ	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	8/8	100
5. การบำรุงรักษา "การทำความสะอาด" / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่จัดเก็บ	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	8/8	100
6. การบำรุงรักษา "การเปลี่ยนชิ้นส่วน" / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันฯที่จัดเก็บ	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0/0	-
รวม	10	0	10	0	10	10	10	0	0		

หมายเหตุ : รายงานทุก 2 เดือน โดยหัวหน้างาน นำเสนอ หัวหน้าแผนก

ต้นฉบับ : หน่วยงาน

สำเนา : หปอม-ฟ.

ผู้รายงาน .....จักรกฤษ วงค์คำ..... (หัวหน้างาน)
(นางสาวปรารถนา วงค์คำ)
วันที่ 23 / 1 / 69

ผู้ทบทวน.....ห้วหน้าแผนก
(นางสาวจุไรรัตน์ ธีโหล)
วันที่ 30 / 01 / 69

MF-00-ASS-02-04 Rev.07

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีสำรองคลัง

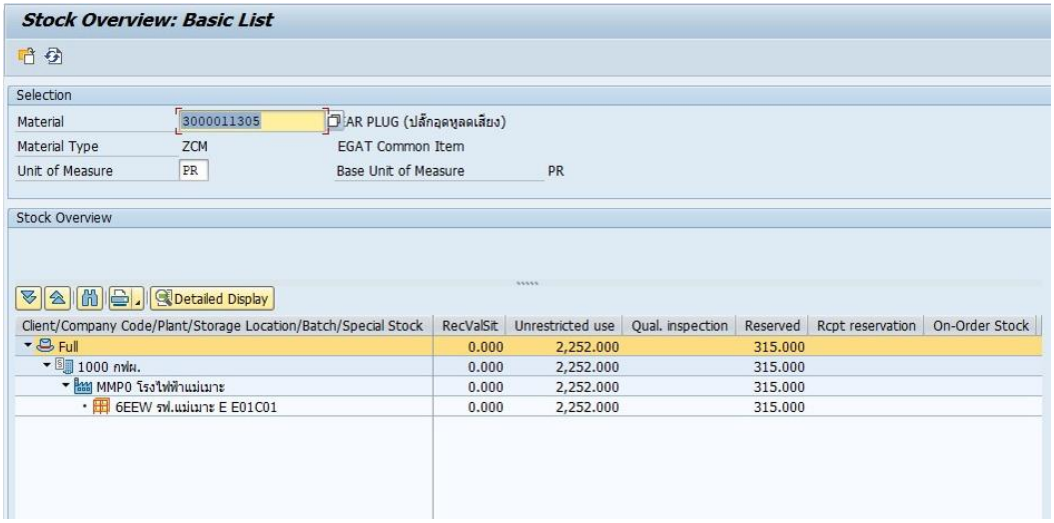

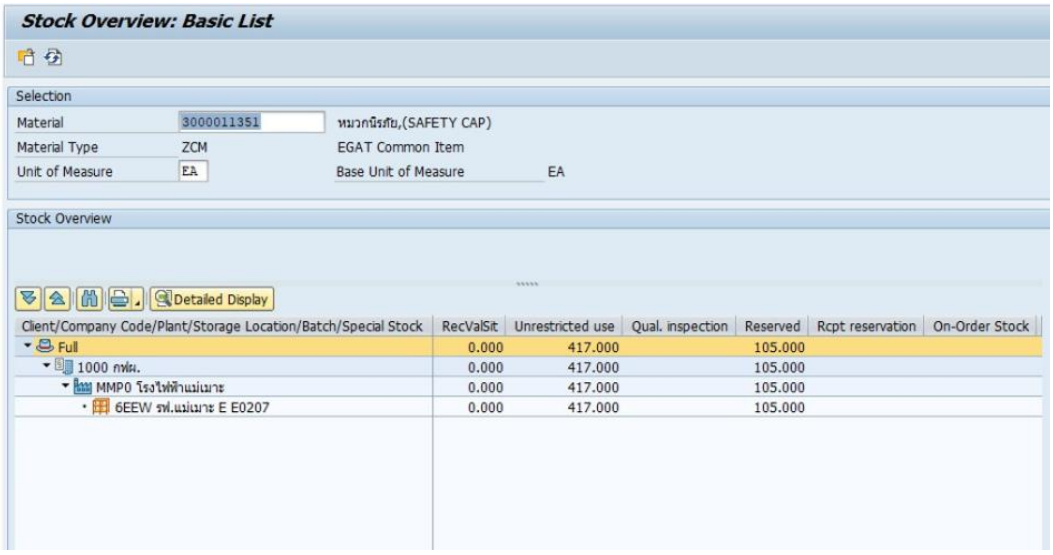

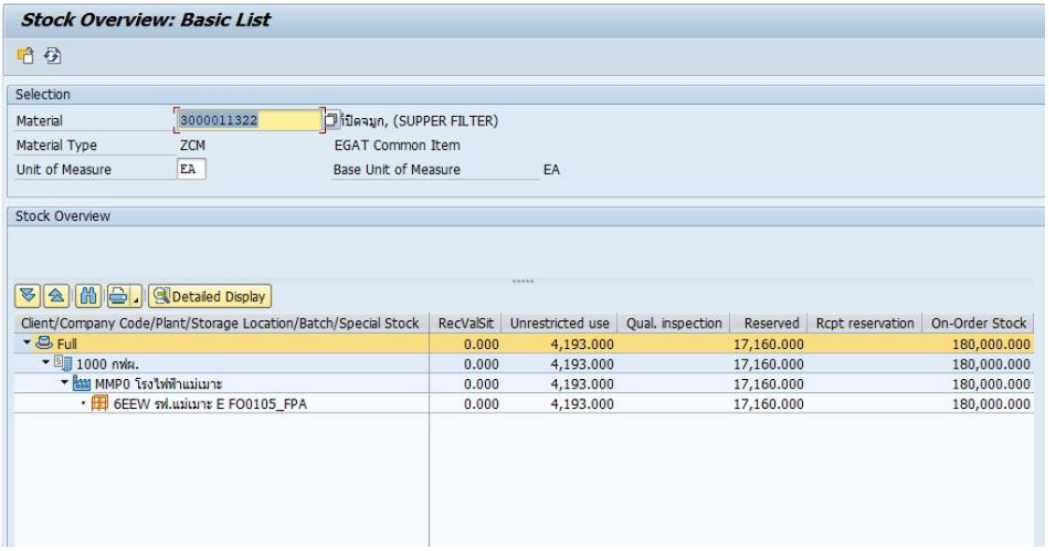

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

ตัวอย่างแผนเข้าดำเนินการทดสอบและทำความสะอาดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท พีโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด
PICO TECHNOLOGY WORLD CO.,LTD.
7/106,7/108 หมู่ 5 ซอยรามคำแหง 152 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
7/106,7/108 Soi Ramkhamhaeng 152, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Bangkok 10240
Tel : 0-2372-0198-9, 0-2726-1021-2 Fax : 0-2372-0199

แผนดำเนินงานตรวจทดสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) ประจำเดือน มกราคม 2569

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	เริ่มเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2568	22 days	พ 1/1/69	ส 31/1/69
2	- กลงโถร1,หมวดยานพหนะ,ZW3,ZV,ZW1-2	1 day	ศ 2/1/69	ศ 2/1/69
3	- FGD 12-13 , FGD 10-11,FGD 8-9,FGD4-7	1 day	จ 5/1/69	จ 5/1/69
4	- อาคารปฏิบัติการเคมี, - ZS-6, ZA11,ZG6	1 day	อ 6/1/69	อ 6/1/69
5	- ZG1-ZG3/5,ZN3,ZW4-5,ZU,ZN1	1 day	พ 7/1/69	พ 7/1/69
6	- ตึกขาว,ตึกแดง,กลุ่มอาคารคลัง ง,CCTV,ZR	1 day	พ 8/1/69	พ 8/1/69
7	- กพจ-ฟ.,ZS1-ZS3	1 day	ศ 9/1/69	ศ 9/1/69
8	- ศูนย์ปฏิบัติการเคมี ,กบรม1-ฟ.,ตึกเขียว	1 day	จ 12/1/69	จ 12/1/69
9	- หอบม2-ฟ,หอบม3-ฟ - ZA13,	1 day	อ 13/1/69	อ 13/1/69
10	- Unit4, โรงอาหารและห้องทนาการ	1 day	พ 14/1/69	พ 14/1/69
11	- Unit8, Unit9	1 day	พ 15/1/69	พ 15/1/69
12	- Unit10, Unit11	1 day	ศ 16/1/69	ศ 16/1/69
13	- Unit12, Unit13	1 day	จ 19/1/69	จ 19/1/69
14	- กบรม5-ฟ., หออม-ฟ,	1 day	อ 20/1/69	อ 20/1/69
15	- ประชาสัมพันธ์,สิ่งแวดล้อม,สถานพยาบาล	1 day	พ 21/1/69	พ 21/1/69
16	- กบรม-ฟ.,กบรม2-ฟ,กบรม3-ฟ	1 day	พ 22/1/69	พ 22/1/69
17	- กลุ่มอาคารคลังน้ำมัน หตช-ฟ.	1 day	ศ 23/1/69	ศ 23/1/69
18	- อาคาร ZD,45ZS4-32ZS4,ZV	1 day	จ 26/1/69	จ 26/1/69
19	- อาคาร กบรม4-ฟ.,อาคาร ZW-4	1 day	อ 27/1/69	อ 27/1/69
20	- อาคารบัลติดประสาน,แผนกวัดเทคลอยได้	1 day	พ 28/1/69	พ 28/1/69
21	- งานบำรุงซ่อมแซมระบบ	1 day	พ 29/1/69	พ 29/1/69
22	- งานบำรุงซ่อมแซมระบบ	1 day	ศ 30/1/69	ศ 30/1/69

Project: กุมภาพันธ์ 2568
Date: 3/2/2568

Task
Split
Progress
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Deadline

Page 1

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

ผลการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด
PICO TECHNOLOGY WORLD CO.,LTD
7/106,7/108 ซอยรามคำแหง 152 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
7/106,7/108 Soi Ramkhamhaeng 152, Ratphatthana, Saphansoong, Bangkok 10240
Tel : 0-2372-0198-9, 0-2728-1021-2 Fax : 0-2372-0199

วันที่ 5 มิถุนายน 2569

เรียน ผู้ควบคุมงานทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เรื่อง สรุปผลการตรวจทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ประจำเดือน พฤษภาคม 2569.)
อ้างอิง สัญญาเลขที่ 3000005184 (ZLVA)

ตามที่บริษัท พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างงานตรวจทดสอบและทำความสะอาด ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4,8-13 โรงไฟฟ้า MM-T14 อาคารประกอบ และอาคารสถานพยาบาล อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ้างอิงสัญญาเลขที่ 3000005184 (ZLVA)นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอสรุปผลการตรวจทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อาคารที่ทำการตรวจทดสอบ อาคาร UNIT 4
   - จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 233 ตัว / ปกติ
   - จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 19 ตัว / ปกติ
   - จำนวนอุปกรณ์ปุ่มกด (Manual Call Point) 59 ตัว / ปกติ
   - จำนวนอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Horn) 15 ตัว/ปกติ

2. อาคารที่ทำการตรวจทดสอบ อาคาร UNIT 8
   - จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 349 ตัว / ไม่ปกติ 6 Zone
   - จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 24 ตัว / ปกติ
   - จำนวนอุปกรณ์ปุ่มกด (Manual Call Point) 42 ตัว / ปกติ
   - จำนวนอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Horn) 4 ตัว/ปกติ

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒
ที่ ค.๒๑ /๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค.๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ ๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรียกโดยย่อว่า “จป.วิชาชีพ (จป.ว.)” จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย

	ชื่อ – สกุล		เลขประจำตัว	เลขทะเบียน
(๑)	นางสาวจุไรรัตน์	ธีไหล	๕๖๓๓๕๘	กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๔๓๙
(๒)	นางสาวนุชิดา	หุ่นศรีสกุล	๕๙๓๖๒๒	กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๑๖๕
(๓)	นายณชรัญ	กินีศรี	๔๘๒๑๐๒	กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๐๓๐
(๔)	นางสาวปรารถนา	วงศ์คำ	๕๙๐๓๙๑	กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๓๘๗
(๕)	นายภูริทัต	ปุยวงศ์	๕๙๙๕๖๕	รอขึ้นทะเบียน
(๖)	นางสาวณีรนุช	สุวรรณรินทร์	๕๙๙๖๕๐	รอขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ ให้ จป.วิชาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

(๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๔) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

(๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

(๖) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

Hot Work Permit

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	**ใบขออนุญาตเข้าทำงาน** (Work Permit) (MF-00-ASS-13-01/Rev.15)	Work Permit No...WP01464/2569.. Work Order...4072295..

ส่วนที่ 1 ผู้ขออนุญาต ** ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง**

หน่วยงาน / บริษัท....อรม./กบรม4-ฟ./หบลม-ฟ....ชื่ออุปกรณ์..CC#2..สถานที่..ZS-2..

ผู้ขออนุญาต ชื่อ....นายจำลอง เทพศิริ...ตำแหน่ง..ช.7

รายละเอียดงาน...เชื่อมเสริม Wear Liner...ตั้งแต่วันที่..2026-01-06 13:00:00..ถึงวันที่..2026-01-06 19:00:00..

ขออนุญาต ☑ เข้าทำงานในพื้นที่อันตราย (พื้นที่ ..อาคาร ZS-2)

ขออนุญาต ☑ เข้าทำงานวิกฤติ ลักษณะงานที่ขออนุญาตเข้าทำงาน (โปรดระบุ)

☑ **งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ** (Hot Work)

☑ มีการเคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟออกจากพื้นที่ ☑ มีการกั้นเขตพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมสะเก็ดไฟกระเด็น ☑ การตรวจวัดสารไวไฟ ไม่เกิน 10% LEL..1.00 %

☑ มีการใช้ผ้ากันไฟ หรืออุปกรณ์ป้องกันการกระจายของสะเก็ดไฟ บริเวณพื้นที่ทำงาน ☑ มีการทำความสะอาด

☑ อุปกรณ์ดับเพลิง ชนิด..ผงเคมีแห้ง ..จำนวน..1 ..ถัง ☑ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

☐ **งานในที่อับอากาศ** (Confined Space)

มาตรการความปลอดภัย

☐ ผู้ปฏิบัติงานที่ขออนุญาตทุกคน ผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด (รายชื่อตามแบบฟอร์ม รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (MF-00-ASS-13-02)

☐ ผู้ปฏิบัติงานที่ขออนุญาตทุกคน มีใบรับรองแพทย์ และไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์เห็นว่าสามารถทำงานที่ที่อับอากาศได้ (ให้ใช้แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 รับรองโดยใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ออกใบรับรอง)

☐ ตรวจสอบเครื่องมือ และระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย ☐ มีการระบายของเสียทิ้ง

☐ มีการทำความสะอาด ☐ มีการระบายอากาศ ☐ จัดผู้ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์

☐ มีการกั้นเขตพื้นที่ทำงานพร้อมติดป้าย "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า"

☐ มีการตรวจวัดก๊าซ

O2...19.50... %(19.5% - 23.5%) CO...-... ppm(<50 ppm)

SO2...-... ppm(<5 ppm) NH3...-... ppm(<50 ppm)

H2S...-... ppm(<20 ppm) LEL หรือ LFL...-... %(<10 % LEL)

DT...-... DEG C(<40 DEG C หรือตามสภาพอากาศ)

อื่น ๆ.....

อันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน

☐ ขาดอากาศหายใจ ☐ ไฟไหม้/ระเบิด

☐ วัสดุกระเด็น/ตก/กระแทก ☐ เสียงดัง

☐ สูดดม/สัมผัสสารเคมี ☐ สัมผัสรังสี

☐ ตกจากที่ต่างระดับ สะดุด/ลื่นล้ม ☐ ถูกของมีคม แทง/ตัด/บาด

☐ สัมผัสไฟฟ้า ☐ อื่นๆ ระบุ..

วิธีการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. วิทยุสื่อสาร ช่อง.....
2. โทรศัพท์มือถือ เบอร์ .....
3. อื่น ๆ ระบุ.....

วิธีการหลีกหนีภัย

1. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้หยุดงานและออกจากสถานที่อับอากาศโดยทันที
2. ตรวจนับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ให้ผู้ควบคุมงานทราบ
3. ตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุฉุกเฉิน และทำการแก้ไข
4. ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศใหม่ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

☐ **งานติดตั้งนั่งร้าน**

☐ มีรายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดประกอบการออกแบบติดไว้บริเวณที่มีการใช้นั่งร้าน

☐ ติดใบอนุญาตใช้นั่งร้าน การทดสอบตรวจสอบนั่งร้าน ป้านเตือนอันตราย ป้ายบังคับ หน้าทางขึ้น

☐ ห้ามทำงานบนนั่งร้านเมื่อพื้นลื่นหรือมีพายุฝน

☐ กั้นบริเวณและติดตั้งป้านเตือนอันตราย

☐ กรณีทำงานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกัน มีการป้องกันอันตรายต่อผู้ที่ทำงานอยู่ชั้นล่าง

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/ แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แผนการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2569

ตารางแผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน และการซ้อมแผนฟื้นฟูความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

ลำดับ	ISO 14001	ISO 45001	BCM	แผนการฝึกซ้อม	ระดับความรุนแรง	สถานที่ซ้อม	ผู้รับผิดชอบแผน	กำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน (วัน / เดือน / ปี)											
								ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
								ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร SUS-81	หปถม1-พ.												
2	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Boiler Unit 8,11	หตม2/1-พ.												
3	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Ball Mill 47	หตชม1-พ.												
4	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Turbine Unit 8,11	หตม2/3-พ.												
5	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร ZS-3	หอจม1-พ.												
6	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร 89ZS4	หอจม2-พ.												
7	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Workshop ZW 1,3	หปกร-ธ.												
8	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคารสำนักงานแผนก หปอม-พ. (ตึกเขียว)	หปอม-พ.												
9	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Turbine Unit 8,11	หตม2/2-พ.												
10	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร TRANSFER 2 UNIT 14	หอจม3-พ.												
11	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Boiler Unit 8,11	หตม2/4-พ.												
12	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร STACKER 2	หปถม2-พ.												
13	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร FGD Unit 11	หตชม2-พ.												
14	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร WorkShop ZW-1	หรพม-พ.												
15	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Workshop หปพม2-พ.	หบพม2-พ.												
16	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคารสำนักงานแผนก หงบม-พ.	หงบม-พ.												
17	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Workshop กบรม4-พ. (อาคารใหม่)	หบพม4-พ.												
18	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร WorkShop หบคม-พ.	หบคม-พ.												
19	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคารสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	หสลม-พ.												
20	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	ห้องพักผู้ควบคุมงาน ZT-91	หปถม-พ.												
21	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	ห้อง Sever อาคารบริการ	หบตน1-ท.												
22	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคาร Turbine Unit 8,11	หตม2/1-พ.												
23	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	หรพม-ย.												
24	✓	✓		แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 1	ห้องบรรจุอากาศช่วยหายใจ (SCBA)	หรปม-พ.												

ตารางแผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน และการซ้อมแผนฟื้นฟูความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

ลำดับ	ISO 14001	ISO 45001	BCM	แผนการฝึกซ้อม	ระดับความรุนแรง	สถานที่ซ้อม	ผู้รับผิดชอบแผน	กำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน (วัน / เดือน / ปี)											
								ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
								ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
49	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 2	อาคารชั่วคราว กองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือ	กอน-ห.												
50	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี	ระดับ 2	อาคาร Boiler Unit 4	หวบม-พ. / กบรม5-พ.												
51	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินความมั่นคงทางรังสี	ระดับ 2	อาคาร FGD Unit 11	หตชม3-พ. / กปชม-พ.												
52	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล	ระดับ 2	อาคาร ZL Unit 11	หอจม3-พ. / กชนม-พ.												
53	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล	ระดับ 2	อาคาร G21	หตม1/3-พ. / กลม1-พ.												
54	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 2+	Fuel oil Tank	หตม1/1-พ. / กลม1-พ.												
55	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ	ระดับ 3	Light Storage Tank (ZU)	หตม2/3-พ. / กลม2-พ. / อพม.												
56	✓	✓	✓	แผนรองรับเหตุฉุกเฉินการก่อวินาศกรรม	ระดับ 3	Light Storage Tank (ZU)	หรปม-พ. / อพม.												

ผู้จัดทำ .....
(น.ส.จุไรรัตน์ ฮีไหล)
หปอม-พ.
วันที่ 6 มกราคม 2569

ผู้อนุมัติ .....
(นายนิรันดร์ เขียวดี)
วศ.11 ชพพ2. ผู้แทนฝ่ายบริหาร
วันที่ 12 มกราคม 2569

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

หนังสือรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

ที่ กฟผ. S๑๑๔๐๐๑/๔๕๙๐๗

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
อ้างถึง หนังสือ ที่ กฟผ. S๑๑๔๐๐๑/๓๗๒๘๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กภ.รง.๒)
๒. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กภ.จ.๒)
๓. รายชื่อวิทยากร
๔. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๓ ทั้งนี้ อนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

กฟผ. ได้ดำเนินการ "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑๔๐ คน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ๘๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐ ในการนี้ กฟผ. จึงใคร่ขอส่งรายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกลักษณ์ ภูไพบูลย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย
ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กองปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๒๑๒ ๐ ๒๔๓๖ ๕๐๑๓
โทรสาร ๐ ๒๔๓๖ ๔๒๙๗
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แบบฟอร์มการตรวจระบบดับเพลิงชนิดมือถือ

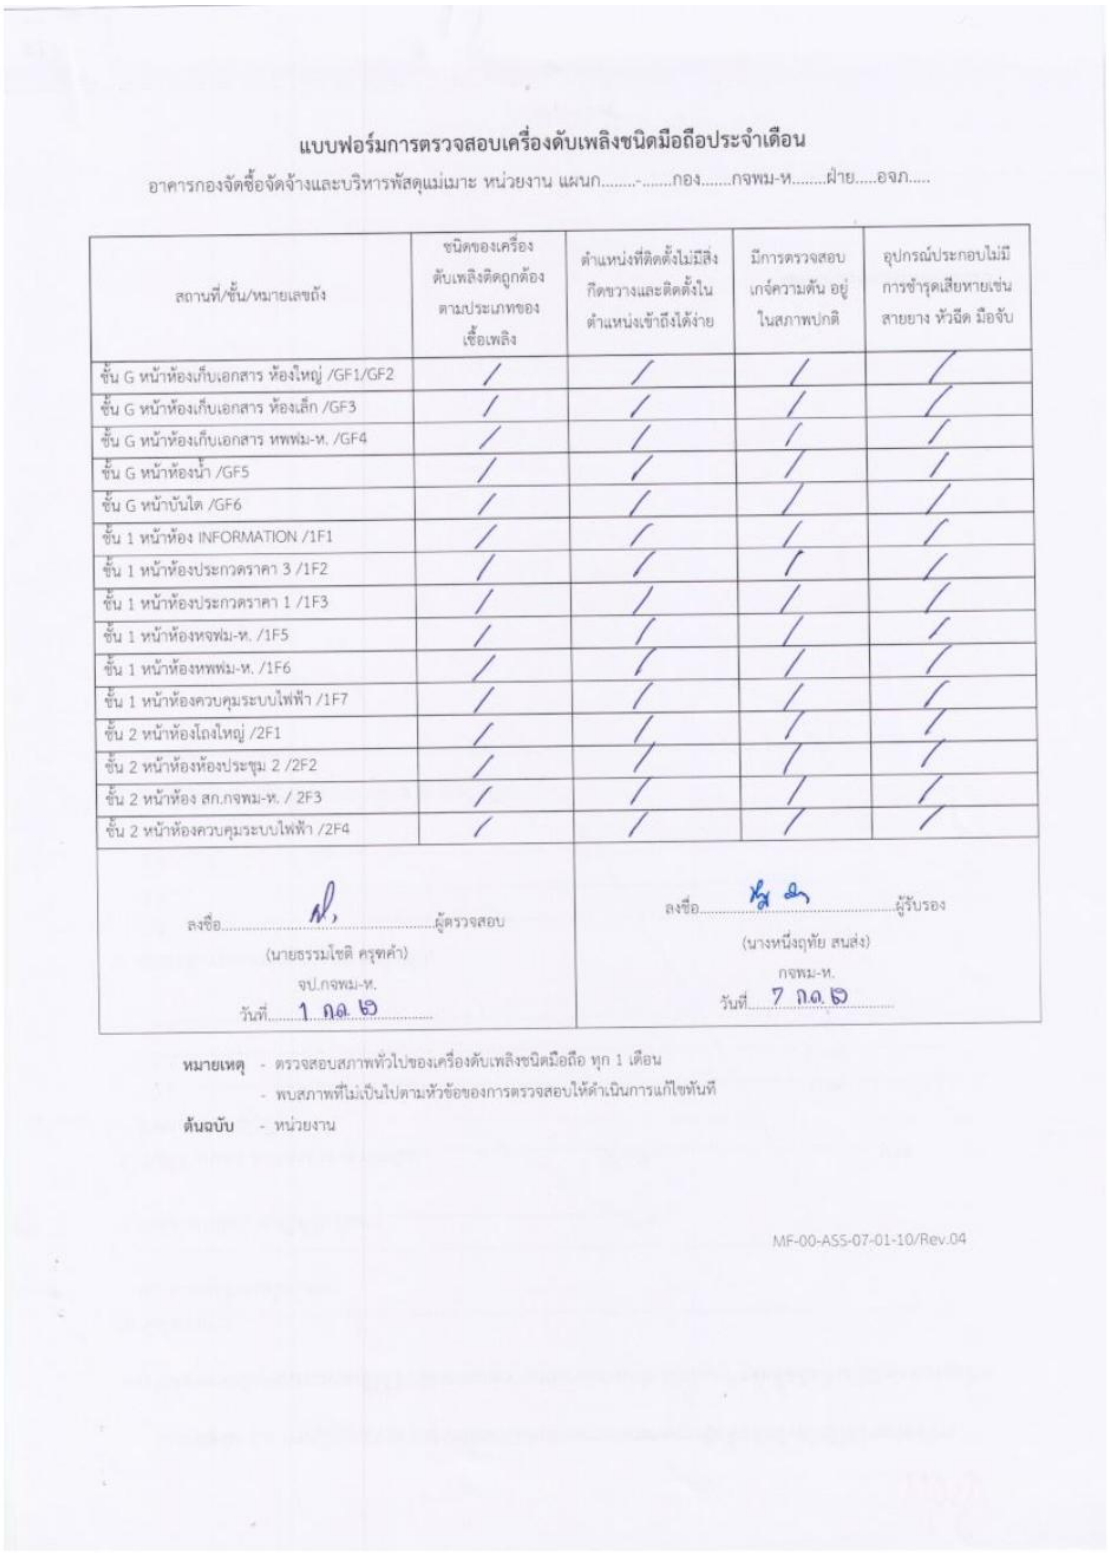

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือประจำเดือน

อาคารกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะ หน่วยงาน แผนก.....-.....กอง.....กจพม-ห.....ฝ่าย.....อจภ.....

สถานที่/ชั้น/หมายเลขถัง	ชนิดของเครื่องดับเพลิงติดถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งไม่มีสิ่งกีดขวางและติดตั้งในตำแหน่งเข้าถึงได้ง่าย	มีการตรวจสอบเกจ์ความดัน อยู่ในสภาพปกติ	อุปกรณ์ประกอบไม่มีการชำรุดเสียหายเช่น สายยาง หัวฉีด มือจับ
ชั้น G หน้าห้องเก็บเอกสาร ห้องใหญ่ /GF1/GF2	/	/	/	/
ชั้น G หน้าห้องเก็บเอกสาร ห้องเล็ก /GF3	/	/	/	/
ชั้น G หน้าห้องเก็บเอกสาร กพพม-ห. /GF4	/	/	/	/
ชั้น G หน้าห้องน้ำ /GF5	/	/	/	/
ชั้น G หน้าบันได /GF6	/	/	/	/
ชั้น 1 หน้าห้อง INFORMATION /1F1	/	/	/	/
ชั้น 1 หน้าห้องประกวดราคา 3 /1F2	/	/	/	/
ชั้น 1 หน้าห้องประกวดราคา 1 /1F3	/	/	/	/
ชั้น 1 หน้าห้องกจพม-ห. /1F5	/	/	/	/
ชั้น 1 หน้าห้องกพพม-ห. /1F6	/	/	/	/
ชั้น 1 หน้าห้องควบคุมระบบไฟฟ้า /1F7	/	/	/	/
ชั้น 2 หน้าห้องโถงใหญ่ /2F1	/	/	/	/
ชั้น 2 หน้าห้องห้องประชุม 2 /2F2	/	/	/	/
ชั้น 2 หน้าห้อง สก.กจพม-ห. / 2F3	/	/	/	/
ชั้น 2 หน้าห้องควบคุมระบบไฟฟ้า /2F4	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธรรมโชติ ครุฑคำ)
จป.กจพม-ห.
วันที่ 1 ก.ค. 67

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางหนึ่งฤทัย สนส่ง)
กจพม-ห.
วันที่ 7 ก.ค. 67

หมายเหตุ - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ทุก 1 เดือน
- พบสภาพที่ไม่เป็นไปตามหัวข้อของการตรวจสอบให้ดำเนินการแก้ไขทันที

ต้นฉบับ - หน่วยงาน

MF-00-ASS-07-01-10/Rev.04

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบพิเศษ

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบพิเศษ

ประจำหน่วยงานแผนก.....กอง.....กบรม2-ฟ.....ฝ่าย.....อรม.....

ลำดับที่	รายการอุปกรณ์ระบบพิเศษ	ความถี่การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง- ขับด้วยเครื่องยนต์ -ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า- เครื่องสูบน้ำ		
2	หัวรับน้ำดับเพลิง(Fire department connections)	ทุก 1 เดือน	จป.กบรม2-ฟ.
3	หัวดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants)	ทุก 1 เดือน	หรปม-ฟ
4	ถังน้ำดับเพลิง-ระดับน้ำ-สภาพถัง		
5	สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด(Hose and hose station)	ทุก 1 เดือน	จป.กบรม2-ฟ.
6	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ(Sprinkler system)		
7	เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ	ทุก 1 เดือน	จป.กบรม2-ฟ.
8	ระบบดับเพลิงพิเศษ - ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent Fire Extinguishing Systems) (FM200,Pyrogen,Nitrogen)		
9	ระบบดับเพลิงพิเศษ - ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง (Carbon Dioxide Extinguishing Systems)		
10	ระบบดับเพลิงพิเศษ - ระบบโฟมดับเพลิง(Fire Foam Extinguishing Systems)		
11	ระบบดับเพลิงพิเศษ - ระบบก๊าซฮาลอนดับเพลิง(Halon Extinguishing Systems)		
12	ระบบดับเพลิง (Fire Fighting)		
13	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		
14	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ทุก 1 เดือน	จป.กบรม2-ฟ.
15	ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน		
16	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	ทุก 1 เดือน	จป.กบรม2-ฟ.
17	โคมไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน	ทุก 1 เดือน	จป.กบรม2-ฟ.
18	เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศติดตัว(SCBA)		
19	อื่นๆ		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นายธีรชัย นินนาทนนท์) สังกัด กบรม2-ฟ. วันที่ 6/1/69	ลงชื่อ ผู้รับรอง (.....) (นายชาญณรงค์ ชัยอาจ) วศ.10 ผู้อำนวยการแผน กบรม2-ฟ. วันที่ 6 ม.ค. 69

ต้นฉบับ - หน่วยงาน

สำเนา - หปอม-ฟ.

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

แผนปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569

ชื่อแผน	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม.		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน	เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน		% ความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม	100%
ผู้รับผิดชอบของแผน	รฟม.			

กิจกรรม	น้ำหนัก		ปีงบประมาณ																				ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
			2568			2569													2570				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
1. งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ																							
1.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2568	2	แผน				2.0																	ทปอม-พ.
		จริง																					
1.2 ทบทวนนโยบายและแผนงานปี 2568 และจัดทำนโยบายและแผนปี 2569	1	แผน	1.0																				ทปอม-พ.
		จริง																					
1.3 นำนโยบายและแผนปี 2569 เสนอ คปอ-พ.ม. พิจารณา	1	แผน		1.0																			ทปอม-พ.
		จริง																					
1.4 ลงนามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1	แผน			1.0																		ชพฟ2. อพม., อรม. คปอ.
		จริง																					
1.5 ถ่ายทอดนโยบายฯ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	1	แผน				1.0																	อพม., อรม., สก.ชพฟ2.
		จริง																					
2. งานด้านการอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ																							
2.1 แจ้ง อคค. เพื่อจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย ปี 2569	1	แผน	1.0																				ทปอม-พ.
		จริง																					
2.2 ติดตามผลการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยปี 2569	6	แผน				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						ทปอม-พ.
		จริง																					
2.3 ประชุม/สวนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	6	แผน				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						ทปอม-พ.จป.
		จริง																					
3. งานด้านการรณรงค์และกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย																							
3.1 กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยนอกงาน	1	แผน							0.5								0.5						ทปอม-พ.
		จริง																					
3.2 กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยงาน MO/MVI	9	แผน				1.0	1.0	1.0				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						ทุกกองที่เกี่ยวข้อง,จป.บริหาร,จป.เทคนิค จป.หัวหน้างาน, ผู้ปฏิบัติงาน
		จริง																					
3.3 วันความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	1	แผน														1.0							ทุกกองในโรงไฟฟ้า,จป.บริหาร จป.เทคนิค,จป.หัวหน้างาน,ผู้ปฏิบัติงาน
		จริง																					

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2569 (ต่อ)

กิจกรรม	น้ำหนัก		ปีงบประมาณ																ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
			2568			2569											2570		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
3.4 ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติและดูงานสถานประกอบการภายนอก	แผน	1										1.0									จป.เทคนิค , จป.บริหาร
	จริง																				จป.หัวหน้างาน,หปอ.-พ.
3.5 ระดับกอง , จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยฯ และกิจกรรมตามแผน	แผน	12				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				หัวหน้ากอง , หัวหน้าแผนก
	จริง																				จป.ว , จป.เทคนิค, จป.บริหาร
3.6 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)	แผน	12				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				ทุกแผนก
3.6.1 เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. (5 ส. FOR SAFETY)	จริง																				
3.6.2 เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานด้วยกิจกรรม Safety talk Box Tool และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร																					
3.6.3 เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานด้วยกิจกรรมหยุดงานเพื่อความปลอดภัย (Stop work)																					
3.7 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย	แผน	12				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				ทรพ.น-ย. , หปอ.-พ.
	จริง																				
4. งานด้านการซ้อมแผนฉุกเฉิน																					
4.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติการ และการสื่อสารภาวะวิกฤต	แผน	1									1.0										อพม.
	จริง																				
4.2 ทบทวนบทบาทหน้าที่การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต	แผน	1									1.0										อพม.
	จริง																				
4.3 งานซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 รพม.	แผน	3									3.0										กผม.2-พ. ,หปอ.-พ.
	จริง																				
5. งานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ																					
5.1 รายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานราชการ	แผน	12				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				หปอ.-พ.
	จริง																				
5.2 รายงานข้อมูลด้านอุบัติภัยสาธารณภัยต่อหน่วยงานราชการ	แผน	12				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				หปอ.-พ.
	จริง																				
6. การประเมินแผนปฏิบัติการ	แผน	4						1.0			1.0			1.0			1.0				หปอ.-พ.
	จริง																				
รวม		100																			
งานตามแผน (%)	ปริมาณแต่ละเดือน		2.0	1.0	1.0	10.0	7.0	8.0	6.5	6.0	12.0	8.0	7.0	8.0	7.0	8.0	8.5				
	ปริมาณงานสะสม		2.0	3.0	4.0	14.0	21.0	29.0	35.5	41.5	53.5	61.5	68.5	76.5	83.5	91.5	100.0				
งานที่ปฏิบัติได้จริง	ปริมาณแต่ละเดือน																				
	ปริมาณงานสะสม																				

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ เรื่อง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูความต่อเนื่องทางธุรกิจ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง	หมายเลขเอกสาร : MP-00-ASS-07
	การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการฟื้นฟูความต่อเนื่องทางธุรกิจ	การแก้ไขครั้งที่ : 12
		วันที่เริ่มใช้ : 2 ... พ.ย. 2568
	จัดทำโดย : แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผ่นที่ : 1/21

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และการฟื้นฟูความต่อเนื่องทางธุรกิจ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

ตัวอย่าง แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ และป้องกันรักษาอุปกรณ์สารเคมี ปี 2569

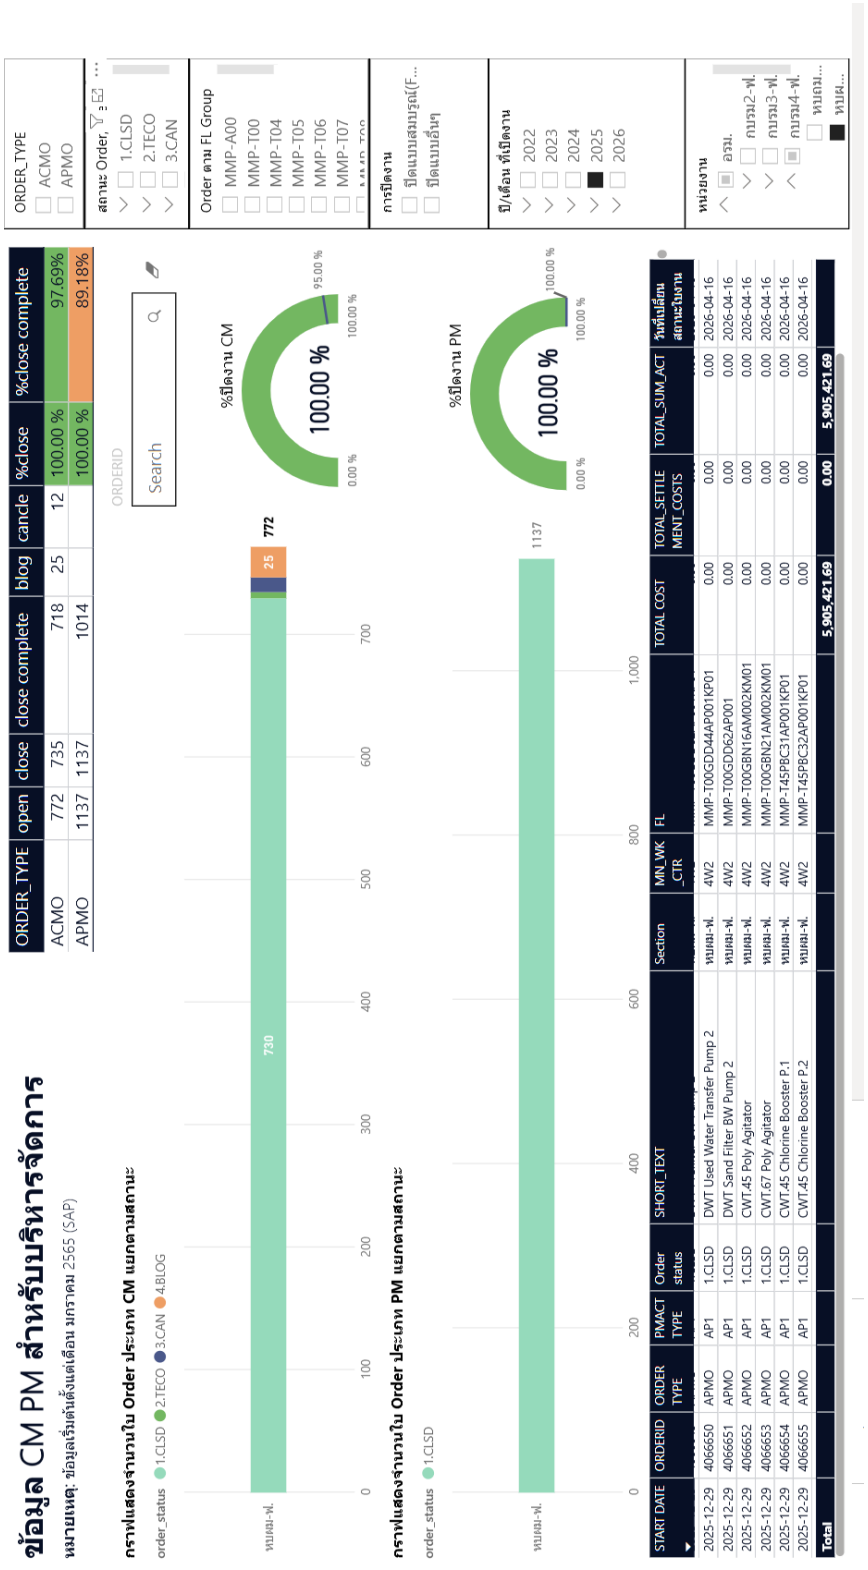

START DATE	ORDERID	ORDER TYPE	PMACT TYPE	Order status	SHORT_TEXT	Section	MN_WK_CTR	FL	TOTAL COST	TOTAL_SETTLEMENT_COSTS	TOTAL_SUM_ACT	วันที่แก้ไขสถานะในงาน
2025-12-29	4066650	APMO	AP1	1.CLSD	DWT Used Water Transfer Pump 2	หมดอา-พ.	4W2	MMP-T00GDD44AP001KP01	0.00	0.00	0.00	2026-04-16
2025-12-29	4066651	APMO	AP1	1.CLSD	DWT Sand Filter BW Pump 2	หมดอา-พ.	4W2	MMP-T00GDD62AP001	0.00	0.00	0.00	2026-04-16
2025-12-29	4066652	APMO	AP1	1.CLSD	CWT.45 Poly Agitator	หมดอา-พ.	4W2	MMP-T00GBN16AM002KM01	0.00	0.00	0.00	2026-04-16
2025-12-29	4066653	APMO	AP1	1.CLSD	CWT.67 Poly Agitator	หมดอา-พ.	4W2	MMP-T00GBN21AM002KM01	0.00	0.00	0.00	2026-04-16
2025-12-29	4066654	APMO	AP1	1.CLSD	CWT.45 Chlorine Booster P.1	หมดอา-พ.	4W2	MMP-T45PBC31AP001KP01	0.00	0.00	0.00	2026-04-16
2025-12-29	4066655	APMO	AP1	1.CLSD	CWT.45 Chlorine Booster P.2	หมดอา-พ.	4W2	MMP-T45PBC32AP001KP01	0.00	0.00	0.00	2026-04-16
Total									5,905,421.69	0.00	5,905,421.69	

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แผนลดอุบัติเหตุด้านบุคคลและทรัพย์สินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แบบฟอร์ม 2 : กิจกรรมหลักและกำหนดเวลาของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการรวมถึงเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของกิจกรรม

ชื่อแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ : ลดอุบัติเหตุด้านบุคคลและทรัพย์สิน

ผลผลิตของแผน (Output)	เป้าหมาย										คำอธิบายตัวชี้วัด
	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	
1. ค่าดัชนีประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงาน (DII x 1000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. DII คือค่าดัชนีการประสบอันตรายของผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง กฟผ.
2. ความสูญเสียด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (บาท/GWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2. มูลค่าความสูญเสียซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุของเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (ที่ได้ประกันภัยไว้กับบริษัท) ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ เป็น X บาทต่อ 1 ล้านหน่วยผลิตไฟฟ้า (GWh.)

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ปี 2569												2570	2571	2572	2573	ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
1	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ฝ่าย/กอง/แผนก
2	การปฏิบัติงานตามแผนงาน คปอ.พม.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ทปอ.พ.
3	ผู้บริหารตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ฝ่าย/หัวหน้ากอง/หัวหน้าแผนก)	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37					อพม./อรม.
4	การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย(Safety Talk Box Tool พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร, Morning Talk ,5 ส for Safety)	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ทปอ.พ./หน่วยงาน
5	การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (สวมใส่ PPE 100 %)	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ทปอ.พ./หน่วยงาน
6	ประชุมชี้แจงผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37					ทปอ.พ.
7	การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในงาน MI/MO/งานสับคาห์ ความปลอดภัยในการทำงาน/งานรณรงค์ความปลอดภัยฯ นอกงาน	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37					ทุกกอง ที่เกี่ยวข้อง (อพม., อรม.),ทปอ.พ.
8	ชี้แจงผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนเข้าทำงาน	5	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41					ทปอ.พ./หน่วยงานผู้ควบคุมสัญญาจ้าง
9	Program Tag & Work Permit Online 100% 9.1 การจัดทำ Program Tag & Work Permit Online 9.2 หน่วยงานใช้ Program Tag & Work Permit Online	4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37					อพม. อรม.
10	พฤติเพื่อความปลอดภัย (STOP WORK for SAFETY)	3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25					ทปอ.พ./หน่วยงานผู้ควบคุมสัญญาจ้าง
11	สนับสนุนให้ จป.หัวหน้างาน ทำหน้าที่ตามกฎหมาย 10 ข้อ ควบคู่ไปกับงานประจำ	3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25					อพม. อรม.
12	ประสานงานตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ทปอ.พ.
13	ตรวจสอบระบบ Fire Protection ทุกอาคารให้พร้อมใช้งาน(ระบบน้ำและระบบไฟ)	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ทุกกอง (อพม., อรม.)
14	ตรวจทดสอบและซ่อมบำรุง ระบบFire Alarm ทุกอาคารในโรงไฟฟ้า	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					ทปอ.พ.
15	กิจกรรมลดความสูญเสียด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					อพม. อรม.

เอกสารที่ ค-14

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและเชื้อเพลิง

อบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายจากการได้รับสารเคมี รวมทั้งแนวทางแก้ไข

ปี 2569 จะดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง โดยในปี 2568 มีได้ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายจากการได้รับสารเคมี รวมทั้งแนวทางแก้ไข หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย จำนวน 4 รุ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568, 29 กรกฎาคม 2568, 18 สิงหาคม 2568 และ 27 สิงหาคม 2568 Online ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าอบรม จำนวน 30 คน

รูปภาพการอบรม

รุ่นที่ 1/2568 วันที่ 18 กรกฎาคม 2568



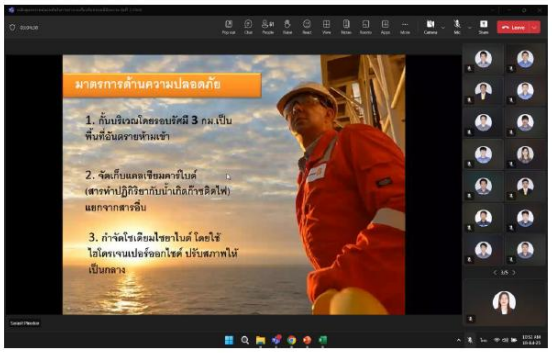

รุ่นที่ 2/2568 วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

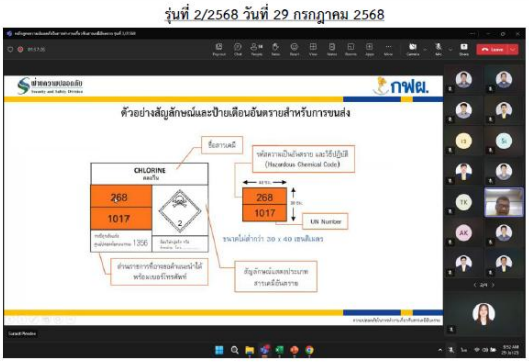

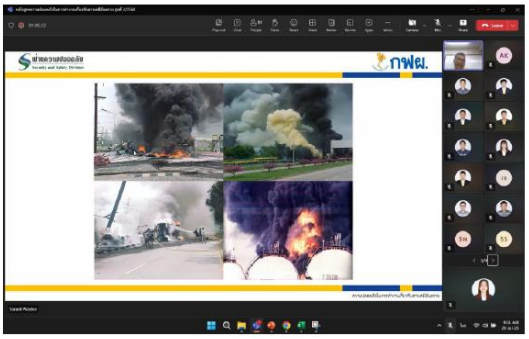

รุ่นที่ 3/2568 วันที่ 18 สิงหาคม 2568

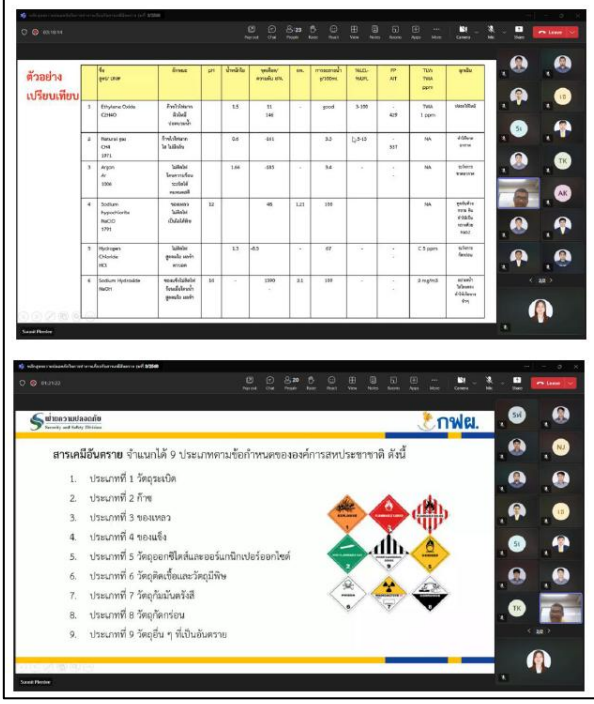

รุ่นที่ 4/2568 วันที่ 27 สิงหาคม 2568

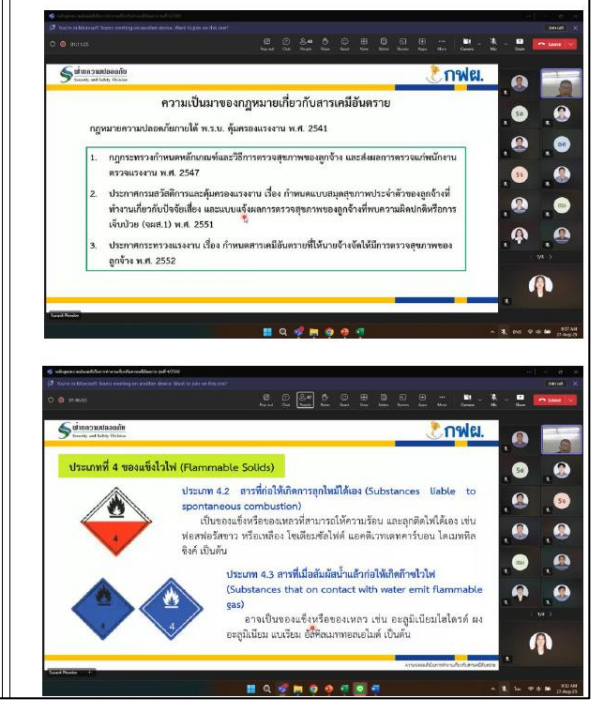

นอกจากนี้ กฟผ. ได้มีการจัดอบรม ในรูปแบบออนไลน์ (ELS) หลักสูตร โรคจากการทำงาน อันตรายจากเสียงและสารเคมี ให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปรับการอบรมในระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการสรุปผลการอบรมในช่วงธันวาคมของทุกปี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและเชื้อเพลิง

การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมี และเอกสารคู่มือวิธีการใช้งาน

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ระบบมาตรฐานการจัดการ เรื่อง การเดินอุปกรณ์ด้านหม้อน้ำ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	คู่มือการทำงานเรื่อง	หมายเลขเอกสาร : MI-00-OP23-00-05
	การเดินอุปกรณ์ด้านหม้อน้ำ	การแก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่เริ่ม : 11 ม.ค. 2554
	จัดทำโดย : หดม2/3-ฟ.	แผ่นที่ : 1 / 43

โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

การเดินอุปกรณ์ด้านหม้อน้ำ

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โดยปี 2569 จะดำเนินการทดสอบ ในช่วง 6 เดือนหลัง

ที่ กฟผ.S๔๒๑๐๐/๗๓๐๖๔

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ๘๐๐ ม.๖ ต.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง ๕๒๒๒๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรับรองความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้หยุดเดินเครื่องตามแผน เพื่อดำเนินการเข้าตรวจทดสอบสภาพหม้อน้ำโดยการอัดน้ำ โรงไฟฟ้าเครื่องที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีผู้ตรวจทดสอบ คือ นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ วิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ทะเบียนเลขที่ ๖-๖๗-๑๘๔๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขทะเบียน สก.๔๕๙๑

ผลการตรวจทดสอบสภาพหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘ สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สาระไชย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-๒
ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทรศัพท์ : ๐ ๕๔๒๕ ๒๐๙๐
โทรสาร : ๐ ๕๔๒๕ ๒๐๘๖
อีเมล์ : Jurairad.t@egat.co.th

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โดยปี 2569 จะดำเนินการทดสอบ ในช่วง 6 เดือนหลัง (ต่อ)

หบนม3-ฟ.
ECM 128
รับที่
ส่งที่ 17 ต.ค. 2568

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บันทึก

จาก หบนม3-ฟ.	เรียน ชฟฟ2. ผ่าน อรม. ช.อรม-1. กบรม3-ฟ.
เรื่อง ขอส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8	(นายเชิดชัย วิชา) รก(นายชัชวาล เตียวกุล) ช.อรม-1. ทำการแทน อรม. กบรม3-ฟ. 22 ต.ค.68
วันที่ 16 ตุลาคม 2568	

เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 ได้ทำการหยุดบำรุงรักษาตามวาระ {450} Minor Inspection MM-T08 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2568 - 20 ตุลาคม 2568 ในส่วนของหม้อไอน้ำต้องมีการตรวจทดสอบรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำหลังจากมีการตรวจซ่อมหรือแก้ไข ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหม้อน้ำ โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศขอกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ทำการตรวจทดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ใช้แรงดันทดสอบด้วยน้ำ 200 bar(g) และทดสอบปรับตั้งลิ้นนิรภัยระหว่าง Start Up ให้เปิดระบายไอน้ำที่ 193.75 bar(g) ผลผ่านการทดสอบโดยไม่พบข้อบกพร่อง และสามารถใช้งานได้ปลอดภัย

จึงใคร่ขอ ชฟฟ2. ลงนามในส่วนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ เพื่อที่จะให้ทาง หปอม-ฟ. นำส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ)
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8

เรียน หปอม-ฟ
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ)
ชฟฟ2. 24/10/68

สำเนา : หปอม-ฟ., กบรม5-ฟ., กบรม2-ฟ., กผม2-ฟ., หบนม2-ฟ.,
หปนร-ธ., วิศวกรอำนวยการใช้หม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (นายธีวินท์ ปลั่งศรีนนท์ : หบนม2-ฟ.)

นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ หบนม3-ฟ., กบรม3-ฟ., อรม. โทร. 04-744-3330, 087-1798604
E-mail: siripong.sun@egat.co.th

ตัวแทน หปอม-ฟ.

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โดยปี 2569 จะดำเนินการทดสอบ ในช่วง 6 เดือนหลัง (ต่อ)

1

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส.....
เลขที่รับ.....วันที่.....
(ช่องที่1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

ข้าพเจ้า.....นายสิริพงศ์...สังข์เจริญ.....อายุ .....38.....ปี อาชีพ.....พนักงานรัฐวิสาหกิจ.....
พักอยู่บ้านเลขที่....1942/58 .....หมู่ ...-.....ตรอก/ซอย.....3 (รอบเวียง).....ถนน.....-. .....
ตำบล/แขวง.....สวนดอก.....อำเภอ/เขต.....เมือง.....จังหวัด.....ลำปาง.....โทรศัพท์.....087-1798604.....
สถานที่ทำงาน.....การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ....ตั้งอยู่ ณ.. ต.แม่เมาะ.....อ.แม่เมาะ...จ.ลำปาง.....โทรศัพท์.....0-5425-3330.....
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
เลขทะเบียน สก/วก/ขก...4591....ตั้งแต่วันที่...29.. ก.ย...2568....ถึงวันที่...28.. ก.ย..2573....และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ ตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมนี้ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ
เลขทะเบียน .. 6 -67 - 1846... หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2571

ข้าพเจ้าได้ทำการอัดน้ำทดสอบและตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำของโรงงาน [.....โรงไฟฟ้าแม่เมาะ.....]
ที่อยู่เลขที่.....800..... หมู่ที่..... 6.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....การไฟฟ้า.....
ตำบล / แขวง.....แม่เมาะ.... อำเภอ / เขต .....แม่เมาะ.....จังหวัด.....ลำปาง.....โทรศัพท์.....0-5425-2000..... .....
ประกอบกิจการ.....ผลิตพลังงานไฟฟ้า.....ทะเบียนโรงงานเลขที่ [.....10520200125412.....] หมดอายุ.....31ธันวาคม 2570.....
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ.....การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.....จำนวนคนงาน.....2,210.....คน
ตรวจทดสอบเรียบร้อยเมื่อวันที่.....16 ตุลาคม 2568.....เวลา...12.00..น. .... โรงงานนี้มีหม้อไอน้ำทั้งหมด.....8.....เครื่อง
หม้อไอน้ำเครื่องนี้หมายเลข [.....8.....] ขณะตรวจ หม้อไอน้ำเครื่องอื่นสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☐ หยุด

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจทดสอบสภาพหม้อน้ำเครื่องนี้โดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Test) ที่ความดันไม่น้อยกว่าเกณฑ์การอัดน้ำทดสอบตามที่ระบุในหน้าที่ 4 ของเอกสารนี้ และขอรับรองว่าหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ำเป็นไปตามรายละเอียดแสดงไว้ในหน้า 2 และ 3 ของเอกสารนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและหรือทดสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย **เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ตรวจสอบ** ที่ความดัน **ซึ่งได้ปรับตั้งลิ้นนิรภัยให้เปิดระบายไอที่ความดันไม่เกิน** [.....193.75 BAR.....] ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
(นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ก่อนการตรวจทดสอบฯ โปรดอ่านรายละเอียดในหน้า 4 ของเอกสารนี้

หม้อไอน้ำเครื่องนี้ เป็นหม้อไอน้ำ ☐เรือ ☐ รถไฟ ☐ ลูกหมู ☐ ท่อน้ำขวาง ☐ ท่อไฟนอน (Package)
☐ ดัดแปลงเตาจากหม้อไอน้ำแบบ.....-.....อื่น ๆ (ระบุ).....WATER-COOLED FURNACE .....ใช้งานมาแล้ว.....30.....ปี
หมายเลขเครื่อง.....8.....สร้างโดย.....CE,CANADA..... .....โดยออกแบบความดันสูงสุดไว้ที่.....230 BAR.....
อุณหภูมิ..SUPERHEAT...STEAM...อัตราการผลิตไอ.....954 ตัน/ชม..... พื้นที่ผิวรับความร้อน...[.....27,954 ตารางเมตร.....]
แรงม้าหม้อไอน้ำ.....62,010 BHP.....การเคลื่อนย้ายหม้อไอน้ำ ☒ ไม่เคย ☐เคย เมื่อ.....-.....
จาก (ที่ใด).....-.....

1. ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ.....นายนพพร ฉัตรแก้ว.....ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่.....104-060-27998.....หมดอายุ .....พ.ศ. 2568.....
2. ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ.....นายศราวุธ คำปันบุตร .....ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่.....104-060-36205.....หมดอายุ ....พ.ศ. 2569.....
3. ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ.....นายสมศักดิ์ ปินตา.....ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่.....104-060-48522.....หมดอายุ ....พ.ศ. 2571.....

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โดยปี 2569 จะดำเนินการทดสอบ ในช่วง 6 เดือนหลัง (ต่อ)

4. ตัวหม้อไอน้ำ

การต่อแผ่นเหล็กหม้อไอน้ำ เป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ หมุดย้ำ เปลือกหม้อไอน้ำหนา.....-. .....

ฉนวนหุ้มหม้อไอน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ ใยแก้ว ☐ Asbestos ☐ อิฐทนไฟ ☒ อื่น ๆ.....ROCK WOOL.....

ขนาดหม้อไอน้ำ ∅ .....- ...ยาว.....- .....ท่อไฟใหญ่ ขนาด .....-..... ยาว.....-.....หนา.....-.....จำนวน.....-.....ท่อ

ท่อไฟเล็กขนาด ∅.....-.....ยาว.....-.....จำนวน.....-.....ท่อ, ท่อไฟเล็กขนาด ∅.....-.....ยาว.....-.....จำนวน.....- .....ท่อ

ท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ) ขนาด ∅.....1.5,1.75,2,2.25,2.5" .....ยาว.....-.....จำนวน.....-.....ท่อ

ผนังเตาขนาด...13.83 x 15.32 x 73.97 ม (กxยxส) .....หนา.....-.....ผนังด้านหน้า-หลัง (End Plates) หนา.....-.....

ถังพักไอ (Header or Steam Dome) ขนาด ∅.....1.778 เมตร ....ยาว....15.516 เมตร.....

ช่องคนลง (Man Hole) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน....หลาย....ช่อง , ช่องมือลอด (Hand Hole) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน...หลาย...ช่อง

ช่องทำความสะอาดท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำตั้งแบบท่อน้ำขวาง) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน.....- .....ช่อง

เหล็กยึดโยงเป็นแบบ ☐Stay Rod ขนาด ∅.....- ..... จำนวน.....-.....ชุด

☐Stay Tube ขนาด ∅.....- ..... จำนวน.....-.....ชุด

☐Gusset Stay หนา.....-...ด้านหน้า.....-.....ชุด ด้านหลัง.....-.....ชุด

☒อื่น ๆ .....BUCK STAY.....จำนวน.....16.....ชุด

5. สภาพอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำ

5.1 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) มีจำนวน.....11.....ชุด เป็นแบบ

☐ แบบถ่วงน้ำหนัก ขนาด ∅.....-.....ระบายไอน้ำที่ความดัน... 45.1,48.3,49.6,175.5,188.23,

☒ แบบสปริงมีคานงัด ขนาด ∅..2.5"(2ชุด),3"(3ชุด),6"(5ชุด)..ระบายไอน้ำที่ความดัน... 190.7,192,193.75 BAR

☒ แบบ...ไฟฟ้า..... ขนาด ∅2.5"(1ชุด),.....ระบายไอน้ำที่ความดัน... 44.5 BAR

5.2 ระบบความดัน

ความดันใช้งานปรกติ (Working Pressure).....178 ..BAR.....

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) จำนวน.....2.....ชุด สเกลสูงสุดที่อ่านได้.....320 BAR.....

สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน.....-.....ชุด

ตั้งไว้ที่ความดัน.....-..... Diff, Pressure.....- .. ..

5.3 ระบบน้ำ

หลอดแก้วและวาล์วบังคับ มีจำนวน.....2.....ชุด พร้อมท่อระบายจากวาล์วหลอดแก้วถึงระดับพื้น

เครื่องควบคุมระดับน้ำ (Water Level Control) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ ลูกลอย (Float Type) ☐ Electrode

☒ อื่น ๆ (ระบุ).....ELECTRONIC.....จำนวน..... 1.....ชุด (MULTI STAGE)

เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ เป็นแบบ ☐ Reciprocating ☐Turbine ☒ อื่น ๆ.....CENTRIFUGAL.....จำนวน.....3.....ชุด

โดยใช้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ ไอน้ำ ☐ อื่น ๆ .....

วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อน้ำ เข้าหม้อไอน้ำ ขนาด ∅.....300 มม. .....จำนวน.....1.....ชุด

น้ำที่เข้าหม้อไอน้ำ ☐ น้ำประปา ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำบ่อ ☐ น้ำคลอง ☒ อื่น ๆ (ระบุ).....น้ำในเขื่อน.....

กรรมวิธีการปรับสภาพน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ Softener (Resin) ☒เติมสารเคมี ☒อื่น ๆ DEMINERIZATION SYSTEM

คุณสมบัติของน้ำเข้าหม้อไอน้ำ pH=.....8.8 - 9.1..... Hardess =.....0 ppm.....อื่น ๆ(ถ้ามี).....-.....

วาล์วถ่ายน้ำ (Blow Down Valve) ขนาด ∅.....2.5" + 2 "... .จำนวน.....7 + 7.....ชุด

5.4 ระบบการจ่ายไอน้ำ

วาล์วจ่ายไอน้ำ (Main Steam Valve) ขนาด ∅.....350 มม.....จำนวน.....2.....ชุด

วาล์วกันกลับที่ท่อจ่ายไอ (Check Valve) ขนาด ∅.....-.....จำนวน.....-.....ชุด

ท่อจ่ายไอน้ำ (Steam Pipe)ขนาด ∅...381 มม. ...ฉนวนหุ้มท่อจ่ายไอน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ..CALCIUM SILICATE..

5.5 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒มี เป็นแบบ ☐กระดิ่งไฟฟ้า ☐ไซเรน ☒ อื่น ๆ (ระบุ)..ไฟกระพริบและสัญญาณเสียง.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โดยปี 2569 จะดำเนินการทดสอบ ในช่วง 6 เดือนหลัง (ต่อ)

2.6 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ แกลบ ☐ขี้เลื่อย ☐น้ำมันดีเซล ☐น้ำมันเตาเกรด.....-.....☒.อื่นๆ(ระบุ)... ถ่านลิกไนต์.....

ปริมาณการใช้.. 77. กก. / วินาที ต่อหน่วยเวลา) ☒ มีระบบความคุมการจ่ายเชื้อเพลิง เป็นแบบ...DIRECTED FIRED

ขนาดความสามารถ...100 กก./วินาที.. ...การจัดการทิศทางเปลวไฟ ☐1 Pass ☒ 2 Pass ☐ 3 Pass ☐ 4 Pass

ปล่องไฟขนาด ..∅ 5.75 เมตร...สูง...150 เมตร.....ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ ธรรมชาติ ☒ พัดลมขนาด...440 KW.....

สายล่อฟ้า ☐ ไม่จำเป็นต้องมี ☒ จำเป็นต้องมี (☒ มีเหมาะสม ☐ ยังไม่มี)

2.7 ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน .....-.....ชุด

2.8 ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องอุ่นน้ำมัน (Oil Heater ☒ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ.....-.....อุ่นถึงอุณหภูมิ.....-.....

เครื่องอุ่นอากาศ (Air Heater) ☐ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ...REGENERATIVE/TUBULAR.....อุ่นถึงอุณหภูมิ...352°C....

เครื่องอุ่นน้ำ (Economizer) ☐ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ...BARE TUBE/COUNTER FLOW...อุ่นถึงอุณหภูมิ...314°C....

การนำคอนเดนเสตกลับมาใช้ ☐ไม่มี ☒ มี ปริมาณ.....100 %.....

2.9 ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ (Pressure Vessel) ☐ ไม่มี ☒ มี (ระบุ)

เครื่องจักรไอน้ำ ขนาด ∅ ไอดี (High Pressure) .....-.....ขนาด ∅ ไอเสีย (Low Pressure).....-.....

จำนวน.....-.....ชุด

เครื่อง...STEAM TURBINE GENERATOR..จำนวน.....1.....ชุด ใช้ความดัน...158 BAR...☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

เครื่อง.....-.....จำนวน.....-.....ชุด ใช้ความดัน.....-..... ☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

เครื่อง.....-.....จำนวน.....-.....ชุด ใช้ความดัน.....-..... ☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

เครื่อง.....-.....จำนวน.....-.....ชุด ใช้ความดัน.....-..... ☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

รายงานผลการตรวจหม้อน้ำก่อนรับรอง

ท่อไฟใหญ่	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	ท่อไฟเล็ก	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง
ผนังด้านหน้า - หลัง	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	ผนังเตา	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง
เหล็กยึดโยง	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	ช่องมือลอด	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง
ช่องคนลง	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	ท่อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง
เกจวัดความดัน	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	ลิ้นนิรภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง
เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	สวิทช์ควบคุมความดัน	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง
ระบบสัญญาณเตือนภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	เครื่องควบคุมระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง
สภาพตะกรันภายในหม้อไอน้ำ	☒ ไม่มี	☐ มี	☐ มาก	☐ ปานกลาง	☐ น้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่น ๆ

.....- .....

.....

ข้าพเจ้าได้ให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการดำเนินการซ่อมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

.....(วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ)

(นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ)

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โดยปี 2569 จะดำเนินการทดสอบ ในช่วง 6 เดือนหลัง (ต่อ)

MAE MOH POWER PLANT UNIT 08
Boiler Hydrostatic Test
Sunday, October 16, 2568

Page : 1 of 2
Date 16/10/68
File : *MM-T08*

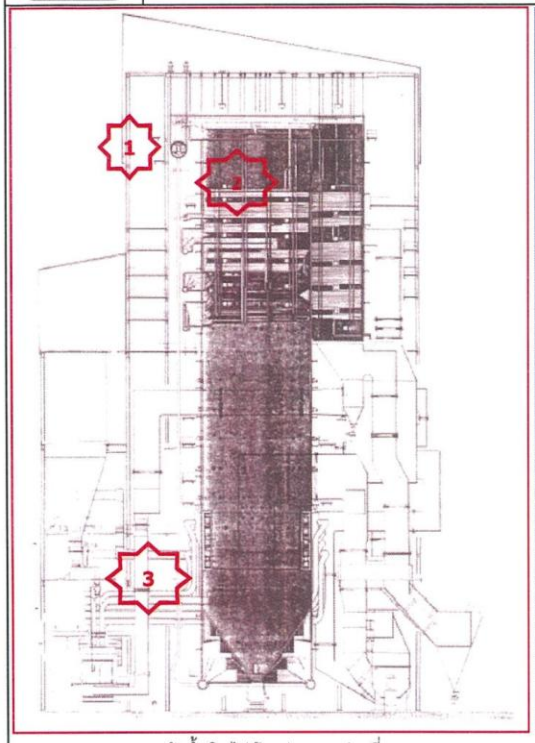

อาคารหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8

1. บริเวณ Steam Drum ของหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 จ.ลำปาง

2. บริเวณ Manhole ตำแหน่ง Superheater Coil ขณะทำการ Hydrostatic Test 16 ต.ค. 68

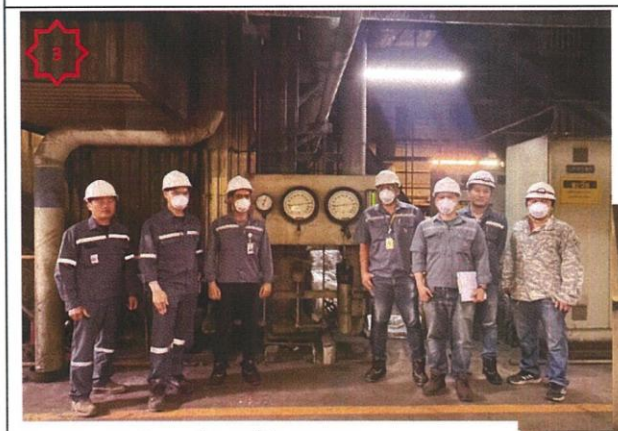

3. ภาพแสดงเกจวัดความดันขณะที่ทำ Hydrostatic Test 16 ต.ค. 68

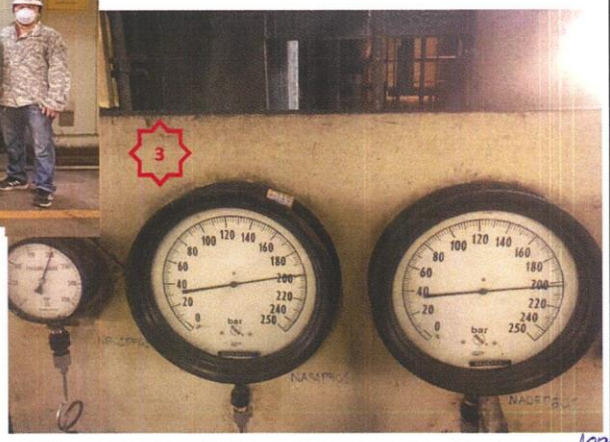

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สภ.4571
16/10/68

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
ที่ ค.๓๐/ 2568
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 "ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน" ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ออกคำสั่ง ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ที่ ค. 2/2568 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ 2 ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-14 ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่ "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ" จำนวน 94 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อ 3 ให้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดูแล ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่

(2) ตรวจความเรียบร้อยของหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนก่อนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่อง

(3) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และค่าควบคุมต่างๆ ตามช่วงระยะเวลา พร้อมจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายงานประจำวัน พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ตลอดเวลา

(4) ควบคุม ดูแล คุณภาพน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำให้เป็นไปตามประกาศเรื่องคุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ

(5) หยุดใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทันที เมื่อพบข้อบกพร่องของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรงและแจ้งให้วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที

(6) ปฏิบัติงานด้านอื่นเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามที่นายจ้างหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม)
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

คำสั่งแต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒
ที่ ค.๒๕/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ และวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ และวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นไปตามระเบียบ กฟผ. ที่ ๓๑๔ ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษในการลงนามขออนุญาตและรับรองความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ข้อ ๕ การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติและวิศวกรผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้มอบหมายหน้าที่วิศวกรรมควบคุม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค.๑๔/๒๕๖๘ แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำและวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ ๒ แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย

(๑) นายธีวินท์ ปลังศรีนนท์ ตำแหน่ง หบนม๒-ฟ. กบรม๒-ฟ. อรม.
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขทะเบียน วก.๑๒๕๖
ทำหน้าที่วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘ ถึง ๑๔
ทะเบียนใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๕-๑๐๔-๐๖๐-๐๐๑๐๖๑

ข้อ ๓ ให้วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ ตามข้อ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการมอบหมาย

(๒) อำนวยการ วางแผน จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนในการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๓) จัดให้มีความการตรวจทดสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ ตามกฎหมายที่กำหนด

(๔) ควบคุมการแก้ไข และซ่อมแซมหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

(๕) ให้หยุดการใช้งานหม้อน้ำทันที เมื่อพบข้อบกพร่องของหม้อน้ำซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรง และแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที

(๖) รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายจ้างหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมอบหมาย

ข้อ ๔ แต่งตั้งวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย

(๑) นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ ตำแหน่ง หบนม๓-ฟ. กบรม๓-ฟ. อรม.
ใบประกอบวิศวกรรมควบคุมเลขทะเบียน สก.๔๕๙๑
ทำหน้าที่ วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘ และ ๙
ทะเบียนใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๖-๖๗-๑๘๔๖

(๒) นายจิรัฏฐ์ อังศุธรรมทัต ตำแหน่ง วศ.๑๐ กบรม๑-ฟ. อรม.
ใบประกอบวิศวกรรมควบคุมเลขทะเบียน วก.๙๑๙
ทำหน้าที่ วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๑๐ และ ๑๑
ทะเบียนใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๖-๖๕-๐๘๓๑

สำเนาถูกต้อง
สก.4591
16/10/68

../๒

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

คำสั่งแต่งตั้งวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

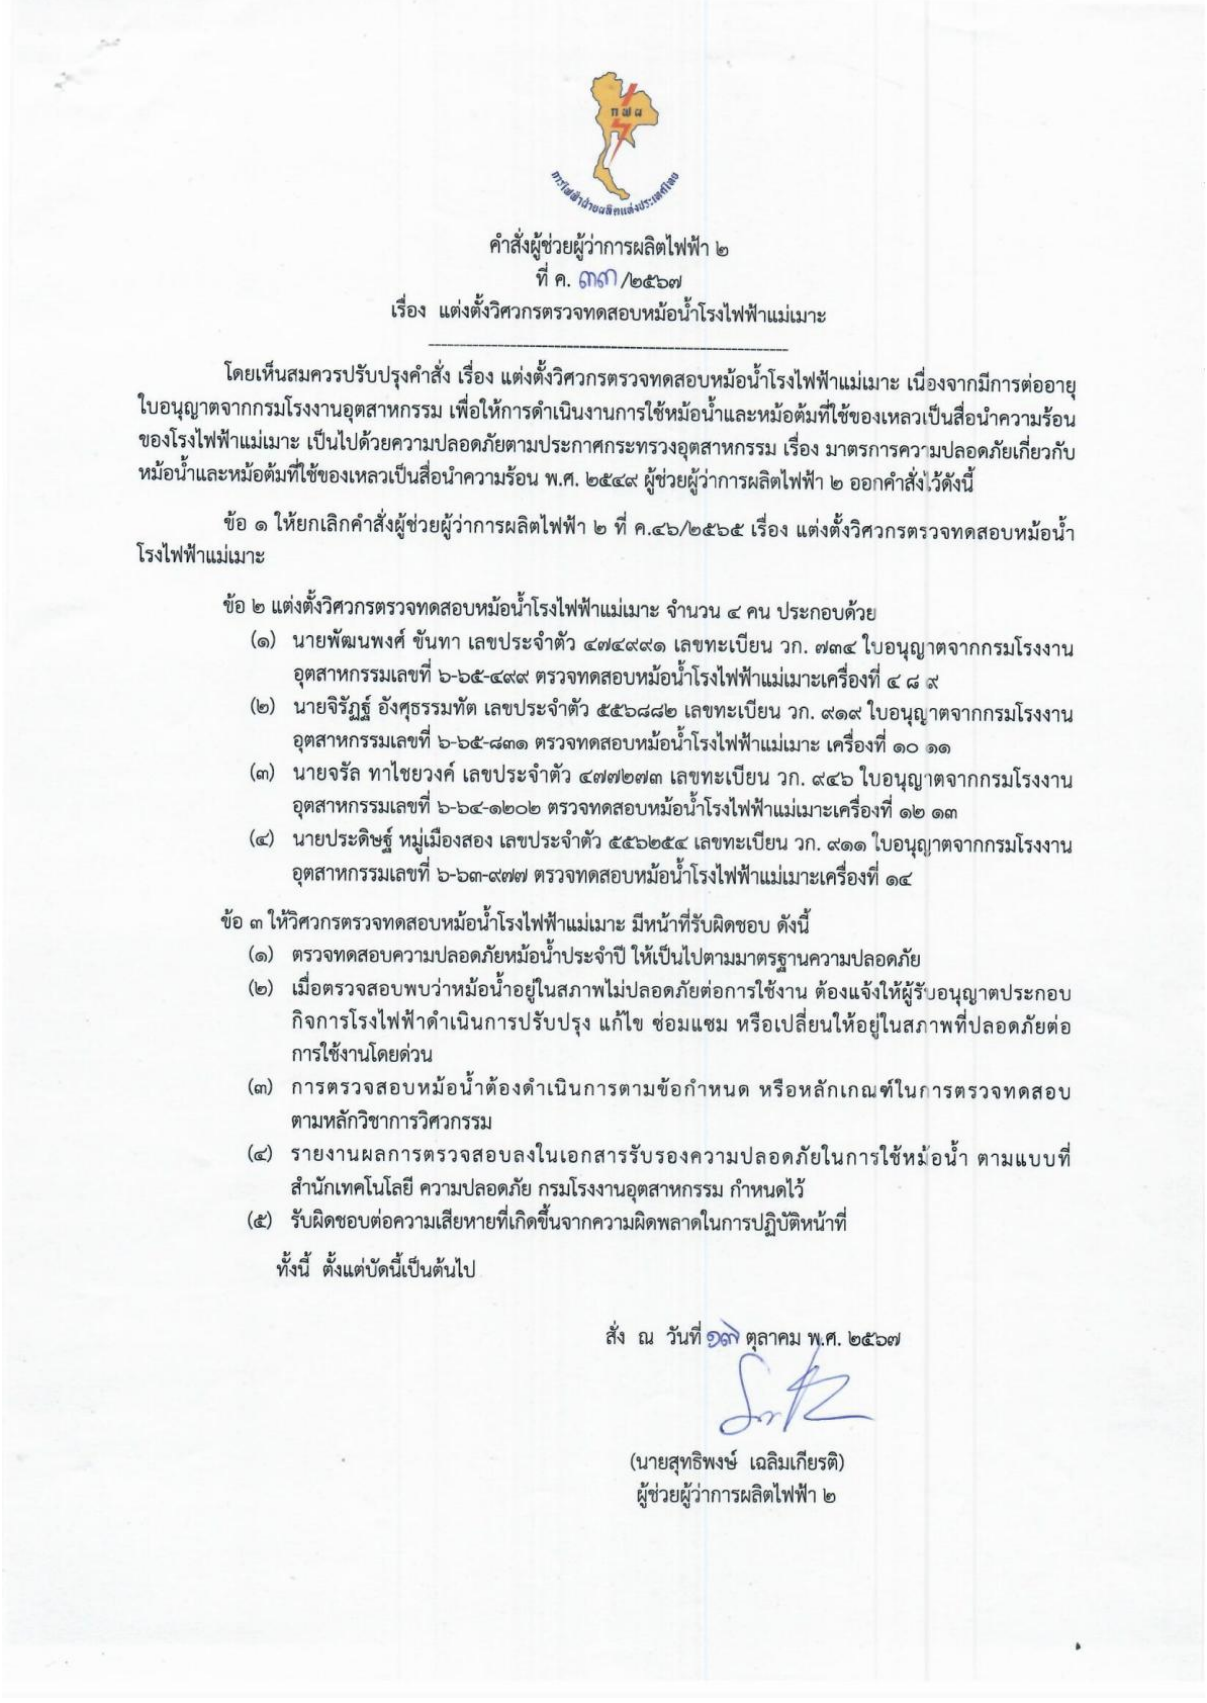

คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒
ที่ ค. ๕๓๓/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากมีการต่ออายุใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การดำเนินงานการใช้หม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นไปด้วยความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค.๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ ๒ แต่งตั้งวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

(๑) นายพัฒนพงศ์ ขันทา เลขประจำตัว ๔๗๔๙๙๑ เลขทะเบียน วก. ๗๓๔ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๕-๔๙๙ ตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ ๔ ๘ ๙

(๒) นายจิรัฏฐ์ อังศุธรรมทัต เลขประจำตัว ๕๕๖๘๘๒ เลขทะเบียน วก. ๙๑๙ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๕-๘๓๑ ตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๑๐ ๑๑

(๓) นายจรัล ทาไชยวงค์ เลขประจำตัว ๔๗๗๒๗๓ เลขทะเบียน วก. ๙๔๖ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๔-๑๒๐๒ ตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ ๑๒ ๑๓

(๔) นายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง เลขประจำตัว ๕๕๖๒๕๔ เลขทะเบียน วก. ๙๑๑ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๓-๙๗๗ ตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ ๑๔

ข้อ ๓ ให้วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อน้ำประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

(๒) เมื่อตรวจสอบพบว่าหม้อน้ำอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานโดยด่วน

(๓) การตรวจสอบหม้อน้ำต้องดำเนินการตามข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ในการตรวจทดสอบตามหลักวิชาการวิศวกรรม

(๔) รายงานผลการตรวจสอบลงในเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ ตามแบบที่สำนักเทคโนโลยี ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดไว้

(๕) รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

แผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
หม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

แผนหยุดเดินเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาตามวาระโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

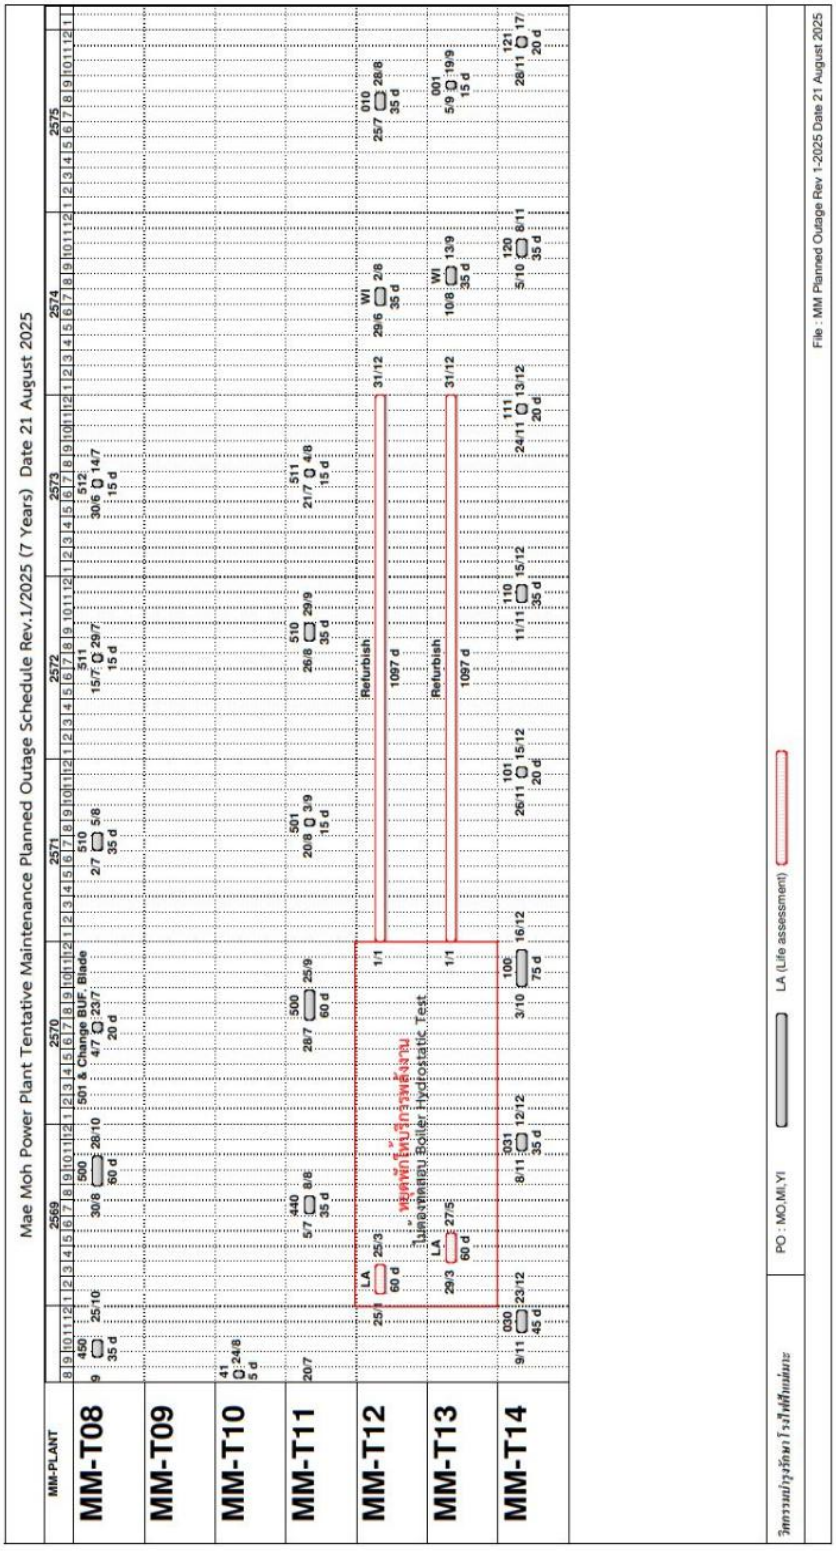

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HPD) ที่ กผม2-ฟ. พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยมีหัวข้อการอบรมครบทุกด้าน รวมถึงด้านหม้อน้ำด้วย

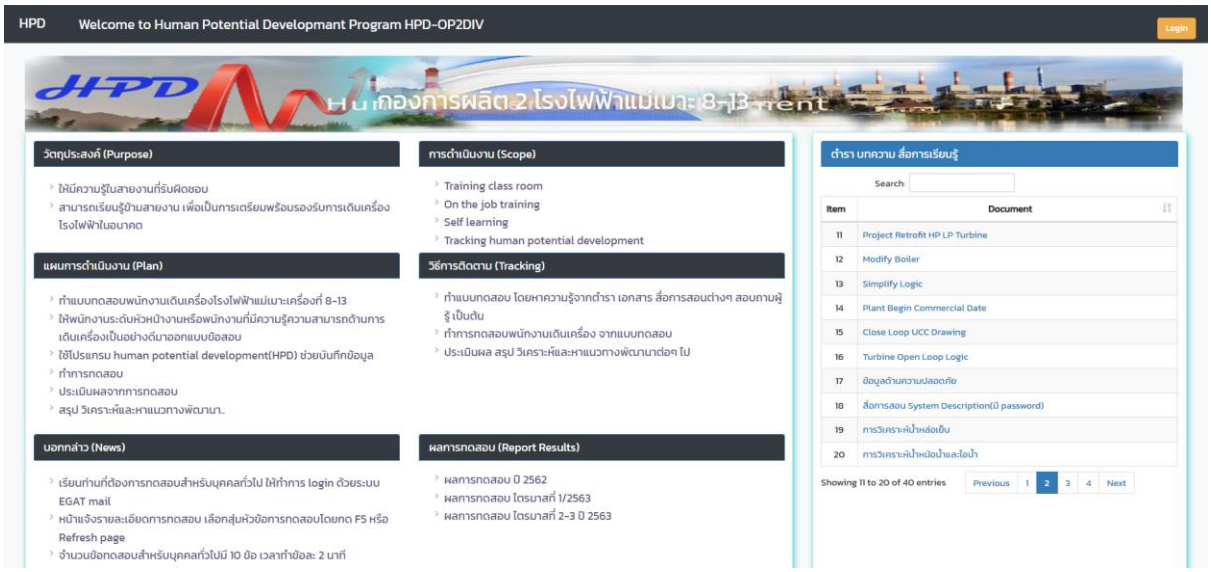

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

การอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ปี 2569 จะดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ส่วนในปี 2568 กฟผ. ดำเนินการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ในวันที่ 17 กันยายน2568 ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Room โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน

แบบ ศค.03

กำหนดการบรรยายหลักสูตร ทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 3/2568
วันที่ 17 กันยายน 2568
Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

วัน เดือน ปี	เวลา	ชื่อวิชา/หัวข้อ	ทฤษฎี	ปฏิบัติ	ผู้บรรยาย	หมายเหตุ
วันพุธที่ 17	08.30-10.00 น.	ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำสำหรับผู้ควบคุมหม้อน้ำ	/		นายรชา ธรรมาณิชานนท์ (597431)	
กันยายน 2568	10.15-11.45 น.		/		วศ.6 หวม-ธ. กมน-ธ. อบค.	
	12.45-14.15 น.		/		นายชาคริต คูหากาญจน์ (565911)	
	14.30-16.00 น.		/		หวอฟ-ธ. กบมอ-ธ. อบฟ.	

หมายเหตุ เวลาพัก : 10.00–10.15 น., 11.45–12.45 น., 14.15–14.30 น.

ผู้ประสานงาน : นางสาวธัญจิรา ไพบูลย์รัตนากร

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 3/2568
สังกัด กผม2-ฟ. ฝ่าย อฟม.
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2568

ที่	ชื่อหลักสูตร	ที่	เลขประจำตัว	รายชื่อ		ตำแหน่ง	สังกัด		
				ชื่อ	สกุล		แผนก	กอง	ฝ่าย
1	ทบทวนผู้ควบคุมหม้อน้ำฯ	1					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
	วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2568	2					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		3					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		4					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		5					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		6					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		7					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		8					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		9					หตม2/3-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		10					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		11					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		12					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		13					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		14					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		15					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		16					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.
		17					หตม2/2-ฟ.	กผม2-ฟ.	อฟม.

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนมกราคม 2569

วันที่	จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ	รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด											ตรวจสอบความถูกต้อง Clean/Cal	หมายเหตุ
		pH	Cond	Temp	จุดที่สอบเทียบ	COD	SAC254	Flow Sensor(1) Level(1)	Flow Sensor(3) Level(1)	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันน้ำ	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันอากาศ	DO		
8,9/1/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.45	405	24.8	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.32	856	25.4		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.85	711	22.8		-	-	-	1030	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.85	1113	22.4		-	-	-	1630	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.95	658	23.0		-	-	2660	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.93	1906	23.3		-	-	1940	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.61	1113	22.7		-	-	4280	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.81	1668	23.2		-	-	1160	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.95	977	22.8		-	-	3850	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.87	1093	21.7		12.8	11.4	-	8400	-	-	6.95	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.24	674	22.8		-	-	-	-	-	-	-	√	
15,16/1/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.33	355	25.2	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.08	1221	23.9		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.28	511	22.7		-	-	-	1220	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.39	1068	25.2		-	-	-	1110	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.10	1503	22.2		-	-	20	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.19	1297	23.3		-	-	4500	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.86	1312	25.3		-	-	2050	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.90	1389	22.8		-	-	3520	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.94	783	23.1		-	-	1890	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.82	1123	22.5		12.8	11.4	-	7760	-	-	7.63	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.08	749	22.6		-	-	-	-	-	-	-	√	
21,22/1/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.30	365	25.1	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.41	1000	25.2		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.43	489	23.6		-	-	-	1230	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.31	1109	24.4		-	-	-	990	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.10	1458	19.3		-	-	2310	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.69	1448	24.0		-	-	2340	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.32	1200	25.1		-	-	3720	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.89	1000	23.7		-	-	1680	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	8.00	909	23.5		-	-	3430	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.91	979	23.2		12.6	12.1	-	6570	-	-	5.91	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.04	753	23.1		-	-	-	-	-	-	-	√	
28,29/1/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.25	395	25.5	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.19	1160	25.2		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.12	813	23.9		-	-	-	1050	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.26	1356	25.0		-	-	-	848	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.03	721	22.9		-	-	1780	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.99	1538	24.1		-	-	3300	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.41	1300	25.7		-	-	3720	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.88	1126	23.8		-	-	2790	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	8.10	781	23.8		-	-	3260	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.79	958	22.7		13.2	11.6	-	7630	-	-	7.52	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.34	869	24.1		-	-	-	-	-	-	-	√	

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L072F Unopened storage until: 13.03.2027)

รายงานโดย

(นายเกศพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

วันที่	จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ	รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด											ตรวจสอบความถูกต้อง Clean/Cal	หมายเหตุ
		pH	Cond	Temp	จุดที่สอบเทียบ	COD	SAC254	Flow Sensor(1) Level(1)	Flow Sensor(3) Level(1)	เครื่องมือวัดระดับน้ำความดันน้ำ	เครื่องมือวัดระดับน้ำความดันอากาศ	DO		
4,5/2/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.00	701	28.3	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	7.88	1490	26.1		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.42	858	24.2		-	-	-	932	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.48	1360	26.7		-	-	-	895	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.32	1243	23.7		-	-	40	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.96	1392	24.1		-	-	4560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.99	1497	25.8		-	-	1220	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.82	1390	24.4		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	8.00	957	24.2		-	-	1460	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.81	1326	24.4		12.4	11.0	-	7220	-	-	6.31	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.19	1076	24.4		-	-	-	-	-	-	-	√	
9,12/2/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.02	693	28.6	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	7.85	1488	26.2		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.53	682	25.2		-	-	-	765	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.60	949	28.2		-	-	-	1020	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.19	1520	23.5		-	-	80	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.11	781	25.3		-	-	4560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.04	1480	26.4		-	-	1040	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.78	905	25.7		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.92	1112	26.3		-	-	1360	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.72	982	25.6		11.8	10.8	-	6980	-	-	5.52	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.39	1017	26.6		-	-	-	-	-	-	-	√	
18,20/2/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.98	690	28.7	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	7.89	1496	26.4		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	7.70	1201	25.4		-	-	-	713	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.26	1599	26.3		-	-	-	927	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.34	664	25.2		-	-	1970	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.93	929	26.2		-	-	4560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.01	1450	26.3		-	-	3360	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.82	1066	27.0		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	8.04	827	26.6		-	-	1100	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.85	1365	26.4		11.6	10.7	-	8680	-	-	6.07	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.20	798	25.9		-	-	-	-	-	-	-	√	
24,26/2/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.07	710	28.9	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	7.99	1505	27.2		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.01	792	26.0		-	-	-	810	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.01	937	26.1		-	-	-	869	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.96	662	24.2		-	-	1890	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.06	841	25.1		-	-	560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.97	1474	26.1		-	-	3450	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.87	799	25.7		-	-	1120	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.94	1391	25.6		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.74	801	25.9		11.8	10.8	-	9080	-	-	6.05	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	7.95	1453	25.8		-	-	-	-	-	-	-	√	

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L072F Unopened storage until: 13.03.2027)

รายงานโดย

(นายเกศพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนมีนาคม 2569

วันที่	จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ	รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด											ตรวจสอบความถูกต้อง Clean/Cal	หมายเหตุ
		pH	Cond	Temp	จุดที่สอบเทียบ	COD	SAC254	Flow Sensor(1) Level(1)	Flow Sensor(3) Level(1)	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันน้ำ	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันอากาศ	DO		
5,6/3/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.01	556	29.4	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.30	785	26.2		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.29	1337	26.2		-	-	-	764	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.20	2100	29.0		-	-	-	935	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.17	666	24.4		-	-	1900	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.37	747	25.5		-	-	4560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.00	1530	26.1		-	-	3450	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.08	706	25.9		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.92	1211	25.1		-	-	1460	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.79	906	25.3		11.3	10.6	-	7220	-	-	6.31	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.15	998	25.0		-	-	-	-	-	-	-	√	
12,13/3/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.97	531	29.1	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.28	760	25.9		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	7.96	671	26.6		-	-	-	725	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.24	776	29.6		-	-	-	1420	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.25	627	24.7		-	-	2360	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.36	742	25.7		-	-	4560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.05	1405	27.2		-	-	4570	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.22	722	27.0		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.97	760	26.3		-	-	1360	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.89	755	26.5		11.8	10.8	-	8270	-	-	5.52	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.18	681	25.5		-	-	-	-	-	-	-	√	
17,20/3/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.99	568	29.5	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.29	778	26.3		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.24	864	26.7		-	-	-	769	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.14	1182	28.2		-	-	-	839	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.91	730	25.2		-	-	1940	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.09	976	25.8		-	-	4560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.03	1448	27.8		-	-	3360	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.06	716	26.3		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.98	775	25.6		-	-	1100	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.92	874	27.3		11.0	10.3	-	7640	-	-	6.07	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.01	740	24.7		-	-	-	-	-	-	-	√	
25,26/3/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.97	588	29.9	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.35	790	26.5		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	7.67	953	27.6		-	-	-	734	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	9.54	835	29.7		-	-	-	892	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.55	1520	27.4		-	-	1730	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.10	762	27.3		-	-	560	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.01	1499	28.5		-	-	3180	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.05	785	28.4		-	-	1120	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.90	699	27.1		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.91	738	27.8		13.3	11.0	-	7090	-	-	6.05	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	7.89	765	25.9		-	-	-	-	-	-	-	√	

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L072F Unopened storage until: 13.03.2027)

รายงานโดย

(นายเกศพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนเมษายน 2569

วันที่	จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ	รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด											ตรวจสอบความถูกต้อง Clean/Cal	หมายเหตุ
		pH	Cond	Temp	จุดที่สอบเทียบ	COD	SAC254	Flow Sensor(1) Level(1)	Flow Sensor(3) Level(1)	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความต้นน้ำ	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความต้นอากาศ	DO		
2,3/4/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.09	711	31.9	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.20	745	28.4		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.28	727	29.0		-	-	-	701	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.13	648	28.1		-	-	-	797	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.61	660	25.2		-	-	1980	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.23	744	27.8		-	-	3660	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.99	665	27.1		-	-	3270	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.16	788	28.8		-	-	3600	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	8.01	622	28.2		-	-	3160	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.90	740	258.1		12.9	11.6	-	6950	-	-	7.18	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	797.00	616	28.6		-	-	-	-	-	-	-	√	
8,9/4/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.15	721	32.0	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.23	751	28.6		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.58	621	28.0		-	-	-	783	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.62	654	29.2		-	-	-	835	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.99	633	25.1		-	-	2320	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.24	745	28.0		-	-	3850	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.96	613	26.6		-	-	3360	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.08	749	29.1		-	-	3780	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	8.05	635	28.4		-	-	3060	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.93	693	28.7		12.7	11.7	-	6900	-	-	7.23	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.25	630	26.4		-	-	-	-	-	-	-	√	
16,17/4/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.10	735	32.8	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.22	755	28.8		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.22	803	29.6		-	-	-	666	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.32	953	30.7		-	-	-	905	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.84	621	25.5		-	-	1710	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.24	718	28.0		-	-	3500	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.01	625	26.9		-	-	3180	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.10	718	28.9		-	-	3440	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	8.06	729	27.6		-	-	3100	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.81	793	28.8		12.2	11.1	-	6760	-	-	6.72	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.34	628	25.9		-	-	-	-	-	-	-	√	
21,23/4/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.13	733	32.9	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.26	766	28.9		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.63	572	28.9		-	-	-	619	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.73	724	31.7		-	-	-	872	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.02	664	26.1		-	-	2080	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.06	760	28.4		-	-	3980	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.03	633	26.5		-	-	3270	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	8.01	763	29.3		-	-	3890	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.91	740	28.4		-	-	3180	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.88	710	29.9		11.9	10.8	-	7570	-	-	6.25	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	7.96	696	27.1		-	-	-	-	-	-	-	√	

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L072F Unopened storage until: 13.03.2027)

รายงานโดย

(นายเกศพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนเมษายน 2569

วันที่	จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ	รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด											ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		pH	Cond	Temp	จุดที่สอบเทียบ	COD	SAC254	Flow Sensor(1) Level(1)	Flow Sensor(3) Level(1)	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันน้ำ	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันอากาศ	DO	ความถูกต้อง Clean/Cal	
28,29/4/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.10	755	32.8	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.28	766	28.9		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.61	591	27.3		-	-	-	716	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.51	635	29.6		-	-	-	800	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.97	751	26.0		-	-	2170	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.81	800	28.8		-	-	3360	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.98	680	27.5		-	-	3380	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.84	846	29.4		-	-	3210	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.78	692	29.3		-	-	3290	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.85	711	29.4		11.8	10.7	-	6920	-	-	6.20	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	7.71	775	28.0		-	-	-	-	-	-	-	√	
	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	-	-	-	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.Pump house Ash Water Lake	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.Inlet Main drain 4-8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.Inlet Main drain 9-13	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.Inlet Main drain 3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.Outlet Ash Water Lake	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.Outlet Main drain	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	10.Diversion Pond	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	-	-	-	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.Pump house Ash Water Lake	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.Inlet Main drain 4-8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.Inlet Main drain 9-13	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.Inlet Main drain 3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.Outlet Ash Water Lake	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.Outlet Main drain	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	10.Diversion Pond	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	-	-	-	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.Pump house Ash Water Lake	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.Inlet Main drain 4-8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.Inlet Main drain 9-13	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.Inlet Main drain 3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.Outlet Ash Water Lake	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.Outlet Main drain	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	10.Diversion Pond	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L072F Unopened storage until: 13.03.2027)

รายงานโดย

(นายเกศพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

วันที่	จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ	รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด											ตรวจสอบความถูกต้อง Clean/Cal	หมายเหตุ
		pH	Cond	Temp	จุดที่สอบเทียบ	COD	SAC254	Flow Sensor(1) Level(1)	Flow Sensor(3) Level(1)	เครื่องมือวัดระดับน้ำความดันน้ำ	เครื่องมือวัดระดับน้ำความดันอากาศ	DO		
7,8/5/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.05	758	32.9	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.27	768	29.1		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.23	690	29.3		-	-	-	700	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.24	716	30.2		-	-	-	975	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.96	772	26.6		-	-	2150	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.00	780	28.8		-	-	3600	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.91	792	28.1		-	-	3450	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.84	835	30.3		-	-	3580	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.75	750	29.7		-	-	3200	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.85	705	30.3		11.3	10.5	-	7710	-	-	5.34	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.01	694	27.5		-	-	-	-	-	-	-	√	
11,15/5/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.20	777	33.5	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.28	768	28.7		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.19	789	30.4		-	-	-	697	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.42	701	31.0		-	-	-	1050	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.98	841	26.2		-	-	2650	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.00	765	27.9		-	-	3800	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.92	798	28.4		-	-	4000	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.82	725	29.1		-	-	3820	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.91	789	28.2		-	-	3080	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.81	813	29.5		11.0	10.1	-	7840	-	-	4.51	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.05	841	27.5		-	-	-	-	-	-	-	√	
20,21/5/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.14	711	33.3	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.23	745	29.3		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.32	843	30.0		-	-	-	730	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.46	765	31.4		-	-	-	924	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.87	1163	27.2		-	-	3460	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.93	916	28.7		-	-	3510	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.01	802	28.3		-	-	4070	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.76	877	30.4		-	-	3480	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.98	748	28.9		-	-	3110	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.68	807	28.6		11.2	10.2	-	8520	-	-	4.89	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	7.59	880	27.7		-	-	-	-	-	-	-	√	
26,27/5/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	8.19	768	33.2	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.22	779	28.8		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.36	1489	29.8		-	-	-	667	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.39	2100	31.4		-	-	-	809	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.98	829	26.6		-	-	2050	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.10	938	29.1		-	-	4000	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.31	954	28.1		-	-	3450	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.79	817	30.6		-	-	3920	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.84	1071	29.6		-	-	3220	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.66	861	30.0		13.0	12.4	-	7180	-	-	4.46	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.11	810	27.5		-	-	-	-	-	-	-	√	

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1L302C Unopened storage until: 29.10.2028)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1L338H Unopened storage until: 4.12.2027)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L307D Unopened storage until: 3.11.2027)

รายงานโดย

(นายเกศพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนมิถุนายน 2569

วันที่	จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ	รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด											ตรวจสอบความถูกต้อง Clean/Cal	หมายเหตุ
		pH	Cond	Temp	จุดที่สอบเทียบ	COD	SAC254	Flow Sensor(1) Level(1)	Flow Sensor(3) Level(1)	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันน้ำ	เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันอากาศ	DO		
4,5/6/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.88	350	36.2	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.32	1005	31.1		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.50	791	30.3		-	-	-	699	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.51	894	31.9		-	-	-	826	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.05	826	27.4		-	-	2100	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.26	855	30.0		-	-	3500	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.21	846	28.9		-	-	3720	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.96	810	31.9		-	-	3550	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.99	776	30.7		-	-	3200	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	8.03	787	31.5		12.9	10.8	-	8630	-	-	4.17	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.13	772	28.6		-	-	-	-	-	-	-	√	
11,12/6/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.93	365	38.1	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.42	1058	31.0		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	8.01	802	28.3		-	-	-	718	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	8.50	893	30.9		-	-	-	888	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.37	835	27.2		-	-	2600	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	7.89	830	29.4		-	-	3850	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	8.25	840	29.0		-	-	4280	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.65	788	30.4		-	-	3850	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.66	787	29.6		-	-	3150	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.66	791	29.5		12.4	10.7	-	7540	-	-	4.08	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	7.97	797	28.3		-	-	-	-	-	-	-	√	
18,19/6/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.86	335	37.2	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.40	1011	31.2		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	7.93	1014	30.3		-	-	-	758	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	7.93	2320	31.3		-	-	-	883	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	7.95	1320	29.6		-	-	183	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.25	903	32.0		-	-	557	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.95	1420	32.0		-	-	1750	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.98	818	31.8		-	-	417	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.93	783	30.8		-	-	1800	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.96	802	30.3		11.7	10.4	-	2010	-	-	4.23	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.36	815	31.2		-	-	-	-	-	-	-	√	
24,25/6/2569	1.Used Tank mmrp1(MM-T14)	7.91	368	36.5	pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm	-	-	-	-	-	-	-	√	
	2.Pump house Ash Water Lake	8.41	1018	30.8		-	-	-	-	-	-	-	√	
	3.Inlet Main drain 4-8	7.48	2600	31.0		-	-	-	675	-	-	-	√	
	4.Inlet Main drain 9-13	7.76	2460	32.1		-	-	-	878	-	-	-	√	
	5.Inlet Main drain 3	8.07	1634	29.8		-	-	255	-	-	-	-	√	
	6.Outlet Ash Water Lake	8.37	1012	31.4		-	-	414	-	ปกติ	ปกติ	-	√	
	7.Outlet Main drain	7.94	1754	31.5		-	-	1780	-	ปกติ	-	-	√	
	8.Outlet Ash Bio-wetland	7.91	820	31.5		-	-	340	-	ปกติ	-	-	√	
	9.Outlet Main drain Bio-wetland	7.99	801	30.4		-	-	1820	-	ปกติ	-	-	√	
	10.Diversion Pond	7.81	843	30.1		11.7	10.4	-	1380	-	-	4.84	√	
	11.Inlet Main drain Bio-wetland	8.22	879	30.3		-	-	-	-	-	-	-	√	

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1L302C Unopened storage until: 29.10.2028)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1L338H Unopened storage until: 4.12.2027)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L307D Unopened storage until: 3.11.2027)

รายงานโดย

(นายเกศพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7
