
ภาคผนวกที่ 21

ผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเคมี

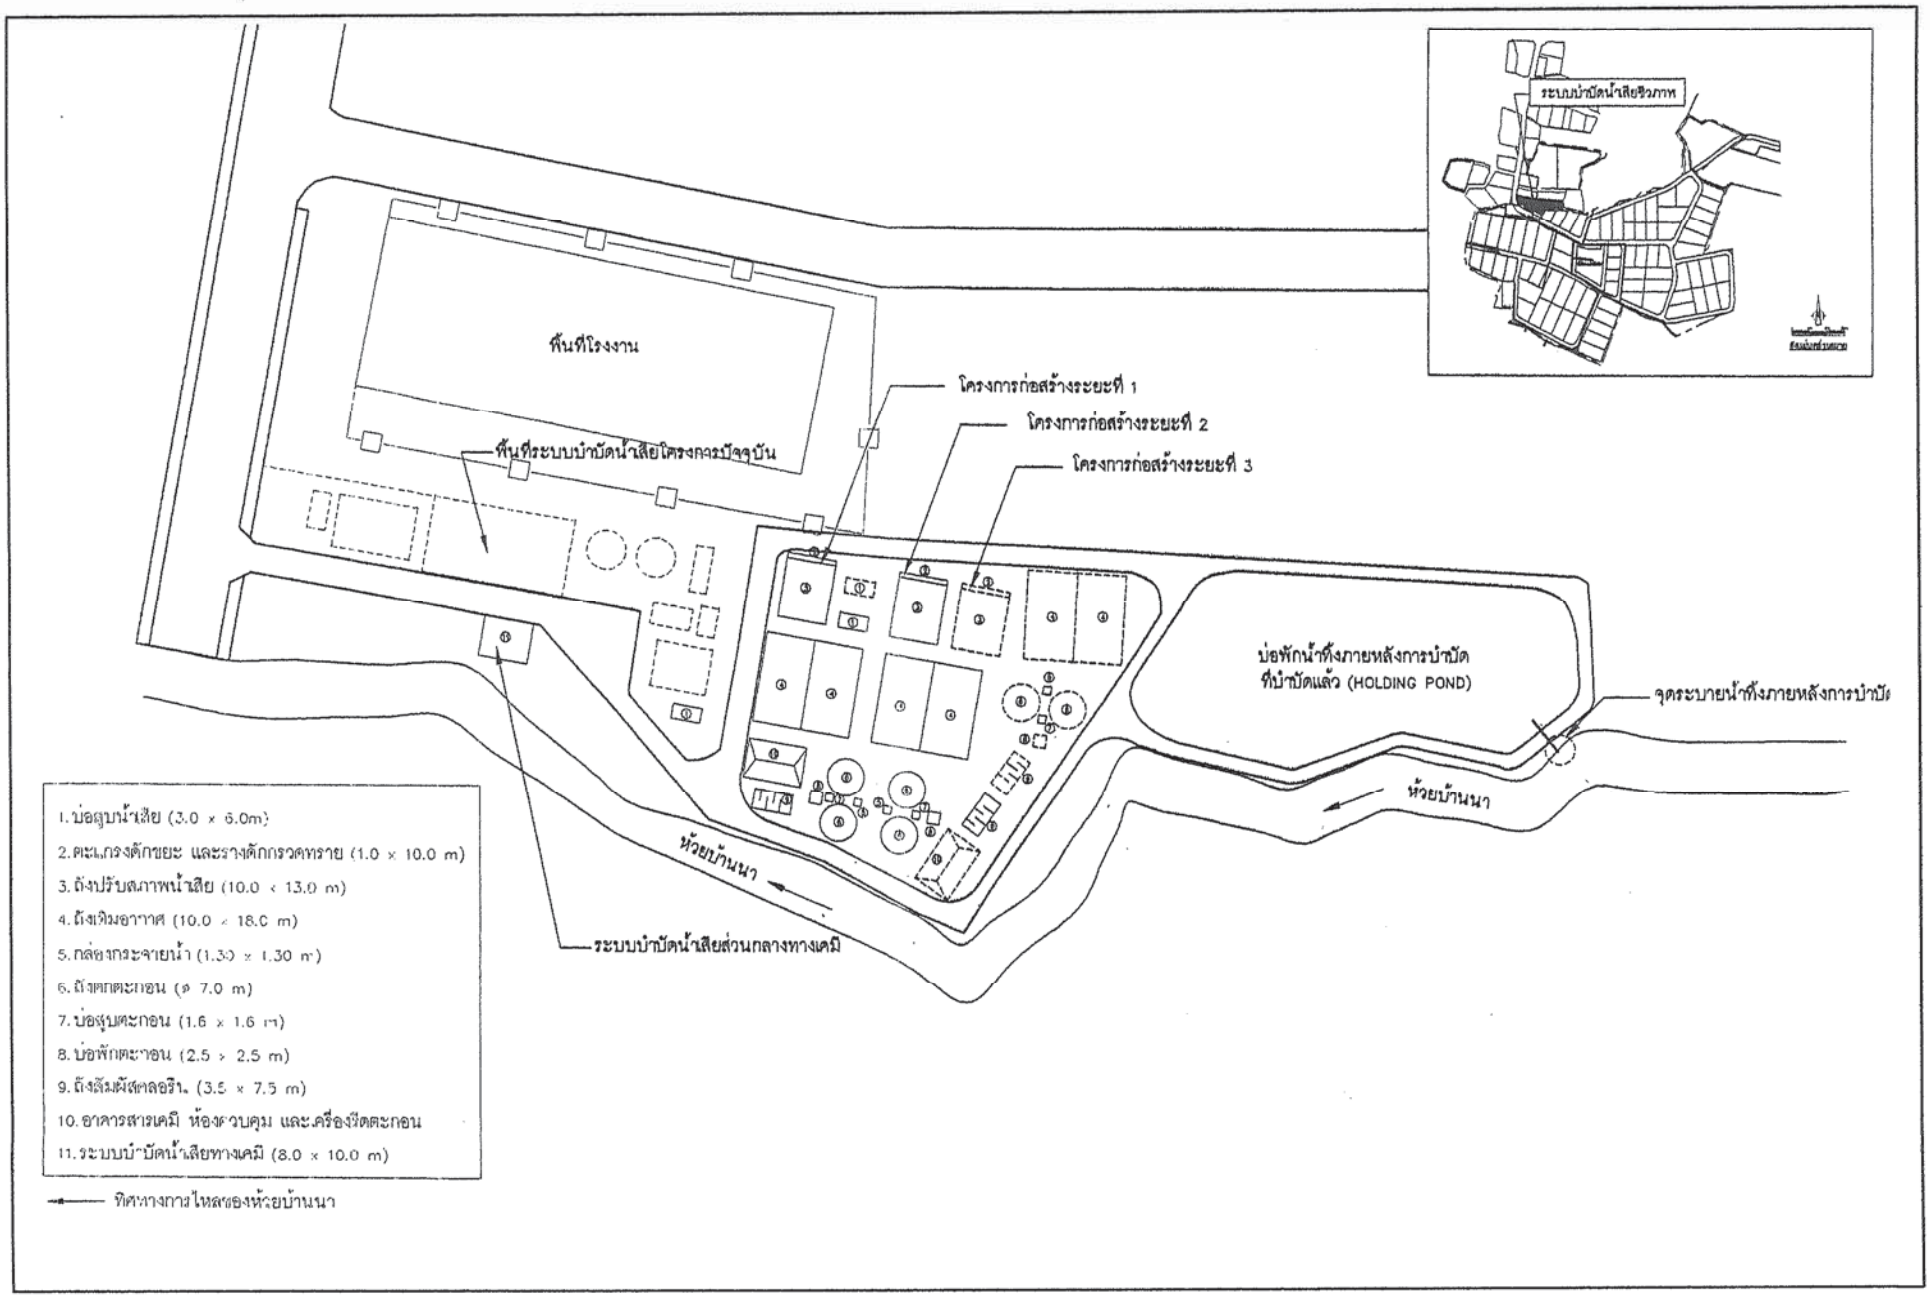

<u>รูปที่ 2.9.3-2</u> ผังแสดงที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

ภาคผนวกที่ 22

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ของน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บันทึกการเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

วันที่	ปริมาณน้ำเข้าระบบ ลบ.ม./วัน	ค่าออกแบบ	บ่อปรับสภาพ (EQ Tank)	บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Tank 1)								บ่อเติมอากาศ 2 (Aeration Tank 2)				บ่อเติมอากาศ 3 (Aeration Tank 3)				บ่อเติมอากาศ 4 (Aeration Tank 4)				Polishing Pond			Holding Pond			ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
				MBBR Tank 1				MBBR Tank 2																						
		< 4,000 ลบ.ม./วัน	pH 5.5-9.0	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	สี	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	สี	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	kW
1/1/69	1,643	4,000	7.01	7.29	29.8	1.82	ใส	7.33	29.9	2.25	ใส	6.99	30.2	2.08	650	6.96	30.1	2.24	625	6.95	30.1	1.89	650	7.12	29.1	1.12	7.28	28.4	1.69	1,700
2/1/69	1,716	4,000	7.00	7.39	29.6	2.01	ใส	7.33	29.8	2.08	ใส	7.04	29.8	2.00	625	7.06	29.9	2.01	650	7.00	29.8	1.83	625	7.18	28.1	1.25	7.32	28.2	1.46	1,700
3/1/69	1,851	4,000	7.01	7.35	29.3	1.74	ใส	7.32	29.4	1.85	ใส	7.04	29.4	1.92	650	7.05	29.4	1.94	650	6.95	29.3	1.76	650	7.25	27.6	1.35	7.39	27.4	1.40	1,600
4/1/69	1,800	4,000	7.01	7.25	29.0	1.42	ใส	7.22	29.1	1.53	ใส	7.03	29.1	1.60	625	7.02	29.0	1.62	600	6.89	29.0	1.53	625	7.25	26.9	1.31	7.45	26.6	1.33	1,700
5/1/69	2,743	4,000	6.97	7.13	29.2	1.39	ใส	7.12	29.3	1.42	ใส	6.95	29.1	1.47	575	6.91	29.1	1.55	625	6.82	29.2	1.44	625	7.14	27.4	1.02	7.26	27.3	1.14	2,000
6/1/69	3,061	4,000	6.96	7.02	28.9	1.07	ใส	7.10	29.0	1.17	ใส	6.67	29.0	1.15	525	6.69	29.0	1.22	525	6.58	29.0	1.04	550	7.05	26.9	1.03	7.18	26.9	1.05	1,900
7/1/69	3,275	4,000	6.97	7.09	29.0	1.01	ใส	7.13	29.0	1.05	ใส	6.60	27.4	1.02	500	6.61	28.9	1.02	500	6.58	28.9	1.07	500	7.12	26.0	1.16	7.25	26.0	1.20	2,000
8/1/69	3,294	4,000	6.99	7.15	29.2	1.00	ใส	7.17	28.3	1.00	ใส	6.63	28.7	1.02	500	6.67	28.6	1.03	475	6.68	28.6	1.00	500	7.14	25.2	1.03	7.25	24.8	1.06	2,000
9/1/69	3,201	4,000	6.99	7.17	27.4	1.04	ใส	7.18	27.1	1.04	ใส	6.62	27.5	1.03	525	6.64	27.2	1.07	475	6.63	28.1	1.01	525	7.14	25.2	1.07	7.24	24.7	1.14	2,100
10/1/69	3,093	4,000	7.00	7.15	28.7	1.00	ใส	7.17	28.7	1.00	ใส	6.70	28.9	1.06	550	6.78	28.8	1.05	525	6.72	28.1	1.02	550	7.08	26.3	1.04	7.22	25.3	1.09	2,000
11/1/69	2,369	4,000	6.99	7.15	28.7	1.00	ใส	7.17	28.7	1.00	ใส	6.70	28.9	1.06	550	6.78	28.8	1.05	525	6.72	28.1	1.02	550	7.08	26.3	1.04	7.22	25.3	1.09	1,800
12/1/69	3,189	4,000	6.99	7.24	27.7	1.19	ใส	7.25	27.8	1.29	ใส	6.96	27.8	1.23	575	7.07	27.8	1.21	575	7.01	27.8	1.03	575	7.28	26.8	1.04	7.36	26.1	1.11	2,000
13/1/69	3,207	4,000	7.01	7.20	28.3	1.74	ใส	7.22	28.3	1.79	ใส	6.80	28.8	1.22	550	6.85	28.3	1.29	550	6.82	28.8	1.06	525	7.23	26.7	1.11	7.34	26.5	1.21	2,000
14/1/69	3,266	4,000	6.97	7.20	28.4	1.80	ใส	7.22	28.6	1.75	ใส	6.66	28.7	1.46	525	6.72	28.7	1.74	525	6.71	28.6	1.25	525	7.12	28.2	1.18	7.28	27.4	1.29	2,100
15/1/69	3,435	4,000	6.98	7.61	28.8	1.00	ใส	7.24	29.1	1.00	ใส	6.88	29.0	1.04	525	6.74	29.1	1.14	550	6.92	29.1	1.03	600	7.13	28.8	1.11	7.23	27.8	1.16	2,200
16/1/69	3,443	4,000	6.97	7.42	29.2	1.04	ใส	7.19	29.4	1.05	ใส	6.70	29.6	1.01	525	6.71	29.7	1.09	500	6.87	29.6	1.04	500	7.12	28.6	1.05	7.26	28.4	1.18	2,100
17/1/69	3,178	4,000	6.96	7.38	29.5	1.02	ใส	7.10	29.7	1.03	ใส	6.65	29.8	1.06	500	6.62	29.8	1.04	525	6.79	29.8	1.01	550	7.04	29.4	1.01	7.14	29.1	1.05	2,000
18/1/69	2,237	4,000	6.96	7.19	29.5	1.02	ใส	7.02	29.7	1.01	ใส	6.71	29.9	1.11	575	6.71	30.0	1.14	525	6.70	30.0	1.10	575	7.03	29.3	1.02	7.18	29.0	1.04	1,800
19/1/69	3,509	4,000	6.98	7.06	30.4	2.44	ใส	7.23	30.1	2.15	ใส	7.09	30.2	2.71	625	6.95	30.5	2.82	625	6.90	30.8	2.84	625	7.19	29.3	1.74	7.40	29.4	1.61	2,100
20/1/69	3,590	4,000	6.97	7.52	30.0	3.84	ใส	7.14	29.8	2.59	ใส	7.16	30.3	2.55	550	7.05	30.3	1.76	575	7.15	30.0	1.92	575	7.26	29.0	2.07	7.21	28.9	1.35	2,100
21/1/69	3,464	4,000	6.98	7.09	29.9	3.18	ใส	7.11	29.8	3.29	ใส	6.82	30.0	2.62	475	6.78	29.9	1.88	500	6.80	30.0	2.12	500	7.23	29.4	2.47	7.25	16.4	4.82	2,100
22/1/69	3,501	4,000	6.98	7.10	29.9	2.87	ใส	7.13	29.9	2.47	ใส	6.80	30.1	1.88	525	6.71	30.0	1.81	475	6.67	30.0	1.54	525	7.32	29.3	2.47	7.28	28.9	1.93	2,000
23/1/69	3,382	4,000	6.99	7.66	30.0	1.91	ใส	7.29	29.6	2.22	ใส	6.76	30.7	1.79	500	6.69	30.7	1.88	500	6.75	30.5	1.38	500	7.24	27.9	1.90	7.27	15.8	1.43	2,000
24/1/69	3,080	4,000	7.00	7.23	30.5	2.26	ใส	6.81	30.0	1.50	ใส	6.79	30.1	1.03	500	6.72	30.2	1.80	500	6.95	29.7	1.57	550	7.19	30.7	1.15	7.14	30.7	1.27	2,100
25/1/69	2,526	4,000	6.99	7.31	29.4	2.18	ใส	7.35	29.5	2.99	ใส	6.92	29.8	1.96	525	6.97	29.7	2.62	525	6.96	29.6	1.04	550	7.21	28.7	1.11	7.21	28.0	1.16	1,800
26/1/69	3,306	4,000	6.98	7.31	29.9	2.38	ใส	7.29	29.9	2.29	ใส	7.09	30.0	1.94	575	7.06	29.8	1.92	600	6.99	29.9	1.96	575	7.42	29.3	1.65	7.32	29.2	1.24	2,100
27/1/69	3,378	4,000	6.98	7.09	29.8	2.68	ใส	7.11	29.8	2.89	ใส	6.82	29.9	2.10	500	6.81	30.1	1.65	525	6.79	30.2	1.58	550	7.11	28.8	1.98	7.30	28.4	1.46	2,200
28/1/69	3,369	4,000	6.97	7.51	29.6	1.70	ใส	7.12	29.8	1.53	ใส	6.82	29.8	1.16	525	6.71	30.0	1.49	525	6.77	30.0	1.67	550	7.30	29.0	1.68	4.18	28.4	1.34	2,100
29/1/69	3,178	4,000	6.99	7.55	29.6	2.52	ใส	7.21	29.7	1.67	ใส	6.89	29.8	1.85	525	6.78	29.8	1.06	525	6.78	29.8	1.17	525	7.14	28.8	2.16	7.21	16.3	1.27	2,100
30/1/69	3,227	4,000	6.97	7.59	29.9	1.05	ใส	7.50	29.8	1.02	ใส	7.09	30.4	1.18	525	7.21	30.0	1.05	525	7.21	30.1	1.02	500	7.30	29.6	1.43	7.48	28.6	1.40	2,200
31/1/69	2,959	4,000	6.98	7.51	29.9	1.27	ใส	7.39	29.6	1.29	ใส	6.99	30.6	1.11	525	7.04	30.5	1.12	525	7.09	30.6	1.82	525	7.30	29.7	1.10	7.32	28.9	1.47	2,100
เฉลี่ย	2,983	-	6.98	7.28	29.3	1.73	ใส	7.20	29.3	1.68	ใส	6.85	29.4	1.53	500	6.84	29.5	1.52	500	6.84	29.4	1.41	500	7.18	28.1	1.38	7.17	26.5	1.40	1,990
รวม	92,470	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,700
หมายเหตุ :																														
สูงสุด	3,590	-	7.01	7.66	30.5	3.84	0	7.50	30.1	3.29	0	7.16	30.7	2.71	650	7.21	30.7	2.82	650	7.21	30.8	2.84	650	7.42	30.7	2.47	7.48	30.7	4.82	
ต่ำสุด	1,643	-	6.96	7.02	27.4	1.00	0	6.81	27.1	1.00	0	6.60	27.4	1.01	475	6.61	27.2	1.02	475	6.58	27.8	1.00	500	7.03	25.2	1.01	4.18	15.8	1.04	
															546				544				556							

บันทึกการเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

วันที่	ปริมาณน้ำเข้าระบบ	ค่าออกแบบ	บ่อปรับสภาพ (EQ Tank)	บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Tank 1)								บ่อเติมอากาศ 2 (Aeration Tank 2)				บ่อเติมอากาศ 3 (Aeration Tank 3)				บ่อเติมอากาศ 4 (Aeration Tank 4)				Polishing Pond			Holding Pond			ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
				MBBR Tank 1				MBBR Tank 2																						
	ลบ.ม./วัน	< 4,000	pH	pH	Temp	DO	สี	pH	Temp	DO	สี	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	pH	Temp	DO	kW
		ลบ.ม./วัน	5.5-9.0	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l		5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l		5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	
1/2/69	2,247	4,000	7.00	7.52	30.2	1.10	ใส	7.19	30.3	2.34	ใส	6.54	30.0	1.23	300	6.51	30.1	1.42	300	6.49	30.1	2.01	300	7.18	29.3	2.14	7.20	29.0	2.31	2,000
2/2/69	3,314	4,000	6.98	7.35	29.9	1.79	ใส	7.27	30.0	2.24	ใส	6.85	30.2	1.17	550	6.78	30.3	2.04	500	6.96	30.1	1.00	550	7.18	28.8	1.31	7.20	28.2	1.05	2,200
3/2/69	3,388	4,000	6.95	7.46	29.3	1.57	ใส	7.35	29.4	1.01	ใส	6.96	29.8	1.02	475	6.75	29.9	1.44	475	7.06	29.7	1.05	525	7.28	28.2	1.25	7.24	27.6	1.00	2,200
4/2/69	3,414	4,000	6.97	7.29	29.8	1.12	ใส	7.28	29.8	1.10	ใส	6.72	30.0	1.07	425	6.55	30.1	1.90	450	6.95	30.0	1.01	450	7.13	29.6	1.38	7.20	28.6	1.19	2,200
5/2/69	3,585	4,000	6.95	7.43	30.2	1.03	ใส	7.35	30.2	1.01	ใส	6.91	30.5	1.04	450	6.67	30.5	1.17	475	7.04	30.4	1.01	525	7.11	30.0	1.03	7.13	29.6	1.01	2,100
6/2/69	3,347	4,000	7.01	7.46	30.3	1.06	ใส	7.31	30.4	1.13	ใส	6.89	30.7	1.03	425	6.56	30.9	1.09	425	7.01	30.6	1.03	450	7.10	31.6	1.01	7.15	30.7	1.22	2,300
7/2/69	3,194	4,000	6.94	7.32	30.7	2.23	ใส	7.26	30.8	2.61	ใส	6.86	31.1	1.98	475	6.89	31.2	2.80	450	6.99	31.1	1.03	475	7.22	31.3	1.26	7.24	30.6	1.01	2,400
8/2/69	2,779	4,000	6.93	7.04	30.6	1.71	ใส	6.89	30.8	1.59	ใส	6.75	31.1	2.26	350	6.74	31.2	3.41	350	6.79	31.1	1.00	400	7.06	30.6	1.05	7.21	29.3	1.02	2,200
9/2/69	3,533	4,000	6.95	6.91	29.9	2.44	ใส	6.99	29.9	2.89	ใส	6.72	30.3	2.64	525	6.70	30.5	4.31	525	6.66	30.4	1.32	550	6.94	30.7	1.06	7.05	29.7	1.00	2,400
10/2/69	3,455	4,000	6.97	7.35	30.1	1.53	ใส	7.05	30.3	2.33	ใส	6.67	30.4	1.79	425	6.70	30.5	3.34	450	6.76	30.4	5.50	450	6.95	31.0	1.09	7.02	29.5	1.05	2,400
11/2/69	3,551	4,000	6.97	7.40	30.5	1.21	ใส	7.09	30.7	1.74	ใส	6.65	30.9	1.71	525	6.72	31.0	2.97	525	6.81	30.9	1.08	525	6.94	31.0	1.08	6.97	29.9	1.00	2,400
12/2/69	3,564	4,000	6.99	7.41	30.7	1.29	ใส	7.13	30.8	2.26	ใส	6.74	31.1	1.06	450	6.76	31.2	2.29	425	6.99	31.0	1.03	450	7.03	30.8	1.00	6.99	29.8	1.01	2,400
13/2/69	3,566	4,000	6.97	7.21	30.4	1.64	ใส	7.06	30.6	2.16	ใส	6.69	30.9	1.79	475	6.69	31.0	2.91	450	6.76	30.8	1.03	450	6.97	30.8	1.01	7.00	30.0	1.03	2,400
14/2/69	2,950	4,000	6.99	7.30	30.9	1.35	ใส	7.13	31.1	1.53	ใส	6.74	31.2	2.09	475	6.76	31.3	3.16	450	6.78	31.2	1.09	450	7.00	32.3	1.09	7.21	31.0	1.14	2,300
15/2/69	2,266	4,000	6.97	7.12	30.8	2.33	ใส	7.19	30.9	2.35	ใส	6.94	31.3	3.13	575	6.89	31.4	3.82	525	6.81	31.3	1.31	550	7.00	31.7	1.14	7.07	31.0	1.01	2,100
16/2/69	3,421	4,000	6.96	7.28	30.7	1.70	ใส	7.08	30.9	2.45	ใส	6.91	31.5	1.58	450	6.89	31.5	3.79	450	6.91	31.5	1.63	450	7.30	31.5	1.03	7.18	31.5	1.69	2,300
17/2/69	3,523	4,000	6.96	7.67	31.1	1.12	ใส	7.12	30.9	1.91	ใส	6.86	31.2	2.57	575	6.88	31.2	2.23	550	6.82	31.4	2.24	575	7.17	31.3	1.73	7.33	31.5	1.00	2,300
18/2/69	3,622	4,000	6.96	6.96	31.3	2.81	ใส	6.99	31.3	2.47	ใส	6.78	32.0	1.68	475	6.87	31.8	2.09	475	6.71	32.0	1.84	475	7.14	30.6	2.61	7.11	29.8	2.12	2,300
19/2/69	3,533	4,000	6.96	7.29	31.4	1.67	ใส	7.10	31.8	1.94	ใส	6.77	32.1	3.08	500	6.79	32.1	3.24	475	6.76	32.2	2.97	500	7.15	30.4	1.71	7.10	30.0	1.87	2,400
20/2/69	3,298	4,000	7.00	7.18	31.4	2.08	ใส	7.00	31.3	2.01	ใส	6.66	31.7	2.97	475	6.71	32.1	2.83	525	6.65	32.2	3.00	475	6.99	29.7	1.91	7.20	29.5	1.38	2,200
21/2/69	2,771	4,000	6.95	7.29	31.4	1.82	ใส	7.20	31.6	2.00	ใส	7.17	32.0	3.65	500	7.16	31.7	3.08	500	7.05	32.0	3.40	500	7.28	31.6	1.81	7.29	29.9	1.29	2,200
22/2/69	2,344	4,000	6.97	7.25	31.2	1.83	ใส	7.07	30.9	2.22	ใส	6.95	31.6	1.60	550	6.89	31.8	1.91	575	6.87	31.3	1.45	575	7.11	30.6	1.75	7.29	29.2	1.91	2,000
23/2/69	3,543	4,000	6.97	6.99	31.2	3.19	ใส	6.98	31.6	2.52	ใส	6.79	31.6	3.45	525	6.72	31.6	3.58	550	6.76	31.6	3.80	525	7.10	30.6	2.56	7.09	29.9	2.70	2,200
24/2/69	3,576	4,000	6.98	7.25	31.5	1.30	ใส	7.05	31.7	2.21	ใส	6.88	31.9	3.38	575	6.82	31.8	2.98	575	6.81	31.9	2.14	575	7.20	31.7	1.85	7.23	30.7	1.79	2,300
25/2/69	3,389	4,000	6.95	7.48	31.6	1.51	ใส	7.18	31.6	1.50	ใส	7.00	31.9	3.38	550	6.88	32.0	1.97	575	6.90	32.2	1.90	550	7.22	31.6	1.15	7.12	29.9	2.76	2,200
26/2/69	3,377	4,000	6.95	7.37	31.7	1.10	ใส	7.00	31.5	1.01	ใส	6.94	31.7	1.60	350	6.81	31.7	1.65	500	6.78	31.0	1.64	400	7.00	30.5	2.37	7.00	29.6	3.01	2,300
27/2/69	3,327	4,000	6.96	7.38	31.7	1.64	ใส	7.09	31.8	2.11	ใส	6.86	32.4	3.48	475	6.81	32.4	2.85	500	6.79	32.5	2.59	525	7.12	31.5	2.42	7.20	31.4	1.80	2,200
28/2/69	3,395	4,000	6.92	7.45	27.6	1.86	ใส	7.12	31.8	1.61	ใส	6.82	32.3	2.67	525	6.82	32.4	2.43	550	6.77	32.4	2.20	575	7.24	31.5	2.33	7.08	30.2	2.55	2,100
เฉลี่ย	3,260	-	6.96	7.30	30.6	1.68	ใส	7.12	30.9	1.94	ใส	6.82	31.2	2.14	500	6.77	31.2	2.59	500	6.84	31.2	1.87	500	7.11	30.7	1.54	7.14	29.9	1.53	2,250
รวม	91,272	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000

หมายเหตุ :

สูงสุด	3,622	-	7.01	7.67	31.7	3.19	0	7.35	31.8	2.89	0	7.17	32.4	3.65	575	7.16	32.4	4.31	575	7.06	32.5	5.50	575	7.30	32.3	2.61	7.33	31.5	3.01	
ต่ำสุด	2,247	-	6.92	6.91	27.6	1.03	0	6.89	29.4	1.01	0	6.54	29.8	1.02	300	6.51	29.9	1.09	300	6.49	29.7	1.00	300	6.94	28.2	1.00	6.97	27.6	1.00	

บันทึกการเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2569

วันที่	ปริมาณน้ำเข้าระบบ ลบ.ม./วัน	ค่าออกแบบ	บ่อปรับสภาพ (EQ Tank)	บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Tank 1)								บ่อเติมอากาศ 2 (Aeration Tank 2)				บ่อเติมอากาศ 3 (Aeration Tank 3)				บ่อเติมอากาศ 4 (Aeration Tank 4)				Polishing Pond			Holding Pond			ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
				MBBR Tank 1				MBBR Tank 2																						
		< 4,000 ลบ.ม./วัน	pH 5.5-9.0	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	สี	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	สี	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	kW
1/3/69	2,160	4,000	6.98	7.18	31.3	1.69	ใส	7.11	31.4	2.08	ใส	6.71	31.7	1.97	550	6.66	32.2	1.83	550	6.65	31.7	1.86	550	6.88	29.8	1.98	7.17	29.5	1.02	2,100
2/3/69	2,907	4,000	6.98	7.50	31.9	1.97	ใส	7.28	32.0	2.44	ใส	6.83	32.3	3.02	500	6.76	32.5	3.70	525	6.79	32.4	1.57	500	6.93	33.0	1.00	6.99	32.1	1.31	2,100
3/3/69	2,380	4,000	6.95	7.44	31.5	1.08	ใส	7.27	31.7	2.00	ใส	6.80	32.1	2.47	475	6.83	32.3	3.56	450	6.79	32.2	1.00	475	6.94	32.5	1.02	6.97	31.6	1.31	2,100
4/3/69	3,130	4,000	6.97	7.19	31.7	1.57	ใส	7.07	31.8	2.08	ใส	6.64	32.2	2.08	525	6.66	32.3	3.30	500	6.71	32.2	1.12	525	6.91	32.3	1.08	7.00	31.4	1.40	2,200
5/3/69	3,323	4,000	6.96	7.16	31.9	1.44	ใส	7.07	32.0	2.60	ใส	6.70	32.2	2.06	450	6.73	32.3	2.90	450	6.74	32.3	1.14	475	6.97	32.2	2.06	7.00	31.3	1.35	2,300
6/3/69	3,183	4,000	6.94	7.55	31.8	1.26	ใส	7.05	31.9	1.63	ใส	6.73	32.2	1.85	450	6.76	32.3	2.86	400	6.76	32.2	1.00	450	6.97	32.1	1.01	6.97	30.7	1.19	2,200
7/3/69	2,671	4,000	6.96	7.68	31.8	1.23	ใส	7.27	31.9	2.33	ใส	6.81	32.2	1.55	450	6.81	32.3	3.00	450	6.79	32.2	1.00	475	6.94	31.6	1.12	7.03	30.5	1.22	2,000
8/3/69	2,276	4,000	6.92	7.38	31.8	2.37	ใส	7.27	32.2	2.72	ใส	6.80	32.3	1.31	550	6.71	32.5	2.31	525	6.93	32.4	1.00	575	7.23	32.7	1.03	7.28	31.5	1.17	1,900
9/3/69	3,301	4,000	7.11	7.71	31.8	2.26	ใส	7.44	32.1	2.93	ใส	7.03	32.6	2.18	525	6.96	32.6	3.20	525	6.97	32.6	1.14	550	7.09	33.2	1.00	7.28	31.4	1.00	2,100
10/3/69	3,248	4,000	7.02	7.64	31.3	1.96	ใส	7.50	31.7	2.18	ใส	7.29	31.9	1.94	425	7.33	31.8	3.06	425	7.31	31.5	1.00	425	7.22	29.8	1.00	7.32	29.8	1.00	2,200
11/3/69	3,290	4,000	7.00	7.57	31.2	1.61	ใส	7.33	31.6	2.49	ใส	7.00	31.8	1.22	475	6.96	31.7	2.24	475	7.16	31.8	1.02	525	6.77	30.8	1.65	7.43	29.1	1.01	2,300
12/3/69	3,375	4,000	6.97	7.59	31.6	1.56	ใส	7.35	31.6	2.08	ใส	7.00	31.8	2.13	475	6.87	32.0	1.48	475	7.23	31.7	1.03	500	-	-	-	-	-	-	2,300
13/3/69	3,205	4,000	6.98	7.62	31.1	2.06	ใส	7.37	31.3	2.05	ใส	7.09	31.5	1.30	450	6.95	31.7	1.73	450	7.31	31.4	1.00	475	-	-	-	-	-	-	2,100
14/3/69	3,367	4,000	6.98	7.61	30.8	2.01	ใส	7.43	31.2	2.64	ใส	7.04	31.3	1.86	500	7.00	31.6	1.55	550	7.15	32.0	1.32	550	-	-	-	-	-	-	2,300
15/3/69	1,839	4,000	7.00	7.54	30.7	2.10	ใส	7.54	31.6	3.56	ใส	7.10	31.5	1.88	600	7.07	31.8	2.94	550	7.19	31.7	1.04	625	-	-	-	-	-	-	1,900
16/3/69	3,281	4,000	6.99	6.79	31.4	2.06	ใส	6.84	31.6	1.96	ใส	6.80	31.5	1.43	500	6.70	31.7	1.00	475	6.77	31.6	1.17	475	-	-	-	-	-	-	2,200
17/3/69	3,339	4,000	6.97	6.74	30.8	1.85	ใส	7.37	30.9	1.98	ใส	6.91	31.6	2.41	475	6.98	31.4	2.19	450	6.89	31.3	2.75	475	-	-	-	-	-	-	2,100
18/3/69	3,403	4,000	6.99	7.68	31.5	1.88	ใส	7.39	31.6	1.58	ใส	7.19	32.3	1.88	525	7.18	32.0	1.99	550	7.11	32.3	1.50	550	-	-	-	-	-	-	2,300
19/3/69	3,401	4,000	6.99	7.67	31.2	2.02	ใส	7.39	31.5	1.80	ใส	7.30	32.0	1.16	575	7.28	32.2	1.66	575	7.28	31.7	1.83	575	-	-	-	-	-	-	2,000
20/3/69	3,518	4,000	6.96	7.51	31.9	1.51	ใส	7.67	31.0	1.32	ใส	7.30	32.3	2.28	500	7.21	32.4	2.24	525	7.15	32.4	1.81	525	-	-	-	-	-	-	2,100
21/3/69	3,432	4,000	6.98	7.58	32.0	2.29	ใส	7.68	32.1	1.60	ใส	7.37	32.4	2.23	400	7.30	32.4	1.63	450	7.24	32.5	1.78	500	-	-	-	-	-	-	2,200
22/3/69	2,772	4,000	6.98	7.22	31.9	2.38	ใส	7.39	32.0	2.11	ใส	7.73	32.1	1.86	550	7.48	32.2	1.27	550	7.19	32.2	1.79	550	-	-	-	-	-	-	2,000
23/3/69	3,498	4,000	7.01	7.67	32.1	1.53	ใส	7.50	32.2	1.28	ใส	7.10	32.5	1.49	550	7.19	32.5	1.79	600	7.11	32.4	1.82	600	-	-	-	-	-	-	2,200
24/3/69	3,490	4,000	7.01	7.73	32.1	1.79	ใส	7.60	32.2	1.83	ใส	7.40	32.5	1.77	525	7.35	32.5	1.80	550	7.38	32.4	1.16	575	-	-	-	-	-	-	2,100
25/3/69	3,565	4,000	7.02	7.59	32.4	2.42	ใส	7.97	32.5	1.73	ใส	7.47	32.9	1.23	475	7.39	32.7	2.39	500	7.38	32.7	1.69	500	-	-	-	-	-	-	2,200
26/3/69	3,633	4,000	7.00	7.68	31.9	1.55	ใส	7.40	32.1	2.24	ใส	7.32	32.3	1.22	475	7.30	32.2	1.39	575	7.28	32.2	1.79	575	-	-	-	-	-	-	2,300
27/3/69	3,433	4,000	7.00	7.66	32.6	1.32	ใส	7.60	32.7	2.29	ใส	7.51	32.9	1.87	475	7.50	32.9	1.86	475	7.47	32.9	2.86	475	-	-	-	-	-	-	2,200
28/3/69	3,268	4,000	6.99	6.87	32.4	1.59	ใส	6.97	32.8	2.27	ใส	6.99	32.8	1.87	425	6.91	32.9	2.33	450	6.88	32.9	2.32	475	-	-	-	-	-	-	2,000
29/3/69	1,982	4,000	6.97	7.69	31.9	1.35	ใส	7.35	32.0	1.49	ใส	7.10	32.6	1.19	550	7.13	33.1	2.50	525	7.24	32.8	1.00	550	-	-	-	-	-	-	1,700
30/3/69	2,948	4,000	7.01	7.56	31.4	2.03	ใส	7.55	31.9	2.56	ใส	7.14	32.4	1.66	575	7.12	32.6	1.88	550	7.27	32.2	1.00	600	-	-	-	-	-	-	2,100
31/3/69	3,286	4,000	7.02	7.58	31.6	1.46	ใส	7.52	32.0	2.82	ใส	7.12	32.1	2.63	475	7.14	32.4	3.05	475	7.14	32.3	1.05	500	-	-	-	-	-	-	2,200
เฉลี่ย	3,094	-	6.99	7.47	31.6	1.78	ใส	7.37	31.8	2.15	ใส	7.07	32.1	1.84	500	7.04	32.2	2.28	500	7.07	32.1	1.44	500	6.98	31.8	1.27	7.13	30.8	1.18	2,129
รวม	95,904	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000

หมายเหตุ : 1. วันที่ 12-15/3/69 บ่อ Polishing Pond กับบ่อ Holding Pond ไม่มีค่าตรวจวัดหน้างาน เนื่องจากดำเนินการสูบลอกตะกอน

สูงสุด	3,633	-	7.11	7.73	32.6	2.42	0	7.97	32.8	3.56	0	7.73	32.9	3.02	600	7.50	33.1	3.70	600	7.47	32.9	2.86	625	7.23	33.2	2.06	7.43	32.1	1.40	
ต่ำสุด	1,839	-	6.92	6.74	30.7	1.08	0	6.84	30.9	1.28	0	6.64	31.3	1.16	400	6.66	31.4	1.00	400	6.65	31.3	1.00	425	6.77	29.8	1.00	6.97	29.1	1.00	

บันทึกการเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2569

วันที่	ปริมาณน้ำเข้าระบบ ลบ.ม./วัน	บ่อปรับสภาพ (EQ Tank)	บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Tank 1)								บ่อเติมอากาศ 2 (Aeration Tank 2)				บ่อเติมอากาศ 3 (Aeration Tank 3)				บ่อเติมอากาศ 4 (Aeration Tank 4)				Effluent			ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
			MBBR Tank 1				MBBR Tank 2																			
		pH	pH	Temp	DO	สี	pH	Temp	DO	สี	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	kW
		5.5-9.0	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l		5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l		5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	
1/4/69	3,449	6.99	7.55	32.0	1.62	ใส	7.43	32.2	1.68	ใส	7.12	32.5	2.59	475	7.11	32.6	3.21	450	7.12	32.6	1.00	475	7.23	32.6	1.44	2,200
2/4/69	3,546	7.02	7.61	32.3	1.62	ใส	7.46	32.6	1.68	ใส	7.09	33.0	1.80	450	7.13	33.0	2.42	475	7.19	32.9	1.00	475	7.27	32.7	1.78	2,300
3/4/69	3,391	7.01	7.52	31.9	1.48	ใส	7.47	32.5	1.83	ใส	7.10	32.6	1.95	500	7.14	33.0	2.56	500	7.16	33.0	1.00	525	7.23	32.9	2.14	2,200
4/4/69	3,269	6.98	7.59	32.2	2.08	ใส	7.42	32.7	1.95	ใส	7.11	32.9	1.80	450	7.21	33.0	2.47	450	7.34	32.9	1.00	450	7.60	33.0	1.70	2,300
5/4/69	2,316	6.93	7.62	32.4	1.64	ใส	7.47	33.1	2.69	ใส	7.22	33.4	2.77	400	7.21	33.5	3.05	400	7.25	33.5	1.00	400	7.42	33.3	2.57	1,800
6/4/69	3,157	6.95	7.23	32.5	1.41	ใส	7.56	32.9	1.00	ใส	7.32	33.4	1.56	525	7.34	33.4	1.79	550	7.42	33.3	1.00	525	7.44	32.8	2.59	2,000
7/4/69	3,326	7.00	7.51	32.3	1.68	ใส	7.52	32.4	1.61	ใส	7.15	33.1	1.93	500	7.10	33.2	2.40	525	7.28	33.0	1.00	550	7.33	33.2	1.62	2,200
8/4/69	3,496	6.98	7.59	32.4	1.88	ใส	7.44	32.8	1.46	ใส	7.18	33.1	2.22	500	7.16	33.2	2.47	500	7.23	33.1	1.00	500	7.29	33.4	1.67	2,300
9/4/69	3,387	6.99	7.63	32.8	1.44	ใส	7.44	33.2	1.18	ใส	7.09	33.5	1.82	500	7.15	33.4	2.46	475	7.22	33.4	1.00	500	7.31	33.5	1.84	2,200
10/4/69	3,261	6.98	7.55	32.6	1.25	ใส	7.40	33.1	1.00	ใส	7.11	33.4	1.87	450	7.16	33.6	2.57	500	7.31	33.5	1.00	500	7.36	33.7	2.35	2,200
11/4/69	2,162	6.98	7.52	32.6	1.32	ใส	7.47	32.9	1.64	ใส	7.22	33.3	2.14	525	7.21	33.4	3.01	500	7.26	33.3	1.00	550	7.37	33.5	2.33	1,900
12/4/69	1,554	6.94	7.64	32.9	1.84	ใส	7.54	33.2	1.00	ใส	7.37	33.5	2.60	425	7.36	33.7	3.16	475	7.36	34.1	1.00	875	7.44	33.7	2.31	1,800
13/4/69	1,363	6.98	7.51	33.2	2.59	ใส	7.50	33.1	1.34	ใส	7.35	33.7	2.18	550	7.30	33.9	2.56	550	7.18	34.5	1.00	900	7.38	34.0	1.94	1,900
14/4/69	1,447	6.93	7.50	33.2	2.62	ใส	7.37	33.1	1.00	ใส	7.21	33.9	2.86	600	7.20	34.0	3.03	550	6.74	34.9	1.03	850	7.26	33.9	1.92	1,800
15/4/69	1,509	6.95	7.65	33.1	3.71	ใส	7.41	33.1	1.00	ใส	7.20	33.8	2.97	600	7.13	34.1	3.13	575	5.97	35.2	2.74	850	7.25	33.8	1.98	1,900
16/4/69	2,377	6.99	7.55	33.4	3.03	ใส	7.49	33.0	1.35	ใส	7.31	33.7	3.42	550	7.24	34.0	3.53	525	5.89	35.0	3.46	775	7.21	34.1	2.09	1,900
17/4/69	2,248	6.95	7.48	33.0	2.17	ใส	7.59	33.0	1.23	ใส	7.40	33.5	3.19	325	7.39	33.7	3.42	300	5.63	35.1	3.29	700	7.32	33.3	2.36	1,900
18/4/69	2,424	6.98	7.40	33.8	1.88	ใส	7.59	33.3	1.29	ใส	7.39	34.0	3.16	375	7.45	33.7	2.98	400	6.15	35.2	2.32	425	7.42	34.2	1.61	1,900
19/4/69	2,082	7.01	7.37	34.0	1.28	ใส	7.60	33.4	1.32	ใส	7.31	34.4	1.95	275	7.29	34.3	1.70	275	7.12	34.4	1.00	275	7.32	33.9	1.29	1,900
20/4/69	3,396	7.01	7.50	34.2	1.67	ใส	7.58	33.9	1.37	ใส	7.41	34.5	1.65	475	7.32	34.6	1.88	475	7.31	34.6	1.80	500	7.57	33.9	1.87	2,200
21/4/69	3,373	7.03	7.42	33.9	2.77	ใส	7.61	33.6	2.23	ใส	7.43	33.8	1.82	500	7.42	33.9	1.56	450	7.31	33.8	1.22	450	7.26	34.0	1.97	2,200
22/4/69	3,448	7.01	7.57	34.0	1.79	ใส	7.79	34.0	2.36	ใส	7.30	34.2	2.93	450	7.29	34.1	2.34	450	7.32	34.2	1.50	450	7.22	33.8	3.73	2,200
23/4/69	3,370	7.04	7.51	34.2	2.18	ใส	7.76	33.6	1.39	ใส	7.46	33.9	3.16	450	7.34	34.4	2.60	425	7.31	33.9	1.78	450	7.49	33.8	2.02	2,200
24/4/69	3,397	7.00	7.51	33.3	1.85	ใส	7.71	33.2	3.09	ใส	7.55	33.5	3.45	450	7.44	34.0	3.63	450	7.42	33.4	2.59	450	7.74	32.9	1.79	2,100
25/4/69	3,283	7.02	7.44	32.6	1.38	ใส	7.59	33.0	1.00	ใส	7.21	33.2	3.18	475	7.21	33.2	3.06	475	7.32	33.1	1.00	500	7.21	33.8	1.37	2,100
26/4/69	2,430	6.96	7.33	33.3	1.44	ใส	7.77	33.2	1.00	ใส	7.57	33.5	3.80	500	7.47	33.6	2.86	500	7.34	33.6	1.00	525	7.69	34.0	1.81	2,000
27/4/69	3,150	7.06	7.50	32.8	2.63	ใส	7.53	32.8	2.06	ใส	7.30	33.1	4.35	450	7.27	33.1	3.50	425	7.16	33.1	1.16	475	7.34	33.0	1.66	2,100
28/4/69	3,460	7.04	7.52	32.6	2.31	ใส	7.57	32.6	1.82	ใส	7.34	33.3	4.89	400	7.25	33.0	3.79	400	7.11	33.1	1.00	400	7.34	32.9	1.67	2,200
29/4/69	3,354	6.99	7.51	32.8	1.29	ใส	7.82	32.8	1.00	ใส	7.40	33.2	4.24	375	7.29	33.4	3.01	400	7.28	33.4	1.00	425	7.32	33.5	1.77	2,200
30/4/69	3,437	7.00	7.62	32.7	1.82	ใส	7.70	32.8	1.13	ใส	7.39	33.3	3.50	425	7.21	33.4	1.54	475	7.35	33.3	1.00	475	7.48	33.4	1.59	2,100
เฉลี่ย	2,862	6.99	7.51	32.9	1.92	ใส	7.55	33.0	1.52	ใส	7.28	33.5	2.72	450	7.26	33.6	2.72	450	7.07	33.7	1.40	550	7.37	33.5	1.96	2,073
รวม	85,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,200

หมายเหตุ :

สูงสุด	3,546	7.06	7.65	34.2	3.71	0	7.82	34.0	3.09	0	7.57	34.5	4.89	600	7.47	34.6	3.79	575	7.42	35.2	3.46	900	7.74	34.2	3.73	
ต่ำสุด	1,363	6.93	7.23	31.9	1.25	0	7.37	32.2	1.00	0	7.09	32.5	1.56	275	7.10	32.6	1.54	275	5.63	32.6	1.00	275	7.21	32.6	1.29	

บันทึกการเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

วันที่	ปริมาณน้ำเข้าระบบ ลบ.ม./วัน	ค่าออกแบบ	บ่อปรับสภาพ (EQ Tank)	บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Tank 1)								บ่อเติมอากาศ 2 (Aeration Tank 2)				บ่อเติมอากาศ 3 (Aeration Tank 3)				บ่อเติมอากาศ 4 (Aeration Tank 4)				Effluent			ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
				MBBR Tank 1				MBBR Tank 2																			
		< 4,000	pH	pH	Temp	DO	สี	pH	Temp	DO	สี	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	SV_{30}	pH	Temp	DO	kW
		ลบ.ม./วัน	5.5-9.0	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l		5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l		5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	(ml/l)	5.5-9.0	< 40 °C	≥1 mg/l	
1/5/69	2,608	4,000	6.98	7.73	32.7	1.09	ใส	7.92	33.2	1.00	ใส	7.36	33.5	3.65	450	7.24	33.3	1.81	475	7.36	33.0	1.00	500	7.55	33.1	1.77	2,000
2/5/69	2,553	4,000	7.01	7.54	33.0	1.21	ใส	7.67	33.1	1.09	ใส	7.35	33.6	4.70	550	7.27	33.5	3.08	550	7.28	33.6	1.00	575	7.43	33.5	2.56	2,000
3/5/69	2,144	4,000	6.98	7.60	32.8	1.92	ใส	7.69	32.9	1.38	ใส	7.46	33.6	4.27	550	7.40	33.6	2.19	525	7.37	33.5	1.02	525	7.58	32.6	1.94	1,800
4/5/69	3,319	4,000	7.02	7.63	32.7	1.86	ใส	7.82	32.6	1.18	ใส	7.53	32.9	4.31	525	7.44	33.6	2.56	475	7.37	33.5	1.03	525	7.58	32.6	1.94	2,400
5/5/69	3,209	4,000	7.01	7.49	32.3	1.70	ใส	7.77	32.2	1.35	ใส	7.50	32.6	4.44	500	7.34	32.6	3.04	525	7.30	32.8	1.02	550	7.52	32.6	2.27	2,000
6/5/69	3,184	4,000	7.01	7.43	32.8	1.72	ใส	7.69	32.6	1.42	ใส	7.39	33.1	4.19	475	7.26	33.1	2.54	475	7.29	33.0	1.02	475	7.38	33.1	1.95	2,200
7/5/69	3,155	4,000	7.02	7.40	32.2	2.49	ใส	7.68	31.9	1.21	ใส	7.36	32.7	4.71	450	7.29	32.7	3.20	425	7.23	32.7	1.00	475	7.35	32.6	1.46	2,200
8/5/69	3,353	4,000	6.99	7.37	31.9	2.03	ใส	7.66	31.8	1.05	ใส	7.85	32.1	4.76	450	7.25	32.1	2.96	450	7.16	32.1	1.02	450	7.35	32.0	1.54	2,200
9/5/69	3,150	4,000	7.02	7.50	32.4	2.04	ใส	7.74	32.0	1.23	ใส	7.39	32.4	4.71	450	7.25	32.4	2.73	400	7.21	32.4	1.00	450	7.33	32.4	1.96	2,100
10/5/69	2,963	4,000	7.00	7.42	32.0	1.26	ใส	7.73	31.7	1.13	ใส	7.38	32.6	4.68	525	7.31	32.6	3.03	525	7.27	32.5	1.04	550	7.33	32.2	2.68	2,200
11/5/69	3,262	4,000	6.98	7.21	30.5	2.86	ใส	7.29	30.8	2.18	ใส	7.34	31.5	4.72	525	7.27	31.3	3.88	550	7.12	31.5	2.89	525	7.32	31.5	1.99	2,200
12/5/69	3,279	4,000	7.00	7.21	31.6	3.59	ใส	7.36	31.0	2.54	ใส	7.32	30.8	2.06	500	7.28	30.8	2.82	500	7.32	30.8	1.18	525	7.57	31.7	1.89	2,200
13/5/69	3,446	4,000	7.02	7.32	32.0	1.96	ใส	7.27	31.2	2.18	ใส	7.25	32.0	2.61	575	7.28	32.1	1.75	575	7.31	31.5	1.28	575	7.50	31.6	1.77	2,300
14/5/69	3,286	4,000	7.01	7.32	30.9	2.97	ใส	7.46	31.1	2.34	ใส	7.40	31.7	4.17	525	7.38	30.8	4.88	515	7.31	31.6	2.07	575	7.63	32.8	3.16	2,200
15/5/69	3,312	4,000	7.01	7.26	31.1	1.62	ใส	7.38	31.6	2.73	ใส	7.32	31.9	1.72	525	7.31	30.9	1.52	500	7.30	31.9	1.11	525	7.38	32.9	1.86	2,200
16/5/69	3,047	4,000	7.00	7.40	31.6	2.51	ใส	7.23	31.6	3.42	ใส	7.30	31.8	1.67	525	7.26	32.1	2.00	500	7.37	32.1	1.16	550	7.33	31.0	2.90	2,000
17/5/69	2,093	4,000	6.99	7.38	32.8	2.85	ใส	7.56	32.7	2.52	ใส	7.56	33.0	4.33	600	7.39	32.9	1.61	600	7.44	33.0	2.40	600	7.66	32.4	4.16	1,900
18/5/69	3,188	4,000	7.03	7.40	32.9	1.99	ใส	7.55	32.6	1.91	ใส	7.51	33.5	3.92	625	7.47	33.1	2.98	625	7.42	33.1	2.91	625	7.60	32.7	5.13	2,200
19/5/69	3,419	4,000	7.05	7.36	33.3	2.19	ใส	7.38	32.7	1.97	ใส	7.38	32.9	3.68	575	7.34	33.0	3.59	575	7.38	32.9	3.34	600	7.69	32.1	5.06	2,200
20/5/69	3,314	4,000	7.01	7.42	32.6	2.97	ใส	7.40	32.7	2.79	ใส	7.46	32.7	2.13	550	7.38	32.8	3.87	550	7.36	32.6	1.76	550	7.56	32.5	2.44	2,100
21/5/69	3,224	4,000	7.02	7.29	32.7	1.86	ใส	7.32	32.7	2.17	ใส	7.46	32.8	1.97	525	7.42	32.8	1.91	550	7.36	32.9	1.86	525	7.52	32.4	2.23	2,200
22/5/69	3,313	4,000	7.03	7.37	32.8	2.73	ใส	7.41	32.7	2.57	ใส	7.40	32.9	2.32	575	7.34	32.9	1.39	575	7.33	32.8	2.77	575	7.49	32.0	2.67	2,200
23/5/69	3,234	4,000	7.01	7.39	32.7	3.01	ใส	7.42	32.7	2.86	ใส	7.40	32.8	1.77	550	7.47	32.8	2.62	550	7.36	32.8	1.16	525	7.59	32.7	2.41	2,100
24/5/69	2,324	4,000	7.01	7.36	33.8	2.16	ใส	7.40	32.7	1.97	ใส	7.44	33.1	1.72	575	7.41	32.9	3.59	575	7.38	33.1	3.35	550	7.52	32.2	2.73	1,900
25/5/69	3,304	4,000	7.02	7.42	33.4	2.59	ใส	7.54	33.0	1.00	ใส	7.42	33.8	3.59	450	7.35	33.7	1.78	425	7.43	33.6	1.04	475	7.67	32.9	3.47	2,300
26/5/69	3,420	4,000	7.02	7.51	33.0	2.96	ใส	7.70	32.9	1.39	ใส	7.36	33.5	3.94	425	7.27	33.5	2.19	425	7.39	33.5	1.03	400	7.95	33.5	5.59	2,300
27/5/69	3,725	4,000	7.01	7.45	33.1	2.65	ใส	7.46	32.6	1.00	ใส	7.32	33.4	3.22	400	7.29	33.3	1.49	425	7.34	33.3	1.02	425	7.63	33.4	4.17	2,300
28/5/69	3,596	4,000	7.01	7.43	33.2	1.86	ใส	7.74	33.1	1.03	ใส	7.29	33.5	2.89	425	7.19	33.5	1.39	450	7.29	33.5	1.04	475	7.50	33.3	3.40	2,300
29/5/69	3,430	4,000	7.02	7.56	33.1	1.62	ใส	7.62	33.1	1.03	ใส	7.43	33.6	2.40	450	7.23	33.6	1.89	450	7.33	33.5	1.04	450	7.54	33.2	2.30	2,300
30/5/69	3,381	4,000	7.02	7.54	32.9	2.51	ใส	7.66	33.0	1.89	ใส	7.52	33.5	2.83	425	7.37	33.5	2.47	425	7.25	33.5	2.00	425	7.52	33.3	2.39	2,300
31/5/69	2,569	4,000	6.97	7.50	32.8	1.69	ใส	7.57	32.8	1.87	ใส	7.50	33.1	2.60	500	7.41	33.1	2.08	500	7.38	33.1	1.78	500	7.49	32.9	2.12	2,200
เฉลี่ย	3,123	-	7.01	7.39	32.4	2.31	ใส	7.52	32.2	1.88	ใส	7.41	32.7	3.25	500	7.32	32.6	2.56	500	7.32	32.6	1.64	500	7.51	32.5	2.80	2,178
รวม	96,804	108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800
สูงสุด	3,725	4,000	7.05	7.73	33.75	3.59	-.00	7.92	33.15	3.42	-.00	7.85	33.80	4.76	625.00	7.47	33.70	4.88	625.00	7.44	33.60	3.35	625.00	7.95	33.50	5.59	
ต่ำสุด	2,093	4,000	6.97	7.21	30.50	1.09	-.00	7.23	30.80	1.00	-.00	7.25	30.75	1.67	400.00	7.19	30.80	1.39	400.00	7.12	30.80	1.00	400.00	7.32	30.95	1.46	

หมายเหตุ :

บันทึกการเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

วันที่	ปริมาณน้ำเข้าระบบ	ค่าออกแบบ	บ่อปรับสภาพ (EQ Tank)	บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Tank 1)								บ่อเติมอากาศ 2 (Aeration Tank 2)				บ่อเติมอากาศ 3 (Aeration Tank 3)				บ่อเติมอากาศ 4 (Aeration Tank 4)				Polishing Pond			Holding Pond			ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
				MBBR Tank 1				MBBR Tank 2																						
	ลบ.ม./วัน	< 4,000 ลบ.ม./วัน	pH 5.5-9.0	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	สี	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	สี	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	SV_{30} (ml/l)	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	pH 5.5-9.0	Temp < 40 °C	DO ≥1 mg/l	kW
1/6/69	3,416	4,000	7.00	7.31	32.3	1.87	ใส	7.38	32.3	1.84	ใส	7.34	32.9	3.13	500	7.27	32.9	3.62	500	7.22	32.9	3.55	525	7.57	32.8	2.91	7.60	32.3	1.98	2,200
2/6/69	3,392	4,000	7.01	7.42	32.9	3.19	ใส	7.41	32.7	2.52	ใส	7.43	32.8	1.77	575	7.37	33.0	1.21	575	7.36	33.0	4.63	575	7.27	32.7	3.01	7.60	32.9	2.74	2,300
3/6/69	2,683	4,000	7.06	7.65	32.8	2.95	ใส	7.69	33.1	2.99	ใส	7.54	33.3	3.18	500	7.53	33.3	2.45	500	7.47	33.5	1.75	525	7.60	33.6	2.95	7.68	33.5	3.05	2,200
4/6/69	3,227	4,000	7.03	7.29	32.3	2.47	ใส	7.39	32.8	2.55	ใส	7.40	33.1	2.08	475	7.32	33.2	2.63	500	7.33	33.2	1.79	500	7.70	32.7	2.98	7.54	32.7	2.88	2,200
5/6/69	3,557	4,000	7.03	7.57	32.6	2.25	ใส	7.60	32.8	1.86	ใส	7.55	33.1	3.17	575	7.49	33.0	1.73	575	7.46	33.1	2.17	575	7.60	33.0	2.89	7.58	32.9	2.59	2,200
6/6/69	3,473	4,000	7.02	7.40	33.3	1.93	ใส	7.38	33.0	2.02	ใส	7.47	32.9	1.91	525	7.30	32.9	1.40	525	7.34	33.2	1.67	550	7.23	32.7	2.74	7.55	33.0	2.59	2,200
7/6/69	2,674	4,000	6.99	7.54	32.8	1.57	ใส	7.51	32.6	1.25	ใส	7.57	32.8	2.79	500	7.56	32.8	1.95	550	7.48	32.9	1.21	550	7.61	32.5	2.09	7.59	31.9	1.84	2,000
8/6/69	3,303	4,000	7.03	7.40	32.8	1.99	ใส	7.60	32.6	2.20	ใส	7.58	33.2	3.61	500	7.47	33.4	1.60	525	7.40	33.2	1.47	550	7.43	32.4	2.13	7.51	32.6	1.78	2,200
9/6/69	3,480	4,000	7.03	7.42	32.8	2.87	ใส	7.44	32.9	2.69	ใส	7.51	33.0	1.68	525	7.40	32.7	1.51	525	7.41	32.8	1.40	525	7.71	33.0	2.01	7.60	32.8	2.64	2,300
10/6/69	3,453	4,000	7.02	7.50	32.7	3.22	ใส	7.45	32.6	2.16	ใส	7.41	33.1	2.91	475	7.43	33.2	1.68	475	7.39	32.8	1.70	500	7.58	32.6	2.88	7.65	33.0	3.03	2,300
11/6/69	3,495	4,000	7.01	7.36	32.4	1.85	ใส	7.32	32.7	2.13	ใส	7.44	33.1	1.53	550	7.43	32.7	3.98	525	7.32	32.7	3.31	550	7.50	33.2	3.01	7.52	32.9	2.13	2,300
12/6/69	3,373	4,000	7.01	7.41	32.1	2.42	ใส	7.41	32.3	1.80	ใส	7.50	32.6	1.64	450	7.40	32.1	1.64	450	7.40	32.5	1.16	450	7.65	32.4	1.71	7.69	32.6	2.57	2,100
13/6/69	3,281	4,000	7.02	7.66	32.5	2.68	ใส	7.68	32.8	1.74	ใส	7.60	32.8	2.59	575	7.53	32.8	2.66	575	7.42	32.8	2.45	575	7.55	32.7	5.10	7.49	33.1	3.97	2,100
14/6/69	2,232	4,000	6.98	7.55	33.0	1.40	ใส	7.50	32.6	1.41	ใส	7.65	33.2	3.65	525	7.57	33.2	2.48	525	7.49	33.2	1.83	550	7.62	32.0	3.05	7.41	33.4	3.83	2,200
15/6/69	3,171	4,000	7.01	7.57	33.0	2.88	ใส	7.61	33.0	2.72	ใส	7.53	33.5	2.03	525	7.45	33.3	2.77	525	7.42	33.8	2.31	550	7.89	33.8	6.09	7.72	33.1	1.90	1,900
16/6/69	3,284	4,000	7.02	7.31	32.7	1.93	ใส	7.43	32.6	1.71	ใส	7.41	33.2	2.13	450	7.30	33.2	1.89	450	7.29	33.2	1.67	475	7.59	33.1	2.74	7.61	32.3	2.28	2,200
17/6/69	3,338	4,000	7.02	7.57	32.8	1.69	ใส	7.43	32.9	1.67	ใส	7.36	32.6	2.97	525	7.39	33.1	1.28	525	7.51	33.1	2.57	550	7.56	33.2	2.83	7.62	33.0	2.58	2,200
18/6/69	3,271	4,000	7.02	7.38	33.2	3.62	ใส	7.43	33.2	3.87	ใส	7.52	33.2	1.57	500	7.40	33.3	2.90	525	7.41	33.5	2.61	500	7.63	33.5	3.84	7.59	33.4	2.17	2,100
19/6/69	3,449	4,000	7.02	7.54	32.8	1.43	ใส	7.51	32.8	1.34	ใส	7.56	33.1	1.51	475	7.49	32.9	2.46	475	7.48	32.8	1.17	500	7.51	33.0	2.15	7.40	33.0	2.64	2,200
20/6/69	3,354	4,000	7.01	7.33	32.5	1.83	ใส	7.37	32.6	1.89	ใส	7.49	32.9	3.37	550	7.38	32.9	1.67	550	7.37	32.9	2.39	575	7.57	32.7	3.28	7.49	32.7	2.97	2,300
21/6/69	2,330	4,000	7.01	7.39	32.4	1.72	ใส	7.40	32.3	2.20	ใส	7.36	32.6	1.15	550	7.48	32.7	2.47	575	7.40	32.4	1.71	575	7.48	32.7	1.93	7.54	32.8	2.60	1,900
22/6/69	3,192	4,000	7.03	7.46	32.5	2.43	ใส	7.65	32.3	1.13	ใส	7.26	32.8	3.12	525	7.29	32.8	2.72	525	7.25	31.2	1.47	525	7.45	32.3	1.55	7.47	32.0	1.81	2,300
23/6/69	3,325	4,000	7.02	7.44	32.3	2.73	ใส	7.63	32.1	1.03	ใส	7.27	32.9	3.69	500	7.21	32.7	3.26	500	7.14	32.7	1.17	500	7.40	32.9	1.88	7.49	32.6	2.73	2,200
24/6/69	3,284	4,000	7.02	7.41	32.9	2.40	ใส	7.77	32.6	1.03	ใส	7.26	33.2	2.45	475	7.20	33.2	2.05	475	7.21	33.2	1.05	475	7.54	33.4	3.03	7.61	33.3	5.27	2,300
25/6/69	3,705	4,000	7.00	7.39	31.6	3.03	ใส	7.52	31.5	1.63	ใส	7.13	32.5	3.54	475	7.16	32.3	3.48	475	7.13	32.3	1.46	500	7.46	32.7	3.68	7.85	32.7	8.00	2,200
26/6/69	3,592	4,000	6.99	7.39	32.6	2.47	ใส	7.83	32.4	1.17	ใส	6.91	32.7	3.09	400	6.98	32.8	2.65	400	6.95	32.8	1.01	400	7.58	32.8	4.19	7.88	33.1	6.07	2,200
27/6/69	3,186	4,000	7.00	7.37	33.0	2.22	ใส	7.69	32.7	1.28	ใส	6.92	33.1	3.28	450	7.01	33.1	2.72	450	7.00	33.2	1.02	475	7.33	33.0	1.89	7.50	32.9	4.01	2,200
28/6/69	2,306	4,000	6.97	7.30	32.8	2.57	ใส	7.58	32.6	1.13	ใส	7.06	33.3	3.50	525	7.22	33.2	3.19	525	7.11	33.1	1.03	575	7.32	32.9	1.33	7.47	32.7	2.38	1,900
29/6/69	3,206	4,000	7.00	7.44	32.7	3.17	ใส	7.46	32.5	2.09	ใส	7.00	33.3	3.49	550	7.15	33.2	3.39	525	7.07	33.2	1.44	500	7.41	32.8	1.59	7.53	32.8	3.20	2,200
30/6/69	3,586	4,000	7.00	7.36	32.1	3.05	ใส	7.67	31.9	1.00	ใส	6.90	32.6	3.58	475	6.97	32.4	3.49	425	6.84	32.5	1.12	450	7.34	32.6	2.13	7.50	32.7	3.65	2,300
เฉลี่ย	3,221	-	7.01	7.44	32.6	2.39	ใส	7.52	32.6	1.87	ใส	7.36	32.9	2.67	500	7.34	32.9	2.43	500	7.30	32.9	1.84	500	7.52	32.8	2.78	7.57	32.8	3.06	2,180
รวม	96,618	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,400
สูงสุด	3,705	-	7.06	7.66	33.3	3.62	0	7.83	33.2	3.87	0	7.65	33.5	3.69	575	7.57	33.4	3.98	575	7.51	33.8	4.63	575	7.89	33.8	6.09	7.88	33.5	8.00	
ต่ำสุด	2,232	-	6.97	7.29	31.6	1.40	0	7.32	31.5	1.00	0	6.90	32.5	1.15	400	6.97	32.1	1.21	400	6.84	31.2	1.01	400	7.23	32.0	1.33	7.40	31.9	1.78	

หมายเหตุ :

ภาคผนวกที่ 23

Preventive Maintenance ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

ประจำปี พ.ศ. 2569

Pinthong Industrial Park Public Company Limited
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107559000036
789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Rd., T.Nongkham, A.Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ - แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
T: +66 (38) - 296334 - 7 F: +66 (38) - 296333

เลขที่เอกสาร PM260001

วันที่ 15 มกราคม 2569

ผู้จัดทำ หัสดี สินธ์ภมร

เรื่อง ขออนุมัติแผนก PM ประจำปี 2569 แผนกซ่อมบำรุง

เรียน ธนชัยอนันต์ จีนเจียง

สำเนา พีร์ ปัทมวรกุลชัย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Attached file: PM260001.pdf)

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ผู้ตรวจสอบ

15 มกราคม 2569

[redacted]

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อนุมัติ

15 มกราคม 2569

PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2026 : Pinthong 1-6

[redacted]

ตรวจสอบโดย

แผนก : ซ่อมบำรุง

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																														สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
						6_10	13_17	20_24	27_31	3_7	10_14	17_21	24_28	3_7	10_14	17_21	24_28	1_4	7_11	14_18	23_27	5_9	12_16	19_23	26_30	2_6	9_13	16_20	23_27	1_4	7_11	14_18	21_31	4_8	11_15	18_22	25_29	1_5	8_12	15_19	22_26	6_10	13_17	20_24	27_31	3_7	10_14	17_21	24_28	1_5	8_12	15_19	22_26	
1	ELECTRICAL SYSTEM (ตู้ MDB, DP) Check And Report Results.																																																					
ตู้ MDB, DP	1. MDB, DP (ระบบประปา,บำบัดและพื้นที่ส่วนกลาง) =>ผรม.	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	ผรม.ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ MDB พร้อมซ่อมแซมจุดที่ชำรุด	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	2. MDB, DP (ระบบประปา,บำบัดและพื้นที่ส่วนกลาง) =>ผรม.	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	ผรม.ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ MDB พร้อมซ่อมแซมจุดที่ชำรุด	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	3. MDB, DP (ระบบประปา,บำบัดและพื้นที่ส่วนกลาง) =>ผรม.	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	ผรม.ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ MDB พร้อมซ่อมแซมจุดที่ชำรุด	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	4. MDB, DP (ระบบประปา,บำบัดและพื้นที่ส่วนกลาง) =>ผรม.	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	ผรม.ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ MDB พร้อมซ่อมแซมจุดที่ชำรุด	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	5. MDB, DP (ระบบประปา,บำบัดและพื้นที่ส่วนกลาง) =>ผรม.	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	ผรม.ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ MDB พร้อมซ่อมแซมจุดที่ชำรุด	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	6. MDB, DP (ระบบประปา,บำบัดและพื้นที่ส่วนกลาง) =>ผรม.	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	ผรม.ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ MDB พร้อมซ่อมแซมจุดที่ชำรุด	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
2	RAW WATER PUMP SYSTEM (Motor & pump ระบบน้ำดิบ)																																																					
Motor & Pump	1. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-01 : บ่อ R102 Pump 1 (Centifugal Pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	2. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-02 : บ่อ R102 Pump 2 (Centifugal Pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	3. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-A : บ่อ R102 Pump 3 (Centifugal Pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	4. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-B : บ่อ R102 Pump 4 (Centifugal Pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	5. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-04 : บ่อ R103 Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	6. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-03 : บ่อ R104 Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	7. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-03A : บ่อ R104 Pump 2 (Centifugal Pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	8. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-03B : บ่อ R104 Pump 3 (Centifugal Pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	9. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-05 : อุโมงค์ Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	10. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-06 : บ่อเฟส 14 Pump 1 (Booter Pump 4 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	11. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-01 : บ่อ R202 Pump 1 (Centifugal Pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	12. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-02 : บ่อ R202 Pump 2 (Centifugal Pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	13. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-03 : บ่อ R202 Pump 3 (Centifugal Pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	14. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-04 : บ่อ น้ำพุ (เรือนรับรอง) Pump 1 (Booter Pump 5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	15. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-05 : สูบขึ้นรถน้ำ Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	16. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-06 : บ่อ R201 Pump 1 (Centifugal Pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	17. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-07 : บ่อ R201 Pump 2 (Centifugal Pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	18. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-01 : Scada Pump 1 (Centifugal Pump 90 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	19. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-03 : Scada Pump 3 (Centifugal Pump 90 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	20. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-04 : บ่อ R302 Pump 1 (Centifugal Pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																																	
	21. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-05 : บ่อ R302 Pump 2 (Centifugal Pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																														สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	22. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-06 : บ่อ R302 Pump 3 (Centifugal Pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	23. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-07 : ปั๊มน้ำพุ Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	24. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-08 : บ่อ R303-1 Pump 1 (Centifugal Pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	25. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-09 : บ่อ R303-1 Pump 2 (Centifugal Pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	26. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-10 : บ่อ R303-2 Pump 1 (Centifugal Pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	27. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-01 : บ่อ R402 Pump 1 (Centifugal Pump 30 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	28. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-02 : บ่อ R402 Pump 2 (Centifugal Pump 30 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	29. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-01 : บ่อ R502 Pump 1 (Centifugal Pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	30. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-02 : บ่อ R502 Pump 2 (Centifugal Pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	31. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-03 : บ่อ R502 Pump 3 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	32. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-01 : บ่อ R602 Pump 1 (Centifugal Pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	33. Motor & pump สูบน้ำดิบ RP-02 : บ่อ R602 Pump 2 (Centifugal Pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
3	**RAW WATER PUMP SYSTEM (Control panel ระบบน้ำดิบ)**																																																					
	1. Control panel สูบน้ำดิบ RC1-01 : บ่อ R102 (Control pump to 4 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	2. Control panel สูบน้ำดิบ RC1-02 : บ่อ R103 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	3. Control panel สูบน้ำดิบ RC1-03 : บ่อ R104 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	4. Control panel สูบน้ำดิบ RC1-04 : บ่อ R104 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	5. Control panel สูบน้ำดิบ RC1-05 : บ่อ อุโมงค์ (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	6. Control panel สูบน้ำดิบ RC1-06 : บ่อ เฟส 14 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	7. Control panel สูบน้ำดิบ RC1-07 : บ่อ สวนไผ่ทอง (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	8. Control panel สูบน้ำดิบ RC2-01 : บ่อ R202 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	9. Control panel สูบน้ำดิบ RC2-02 : บ่อ R201 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	10. Control panel สูบน้ำดิบ RC2-03 : สูบขึ้นรถน้ำ (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
Control Panel	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	11. Control panel สูบน้ำดิบ RC2-04 : ปั๊มน้ำพุ (เรือนรับรอง) (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	12. Control panel สูบน้ำดิบ RC3-01 : Scarda (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	13. Control panel สูบน้ำดิบ RC3-02 : บ่อ R302 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	14. Control panel สูบน้ำดิบ RC3-03 : บ่อน้ำพุ (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	15. Control panel สูบน้ำดิบ RC3-04 : บ่อ R303-1 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	16. Control panel สูบน้ำดิบRC3-05 : บ่อ R303-2 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	17 Control panel สูบน้ำดิบ RC4-01 : บ่อ R402 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		O	M			O	M			O	M			O	Y-S			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M			O	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	18. Control panel ศูนย์น้ำดิบ RC5-01 : บ่อ R502 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M				Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	19. Control panel ศูนย์น้ำดิบ RC5-02 : บ่อ R502 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M				Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	20. Control panel ศูนย์น้ำดิบ RC6-01 : บ่อ R602 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M				Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	21. แอร์วาล์ว น้ำดิบ (Control pump to xx set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN																										○	Y-S																			
	ผรม. ขอดล้างทำความสะอาด	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
4	**WATER SUPPLY SYSTEM (ระบบประปา)**																																																	
	1. Motor & pump RW-01 : ศูนย์น้ำดิบชุด 1-2 Pump 1 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	2. Motor & pump RW-02 : ศูนย์น้ำดิบชุด 1-2 Pump 2 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	3. Motor & pump RW-03 : ศูนย์น้ำดิบชุด 1-2 Pump 3 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	4. Motor & pump RW-04 : ศูนย์น้ำดิบชุด AB Pump 1 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	5. Motor & pump RW-05 : ศูนย์น้ำดิบชุด AB Pump 2 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	6. Motor & pump RW-06 : ศูนย์น้ำดิบชุด AB Pump 3 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	7. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 MX-1H : Mixxer 1 HI Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	8. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 MX-1L : Mixxer 1 LOW Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	9. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 MX-2H : Mixxer 2 HI Pump 2 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	10. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 MX-2L : Mixxer 2 LOW Pump 2 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	11. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 PAC-1 : Pac ชุด 1-2 Pump 1 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	12. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 PAC-2 : Pac ชุด 1-2 Pump 2 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	13. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 CL-1 : คลอรีน ชุด 1-2 Pump 1 (Feed pump 11.1 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	14. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 CL-2 : คลอรีน ชุด 1-2 Pump 2 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	15. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 CL-3 : คลอรีน ชุด 1-2 Pump 3 (Feed pump 11.1 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	16. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 CL-4 : คลอรีน ชุด 1-2 Pump 4 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	17. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 PD-2 : โพลิเมอร์ ชุด 1-2 Pump 1 (Feed pump 0.06 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	18. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด 1-2 MXP-01 : Mixer polimer ชุด 1-2 Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	19. Motor & pump ระบบถังกรองทราย ชุด 1-2 CW-4 : ศูนย์เข้าถังกรองทราย ชุด 1-2 Pump 1 (Centifugal pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	20. Motor & pump ระบบถังกรองทราย ชุด 1-2 CW-5 : ศูนย์เข้าถังกรองทราย ชุด 1-2 Pump 2 (Centifugal pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	21. Motor & pump ระบบถังกรองทราย ชุด 1-2 CW-6 : ศูนย์เข้าถังกรองทราย ชุด 1-2 Pump 3 (Centifugal pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	22. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB SCP-A01 : Scraper-A Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	23. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB SCP-B01 : Scraper-B Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	24. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB MX-A01 : Mixer-A1 Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	25. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB MX-A02 : Mixer-A2 Pump 2 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	26. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB MX-B01 : Mixer-B1 Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	27. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB MX-B02 : Mixer-B2 Pump 2 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	28. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB PAC-A : Pac ชุด AB Pump 1 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	29. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB PAC-B : Pac ชุด AB Pump 2 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	30. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB CL-A : คลอรีน ชุด AB Pump 1 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	31. Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB CL-B : คลอรีน ชุด AB Pump 2 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	32 . Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB CL-C : คลอรีน ชุด AB Pump 3 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	33 . Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB PD-A : โพลิเมอร์ ชุด AB Pump 1 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	34 . Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB PD-B : โพลิเมอร์ ชุด AB Pump 2 (Feed pump 21.2 w.)= 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	35 . Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB PD-B : โพลิเมอร์ ชุด AB Pump 2 (Feed pump 21.2 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	36 . Motor & pump ระบบผลิตน้ำประปา ชุด AB-01 : Airbower Pump 1 (Feed pump 2.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	37 . Motor & pump ระบบสูบเข้าเส้นท่อ H-01 : Pump 1 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	38 . Motor & pump ระบบสูบเข้าเส้นท่อ H-02 : Pump 2 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	39. Motor & pump ระบบสูบเข้าเส้นท่อ H-03 : Pump 3 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	40. Motor & pump ระบบสูบเข้าเส้นท่อ H-04 : Pump 4 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	41. Motor & pump ระบบสูบไปส่วนขยาย CP-01 : Pump 1 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	42. Motor & pump ระบบสูบไปส่วนขยาย WWP-01 : Pump 2 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	43. Motor & pump ระบบสูบไปส่วนขยาย WWP-02 : Pump 3 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	44. Motor & pump ระบบสูบไปส่วนขยาย WWP-03 : Pump 4 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	45. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง WWP-04 : Pump 1 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	46. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง WWP-05 : Pump 2 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	47. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง WWP-06 : Pump 3 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	48. Motor & pump ระบบสูบน้ำดิบ ชุด AB RW-01 : Pump 1 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	49. Motor & pump ระบบสูบน้ำดิบ ชุด AB RW-02 : Pump 2 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	50. Motor & pump ระบบสูบน้ำดิบ ชุด AB RW-03 : Pump 3 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	51. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง ชุด AB TP-01 : Pump 1 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	52. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง ชุด AB TP-02 : Pump 2 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	53. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง ชุด AB TP-03 : Pump 3 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	54. Motor & pump ระบบสูบเข้าถังกรองทราย ชุด AB CW-01 : Pump 1 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	55. Motor & pump ระบบสูบเข้าถังกรองทราย ชุด AB CW-02 : Pump 2 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	56. Motor & pump ระบบสูบเข้าถังกรองทราย ชุด AB CW-03 : Pump 3 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	57. Motor & pump ระบบ Scraper A S-01 : Pump 1 (Therby mixxer pump 0.37 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																															สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	58. Motor & pump ระบบ Scraper B S-02 : Pump 1 (Therby mixxer pump 0.37 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	59. Motor & pump ระบบ Therby mixxer A TM-01 : Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	60. Motor & pump ระบบ Therby mixxer A TM-02 : Pump 2 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	61. Motor & pump ระบบ Therby mixxer B TM-03 : Pump 1 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	62. Motor & pump ระบบ Therby mixxer B TM-04 : Pump 2 (Therby mixxer pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	63. Motor & pump ระบบ Pac AB PAC-01 : Pump 1 (Feed pump 21.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	64. Motor & pump ระบบ Pac AB PAC-02 : Pump 2 (Feed pump 21.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	65. Motor & pump ระบบ คลอรีน AB CL-01 : Pump 1 (Feed pump 21.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	66. Motor & pump ระบบ คลอรีน AB CL-02 : Pump 2 (Feed pump 21.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	67. Motor & pump ระบบ คลอรีน AB CL-03 : Pump 3 (Feed pump 21.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	68. Motor & pump ระบบ โพลิเมอร์ AB PD-01 : Pump 1 (Feed pump 0.06 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	69. Motor & pump ระบบ โพลิเมอร์ AB PD-02 : Pump 2 (Feed pump 0.06 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	70. Motor & pump ระบบ Mixxer polimer AB PM-01 : Pump 1 (Therby mixxer pump 0.37 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	71. Motor & pump ระบบสูบน้ำดิบ ชุด C RW-04 : Pump 1 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	72. Motor & pump ระบบสูบน้ำดิบ ชุด C RW-05: Pump 2 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	73. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง ชุด C TP-04: Pump 1 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	74. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง ชุด C TP-05: Pump 2 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	75. Motor & pump ระบบ Backwash ชุด C BW-C1: Pump 1 (Booter pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	76. Motor & pump ระบบ Backwash ชุด C BW-C2: Pump 2 (Booter pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	77. Motor & pump ระบบ Vaccuum ชุด C VP-C1 Pump 1 (Vaccuum pump.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	78. Motor & pump ระบบ Vaccuum ชุด C VP-C1 Pump 2 (Vaccuum pump.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	79. Motor & pump ระบบ Airbower ชุด C AB-C2 Pump 1 (Airbower pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	80. Motor & pump ระบบ Airreceircr ชุด C AR-C Pump1 (Aireceircr pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	81. Motor & pump ระบบ Pac ชุด C PAC-C1 Pump 1 (Feed pump 10.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	82. Motor & pump ระบบ Pac ชุด C PAC-C2 Pump 2 (Feed pump 10.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	83. Motor & pump ระบบคลอรีน ชุด C CL-C1 Pump 1 (Feed pump 10.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	84. Motor & pump ระบบคลอรีน ชุด C CL-C2 Pump 2 (Feed pump 10.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
Motor & Pump	85. Motor & pump ระบบคลอรีน ชุด C CL-C3 Pump 3 (Feed pump 10.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	86. Motor & pump ระบบคลอรีน ชุด C CL-C4 Pump 4 (Feed pump 10.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	87. Motor & pump ระบบโพลิเมอร์ ชุด C PD-C Pump 1 (Feed pump 0.1 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	88. Motor & pump ระบบ Mixxer โพลิเมอร์ ชุด C PM-C Pump 1 (Feed pump 0.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	89. Motor & pump ระบบ ปั๊มจุ่มตะกอน SUP-01 Pump 1 (Supmersible pump 3.75 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	90. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูงส่วนขยาย P-1 Pump 1 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	91. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูงส่วนขยาย P-2 Pump 2 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	92. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูงส่วนขยาย P-3 Pump 3 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	93. Motor & pump RW-01 : สูบน้ำดิบ Pump 1 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	94. Motor & pump RW-02 : สูบน้ำดิบ Pump 2 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	95. Motor & pump BW-01 : Backwash Pump 1 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	96. Motor & pump BW-02 : Backwash Pump 2 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	97. Motor & pump MXP-01 : Mixxer Polimer Pump 1 (Gear Mixer pump 0.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	98. Motor & pump ระบบ Pac PAC-01 Pump 1 (Feed pump 15 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	99. Motor & pump ระบบ Pac PAC-02 Pump 2 (Feed pump 15 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	100. Motor & pump ระบบคลอรีน CL-01 Pump 1 (Feed pump 15 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	101. Motor & pump ระบบคลอรีน CL-02 Pump 2 (Feed pump 15 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	102. Motor & pump ระบบคลอรีน CL-03 Pump 3 (Feed pump 15 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	103. Motor & pump ระบบโพลิเมอร์ PD-1 Pump 3 (Feed pump 0.1 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	104. Motor & pump ระบบ Vaccuum VP-1 Pump 1 (Vaccuum pump. 2.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	105. Motor & pump ระบบ Vaccuum VP-2 Pump 2 (Vaccuum pump. 2.2 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	106. Motor & pump ระบบ Airbower AB-1 Pump 1 (Airbower pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	107. Motor & pump ระบบ Air Compressor AC-1 Pump 1 (Air Compressor pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	108. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง CW-1 Pump 1 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	109. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง CW-2 Pump 2 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	110. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง CW-3 Pump 3 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	111. Motor & pump RW-01 : สูบน้ำดิบ Pump 1 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	112. Motor & pump RW-02 : สูบน้ำดิบ Pump 1 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	113. Motor & pump ระบบคลอรีน CL-01 Pump 1 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	114. Motor & pump ระบบคลอรีน CL-02 Pump 2 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	115. Motor & pump ระบบคลอรีน CL-03 Pump 3 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	116. Motor & pump ระบบคลอรีน CL-04 Pump 4 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	117. Motor & pump ระบบ Pac PAC-01 Pump 1 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	118. Motor & pump ระบบ Pac PAC-02 Pump 2 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																														สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	119. Motor & pump ระบบโพลิเมอร์ Polimer-1 Pump 1 (Feed pump 90 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	120. Motor & pump ระบบโพลิเมอร์ Polimer-2 Pump 2 (Feed pump 90 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	121. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง CP-01 Pump 1 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	122. Motor & pump ระบบสูบขึ้นถังสูง CP-02 Pump 2 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	123. Motor & pump BW-01 : Backwash Pump 1 (Centifugal pump 4 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	124. Motor & pump BW-02 : Backwash Pump 2 (Centifugal pump 4 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	125. Motor & pump ระบบ Airbower AB-01 Pump 1 (Airbower pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	126. Motor & pump ระบบ Air Compressor AC-1 Pump 1 (Air Compressor pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	127. Motor & pump ระบบ Vaccuum VP-01 Pump 1 (Vaccuum pump. Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	128. Motor & pump ระบบ Vaccuum VP-02 Pump 1 (Vaccuum pump. Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	129. Motor & pump RW-01 : สูบน้ำดิบ Pump 1 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	130. Motor & pump RW-02 : สูบน้ำดิบ Pump 2 (Centifugal pump 15 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	131. Motor & pump CL-01 ระบบคลอรีน Pump 1 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	132. Motor & pump CL-02 ระบบคลอรีน Pump 2 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	133. Motor & pump CL-03 ระบบคลอรีน Pump 3 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	134. Motor & pump AB-01 ระบบ Airbower Pump 1 (Airbower pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	135. Motor & pump PAC-01 ระบบ Pac Pump 1 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	136. Motor & pump PAC-02 ระบบ Pac Pump 2 (Feed pump 11 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	137. Motor & pump CP-01 ระบบสูบขึ้นถังสูง Pump 1 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	138. Motor & pump CP-02 ระบบสูบขึ้นถังสูง Pump 2 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	139. Motor & pump CP-03 ระบบสูบขึ้นถังสูง Pump 3 (Centifugal pump 18.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	140. Motor & pump BW-01 : Backwash Pump 1 (Centifugal pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	141. Motor & pump BW-02 : Backwash Pump 2 (Centifugal pump 5.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	142. Motor & pump VP-01 ระบบ Vaccuum Pump 1 (Vaccuum pump. 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	143. Motor & pump VP-02 ระบบ Vaccuum Pump 2 (Vaccuum pump. 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	144. Motor & pump Polimer-1 ระบบโพลิเมอร์ Pump 1 (Feed pump 90 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	145. Motor & pump Polimer-2 ระบบ Polimer Mixer Pump1 (Therby Mixer pump 1.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	146. Motor & pump AC-1 ระบบ Air Compressor Pump 1 (Air Compressor pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	147. Motor & pump AC-2 ระบบ Air Compressor Pump 2 (Air Compressor pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													
	148. Motor & pump RW-03 : สูบน้ำดิบบ่อใต้ดิน Pump 1 (Centifugal pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																													

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																															สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	149. Motor & pump RW-04 : สูบน้ำดิบบ่อใต้ดิน Pump 2 (Centifugal pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	150. Motor & pump TP-04 ระบบสูบขึ้นถังสูงส่วนขยาย Pump 1 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	151. Motor & pump TP-05 ระบบสูบขึ้นถังสูงส่วนขยาย Pump 2 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	152. Motor & pump TP-06 ระบบสูบขึ้นถังสูงส่วนขยาย Pump 3 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	153. Motor & pump P-101A : สูบน้ำดิบ Pump 1 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																														
	154. Motor & pump P-101B : สูบน้ำดิบ Pump 2 (Centifugal pump 22 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	155. Motor & pump P-102A : Backwash Pump 1 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	156. Motor & pump P-102B : Backwash Pump 2 (Centifugal pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	157. Motor & pump CP-104 ระบบโพลิเมอร์ Pump 1 (Feed pump 0.09 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	158. Motor & pump A-101 ระบบ Polimer Mixer Pump1 (Therby Mixer pump 1.5 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	159. Motor & pump CP-103A ระบบ Pac Pump 1 (Feed pump 14.3 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	160. Motor & pump CP-103B ระบบ Pac Pump 2 (Feed pump 14.3 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	161. Motor & pump CL-01 ระบบคลอรีน Pump 1 (Feed pump 14.3 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	162. Motor & pump CL-02 ระบบคลอรีน Pump 2 (Feed pump 14.3 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	163. Motor & pump CL-03 ระบบคลอรีน Pump 3 (Feed pump 14.3 w.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	164. Motor & pump VP-101A ระบบ Vaccuum Pump 1 (Vaccuum pump. 1.3 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	165. Motor & pump VP-101B ระบบ Vaccuum Pump 2 (Vaccuum pump. 1.3 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	166. Motor & pump AB-1 ระบบ Airbower Pump 1 (Airbower pump 7.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	167. Motor & pump AC-101A ระบบ Air Compressor Pump 1 (Air Compressor pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	168. Motor & pump AC-101B ระบบ Air Compressor Pump 2 (Air Compressor pump 1.5 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	169. Motor & pump P1 ระบบ Hour Pump 1 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	170. Motor & pump P2 ระบบ Hour Pump 2 (Centifugal pump 11 Kw.) = 1 ตัว (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	1. Control panel WAC1-01 : ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำดิบ Control pump to 6 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	2. Control panel WAC1-02 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาชุด 1-2 Control pump to 12 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	3. Control panel WAC1-03 : ตู้ควบคุมระบบสูบเข้าถังกรองทรายชุด 1-2 Control pump to 3 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	4. Control panel WAC1-03 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาชุด AB Control pump to 14 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	5. Control panel WAC1-04 :ตู้ควบคุมระบบสูบเข้าเส้นท่อ Control pump to 4 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	6. Control panel WAC1-05 :ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำไปส่วนขยาย Control pump to 4 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	7. Control panel WAC1-05 :ตู้ควบคุมระบบสูบขึ้นถังสูงระบบประปาส่วนขยาย Control pump to 3 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	8. Control panel WAC2-01 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาชุด AB Control pump to 23 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																															
	9. Control panel WAC2-02 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาชุด C Control pump to 18 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
Control Panel	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																													
	10. Control panel WAC2-03 : ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบตะกอน Control pump to 1 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																													
	11. Control panel WAC2-04 : ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบขึ้นถังสูง Control pump to 3 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	12. Control panel WAC3-01 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา Control pump to 15 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	13. Control panel WAC3-02 : ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบขึ้นถังสูง Control pump to 3 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	14. Control panel WAC4-01 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา Control pump to 18 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	15. Control panel WAC5-01 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา Control pump to 18 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	16. Control panel WAC5-02 : ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำออกจากใต้บ่อน้ำดิบ Control pump to 2 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	17. Control panel WAC5-03 : ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบขึ้นถังสูงระบบประปาส่วนขยาย Control pump to 3 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	18. Control panel WAC6-01 : ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา Control pump to 18 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	19. Control panel WAC6-02 : ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเข้าเส้นท่อ Pump Hour Control pump to 2 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	20. Control panel WAC6-03 : ตู้ควบคุมระบบวาล์วอัตโนมัติถังกรองทราย Control pump to 10 set (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	1. ตรวจสอบวาล์วน้ำดับเพลิง 10 set (PM Check)	1 Year	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN																						○	Y-S																							
	ผรม. ทดสอบโดยการหมุนเพื่อให้วาวล์มีการเคลื่อนที่ (ทดสอบความพร้อมใช้งาน)			จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	2. ตรวจสอบวาล์วน้ำดับเพลิง 10 set (PM Check)	1 Year	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN																						○	Y-S																							
	ผรม. ทดสอบโดยการหมุนเพื่อให้วาวล์มีการเคลื่อนที่ (ทดสอบความพร้อมใช้งาน)			จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	3. ตรวจสอบวาล์วน้ำดับเพลิง 10 set (PM Check)	1 Year	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN																						○	Y-S																							
	ผรม. ทดสอบโดยการหมุนเพื่อให้วาวล์มีการเคลื่อนที่ (ทดสอบความพร้อมใช้งาน)			จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	4. ตรวจสอบวาล์วน้ำดับเพลิง 10 set (PM Check)	1 Year	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN																						○	Y-S																							
	ผรม. ทดสอบโดยการหมุนเพื่อให้วาวล์มีการเคลื่อนที่ (ทดสอบความพร้อมใช้งาน)			จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	5. ตรวจสอบวาล์วน้ำดับเพลิง 10 set (PM Check)	1 Year	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN																						○	Y-S																							
	ผรม. ทดสอบโดยการหมุนเพื่อให้วาวล์มีการเคลื่อนที่ (ทดสอบความพร้อมใช้งาน)			จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	6. ตรวจสอบวาล์วน้ำดับเพลิง 10 set (PM Check)	1 Year	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN																						○	Y-S																							
	ผรม. ทดสอบโดยการหมุนเพื่อให้วาวล์มีการเคลื่อนที่ (ทดสอบความพร้อมใช้งาน)			จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
5	**WATER TREATMENT SYSTEM (ระบบบำบัดน้ำเสีย)**																																																
	1. Motor & pump PS-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อรวม Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	2. Motor & pump PS-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อรวม Pump 2 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	3. Motor & pump PS-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อรวม Pump 3 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	4. Motor & pump WP-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ1 Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	5. Motor & pump WP-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ1 Pump 2 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	6. Motor & pump WP-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ1 Pump 3 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	7. Motor & pump WP-04 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ1 Pump 4 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	8. Motor & pump EJ-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ1 Ejactor Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	9. Motor & pump EJ-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ1 Ejactor Pump 2 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	10. Motor & pump P-EQ-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ2 Pump 1 (Supmersible Pump 3.57 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	11. Motor & pump P-EQ-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ2 Pump 2 (Supmersible Pump 3.57 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	12. Motor & pump EJ-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ2 Ejactor Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	13. Motor & pump EJ-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ2 Ejactor Pump 2 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																													
	14. Motor & pump RSP-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Return Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																													
	15. Motor & pump RSP-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Return Pump 2 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	16. Motor & pump RSP-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Return Pump 3 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	17. Motor & pump STB-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Return บ่อเหลี่ยม Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	18. Motor & pump STB-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Return บ่อเหลี่ยม Pump 2 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	19. Motor & pump STB-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Return บ่อเหลี่ยม Pump 3 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	20. Motor & pump AB-MBBR-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Air Bower MBBR Pump 1 (Air Bower Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	21. Motor & pump AB-MBBR-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Air Bower MBBR Pump 2 (Air Bower Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	22. Motor & pump AB-MBBR-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Air Bower MBBR Pump 3 (Air Bower Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	23. Motor & pump AB-AT-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Air Bower AB Pump 1 (Air Bower Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	24. Motor & pump AB-AT-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Air Bower AB Pump 2 (Air Bower Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	25. Motor & pump AB-AT-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Air Bower AB Pump 3 (Air Bower Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	26. Motor & pump SCP-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Screw Pump 1 (Screw Pump 3 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	27. Motor & pump SCP-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Screw Pump 2 (Screw Pump 3 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	28. Motor & pump P-PFP-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Filtrate Pump 1 (Filtrate Pump 1.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	29. Motor & pump P-PFP-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Filtrate Pump 2 (Filtrate Pump 1.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	30. Motor & pump WP-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย สูบน้ำออกจากบ่อพัก Pump 1 (Supmersible Pump 1.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	31. Motor & pump WP-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย สูบน้ำออกจากบ่อพัก Pump 2 (Supmersible Pump 1.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	32. Motor & pump EJ-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Ejactor Pump 1 (Ejactor Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	33. Motor & pump AR-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Air Compressor Pump 1 (Air Compressor Pump 2.2 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	34. Motor & pump MXP-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Therbymixer Pump 1 (Therbymixer Pump 4 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	35. Motor & pump PD-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย Polimer Pump 1 (Feed Pump 0.06 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	36. Motor & pump CW-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย สูบเข้าเครื่องวีด Pump 1 (Booter Pump) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	37. Motor & pump SP1-PS-01 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 1 (Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	38. Motor & pump SP1-PS-02 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	39. Motor & pump SP1-PS-03 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	40. Motor & pump SP1-PS-04 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 3 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	41. Motor & pump SP1-PS-05 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	42. Motor & pump SP1-PS-06 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	43. Motor & pump SP1-PS-07 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 3 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
Motor & Pump	44. Motor & pump CP1-PS3-01 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 4 (Sefplyming Pump 4 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	45. Motor & pump CP1-PS3-02 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 5 (Sefplyming Pump 4 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	46. Motor & pump SP1-PS-08 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 4 Pump 1 ((Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	47. Motor & pump SP1-PS-09 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 5 Pump 1 ((Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	48. Motor & pump SP1-PS-10 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 5 Pump 2 ((Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	49. Motor & pump SP1-PS-11 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 6 Pump 1 ((Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	50. Motor & pump SP1-PS-12 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 6 Pump 2 ((Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	51. Motor & pump SP1-PS-13 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย ลูบระหว่างเส้นท่อ ขยอ 6 Pump 1 (Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	52. Motor & pump SP1-PS-14 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย ลูบระหว่างเส้นท่อ บ.ไทว่า Pump 1 (Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Motor & pump M-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ Pump 1 (Sumersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Motor & pump M-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ Pump 2 (Sumersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	3. Motor & pump AR-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ Pump 1 (Jet Aerator Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	4. Motor & pump AR-02 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ Pump 2 (Jet Aerator Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	5. Motor & pump AR-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ Pump 3 (Jet Aerator Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	6. Motor & pump AR-04 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ Pump 4 (Jet Aerator Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	7. Motor & pump SP2-PS-01 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	8. Motor & pump SP2-PS-02 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 2 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	9. Motor & pump SP2-PS-03 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 1 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	10. Motor & pump SP2-PS-04 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 2 (Supmersible Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	11. Motor & pump SP2-PS-05 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	12. Motor & pump SP2-PS-06 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 2 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	13. Motor & pump SP2-PS-07 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 4 Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	14. Motor & pump SP2-PS-08 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 4 Pump 2 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Motor & pump AR-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ Pump 1 (Jet Aerator Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Motor & pump AR-03 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ Pump 3 (Jet Aerator Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	3. Motor & pump SP3-PS-01 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 1 (Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	4. Motor & pump SP3-PS-02 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 2 (Supmerble Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	5. Motor & pump SP3-PS-03 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	6. Motor & pump SP3-PS-04 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	7. Motor & pump SP3-PS-05 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																											
	8. Motor & pump SP3-PS-06 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	9. Motor & pump SP3-PS-07 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 4 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	10. Motor & pump SP3-PS-08 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 4 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	11. Motor & pump SP3-PS-09 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 5 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	12. Motor & pump SP3-PS-10 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 5 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	13. Motor & pump SP3-PS-11 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 6 Pump 1 (Supmerble Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	14. Motor & pump SP3-PS-12 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 6 Pump 2 (Supmerble Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	15. Motor & pump SP3-PS-13 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 7 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	16. Motor & pump SP3-PS-14 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 7 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	17. Motor & pump SP3-PS-15 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 8 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	18. Motor & pump SP3-PS-16 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 8 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	19. Motor & pump SP3-PS-17 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 9 Pump 1 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	20. Motor & pump SP3-PS-18 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 9 Pump 2 (Supmerble Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Motor & pump SP4-PS-01 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Motor & pump SP4-PS-02 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 2 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Motor & pump EJ-01 : ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ Pump 1 (Ejactor Pump 3.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Motor & pump SP5-01 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 1 (Supmersible Pump 11 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	3. Motor & pump SP5-02 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 2 (Supmersible Pump 11 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	4. Motor & pump SP5-03 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 1 Pump 3 (Supmersible Pump 11 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	5. Motor & pump SP5-PS-04 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 1 (Supmersible Pump 0.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	6. Motor & pump SP5-PS-05 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 2 Pump 2 (Supmersible Pump 0.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	7. Motor & pump SP5-PS-06 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 1 (Supmersible Pump 0.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	8. Motor & pump SP5-PS-07 : ระบบบ่อพักน้ำเสีย บ่อ Sump 3 Pump 2 (Supmersible Pump 0.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Motor & pump SE-102-1 บ่อ EQ Ejactor Pump 1 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Motor & pump SE-102-1 บ่อ EQ Ejactor Pump 1 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	3. Motor & pump SE-102-1 บ่อ EQ Ejactor Pump 1 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	4. Motor & pump SE-102-2 บ่อ EQ Ejactor Pump 2 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	5. Motor & pump SE-102-3 บ่อ EQ Ejactor Pump 3 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	6. Motor & pump SE-102-4 บ่อ EQ Ejactor Pump 4 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	7. Motor & pump SE-102-5 บ่อ EQ Ejactor Pump 5 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	8. Motor & pump SE-102-6 บ่อ EQ Ejactor Pump 6 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	9. Motor & pump SE-102-7 บ่อ EQ Ejactor Pump 7 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	10. Motor & pump SE-102-8 บ่อ EQ Ejactor Pump 8 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	11. Motor & pump SE-102-9 บ่อ EQ Ejactor Pump 9 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	12. Motor & pump SE-102-10 บ่อ EQ Ejactor Pump 10 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	13. Motor & pump SE-102-11 บ่อ EQ Ejactor Pump 11 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	14. Motor & pump SE-102-12 บ่อ EQ Ejactor Pump 12 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	15. Motor & pump SE-102-13 บ่อ EQ Ejactor Pump 13 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	16. Motor & pump SE-102-14 บ่อ EQ Ejactor Pump 14 (Ejactor Pump 5.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	17. Motor & pump P-102A บ่อ EQ Pump 1 (Supmersible Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	18. Motor & pump P-102B บ่อ EQ Pump 2 (Supmersible Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	19. Motor & pump P-102C บ่อ EQ Pump 3 (Supmersible Pump 15 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	20. Motor & pump P-105A บ่อ EQ Pump 1 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	21. Motor & pump P-105B บ่อ EQ Pump 2 (Supmersible Pump 7.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	22. Motor & pump B-103A Air Bower Pump 1 (Air Bower Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	23. Motor & pump B-103B Air Bower Pump 2 (Air Bower Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	24. Motor & pump B-103C Air Bower Pump 3 (Air Bower Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	25. Motor & pump P-103-1 Sludge Transfer Pump 1 (Supmersible Pump 1.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	26. Motor & pump P-103-2 Sludge Transfer Pump 1 (Supmersible Pump 1.5 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	27. Motor & pump A-107-A Aspirting Aerator Pump 1 (Aerator Pump 4 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	28. Motor & pump A-107-B Aspirting Aerator Pump 2 (Aerator Pump 4 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	29. Motor & pump A-107-C Aspirting Aerator Pump 3 (Aerator Pump 4 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	30. Motor & pump A-107-D Aspirting Aerator Pump 4 (Aerator Pump 4 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	31. Motor & pump A-108-A Treated Water Transfer Pump 1 (Centifugal Pump 22 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	32. Motor & pump A-108-B Treated Water Transfer Pump 2 (Centifugal Pump 22 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	33. Motor & pump DC-103-1 Decanter Pump 1 (Gear Pump 0.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	34. Motor & pump DC-103-2 Decanter Pump 2 (Gear Pump 0.75 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	1. Control panel WTC1-01 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย DB1 (Control pump to 19 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	2. Control panel WTC1-02 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย DB2 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	3. Control panel WTC1-03 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย DB3 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	4. Control panel WTC1-04 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย DB4 (Control pump to 11 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL																																												
	5. Control panel WTC1-05 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Sump 1 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
Control Panel	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	6. Control panel WTC1-06 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Sump 2 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																												
	7. Control panel WTC1-07 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Sump3 (Control pump to 5 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	8. Control panel WTC1-08 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Sump4 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	9. Control panel WTC1-09 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Sump5 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	10. Control panel WTC1-10 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ Sump6 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	11. Control panel WTC1-11 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ฐมระหว่างเส้นท่อ แยกซอย 6 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	12. Control panel WTC1-12 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ฐมระหว่างเส้นท่อ ม.โพวา (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Control panel WTC2-01 ตู้ควบคุมระบบปั๊มเติมอากาศ (Control pump to 4 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Control panel WTC2-02 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ EQ (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	3. Control panel WTC2-03 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 1 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	4. Control panel WTC2-04 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 2 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	5. Control panel WTC2-05 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 3 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	6. Control panel WTC2-06 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 4 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Control panel WTC3-01 ตู้ควบคุมระบบปั๊มเติมอากาศ (Control pump to 4 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Control panel WTC3-02 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 1 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	3. Control panel WTC3-03 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 2 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	4. Control panel WTC3-04 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 3 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	5. Control panel WTC3-05 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 4 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	6. Control panel WTC3-06 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 5 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	7. Control panel WTC3-07 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 6 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	8. Control panel WTC3-08 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 7 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	9. Control panel WTC3-09 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 8 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	10. Control panel WTC3-10 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 9 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Control panel WTC4-01 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 1 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Control panel WTC5-01 ตู้ควบคุมระบบปั๊มเติมอากาศ บ่อ EQ (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	2. Control panel WTC5-02 ควบคุมระบบปั๊มเติมอากาศ (Control pump to 8 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	3. Control panel WTC5-03 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 1 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	4. Control panel WTC5-04 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 2 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	5. Control panel WTC5-05 ตู้ควบคุมระบบปั๊มสูบน้ำเสีย บ่อ Sump 3 (Control pump to 2 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											
	1. Control panel WTC6-01 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ EQ (Control pump to 21 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M		
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ตรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์ ธนกร	ACTUAL																																											

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)	สรุปผลการ
						January: w1 w2 w3 w4 / February: w1 w2 w3 w4 / March: w1 w2 w3 w4 / April: w1 w2 w3 w4 / May: w1 w2 w3 w4 / June: w1 w2 w3 w4 / July: w1 w2 w3 w4 / August: w1 w2 w3 w4 / September: w1 w2 w3 w4 / October: w1 w2 w3 w4 / November: w1 w2 w3 w4 / December: w1 w2 w3 w4	
	2. Control panel WTC6-02 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย Local Panel No.2 (Control pump to 5 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	3. Control panel WTC6-03 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย Local Panel No.3 (Control pump to 6 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	4. Control panel WTC6-04 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย Local Panel No.4 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	5. Control panel WTC6-05 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย Local Panel No.5 (Control pump to 1 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
6	**CCTV SYSTEM**						
CCTV	1. CCTV SYSTEM	1 Month / Tmie	PIN 1	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	2. CCTV SYSTEM	1 Month / Tmie	PIN 2	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	3. CCTV SYSTEM	1 Month / Tmie	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	4. CCTV SYSTEM	1 Month / Tmie	PIN 4	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	5. CCTV SYSTEM	1 Month / Tmie	PIN 5	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	6. CCTV SYSTEM	1 Month / Tmie	PIN 6	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	7. CCTV SYSTEM	1 Month / Tmie	PLP	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
7	**น้ำเกรด 2**						
Motor & Pump	1. Motor & pump RP2-01 ปั๊มขึ้นรถน้ำ Pump 1 (Safplyming Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	2. Motor & pump RP2-02 ปั๊มน้ำเกรด 2 Pump 1 (Cantifugal Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
	3. Motor & pump RP2-03 ปั๊มน้ำเกรด 2 Pump 2 (Cantifugal Pump 30 Kw.) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
Control panel	4. Control panel WGC3-01 ตู้ควบคุมระบบน้ำเกรด 2 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=1 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y-S / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	Y-S =1 Time/Year		จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
Float Valve	5.ชุด Modulating Float Valve, ระบบน้ำเกรด 2 (Control pump to 3 set) (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง PM Check ตรวจสอบ ทำความสะอาด พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		
แอร์วาล์ว	6. แอร์วาล์ว น้ำเกรด2 (PM Check)	Y-S =1 Time/Year	PIN 3	สุรเดช/วัชระ/	PLAN	○ Y-S	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Visual Check / ผรม. PM check พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ			จักรกฤษณ์/ธนกร	ACTUAL		

Remark : M = Monthly (ระยะ 1 เดือน), / 2M = Monthly (ระยะ 2 เดือน), / Q = Quarterly (ระยะ 3 เดือน), / H = Half yearly (ระยะ 6 เดือน), / Y = Yearly (ระยะ 1 ปี), / S = Subcontractor (บำรุงรักษาโดยผู้รับเหมา).

Effective : 1 September 2023

○ PLAN

● ACTUAL

←→ SLIDE PLAN

*** รายงานความคืบหน้าทุกๆ สัปดาห์

PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2026 : Pinthong 1-6

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย
15/1/69	15/1/69	

แผนก : ซ่อมบำรุง

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)	สรุปผลการ
						January: w1 6_10, w2 13_17, w3 20_24, w4 27_31 / February: w1 3_7, w2 10_14, w3 17_21, w4 24_28 / March: w1 3_7, w2 10_14, w3 17_21, w4 24_28 / April: w1 1_4, w2 7_11, w3 14_18, w4 23_27 / May: w1 5_9, w2 12_16, w3 19_23, w4 26_30 / June: w1 2_6, w2 9_13, w3 16_20, w4 23_27 / July: w1 1_4, w2 7_11, w3 14_18, w4 21_31 / August: w1 4_8, w2 11_15, w3 18_22, w4 25_29 / September: w1 1_5, w2 8_12, w3 15_19, w4 22_26 / October: w1 6_10, w2 13_17, w3 20_24, w4 27_31 / November: w1 3_7, w2 10_14, w3 17_21, w4 24_28 / December: w1 1_5, w2 8_12, w3 15_19, w4 22_26	
1	**ELECTRICAL SYSTEM (ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า)** Check And Report Results.						
	1. Transformer TR1-01 สำนักงานปิ่นทอง (315 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	2. Transformer TR1-02 อู่โมงก์ปื๋อเค้ารวจ (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	3. Transformer TR1-03 ป๊อกฟส 8 (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	4. Transformer TR1-04 ระบบประปา (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	5. Transformer TR1-05 ระบบบำบัดน้ำเสีย (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	6. Transformer TR1-06 สี่แยกศาลปู่ขาว (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	7. Transformer TR1-07 หน้าฟส 7 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	8. Transformer TR1-08 บ่อ Sump 5 ซอย 8 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	9. Transformer TR1-08 บ่อ Sump 5 ซอย 8 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	10. Transformer TR1-09 ระบบประปาส่วนขยาย (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	11. Transformer TR1-10 ซอย 10 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	12. Transformer TR1-11 บ่อ R-104 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	13. Transformer TR2-01 สำนักงาน คมอ. (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	14. Transformer TR2-02 บ่อ Sump 1 (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	15. Transformer TR2-03 ระบบประปา (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	16. Transformer TR2-04 บ่อ R-202 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	17. Transformer TR2-05 เฟส 15 (30 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	18. Transformer TR2-06 ซอย 2 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	19. Transformer TR2-07 ระบบประปาส่วนขยาย (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	20. Transformer TR2-08 ระบบ Scada 3 (500 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	21. Transformer TR2-09 ระบบบำบัดน้ำเสีย (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 2	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	22. Transformer TR3-01 ป้อม C2 (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	23. Transformer TR3-02 บ่อ Sump 3 (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	24. Transformer TR3-03 หน้า บ.KUBOTA (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	25. Transformer TR3-04 หน้า บ.MATSHITA (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	26. Transformer TR3-05 บ่อ Sump 6 (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	27. Transformer TR3-06 ระบบประปา (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL		
	28. Transformer TR3-07 หน้า บ.SMC (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																				สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
Transformer	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	29. Transformer TR3-08 บ่อ Sump 7 (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	30. Transformer TR3-09 ทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	31. Transformer TR3-10 ระบบบำบัดน้ำเสีย (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	32. Transformer TR3-11 บ่อ Sump 8 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	33. Transformer TR3-12 บ่อ R302 (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	34. Transformer TR3-13 บ่อ Sump 10 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 3	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	35. Transformer TR4-01 ด้านหลังศาลหน้าโครงการ (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 4	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	36. Transformer TR4-02 สามแยกโครงการ (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 4	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	37. Transformer TR4-03 ระบบประปา (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 4	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	38. Transformer TR4-04 บ่อ R402 (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 4	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	39. Transformer TR5-01 หน้าเรือนพนะชำ (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 5	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	40. Transformer TR5-02 ถนน B1 หน้าระบบประปา (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 5	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	41. Transformer TR5-03 ระบบบำบัดน้ำเสีย (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 5	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	42. Transformer TR5-04 ระบบประปา (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 5	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	43. Transformer TR5-05 ถนน B3 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 5	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	44. Transformer TR5-06 ระบบประปาส่วนขยาย (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 5	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	45. Transformer TR5-07 แปลง G08 (500 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 5	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	46. Transformer TR6-01 หน้าโครงการ A1 (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 6	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	47. Transformer TR6-02 สี่แยก TYC B1 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 6	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	48. Transformer TR6-03 ถนน B1 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 6	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	49. Transformer TR6-04 ถนน C1 (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 6	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	50. Transformer TR6-05 ระบบประปา (250 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 6	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	51. Transformer TR6-06 ระบบบำบัดน้ำเสีย (400 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PIN 6	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	52. Transformer TR PLP-01 ระบบประปา (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	53. Transformer TR PLP-02 ถนนสายประธาน ส่วนกลาง (50 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time			ACTUAL																																											
	54. Transformer อาคาร G-1 (3PH 22kV-400/230 V. 50Hz 315 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-1)	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL																																											
	55. Transformer อาคาร G-4/1 (3PH 22kV-400/230 V. 50Hz 315 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-4/1)	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL																																											
	56. Transformer อาคาร G-4/2 (3PH 22kV-400/230 V. 50Hz 315 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-4/2)	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL																																											
	57. Transformer อาคาร G-5/1 (3PH 22kV-400/230 V. 50Hz 315 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-5/1)	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL																																											
	58. Transformer อาคาร G-5/2 (3PH 22kV-400/230 V. 50Hz 315 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-5/2)	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL																																											
	59. Transformer อาคาร G-6/1 (315 kVA 3PH. Dyn11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-6/1)	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M						○	M						○	Y/S						○	M								

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)	สรุปผลการ
						January w1 w2 w3 w4 / February w1 w2 w3 w4 / March w1 w2 w3 w4 / April w1 w2 w3 w4 / May w1 w2 w3 w4 / June w1 w2 w3 w4 / July w1 w2 w3 w4 / August w1 w2 w3 w4 / September w1 w2 w3 w4 / October w1 w2 w3 w4 / November w1 w2 w3 w4 / December w1 w2 w3 w4	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
	60. Transformer อาคาร G-6/2 (315 kVA 3PH. Dya11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-6/2)	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y/S / ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
	61. Transformer อาคาร G-7/1(315 kVA 3PH. Dya11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-7/1)	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y/S / ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
	62. Transformer อาคาร G-7/2 (315 kVA 3PH. Dya11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-7/2)	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y/S / ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
	63. Transformer อาคาร G-8/1 (315 kVA 3PH. Dya11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-8/1)	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y/S / ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
	64. Transformer อาคาร G-8/2 (315 kVA 3PH. Dya11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-8/2)	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y/S / ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
	65. Transformer อาคาร G-9/1 (315 kVA 3PH. Dya11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-9/1)	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y/S / ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
	66. Transformer อาคาร G-9/2 (315 kVA 3PH. Dya11 22000-400/230 V.) = 1 ลูก (PM Check)	1 Time/Year	PLP (G-9/2)	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ Y/S / ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	2 Month / Time	Warranty =>2569		ACTUAL		
2	**SOLAR SYSTEM**						
Solar	1. Solar Roof top / Solar Farm สำนักงาน	3 Time/Year	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
	2. Solar Roof top / Solar Farm สถาที่	3 Time/Year	PIN 2	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
	3. Solar Roof top / Solar Farm ฟู่ลาวา ออร์ไลโบทิฟ	3 Time/Year	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
	4. Solar Roof top / Solar Farm LF Greenhills M O R	3 Time/Year	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
	5. Solar Roof top / Solar Farm LF Lifespace	3 Time/Year	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
	6. Solar Roof top / Solar Farm LF ชมดาว 1	3 Time/Year	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
	7. Solar Roof top / Solar Farm LF สวนเฮาพา	3 Time/Year	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
	8. Solar Roof top / Solar Farm Juthawan Sriracha	3 Time/Year	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ Q-S / ○ Q-S / ○ Q-S	
	ตรม. PM ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดแผง Solar cell และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด				ACTUAL		
3	**ระบบไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทอง**						
ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทอง	1. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองโครงการ 1 (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	2. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองโครงการ 2 (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PIN 2	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	3. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองโครงการ 3 (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PIN 3	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	4. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองโครงการ 4 (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PIN 4	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	5. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองโครงการ 5 (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PIN 5	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	6. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองโครงการ 6 (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PIN 6	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	7. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองแหลมจบัง (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PIN LAND	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	8. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองแหลมจบัง (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	แหลมจบัง	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	9. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทองพานทอง (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	พานทอง	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
	10. ไฟแสงสว่างป้ายปิ่นทอง PLP (ชุดโคมไฟ, เวลานาฬิกาตั้งไทม์เมอร์, ตู้ควบคุมไทรล)	1 Time/Month	PLP	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง, ความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์, สายส่ง, จุดต่อสาย, ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				ACTUAL		
4	**ระบบไฟถนนปิ่นทอง**						
ไฟถนน	1.ไฟถนน	1 Time/Month	PIN 1	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL		
	2.ไฟถนน	1 Time/Month	PIN 2	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL		
	3.ไฟถนน	1 Time/Month	PIN 3	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL		
	4.ไฟถนน	1 Time/Month	PIN 4	ช่อยศ /วุฒิชัย	PLAN	○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M / ○ M	
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL		

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																																สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
ระบบไฟ	5.ไฟถนน	1 Time/Month	PIN 5	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL																																																	
	6.ไฟถนน	1 Time/Month	PIN 6	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL																																																	
	7.ไฟถนน	1 Time/Month	PINLAND	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL																																																	
	8.ไฟถนน	1 Time/Month	PLP	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง,อุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์,สายเมน,ระบบควบคุม,โคมไฟต้องติดใช้งานได้				ACTUAL																																																	
5	**FIRE PROTECTION SYSTEM**																																																					
FIRE PROTECTION	1. FIRE ALARM SYSTEM (สำนักงาน)	3Month / Tmie	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	Q											○	Q											○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน				ACTUAL																																																	
	2. ตรวจสอบอุปกรณ์	3Month / Tmie	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	Q											○	Q											○	Q											○	Q						
	ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก (หนีไฟ)				ACTUAL																																																	
	3. ตรวจสอบอุปกรณ์	3Month / Tmie	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	Q											○	Q											○	Q											○	Q						
	ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก (หนีไฟ)				ACTUAL																																																	
6	**อาคารสำนักงานและโรงงานเช่า**																																																					
อาคารสำนักงานและโรงงานเช่า	1. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	M=3Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	M											○	M											○	Y-S, H											○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2569	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	2. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	M=3Month /Time	PIN 3	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	M											○	M											○	Y-S, H											○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2569	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	3. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	M=3Month /Time	PIN 5	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	M											○	M											○	Y-S, H											○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2569	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	4. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	M=3Month /Time	PIN 6	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	M											○	M											○	Y-S, H											○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2569	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	5. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	Y-S =1 Time/Year	PLP	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	M											○	M											○	Y-S, H											○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2569	M=3Month /Time			ACTUAL																																																	
	6. อาคารสำนักงาน 3 อาคาร	Y-S =1 Time/Year	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	M											○	M											○	Y-S, H											○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2569	M=3Month /Time			ACTUAL																																																	
	7. อาคารสำนักงาน 1 อาคาร (คนอ.)	Y-S =1 Time/Year	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	M											○	M											○	Y-S, H											○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2569	M=3Month /Time			ACTUAL																																																	
7	**ระบบไฟแสงสว่างในอาคาร**																																																					
ไฟแสงสว่างในอาคาร	1. ไฟแสงสว่างในอาคาร (สำนักงาน)	1 Time/Month	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	(Over haul เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน รอบ2ปี)				ACTUAL																																																	
	2. ไฟแสงสว่างในอาคาร (สำนักงาน)	1 Time/Month	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	(Over haul เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน รอบ2ปี)				ACTUAL																																																	
8	**ตู้กดน้ำดื่มสำนักงาน**																																																					
ตู้กดน้ำดื่ม	1. ตู้กดน้ำดื่ม สำนักงาน 3 จุด	2 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M		
	เปลี่ยนไส้กรอง Sediment และ Pre-Carbon 2 เดือน				ACTUAL																																																	
	2. เปลี่ยนไส้กรอง ตู้กดน้ำดื่ม สำนักงาน 3 จุด	6 Month / Tmie	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																						○	H																							○	H		
	เปลี่ยนไส้กรอง Membrane 150 G,ไส้กรอง Post-Carbon และหลอด Ultra Violet (UV) 6 เดือน				ACTUAL																																																	
9	**อุปกรณ์ห้องน้ำสำนักงาน**																																																					
สำนักงาน	1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ชักโครก ห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 2 อาคาร 2 จำนวน 4 จุด	2 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M		
	ตรวจเช็คคันโยกชักโครก ลูกลอย ก้านยึดลูกลอยต้องไม่ชำรุดเสียหาย ทุกๆ 2 เดือน				ACTUAL																																																	
	11.2 เปลี่ยนไส้กรอง ตู้กดน้ำดื่ม สำนักงาน 3 จุด	6 Month / Tmie	PIN 1		PLAN																							H																							H		
	เปลี่ยนไส้กรอง Membrane 150 G,ไส้กรอง Post-Carbon และหลอด Ultra Violet (UV) 6 เดือน				ACTUAL																																																	
	2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ชักโครก ห้องน้ำชาย หญิง บริเวณโรงอาหาร จำนวน 11 จุด	2 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M		
	ตรวจเช็คคันโยกชักโครก ลูกลอย ก้านยึดลูกลอยต้องไม่ชำรุดเสียหาย ทุกๆ 2 เดือน				ACTUAL																																																	
	3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ชักโครก ห้องน้ำชาย หญิง บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 จำนวน 8 จุด	2 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M		
	ตรวจเช็คคันโยกชักโครก ลูกลอย ก้านยึดลูกลอยต้องไม่ชำรุดเสียหาย ทุกๆ 2 เดือน				ACTUAL																																																		
	4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ชักโครก ห้องน้ำชาย หญิง บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2 จำนวน 2 จุด	2 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M		
	ตรวจเช็คคันโยกชักโครก ลูกลอย ก้านยึดลูกลอยต้องไม่ชำรุดเสียหาย ทุกๆ 2 เดือน				ACTUAL																																																	
	5. ล้างไส้กรองดักตะกอนอ่างล้างมือห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 2 อาคาร 2	1 Time/Month	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	เปลี่ยนไส้กรอง Sediment และ Pre-Carbon 2 เดือน				ACTUAL																																																	
10	**ปั๊มสูบน้ำเครื่องยนต์**																																																					
ปั๊มสูบน้ำ	1. Engine & Pump MP-01 ปั๊มเครื่องยนต์ บริเวณอุโมง เฟส 6	1 Time/Month	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน	1 Year			ACTUAL																																																	
	2. Engine & Pump MP-02 ปั๊มเครื่องยนต์ บริเวณบ่อเส้นก๋วยเตี๋ยว (บ่อ R103)	1 Time/Month	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M			○	M			○	M			○	M			○	Y-S			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M			○	M		
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำเดือน	1 Year			ACTUAL																																																	
11	**สถานที่เก็บขยะอันตราย**																																																					
จุดเก็บขยะ	1. จุดเก็บขยะอันตราย	2 Month / Time	PIN 5	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M							○	2M		
	ตรวจสอบการลงบันทึกปริมาณขยะ ทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บ ทุกๆ 1 เดือน				ACTUAL																																																	

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																														สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
12	AIR CONDITION SYSTEM																																																					
AIR CONDITION	1. ห้องประชุม S1-S5,M1-M3,MD1-MD3	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	2. ออฟฟิศสำนักงาน(อาคาร 2 ชั้น 1)	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	3. ห้องที่ปรึกษา	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	4. ออฟฟิศฝ่ายบัญชี และการเงิน (อาคาร 2 ชั้น 2)	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	5. ห้องประธานบริหาร	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	6. สำนักงานฝ่ายขาย	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	7. เรือนรับรอง,อาคาร กนอ.	6 Month / Time	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	8. ออฟฟิศสำนักงาน(อาคาร 3 ชั้น 1)	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
	9. ออฟฟิศสำนักงาน(อาคาร 3 ชั้น 2)	6 Month / Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN																		○	H-S																							○	H-S						
	ผรม. PM Check วัดกระแสของ Motor และวัดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบพร้อมทดสอบรอยรั่วและล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ตามรอบ ปีละ 2 ครั้ง (สำนักงาน)				ACTUAL																																																	
13	ระบบถนน (ผิวจราจร)																																																					
ถนนผิวจราจร	1. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PIN 1	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
	2. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PIN 2	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
	3. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PIN 3	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
	4. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PIN 4	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
	5. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PIN 5	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
	6. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PIN 6	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
	7. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PINLAND	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
	8. พื้นผิวจราจร เส้นจราจร (ตรวจเช็คและซ่อม)	3 Month / Tmie	PLP	หัวหน้าแผนก / ผจก.	PLAN						○	Q											○	Q													○	Q											○	Q						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำ 3 เดือน (พื้นที่ส่วนกลาง)				ACTUAL																																																	
14	OTHER SYSTEM																																																					
OTHER	1. สะพานคอนกรีตข้ามห้วย (พื้นที่ส่วนกลาง)	1 Time/Year	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	Y-S																																					
	ผรม.ล้างทำความสะอาดสะพาน				ACTUAL																																																	
	2. สะพานคอนกรีตข้ามห้วย (พื้นที่ส่วนกลาง)	1 Time/Year	PIN 3	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN														○	Y-S																																	
	ผรม.ล้างทำความสะอาดสะพาน				ACTUAL																																																	
	3. สะพานคอนกรีตข้ามห้วย (พื้นที่ส่วนกลาง)	1 Time/Year	PIN 5	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN										○	Y-S																																					
	ผรม.ล้างทำความสะอาดสะพาน				ACTUAL																																																	

Remark : M = Monthly (ระยะ 1 เดือน), / 2M = Monthly (ระยะ 2 เดือน), / Q = Quarterly (ระยะ 3 เดือน), / H = Half yearly (ระยะ 6 เดือน), / Y = Yearly (ระยะ 1 ปี), / S = Subcontractor (บำรุงรักษาโดยผู้รับเหมา).

Effective : 1 September 2023

○ PLAN

● ACTUAL

←→ SLIDE PLAN

*** รายงานความคืบหน้าทุกๆ สัปดาห์

PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN 2026 : Pinthong 1-6

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย
15/1/69	15/1/69	

แผนก : ซ่อมบำรุง

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)	สรุปผลการ
						January: w1 6_10, w2 13_17, w3 20_24, w4 27_31 / February: w1 3_7, w2 10_14, w3 17_21, w4 24_28 / March: w1 3_7, w2 10_14, w3 17_21, w4 24_28 / April: w1 1_4, w2 7_11, w3 14_18, w4 23_27 / May: w1 5_9, w2 12_16, w3 19_23, w4 26_30 / June: w1 2_6, w2 9_13, w3 16_20, w4 23_27 / July: w1 1_4, w2 7_11, w3 14_18, w4 21_31 / August: w1 4_8, w2 11_15, w3 18_22, w4 25_29 / September: w1 1_5, w2 8_12, w3 15_19, w4 22_26 / October: w1 6_10, w2 13_17, w3 20_24, w4 27_31 / November: w1 3_7, w2 10_14, w3 17_21, w4 24_28 / December: w1 1_5, w2 8_12, w3 15_19, w4 22_26	
1	**ELECTRICAL SYSTEM (ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า)** Check And Report Results.						
	1. Transformer TR1 เฟส 1/A อาคารโรงงาน AIM (160 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	2. Transformer TR2 เฟส 1/B อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	3. Transformer TR3 เฟส 1/C อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	4. Transformer TR4 เฟส 1/D อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	5. Transformer TR5 เฟส 1/E อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	6. Transformer TR6 เฟส 2/B อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	7. Transformer TR7 เฟส 2/C อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	8. Transformer TR8 เฟส 2/D อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	9. Transformer TR9 เฟส 3/A1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	10. Transformer TR10 เฟส 3/A2 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	11. Transformer TR11 เฟส 3/A3 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	12. Transformer TR12 เฟส 3/B1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	13. Transformer TR13 เฟส 3/B2 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	14. Transformer TR14 เฟส 4/A1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	15. Transformer TR15 เฟส 4/A2 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	16. Transformer TR16 เฟส 4/A3 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	17. Transformer TR17 เฟส 4/B1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	18. Transformer TR18 เฟส 5/A อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	19. Transformer TR19 เฟส 5/B อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	20. Transformer TR20 เฟส 5/C อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	21. Transformer TR21 เฟส 5/D อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	22. Transformer TR22 เฟส 5/E อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	23. Transformer TR23 เฟส 5/F อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	24. Transformer TR24 เฟส 6/A อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	25. Transformer TR25 เฟส 6/D อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	26. Transformer TR26 เฟส 6/E อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	27. Transformer TR27 เฟส 7/C อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL		
	28. Transformer TR28 เฟส 7/D อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ช้อยส /วุฒิชัย	PLAN	○ M ○ M ○ M ○ M ○ M ○ Y/S ○ M	

ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

No	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	ที่ติดตั้ง/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล	2026 Year (Jan 1, 2026 - Dec 31, 2026)																																																สรุปผลการ
						January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				
						w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	29. Transformer TR29 เฟส 8/A1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	30. Transformer TR30 เฟส 8/A3 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	31. Transformer TR31 เฟส 8/B1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																		
	32. Transformer TR32 เฟส 8/B2 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	33. Transformer TR33 เฟส 8/B3 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	34. Transformer TR34 เฟส 8/C1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	35. Transformer TR35 เฟส 10/A1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	36. Transformer TR36 เฟส 10/A2 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	37. Transformer TR37 เฟส 10/B1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	38. Transformer TR38 เฟส 10/B4 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	39. Transformer TR39 เฟส 14/C3 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	40. Transformer TR40 เฟส 9/A4 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	41. Transformer TR41 เฟส 9/B1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	42. Transformer TR42 เฟส 9/1 อาคารโรงงาน AIM (100 KVA) = 1 ลูก (PM Check)	M=2 Month /Time	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN						○	M							○	M							○	M							○	M			○	Y/S							○	M						
	ตรวจเช็ค ขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้า,ทำความสะอาดหม้อแปลง,วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด,Test ระบบกราวด์หม้อแปลง	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
2	**อาคารสำนักงานและโรงงานเช่า**																																																					
อาคารสำนักงานและโรงงานเช่า	1. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	M=2 Month /Time	PIN 1	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M							○	M							○	Y-S, H							○	M						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2568	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	2. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	M=2 Month /Time	PIN 2	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M							○	M							○	Y-S, H							○	M						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2568	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	
	3. โรงงานเช่า , แวร์เฮ้าส์	M=2 Month /Time	PIN 3	ชัยยศ /วุฒิชัย	PLAN		○	M							○	M							○	M							○	M							○	Y-S, H							○	M						
	PM check ตามใบรายการตรวจสอบประจำปี 2568	Y-S =1 Time/Year			ACTUAL																																																	

Remark : M = Monthly (ระยะ 1 เดือน), / 2M = Monthly (ระยะ 2 เดือน), / Q = Quarterly (ระยะ 3 เดือน), / H = Half yearly (ระยะ 6 เดือน), / Y = Yearly (ระยะ 1 ปี), / S = Subcontractor (บำรุงรักษาโดยผู้รับเหมา).

Effective : 1 September 2023

○ PLAN

● ACTUAL

←→ SLIDE PLAN

*** รายงานความคืบหน้าทุกๆ สัปดาห์

ภาคผนวกที่ 24

แผนและเอกสารการขุดลอกลำรางสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2569

แผนงานมาตรการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 1-6 ประจำปี 2569

ลำดับ	เหตุฉุกเฉิน	แผนการดำเนินการ/เดือน												ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	งานป้องกันอัคคีภัย													
	- ตรวจสอบพื้นที่													หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- ไถหญ้ากันไฟตามแนวกันชน													ผู้รับเหมา
	- ตัดหญ้าตามแนวกันชน													ผู้รับเหมา
	- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง (ถังดับเพลิง) ภายในโครงการ													เจ้าหน้าที่ รปภ. / เจ้าหน้าที่ จป.
	- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง (ถังดับเพลิง) สำนักงาน													ฝ่ายความปลอดภัยและสาธารณูปโภค / เจ้าหน้าที่ จป.
2	งานป้องกันอุทกภัย													
	- ตรวจพื้นที่													หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- ขุดลอกห้วยสาธารณะ (ดำเนินการตามความเหมาะสม)													ผู้รับเหมา
	- ลอกรางระบายน้ำฝน / ร่องน้ำภายในพื้นที่โครงการ													ผู้รับเหมา
3	งานด้านโจรกรรมทรัพย์สิน													
	- ตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลม													หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- ปรับปรุงซ่อมแซม					ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง								ฝ่ายซ่อมบำรุง / ผู้รับเหมา
4	งานด้านการจราจร													
	- จัดการจราจรชั่วโมงเร่งด่วน													รปภ.
	- ปรับปรุงซ่อมแซม					ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง								ฝ่ายซ่อมบำรุง / ผู้รับเหมา
5	งานตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่													หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
6	งานประท้วง / ชุมนุม													
	- แจ้งเหตุ / รักษาความปลอดภัย					ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง								หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- ตรวจสอบ /ติดตามสถานการณ์ / รายงานผล					ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง								หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- บัญชาการควบคุมสถานการณ์					ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง								หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- สื่อสาร / ประสานงาน					ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง								ฝ่ายปรัฐกิจสัมพันธ์ / ฝ่ายสื่อสารองค์กร
7	การฝึกดับเพลิงเบื้องต้น													ฝ่ายความปลอดภัยและสาธารณูปโภค
	- การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น													
	- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/ผจญเพลิง													ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ลำดับ	เหตุฉุกเฉิน	แผนการดำเนินการ/เดือน												ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
8	อื่นๆ เช่น สารเคมีหกรั่วไหล													
	- แจ้งเหตุ / รักษาความปลอดภัย	←				ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง							→	หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- ตรวจสอบ / ติดตามสถานการณ์ / รายงานผล	←				ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง							→	หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- บัญชาการควบคุมสถานการณ์	←				ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง							→	หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
	- สื่อสาร / ประสานงาน	←				ดำเนินการเมื่อมีการแจ้ง							→	ฝ่ายปรัฐกิจสัมพันธ์ / ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หมายเหตุ : อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก

1. ยานพาหนะ

รถนำ	จำนวน	5	คัน
รถดับเพลิง	จำนวน	3	คัน (เทศบาล)
รถไถ	จำนวน	1	คัน (เช่าหจก.เสมือดแดง)
รถดับเพลิง	จำนวน	1	คัน (ปืนทอง)

2. ปั๊มน้ำชนิดเคลื่อนย้าย

- โครงการ 1 จำนวน 1 เครื่อง
- โครงการ 2 จำนวน 1 เครื่อง
- โครงการ 3 จำนวน 1 เครื่อง

3. สายดับเพลิง /อุปกรณ์เชื่อมต่อ / หัวฉีด / วาล์วเปิด -ปิด ประตูน้ำ

3.1 โครงการ 1
- * สถานที่ติดตั้ง ป้อม รปภ. ประตู A1
- * สถานที่ติดตั้ง ป้อม รปภ. ประตู A5-6

3.2 โครงการ 2
- * สถานที่ติดตั้ง ป้อม รปภ. ประตู B1

3.3 โครงการ 3
- * สถานที่ติดตั้ง ป้อม รปภ. ประตู C2 C3 C4

3.5 โครงการ 4
- * สถานที่ติดตั้ง ป้อมรปภ. ทางเข้าหน้านิคมอุตสาหกรรมปืนทอง


3.5 โครงการ 5
- * สถานที่ติดตั้ง ป้อม รปภ. ประตูฝั่ง 331

3.5 โครงการ 6
- * สถานที่ติดตั้ง ป้อม รปภ. ทางเข้าหน้านิคมอุตสาหกรรมปืนทอง

[redacted]

ภาคผนวกที่ 25

เอกสารขยายบ่อหน่วงน้ำ และรางระบายน้ำฝน

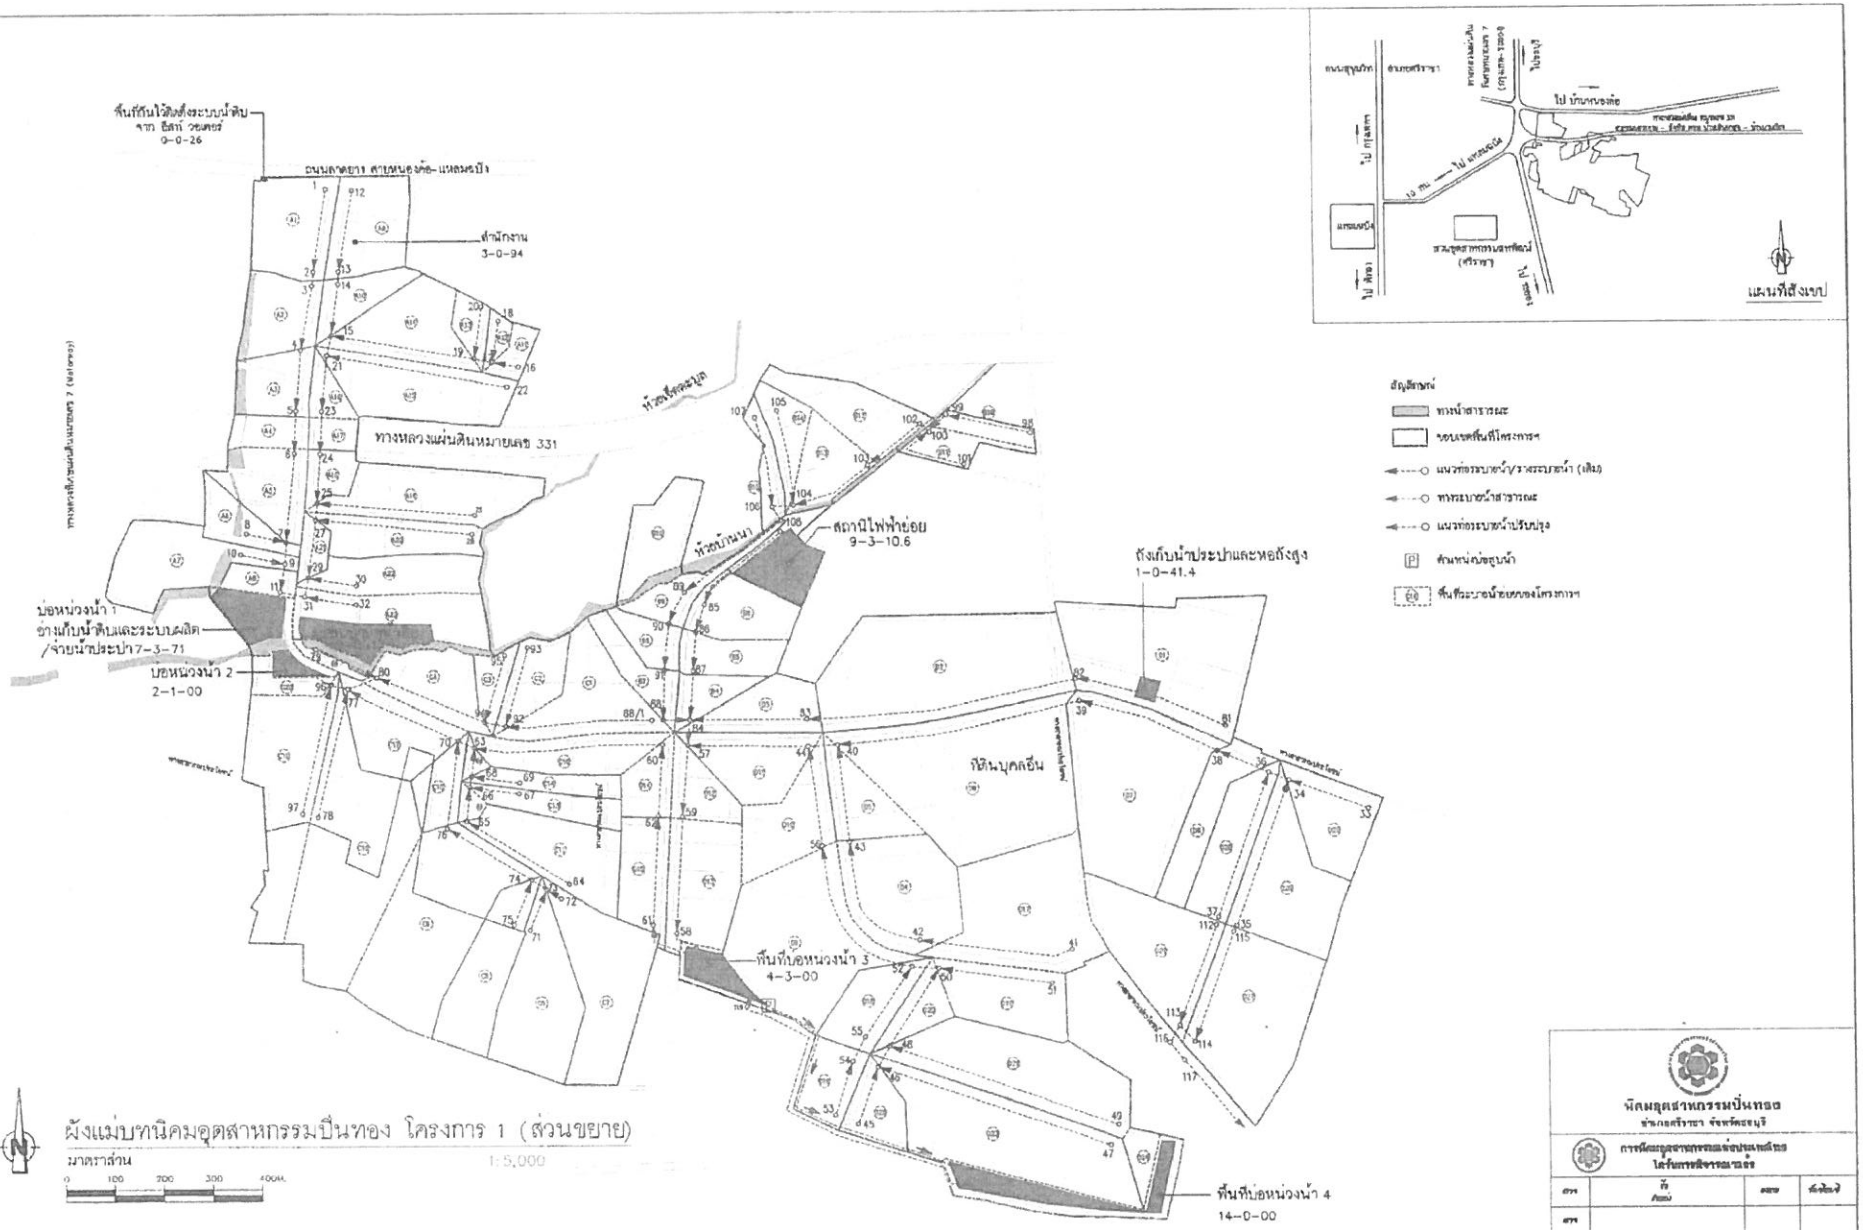

ผังแม่บทนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย)


มาตราส่วน 1:5,000

0 100 200 300 400M.


นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
จ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาระยอง

PROJECT		AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	SURVEY ENGINEER		GEOTECHNICAL ENGINEER		CIVIL/DRAINAGE ENGINEER		Fig.No	
โครงการอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย)	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด	DATE	แสดงพื้นที่การระบายน้ำย่อยของพื้นที่โครงการฯ	ARCHITECT	สถาปนิก ผู้ควบคุม ภาคีที่ ก-ส.ย. 55	MECHANICAL ENGINEER AND PLUMBING		DRAWN		1.2-5	
	DESIGN BY	PROJECT MANAGER						CHECKED		D/M/Y	PAGE
		DATE								D/M/Y	TOTAL

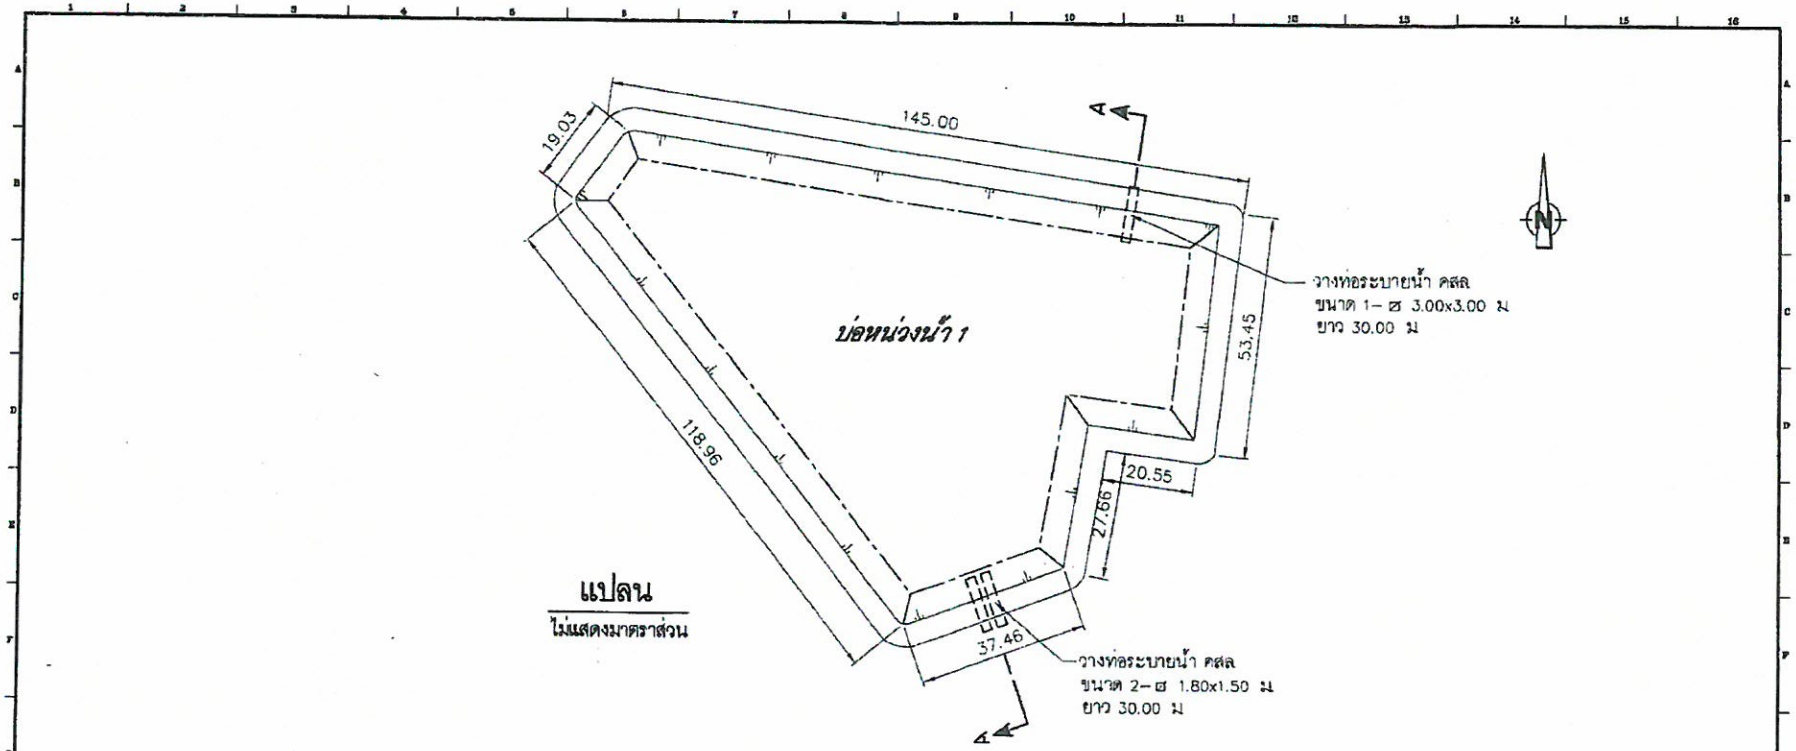

แปลน
ไม่แสดงมาตราส่วน

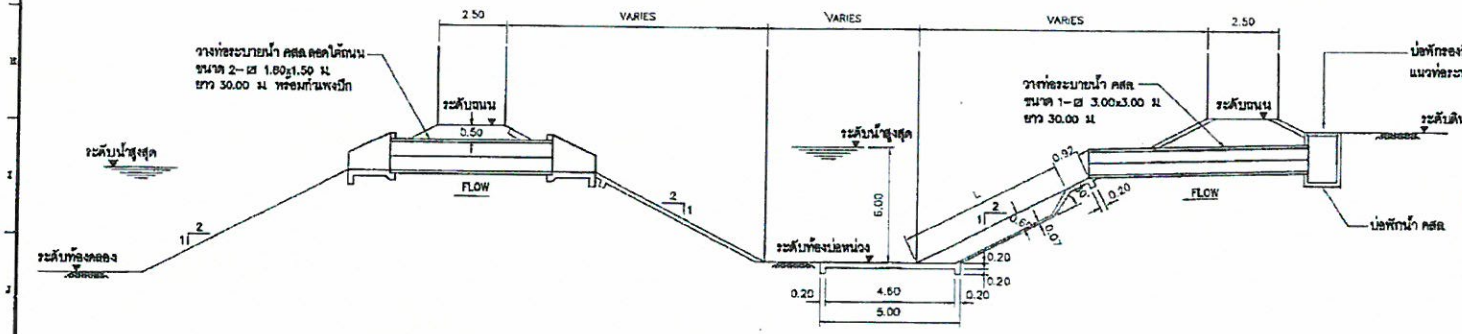

รูปตัด A – A
ไม่แสดงมาตราส่วน


REV.	DATE	DRAWN	APPROVED	MODIFICATION	
	DATE	DESIGNED	DATE	CHECKED	DATE

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Thai Environmental Technic Limited
Tel: (662)726-0361 Fax: (662)726-0364

Project
นิคมอุตสาหกรรมเขื่องใน โครงการ 1
(ส่วนขยาย)


Drawing Title
แบบสามมิติบ่อหน่วงน้ำบ่อที่ 1

Equipment No. | Fig No. 1.2-12 | Rev.
Client No. – | Scale | Sheet No.

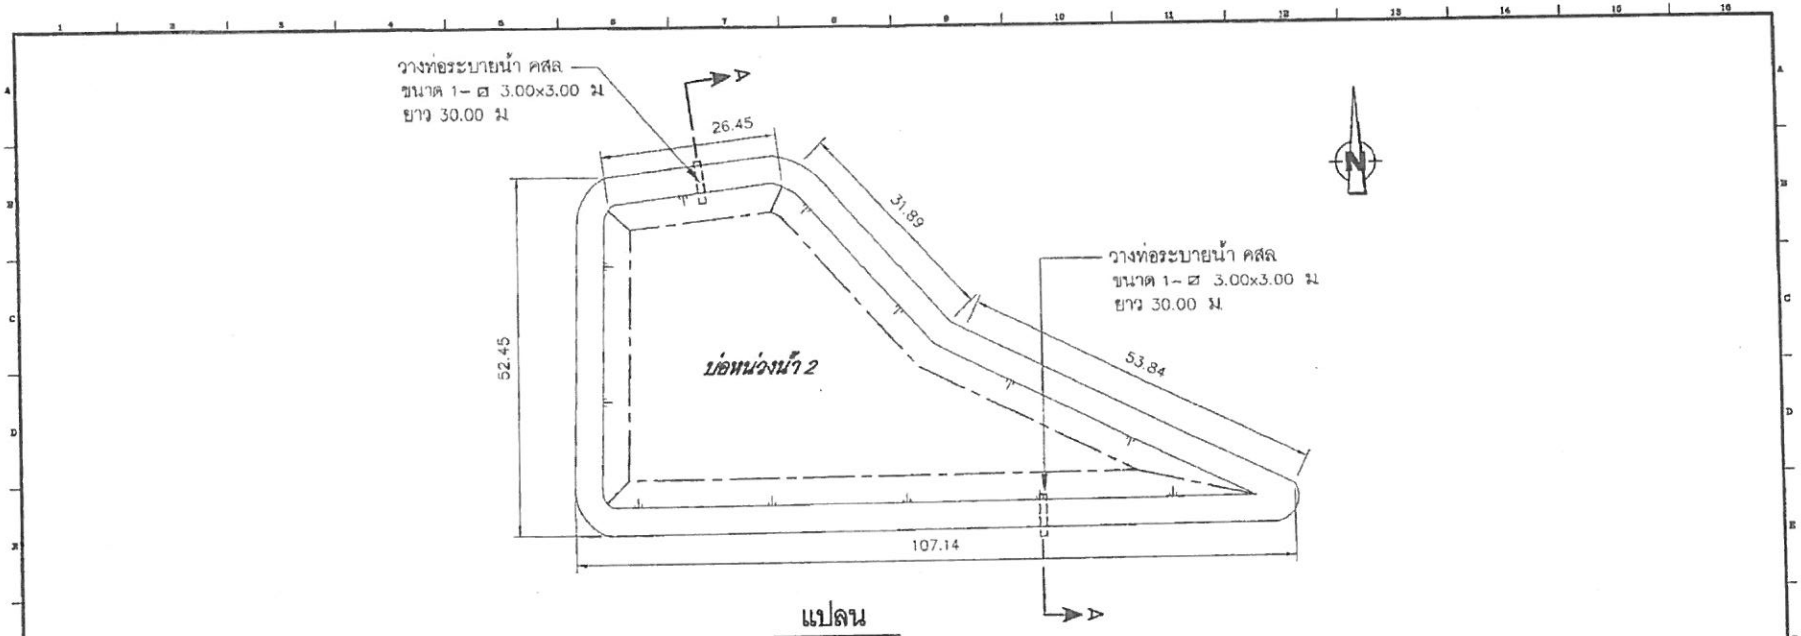

แปลน

ไม่แสดงมาตราส่วน

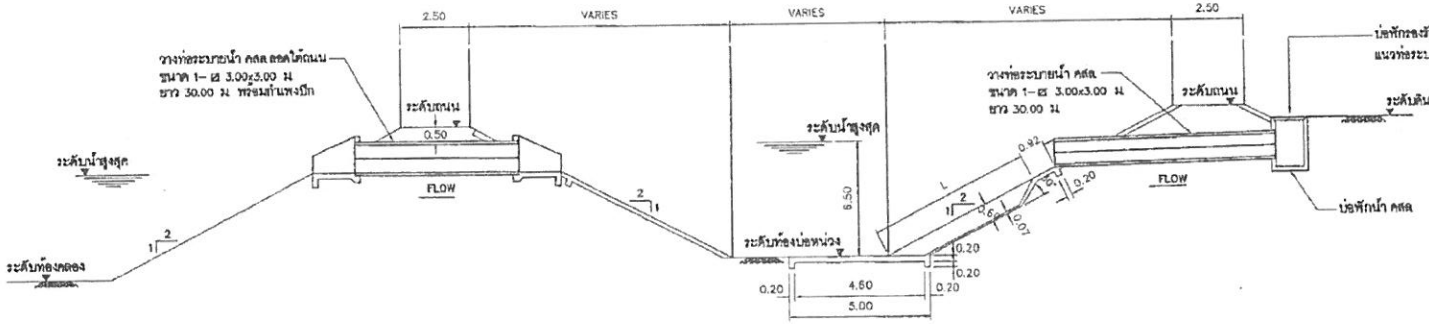

รูปตัด A – A

ไม่แสดงมาตราส่วน


REV.	DATE	DRAWN	APPROVED	MODIFICATION		
DRAWN	DATE	DESIGNED	DATE	CHECKED	DATE	

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Thai Environmental Technic Limited
Tel. (066)7795-0101 Fax (066)7795-0004


Project
นิคมอุตสาหกรรมเป็นทอง โครงการ 1
(ส่วนขยาย)

Drawing Title
แบบขยายบ่อหน่วงน้ำบ่อที่ 2

Equipment No. | Fig No. | L.S-L6 | Rev.
Check No. | | Scale | Sheet No.

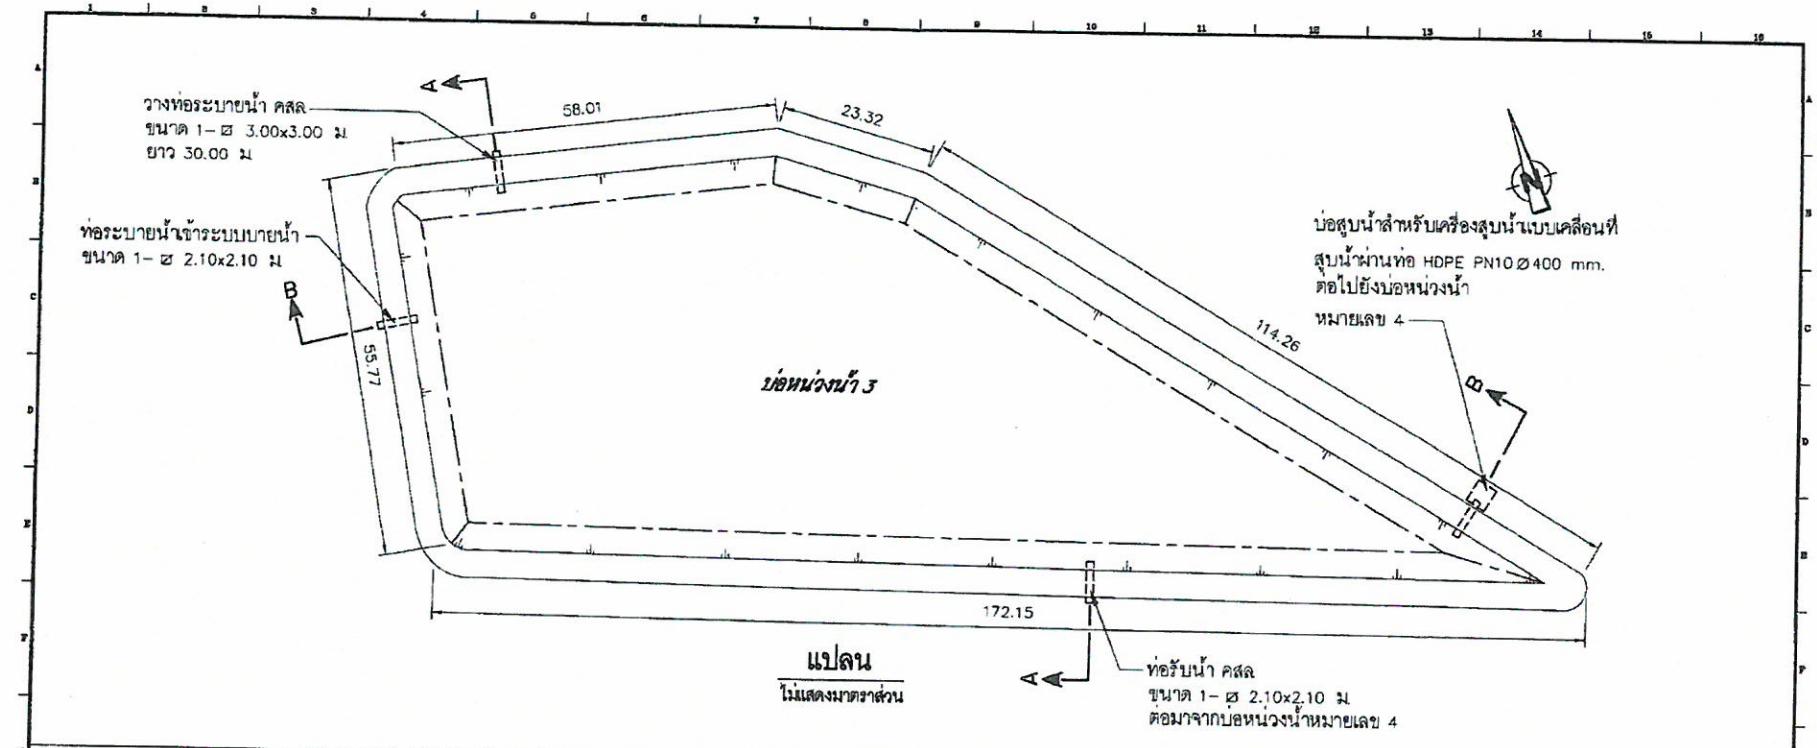

แปลน
ไม่แสดงมาตราส่วน

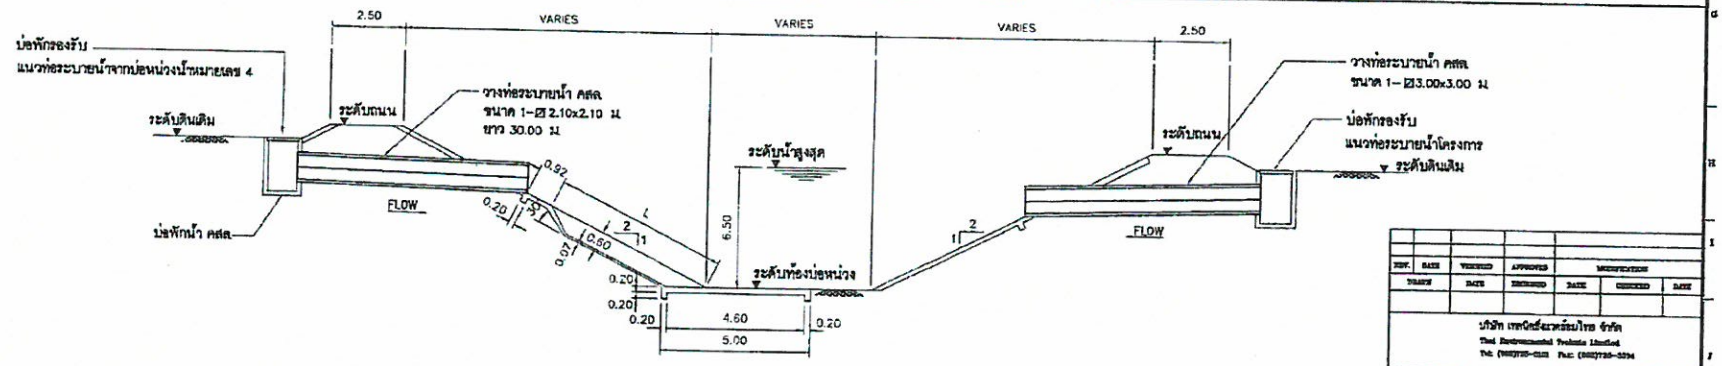

รูปตัด A – A
ไม่แสดงมาตรส่วน


REV.	DATE	DRAWED	APPROVED	MODIFICATION		
DRAWN	DATE	REVISED	DATE	CHECKED	DATE	

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Thai Environmental Technics Limited
Tel. (0-2937-0333 Fax: (0-2937-0334


Project
นิคมอุตสาหกรรมเงินทอง โครงการ 1
(ส่วนขยาย)

Drawing Title
แบบรายละเอียดบ่อหน่วงน้ำบ่อที่ 3 และ รูปตัด A-A

Equipment No.	Fig No.	1.0-16	
Client No.		Scale	Sheet No.

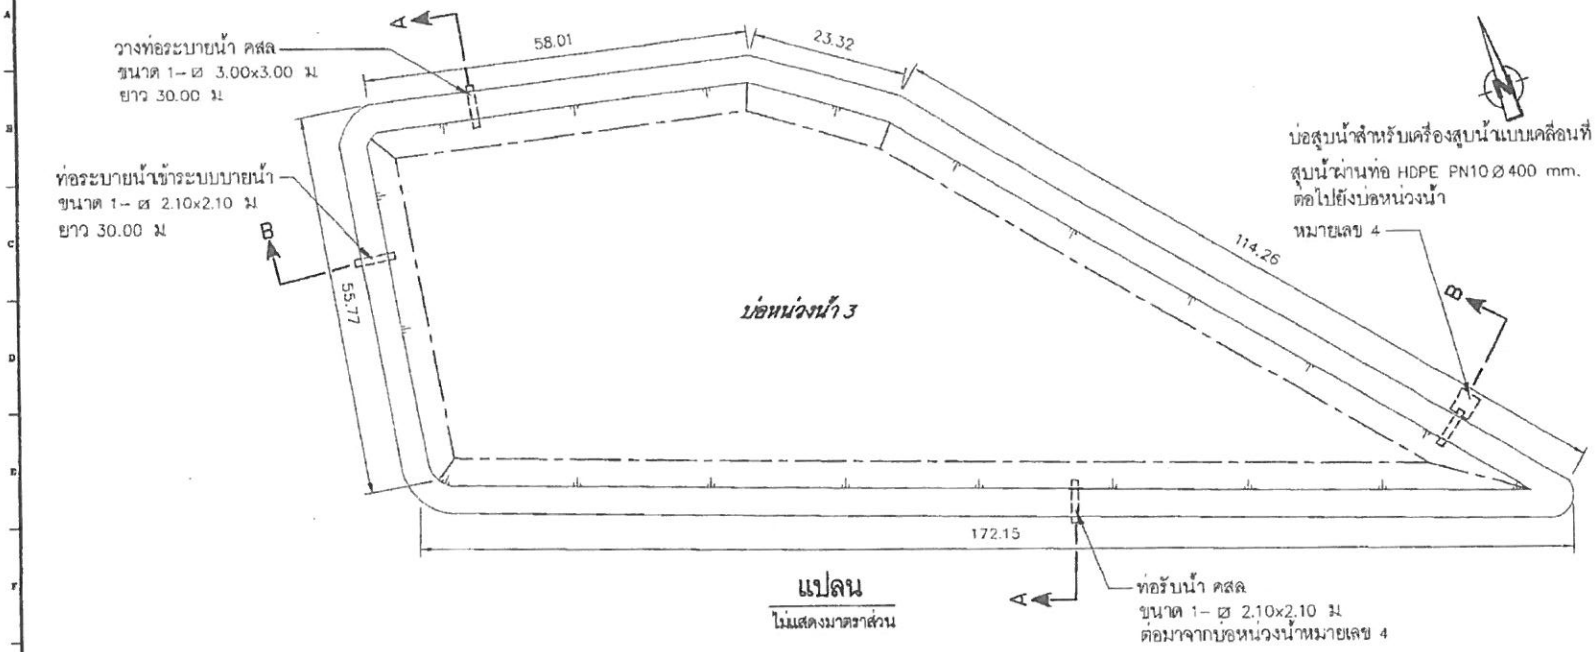

แปลน
ไม่แสดงมาตราส่วน

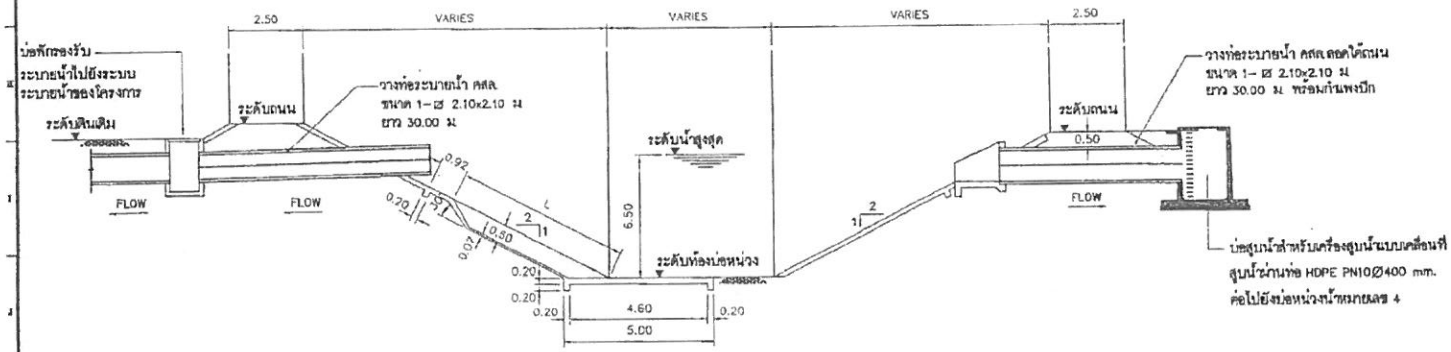

รูปตัด B – B
ไม่แสดงมาตราส่วน


REV.	DATE	DRAWN	APPROVED	INSPECTION		
REMARK		DATE	DESIGNED	DATE	CHECKED	DATE

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Thai Environmental Technic Limited
Tel (0807705-6566 Fax: (0807705-6564

Project
นิคมอุตสาหกรรมเหมืองทอง โครงการ 1
(ส่วนขยาย)


Drawing Title
แบบรายละเอียดบ่อหน่วงน้ำบ่อที่ 3 และ รูปตัด B-B

Development No.	Fig No.	1.2-10	Rev.
Sheet No.		Scale	Sheet No.

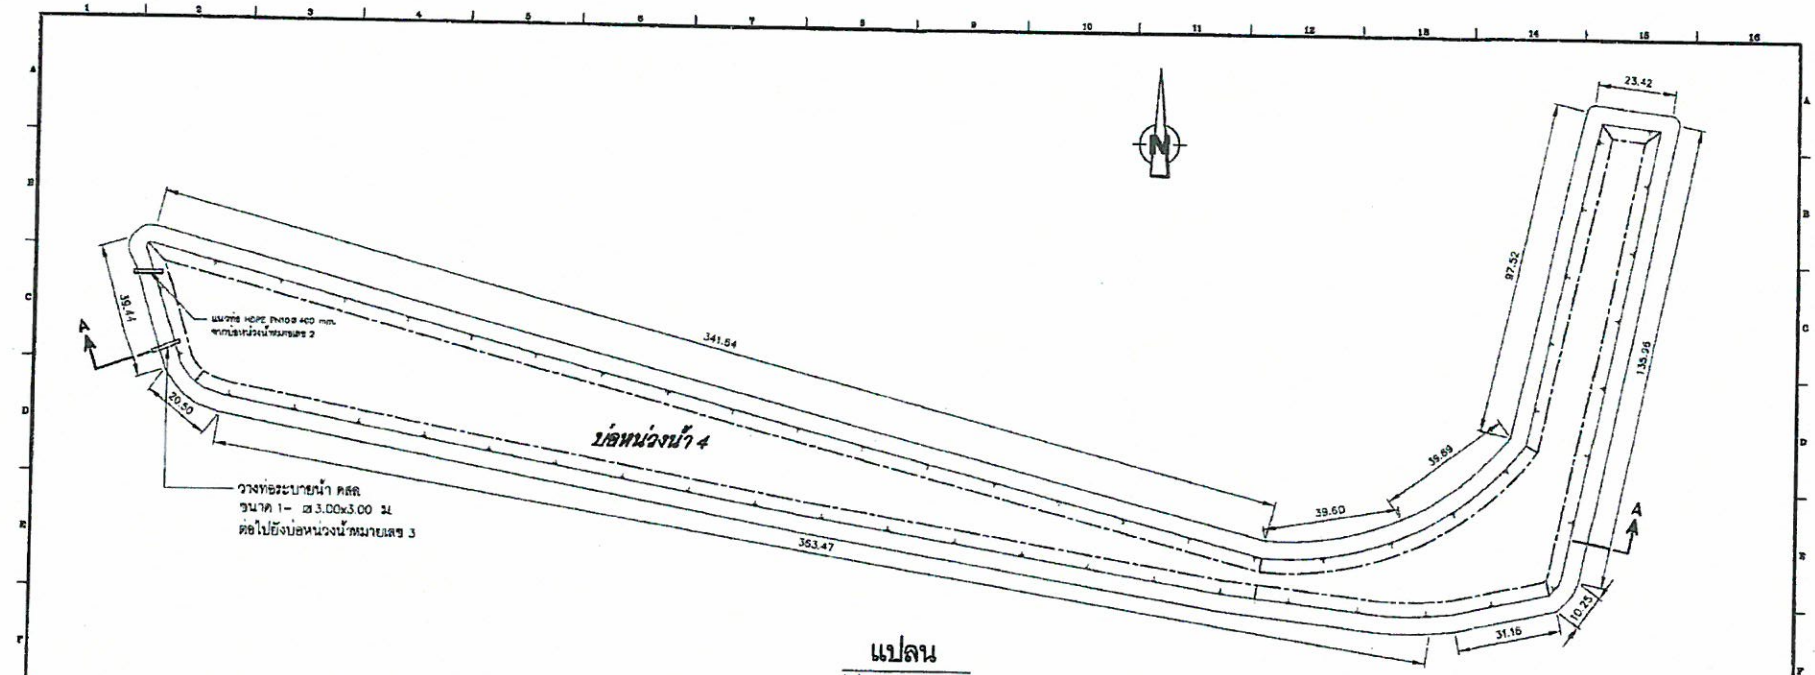

แปลน

ไม่แสดงมาตราส่วน

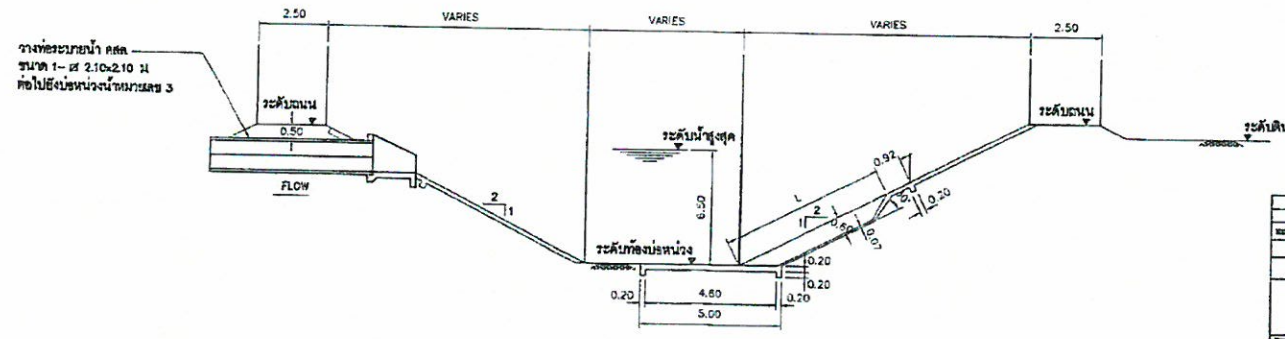

รูปตัด A – A

ไม่แสดงมาตราส่วน


NO.	DATE	VERIFIED	APPROVED	MODIFICATION		
ISSUED		DATE	DESIGNED	DATE	CHECKED	DATE

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Thai Environmental Technics Limited
Tel: (662)755-0241 Fax: (662)755-3594

Project
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1
(ส่วนขยาย)


Drawing Title
แบบก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำบ่อที่ 4

Document No.		Fig No.	3.2-17	Rev.
Client No.			Date	Check No.




SECTION ①

SCALE 1:5

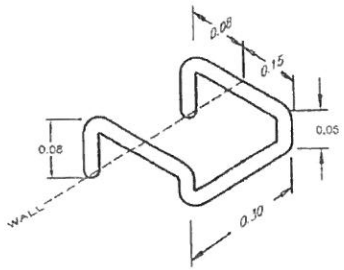


ISOMETRIC OF STAIR

N.T.S.

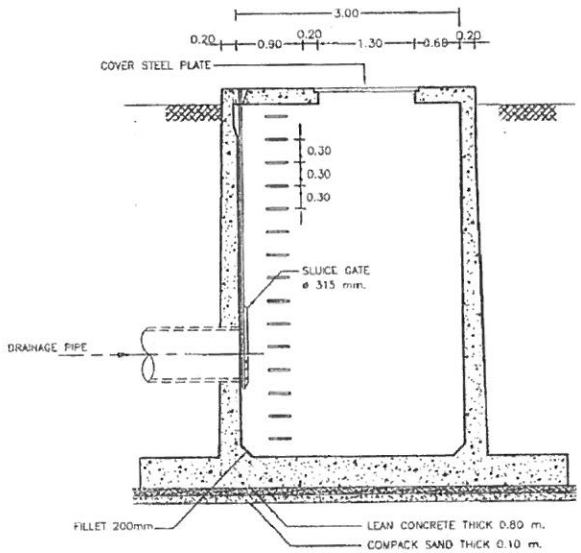

SECTION A–A

N.T.S.

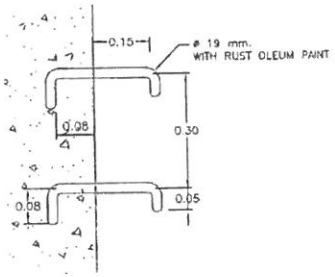

SIDE VIEW


N.T.S.

PROJECT: นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย)	OWNER: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด	AUTHORIZED SIGNATURE / DATE	TITLE: แบบทั่วไปบ่อสูบน้ำ ของโครงการฯ	SURVEY ENGINEER	GEOTECHNICAL ENGINEER	CIVIL/STRUCTURE ENGINEER	Fig.No 1.2–11		
	DESIGN BY	PROJECT MANAGER / DATE		ARCHITECT	MECHANICAL ENGINEER AND PLUMBING	DRAWN / CHECKED	D/M/Y D/M/Y	PAGE TOTAL	


นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ส่วนขยายที่ 1 จังหวัดชลบุรี

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม

ครั้งที่	ข้อ/รายละเอียด	ลงชื่อ	วันที่แก้ไข

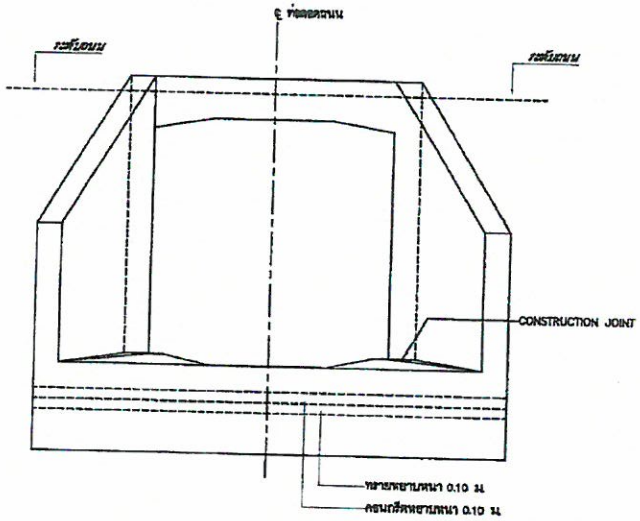


รูปแบบมาตรฐานท่อลอดถนน

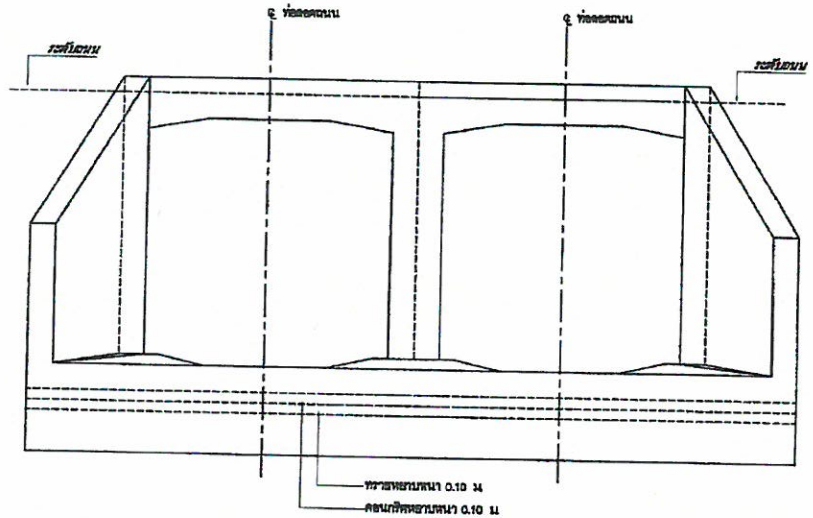


รูปแบบมาตรฐานท่อลอดถนน

PROJECT โครงการก่อสร้างถนนเส้นทาง ใหม่ตาย 1 (ส่วนขยาย)	ที่ตั้ง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสตรีส จำกัด ผู้ออกแบบ บริษัท เทคนิคที่ปรึกษา จำกัด	AUTHORIZED SIGNATURE PROJECT MANAGER	ชื่อแบบ/ชื่อรูป แบบมาตรฐาน ท่อลอดถนน	วิศวกรโครงสร้าง ปฐพีกลศาสตร์ ถนน/ทาง วิศวกรโยธาและระบายน้ำ		วิศวกรเครื่องกล		วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสิ่งแวดล้อม เขียน สาย		แบบ/รูปแบบที่ 1.2-8 มาตราส่วน ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด วันที่ แก้ไขที่		หมายเหตุ ____/____/____		

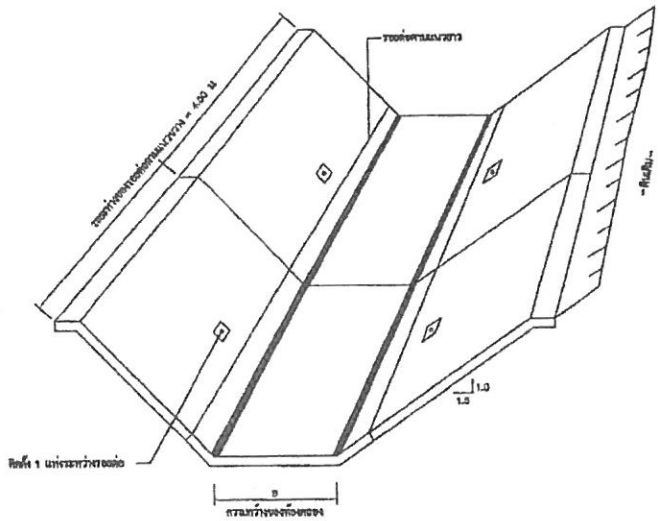


รางคาดคอนกรีต

มาตราส่วน 1:20

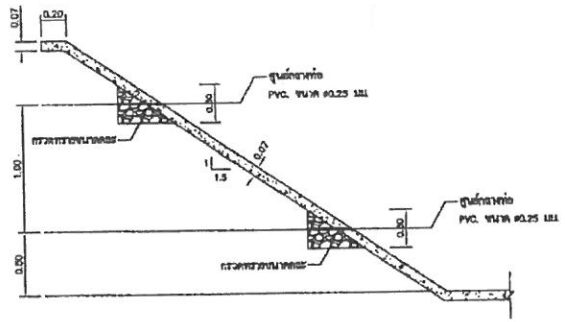


รูปท่อระบายน้ำด้านข้างทุกระยะ 4.50 เมตร

มาตราส่วน 1:20



รูปตัวทั่วไป


มาตราส่วน 1:20




แบบขยายรอยต่อ

มาตราส่วน 1:10


PROJECT ปิดคลุมตลาดสดเทศบาลเมืองใหม่ดงดาว (ส่วนขยาย)	ผู้รับจ้าง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ผู้ออกแบบ บริษัท เอทีอีคอนซัลแตนท์ จำกัด	AUTHORIZED SIGNATURE PROJECT MANAGER	ชื่อแบบ/ชื่อรูป แบบมาตรฐาน รางระบายน้ำ	วิศวกรผู้ควบคุม ปฏิทินตามสัญญา ตรวจรับงาน วิศวกรโครงการระบายน้ำ		วิศวกรผู้ออกแบบ		วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรสิ่งแวดล้อม เขียน ตรวจ		แบบ/รูปลำดับที่ 1.2-7 มาตราส่วน วันที่ แก้ครั้ง		ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ	อนุมัติ / /




รูปตัดท่อปากกระดิ่ง
ไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริม

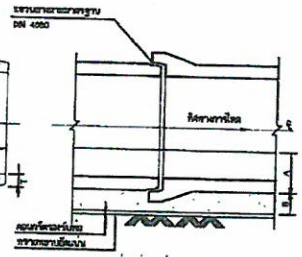


การต่อเชื่อมท่อปากกระดิ่ง
ไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริม



รูปตัดท่อปากลิ้นราง
ไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริม

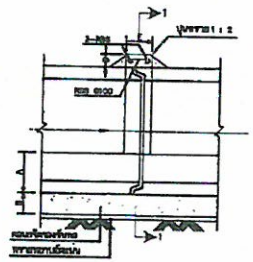


การต่อเชื่อมท่อปากลิ้นราง
ไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริม

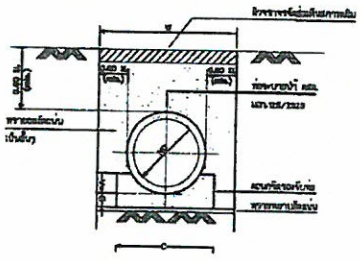

รูปตัดการวางท่อระบายน้ำ/ท่อยอมส่งน้ำ
ไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริม

ตารางที่ 1 แสดงขนาดและมิติของท่อระบายน้ำ คสล.

ชั้นคุณภาพ	ขนาดระบุท่อ ND (มม.)	ความหนา (ดูหน้า) T (มม.)	ความยาว (ดูหน้า) L (มม.)	มิติต่างของปากท่อ (มิลลิเมตร)									
				ท่อที่มีปากกระดิ่ง						ท่อที่มีปากลิ้นราง			
				l1	l2	l3	l4	l5	l6	a	b	c	t
มอก.5	300	50	1000 และ 2500	80	85	4	89	150	50	19	8	23	30
	600	75	1000 และ 2500	78	91	6	116	225	75	23	15	32	40
	800	85	1000 และ 2500	88	111	6	137	285	95	30	19	42	48
	1000	110	1000 และ 2500	85	125	6	150	330	110	43	20	47	45
	1200	125	1000 และ 2500	100	141	6	165	378	126	49	25	52	50
	1500	150	1000 และ 2500	100	166	6	177	450	150	57	30	63	60



รูปตัด 1 – 1
ไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริม

ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ภาคตัดขวางการเสริมเหล็กของท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดระบุท่อ (ND) มม.	พื้นที่ภาคตัดขวางของเหล็กเส้นรับแรงดึง (ตร.มม.ต่อ ความยาวของท่อ 1 เมตร)				
	ชั้นคุณภาพของเหล็กเสริม 3				
	วงรอบ		วงรัด	แรงที่ทำให้ท่อแตก * ไม่น้อยกว่า นิวตัน/เมตร	ภาระสูงสุด * ไม่น้อยกว่า นิวตัน/เมตร
	วงใน	วงนอก			
300	1.5	–	–	12500	20000
600	1.5	–	1.5	28300	50000
800	4.0	–	3.4	52000	80000
1000	4.2	3.2	4.7	65000	100000
1200	5.1	3.8	5.7	78000	120000
1500	7.2	5.5	8.0	97500	150000

* ภาคฐานการทดสอบแรงที่กำหนดไว้ ในการใช้ที่สำการทดสอบเป็นไปตาม มอก. 128/2529


ตารางที่ 3 แสดงขนาดและมิติการวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดท่อ (ND) มม.	ความกว้างร่องขุด W (มม.)	ระยะคลุมหลังรองรับท่อ					เหล็กรัดปลอกรัดรับท่อ		ระยะยึดหลังคลุมคอนกรีต	
		A (มม.)	B (มม.)	C (มม.)	D (มม.)	E (มม.)	S1	S2	จำนวน	ระยะห่าง
300	1820	100	120	600	50	100	–	–	–	–
600	1950	200	150	1000	100	150	091000.29	3-0912	2	0.500m.00
800	2180	250	200	1300	100	200	091260.29	5-0912	3	0.500m.00
1000	2420	300	250	1500	100	200	091260.29	7-0912	3	0.5000.75
1200	2650	350	300	1800	100	200	091260.15	8-0912	4	0.5000.75
1500	3000	450	400	2300	100	200	091660.20	11-0916	3	0.5000.60

หมายเหตุ


1. ความกว้างของการขุดร่องท่อระบายน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ถ้าเห็นว่าการขุดในขนาดที่ได้กำหนดไว้ให้ดีกับบริเวณงานนั้นๆ
2. คอนกรีตของรับและหุ้มท่อมีกำลังอัดประลัยต่ำสุดของคอนกรีตทรงกระบอก รูปลูกบาศก์ เท่ากับ 210 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน ส่วนคอนกรีตรองพื้นมีกำลังไม่น้อยกว่า 180 กก./ซม.2 ส่วนคอนกรีตยาแนวต้องมีกำลังไม่น้อยกว่า 145 กก./ซม.2

PROJECT: โครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสงเหล่า (ส่วนขยาย)	ที่ปรึกษา: บริษัท เอ็นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด	AUTHORIZED SIGNATURE	ชื่อแบบ/ชื่อรูป: แบบมาตรฐาน ท่อระบายน้ำหน้าตัววงกลม	วิศวกรผู้ควบคุม		วิศวกรโครงการ		แบบ/รูปแบบที่ 1.2-9			
	ออกแบโดย: บริษัท เทคนิคที่ปรึกษาไทย จำกัด	PROJECT MANAGER		ปฏิบัติงานแทน		วิศวกรผู้ช่วยผู้จัดการ		มาตราส่วน			
				ตรวจปฏิบัติ		วิศวกรผู้ช่วยผู้จัดการ		วันที่	เดือนที่		
				วิศวกรวิเคราะห์และระบบน้ำ	วิศวกรที่ปรึกษา	เขียน					
						ตรวจ					

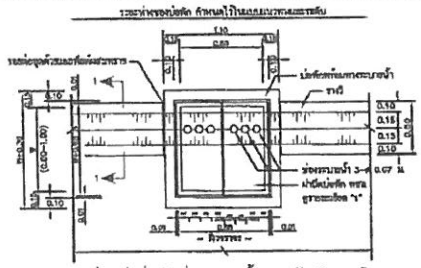


แปลนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ และคันหินรางวี

มาตราส่วน 1:20

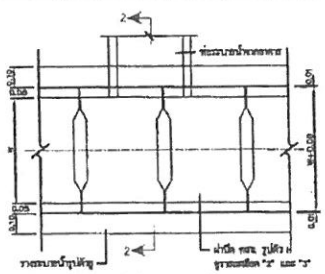


ชนิดฝาปิด คสล.รูปตัว H

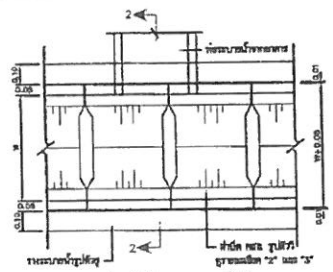

ชนิดฝาปิด คสล.รูปตัววี


หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตที่ใช้เป็นชนิด ก-2 ตาม มยผ. 101-2533
3. เหล็กเสริมคอนกรีตที่มีขนาดเล็กกว่า 10 มม.ให้ใช้เหล็กเส้นกลมตาม มอก. 20เกรด 24 เหล็กเส้นขนาดตั้งแต่ 10 มม. ขึ้นไปให้ใช้เหล็กข้ออ้อยตาม มอก. 24 เกรด SD 30
4. เหล็กโครงสร้างให้เป็นไปตาม มอก. 116 เกรด Fe 30
5. เหล็กเส้นให้เป็นไปตาม มอก. 83 เกรด SR 24
6. เหล็กโครงสร้างและเหล็กเส้นต้องทาสีกันสนิม ยกเว้นที่ฝังในคอนกรีต ทาสีรองพื้นอย่างน้อย 2 ครั้ง และสีน้ำมัน 1 ครั้ง
7. ระยะหุ้มคอนกรีตจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็กไม่น้อยกว่า 3 ซม.
8. ช่องว่างระหว่างท่อกับผิวคอนกรีตที่เหลือให้ใส่แผ่นโฟมหรือวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ดีอุดให้แน่น
9. ต้องแบ่งท่อที่ก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ ระยะห่างกันไม่เกินความยาวท่อ ระยะห่างของรอยต่อที่ก่อสร้างแต่ละช่วงต้องเท่ากันตลอด
10. การก่อสร้างที่ระบายและฝาปิดของรางระบายน้ำรูปตัวยู ให้เป็นแบบชิ้นเดียว
11. ในการก่อสร้างรางระบายน้ำที่มีระยะห่างระหว่างรางไม่เกิน 10.00 เมตร ระยะห่างของรอยต่อก่อสร้าง 1 ซม. ยกเว้นรอยต่อที่อยู่บริเวณที่ประชิดกับรอยต่อของทางขวาง ซึ่งกว้าง 1.3 โดยประมาณ
12. ม. เป็นความกว้างของรางระบายน้ำ คสล.ที่จะใช้ในแบบมาตรฐานนี้
13. คอนกรีตที่ใช้ในงานนี้ ต้องมีกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
14. ดินถมโดยรอบท่อต้องเป็นวัสดุที่ผ่านการบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรกล ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 90 % STANDARD PROCTOR (AASHTO T99-89)




รูปตัด 1-1

มาตราส่วน 1:10

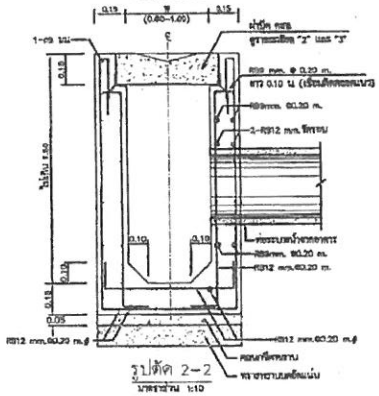


รูปตัด 2-2

มาตราส่วน 1:10

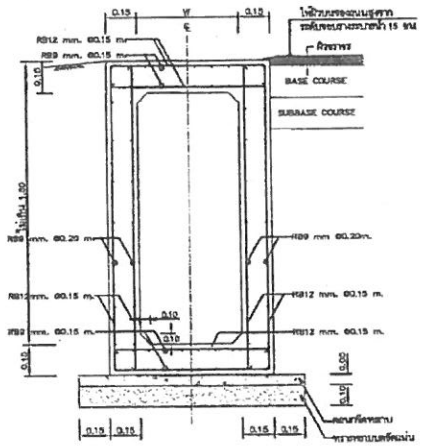


รูปตัดทางขวางท่อลอดเชื่อมรางระบายน้ำ รูปตัวยู

มาตราส่วน 1:10



รายละเอียด "1"

มาตราส่วน 1:10




ชนิดฝาปิด คสล.รูปตัว H


ชนิดฝาปิด คสล.รูปตัววี

รายละเอียด "2"

มาตราส่วน 1:10




ชนิดฝาปิด คสล.รูปตัว H



รายละเอียด "3"

มาตราส่วน 1:10

ชนิดฝาปิด คสล.รูปตัววี



ชนิดฝาปิด คสล.(แบบสี่เหลี่ยม)

PROJECT: นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย)	ที่ปรึกษา: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด	AUTHORIZED SIGNATURE	รื่องแบบ/ชื่อรูป: แบบมาตรฐาน รางระบายน้ำรูปตัวยู	วิศวกรสำรวจ		วิศวกรโครงสร้าง		แบบ/รูปลำดับที่ 1.2-10	
	ผู้ออกแบบ: บริษัท เทคนิคอีโคลดคัลไทย จำกัด	PROJECT MANAGER		ปฏิทินตรวจแบบ		วิศวกรเจ้าของโครงการ		มาตราส่วน	
				อนุมัติ		วิศวกรเครื่องกล		วันที่ / เล่มที่	
				วิศวกรโยธาเขตระบายน้ำ					

ภาคผนวกที่ 26

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3

แบบสรุปปริมาณของเสีย ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568

No.	รายชื่อโรงงาน	ปริมาณของเสีย (ตัน)														
		1.ขยะมูลฝอย	2.พลาสติก	3.กระดาษ	4.แก้ว	5.เศษโลหะ	6.ไม้	7.น้ำมันที่ใช้แล้ว	8.ภาชนะเปื้อนน้ำมัน	9.เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน	10. สารเคมีที่ใช้แล้ว	11. ถังสารเคมีที่ใช้แล้ว	12.ขยะจากห้องพยาบาล	13.ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่/หลอดไฟ	14.อื่น ๆ	รวม(ตัน)
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568																
1	บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด	1.87	0.42	0.79		21.71	1.77		0.88	2.11				0.01	36.46	66.02
2	บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน 3)		3.41	3.67			6.21								102.94	116.23
3	บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน 1)					80.98				0.27					2.55	83.80
4	บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ	204.00	77.26	43.63	3.65	14.89	1.09		7.20	3.80	14.40	0.62	0.01		15.52	386.07
5	บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรง 1)	11.50		1.35		1.76		0.77	3.97	32.97	506.30	118.72		0.30	188.50	866.14
6	บริษัท ไทย ซันเคียว จำกัด	3.67	0.03	0.18	0.03	0.04				0.01				0.01		3.96
7	บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด	9.18	0.0038	0.0042	0.0001	0.30	0.01		0.0002	0.01	0.01	0.0018		0.00001	0.00	9.51
8	บริษัท ทากาชิโฮ เดนไซ (ประเทศไทย) จำกั	0.46	1.60	1.58		1,068.99									123.00	1,195.63
9	บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)จำกัด	7.49	0.28	42.31		2,410.29	34.91		0.20	9.77			0.0027	0.02	0.05	2,505.32
10	บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จ	1.84	0.99	17.01		0.31	0.43								44.76	65.34
11	บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จ	12.85	5.88	28.70		0.69	6.37			0.62		0.01	0.003	0.05	121.38	176.55
12	บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด	204.00						21.00		4.20					120.18	349.38
13	บริษัท ไทย ทาซึมุ เทค จำกัด	9.18	1.01	0.36		1,130.00	2.34		0.10	2.16				0.04	2.05	1,147.23
14	บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไท	3.74													3.23	6.97
15	บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด	5.51	0.61	0.47	0.18	6.76	0.09	1.20	0.03	1.56	2.90			0.05		19.36
16	บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด	7.34						21.01	0.32	4.49	5.86			0.01		39.03
17	บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปค (ประเทศไทย) จำ	12.89	1.47	4.11	1.25	4.23	12.18	1.00			1.50	2.84	0.00	0.07	638.33	679.87
18	บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	9.36	0.04	0.57		103.28	5.73	0.94	0.02	1.30				0.01	0.02	121.27
19	บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด (สาขา 2)			1.62		34.42	5.46									41.50
20	บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด	28.00	0.41	0.55		807.29	8.00								4.07	848.32
21	บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด	1.25	1.25	1.25					0.80		0.20	0.40				5.14

แบบสรุปปริมาณของเสีย ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568

No.	รายชื่อโรงงาน	ปริมาณของเสีย (ตัน)														
		1.ขยะมูลฝอย	2.พลาสติก	3.กระดาษ	4.แก้ว	5.เศษโลหะ	6.ไม้	7.น้ำมันที่ใช้แล้ว	8.ภาชนะเปื้อนน้ำมัน	9.เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน	10. สารเคมีที่ใช้แล้ว	11. ถังสารเคมีที่ใช้แล้ว	12.ขยะจากห้องพยาบาล	13.ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่/หลอดไฟ	14.อื่น ๆ	รวม(ตัน)
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)																
22	บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์	12.00	2.74	50.38	0.94	7.50	14.30		23.01	19.46			0.01		185.68	316.02
23	บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด	33.29	33.24	0.90		2,476.02			1.12	3.64			1.600	0.02	1.20	2,551.03
24	บริษัท โทโฮคุ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย	187.20	1.39	1.09	0.36	204.96	5.39	2.51	0.71	3.92	10.40	0.08	0.01	0.03	0.55	418.60
25	บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด		1.30	1.00					0.07	0.66	0.17			0.01	25.36	28.57
26	บริษัท เค.ที.อี. จำกัด	7.34								2.07	1.58					10.99
27	บริษัท ยูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	408.00	3.04	13.64			18.38	0.75	5.85	11.06						460.70
28	บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์)จ	14.98				453.44			0.31	4.21				0.03	52.73	525.70
29	บริษัท ไดโค ดายส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1.87														1.87
30	บริษัท ซากูไร เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด	5.51				250.38										255.89
31	บริษัท แพน เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด	6.19	0.88	2.22		0.04	111.26		0.01	0.81				0.02	0.34	121.76
32	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด	46.80	13.42	30.67	2.60	17.37	4.70		8.10	5.15		0.25	0.005		298.73	427.79
33	บริษัท โจนัน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด	9.18	6.11	6.68		6.56	1.79	1.62	6.10	0.08	1.73	0.41		0.04		40.30
34	บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์)จำกัด	7.49	0.18	2.73		136.52	1.02	1.20	0.15	9.05	0.46	0.15		0.05	37.50	196.49
35	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอน	14.96	6.62	29.17		2.73						1.89	0.02	0.01		55.40
36	บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	5.51														5.51
37	บริษัท แหลมฉบัง คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	6.00						116.75								122.75
38	บริษัท เซ็นทรัล พีซีชั่น พาร์ท จำกัด	14.98	0.72	0.65	0.72	49.58									33.55	100.19
39	บริษัท ไทย อิเคดะ คากินูมา จำกัด	208.00				46.19									8.44	262.63
40	บริษัท ซีจิกาว่า (ประเทศไทย) จำกัด	1.25	1.25	1.25		3.80										7.54
41	บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำ	0.43				1.54		0.91		0.39						3.27
42	บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี. จำกัด	312.00	3.27			1,733.55	3.87						0.040	0.04	31.12	2,083.88

แบบสรุปปริมาณของเสีย ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568

No.	รายชื่อโรงงาน	ปริมาณของเสีย (ตัน)														
		1.ขยะมูลฝอย	2.พลาสติก	3.กระดาษ	4.แก้ว	5.เศษโลหะ	6.ไม้	7.น้ำมันที่ใช้แล้ว	8.ภาชนะเปื้อนน้ำมัน	9.เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน	10. สารเคมีที่ใช้แล้ว	11. ถังสารเคมีที่ใช้แล้ว	12.ขยะจากห้องพยาบาล	13.ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่/หลอดไฟ	14.อื่น ๆ	รวม(ตัน)
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)																
43	บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด	13.10	10.00	1.55		0.15	0.03								0.67	25.50
44	บริษัท เคียวริทซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด	2.07	1.08	0.57	0.03	31.22		2.40	0.12	0.65	0.12	0.03		0.02		38.31
45	บริษัท เอ็นทีพีที จำกัด	7.49				2,418.42		5.55	0.21			3.53	0.01	0.05	98.02	2,533.26
46	บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด	255.61	0.69	2.61	1.74	1,316.34		25.98		17.15		0.01	0.03	0.00	108.31	1,728.46
47	บริษัท สยาม ริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด	2.45	2.45	2.45												7.34
48	บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา					123.16										123.16
49	บริษัท สยาม ไทเซอิ อินดัสตรี้ จำกัด	1.87	1.87	1.87				1.00		3.56						10.18
50	บริษัท เฮอิฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด	1.25	1.25	1.25					0.28							4.02
51	บริษัท ไซทามะ ซิขิ (ประเทศไทย) จำกัด	0.22				9.85			0.02	6.30					0.01	16.40
52	บริษัท มารูเทค (ประเทศไทย) จำกัด	3.74				13.05										16.79
53	บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด	1.80													5.63	7.43
รวม		**2,126.71**	**186.15**	**298.83**	**11.50**	**14,988.29**	**245.32**	**204.59**	**59.57**	**151.40**	**545.63**	**128.93**	**1.73**	**0.88**	**2,290.87**	**21,240.40**
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568																
1	บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด	1.91	0.55	0.74	0.23	0.20	0.35		0.84	2.43						7.24
2	บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	4.88	4.85	1.78			2.41			0.89		0.06				14.88
3	บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน 1) เลขที่ 789/17					85.75				0.54					2.54	88.83
4	บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน 2) เลขที่ 789/146														6.62	6.62
5	บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน 3) เลขที่ 78		3.55	4.34			6.87								97.14	111.90
6	บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ	212.00	108.29	35.49	1.60	2.27	1.10			6.38	14.20	0.41	0.01	0.01	530.75	912.51
7	บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงง	12.00	0.60	1.50	3.00	6.00		1.63		23.38	528.29			0.09	235.37	811.86
8	บริษัท ไทย ซันเคียว จำกัด	3.82	0.03	0.18	0.03	0.04				0.01				0.01		4.10

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3

แบบสรุปปริมาณของเสีย ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568

No.	รายชื่อโรงงาน	ปริมาณของเสีย (ตัน)														
		1.ขยะมูลฝอย	2.พลาสติก	3.กระดาษ	4.แก้ว	5.เศษโลหะ	6.ไม้	7.น้ำมันที่ใช้แล้ว	8.ภาชนะเปื้อนน้ำมัน	9.เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน	10. สารเคมีที่ใช้แล้ว	11. ถังสารเคมีที่ใช้แล้ว	12.ขยะจากห้องพยาบาล	13.ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่/หลอดไฟ	14.อื่น ๆ	รวม(ตัน)
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)																
9	บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด	9.47	3.80	3.15		255.08	7.90			8.10	4.44	2.00				293.94
10	บริษัท ทากาชิโฮ เคนไซ (ประเทศไทย) จำกั	0.44	2.60	3.26		1.16		0.01		0.07	0.02	0.01		0.01		7.58
11	บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)จำกัด	7.49	0.57	42.33		2,338.02	35.54	1.40	100.00	7.33				0.04	0.04	2,532.76
12	บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประ	15.92	2.76	11.86		1.34		1.20	1.63	4.40						39.11
13	บริษัท ชาตรี โบลว์ (ประเทศไทย) จำกัด	3.48	3.18	3.18					0.01	0.55					0.02	10.41
14	บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จ	13.36	6.22	29.69		4.41	9.48			0.75		0.20	0.002	0.17	314.27	378.55
15	บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด	212.00						2.00		4.20					88.32	306.52
16	บริษัท ไทย ทาซึมุ เทค จำกัด	9.36	1.11	0.63		1,170.21	3.75		0.08	2.62				0.01	1.80	1,189.56
17	บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไท	3.74	0.32	0.52	0.11	2,814.10		105.50							2,301.30	5,225.60
18	บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด	7.34								4.55	12.32				22.50	46.71
19	บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปค (ประเทศไทย) จำกัด		1.597	3.04	1.12	0.18					9.50	2.98		0.35		17.17
20	บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) 78	9.36	0.24	0.92		63.38	1.47	0.40	0.05	0.50					9.51	85.83
21	บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด สาขา 2		0.11	1.97		45.26	5.53									52.87
22	บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด	28.00	0.42	0.67		747.06	8.70	2.20							5.92	792.97
23	บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด	3.89				328.80					156.70	1.848.7				489.39
24	บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลน	12.00	3.61	59.38	1.38	5.50	15.83		27.80	15.00			0.01		167.56	308.06
25	บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด	67.44	34.77	1.93		5,132.84		1.00	1.32	8.74			4.40	0.02	1.20	5,253.66
26	บริษัท โทโฮคุ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไท	18.68	1.49	1.35	0.24	224.39	6.31		1.42	4.98	8.65				4.01	271.52
27	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22.42	3.20	4.10		62.25	6.50		0.04	2.30	0.20			0.02	0.95	101.98
28	บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด		1.28	0.78					0.05	0.22	0.16	0.06		0.05	28.11	30.71
29	บริษัท เค.ที.อี. จำกัด	7.49								1.94	1.87					11.30

แบบสรุปปริมาณของเสีย ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568

No.	รายชื่อโรงงาน	ปริมาณของเสีย (ตัน)														
		1.ขยะมูลฝอย	2.พลาสติก	3.กระดาษ	4.แก้ว	5.เศษโลหะ	6.ไม้	7.น้ำมันที่ใช้แล้ว	8.ภาชนะเปื้อนน้ำมัน	9.เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน	10. สารเคมีที่ใช้แล้ว	11. ถังสารเคมีที่ใช้แล้ว	12.ขยะจากห้องพยาบาล	13.ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่/หลอดไฟ	14.อื่น ๆ	รวม(ตัน)
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)																
30	บริษัท ยูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	27.53	3.70	16.21			3.11		9.35	12.17					26.00	98.07
31	บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์)จ	14.98				391.91			0.31	6.61						413.81
32	บริษัท ไดโค ดายส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1.80														1.80
33	บริษัท ซากูไร เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด	5.72				278.67										284.39
34	บริษัท แพน เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด	6.11	0.56	0.28		0.66	96.53		1.12				0.01		0.22	105.49
35	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด	46.80	13.22	59.16	2.30	24.46	2.50		4.12	4.75	1.20		0.003	0.08		158.60
36	บริษัท โจนัน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด	9.54	5.36	5.25		1.15	0.92		0.09	1.80	0.50			0.01		24.62
37	บริษัท นิเด็ค ได-คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกั	216.00	5.64	4.96		102.36	45.12	82.38	1.80	42.52			1.80	0.10		502.68
38	บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์)จำกัด	7.63	0.12	3.68	0.30	187.32	0.58	0.50	0.19	6.90	1.30			0.08	44.75	253.35
39	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอน	15.26	8.21	31.91	0.43	0.02					0.11		0.002		26.40	82.34
40	บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	5.72				2.81					4.52					13.05
41	บริษัท แหลมฉบัง คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	6.00													45.87	51.87
42	บริษัท ไทย อิเคดะ คากินูมา จำกัด	212.00				52.27										264.27
43	บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซลเซอรี่ จำกัด	9.36														9.36
44	บริษัท ซีจิกาว่า (ประเทศไทย) จำกัด	1.25	1.25	1.25		3.50										7.24
45	บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำ	0.43				1.70	0.50	1.42	0.13	0.49						4.67
46	บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี. จำกัด	316.00	2.28			1,660.42	1.94							0.03	50.59	2,031.25
47	บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด	13.10	15.50	2.03		0.13	0.03								0.83	31.63
48	บริษัท เคียวริทซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด	2.07	0.92	1.00	0.03	36.92		2.20	0.36	0.89	0.13	0.03		0.07		44.62
49	บริษัท เอ็นทีพีที จำกัด	7.49				4.81		8.58	0.31			5.40	0.003	0.06	92.06	118.71
50	บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด	259.40	2.29	3.68	1.58	981.77		44.35	4.57	8.52		17.03	0.004	0.03	202.86	1,526.07

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3

แบบสรุปปริมาณของเสีย ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568

No.	รายชื่อโรงงาน	ปริมาณของเสีย (ตัน)														
		1.ขยะมูลฝอย	2.พลาสติก	3.กระดาษ	4.แก้ว	5.เศษโลหะ	6.ไม้	7.น้ำมันที่ใช้แล้ว	8.ภาชนะเปื้อนน้ำมัน	9.เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน	10. สารเคมีที่ใช้แล้ว	11. ถังสารเคมีที่ใช้แล้ว	12.ขยะจากห้องพยาบาล	13.ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่/หลอดไฟ	14.อื่น ๆ	รวม(ตัน)
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)																
51	บริษัท สยาม ริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด	2.54	2.54	2.54												7.62
52	บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา					90.89										90.89
53	บริษัท สยาม ไทเซอิ อินดัสตรี้ จำกัด	1.91	1.91	1.91						3.48						9.20
54	บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จ	1.91	0.44	15.40		0.42	1.14			0.63		0.08		0.02	40.31	60.35
55	บริษัท ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำ	7.61	0.60	0.75	0.30	164.09	1.08	0.80	0.03	4.84				0.02	9.75	189.87
56	บริษัท มัตสึโมโตะ โคซัน (ไทยแลนด์) จำกั	7.20				171.80	8.96								17.89	205.85
57	บริษัท เฮอิฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด	1.25	1.25	2.45		6.00	0.30	0.41		0.38						12.03
58	บริษัท นิฮอน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	8.20	0.64	0.46		27.07		3.20		1.44						41.01
59	บริษัท ที-พารากอน อินดัสเตรียล (ประเทศไ	6.80	0.59	1.12	1.13	8.34		18.33	0.04	0.67					5.91	42.93
60	บริษัท มารูเทค (ประเทศไทย) จำกัด	3.82				10.80		2.60		2.54						19.76
61	บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด	1.87														1.87
62	บริษัท ซีโก้ อิเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำ	108.00														108.00
63	บริษัท ทานิกาวา เซซากุโช (ประเทศไทย) จำกัด		16.47											0.004		16.47
รวม		**2,021.80**	**267.01**	**366.83**	**13.78**	**17,498.54**	**274.44**	**280.11**	**155.65**	**198.51**	**744.11**	**28.25**	**6.24**	**1.27**	**4,381.37**	**26,237.90**

หมายเหตุ : 1. เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ : ลำดับที่ 1 ขยะมูลฝอย

2. ขยะ/ของเสีย/เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการยื่นขอ Internet จากกรมโรงงาน : ลำดับที่ 2-14

ภาคผนวกที่ 27

ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest Form)
ของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0768-099081-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82240001825549

สถานที่ตั้งโรงงาน : 789/176 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ : [redacted] เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

พาหนะที่ใช้ : รถทั่วไป

ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Contaminated Fabric	150202	ถัง	3	849 kg 0.5
2	Contaminated Container	150110	ถัง	1	186 kg 0.5
3	Short Blas Sludge	120116	ถัง	2	735 kg 0.5
4	Paint Sludge	080113	ถัง	10	1480 kg 0.5

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 2 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

[redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 2 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 21/07/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 16.15 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted] ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

ที่ : 21/07/25

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : ชลบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 22/7/25

เวลาที่มาถึง : 05:30

ปริมาณที่รับมอบ : 2.95 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 21/7/25 เวลาที่มอบ : 12.11

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 2.95 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 24/7/25 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.47

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [signature] (รก) ลายมือชื่อ : วันที่ : 14/07/2025

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0968-033614-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82240001825549

สถานที่ตั้งโรงงาน : 789/176 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ : [redacted] เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

กทพพาหนะที่ใช้ : รถทั่วไป

ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Contaminated Fabric	150202	ถัง	3	590 kg. 0.01
2	Contaminated Container	150110	ถัง	1	80 kg. 0.01
3	Short Blas Sludge	120116	ถัง	2	830 kg. 0.1

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.12 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

[redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.12 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 09/09/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 13.40 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted] ต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] วันที่ : 9/9/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : [redacted] มายังจังหวัด : [redacted]

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 9/9/25

เวลาที่มาถึง : 14.22

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

[redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 1.5 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 09/09/25 เวลาที่มอบ : 14:40

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1.5 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 10/09/25 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 11:09

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 19/9/25

เลขที่อ้างอิง 1-20-1068-128417-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82240001825549

สถานที่ตั้งโรงงาน : 789/176 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

[redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Contaminated Fabric	150202	ถัง	3	440 kg 0.01
2	Contaminated Container	150110	ถัง	2	180 kg 0.01
3	Short Blas Sludge	120116	ถัง	2	630 kg 0.1
4	Paint Sludge	080113	ถัง	5	1370 kg 0.1

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.12 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0.1 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

[redacted] ตัน

ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.22 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 30/10/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 16.00 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted] ...างตน ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

วันที่ : 30/10/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด ชลบุรี มายังจังหวัด ชลบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 30/10/25

เวลาที่มาถึง : 17:00

[redacted] ...น

ปริมาณที่รับมอบ : 2.62 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 10/11/25 เวลาที่มอบ : 12:00

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 2.62 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 10/11/25 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 13:01

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับ[redacted]

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

เลขที่อ้างอิง 1-20-1068-005518-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82240001825549
สถานที่ตั้งโรงงาน : 789/176 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรติดต่อ : [redacted] เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
พาหนะที่ใช้ : รถทั่วไป
ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Contaminated Fabric	150202	ถัง	2	360 Kg. 0.01
2	Contaminated Container	150110	ถัง	1	230 Kg. 0.1
3	Short Blas Sludge	120116	ถัง	1	190 Kg. 0.01
4	Paint Sludge	080113	ถัง	1	210 Kg. 0.01

ปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.12 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0.01 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

[redacted]ตามข้างต้น
ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.13 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 02/10/2568
เวลาที่ส่งมอบ : 10.20 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
[redacted] วันที่ : 2/10/68
[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

[redacted]
ขนส่งจากจังหวัด ชลบุรี มายังจังหวัด ชลบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 2/10/2568
เวลาที่มาถึง : 11:14

[redacted]
ปริมาณที่รับมอบ : 0.99 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 02/10/68 เวลาที่มอบ : 12:40
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]
ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.99 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 06/10/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 12:58
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับ[redacted]
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-24-1268-047725-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82240001025546

สถานที่ตั้งโรงงาน : 789/172 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : [redacted] เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ฟิวชั่น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (กากฯ) : 10240001025501

สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 14 ถนน - ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Coolant oil	120109	Coolant oil	1	5.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 5 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 5 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 11/12/2568

เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง [redacted] วันที่ : 11/12/2025

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ฟิวชั่น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (กากฯ) : 10240001025501

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ใช้ระยะเวลา 1 วัน

วันที่มาถึง : 11/12/68

เวลาที่มาถึง : 12.33 น.

ส่วนที่ ๓/๒

จำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น [redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 11.88 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 11/12/68 เวลาที่มอบ : 13.10 น.

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว [redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.88 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 13/12/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 13.00 น.

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิ [redacted]

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-24-1168-113931-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82240001025546

สถานที่ตั้งโรงงาน : 789/172 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

[redacted]

ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ฟิวชั่น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10240001025501

สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 14 ถนน - ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Coolant oil	120109	-	1	10.0

รวมปริมาณทั้งหมด ของเหลว 10 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทะเบียนการ

[redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 10 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 26/11/2568

เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

[redacted]

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ฟิวชั่น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) 10240001025501

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด ฉะเชิงเทรา

ใช้ระยะเวลา 1 วัน

วันที่มาถึง : 26/11/68

เวลาที่มาถึง : 17.24 น.

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 12.03 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 26/11/68 เวลาที่มอบ : 18.00 น.

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 12.03 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 26/11/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 13.00 น.

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

[redacted]

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-24-1168-073012-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82240001025546

สถานที่ตั้งโรงงาน : 789/172 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

[redacted]

ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ บริษัท พีวะซั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10240001025501

สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 14 ถนน - ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Coolant oil	120109	Coolant oil	1	10.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 10 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

วรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

[redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 10 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 18/11/2568

เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

[redacted]

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท พีวะซั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10240001025501

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 18/11/68

เวลาที่มาถึง : 12.20 น.

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

[redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 12.41 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 18/11/68 เวลาที่มอบ : 12.40 น.

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 12.41 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 20/11/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 13.00 น.

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ภาคผนวกที่ 28

ผลการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา
และระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ. 2568

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6811568
Report No :6812-0408

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 1)
Sample Name : กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 27/11/2025 - 02/12/2025
Sample No : W 68111808
Sampling Date : 21/11/2025
Sampling Time : 9:13 AM
Received Date : 22/11/2025
Reported Date : 04/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 0.15	≥100
Chromium (Cr)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≥2500
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≥1000
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≥20

Physical Apperance : 1. Sample : Sludge (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Industry B.E. 2566 (2023) , regarding Waste or Unused Material Disposal, published in the Royal Government Gazette, Vol.140, Special Part 126D, date May 31, B.E.2566 (2023)
(TTLC : Total Threshold Limit Concentration)
2. Unit mg/kg (Wet weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
04/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
04/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6811568

Report No :6812-0409

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 1)	Sample No	: W 68111809
Sample Name	: กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา	Sampling Date	: 21/11/2025
Sampling By	: ETC	Sampling Time	: 9:13 AM
Sampling Method	: Grab	Received Date	: 22/11/2025
Tested Date	: 28/11/2025 - 02/12/2025	Reported Date	: 04/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cadmium	mg/L	Waste Extraction,ICP (US EPA. Method 1310A, 6010C)	< 0.02	≥1
Chromium	mg/L	Waste Extraction,ICP (US EPA. Method 1310A, 6010C)	0.03	≥5
Lead	mg/L	Waste Extraction,ICP (US EPA. Method 1310A, 6010C)	< 0.02	≥5
Mercury	mg/L	Waste Extraction,Cold - Vapor AAS (US EPA.Method 7471B)	< 0.0010	≥0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Sludge (brown)

2. Container : Bag

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Industry B.E. 2566 (2023), regarding Waste or Unused Material Disposal, published in the Royal Government Gazette, Vol.140, Special Part 126D, date May 31, B.E.2566 (2023)., STLC : Soluble Threshold Limit Concentration)

2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 6010C, 7471B (2007), 1310A.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
04/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
04/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6811568

Report No :6812-0410

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 1)	Sample No	: W 68111810
Sample Name	: กากตะกอนจากระบบบำบัด	Sampling Date	: 21/11/2025
Sampling By	: ETC	Sampling Time	: 9:08 AM
Sampling Method	: Grab	Received Date	: 22/11/2025
Tested Date	: 27/11/2025 - 03/12/2025	Reported Date	: 04/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	0.16	≥100
Chromium (Cr)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	19.4	≥2500
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	8.20	≥1000
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	0.21	≥20

Physical Apperance : 1. Sample : Sludge (black)

2. Container : Bag

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Industry B.E. 2566 (2023) , regarding Waste or Unused Material Disposal, published in the Royal Government Gazette, Vol.140, Special Part 126D, date May 31, B.E.2566 (2023)

(TTLC : Total Threshold Limit Concentration)

2. Unit mg/kg (Wet weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
04/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
04/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6811568

Report No :6812-0411

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 1)	Sample No	: W 68111811
Sample Name	: กากตะกอนจากระบบบำบัด	Sampling Date	: 21/11/2025
Sampling By	: ETC	Sampling Time	: 9:08 AM
Sampling Method	: Grab	Received Date	: 22/11/2025
Tested Date	: 28/11/2025 - 02/12/2025	Reported Date	: 04/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cadmium	mg/L	Waste Extraction,ICP (US EPA. Method 1310A, 6010C)	< 0.02	≥1
Chromium	mg/L	Waste Extraction,ICP (US EPA. Method 1310A, 6010C)	0.68	≥5
Lead	mg/L	Waste Extraction,ICP (US EPA. Method 1310A, 6010C)	0.06	≥5
Mercury	mg/L	Waste Extraction,Cold - Vapor AAS (US EPA.Method 7471B)	< 0.0010	≥0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Sludge (black)

2. Container : Bag

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Industry B.E. 2566 (2023), regarding Waste or Unused Material Disposal, published in the Royal Government Gazette, Vol.140, Special Part 126D, date May 31, B.E.2566 (2023)., STLC : Soluble Threshold Limit Concentration)

2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 6010C, 7471B (2007), 1310A.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
04/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
04/12/2025


REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 29

โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียของโครงการ

โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1,2 และ 3

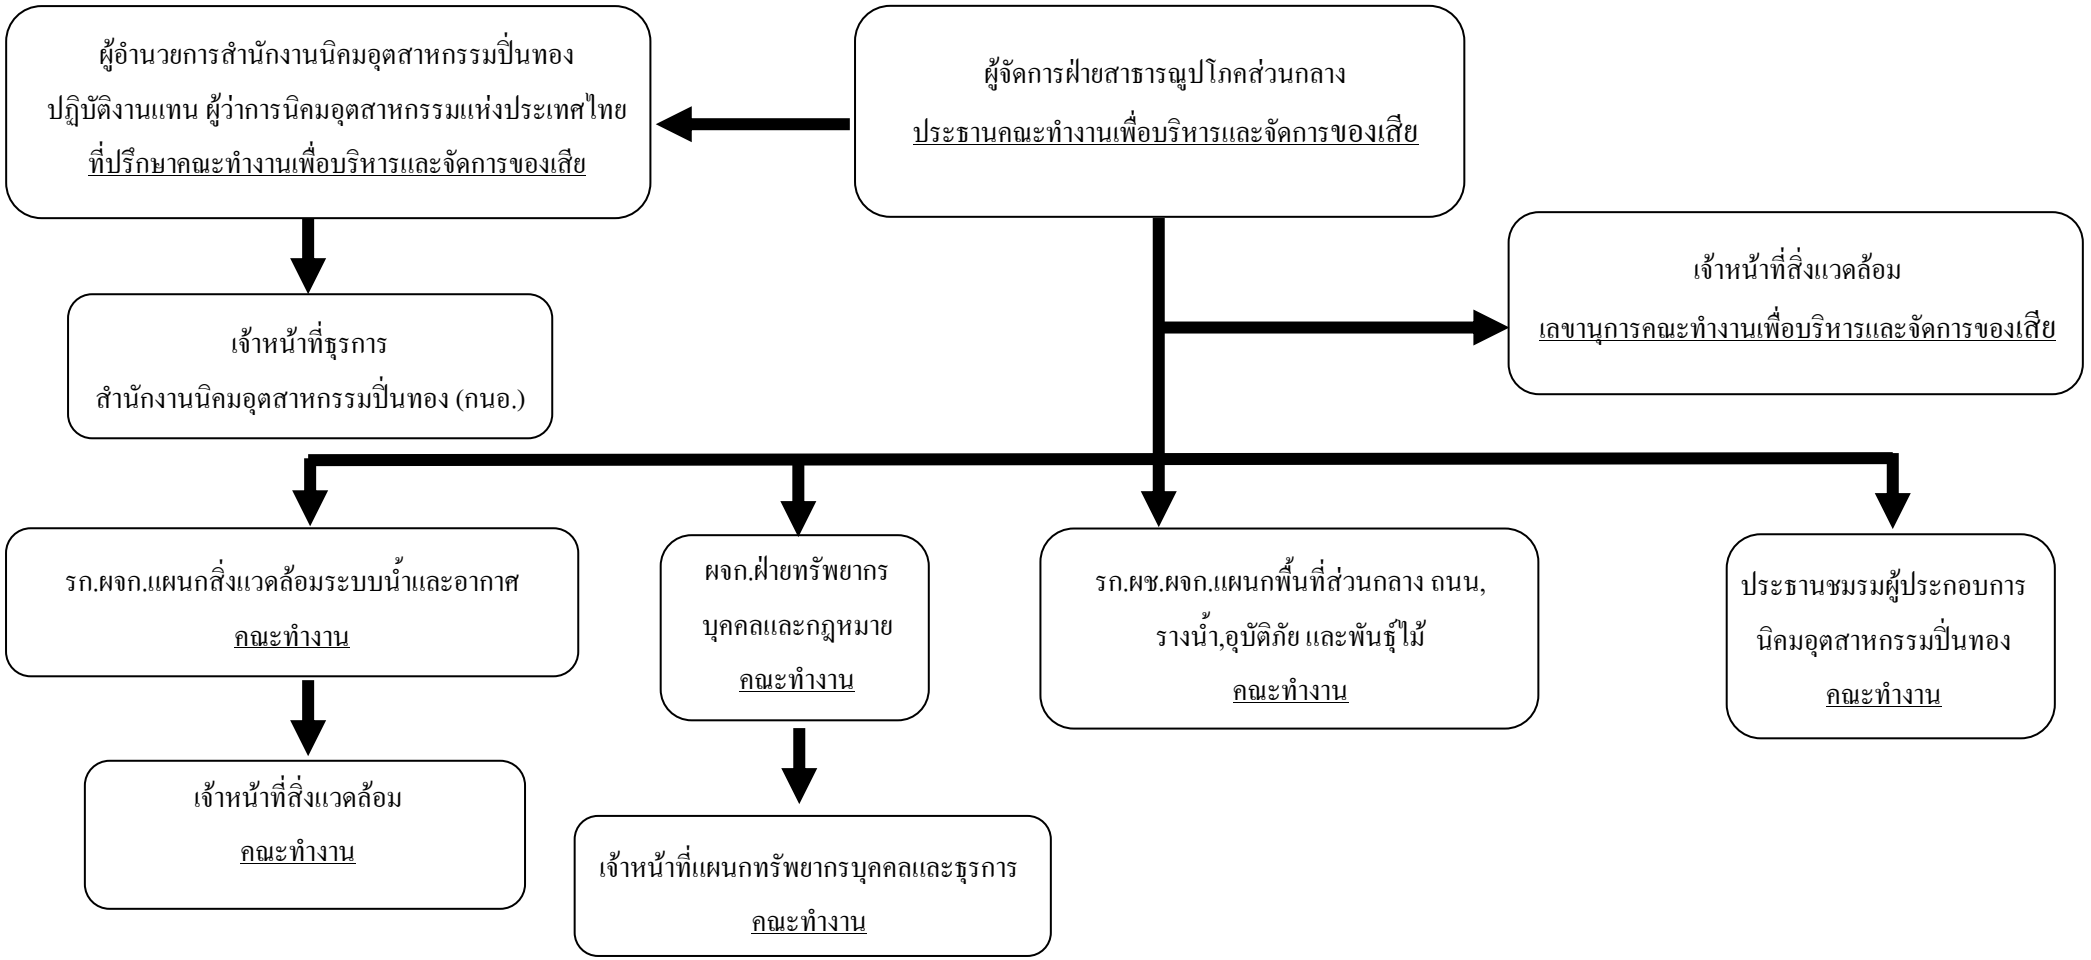

ภาคผนวกที่ 30

แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2569

แผนการดำเนินงาน CSR&ECO (ภายใต้ESG) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ปี 2569

ที่	รายการ		2569											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	หัวข้อ	โครงการ	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ด้านที่ 1 Environmental (สิ่งแวดล้อม)														
1	การขอรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (CarbonFootPrint) +ISO14064-1	1-6												
2	โครงการT-VER นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	1-5												
3	การประชุม EIA Monitoring จำนวน 2/ปี	1-6												
4	โครงการ Green Area Plus/ พื้นที่สาธารณประโยชน์ รอบนิคมฯปิ่นทอง จำนวน 2 ครั้ง/ปี	1-6												
5	กิจกรรมธงขาวดาวเขียว จำนวน 4 ครั้ง/ปี	1-5												
6	การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG	1-5												
7	โครงการเครือข่ายสีเขียว (Eco Green network)	1-6												
8	โครงการเปิดบ้านรอบรั้วสีเขียว (ความสัมพันธ์ชุมชน)	1-6												
ด้านที่ 2 Social (สังคม)														
	โรงเรียน													
1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สนับสนุนและซื้อของขวัญปี 2569)	1-6												
2	กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา/อุปกรณ์การเรียน/ปรับภูมิทัศน์ ทาสีรั้ว พื้นBBL	1-6												
3	โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO)	1-5												
4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตร (Green School)	5,7												
	ชุมชน/หน่วยงานราชการ/อื่นๆ													
5	วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	1-6												
6	วันลอยกระทง/ประเพณีวิ่งควาย/ประเพณีเผาข้าวหลาม/หรืออื่นๆ	1-6												
7	วันสำคัญทางราชการ/วันเฉลิมพระชนมพรรษา/หรืออื่น ๆ	1-6												
8	กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน/หน่วยงานราชการ/การกุศลต่างๆ	1-6												
9	โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1-6												
10	เทศบาลเคลื่อนที่ (เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี)	1-5												
11	โครงการผู้ป่วยติดเตียง/โครงการคลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง/โครงการผู้ยากไร้/ถุงยังชีพ/รพ.สต.	1-6												
12	โครงการวิสาหกิจชุมชนและแหล่งการเรียนรู้ /อบรมอาชีพชุมชน/การแปรรูปสร้างรายได้	1-6												
13	โครการชุมชนเชิงนิเวศ (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO)	1-5												
14	โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติ/อุทกภัย	1-6												
	ศาสนา/วัด													
15	โครงการกฐินสามัคคี	1-6												
16	วันสำคัญทางศาสนา/เข้าพรรษา/ออกพรรษา/กิจกรรมของวัด	1-6												
	โรงงาน/อื่นๆ													
17	โครงการบริจาคโลหิต 4 ครั้ง/ปี	1-5												
18	ประชุมผู้ประกอบการ	1-5												
19	โครงการกีฬาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ/ฟุตบอลคัพการกุศล/กอล์ฟการกุศล	1-6												
ด้านที่ 3 Governance (ธรรมาภิบาล)														
1	แรงงานสัมพันธ์ / สมาคมHR	1-5												
2	กาชาดประจำปี/จังหวัด/กนอ/หน่วยงานราชการ	1-5												
3	โครงการ Happy Workplace	1-5												
4	โครงการ ปลูกฝังพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	1-5												
5	สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพ (สสป.)	1-5												
6	PINTHONG RUN	1-6												
