ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข.1

เอกสารแจ้งขอเชื่อมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)

บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่ม ปตท.
บมจ. เลขที่ 0107548000668
สำนักงานใหญ่ : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 15-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2265-8400 โทรสาร +66 (0) 2265-8500
สำนักงานระยอง : 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66 (0) 3899-4000 โทรสาร +66 (0) 3899-4111

ที่ อรค- 925 / 2554

19 พฤษภาคม 2554

เรื่อง แจ้งส่งสัญญาณ CEMs เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs)

บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งส่งสัญญาณ CEMs เพิ่มเติมในช่องสัญญาณที่ 35, 36, 58 และ 59 ซึ่งมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ESH. Services 1
โทร. 0-3899-4000 ต่อ 5730,5732

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บมจ. เลขที่ 0107554000267
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66(0)2265-8400
โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3899-4000
โทรสาร +66(0)3899-4111

ที่ PTTGC-Q-SH - 554 / 2556

17 ธันวาคม 2556

เรื่อง แจ้งส่งสัญญาณระบบ CEMs เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 สาขาโรงไอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง ขอแจ้งส่งสัญญาณระบบ CEMS เพิ่มเติมในช่องสัญญาณที่ 55, 56 และ 57 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการส่วน หน่วยงาน SHE-Olefins I

[redacted]

17/12/56

หน่วยงาน SHE-Olefins I
โทร. 0-3899-4000 ต่อ 5730, 5441

แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs)

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงงาน บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนไอ-หนึ่ง เลขทะเบียน น.42(1)-27/2535-ญนพ.
ประกอบกิจการ ผลิตเอทิลีน, โพรพิลีน, เอทิลีน, ไฟฟ้า, ไอน้ำ และโรงบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้ง เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

สาขาถนนไอ-สี เลขทะเบียน น.42(1)-10/2536-ญนพ.
ประกอบกิจการ ผลิตเอทิลีน, โพรพิลีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถนนไอ-สี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

ชื่อโรงงาน บริษัท พีโอซี ไกลคอล จำกัด
เลขทะเบียน น. 42(1)-3/2547-ญตอ.
ประกอบกิจการ ผลิตเอทิลีนอ็อกไซด์และเอทิลีนไกลคอล
ที่ตั้ง เลขที่ 9 ซอย จี 12 นิคมเหมราชตะวันออก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

2. ข้อมูลเครื่องมือวัด (Sensor)

เครื่องมือ				ยี่ห้อ/รุ่น	ช่วงการตรวจวัด	หน่วย	เลขช่องสัญญาณ	หมายเหตุ
Parameter	Tag Name	Plant	Desciption					
							52	
							53	
COD Plant I-1	COD Plant I-1	Plant I-1	Waste Water Treatment	UVAS with SC100	0-120	ppm	54	
							55	
							56	
							57	
NOx @ 7% O2	H-3707	Plant I-1	Aux boiler #2(H-3707)	Environment S.A. / MIR-9000 CLD	0 - 100 ppm	ppm @ 7% O_2	58	
NOx @ 7% O2	H-3706	Plant I-1	Aux boiler #1(H-3706)	Environment S.A. / MIR-9000 CLD	0 - 100 ppm	ppm @ 7% O_2	59	
NOx @ 7% O2	H-3705	Plant I-1	HRSG II (H-3705)	SIEMENS/Ultramat23	0-200	ppm @ 7% O_2	60	
NOx @ 7% O2	H-3704	Plant I-1	HRSG I (H-3704)	SIEMENS/Ultramat23	0-200	ppm @ 7% O_2	61	
NOx @ 7% O2	H-3703	Plant I-1	WHSB II (H-3703)	SIEMENS/Ultramat23	0-200	ppm @ 7% O_2	62	
NOx @ 7% O2	H-3702	Plant I-1	FSB (H-3702)	SIEMENS/Ultramat23	0-200	ppm @ 7% O_2	63	ยกเลิก
NOx @ 7% O2	H-3701	Plant I-1	WHSB I (H-3701)	SIEMENS/Ultramat23	0-200	ppm @ 7% O_2	64	

แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs)

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนไอ-หนึ่ง เลขทะเบียน น.42(1)-27/2535-ญนพ.
ประกอบกิจการ ผลิตเอทิลีน, โพรพิลีน, เอทิลีน, ไฟฟ้า, ไอน้ำ และโรงบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้ง เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

2. ข้อมูลเครื่องมือวัด (Sensor)

เครื่องมือ				ยี่ห้อ/รุ่น	ช่วงการตรวจวัด	หน่วย	เลขช่องสัญญาณ	หมายเหตุ	ค่าควบคุม EIA
Parameter	Tag Name	Plant	Desciption						
NOx @ 7% O2	H-3710-Nox @ 7%	Plant I-1	HRSG #3 (H-3710)	Environment S.A. / MIR-9000 CLD	0-200 ppm	ppm@@ 7% O2	55		18
NOx @ 7% O2	H-3709-Nox @ 7%	Plant I-1	HRSG #2 (H-3709)	Environment S.A. / MIR-9000 CLD	0-200 ppm	ppm@@ 7% O3	56		18
NOx @ 7% O2	H-3708-Nox @ 7%	Plant I-1	HRSG #1 (H-3708)	Environment S.A. / MIR-9000 CLD	0-200 ppm	ppm@@ 7% O4	57		18

3. ข้อมูลระบบรับ/ส่งข้อมูล
ระบบส่งข้อมูลเป็นแบบ Internet IP Address 61.19.88.235:2100 Modem เบอร์โทร Line Internet Back up
Logger:ยี่ห้อ Envitech รุ่น EnvidasFW Logger ID no. 16

4. ข้อมูลเพื่อการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉิน
4.1 ชื่อผู้จัดการโรงงาน [redacted]
โทรศัพท์ Mobile - E-mail suvit.t@pttgcgroup.com

4.2 ชื่อผู้ควบคุมระบบ CEMs [redacted] ตำแหน่ง วิศวกร
โทรศัพท์ Mobile 087-2512324 E-mail narathip.r@pttgcgroup.com

PTT Global Chemical Public Company Limited
Head Office : 555/1 Energy Complex, Building A, 14th-18th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand. Tel : +66(0)2265-8400 Fax : +66(0)2265-8500
Rayong Office : 59 Ratniyom Road, Noenphra, Mueang Rayong, Rayong 21150 Thailand. Tel : +66(0)3899-4000 Fax : +66(0)3899-4111
Registration No. 0107554000267

ที่ 25-U-P1 001/2565

11 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เอกสารแนบ 1) แบบฟอร์มยืนยันค่าการตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMs Online)
2) หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยายครั้งที่ 3) ในการขออนุญาตติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GTG) จำนวน 1 ชุด (ทดแทนเครื่องเดิม) และติดตั้งหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จำนวน 1 ชุด (ทดแทนเครื่องเดิม) จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่องเพิ่มเติมที่ปล่อง H-3711 ซึ่งอ้างอิงอัตราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากปล่องระบายอากาศตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยายครั้งที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GTG) และหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) แล้วเสร็จ จึงขออนุญาตเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ H-3711 รายละเอียดการเชื่อมต่อตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่าย
หน่วยงานผลิตสาธารณูปโภค 1
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รับแล้ว
12 JAN 2022
[redacted]

หน่วยงาน SHE - Utilities
โทร. (038) 972074

PTT Global Chemical Public Company Limited
Head Office : 555/1 Energy Complex, Building A, 14th-18th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand. Tel : +66(0)2265-8400 Fax : +66(0)2265-8500
Rayong Office : 59 Ratniyom Road, Noenphra, Mueang Rayong, Rayong 21150 Thailand. Tel : +66(0)3899-4000 Fax : +66(0)3899-4111
Registration No. 0107554000267

ที่ 25-U-P1 001/2565

11 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เอกสารแนบ 1) แบบฟอร์มยืนยันค่าการตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMs Online)
2) หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยายครั้งที่ 3) ในการขออนุญาตติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GTG) จำนวน 1 ชุด (ทดแทนเครื่องเดิม) และติดตั้งหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จำนวน 1 ชุด (ทดแทนเครื่องเดิม) จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่องเพิ่มเติมที่ปล่อง H-3711 ซึ่งอ้างอิงอัตราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากปล่องระบายอากาศตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยายครั้งที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GTG) และหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) แล้วเสร็จ จึงขออนุญาตเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ H-3711 รายละเอียดการเชื่อมต่อตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่าย
หน่วยงานผลิตสาธารณูปโภค 1
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน SHE - Utilities
โทร. (038) 972074

ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	- ความเร็วของก๊าซที่ระบายออก - อุณหภูมิของก๊าซที่ระบายออก - ออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)	- NOx ตรวจวัดโดย Instrumental Reference Method และวิเคราะห์ด้วย Chemiluminescence / U.S. EPA Method 7E - TSP ตรวจวัดโดย Isokinetic Stack Sampling Technique และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method/ U.S. EPA Method 5 - SO_2 ตรวจวัดโดย Instrumental Reference Method และวิเคราะห์ด้วยวิธี UV Fluorescence/ U.S.EPA Method 6C หรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- ปล่อง H-3701 และปล่อง H-3703 ถึง H-3711 ดังนี้ (รูปที่ 1) * ปล่อง H-3701 รับก๊าซระบายจาก HRSG#1 * ปล่อง H-3703 รับก๊าซระบายจาก HRSG#2 * ปล่อง H-3704 รับก๊าซระบายจาก HRSG#3 * ปล่อง H-3705 รับก๊าซระบายจาก HRSG#4 * ปล่อง H-3706 รับก๊าซระบายจาก Aux. Boiler#1 * ปล่อง H-3707 รับก๊าซระบายจาก Aux. Boiler#2 * ปล่อง H-3708 รับก๊าซระบายจาก HRSG#5	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	PTTGC

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวิรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			* ปล่อง H-3709 รับก๊าซระบายจาก HRSG#6 * ปล่อง H-3710 รับก๊าซระบายจาก HRSG#7 * ปล่อง H-3711 รับก๊าซระบายจาก HRSG#8		
1.2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบ CEMS	- ออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)	- ใช้วิธีการตามข้อกำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	- 1 ปล่อง ต่อ CEMS 1 ชุด ได้แก่ * ปล่อง H-3701 ปล่อง H-3703 ถึง H-3705, ปล่อง H-3710 และ ปล่อง H-3711 - 2 ปล่อง ต่อ CEMS 1 ชุด ได้แก่ * ปล่อง H-3706 และ H-3707 * ปล่อง H-3708 และ H-3709	- ตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC^2) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และส่งผลที่ตรวจวัดได้จากระบบ CEMS รายชั่วโมง (CD-ROM) ให้ กนอ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยแนบไปพร้อมรายงานการตรวจติดตามฯ ทุก ๆ 6 เดือน	PTTGC

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวิรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS)		- ตรวจสอบด้วยวิธี Relative Test Audit (RATA)	- ขุด CEMS ของปล่อง H-3701 และปล่อง H-3703 ถึง H-3711	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด	PTTGC
1.4 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ตรวจวัดเฉพาะจุดที่ 3 และ 4) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ตรวจวัดเฉพาะจุดที่ 3 และ 4) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ตรวจวัดเฉพาะจุดที่ 3 และ 4)	- NOx ตรวจวัดโดย Instrumental Reference Method และวิเคราะห์ด้วยวิธี Chemiluminescence - TSP ตรวจวัดโดย Hi-Volume Air Sampler และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method - PM-10 ตรวจวัดโดย PM-10 Cutsize Inlet/ Hi-Volume Air Sampler และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method - SO_2 ตรวจวัดโดย Instrumental Reference Method และวิเคราะห์ด้วยวิธี UV Fluorescence หรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- จุดที่ 1 : ขอบเขตรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (A1) - จุดที่ 2 : บริเวณหน่วยดับเพลิงของโครงการหรือขอบเขตรั้วด้านทิศใต้ (A2) - จุดที่ 3 : บริเวณบ้านมาบชลูด (A3) - จุดที่ 4 : บริเวณบ้านหนองแฟบ (A4) (รูปที่ 2)	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด)	PTTGC

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายวิรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....
(นางสาวขนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง	- ระดับเสียง Leq 24 hr - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด (Lmax)	- ตรวจวัดด้วย Sound Pressure Level Meter	- จุดที่ 1 : ริมรั้วด้านทิศเหนือของบริษัทฯ (N1) - จุดที่ 2 : ริมรั้วด้านทิศใต้ของบริษัทฯ (N2) (รูปที่ 2)	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุด)	PTTGC
3. คุณภาพน้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ค่าบีโอดี (BOD_5) - ค่าซีโอดี (COD) - ฟีนอล (Phenol)	- pH : ใช้ pH Meter ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 หน่วย - Temperature : ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิขณะเก็บตัวอย่าง - TDS : ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว และอบแห้งที่ 180 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 1 ชั่วโมง - SS : ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว และอบแห้งที่ 103 - 105 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 1 ชั่วโมง	- จุดที่ 1 : ก่อนปล่อยลงสู่ทางคลองระบายน้ำทิ้งของนิคมฯ (Final Check Basin) (W1) (รูปที่ 4 และรูปที่ 5) - จุดที่ 2 : คลองระบายน้ำทิ้งของนิคมฯ ก่อนจุดปล่อยน้ำของโรงโอเลฟินส์ (W2) (รูปที่ 5) - จุดที่ 3 : คลองระบายน้ำทิ้งของนิคมฯ หลังจุดปล่อยน้ำของโรงโอเลฟินส์ (W3) (รูปที่ 5)	- เดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	PTTGC

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายวิรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....
(นางสาวขนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- Grease&Oil : ใช้วิธีสกัดด้วยเทคนิค Soxhlet Extraction ด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันและไขมัน - BOD_5 : ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธี Azide Modification หรือ Membrane Electrode - COD : ใช้วิธีย่อยสลายโดยใช้ Potassium Dichromate - Phenol : ใช้การกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธี Colorimetric Method หรือใช้วิธีการตามข้อกำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง			
	- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	- รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	- หอหล่อเย็นของโครงการ	- ทุกวัน	PTTGC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTT Global Chemical Public Company Limited

ลงชื่อ.....
(นายวีรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คมนาคม	- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโครงการ	- การบันทึก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	PTTGC
5. กากของเสีย	- ชนิด - ปริมาณ - การจัดการของเสีย ที่พื้นที่โครงการ	- การบันทึก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	PTTGC
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6.1 ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน	- ระดับเสียง Leq 12 hr - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ตรวจวัดด้วย Sound Pressure Level Meter	- Air Intake - Turbine	- ปีละ 4 ครั้ง	PTTGC
6.2 ตรวจสุขภาพพนักงาน	- การตรวจสุขภาพทั่วไป * ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Examination) - การตรวจสุขภาพตามลักษณะงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ * การทดสอบการได้ยิน	- ตรวจโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง จากกรมการแพทย์ และอยู่ในการ พิจารณาของแพทย์แผนปัจจุบันขั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด	- พนักงานทุกคน - สุ่มตรวจพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้เคียงบริเวณที่มีเสียงดัง	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หลังจากนั้นตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	PTTGC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTT Global Chemical Public Company Limited

ลงชื่อ.....
(นายวีรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6.3 บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน	- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ - ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - สภาพการเสียหาย/สูญเสีย - การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ - รายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามแบบ จป.(ว) (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)	- การจดบันทึก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ	PTTGC
6.4 รวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วย และการตรวจสุขภาพประจำปี	- สถิติสภาวะการเจ็บป่วย - ผลการตรวจสุขภาพประจำปี	- การรวบรวมและบันทึกข้อมูล	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	PTTGC
7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ รวมทั้งผลการสอบสวนสาเหตุ และการดำเนินงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวจนได้ข้อยุติ และนำ เสนอในรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบปีละ 1 ครั้ง	- การจดบันทึก	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- รายงานปีละ 1 ครั้ง	PTTGC

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายวิรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือน ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า	- การสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม	- ชุมชนในพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการและชุมชนที่มีการเก็บตัวอย่างดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (รูปที่ 7)	- รายงานปีละ 1 ครั้ง	PTTGC
8. สุนทรียภาพ	- ขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ และสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการ	- การสำรวจและตรวจสอบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	PTTGC

หมายเหตุ : PTTGC = บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2561

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายวิรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2-1
รายละเอียดการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการภายหลังขยาย

กรณีเดินเครื่องรูปแบบที่ 1: เดินเครื่อง GTG-A และ GTG-B ที่ปล่อง H-3701 กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 352.5 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำสูงสุด 1,100 ตัน/ชั่วโมง

ชื่อปล่อง	ตำแหน่งปล่อง		ก๊าซจาก	การควบคุม	รายละเอียดปล่อง		ลักษณะก๊าซที่ระบาย			% Excess O_2	ความเข้มข้น NOx ที่ Actual % Excess Oxygen[1/]		ความเข้มข้น NOx ที่ 7 % Excess Oxygen[2/]		อัตราการระบาย NOx (g/s)
	E	N	GTG		ความสูง (m)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (m)	อุณหภูมิ (K)	ความเร็ว (m/s)	อัตราการไหล (m^3/s)		(mg/m^3)	(ppm)	(mg/Nm^3)	(ppm)	
1 H-3701	732789	1404807	A B	Steam Injection	30	4.20	442	19.12	178.7	16.0	81	43.0	230	122	14.47
2 H-3703	732861	1404775	C	Steam Injection	30	4.20	442	11.60	108.4	16.0	71	38.0	203	108	7.74
3 H-3704	732500	1404829	D	Dry Low NOx Burner	30	3.60	379	13.69	109.5	14.7	11	6.1	26	14	1.26
4 H-3705	732500	1404844	E	Dry Low Nox Burner	30	3.60	379	13.69	109.5	14.7	11	6.1	26	14	1.26
5 H-3706	732562	1406231	Aux. Boiler #1	Low Nox Burner wze FGR	35	1.8	471	10.5	16.9	3.0	89	47.2	69	37	1.50
6 H-3707	732562	1406298	Aux Boiler #2	Low Nox Burner wze FGR	35	1.8	471	10.5	16.9	3.0	89	47.2	69	37	1.50
7 H-3708	732659	1406270	F	Steam Injection + SCR	35	3.26	399.2	17.1	106.9	11.3	23	12.3	33	18	2.44
8 H-3709	732615	1406270	G	Steam Injection + SCR	35	3.26	399.2	17.1	106.9	11.3	23	12.3	33	18	2.44
9 H-3710	732703	1406270	H	Steam Injection + SCR	35	3.26	399.2	17.1	106.9	11.3	23	12.3	33	18	2.44
10 H-3711	732736	1406273	I	Dry Low NOx Burner + SCR	35	3.26	399.2	22.2	138.5	11.3	18	9.4	26	14	2.44
อัตราการระบายรวม															37.49
หมายเหตุ - อัตราการระบายสูงสุด (ตาม EIA ฉบับปี 2559)															43.79
- ปริมาณอัตราการระบายเฉลี่ยในแต่ละวันปี (ระยะนำไปใช้เดินเครื่อง GTG-H)															8.74
- ปริมาณอัตราการระบายเฉลี่ยรายเดือน 80:20															1.75
- ปริมาณอัตราการระบายเฉลี่ย ประเภทสัดส่วนในแต่ละเดือน 80:20															6.99
* ปริมาณอัตราการระบายที่ใช้ในโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณของ GTG)															2.44
* ปริมาณอัตราการระบายที่สำหรับโครงการนี้															4.55

กรณีเดินเครื่องรูปแบบที่ 2: เดินเครื่อง GTG-B และ GTG-C ที่ปล่อง H-3703 กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 352.5 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำสูงสุด 1,060 ตัน/ชั่วโมง

ชื่อปล่อง	ตำแหน่งปล่อง		ก๊าซจาก	การควบคุม	รายละเอียดปล่อง		ลักษณะก๊าซที่ระบาย			% Excess O_2	ความเข้มข้น NOx ที่ Actual % Excess Oxygen[1/]		ความเข้มข้น NOx ที่ 7 % Excess Oxygen[2/]		อัตราการระบาย NOx (g/s)
	E	N	GTG		ความสูง (m)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (m)	อุณหภูมิ (K)	ความเร็ว (m/s)	อัตราการไหล (m^3/s)		(mg/m^3)	(ppm)	(mg/Nm^3)	(ppm)	
1 H-3701	732789	1404807	A	Steam Injection	30	4.20	442	10.60	93.6	16.0	72	38.2	204	108	6.72
2 H-3703	732861	1404775	B C	Steam Injection	30	4.20	442	19.14	178.8	16.0	81	43.0	230	122	14.46
3 H-3704	732500	1404829	D	Dry Low NOx Burner	30	3.60	379	13.69	109.5	14.7	11	6.1	26	14	1.26
4 H-3705	732500	1404844	E	Dry Low NOx Burner	30	3.60	379	13.69	109.5	14.7	11	6.1	26	14	1.26
5 H-3706	732562	1406231	Aux. Boiler #1	Low NOx Burner wze FGR	35	1.8	471	10.5	16.9	3.0	89	47.2	69	37	1.50
6 H-3707	732562	1406298	Aux. Boiler #2	Low NOx Burner wze FGR	35	1.8	471	10.5	16.9	3.0	89	47.2	69	37	1.50
7 H-3708	732659	1406270	F	Steam Injection + SCR	35	3.26	399.2	17.1	106.9	11.3	23	12.3	33	18	2.44
8 H-3709	732615	1406270	G	Steam Injection + SCR	35	3.26	399.2	17.1	106.9	11.3	23	12.3	33	18	2.44
9 H-3710	732703	1406270	H	Steam Injection + SCR	35	3.26	399.2	17.1	106.9	11.3	23	12.3	33	18	2.44
10 H-3711	732736	1406273	I	Dry Low NOx Burner + SCR	35	3.26	399.2	22.2	138.5	11.3	18	9.4	26	14	2.44
อัตราการระบายรวม															36.46

หมายเหตุ * ที่ความสูงจริง
** ที่ความสูงมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (Dry Basis)

ที่มา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), 2561

ลงชื่อ.....
(นายวิรัช บุญบำรุงชัย)
ผู้อำนวยการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวจันษฐา พักษิณ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล ศรีหมดสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2561

แบบฟอร์มยืนยันค่าการตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMs Online)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงงาน.....บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน).....สาขา ถนนไอ-หนึ่ง.....เลขทะเบียน.....น.42(1)-27/2535-ญนพ.....

ประกอบกิจการ.....ผลิตเอทิลีน, โพรพิลีน, เอทิลีน, ไฟฟ้า, ไอน้ำ และโรงบำบัดน้ำเสีย.....

ประเภทของเชื้อเพลิง .....Fuel Gas, Fuel Oil, Natural gas.....

ที่ตั้ง เลขที่.....14.....หมู่.....ซอย.....ถนน.....ไอ-หนึ่ง.....ตำบล.....มาบตาพุด.....

อำเภอ.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....ระยอง.....ไปรษณีย์.....21150.....

2. ข้อมูลของการติดตั้งระบบ CEMs

2.1 จำนวนปล่องรวมที่ต้องติดตั้ง จำนวน.....10.....ปล่อง

2.2 จำนวนปล่องรวมที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน.....10.....ปล่อง

หมายเหตุ

1. ชนิดของปล่องระบายตามตารางที่ 1 โปรดระบุ S, M, COM รายละเอียดดังนี้

- S หมายถึง Single Stack เป็นปล่อง 1 ปล่องที่ใช้สำหรับระบายอากาศเสียจากการผลิต 1 หน่วยเท่านั้น

- M หมายถึง Multiple Stack เป็นปล่องมากกว่า 1 ปล่องที่ใช้สำหรับระบายอากาศเสียจากการผลิต 1 หน่วย

- COM หมายถึง Common Stack เป็นปล่อง 1 ปล่องที่ใช้สำหรับระบายอากาศเสียจากการผลิตมากกว่า 1 หน่วย

2. ข้อกำหนดในการติดตั้งตามตารางที่ 1 กรณีที่ติดตั้งตามประกาศ อก. โปรดระบุลำดับที่ ( ) รายละเอียดตามข้อ2 ของประกาศ

ตารางที่ 1 ข้อมูลโรงงานในการติดตั้งCEMs

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการผลิต	ชื่อปล่อง	ชนิดปล่อง	ข้อกำหนดในการติดตั้ง			การดำเนินการ	
				EIA	ประกาศ อก. ลำดับ	สมัครใจ	ติดตั้งแล้ว	ยังไม่ติดตั้ง
1	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3701	COM	✓			✓	
2	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3703	COM	✓			✓	
3	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3704	S	✓			✓	
4	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3705	S	✓			✓	
5	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3706	S	✓			✓	
6	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3707	S	✓			✓	
7	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3708	S	✓			✓	
8	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3709	S	✓			✓	
9	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3710	S	✓			✓	
10	หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	H-3711	S	✓			✓	

3. ข้อมูลของเครื่องมือที่ทำการตรวจวัดและส่งมาที่ศูนย์เฝ้าระวังฯ

ตารางที่ 2 ข้อมูลของเครื่องมือ

<u>การเดินเครื่องรูปแบบที่ 1</u>

ลำดับที่	*พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	*หน่วย	*ช่วงการวัด	ค่าควบคุม(EIA)	ชื่อปล่อง	ความกว้างปล่อง	ความสูงของปล่อง	*เลขช่องสัญญาณ	พิกัดของปล่อง
1	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	122	H-3701	4.2	30	64	N1404807 E732780
2	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	108	H-3703	4.2	30	62	N1404775 E732861
3	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	14	H-3704	3.6	30	61	N1404829 E732500
4	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	14	H-3705	3.6	30	60	N1404849 E732500
5	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-100	37	H-3706	1.8	35	59	N1405231 E732562
6	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-100	37	H-3707	1.8	35	58	N1405298 E732562
7	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	18	H-3708	3.26	35	57	N1405270 E732459
8	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	18	H-3709	3.26	35	56	N1405270 E732615
9	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	18	H-3710	3.26	35	55	N1405270 E732703
10	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	14	H-3711	3.26	35	51	N 1405273 E732736

การเดินเครื่องรูปแบบที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลของเครื่องมือ

ลำดับที่	*พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	*หน่วย	*ช่วงการวัด	ค่าควบคุม(EIA)	ชื่อปล่อง	ความกว้างปล่อง	ความสูงของปล่อง	*เลขช่องสัญญาณ	พิกัดของปล่อง
1	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	108	H-3701	4.2	30	64	N1404807 E732780
2	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	122	H-3703	4.2	30	62	N1404775 E732861
3	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	14	H-3704	3.6	30	61	N1404829 E732500
4	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	14	H-3705	3.6	30	60	N1404849 E732500
5	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-100	37	H-3706	1.8	35	59	N1405231 E732562
6	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-100	37	H-3707	1.8	35	58	N1405298 E732562
7	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	18	H-3708	3.26	35	57	N1405270 E732459
8	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	18	H-3709	3.26	35	56	N1405270 E732615
9	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	18	H-3710	3.26	35	55	N1405270 E732703
10	NOx @ 7% O2	ppm @ 7% O2	0-200	14	H-3711	3.26	35	51	N 1405273 E732736

4. ข้อมูลระบบรับ/ส่งข้อมูล

ระบบส่งข้อมูลเป็นแบบ Intern☐IP Address ..... Domaimname (DNS) ....CEMS.PTTG@GROUP.COM.... สำคัญ Port Number....2107.....

Logger: ยี่ห้อ .....Envitech..... รุ่น.....Envidas ULTIMATE..... Logger ID no..5....

4. ข้อมูลเพื่อการติดต่อประสานงาน

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน [redacted] ตำแหน่ง .....วิศวกร..... ประสงค์จะรับ ☑ Email

โทรศัพท์ [redacted] Alert แบบ ☐ SMS

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน [redacted] ตำแหน่ง .....วิศวกร..... ประสงค์จะรับ ☑ Email

โทรศัพท์ [redacted] Alert แบบ ☐ SMS

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ..... ตำแหน่ง ..... ประสงค์จะรับ ☑ Email

โทรศัพท์ ..... Mobile .....Email..... Alert แบบ ☐ SMS

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ..... ตำแหน่ง ..... ประสงค์จะรับ ☐ Email

โทรศัพท์ ..... Mobile .....Email..... Alert แบบ ☐ SMS

หมายเหตุ : SMS สามารถรับได้สูงสุดสองหมายเลข

ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้รายงาน

( )

วันที่ ..... ๑๓ ม.ค. ๖๕ .....

ภาคผนวก ข.2

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (HAZOP)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2552)

โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยายครั้งที่ 3)

(EPS Expansion Phase 3 Project)

โรงงาน : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส์

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 14 ถนน ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต. มาบตาพุด
อ. เมือง จ. ระยอง 21150

บทที่ 12
บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงภายในโรงงาน

จากการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานในโรงงานของ PTTGC เพื่อควบคุมอันตรายให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1) ระบบการจัดการ (Management System)

PTTGC มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งผสมผสานเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมเรียกว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ระบบการจัดการ SHE) ระบบการจัดการดังกล่าวยึดถือและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

- มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001
- มาตรฐานระบบการจัดการ SHE ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTTGC
- แนวทางการดำเนินงาน (Code of Management Practice) ของโครงการ "B-CAREs"
- ระบบการจัดการ Process Safety Management (PSM)

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ แบบบูรณาการ (Integrated Management System: IMS) ซึ่งครอบคลุมทุกระบบขององค์กรได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มอก. 18001-2542 และ BS OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

การดำเนินงานด้วยระบบการจัดการ SHE ตามมาตรฐานดังกล่าว ดังกล่าวโดยจัดให้มีการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยให้ PTTGC มีความมั่นใจว่าอันตราย ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงกลั่นน้ำมันได้รับการชี้บ่ง ประเมิน วิเคราะห์ และควบคุมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2) สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาโรงโอเลฟินส์ มีการดำเนินการชี้บ่งอันตราย และวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่หลายวิธี ครอบคลุมทั้งการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment) การวิเคราะห์อันตรายจากกระบวนการผลิต (Process Hazards Analysis) ซึ่งได้แก่การทำ HAZOP (Hazard and Operability Study), FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) และ วิธี Bow Tie

(ใช้หลักการของ Fault Tree และ Event Tree Analysis) นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการด้วยวิธี Job Safety Analysis และ Health Risk Analysis รวมถึงระบบการขออนุญาตในการทำงาน Permit to work system การดำเนินการชี้บ่งอันตราย และ วิเคราะห์ความเสี่ยงหลายวิธีดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถค้นหาอันตราย ที่แอบแฝงอยู่ได้ในที่ต่างๆ ครอบคลุมสถานที่ปฏิบัติงาน และ กิจกรรมในทุกพื้นที่ สำหรับรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเจตนารมย์หลักคือ การชี้บ่ง ประเมินและควบคุมอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงซึ่งได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด และการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีอันตรายนั้น บริษัทได้ใช้ผลของการทำ Fault Tree และ Event Tree Analysis มาทำรายงานหลัก การชี้บ่งอันตราย การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ และเพื่อเป็นการทบทวนการประเมินความเสี่ยงรวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไข ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้ชำนาญการจากตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1. ทำการชี้บ่งอันตรายและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท
2. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่ได้กำหนดขึ้นว่ามีความเหมาะสม เป็นปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และของผู้ถือหุ้น

ในการศึกษาเพื่อชี้บ่ง และ วิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงโอเลฟินส์ ของบริษัทฯในครั้งนี้ เป็นการศึกษาสำหรับโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยายครั้งที่ 3) (EPS Expansion Phase 3)

จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า ระดับความเสี่ยงของอันตรายแฝงที่ได้รับการป้องกันและควบคุมตามมาตรการที่มีอยู่ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับเล็กน้อย และระดับที่ยอมรับได้ โดยสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัท ภายใต้การบริหารและการจัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่ามาตรการป้องกันและควบคุมตามที่ได้ระบุในแผนควบคุมความเสี่ยงนั้นจะได้รับความเอาใจใส่ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงของอันตรายให้อยู่ในระดับต่ำสุดที่สมเหตุสมผลในทางปฏิบัติ (Reasonably Practicable)

ภาคผนวก

ก. Marked-up Process Engineering Flow Scheme (PEFS)

Balance Of Plant (BOP)

A1(841x594m/m)

MULTIDISCIPLINE APPROVAL	DISCIPLINE	PROJECT	PDM	PROCESS	PIPING	CIVIL	MECHANICAL	STATIC	INSTRUMENT	ELECTRICAL
	SIGNED									
	DATE									

A1(841x594m/m)

MULTIDISCIPLINE APPROVAL	DISCIPLINE	PROJECT	PDM	PROCESS	PIPING	CIVIL	MECHANICAL	STATIC	INSTRUMENT	ELECTRICAL
	SIGNED									
	DATE									

Action 18.2

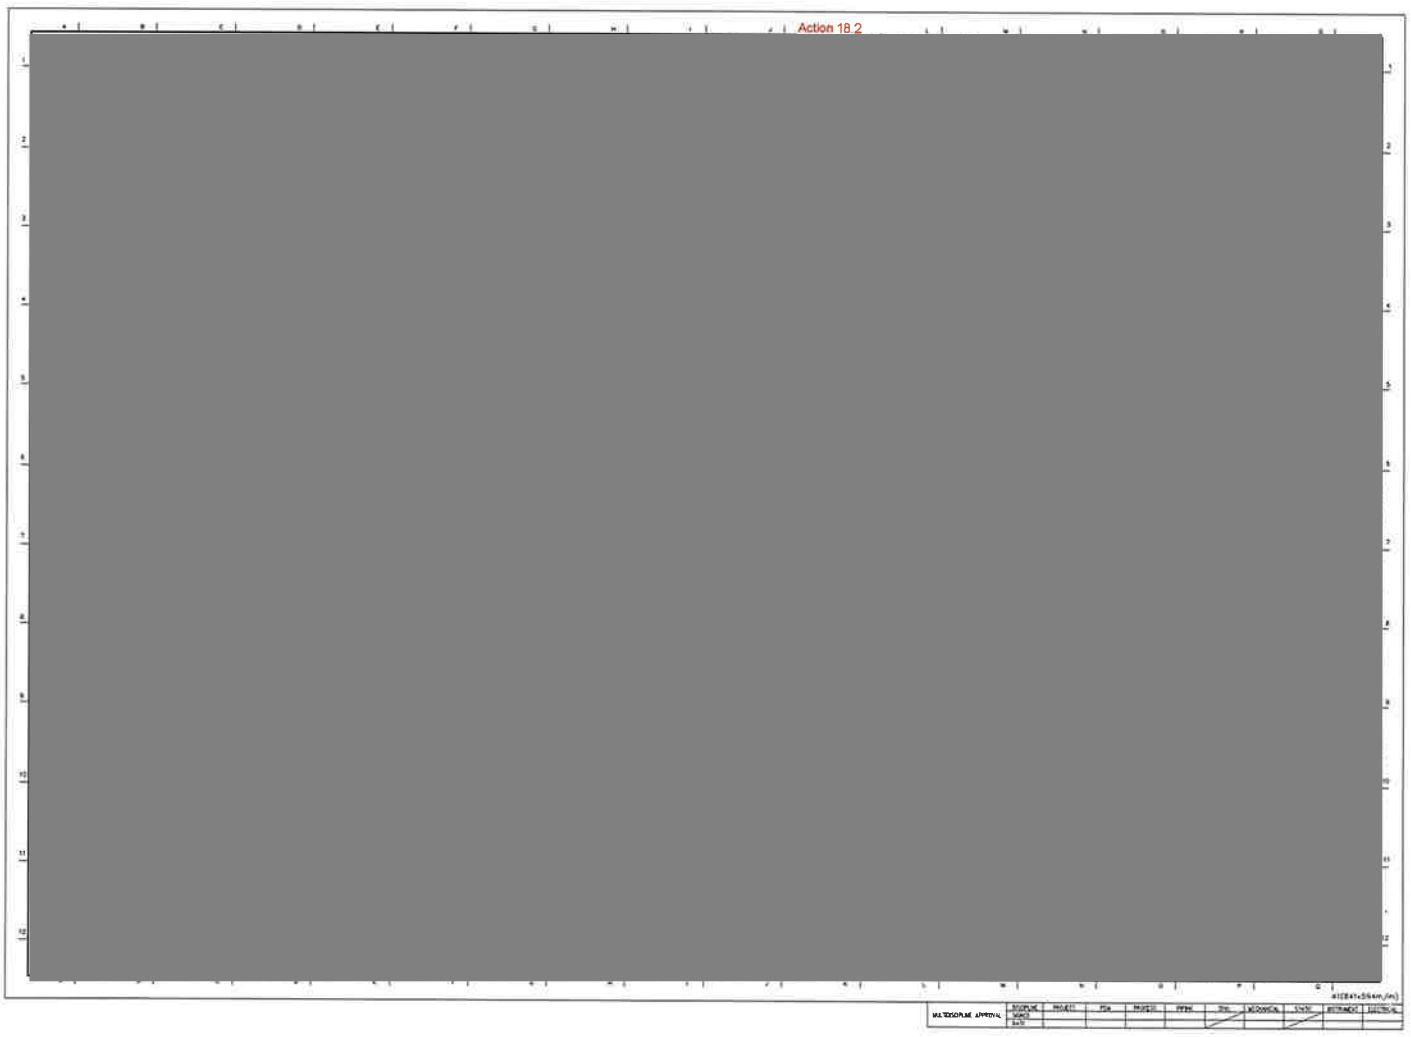

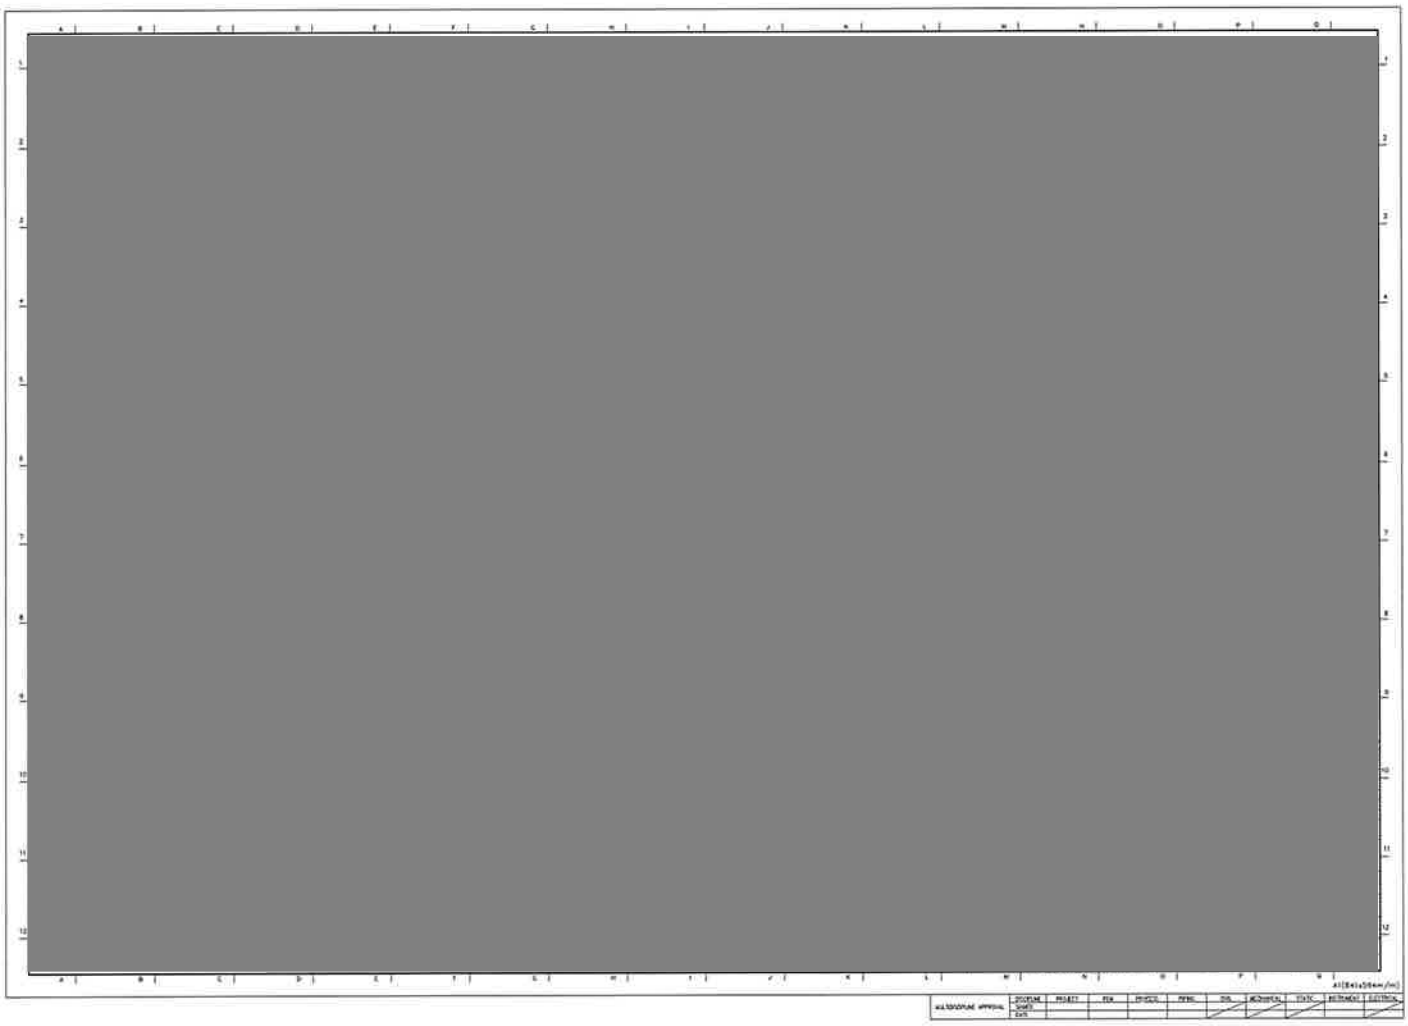

ภาคผนวก ข.3

เอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเทคนิคและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

P-(Q-TS)-010

การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

(Contractor SHE Management)

จัดทำโดย : [redacted]

(ผู้จัดการส่วน SHE - Olefins II)

อนุมัติโดย : [redacted]

(ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเทคนิคและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต)

ตารางการแจกจ่าย

สำเนาเลขที่	ผู้ถือ	สถานที่
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[redacted]

[redacted]

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

[redacted]

[redacted]

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

[redacted]





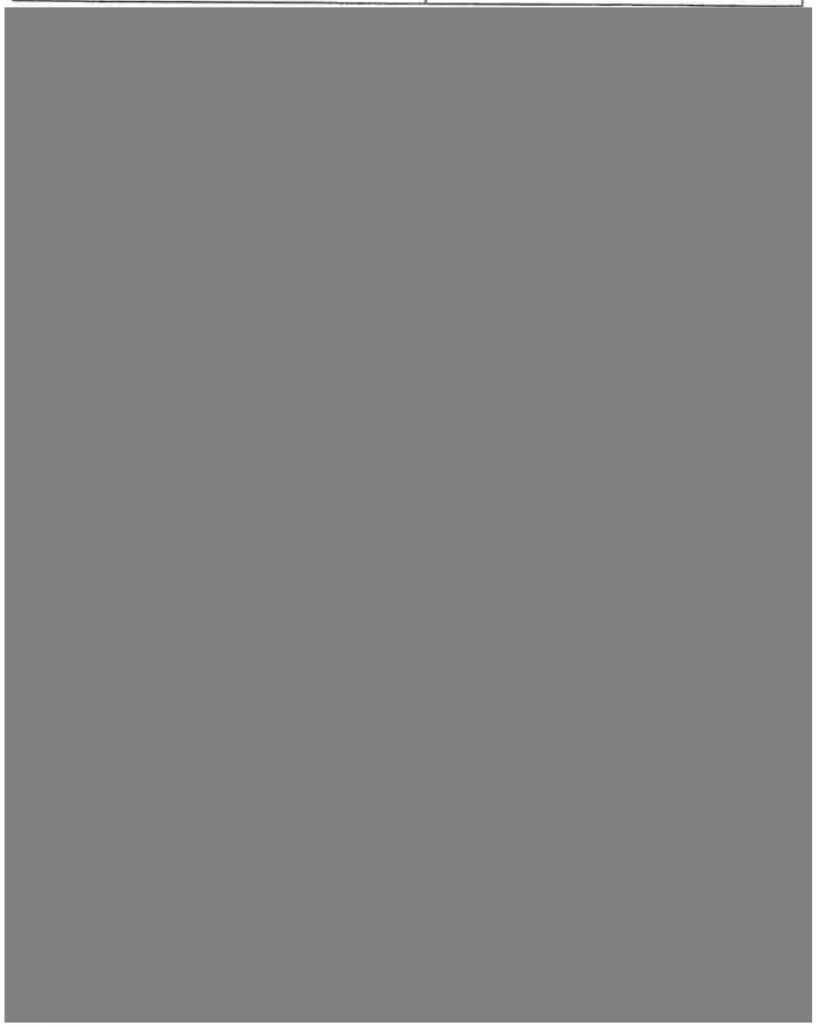



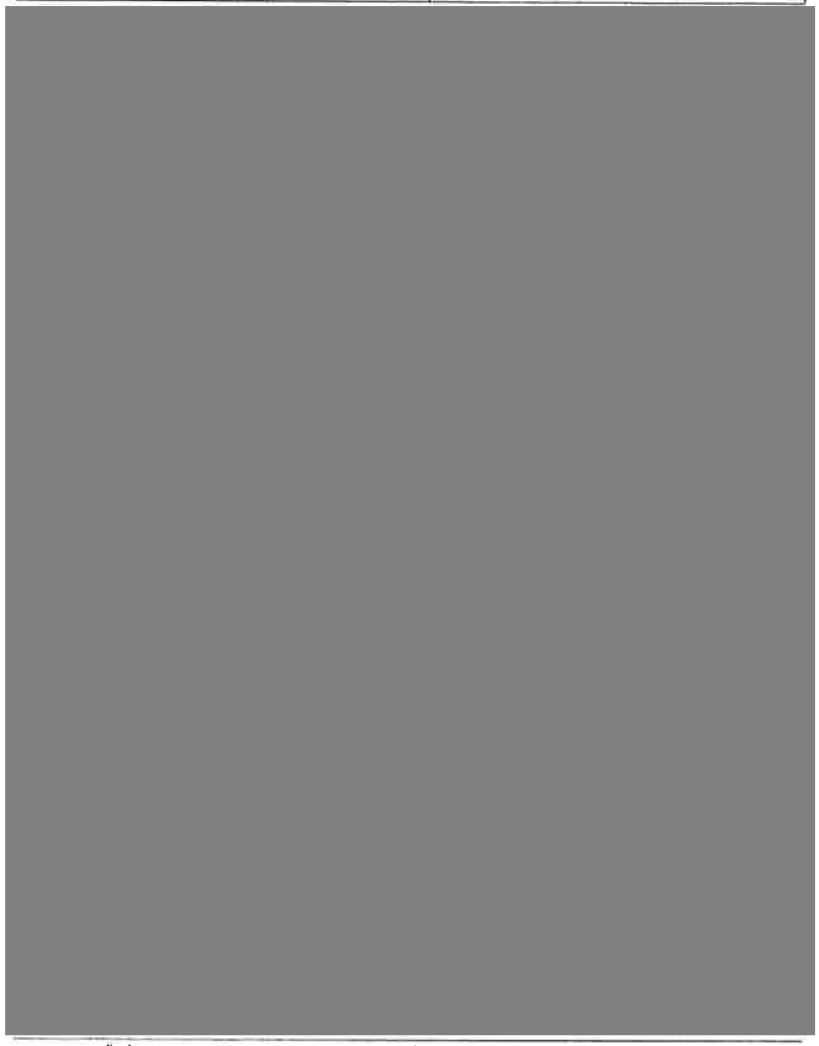





กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา







GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา









[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

[redacted]

Type of KPI	KPI Name	KPI Description

[redacted]

[redacted]

[redacted]

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

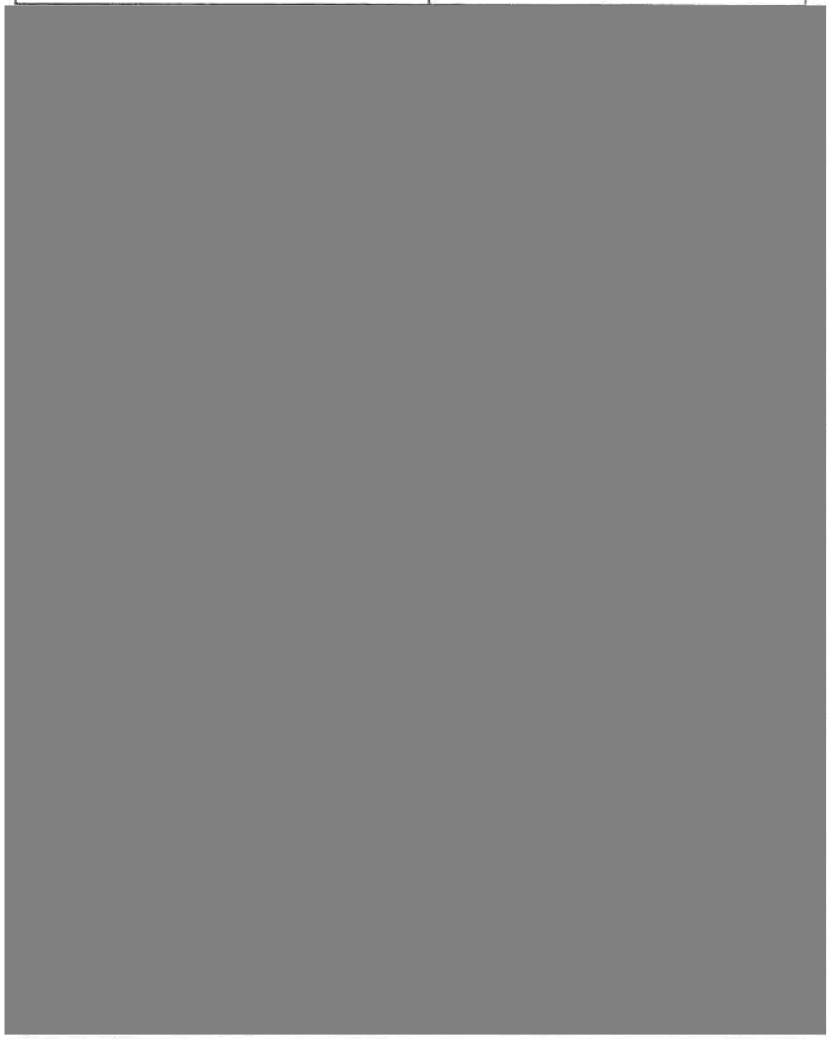

[redacted]

[redacted]

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-010 : การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ภาคผนวก ข.4

เอกสารการรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Technical Safety and PSM

P-(Q-TS)-004

Safety Health & Environment (SHE)

Communication and Complaints

Internal Use Only

จัดทำโดย : [redacted]

(ผู้จัดการส่วนSHE Aromatics 2)

อนุมัติโดย : [redacted]

(ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเทคนิคและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต)

ตารางการแจกจ่าย

สำเนาเลขที่	ผู้ถือ	สถานที่
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[redacted]

[redacted]

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

[redacted]

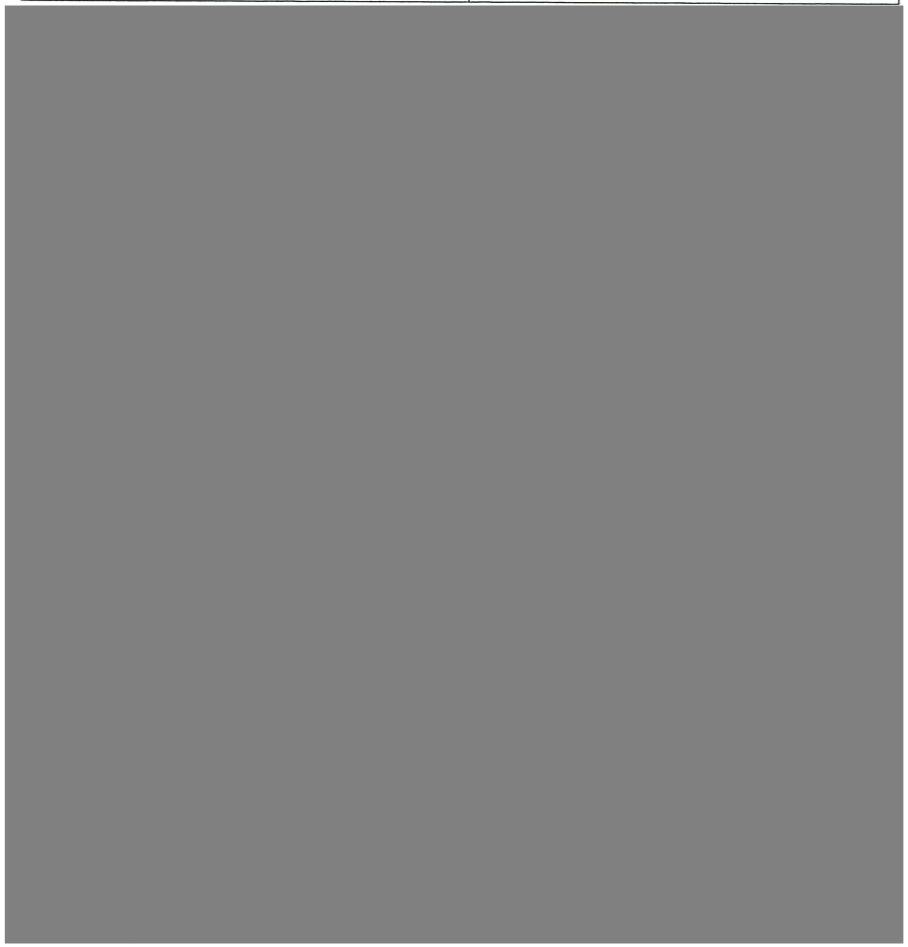

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

[redacted]



GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints



GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints





GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints





กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints



[redacted]

GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

[redacted]

GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

สรุปจำนวนข้อร้องเรียน
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ที่ อก 5106.5/0570

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

24 มิถุนายน 2568

เรื่อง การตรวจสอบข้อร้องเรียนของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้จัดการกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ 27-C-SR-008/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ตามที่อ้างถึงกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ขอให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR - DIW Continuous) ปี 2568 ดังนี้

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ 1
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ 2
3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4 โรงอะโรเมติกส์ 1
4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 คลังสำรองอะโรเมติกส์
5. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 โรงโพลีเอททิลีน
6. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 17 โรงสไตรีนิคส์

สนพ. ได้ตรวจสอบข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) แล้วพบว่ามีหนังสือสั่งการจำนวน 1 ฉบับ ที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คือ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.59 น. เกิดเหตุการณ์กระบวนการผลิตทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดเปลวไฟและควันดำจากหอเผาไหม้ (Flare) สูงผิดปกติ ได้มีหนังสือสั่งการที่ อก 5106.5/0223 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มมาตรการเชิงป้องกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แก้ไขการทำงานของโรงงานตามข้อสั่งการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สนพ. จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉกาจ พัฒนศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

งานกำกับและประกอบกิจการฯ
โทรศัพท์ 0 3868 3930 – 2 ต่อ 1380
โทรสาร 0 3868 3941

ที่ รย ๕๒๒๐๖/๔๒๗๗

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย ๗
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ ๒๗-C-SR-๐๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๕ (Green Industry Level ๕) และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW ContinuousAward) ประจำปี ๒๕๖๘ ได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครมาบตาพุดตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน โดยมีรายชื่อโรงงานดังต่อไปนี้

๑. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๒ โรงโอเลฟินส์ ๑
๒. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๓ โรงโอเลฟินส์ ๒
๓. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๔ โรงอะโรเมติกส์ ๑
๔. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๕ โรงอะโรเมติกส์ ๒
๕. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๖ โรงกลั่นน้ำมัน
๖. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๗ ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์
๗. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๘ คลังสำรองอะโรเมติกส์
๘. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๑ โรงโอเลฟินส์ ๓
๙. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๒ โรงโพลีเอททิลีน
๑๐. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๖ หน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์ และหน่วยผลิตเอทธิลีนไกลคอล
๑๑. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๖ หน่วยผลิตเอทานอลเอมีน
๑๒. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๗ โรงสไตรีนิคส์
๑๓. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตฟีนอล
๑๔. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตบิสฟีนอล เอ

เทศบาลฯ...

เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน เทศบาลฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางภวิณดา ไชยหงส์สา)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๐๓@dla.go.th

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ภาคผนวก ข.5

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ โดย CEMS
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMS)

โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

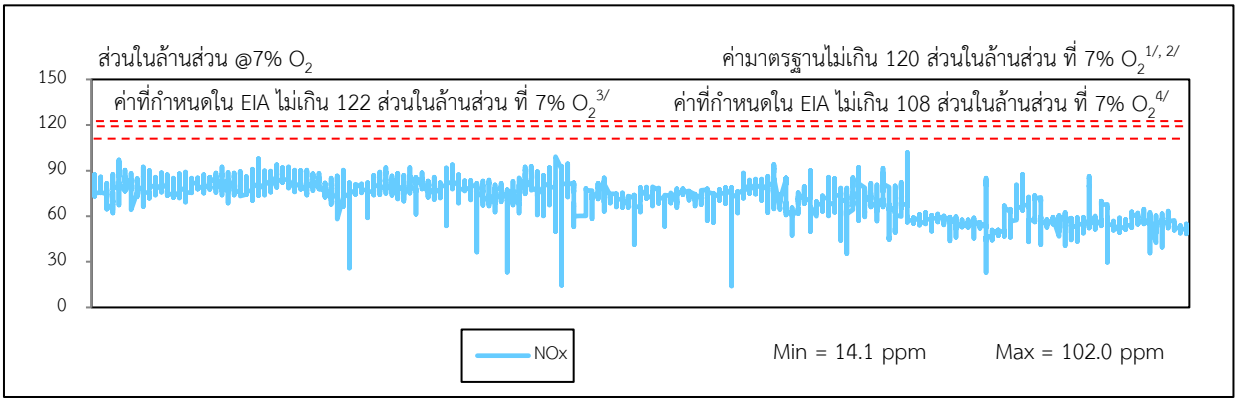

H-3701

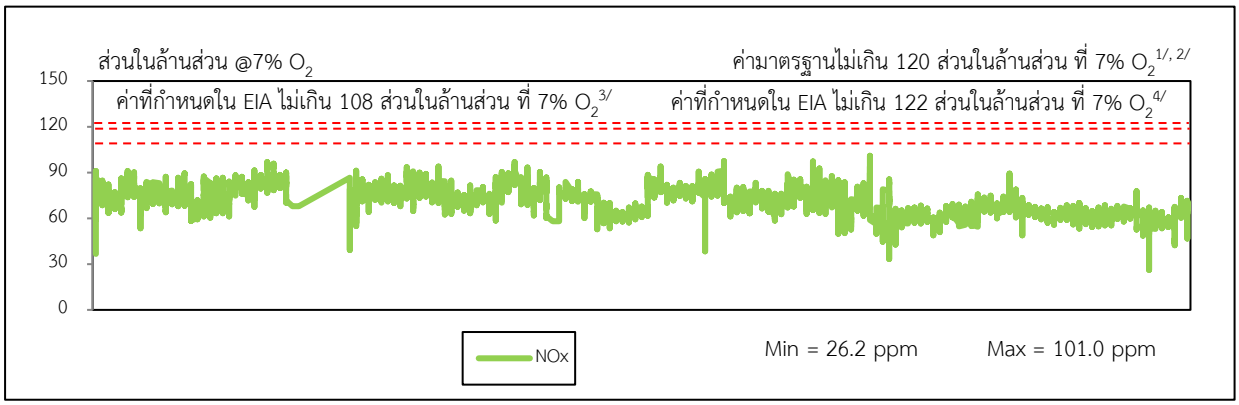

H-3703

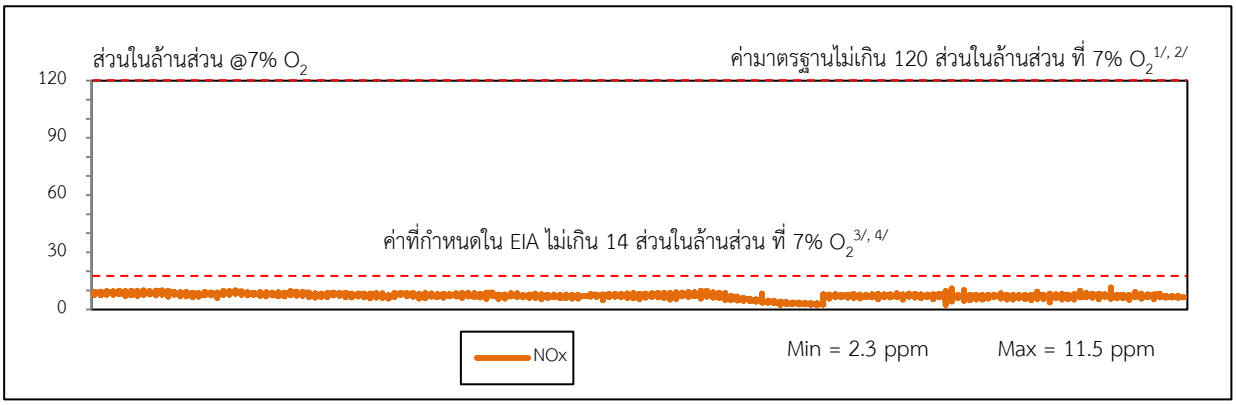

H-3704

หมายเหตุ :

1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2567 ที่ 7% O_2 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
3. 3/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 1)
4. 4/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 2)

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMS)

โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

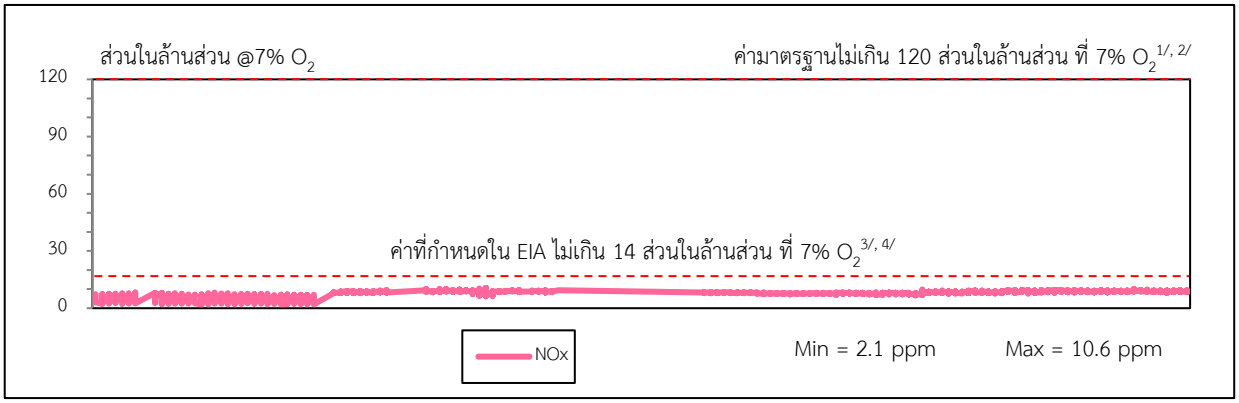

H-3705

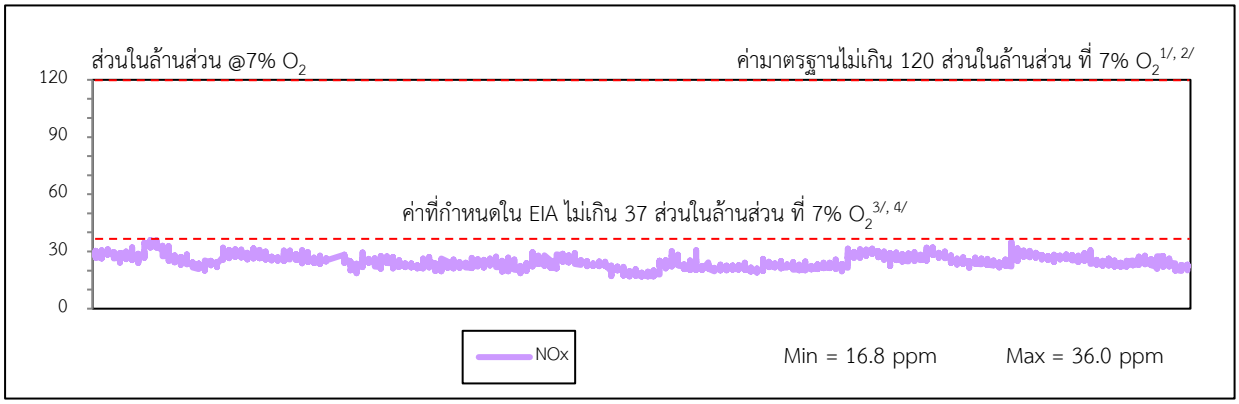

H-3706

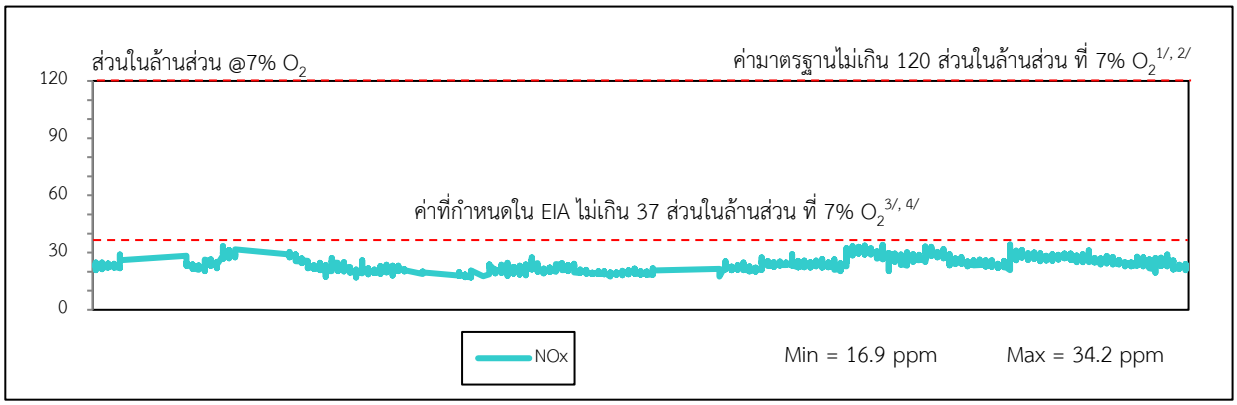

H-3707

หมายเหตุ :

1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2567 ที่ 7% O_2 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
3. 3/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 1)
4. 4/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 2)

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMS)

โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

H-3708

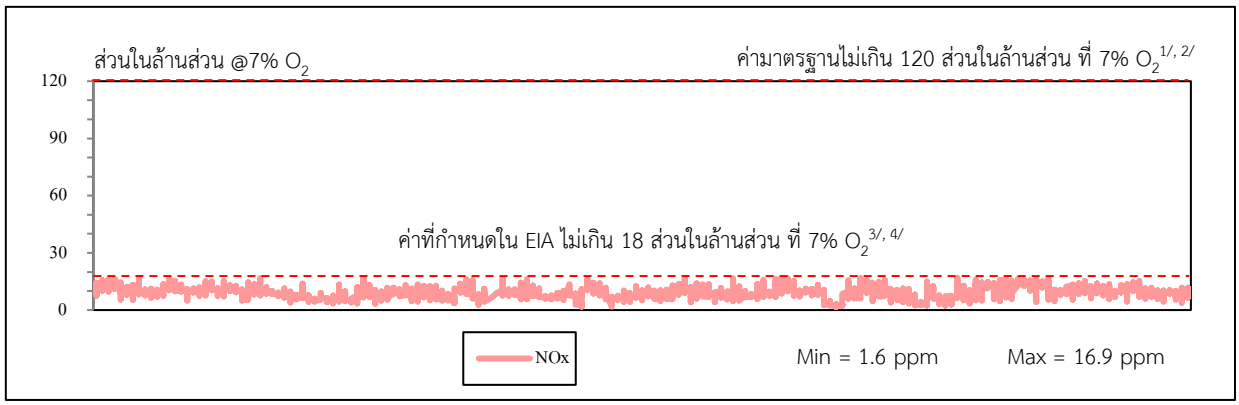

H-3709

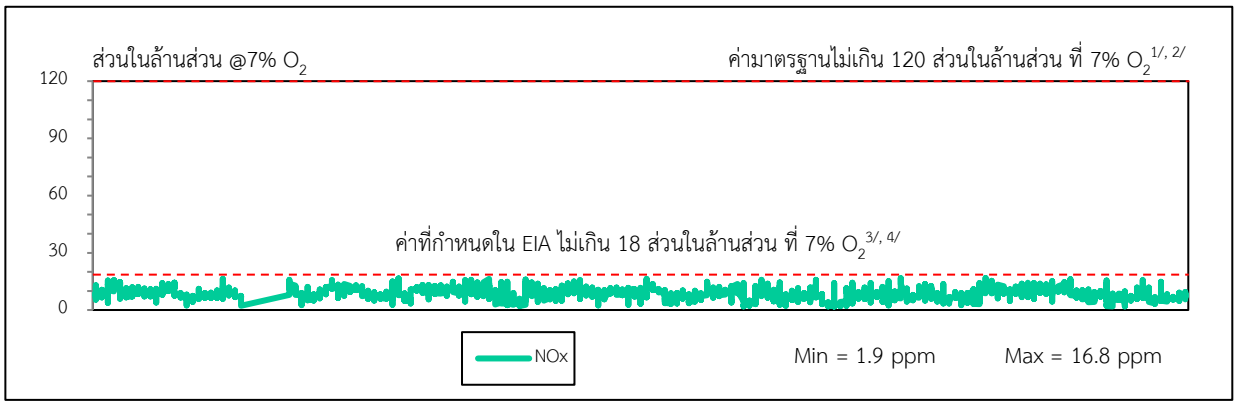

H-3710

หมายเหตุ :

1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2567 ที่ 7% O_2 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
3. 3/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 1)
4. 4/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 2)

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMS)

โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

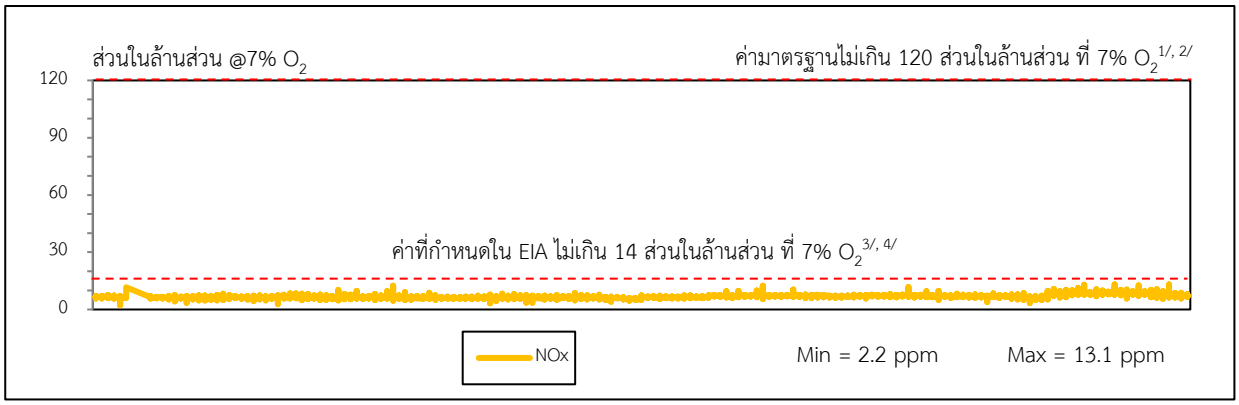

H-3711

หมายเหตุ :

1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2567 ที่ 7% O_2 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง)
3. 3/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 1)
4. 4/ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (การเดินเครื่องรูปแบบที่ 2)

ภาคผนวก ข.6

เอกสารการบันทึกข้อมูลการเดินเครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
01-Jan-26 00:00	0	19	0	32	0	14	36	36	29	50	215
01-Jan-26 01:00	0	19	0	33	0	15	36	36	30	51	218
01-Jan-26 02:00	0	19	0	32	0	14	36	36	30	51	219
01-Jan-26 03:00	0	19	0	32	0	14	36	36	30	50	217
01-Jan-26 04:00	0	19	0	32	0	13	36	36	32	50	218
01-Jan-26 05:00	0	19	0	32	0	13	36	36	31	50	218
01-Jan-26 06:00	0	19	0	32	0	13	36	36	32	50	219
01-Jan-26 07:00	0	19	0	32	0	14	36	36	30	51	217
01-Jan-26 08:00	0	19	0	32	0	14	36	36	29	50	216
01-Jan-26 09:00	0	19	0	32	0	14	36	36	28	51	216
01-Jan-26 10:00	0	19	0	32	0	14	36	36	28	50	216
01-Jan-26 11:00	0	19	0	32	0	14	36	36	26	50	213
01-Jan-26 12:00	0	19	0	32	0	14	38	35	26	51	214
01-Jan-26 13:00	0	19	0	32	0	14	36	31	26	50	209
01-Jan-26 14:00	0	19	0	32	0	14	35	28	30	50	209
01-Jan-26 15:00	0	19	0	32	0	14	36	28	32	50	211
01-Jan-26 16:00	0	19	0	32	0	14	36	29	30	50	210
01-Jan-26 17:00	0	20	0	32	0	14	36	28	34	50	213
01-Jan-26 18:00	0	19	0	32	0	14	36	30	35	51	217
01-Jan-26 19:00	0	19	0	32	0	14	36	31	36	50	218
01-Jan-26 20:00	0	19	0	32	0	14	36	31	36	50	218
01-Jan-26 21:00	0	19	0	32	0	14	35	35	31	50	217
01-Jan-26 22:00	0	20	0	32	0	14	35	35	31	50	217
01-Jan-26 23:00	0	19	0	32	0	14	35	35	33	50	218
02-Jan-26 00:00	0	19	0	32	0	14	35	35	32	50	217
02-Jan-26 01:00	0	19	0	32	0	14	35	35	30	51	216
02-Jan-26 02:00	0	19	0	31	0	14	35	35	31	50	215
02-Jan-26 03:00	0	19	0	32	0	14	35	35	32	50	216
02-Jan-26 04:00	0	19	0	32	0	14	35	35	30	50	217
02-Jan-26 05:00	0	19	0	32	0	14	35	35	31	51	217
02-Jan-26 06:00	0	19	0	32	0	14	35	35	30	50	216
02-Jan-26 07:00	0	19	0	32	0	14	35	35	28	50	214
02-Jan-26 08:00	0	19	0	32	0	14	35	35	27	50	214
02-Jan-26 09:00	0	19	0	32	0	14	35	35	26	50	212
02-Jan-26 10:00	0	19	0	32	0	14	34	35	24	50	208
02-Jan-26 11:00	0	19	0	33	0	14	34	34	28	50	212
02-Jan-26 12:00	0	22	0	32	0	14	34	34	27	50	212
02-Jan-26 13:00	0	21	0	32	0	14	34	34	24	51	210
02-Jan-26 14:00	0	19	0	34	0	16	34	34	28	50	214
02-Jan-26 15:00	0	19	0	32	0	14	35	35	25	50	211
02-Jan-26 16:00	0	19	0	32	0	14	35	35	28	50	213
02-Jan-26 17:00	0	19	0	32	0	14	34	35	30	50	215
02-Jan-26 18:00	0	19	0	31	0	14	34	35	31	50	215
02-Jan-26 19:00	0	19	0	32	0	14	34	35	32	50	216
02-Jan-26 20:00	0	19	0	32	0	14	33	36	32	50	215
02-Jan-26 21:00	0	19	0	32	0	14	33	37	32	50	217
02-Jan-26 22:00	0	19	0	32	0	14	33	37	32	50	218
02-Jan-26 23:00	0	19	0	32	0	14	33	37	29	51	215

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
03-Jan-26 00:00	0	18	0	32	0	12	34	38	33	50	216
03-Jan-26 01:00	0	19	0	32	0	13	33	37	30	50	214
03-Jan-26 02:00	0	19	0	32	0	13	34	38	29	50	215
03-Jan-26 03:00	0	19	0	32	0	14	34	38	32	50	218
03-Jan-26 04:00	0	19	0	31	0	14	34	38	33	50	218
03-Jan-26 05:00	0	19	0	32	0	14	35	38	32	50	221
03-Jan-26 06:00	0	19	0	32	0	14	34	38	34	50	220
03-Jan-26 07:00	0	19	0	32	0	14	34	38	30	50	216
03-Jan-26 08:00	0	19	0	32	0	14	34	37	31	50	217
03-Jan-26 09:00	0	19	0	32	0	14	34	37	30	50	217
03-Jan-26 10:00	0	20	0	32	0	14	34	38	30	51	217
03-Jan-26 11:00	0	19	0	32	0	13	34	38	29	50	215
03-Jan-26 12:00	0	19	0	32	0	14	34	37	30	50	216
03-Jan-26 13:00	0	19	0	31	0	13	34	30	39	51	216
03-Jan-26 14:00	0	19	0	32	0	14	36	37	33	50	220
03-Jan-26 15:00	0	19	0	32	0	14	36	37	33	50	221
03-Jan-26 16:00	0	19	0	32	0	14	35	37	33	50	220
03-Jan-26 17:00	0	19	0	32	0	14	36	37	35	50	224
03-Jan-26 18:00	0	19	0	32	0	14	36	37	25	50	213
03-Jan-26 19:00	0	19	0	32	0	14	36	37	28	50	216
03-Jan-26 20:00	0	19	0	32	0	13	36	38	36	50	224
03-Jan-26 21:00	0	19	0	32	0	13	37	38	35	50	224
03-Jan-26 22:00	0	19	0	32	0	13	36	38	36	50	224
03-Jan-26 23:00	0	19	0	31	0	14	36	38	34	51	223
04-Jan-26 00:00	0	18	0	32	0	14	36	38	34	50	224
04-Jan-26 01:00	0	19	0	32	0	14	35	38	34	50	222
04-Jan-26 02:00	0	19	0	32	0	14	35	38	35	50	223
04-Jan-26 03:00	0	19	0	32	0	14	35	38	35	50	223
04-Jan-26 04:00	0	19	0	32	0	14	35	38	36	50	225
04-Jan-26 05:00	0	19	0	31	0	14	34	38	35	50	221
04-Jan-26 06:00	0	19	0	32	0	14	35	38	38	50	225
04-Jan-26 07:00	0	19	0	32	0	14	35	38	37	50	225
04-Jan-26 08:00	0	19	0	32	0	14	33	38	37	51	223
04-Jan-26 09:00	0	19	0	32	0	14	32	37	37	50	221
04-Jan-26 10:00	0	19	0	32	0	13	33	38	35	50	221
04-Jan-26 11:00	0	19	0	32	0	14	30	37	35	50	218
04-Jan-26 12:00	0	19	0	32	0	14	33	38	35	51	221
04-Jan-26 13:00	0	19	0	32	0	14	32	38	35	50	221
04-Jan-26 14:00	0	19	0	32	0	14	35	37	36	50	223
04-Jan-26 15:00	0	19	0	31	0	14	36	38	35	50	224
04-Jan-26 16:00	0	21	0	32	0	14	36	38	37	50	228
04-Jan-26 17:00	0	22	0	33	0	16	37	37	38	51	233
04-Jan-26 18:00	0	22	0	32	0	15	38	37	39	50	234
04-Jan-26 19:00	0	22	0	33	0	16	38	37	39	50	234
04-Jan-26 20:00	0	22	0	33	0	14	37	37	39	51	234
04-Jan-26 21:00	0	22	0	34	0	15	37	36	39	50	232
04-Jan-26 22:00	0	21	0	33	0	14	37	38	39	50	233
04-Jan-26 23:00	0	21	0	33	0	14	37	39	40	51	235

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
05-Jan-26 00:00	0	21	0	34	0	15	36	38	40	49	233
05-Jan-26 01:00	0	21	0	33	0	14	39	39	39	51	236
05-Jan-26 02:00	0	21	0	34	0	14	39	39	39	50	236
05-Jan-26 03:00	0	21	0	34	0	14	38	39	39	51	237
05-Jan-26 04:00	0	22	0	33	0	14	38	38	39	50	235
05-Jan-26 05:00	0	21	0	34	0	14	38	39	40	51	237
05-Jan-26 06:00	0	21	0	34	0	15	38	38	39	50	235
05-Jan-26 07:00	0	21	0	34	0	14	38	38	39	51	236
05-Jan-26 08:00	0	22	0	34	0	15	36	38	39	50	233
05-Jan-26 09:00	0	17	0	25	0	13	24	23	27	31	161
05-Jan-26 10:00	0	21	0	32	0	15	30	29	40	50	216
05-Jan-26 11:00	0	21	0	32	0	14	33	34	39	50	223
05-Jan-26 12:00	6	22	0	33	0	15	38	37	39	36	226
05-Jan-26 13:00	15	20	0	32	0	17	26	24	39	50	223
05-Jan-26 14:00	15	20	0	31	0	16	29	24	38	50	224
05-Jan-26 15:00	15	20	0	32	0	16	35	24	37	49	229
05-Jan-26 16:00	15	23	0	32	0	15	32	28	38	50	233
05-Jan-26 17:00	20	21	0	32	0	16	32	30	38	50	238
05-Jan-26 18:00	21	21	0	35	0	16	30	30	37	50	240
05-Jan-26 19:00	21	21	0	33	0	16	26	39	38	49	243
05-Jan-26 20:00	21	21	0	33	0	17	27	37	38	51	245
05-Jan-26 21:00	21	21	0	33	0	13	31	37	38	50	244
05-Jan-26 22:00	21	21	0	33	0	14	28	37	38	50	242
05-Jan-26 23:00	21	21	0	33	0	15	29	37	38	50	244
06-Jan-26 00:00	21	21	0	34	0	16	28	37	38	50	244
06-Jan-26 01:00	21	21	0	33	0	15	27	37	38	50	243
06-Jan-26 02:00	21	21	0	33	0	15	28	37	38	50	243
06-Jan-26 03:00	21	20	0	33	0	15	29	36	38	49	241
06-Jan-26 04:00	21	20	0	34	0	15	30	37	38	51	245
06-Jan-26 05:00	21	20	0	34	0	16	29	37	38	50	245
06-Jan-26 06:00	21	20	0	33	0	15	31	37	38	50	246
06-Jan-26 07:00	21	20	0	33	0	14	31	37	39	50	245
06-Jan-26 08:00	21	20	0	34	0	15	29	37	38	50	244
06-Jan-26 09:00	21	20	0	34	0	15	27	37	38	50	241
06-Jan-26 10:00	21	20	0	34	0	15	27	37	38	50	242
06-Jan-26 11:00	21	20	0	34	0	15	25	37	38	50	240
06-Jan-26 12:00	21	20	0	33	0	14	28	35	37	50	239
06-Jan-26 13:00	21	20	0	33	0	15	26	35	38	50	238
06-Jan-26 14:00	21	20	0	34	0	15	28	35	38	50	240
06-Jan-26 15:00	21	20	0	34	0	15	30	35	38	50	242
06-Jan-26 16:00	21	20	0	33	0	15	33	35	38	50	245
06-Jan-26 17:00	21	21	0	34	0	15	33	37	38	50	249
06-Jan-26 18:00	21	22	0	34	0	15	35	37	38	50	252
06-Jan-26 19:00	22	22	0	34	0	15	35	37	38	50	253
06-Jan-26 20:00	23	22	0	33	0	15	37	38	38	50	255
06-Jan-26 21:00	23	22	0	33	0	17	36	38	38	50	256
06-Jan-26 22:00	23	21	0	34	0	17	35	38	38	50	256
06-Jan-26 23:00	23	21	0	34	0	17	36	38	39	50	258

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
07-Jan-26 00:00	22	21	0	33	0	17	36	38	39	50	257
07-Jan-26 01:00	23	22	0	34	0	17	36	38	38	50	258
07-Jan-26 02:00	23	21	0	34	0	17	35	38	38	50	257
07-Jan-26 03:00	23	21	0	33	0	17	37	38	39	50	258
07-Jan-26 04:00	23	21	0	34	0	17	36	38	38	50	257
07-Jan-26 05:00	23	21	0	33	0	16	37	38	38	50	257
07-Jan-26 06:00	22	21	0	33	0	17	35	38	38	50	255
07-Jan-26 07:00	22	21	0	34	0	16	34	39	39	50	255
07-Jan-26 08:00	22	21	0	33	0	15	35	39	38	50	253
07-Jan-26 09:00	22	20	0	34	0	15	36	39	38	51	254
07-Jan-26 10:00	21	20	0	35	0	15	33	39	38	50	252
07-Jan-26 11:00	18	18	0	30	0	13	31	29	40	42	221
07-Jan-26 12:00	18	18	0	30	0	14	29	24	39	50	222
07-Jan-26 13:00	21	20	0	34	0	15	38	38	39	50	255
07-Jan-26 14:00	21	20	0	34	0	15	38	38	39	50	255
07-Jan-26 15:00	23	20	0	34	0	15	36	39	39	50	256
07-Jan-26 16:00	22	20	0	34	0	15	38	39	39	50	258
07-Jan-26 17:00	22	20	0	35	0	15	38	39	39	50	259
07-Jan-26 18:00	22	21	0	35	0	15	39	39	39	50	259
07-Jan-26 19:00	22	21	0	35	0	15	39	39	39	50	259
07-Jan-26 20:00	22	21	0	35	0	15	38	39	39	50	258
07-Jan-26 21:00	22	20	0	35	0	15	38	38	39	50	258
07-Jan-26 22:00	22	20	0	35	0	15	38	39	39	50	259
07-Jan-26 23:00	22	20	0	35	0	15	38	38	39	50	258
08-Jan-26 00:00	22	20	0	34	0	15	37	39	39	50	257
08-Jan-26 01:00	22	21	0	34	0	15	37	39	39	50	257
08-Jan-26 02:00	22	21	0	34	0	15	37	39	39	50	258
08-Jan-26 03:00	22	21	0	35	0	16	37	38	39	50	258
08-Jan-26 04:00	22	20	0	35	0	15	36	39	39	50	256
08-Jan-26 05:00	22	20	0	34	0	15	37	39	39	49	256
08-Jan-26 06:00	22	20	0	35	0	15	36	39	39	50	256
08-Jan-26 07:00	21	19	0	35	0	15	32	39	39	50	249
08-Jan-26 08:00	19	19	0	32	0	14	34	39	39	50	244
08-Jan-26 09:00	21	20	0	35	0	14	34	39	39	50	253
08-Jan-26 10:00	21	20	0	34	0	14	34	39	39	50	252
08-Jan-26 11:00	21	20	0	35	0	15	37	37	39	50	254
08-Jan-26 12:00	20	20	0	35	0	16	36	38	39	50	255
08-Jan-26 13:00	19	23	0	35	0	15	34	39	39	50	254
08-Jan-26 14:00	20	22	0	35	0	15	34	40	39	50	254
08-Jan-26 15:00	20	21	0	35	0	15	35	40	39	50	254
08-Jan-26 16:00	20	21	0	34	0	15	38	39	39	50	256
08-Jan-26 17:00	20	21	0	34	0	15	39	39	39	50	257
08-Jan-26 18:00	20	20	0	35	0	16	38	39	39	50	257
08-Jan-26 19:00	21	21	0	35	0	16	38	40	39	50	259
08-Jan-26 20:00	21	21	0	35	0	15	36	40	39	50	257
08-Jan-26 21:00	21	20	0	35	0	15	37	39	39	50	256
08-Jan-26 22:00	21	21	0	35	0	15	37	40	39	50	258
08-Jan-26 23:00	20	21	0	35	0	15	38	39	39	50	258

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
09-Jan-26 00:00	21	20	0	35	0	15	38	40	39	50	258
09-Jan-26 01:00	21	20	0	35	0	15	38	39	39	50	258
09-Jan-26 02:00	21	20	0	35	0	15	38	39	39	50	256
09-Jan-26 03:00	21	21	0	35	0	15	38	40	39	50	258
09-Jan-26 04:00	21	21	0	35	0	15	38	40	39	50	258
09-Jan-26 05:00	21	21	0	35	0	15	39	40	39	50	260
09-Jan-26 06:00	21	20	0	35	0	15	38	40	39	50	258
09-Jan-26 07:00	21	21	0	35	0	15	37	40	39	50	258
09-Jan-26 08:00	22	21	0	35	0	15	36	39	39	50	256
09-Jan-26 09:00	22	20	0	35	0	15	35	40	39	50	255
09-Jan-26 10:00	21	21	0	35	0	15	34	39	39	50	254
09-Jan-26 11:00	21	21	0	35	0	15	34	39	39	50	253
09-Jan-26 12:00	21	20	0	34	0	15	31	39	38	50	248
09-Jan-26 13:00	21	20	0	34	0	15	29	39	38	50	246
09-Jan-26 14:00	21	20	0	34	0	15	30	39	38	50	247
09-Jan-26 15:00	21	20	0	34	0	15	32	39	38	50	248
09-Jan-26 16:00	20	19	0	34	0	15	31	39	38	50	246
09-Jan-26 17:00	20	19	7	33	0	14	29	38	38	50	249
09-Jan-26 18:00	19	13	15	33	0	15	31	37	37	50	250
09-Jan-26 19:00	21	5	18	33	0	15	33	38	38	50	250
09-Jan-26 20:00	21	14	23	34	0	15	33	34	37	50	260
09-Jan-26 21:00	22	22	0	33	0	15	34	37	37	50	249
09-Jan-26 22:00	21	22	0	34	0	16	36	38	37	50	254
09-Jan-26 23:00	22	22	0	34	0	16	37	38	38	49	257
10-Jan-26 00:00	22	22	0	34	0	16	38	38	38	50	258
10-Jan-26 01:00	22	22	0	34	0	15	37	38	38	50	257
10-Jan-26 02:00	22	22	0	34	0	16	37	38	38	50	256
10-Jan-26 03:00	22	22	0	34	0	16	37	39	38	50	258
10-Jan-26 04:00	21	21	0	34	0	16	37	39	38	50	257
10-Jan-26 05:00	22	22	0	34	0	16	36	38	38	50	256
10-Jan-26 06:00	22	22	0	34	0	16	36	39	39	50	257
10-Jan-26 07:00	22	23	0	34	0	16	36	38	39	50	258
10-Jan-26 08:00	22	21	0	34	0	16	34	39	39	50	253
10-Jan-26 09:00	20	20	0	34	0	16	36	39	39	50	253
10-Jan-26 10:00	20	20	0	34	0	15	37	39	38	50	253
10-Jan-26 11:00	20	20	0	34	0	15	35	38	38	50	250
10-Jan-26 12:00	24	20	0	33	0	16	31	38	38	50	251
10-Jan-26 13:00	21	21	0	33	0	15	36	38	38	50	252
10-Jan-26 14:00	21	21	0	33	0	15	35	38	38	50	252
10-Jan-26 15:00	21	20	0	33	0	15	34	39	39	50	251
10-Jan-26 16:00	22	21	0	34	0	16	35	39	39	50	254
10-Jan-26 17:00	21	21	0	34	0	16	35	39	38	50	253
10-Jan-26 18:00	21	20	0	33	0	16	37	39	38	50	255
10-Jan-26 19:00	22	22	0	34	0	16	34	39	38	50	255
10-Jan-26 20:00	22	21	0	34	0	16	36	39	38	50	255
10-Jan-26 21:00	22	22	0	33	0	15	36	38	39	50	256
10-Jan-26 22:00	22	22	0	33	0	15	36	38	38	50	255
10-Jan-26 23:00	22	22	0	33	0	15	36	38	38	50	256

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
11-Jan-26 00:00	22	22	0	33	0	15	33	38	38	50	251
11-Jan-26 01:00	22	22	0	33	0	15	34	38	38	50	253
11-Jan-26 02:00	22	22	0	34	0	16	34	39	39	50	254
11-Jan-26 03:00	22	22	0	34	0	15	27	38	38	50	247
11-Jan-26 04:00	21	21	0	33	0	15	28	38	38	49	245
11-Jan-26 05:00	20	20	0	34	0	15	32	38	38	50	247
11-Jan-26 06:00	19	19	0	34	0	15	32	39	39	50	246
11-Jan-26 07:00	19	19	0	34	0	15	33	38	39	50	246
11-Jan-26 08:00	19	19	0	34	0	15	30	38	38	50	244
11-Jan-26 09:00	19	19	0	32	0	15	31	38	38	50	243
11-Jan-26 10:00	19	19	0	34	0	14	31	39	39	49	244
11-Jan-26 11:00	19	19	0	31	0	16	31	39	38	50	243
11-Jan-26 12:00	19	24	0	30	0	15	25	38	39	50	241
11-Jan-26 13:00	19	19	0	30	0	16	30	40	38	50	242
11-Jan-26 14:00	19	19	0	31	0	16	36	39	38	50	249
11-Jan-26 15:00	20	20	0	31	0	16	35	38	39	50	249
11-Jan-26 16:00	20	20	0	31	0	16	37	39	39	51	251
11-Jan-26 17:00	21	20	0	31	0	15	37	38	38	50	251
11-Jan-26 18:00	21	20	0	32	0	15	38	38	38	50	253
11-Jan-26 19:00	22	21	0	32	0	16	34	38	39	50	252
11-Jan-26 20:00	22	22	0	33	0	16	33	38	38	49	251
11-Jan-26 21:00	22	22	0	33	0	15	36	39	37	51	254
11-Jan-26 22:00	22	22	0	33	0	15	34	38	38	50	252
11-Jan-26 23:00	22	22	0	33	0	15	35	39	39	50	254
12-Jan-26 00:00	22	22	0	33	0	15	33	38	38	50	252
12-Jan-26 01:00	22	22	0	33	0	15	33	39	38	50	252
12-Jan-26 02:00	22	22	0	33	0	15	33	38	38	50	252
12-Jan-26 03:00	22	22	0	33	0	16	33	38	38	50	251
12-Jan-26 04:00	22	22	0	33	0	16	33	38	38	50	252
12-Jan-26 05:00	22	22	0	33	0	15	35	39	39	50	254
12-Jan-26 06:00	22	22	0	33	0	16	32	39	38	50	251
12-Jan-26 07:00	22	22	0	33	0	15	33	39	39	50	252
12-Jan-26 08:00	19	21	0	32	0	16	31	38	38	50	246
12-Jan-26 09:00	19	20	0	33	0	15	34	38	39	50	248
12-Jan-26 10:00	20	20	0	33	0	15	32	39	38	50	246
12-Jan-26 11:00	19	20	0	33	0	15	32	39	38	50	247
12-Jan-26 12:00	19	20	0	33	0	15	31	39	38	50	245
12-Jan-26 13:00	19	20	0	33	0	15	30	39	38	50	244
12-Jan-26 14:00	19	20	0	33	0	15	32	38	37	50	244
12-Jan-26 15:00	19	20	0	33	0	15	33	38	38	50	246
12-Jan-26 16:00	19	20	0	33	0	16	33	38	37	50	246
12-Jan-26 17:00	19	20	0	33	0	16	34	39	37	50	247
12-Jan-26 18:00	19	19	0	33	0	16	34	38	37	50	246
12-Jan-26 19:00	19	20	0	33	0	16	34	38	38	50	248
12-Jan-26 20:00	19	20	0	33	0	14	34	39	38	50	247
12-Jan-26 21:00	19	19	0	32	0	14	37	39	36	50	246
12-Jan-26 22:00	19	19	0	32	0	14	36	39	38	50	247
12-Jan-26 23:00	19	19	0	31	0	14	35	40	38	51	247

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
13-Jan-26 00:00	19	19	0	32	0	14	37	39	38	50	248
13-Jan-26 01:00	19	19	0	32	0	14	34	40	39	50	246
13-Jan-26 02:00	19	19	0	32	0	14	35	40	39	50	247
13-Jan-26 03:00	19	19	0	32	0	14	33	39	38	50	245
13-Jan-26 04:00	19	19	0	32	0	14	35	39	39	50	246
13-Jan-26 05:00	19	19	0	31	0	14	34	39	38	50	245
13-Jan-26 06:00	19	19	0	32	0	14	34	39	38	50	246
13-Jan-26 07:00	19	20	0	32	0	14	34	39	39	50	246
13-Jan-26 08:00	19	19	0	32	0	13	35	39	39	50	246
13-Jan-26 09:00	19	19	0	32	0	14	33	39	39	50	246
13-Jan-26 10:00	19	19	0	32	0	14	31	39	39	50	243
13-Jan-26 11:00	19	19	0	32	0	14	32	39	38	50	244
13-Jan-26 12:00	23	19	0	32	0	14	28	38	38	51	242
13-Jan-26 13:00	19	19	0	33	0	15	32	38	37	50	243
13-Jan-26 14:00	19	19	0	33	0	14	33	38	37	50	245
13-Jan-26 15:00	19	19	0	33	0	14	31	39	37	51	242
13-Jan-26 16:00	19	19	0	33	0	14	33	38	37	50	244
13-Jan-26 17:00	19	19	0	32	0	14	37	39	37	50	248
13-Jan-26 18:00	20	20	0	33	0	14	36	39	37	50	249
13-Jan-26 19:00	20	20	0	33	0	14	37	38	37	50	250
13-Jan-26 20:00	20	20	0	33	0	14	37	38	37	50	250
13-Jan-26 21:00	20	20	0	33	0	15	36	38	38	50	251
13-Jan-26 22:00	19	20	0	33	0	15	35	39	38	51	251
13-Jan-26 23:00	20	19	0	33	0	15	37	40	38	50	252
14-Jan-26 00:00	19	19	0	33	0	15	30	39	38	51	245
14-Jan-26 01:00	19	19	0	32	0	14	35	38	38	50	245
14-Jan-26 02:00	19	19	0	32	0	14	38	38	38	50	248
14-Jan-26 03:00	19	19	0	34	0	14	38	39	38	50	252
14-Jan-26 04:00	19	19	0	33	0	14	39	39	39	51	253
14-Jan-26 05:00	19	19	0	33	0	15	37	40	38	50	251
14-Jan-26 06:00	19	19	0	33	0	15	31	39	38	50	244
14-Jan-26 07:00	19	19	0	33	0	15	32	39	38	50	245
14-Jan-26 08:00	19	19	0	32	0	15	31	38	38	50	243
14-Jan-26 09:00	19	19	0	32	0	14	32	39	38	50	244
14-Jan-26 10:00	19	19	0	32	0	16	33	38	38	50	246
14-Jan-26 11:00	19	23	0	32	0	18	27	38	37	50	245
14-Jan-26 12:00	19	20	0	34	0	18	29	38	37	51	246
14-Jan-26 13:00	19	19	0	34	0	18	31	38	36	50	246
14-Jan-26 14:00	21	21	0	33	0	16	33	38	36	50	249
14-Jan-26 15:00	21	21	0	33	0	17	33	38	36	50	249
14-Jan-26 16:00	21	21	0	33	0	16	35	38	37	51	251
14-Jan-26 17:00	21	21	0	33	0	16	29	38	37	50	245
14-Jan-26 18:00	21	21	0	33	0	16	35	38	36	50	250
14-Jan-26 19:00	22	22	0	33	0	17	33	38	37	50	252
14-Jan-26 20:00	22	21	0	33	0	16	35	38	37	50	251
14-Jan-26 21:00	22	21	0	33	0	15	36	38	37	50	252
14-Jan-26 22:00	22	21	0	33	0	15	36	38	35	50	251
14-Jan-26 23:00	23	22	0	33	0	16	33	38	36	50	252

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
15-Jan-26 00:00	23	22	0	33	0	15	32	38	36	50	250
15-Jan-26 01:00	22	22	0	33	0	16	33	38	36	50	250
15-Jan-26 02:00	23	22	0	33	0	16	34	38	36	51	252
15-Jan-26 03:00	23	22	0	32	0	14	36	38	36	50	252
15-Jan-26 04:00	23	22	0	32	0	16	33	38	36	50	250
15-Jan-26 05:00	22	22	0	33	0	16	32	37	37	51	250
15-Jan-26 06:00	23	22	0	33	0	15	32	38	37	50	250
15-Jan-26 07:00	23	22	0	33	0	16	33	38	37	50	251
15-Jan-26 08:00	23	21	0	33	0	15	32	38	37	51	249
15-Jan-26 09:00	21	21	0	33	0	17	33	38	36	50	249
15-Jan-26 10:00	21	21	0	33	0	15	34	38	36	50	249
15-Jan-26 11:00	21	21	0	33	0	13	35	38	36	50	248
15-Jan-26 12:00	21	21	0	33	0	15	34	38	36	50	248
15-Jan-26 13:00	22	22	0	33	0	15	32	38	36	50	249
15-Jan-26 14:00	22	22	0	33	0	15	35	38	37	50	251
15-Jan-26 15:00	22	22	0	32	0	15	36	38	36	50	251
15-Jan-26 16:00	22	22	0	33	0	14	36	38	37	50	253
15-Jan-26 17:00	22	22	0	33	0	13	38	38	36	50	252
15-Jan-26 18:00	22	22	0	33	0	16	36	38	36	50	253
15-Jan-26 19:00	22	22	0	33	0	17	34	38	36	50	252
15-Jan-26 20:00	22	22	0	33	0	17	35	38	36	50	252
15-Jan-26 21:00	22	22	0	33	0	15	36	39	36	50	254
15-Jan-26 22:00	22	22	0	33	0	17	35	37	36	50	253
15-Jan-26 23:00	22	22	0	33	0	16	35	38	36	50	253
16-Jan-26 00:00	22	22	0	34	0	16	34	38	36	50	252
16-Jan-26 01:00	22	22	0	33	0	17	35	38	36	50	254
16-Jan-26 02:00	22	22	0	32	0	17	35	38	36	51	253
16-Jan-26 03:00	22	22	0	34	0	16	35	38	37	50	253
16-Jan-26 04:00	22	22	0	34	0	17	35	38	36	50	253
16-Jan-26 05:00	22	22	0	33	0	16	36	38	36	50	254
16-Jan-26 06:00	22	22	0	34	0	16	35	38	36	50	253
16-Jan-26 07:00	22	22	0	34	0	16	34	38	36	50	253
16-Jan-26 08:00	21	21	0	33	0	16	35	39	37	50	251
16-Jan-26 09:00	20	21	0	33	0	15	35	38	37	50	250
16-Jan-26 10:00	19	20	0	33	0	16	36	38	37	50	249
16-Jan-26 11:00	19	19	0	32	12	22	28	34	33	49	248
16-Jan-26 12:00	19	20	0	31	30	18	38	27	25	41	249
16-Jan-26 13:00	23	20	0	33	32	22	29	36	35	50	280
16-Jan-26 14:00	21	19	0	31	31	21	29	36	35	50	273
16-Jan-26 15:00	19	19	0	32	31	23	38	36	35	44	277
16-Jan-26 16:00	19	20	0	31	31	23	36	37	34	50	281
16-Jan-26 17:00	19	21	0	29	30	24	35	37	34	51	280
16-Jan-26 18:00	19	21	0	29	30	23	36	38	33	50	279
16-Jan-26 19:00	19	21	0	29	30	24	36	38	33	50	279
16-Jan-26 20:00	19	21	0	29	30	23	37	38	33	50	280
16-Jan-26 21:00	19	21	0	29	30	24	34	35	37	50	279
16-Jan-26 22:00	19	21	0	29	30	24	35	37	34	50	279
16-Jan-26 23:00	19	21	0	29	30	24	36	37	34	50	280

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
17-Jan-26 00:00	19	21	0	29	30	24	37	37	34	51	282
17-Jan-26 01:00	19	21	0	29	29	24	37	38	33	50	280
17-Jan-26 02:00	19	21	0	29	30	24	38	37	33	50	281
17-Jan-26 03:00	19	22	0	28	30	23	36	37	34	50	281
17-Jan-26 04:00	19	22	0	29	29	23	36	37	34	50	279
17-Jan-26 05:00	19	22	0	29	30	23	37	38	34	50	283
17-Jan-26 06:00	19	22	0	29	30	24	36	37	33	51	281
17-Jan-26 07:00	19	22	0	29	29	23	35	37	33	50	277
17-Jan-26 08:00	20	22	0	28	28	23	37	38	34	50	279
17-Jan-26 09:00	19	22	0	28	29	22	37	37	33	50	279
17-Jan-26 10:00	19	22	0	29	29	24	37	37	34	50	282
17-Jan-26 11:00	19	22	0	28	29	23	36	37	34	51	278
17-Jan-26 12:00	19	22	0	29	28	24	34	37	34	50	279
17-Jan-26 13:00	19	22	0	29	30	24	38	38	33	50	281
17-Jan-26 14:00	19	22	0	28	30	23	38	38	32	50	280
17-Jan-26 15:00	19	23	0	29	30	24	37	38	34	50	285
17-Jan-26 16:00	19	21	0	33	30	25	34	38	33	50	283
17-Jan-26 17:00	19	21	0	34	29	26	33	38	33	50	283
17-Jan-26 18:00	19	21	0	32	29	24	38	37	33	50	284
17-Jan-26 19:00	19	22	0	31	30	24	38	38	33	50	284
17-Jan-26 20:00	19	22	0	31	30	25	36	38	33	50	284
17-Jan-26 21:00	19	21	0	32	31	24	36	38	33	50	283
17-Jan-26 22:00	19	22	0	32	30	24	35	38	33	50	282
17-Jan-26 23:00	19	22	0	32	30	23	34	38	34	50	281
18-Jan-26 00:00	19	21	0	32	30	23	36	37	33	50	281
18-Jan-26 01:00	19	22	0	31	30	24	37	38	33	50	285
18-Jan-26 02:00	19	21	0	32	30	21	38	38	33	51	283
18-Jan-26 03:00	19	21	0	32	30	24	36	38	33	50	284
18-Jan-26 04:00	19	21	0	31	30	24	36	38	33	50	283
18-Jan-26 05:00	19	22	0	32	30	24	34	38	33	50	282
18-Jan-26 06:00	19	21	0	31	29	25	35	37	33	50	280
18-Jan-26 07:00	19	22	0	32	29	25	34	38	33	50	282
18-Jan-26 08:00	19	21	0	31	30	25	33	38	33	50	280
18-Jan-26 09:00	19	21	0	31	30	25	34	38	33	50	281
18-Jan-26 10:00	19	21	0	31	30	24	34	38	33	50	281
18-Jan-26 11:00	19	21	0	31	30	25	35	38	34	50	284
18-Jan-26 12:00	19	21	0	30	30	25	34	38	33	50	280
18-Jan-26 13:00	19	21	0	29	35	27	27	38	33	50	278
18-Jan-26 14:00	19	20	0	29	30	23	34	33	38	50	277
18-Jan-26 15:00	19	20	0	29	30	23	38	36	35	50	281
18-Jan-26 16:00	19	21	0	29	31	23	38	37	35	50	283
18-Jan-26 17:00	19	22	0	29	30	23	37	37	34	50	280
18-Jan-26 18:00	19	21	0	29	30	24	38	37	33	50	282
18-Jan-26 19:00	19	22	0	30	31	24	37	37	33	50	283
18-Jan-26 20:00	19	22	0	29	31	24	37	37	33	50	283
18-Jan-26 21:00	19	22	0	31	32	25	35	37	33	50	284
18-Jan-26 22:00	19	22	0	30	30	25	37	37	33	51	283
18-Jan-26 23:00	19	22	0	30	31	24	36	37	34	50	284

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
19-Jan-26 00:00	19	22	0	31	32	25	34	37	34	50	284
19-Jan-26 01:00	19	22	0	30	31	24	36	37	34	51	285
19-Jan-26 02:00	19	22	0	30	31	25	35	37	34	50	284
19-Jan-26 03:00	19	22	0	30	30	25	37	37	34	50	285
19-Jan-26 04:00	19	22	0	30	30	22	36	37	33	50	280
19-Jan-26 05:00	20	22	0	30	31	24	33	37	34	51	281
19-Jan-26 06:00	19	22	0	30	31	23	35	37	34	50	281
19-Jan-26 07:00	19	22	0	30	31	24	33	37	34	50	281
19-Jan-26 08:00	19	22	0	30	31	25	32	37	34	50	281
19-Jan-26 09:00	19	22	0	29	30	24	35	37	34	50	281
19-Jan-26 10:00	19	22	0	29	30	24	35	37	34	50	280
19-Jan-26 11:00	19	22	0	28	30	24	33	37	33	50	276
19-Jan-26 12:00	23	21	0	27	30	24	32	37	34	50	278
19-Jan-26 13:00	21	21	0	28	30	24	32	38	35	50	279
19-Jan-26 14:00	19	21	0	27	30	27	32	38	35	50	280
19-Jan-26 15:00	19	21	0	28	30	24	37	37	34	51	280
19-Jan-26 16:00	19	21	0	27	29	24	37	37	33	50	277
19-Jan-26 17:00	19	21	0	27	30	24	38	37	33	51	280
19-Jan-26 18:00	19	21	0	28	31	25	36	37	35	50	282
19-Jan-26 19:00	19	21	0	27	31	23	38	37	35	50	282
19-Jan-26 20:00	20	21	0	29	31	25	35	37	34	50	282
19-Jan-26 21:00	20	20	0	29	31	25	35	35	36	50	281
19-Jan-26 22:00	20	20	0	29	31	26	33	37	34	50	280
19-Jan-26 23:00	20	20	0	29	31	25	35	37	33	51	280
20-Jan-26 00:00	20	20	0	29	31	26	33	37	34	50	281
20-Jan-26 01:00	20	20	0	29	31	26	34	37	34	51	281
20-Jan-26 02:00	20	20	0	31	31	25	35	37	33	50	283
20-Jan-26 03:00	20	20	0	31	32	25	34	37	34	50	284
20-Jan-26 04:00	20	20	0	31	31	25	34	37	34	50	282
20-Jan-26 05:00	20	20	0	31	31	25	32	37	34	50	280
20-Jan-26 06:00	19	19	0	31	31	26	35	37	34	49	280
20-Jan-26 07:00	19	19	0	31	31	27	33	37	34	50	282
20-Jan-26 08:00	19	19	0	31	31	26	34	37	34	50	280
20-Jan-26 09:00	19	19	0	30	31	27	34	37	34	51	281
20-Jan-26 10:00	19	19	0	30	31	26	36	37	34	50	281
20-Jan-26 11:00	19	19	0	30	31	26	36	37	34	50	282
20-Jan-26 12:00	19	19	0	30	31	24	37	39	31	50	280
20-Jan-26 13:00	19	20	0	34	31	25	28	38	35	50	281
20-Jan-26 14:00	19	20	0	34	31	25	30	37	34	50	281
20-Jan-26 15:00	19	23	0	32	31	24	28	37	33	50	277
20-Jan-26 16:00	19	23	0	29	31	23	36	37	33	50	282
20-Jan-26 17:00	20	20	0	31	32	24	35	37	34	50	283
20-Jan-26 18:00	21	21	0	32	32	24	36	37	34	50	288
20-Jan-26 19:00	22	22	0	32	32	25	32	37	34	50	287
20-Jan-26 20:00	21	21	0	31	31	25	32	37	33	50	282
20-Jan-26 21:00	21	21	0	32	32	25	32	37	33	50	284
20-Jan-26 22:00	21	21	0	32	32	24	33	37	34	50	285
20-Jan-26 23:00	21	21	0	32	33	25	32	37	34	50	284

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
21-Jan-26 00:00	21	21	0	32	32	24	31	37	33	50	283
21-Jan-26 01:00	20	20	0	32	32	25	29	37	34	51	280
21-Jan-26 02:00	20	20	0	33	32	25	30	37	34	51	280
21-Jan-26 03:00	20	20	0	32	31	24	29	37	34	50	277
21-Jan-26 04:00	20	20	0	33	32	25	33	37	34	50	285
21-Jan-26 05:00	20	20	0	32	32	26	30	37	33	50	280
21-Jan-26 06:00	19	19	0	32	32	26	32	37	34	50	281
21-Jan-26 07:00	19	19	0	32	32	25	30	37	34	51	278
21-Jan-26 08:00	19	19	0	31	31	25	31	37	34	50	278
21-Jan-26 09:00	19	19	0	31	31	24	34	37	34	50	279
21-Jan-26 10:00	19	19	0	31	31	24	33	37	34	50	279
21-Jan-26 11:00	19	19	0	31	31	25	33	37	34	50	280
21-Jan-26 12:00	19	19	0	31	31	24	37	37	34	50	282
21-Jan-26 13:00	19	19	0	31	32	24	36	37	35	50	283
21-Jan-26 14:00	19	19	0	31	35	26	32	37	34	51	283
21-Jan-26 15:00	19	19	0	31	30	24	38	32	39	50	282
21-Jan-26 16:00	19	19	0	31	32	24	36	37	35	51	283
21-Jan-26 17:00	19	19	0	31	31	22	38	37	34	50	281
21-Jan-26 18:00	19	19	0	31	31	24	38	37	34	51	283
21-Jan-26 19:00	19	19	0	31	31	24	37	37	34	50	283
21-Jan-26 20:00	19	19	0	31	32	25	36	38	34	50	285
21-Jan-26 21:00	19	19	0	31	34	24	36	37	33	50	283
21-Jan-26 22:00	19	19	0	31	33	23	37	37	33	51	283
21-Jan-26 23:00	19	19	0	31	34	23	38	38	34	51	286
22-Jan-26 00:00	19	19	0	31	33	23	37	38	34	50	284
22-Jan-26 01:00	19	19	0	31	34	23	37	38	33	50	283
22-Jan-26 02:00	19	19	0	31	34	24	34	38	33	50	281
22-Jan-26 03:00	19	19	0	31	34	23	35	38	33	50	284
22-Jan-26 04:00	19	19	0	31	33	24	37	37	32	51	282
22-Jan-26 05:00	19	19	0	31	33	23	38	38	33	50	285
22-Jan-26 06:00	19	19	0	31	33	22	38	38	33	50	283
22-Jan-26 07:00	19	19	0	31	33	24	37	38	33	51	284
22-Jan-26 08:00	19	19	0	31	33	25	34	38	33	51	283
22-Jan-26 09:00	19	19	0	31	34	25	33	38	33	50	282
22-Jan-26 10:00	19	19	0	31	34	26	31	39	34	51	283
22-Jan-26 11:00	19	19	0	31	33	26	31	38	33	51	280
22-Jan-26 12:00	19	19	0	31	34	25	31	38	33	50	281
22-Jan-26 13:00	23	19	0	31	31	25	30	38	33	50	280
22-Jan-26 14:00	20	19	0	31	31	25	34	38	33	50	282
22-Jan-26 15:00	19	19	0	30	31	21	32	38	33	50	273
22-Jan-26 16:00	19	19	0	31	32	23	32	38	33	50	276
22-Jan-26 17:00	19	19	0	31	30	24	32	37	32	50	275
22-Jan-26 18:00	19	21	0	32	33	26	35	38	33	50	288
22-Jan-26 19:00	19	21	0	32	33	24	37	38	33	51	288
22-Jan-26 20:00	19	21	0	32	33	25	37	37	35	50	289
22-Jan-26 21:00	19	21	0	32	34	25	36	38	32	50	287
22-Jan-26 22:00	19	21	0	32	30	23	32	40	8	50	254
22-Jan-26 23:00	19	21	0	32	0	17	37	40	38	50	254

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
23-Jan-26 00:00	21	23	0	34	0	14	35	40	37	50	254
23-Jan-26 01:00	21	23	0	34	0	15	33	41	36	50	253
23-Jan-26 02:00	21	23	0	34	0	16	33	40	36	50	254
23-Jan-26 03:00	22	23	0	34	0	14	34	41	36	50	253
23-Jan-26 04:00	21	23	0	33	0	14	33	41	36	51	251
23-Jan-26 05:00	21	23	0	34	0	15	32	40	37	50	252
23-Jan-26 06:00	21	23	0	34	0	15	33	41	36	50	253
23-Jan-26 07:00	21	23	0	34	0	15	32	40	36	51	251
23-Jan-26 08:00	21	23	0	34	0	15	29	40	36	50	249
23-Jan-26 09:00	21	23	0	34	0	15	27	41	36	50	248
23-Jan-26 10:00	21	22	0	33	0	15	29	40	36	50	247
23-Jan-26 11:00	21	21	0	34	0	15	28	39	36	50	246
23-Jan-26 12:00	20	23	0	34	0	15	28	39	36	50	244
23-Jan-26 13:00	20	22	0	33	0	15	29	39	36	50	245
23-Jan-26 14:00	21	21	0	33	0	15	31	38	36	50	245
23-Jan-26 15:00	21	21	0	33	0	15	31	38	36	50	245
23-Jan-26 16:00	21	21	0	33	0	15	31	38	36	50	245
23-Jan-26 17:00	21	21	0	33	0	15	34	39	36	51	248
23-Jan-26 18:00	21	21	0	33	0	15	34	39	35	51	249
23-Jan-26 19:00	22	22	0	33	0	16	32	39	36	50	250
23-Jan-26 20:00	21	22	0	33	0	17	33	39	36	50	250
23-Jan-26 21:00	21	21	0	33	0	17	35	39	36	50	252
23-Jan-26 22:00	21	22	0	33	0	17	33	39	36	50	250
23-Jan-26 23:00	21	22	0	33	0	17	33	39	36	51	251
24-Jan-26 00:00	21	22	0	34	0	17	33	39	35	50	251
24-Jan-26 01:00	21	22	0	33	0	17	34	39	36	50	252
24-Jan-26 02:00	21	22	0	33	0	17	34	40	35	51	252
24-Jan-26 03:00	21	21	0	33	0	17	34	39	36	50	251
24-Jan-26 04:00	21	22	0	33	0	16	35	39	36	51	253
24-Jan-26 05:00	21	22	0	33	0	17	34	39	36	50	251
24-Jan-26 06:00	21	22	0	33	0	16	33	40	36	51	252
24-Jan-26 07:00	22	22	0	33	0	16	32	39	36	50	250
24-Jan-26 08:00	20	22	0	33	0	15	32	39	36	50	246
24-Jan-26 09:00	21	22	0	33	0	15	30	39	36	50	245
24-Jan-26 10:00	20	21	0	33	0	15	28	39	36	50	243
24-Jan-26 11:00	21	21	0	33	0	15	26	39	35	51	241
24-Jan-26 12:00	21	22	0	33	0	15	29	39	35	50	245
24-Jan-26 13:00	20	20	0	33	0	15	27	38	36	50	239
24-Jan-26 14:00	20	20	0	33	0	16	29	38	35	50	242
24-Jan-26 15:00	20	20	0	33	0	15	30	39	35	50	242
24-Jan-26 16:00	20	20	0	33	0	15	30	39	35	50	242
24-Jan-26 17:00	20	20	0	33	0	15	30	39	35	50	242
24-Jan-26 18:00	20	20	0	33	0	15	30	39	35	50	242
24-Jan-26 19:00	20	20	0	33	0	15	30	39	35	50	243
24-Jan-26 20:00	20	20	0	33	0	16	32	40	35	50	245
24-Jan-26 21:00	19	19	0	33	0	16	33	40	35	51	245
24-Jan-26 22:00	19	19	0	33	0	16	32	40	35	50	243
24-Jan-26 23:00	19	19	0	33	0	15	33	40	35	50	243

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
25-Jan-26 00:00	19	19	0	33	0	15	32	40	35	50	243
25-Jan-26 01:00	19	19	0	33	0	15	32	40	35	51	244
25-Jan-26 02:00	19	19	0	33	0	15	32	40	35	50	243
25-Jan-26 03:00	19	19	0	34	0	15	33	39	35	50	244
25-Jan-26 04:00	19	19	0	33	0	15	33	40	35	50	244
25-Jan-26 05:00	19	19	0	33	0	15	33	40	35	50	244
25-Jan-26 06:00	19	19	0	33	0	15	32	40	35	50	243
25-Jan-26 07:00	19	19	0	33	0	15	31	39	35	50	242
25-Jan-26 08:00	19	19	0	33	0	15	30	39	35	50	241
25-Jan-26 09:00	19	19	0	33	0	16	30	40	35	50	242
25-Jan-26 10:00	19	19	0	33	0	16	26	40	32	51	235
25-Jan-26 11:00	18	19	0	26	27	19	28	39	15	50	241
25-Jan-26 12:00	23	20	0	31	31	17	29	39	0	50	240
25-Jan-26 13:00	20	20	0	31	31	17	29	39	0	50	237
25-Jan-26 14:00	20	20	0	31	31	17	31	39	0	50	239
25-Jan-26 15:00	20	20	0	30	31	17	32	39	0	50	240
25-Jan-26 16:00	21	20	0	31	31	17	35	39	0	50	244
25-Jan-26 17:00	20	20	0	31	30	17	34	39	0	50	243
25-Jan-26 18:00	20	20	0	31	30	17	34	39	0	51	244
25-Jan-26 19:00	20	20	0	31	31	18	36	39	0	50	246
25-Jan-26 20:00	20	20	0	31	31	18	35	39	0	50	244
25-Jan-26 21:00	20	19	0	31	31	18	37	40	0	50	247
25-Jan-26 22:00	21	20	0	31	30	18	36	39	0	50	245
25-Jan-26 23:00	21	20	0	31	31	17	36	40	0	50	246
26-Jan-26 00:00	20	20	0	31	30	18	35	40	0	50	244
26-Jan-26 01:00	20	20	0	31	31	18	33	39	0	50	243
26-Jan-26 02:00	21	20	0	31	32	18	34	38	0	51	244
26-Jan-26 03:00	20	20	0	30	31	18	33	39	0	50	242
26-Jan-26 04:00	21	20	0	31	31	18	32	39	0	50	242
26-Jan-26 05:00	22	20	0	31	31	18	33	39	0	50	244
26-Jan-26 06:00	22	20	0	31	31	17	31	39	0	50	241
26-Jan-26 07:00	22	20	0	30	30	16	35	39	0	50	242
26-Jan-26 08:00	23	20	0	30	30	16	34	40	0	50	243
26-Jan-26 09:00	23	19	0	29	30	14	37	39	0	50	241
26-Jan-26 10:00	23	20	0	28	30	15	34	39	0	50	239
26-Jan-26 11:00	20	21	0	29	29	16	28	39	0	50	232
26-Jan-26 12:00	19	21	0	28	29	16	33	39	0	50	235
26-Jan-26 13:00	19	23	0	28	29	15	30	39	0	50	233
26-Jan-26 14:00	19	19	0	34	29	17	25	39	0	50	232
26-Jan-26 15:00	19	21	0	28	29	15	33	39	0	50	234
26-Jan-26 16:00	19	22	0	29	29	15	31	39	0	50	234
26-Jan-26 17:00	19	22	0	28	29	15	32	39	0	50	234
26-Jan-26 18:00	20	23	0	28	29	15	32	39	0	50	235
26-Jan-26 19:00	19	22	0	28	29	15	32	39	0	50	235
26-Jan-26 20:00	19	23	0	28	29	15	30	40	0	51	233
26-Jan-26 21:00	19	23	0	28	29	15	31	39	0	50	235
26-Jan-26 22:00	19	23	0	28	29	15	30	40	0	50	235
26-Jan-26 23:00	19	23	0	28	29	15	31	40	0	50	234

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
27-Jan-26 00:00	19	22	0	28	28	15	32	40	0	50	235
27-Jan-26 01:00	17	19	0	28	28	16	28	40	0	50	227
27-Jan-26 02:00	18	19	0	28	28	15	29	40	0	50	226
27-Jan-26 03:00	18	19	0	28	28	16	29	40	0	50	227
27-Jan-26 04:00	17	19	0	28	28	16	28	40	0	50	225
27-Jan-26 05:00	16	19	0	28	28	15	28	40	0	50	224
27-Jan-26 06:00	17	19	0	28	27	16	27	40	0	50	224
27-Jan-26 07:00	18	19	0	27	27	15	29	40	0	51	226
27-Jan-26 08:00	17	19	0	27	27	15	28	40	0	50	224
27-Jan-26 09:00	17	19	0	28	27	17	28	40	0	50	225
27-Jan-26 10:00	16	19	0	27	27	16	26	40	0	50	221
27-Jan-26 11:00	16	18	0	27	27	15	27	39	0	50	219
27-Jan-26 12:00	16	18	0	26	27	14	25	39	0	50	214
27-Jan-26 13:00	15	18	0	26	27	13	25	39	0	50	213
27-Jan-26 14:00	16	18	0	26	27	14	25	39	0	50	215
27-Jan-26 15:00	17	18	0	26	27	14	27	38	0	50	216
27-Jan-26 16:00	17	18	0	26	27	14	27	39	0	50	218
27-Jan-26 17:00	16	18	0	26	27	14	26	39	0	50	215
27-Jan-26 18:00	15	18	0	26	27	14	25	39	0	50	214
27-Jan-26 19:00	16	18	0	26	27	14	25	39	0	50	216
27-Jan-26 20:00	15	18	0	26	27	15	25	39	0	50	215
27-Jan-26 21:00	16	18	0	26	27	14	33	40	0	42	215
27-Jan-26 22:00	16	18	0	26	27	15	24	40	0	50	216
27-Jan-26 23:00	16	18	0	25	27	15	26	40	0	50	217
28-Jan-26 00:00	16	18	0	26	27	14	26	40	0	51	218
28-Jan-26 01:00	16	18	0	26	27	15	26	40	0	51	218
28-Jan-26 02:00	15	18	0	26	27	15	24	40	0	50	215
28-Jan-26 03:00	15	18	0	26	27	15	24	40	0	50	215
28-Jan-26 04:00	15	18	0	26	27	15	24	40	0	51	216
28-Jan-26 05:00	16	18	0	26	27	15	26	40	0	51	219
28-Jan-26 06:00	17	18	0	26	27	15	26	40	0	51	219
28-Jan-26 07:00	17	18	0	26	27	15	27	40	0	51	220
28-Jan-26 08:00	16	18	0	26	27	15	26	40	0	50	218
28-Jan-26 09:00	16	18	0	26	27	15	27	40	0	51	218
28-Jan-26 10:00	15	18	0	26	27	14	26	40	0	51	216
28-Jan-26 11:00	15	18	0	26	27	15	25	39	0	50	216
28-Jan-26 12:00	14	18	0	26	27	14	24	39	0	50	212
28-Jan-26 13:00	15	18	0	25	27	17	25	38	0	46	212
28-Jan-26 14:00	16	18	0	26	27	17	26	38	0	46	213
28-Jan-26 15:00	16	18	0	26	27	17	27	39	0	46	215
28-Jan-26 16:00	16	18	0	26	26	18	27	39	0	50	220
28-Jan-26 17:00	17	18	0	26	27	17	29	39	0	50	223
28-Jan-26 18:00	16	18	0	26	27	19	27	39	0	49	221
28-Jan-26 19:00	16	18	0	26	27	19	26	39	0	50	222
28-Jan-26 20:00	16	18	0	26	27	18	26	40	0	50	220
28-Jan-26 21:00	17	18	0	26	27	18	29	39	0	47	221
28-Jan-26 22:00	16	18	0	26	27	17	26	40	0	50	220
28-Jan-26 23:00	16	18	0	26	27	15	28	39	0	50	221

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
29-Jan-26 00:00	17	18	0	26	27	16	28	40	0	50	221
29-Jan-26 01:00	17	18	0	26	26	15	29	39	0	50	220
29-Jan-26 02:00	17	18	0	26	27	15	29	39	0	50	221
29-Jan-26 03:00	17	18	0	26	28	15	28	39	0	50	221
29-Jan-26 04:00	17	18	0	26	27	16	27	40	0	50	219
29-Jan-26 05:00	17	18	0	26	28	16	27	39	0	50	221
29-Jan-26 06:00	18	18	0	26	27	14	31	40	0	50	223
29-Jan-26 07:00	18	18	0	26	27	15	29	40	0	50	223
29-Jan-26 08:00	18	18	0	26	27	14	30	39	0	50	222
29-Jan-26 09:00	18	18	0	26	27	15	30	40	0	50	224
29-Jan-26 10:00	18	18	0	26	27	15	29	40	0	50	222
29-Jan-26 11:00	17	18	0	26	27	16	27	39	0	49	220
29-Jan-26 12:00	17	18	0	26	27	17	27	39	0	50	221
29-Jan-26 13:00	17	18	0	26	27	15	28	39	0	50	220
29-Jan-26 14:00	17	18	0	26	27	16	28	39	0	50	222
29-Jan-26 15:00	17	23	0	26	27	15	28	39	0	51	226
29-Jan-26 16:00	15	18	0	34	27	19	25	41	0	51	230
29-Jan-26 17:00	19	18	0	29	27	17	30	41	0	50	231
29-Jan-26 18:00	18	19	0	27	27	18	30	41	0	50	230
29-Jan-26 19:00	19	19	0	27	27	17	31	41	0	51	232
29-Jan-26 20:00	20	19	0	27	27	17	32	40	0	50	233
29-Jan-26 21:00	20	19	0	27	27	18	32	41	0	50	233
29-Jan-26 22:00	19	19	0	27	27	18	31	40	0	50	232
29-Jan-26 23:00	20	19	0	28	27	18	32	41	0	50	234
30-Jan-26 00:00	20	19	0	27	26	17	33	41	0	50	232
30-Jan-26 01:00	20	19	0	27	26	16	33	41	0	49	231
30-Jan-26 02:00	19	19	0	27	27	18	32	40	0	50	232
30-Jan-26 03:00	19	19	0	27	27	18	31	40	0	50	231
30-Jan-26 04:00	20	19	0	27	27	16	33	40	0	50	233
30-Jan-26 05:00	20	19	0	27	27	15	33	40	0	50	232
30-Jan-26 06:00	20	19	0	27	27	15	33	40	0	50	231
30-Jan-26 07:00	20	19	0	27	27	17	32	41	0	50	233
30-Jan-26 08:00	19	19	0	27	27	16	31	40	0	50	229
30-Jan-26 09:00	19	19	0	27	27	16	32	39	0	49	229
30-Jan-26 10:00	20	19	0	27	27	16	32	39	0	50	230
30-Jan-26 11:00	20	19	0	27	27	17	33	39	0	50	232
30-Jan-26 12:00	19	19	0	27	27	16	32	38	0	50	228
30-Jan-26 13:00	17	19	0	27	34	17	27	38	0	50	230
30-Jan-26 14:00	20	19	0	27	27	14	32	38	0	50	229
30-Jan-26 15:00	20	19	0	26	27	16	32	39	0	50	229
30-Jan-26 16:00	20	19	0	27	27	15	33	40	0	50	230
30-Jan-26 17:00	20	19	0	27	27	15	33	40	0	50	231
30-Jan-26 18:00	21	19	0	27	27	15	33	40	0	50	233
30-Jan-26 19:00	20	19	0	27	27	16	34	40	0	50	234
30-Jan-26 20:00	20	20	0	27	27	16	33	40	0	50	233
30-Jan-26 21:00	20	20	0	27	27	16	33	40	0	49	232
30-Jan-26 22:00	21	20	0	27	27	16	33	40	0	49	232
30-Jan-26 23:00	20	20	0	28	28	15	32	40	0	51	234

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
31-Jan-26 00:00	20	20	0	28	28	15	32	40	0	51	233
31-Jan-26 01:00	20	20	0	28	28	16	32	40	0	50	235
31-Jan-26 02:00	19	20	0	27	28	16	31	40	0	50	233
31-Jan-26 03:00	19	20	0	27	28	15	32	40	0	50	232
31-Jan-26 04:00	19	20	0	27	27	17	31	41	0	50	233
31-Jan-26 05:00	20	20	0	28	27	16	32	40	0	50	234
31-Jan-26 06:00	19	20	0	27	28	15	33	41	0	50	233
31-Jan-26 07:00	19	20	0	28	27	15	32	40	0	51	232
31-Jan-26 08:00	18	20	0	28	28	16	30	40	0	50	230
31-Jan-26 09:00	19	20	0	27	27	16	31	40	0	50	230
31-Jan-26 10:00	19	20	0	27	28	16	32	39	0	50	230
31-Jan-26 11:00	19	20	0	27	27	15	31	39	0	50	229
31-Jan-26 12:00	19	20	0	27	28	15	30	40	0	50	229
31-Jan-26 13:00	21	19	0	28	28	16	37	40	0	41	229
31-Jan-26 14:00	23	20	0	28	28	19	25	40	0	51	233
31-Jan-26 15:00	20	20	0	27	27	18	31	40	0	51	233
31-Jan-26 16:00	20	20	0	28	28	17	33	40	0	50	235
31-Jan-26 17:00	21	20	0	27	28	17	34	40	0	50	237
31-Jan-26 18:00	21	20	0	28	28	17	35	40	0	50	238
31-Jan-26 19:00	20	21	0	28	28	18	33	40	0	50	239
31-Jan-26 20:00	20	21	0	28	28	19	32	40	0	49	237
31-Jan-26 21:00	20	21	0	28	28	18	33	40	0	51	238
31-Jan-26 22:00	19	21	0	29	28	17	33	40	0	50	238
31-Jan-26 23:00	19	21	0	28	28	18	33	40	0	51	238
01-Feb-26 00:00	19	21	0	28	28	18	32	40	0	50	236
01-Feb-26 01:00	18	21	0	28	27	21	31	40	0	50	237
01-Feb-26 02:00	19	21	0	28	28	19	31	41	0	50	237
01-Feb-26 03:00	19	21	0	28	28	18	32	40	0	50	237
01-Feb-26 04:00	20	21	0	27	28	19	32	40	0	49	236
01-Feb-26 05:00	19	21	0	28	28	18	32	41	0	50	237
01-Feb-26 06:00	20	21	0	27	27	19	33	41	0	51	239
01-Feb-26 07:00	19	21	0	28	28	19	32	41	0	50	238
01-Feb-26 08:00	20	20	0	27	27	18	33	40	0	51	235
01-Feb-26 09:00	20	20	0	26	27	17	32	40	0	50	233
01-Feb-26 10:00	19	20	0	27	27	16	32	39	0	50	231
01-Feb-26 11:00	19	20	0	27	26	15	32	39	0	51	230
01-Feb-26 12:00	19	20	0	27	27	18	31	38	0	50	230
01-Feb-26 13:00	18	23	0	27	27	17	30	38	0	50	231
01-Feb-26 14:00	19	20	0	34	27	18	28	41	0	47	234
01-Feb-26 15:00	20	20	0	28	27	17	32	38	0	51	232
01-Feb-26 16:00	20	20	0	27	26	17	33	38	0	50	232
01-Feb-26 17:00	21	21	0	27	27	17	35	39	0	51	236
01-Feb-26 18:00	21	21	0	27	27	16	35	39	0	51	236
01-Feb-26 19:00	20	22	0	27	28	18	33	41	0	50	239
01-Feb-26 20:00	20	21	0	27	27	18	33	41	0	50	238
01-Feb-26 21:00	20	21	0	27	27	19	32	41	0	51	238
01-Feb-26 22:00	20	20	0	27	27	17	34	40	0	51	236
01-Feb-26 23:00	19	20	0	28	28	17	36	41	0	51	240

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
02-Feb-26 00:00	19	19	0	27	28	17	35	41	0	50	236
02-Feb-26 01:00	19	20	0	28	28	16	36	40	0	51	238
02-Feb-26 02:00	19	20	0	27	28	15	37	41	0	51	237
02-Feb-26 03:00	19	19	0	28	28	16	37	41	0	50	239
02-Feb-26 04:00	19	19	0	27	28	15	37	41	0	51	236
02-Feb-26 05:00	19	19	0	28	28	16	36	41	0	51	237
02-Feb-26 06:00	19	20	0	28	28	15	38	41	0	50	239
02-Feb-26 07:00	19	19	0	28	28	17	35	41	0	50	237
02-Feb-26 08:00	19	20	0	27	27	17	35	41	0	51	237
02-Feb-26 09:00	19	19	0	28	28	14	37	40	0	50	236
02-Feb-26 10:00	19	19	0	28	28	18	32	40	0	51	233
02-Feb-26 11:00	19	19	0	27	28	16	31	39	15	51	246
02-Feb-26 12:00	19	19	0	28	28	16	33	39	16	50	247
02-Feb-26 13:00	19	19	0	28	28	17	30	38	25	50	254
02-Feb-26 14:00	19	19	0	28	28	19	29	38	34	50	263
02-Feb-26 15:00	19	19	0	28	28	21	29	35	35	50	265
02-Feb-26 16:00	19	19	0	28	27	20	33	33	39	50	266
02-Feb-26 17:00	18	18	0	26	34	22	31	34	37	50	270
02-Feb-26 18:00	19	19	0	27	31	22	32	33	36	50	270
02-Feb-26 19:00	19	19	0	27	31	20	34	34	37	50	271
02-Feb-26 20:00	19	19	0	27	31	21	33	33	37	50	270
02-Feb-26 21:00	19	19	0	27	31	21	34	34	37	50	273
02-Feb-26 22:00	19	20	0	28	31	23	32	34	37	50	275
02-Feb-26 23:00	20	20	0	29	31	22	34	34	37	50	278
03-Feb-26 00:00	20	20	0	28	31	23	31	34	37	50	275
03-Feb-26 01:00	20	20	0	28	31	23	33	34	37	50	277
03-Feb-26 02:00	20	20	0	28	31	21	35	34	37	50	278
03-Feb-26 03:00	20	21	0	28	31	21	35	34	37	50	278
03-Feb-26 04:00	23	20	0	28	31	22	32	34	37	50	278
03-Feb-26 05:00	22	20	0	28	31	22	34	34	37	50	278
03-Feb-26 06:00	22	20	0	28	31	22	32	34	37	50	275
03-Feb-26 07:00	22	20	0	27	30	21	34	34	37	50	276
03-Feb-26 08:00	23	20	0	27	29	21	34	34	37	50	274
03-Feb-26 09:00	23	20	0	27	30	20	33	35	38	50	276
03-Feb-26 10:00	22	20	0	27	30	21	33	35	37	50	275
03-Feb-26 11:00	22	20	0	27	30	21	32	34	37	51	274
03-Feb-26 12:00	22	20	0	27	30	21	31	34	37	50	272
03-Feb-26 13:00	21	20	0	27	28	21	35	34	37	50	273
03-Feb-26 14:00	21	20	0	27	29	21	33	34	37	50	273
03-Feb-26 15:00	21	20	0	27	30	22	36	34	37	50	276
03-Feb-26 16:00	22	21	0	27	31	21	35	35	37	50	279
03-Feb-26 17:00	22	21	0	27	31	23	32	34	37	50	277
03-Feb-26 18:00	22	20	0	27	30	22	32	34	37	50	275
03-Feb-26 19:00	22	20	0	27	30	23	31	34	37	50	273
03-Feb-26 20:00	22	20	0	27	30	23	31	34	37	50	274
03-Feb-26 21:00	22	20	0	28	30	23	34	34	37	51	280
03-Feb-26 22:00	22	19	0	29	30	24	35	34	37	50	281
03-Feb-26 23:00	21	20	0	29	30	23	35	34	37	50	280

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
04-Feb-26 00:00	22	21	0	29	30	23	32	34	37	50	278
04-Feb-26 01:00	22	21	0	29	30	24	31	34	37	50	278
04-Feb-26 02:00	23	21	0	29	30	23	32	33	37	50	278
04-Feb-26 03:00	22	21	0	29	30	23	32	34	37	50	279
04-Feb-26 04:00	22	21	0	29	30	23	34	34	37	50	280
04-Feb-26 05:00	22	21	0	29	30	23	32	34	37	50	278
04-Feb-26 06:00	22	21	0	29	30	24	31	34	37	51	277
04-Feb-26 07:00	22	21	0	29	30	24	29	34	37	50	275
04-Feb-26 08:00	19	21	0	29	30	23	33	34	37	50	276
04-Feb-26 09:00	19	21	0	29	30	23	32	35	36	50	275
04-Feb-26 10:00	19	21	0	28	29	23	33	38	33	51	275
04-Feb-26 11:00	19	21	0	28	29	23	33	37	33	50	273
04-Feb-26 12:00	19	21	0	28	28	23	34	38	34	49	274
04-Feb-26 13:00	19	23	0	28	28	24	30	38	34	50	273
04-Feb-26 14:00	19	19	0	34	28	24	29	37	34	50	273
04-Feb-26 15:00	19	20	0	28	28	22	37	38	32	50	273
04-Feb-26 16:00	19	20	0	28	29	22	34	38	32	49	271
04-Feb-26 17:00	19	21	0	27	27	23	35	37	33	50	273
04-Feb-26 18:00	19	20	0	28	28	23	35	37	33	50	274
04-Feb-26 19:00	19	21	0	28	28	23	35	37	33	50	274
04-Feb-26 20:00	19	20	0	28	27	23	35	37	34	50	274
04-Feb-26 21:00	19	20	0	28	27	23	35	37	33	50	274
04-Feb-26 22:00	19	20	0	28	28	23	35	38	33	50	275
04-Feb-26 23:00	19	20	0	28	29	23	36	37	34	50	277
05-Feb-26 00:00	19	20	0	28	28	23	36	38	33	50	275
05-Feb-26 01:00	19	20	0	28	27	23	36	38	33	50	275
05-Feb-26 02:00	19	20	0	27	27	23	36	38	34	50	274
05-Feb-26 03:00	19	20	0	28	28	24	36	38	33	50	276
05-Feb-26 04:00	19	20	0	28	28	23	37	37	34	51	277
05-Feb-26 05:00	19	20	0	27	27	23	37	37	33	50	275
05-Feb-26 06:00	20	20	0	28	28	24	38	38	33	50	279
05-Feb-26 07:00	20	20	0	28	28	23	37	37	33	50	277
05-Feb-26 08:00	19	20	0	29	29	23	37	38	33	50	277
05-Feb-26 09:00	19	20	0	28	30	23	37	38	34	50	279
05-Feb-26 10:00	19	21	0	28	29	23	35	37	34	50	275
05-Feb-26 11:00	19	21	0	28	29	23	37	37	34	51	278
05-Feb-26 12:00	19	20	0	27	28	23	33	37	34	50	274
05-Feb-26 13:00	19	20	0	28	33	25	29	37	34	50	275
05-Feb-26 14:00	19	21	0	28	30	23	35	32	38	50	276
05-Feb-26 15:00	19	21	0	28	30	24	35	33	38	50	279
05-Feb-26 16:00	19	21	0	29	31	24	35	36	34	50	279
05-Feb-26 17:00	19	22	0	28	30	24	36	36	35	50	280
05-Feb-26 18:00	19	22	0	28	30	24	36	36	35	50	280
05-Feb-26 19:00	19	22	0	28	30	24	37	36	35	50	280
05-Feb-26 20:00	19	22	0	28	30	23	38	36	35	50	281
05-Feb-26 21:00	19	22	0	29	30	22	37	36	35	50	280
05-Feb-26 22:00	19	22	0	29	29	22	37	36	34	50	280
05-Feb-26 23:00	19	22	0	29	29	23	37	36	35	51	281

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
06-Feb-26 00:00	20	22	0	28	30	23	37	36	35	49	280
06-Feb-26 01:00	19	22	0	28	29	22	37	36	35	50	279
06-Feb-26 02:00	19	21	0	27	29	22	35	36	35	50	273
06-Feb-26 03:00	19	21	0	27	29	22	34	36	34	50	273
06-Feb-26 04:00	19	21	0	27	29	22	37	36	35	50	277
06-Feb-26 05:00	19	21	0	27	30	22	35	36	35	50	275
06-Feb-26 06:00	19	21	0	27	29	21	37	36	35	50	275
06-Feb-26 07:00	19	21	0	28	29	23	33	36	35	50	275
06-Feb-26 08:00	20	21	0	28	29	23	34	34	37	50	276
06-Feb-26 09:00	20	21	0	28	29	21	35	34	37	50	275
06-Feb-26 10:00	20	19	0	27	28	21	32	35	37	50	269
06-Feb-26 11:00	19	19	0	27	29	21	34	34	37	50	268
06-Feb-26 12:00	19	20	0	25	30	22	34	34	37	51	271
06-Feb-26 13:00	19	20	0	25	30	21	33	34	37	50	268
06-Feb-26 14:00	19	20	0	26	30	22	32	34	37	51	270
06-Feb-26 15:00	19	19	0	26	30	21	34	34	37	50	269
06-Feb-26 16:00	19	19	0	26	30	21	34	34	37	50	271
06-Feb-26 17:00	19	19	0	26	30	21	35	34	37	51	272
06-Feb-26 18:00	19	20	0	27	30	22	35	34	37	50	274
06-Feb-26 19:00	19	20	0	27	30	23	35	34	37	50	274
06-Feb-26 20:00	19	20	0	27	30	22	36	34	37	50	275
06-Feb-26 21:00	19	20	0	26	30	22	37	34	37	50	276
06-Feb-26 22:00	20	20	0	28	30	23	33	34	37	50	276
06-Feb-26 23:00	20	20	0	27	30	23	35	35	37	50	276
07-Feb-26 00:00	19	20	0	27	30	22	36	34	37	50	275
07-Feb-26 01:00	20	20	0	27	30	23	37	34	37	50	277
07-Feb-26 02:00	20	20	0	29	30	23	36	33	37	49	278
07-Feb-26 03:00	20	20	0	29	30	23	34	34	37	50	276
07-Feb-26 04:00	20	20	0	29	30	23	36	34	37	50	280
07-Feb-26 05:00	20	20	0	30	31	24	34	34	37	50	279
07-Feb-26 06:00	20	20	0	29	30	24	32	34	37	50	276
07-Feb-26 07:00	20	20	0	29	31	23	32	34	37	51	277
07-Feb-26 08:00	20	20	0	29	30	24	31	34	37	50	275
07-Feb-26 09:00	20	20	0	29	29	23	32	33	37	50	273
07-Feb-26 10:00	20	19	0	29	31	23	30	35	38	50	274
07-Feb-26 11:00	19	19	0	29	30	23	32	35	37	51	275
07-Feb-26 12:00	19	23	0	29	30	24	28	34	37	50	276
07-Feb-26 13:00	19	19	0	34	28	24	26	34	37	50	271
07-Feb-26 14:00	19	19	0	33	28	24	24	33	37	50	267
07-Feb-26 15:00	19	19	0	27	30	21	36	38	33	50	273
07-Feb-26 16:00	19	20	0	28	30	23	32	34	37	50	274
07-Feb-26 17:00	19	20	0	28	30	23	35	34	37	51	276
07-Feb-26 18:00	19	20	0	28	30	23	34	34	38	50	274
07-Feb-26 19:00	19	20	0	29	30	23	36	34	37	50	277
07-Feb-26 20:00	19	20	0	28	30	24	33	34	37	50	274
07-Feb-26 21:00	19	20	0	28	30	24	33	34	37	50	275
07-Feb-26 22:00	19	20	0	28	30	24	33	34	37	50	274
07-Feb-26 23:00	19	20	0	28	30	24	33	34	37	51	275

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
08-Feb-26 00:00	19	20	0	28	30	23	33	34	37	49	274
08-Feb-26 01:00	19	20	0	28	30	24	32	34	37	50	274
08-Feb-26 02:00	19	20	0	28	30	23	33	34	37	50	274
08-Feb-26 03:00	19	20	0	28	30	24	33	34	37	50	275
08-Feb-26 04:00	19	20	0	28	30	23	32	34	37	50	273
08-Feb-26 05:00	19	20	0	28	30	23	33	34	37	50	276
08-Feb-26 06:00	19	20	0	28	30	24	31	33	36	50	271
08-Feb-26 07:00	19	20	0	28	30	24	29	34	37	50	272
08-Feb-26 08:00	19	20	0	28	30	25	28	33	37	51	270
08-Feb-26 09:00	19	20	0	28	30	24	28	34	37	50	269
08-Feb-26 10:00	19	19	0	28	30	24	29	34	37	50	270
08-Feb-26 11:00	19	19	0	29	30	23	29	35	37	50	271
08-Feb-26 12:00	19	19	0	27	33	24	27	34	37	50	270
08-Feb-26 13:00	19	19	0	27	33	24	26	34	37	50	270
08-Feb-26 14:00	19	19	0	27	30	21	32	33	38	50	270
08-Feb-26 15:00	19	19	0	27	30	22	33	32	38	50	272
08-Feb-26 16:00	19	19	0	27	30	22	31	34	37	50	269
08-Feb-26 17:00	21	21	0	35	0	14	36	0	0	43	171
08-Feb-26 18:00	22	22	0	32	0	11	34	19	38	49	228
08-Feb-26 19:00	22	22	0	34	8	15	25	26	39	50	240
08-Feb-26 20:00	20	22	0	34	12	17	25	25	39	47	240
08-Feb-26 21:00	20	19	0	27	26	16	25	25	39	45	241
08-Feb-26 22:00	19	19	0	27	26	16	24	24	39	45	238
08-Feb-26 23:00	17	18	0	27	26	15	24	24	39	43	233
09-Feb-26 00:00	18	18	0	26	26	15	23	24	39	43	232
09-Feb-26 01:00	18	18	0	27	26	15	24	25	40	43	236
09-Feb-26 02:00	18	18	0	27	26	16	22	24	40	43	234
09-Feb-26 03:00	18	18	0	27	25	16	23	24	40	42	233
09-Feb-26 04:00	18	18	0	27	25	16	23	23	40	43	233
09-Feb-26 05:00	18	18	0	26	25	16	23	22	40	42	230
09-Feb-26 06:00	18	18	0	26	26	15	24	24	40	42	234
09-Feb-26 07:00	18	18	0	26	26	15	23	23	40	42	231
09-Feb-26 08:00	18	18	0	27	26	15	24	24	40	42	233
09-Feb-26 09:00	18	18	0	26	26	15	23	23	40	42	232
09-Feb-26 10:00	18	18	0	27	26	15	22	22	39	42	229
09-Feb-26 11:00	18	18	0	27	26	15	21	21	39	42	228
09-Feb-26 12:00	18	18	0	26	26	14	21	22	39	42	225
09-Feb-26 13:00	18	18	0	27	26	13	22	22	39	42	227
09-Feb-26 14:00	18	18	0	27	27	13	23	22	38	42	230
09-Feb-26 15:00	18	18	0	27	26	14	22	19	38	42	224
09-Feb-26 16:00	18	18	0	27	26	13	23	24	39	40	227
09-Feb-26 17:00	18	18	0	27	26	13	22	24	39	40	226
09-Feb-26 18:00	18	18	0	27	26	13	23	24	39	40	228
09-Feb-26 19:00	18	18	0	27	26	14	23	26	39	40	230
09-Feb-26 20:00	18	18	0	27	26	13	27	26	40	40	234
09-Feb-26 21:00	18	18	0	27	26	13	26	26	40	40	233
09-Feb-26 22:00	18	18	0	27	26	14	23	27	40	40	232
09-Feb-26 23:00	18	18	0	27	26	14	25	25	40	41	234

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
10-Feb-26 00:00	18	18	0	27	26	15	24	25	39	41	232
10-Feb-26 01:00	18	19	0	27	26	15	23	23	40	43	234
10-Feb-26 02:00	18	19	0	27	26	16	24	24	40	43	235
10-Feb-26 03:00	17	19	0	27	26	15	23	23	40	43	234
10-Feb-26 04:00	17	19	0	27	26	14	24	23	40	43	234
10-Feb-26 05:00	18	19	0	27	26	15	22	24	41	43	233
10-Feb-26 06:00	17	19	0	27	26	15	22	25	41	42	233
10-Feb-26 07:00	17	19	0	27	26	16	22	23	41	43	233
10-Feb-26 08:00	18	19	0	27	26	15	22	22	40	43	231
10-Feb-26 09:00	17	19	0	27	26	13	22	23	40	43	230
10-Feb-26 10:00	18	19	0	27	26	16	22	20	39	43	229
10-Feb-26 11:00	19	0	0	27	26	17	26	27	39	47	229
10-Feb-26 12:00	19	0	0	27	26	14	27	27	39	50	229
10-Feb-26 13:00	19	0	0	34	26	18	22	23	38	48	229
10-Feb-26 14:00	19	0	0	34	26	15	24	24	38	48	228
10-Feb-26 15:00	19	0	0	27	26	13	25	37	39	44	230
10-Feb-26 16:00	19	0	0	27	26	14	28	28	39	50	231
10-Feb-26 17:00	19	0	0	28	26	13	29	29	39	50	233
10-Feb-26 18:00	19	0	0	27	26	14	29	29	39	50	233
10-Feb-26 19:00	19	0	0	28	26	15	28	28	39	50	233
10-Feb-26 20:00	19	0	0	28	26	15	27	29	35	50	229
10-Feb-26 21:00	19	0	0	27	26	15	26	30	40	50	233
10-Feb-26 22:00	19	0	0	27	26	15	23	33	40	50	234
10-Feb-26 23:00	20	0	0	28	25	15	22	34	41	50	234
11-Feb-26 00:00	19	0	0	27	26	15	23	33	41	50	234
11-Feb-26 01:00	19	0	0	28	25	15	22	33	41	50	233
11-Feb-26 02:00	19	0	0	27	26	15	25	33	41	50	236
11-Feb-26 03:00	19	0	0	28	26	15	24	34	41	50	236
11-Feb-26 04:00	19	0	0	28	26	15	23	33	41	49	234
11-Feb-26 05:00	19	0	0	28	27	15	21	34	41	50	233
11-Feb-26 06:00	19	0	0	28	26	14	23	32	40	51	233
11-Feb-26 07:00	19	0	0	27	26	15	26	30	41	50	234
11-Feb-26 08:00	19	0	0	27	26	15	24	30	40	50	231
11-Feb-26 09:00	19	0	0	27	26	15	25	28	40	50	229
11-Feb-26 10:00	19	0	0	27	26	15	24	26	39	50	226
11-Feb-26 11:00	19	0	0	27	26	15	24	26	39	50	226
11-Feb-26 12:00	19	0	0	27	26	16	23	24	38	50	224
11-Feb-26 13:00	19	0	0	27	26	16	24	24	38	49	225
11-Feb-26 14:00	19	0	0	27	26	16	25	23	39	50	225
11-Feb-26 15:00	19	0	0	27	26	15	29	23	38	49	226
11-Feb-26 16:00	19	0	0	27	33	16	26	23	38	45	226
11-Feb-26 17:00	19	0	0	27	26	15	30	24	39	50	229
11-Feb-26 18:00	19	0	0	27	26	14	30	24	39	50	228
11-Feb-26 19:00	19	0	0	26	26	15	31	24	39	50	230
11-Feb-26 20:00	19	0	0	27	26	15	32	24	39	50	231
11-Feb-26 21:00	19	0	0	27	26	15	32	24	39	50	231
11-Feb-26 22:00	19	0	0	26	26	15	33	24	39	49	231
11-Feb-26 23:00	19	0	0	26	26	17	30	24	39	50	231

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
12-Feb-26 00:00	19	0	0	26	26	17	30	24	39	50	232
12-Feb-26 01:00	19	0	0	26	26	17	31	24	39	50	232
12-Feb-26 02:00	19	0	0	27	25	17	30	24	39	50	232
12-Feb-26 03:00	19	0	0	26	26	17	30	24	39	50	232
12-Feb-26 04:00	19	0	0	27	26	16	32	24	39	50	233
12-Feb-26 05:00	19	0	0	27	26	16	31	24	39	49	232
12-Feb-26 06:00	19	0	0	27	26	16	30	24	39	51	232
12-Feb-26 07:00	19	0	0	27	27	17	30	24	39	50	233
12-Feb-26 08:00	19	0	0	27	26	16	30	24	40	50	232
12-Feb-26 09:00	19	0	0	27	26	15	32	24	40	50	232
12-Feb-26 10:00	19	0	0	27	26	14	31	24	39	50	231
12-Feb-26 11:00	19	0	0	26	26	15	31	24	39	50	231
12-Feb-26 12:00	23	0	0	27	26	15	26	24	39	50	231
12-Feb-26 13:00	20	0	0	27	26	15	32	24	39	50	232
12-Feb-26 14:00	20	0	0	27	26	15	30	24	39	50	231
12-Feb-26 15:00	20	0	0	27	26	15	29	24	39	50	230
12-Feb-26 16:00	19	0	0	27	26	15	28	24	39	50	228
12-Feb-26 17:00	19	0	0	27	26	15	29	24	39	50	229
12-Feb-26 18:00	19	0	0	27	26	16	28	24	40	50	229
12-Feb-26 19:00	19	0	0	26	26	14	31	24	40	50	231
12-Feb-26 20:00	19	0	0	26	26	15	30	24	39	50	230
12-Feb-26 21:00	19	0	0	27	26	15	29	24	39	50	229
12-Feb-26 22:00	19	0	0	27	26	15	31	24	39	50	230
12-Feb-26 23:00	19	0	0	26	26	15	31	24	39	50	231
13-Feb-26 00:00	19	0	0	27	26	14	31	24	39	50	231
13-Feb-26 01:00	19	0	0	26	26	15	34	24	39	51	234
13-Feb-26 02:00	19	0	0	27	26	15	32	24	39	50	232
13-Feb-26 03:00	19	0	0	27	26	15	32	24	39	50	231
13-Feb-26 04:00	19	0	0	26	26	15	31	24	39	50	231
13-Feb-26 05:00	19	0	0	27	26	15	31	24	40	50	231
13-Feb-26 06:00	19	0	0	27	26	15	30	24	40	50	231
13-Feb-26 07:00	19	0	0	26	26	15	30	24	40	50	230
13-Feb-26 08:00	19	0	0	26	25	15	28	26	40	50	229
13-Feb-26 09:00	19	0	0	26	26	15	27	28	40	50	230
13-Feb-26 10:00	19	0	0	26	25	15	25	26	39	48	223
13-Feb-26 11:00	19	0	0	26	26	15	23	22	39	34	204
13-Feb-26 12:00	20	0	0	27	26	15	24	22	39	34	206
13-Feb-26 13:00	19	0	0	27	26	15	26	38	39	41	231
13-Feb-26 14:00	19	0	0	27	26	15	25	28	39	49	227
13-Feb-26 15:00	19	0	0	34	26	19	22	19	39	50	229
13-Feb-26 16:00	19	0	0	26	26	14	29	28	39	50	231
13-Feb-26 17:00	19	0	0	26	26	16	23	31	39	50	230
13-Feb-26 18:00	19	0	0	26	26	16	25	31	39	50	231
13-Feb-26 19:00	19	0	0	26	26	15	29	29	39	50	234
13-Feb-26 20:00	19	0	0	26	26	15	29	30	39	50	235
13-Feb-26 21:00	19	0	0	27	26	15	33	30	40	50	239
13-Feb-26 22:00	16	0	0	26	26	15	34	30	39	50	237
13-Feb-26 23:00	19	0	0	27	26	15	31	31	39	50	237

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
14-Feb-26 00:00	19	0	0	26	26	14	33	30	39	50	238
14-Feb-26 01:00	19	0	0	26	26	14	32	30	39	50	237
14-Feb-26 02:00	20	0	0	26	26	14	33	30	40	49	238
14-Feb-26 03:00	20	0	0	27	27	15	33	30	39	50	239
14-Feb-26 04:00	19	0	0	27	26	14	32	30	39	50	238
14-Feb-26 05:00	19	0	0	26	26	14	32	30	40	50	237
14-Feb-26 06:00	19	0	0	27	26	15	32	30	40	50	238
14-Feb-26 07:00	19	0	0	26	26	15	31	30	40	50	239
14-Feb-26 08:00	19	0	0	26	26	16	25	35	40	49	236
14-Feb-26 09:00	19	0	0	27	26	15	28	34	40	51	240
14-Feb-26 10:00	19	0	0	26	26	16	28	36	39	50	239
14-Feb-26 11:00	19	0	0	26	26	16	24	37	39	51	238
14-Feb-26 12:00	19	0	0	26	27	15	25	37	39	51	239
14-Feb-26 13:00	19	0	0	27	26	14	26	37	39	49	238
14-Feb-26 14:00	19	0	0	27	34	17	24	29	38	50	239
14-Feb-26 15:00	19	0	0	26	26	15	25	37	39	50	238
14-Feb-26 16:00	19	0	0	26	26	16	24	37	39	49	237
14-Feb-26 17:00	19	0	0	27	27	15	24	38	39	50	239
14-Feb-26 18:00	19	0	0	26	27	16	25	38	39	50	240
14-Feb-26 19:00	20	0	0	27	27	15	28	38	39	50	243
14-Feb-26 20:00	19	0	0	27	26	16	26	38	39	50	243
14-Feb-26 21:00	19	0	0	27	26	15	28	37	39	50	243
14-Feb-26 22:00	19	0	0	26	26	14	31	37	39	50	242
14-Feb-26 23:00	19	0	0	26	26	15	29	37	39	50	241
15-Feb-26 00:00	19	0	0	26	26	14	29	37	39	50	240
15-Feb-26 01:00	19	0	0	26	26	13	30	37	39	50	240
15-Feb-26 02:00	19	0	0	27	27	15	29	37	39	50	244
15-Feb-26 03:00	19	0	0	27	27	15	28	37	39	50	241
15-Feb-26 04:00	19	0	0	26	26	15	29	37	39	50	242
15-Feb-26 05:00	19	0	0	26	26	14	29	37	39	50	241
15-Feb-26 06:00	19	0	0	27	27	15	29	38	40	50	245
15-Feb-26 07:00	19	0	0	26	26	15	27	37	40	50	241
15-Feb-26 08:00	19	0	0	27	27	14	27	38	40	50	241
15-Feb-26 09:00	19	0	0	27	27	14	26	38	39	50	241
15-Feb-26 10:00	19	0	0	26	27	15	24	38	39	49	239
15-Feb-26 11:00	19	0	0	27	26	16	24	38	39	50	239
15-Feb-26 12:00	19	0	0	27	27	16	23	38	38	50	237
15-Feb-26 13:00	23	0	0	27	27	15	26	33	38	50	237
15-Feb-26 14:00	19	0	0	26	26	15	25	37	38	50	238
15-Feb-26 15:00	19	0	0	26	26	14	28	37	38	50	238
15-Feb-26 16:00	19	0	0	26	26	14	29	37	38	50	239
15-Feb-26 17:00	19	0	0	27	25	15	28	37	38	50	240
15-Feb-26 18:00	19	0	0	26	26	15	29	37	39	50	241
15-Feb-26 19:00	18	0	0	27	27	15	30	38	38	51	244
15-Feb-26 20:00	19	0	0	27	27	14	29	38	38	50	242
15-Feb-26 21:00	19	0	0	27	27	15	32	36	39	50	244
15-Feb-26 22:00	19	0	0	26	27	15	30	37	39	50	242
15-Feb-26 23:00	19	0	0	26	27	14	30	38	39	50	243

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
16-Feb-26 00:00	19	0	0	26	27	15	29	37	39	50	243
16-Feb-26 01:00	19	0	0	26	27	15	30	38	39	50	244
16-Feb-26 02:00	19	0	0	27	26	16	31	38	39	50	245
16-Feb-26 03:00	19	0	0	27	27	13	34	38	39	50	246
16-Feb-26 04:00	19	0	0	27	27	15	31	38	39	50	246
16-Feb-26 05:00	19	0	0	26	26	15	30	38	39	50	244
16-Feb-26 06:00	19	0	0	27	27	16	29	38	39	50	245
16-Feb-26 07:00	19	0	0	27	27	15	31	37	39	49	244
16-Feb-26 08:00	18	0	0	26	26	17	28	37	39	50	242
16-Feb-26 09:00	19	0	0	26	27	15	31	37	39	51	244
16-Feb-26 10:00	19	0	0	26	26	14	31	38	39	50	243
16-Feb-26 11:00	21	0	0	26	27	19	22	38	38	50	241
16-Feb-26 12:00	20	0	0	26	27	18	24	37	38	49	240
16-Feb-26 13:00	20	0	0	34	27	19	24	28	38	49	239
16-Feb-26 14:00	21	0	0	27	26	18	33	31	38	49	243
16-Feb-26 15:00	21	0	0	30	31	19	30	25	38	50	243
16-Feb-26 16:00	21	0	0	30	30	18	32	25	38	50	245
16-Feb-26 17:00	21	0	0	30	30	18	32	25	38	50	244
16-Feb-26 18:00	21	0	0	30	30	16	34	25	38	50	243
16-Feb-26 19:00	19	0	0	27	27	16	32	36	39	50	245
16-Feb-26 20:00	19	0	0	27	27	16	32	35	38	50	245
16-Feb-26 21:00	19	0	0	27	27	18	31	36	39	50	246
16-Feb-26 22:00	19	0	0	27	27	17	29	36	39	50	243
16-Feb-26 23:00	19	0	0	27	27	19	27	36	39	50	243
17-Feb-26 00:00	19	0	0	27	27	18	27	36	39	50	244
17-Feb-26 01:00	19	0	0	27	27	18	28	36	39	50	244
17-Feb-26 02:00	19	0	0	27	27	16	31	37	39	50	246
17-Feb-26 03:00	20	0	0	28	28	18	28	36	39	50	246
17-Feb-26 04:00	19	0	0	27	27	17	28	36	39	50	243
17-Feb-26 05:00	19	0	0	27	27	19	25	36	39	49	240
17-Feb-26 06:00	19	0	0	27	27	16	28	36	39	50	243
17-Feb-26 07:00	19	0	0	27	27	18	24	36	39	50	240
17-Feb-26 08:00	19	0	0	27	27	18	23	35	39	50	239
17-Feb-26 09:00	19	0	0	27	27	17	27	33	39	50	239
17-Feb-26 10:00	19	0	0	26	26	19	25	30	38	50	232
17-Feb-26 11:00	19	0	0	26	26	19	22	33	39	50	233
17-Feb-26 12:00	19	0	0	26	26	18	23	33	38	50	234
17-Feb-26 13:00	19	0	0	26	33	19	23	25	38	50	233
17-Feb-26 14:00	19	0	0	26	26	19	24	32	38	49	234
17-Feb-26 15:00	19	0	0	24	26	18	31	31	38	50	235
17-Feb-26 16:00	19	0	0	26	26	18	31	31	38	50	239
17-Feb-26 17:00	19	0	0	26	26	16	31	36	39	50	242
17-Feb-26 18:00	19	0	0	26	26	18	30	37	38	50	245
17-Feb-26 19:00	19	0	0	26	26	17	35	37	39	50	249
17-Feb-26 20:00	19	0	0	26	26	18	32	36	39	50	245
17-Feb-26 21:00	19	0	0	26	26	18	32	36	39	50	246
17-Feb-26 22:00	19	0	0	26	26	18	33	36	38	50	246
17-Feb-26 23:00	19	0	0	26	26	19	31	36	38	49	245

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
18-Feb-26 00:00	19	0	0	26	26	18	34	36	39	49	246
18-Feb-26 01:00	19	0	0	26	26	18	32	36	39	50	245
18-Feb-26 02:00	19	0	0	26	26	18	32	36	39	50	246
18-Feb-26 03:00	19	0	0	26	26	18	33	37	39	50	246
18-Feb-26 04:00	19	0	0	26	26	18	32	36	39	50	246
18-Feb-26 05:00	19	0	0	26	25	19	32	36	39	50	246
18-Feb-26 06:00	19	0	0	26	26	19	31	36	39	50	246
18-Feb-26 07:00	19	0	0	25	26	19	32	36	39	50	247
18-Feb-26 08:00	19	0	0	26	26	19	30	36	39	50	245
18-Feb-26 09:00	19	0	0	26	26	19	31	36	39	50	246
18-Feb-26 10:00	19	0	0	26	26	19	25	35	39	49	238
18-Feb-26 11:00	19	0	0	26	26	19	27	36	38	50	241
18-Feb-26 12:00	22	0	0	26	26	18	30	36	38	50	245
18-Feb-26 13:00	23	0	0	26	26	19	24	34	38	50	239
18-Feb-26 14:00	21	0	0	26	26	19	27	34	38	50	240
18-Feb-26 15:00	21	0	0	26	26	17	31	34	38	50	242
18-Feb-26 16:00	21	0	0	29	29	20	31	36	38	40	244
18-Feb-26 17:00	19	7	0	26	26	17	27	35	38	50	245
18-Feb-26 18:00	19	5	0	26	26	17	26	33	39	50	241
18-Feb-26 19:00	19	5	0	28	28	17	27	33	39	50	247
18-Feb-26 20:00	19	10	0	28	28	18	21	33	39	50	246
18-Feb-26 21:00	19	12	0	28	28	17	24	30	39	50	247
18-Feb-26 22:00	19	20	0	28	7	21	31	32	39	50	248
18-Feb-26 23:00	21	21	0	33	0	18	30	31	39	50	244
19-Feb-26 00:00	21	21	0	34	0	15	30	35	39	50	245
19-Feb-26 01:00	22	22	0	34	0	15	27	35	40	50	246
19-Feb-26 02:00	23	22	0	34	0	14	26	37	39	50	246
19-Feb-26 03:00	22	22	0	34	0	15	25	37	39	50	245
19-Feb-26 04:00	22	22	0	34	0	13	27	37	40	50	246
19-Feb-26 05:00	23	22	0	35	0	15	26	37	40	50	247
19-Feb-26 06:00	23	22	0	35	0	15	25	37	40	50	247
19-Feb-26 07:00	23	23	0	29	0	18	29	37	40	50	248
19-Feb-26 08:00	22	23	0	20	0	24	32	36	40	50	246
19-Feb-26 09:00	23	23	0	20	0	24	31	36	39	50	246
19-Feb-26 10:00	23	22	0	14	0	23	29	36	39	50	236
19-Feb-26 11:00	22	22	0	21	0	26	27	33	38	50	241
19-Feb-26 12:00	21	21	0	30	0	17	33	33	21	40	216
19-Feb-26 13:00	22	22	0	30	0	17	30	30	38	49	238
19-Feb-26 14:00	22	22	0	30	0	16	34	34	38	50	246
19-Feb-26 15:00	22	22	0	30	0	17	34	34	38	50	246
19-Feb-26 16:00	22	22	0	32	0	15	34	34	38	50	248
19-Feb-26 17:00	22	23	0	32	0	15	35	35	38	50	250
19-Feb-26 18:00	22	23	0	32	0	21	35	35	38	50	257
19-Feb-26 19:00	22	23	0	32	0	21	35	35	39	50	257
19-Feb-26 20:00	22	23	0	32	0	21	33	37	39	50	257
19-Feb-26 21:00	22	23	0	32	0	21	34	37	35	50	254
19-Feb-26 22:00	22	23	0	32	0	21	27	38	40	50	252
19-Feb-26 23:00	22	23	0	32	0	21	27	38	40	50	253

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
20-Feb-26 00:00	22	22	0	32	0	22	25	38	40	50	252
20-Feb-26 01:00	22	23	0	32	0	21	26	38	40	50	252
20-Feb-26 02:00	22	22	0	32	0	22	26	38	40	50	251
20-Feb-26 03:00	22	23	0	32	0	21	23	38	40	50	249
20-Feb-26 04:00	22	22	0	33	0	21	22	38	40	50	248
20-Feb-26 05:00	22	23	0	33	0	21	25	37	40	50	251
20-Feb-26 06:00	22	23	0	32	0	21	23	37	40	50	249
20-Feb-26 07:00	22	22	0	33	0	18	22	35	40	50	242
20-Feb-26 08:00	22	22	0	32	0	19	22	33	39	50	238
20-Feb-26 09:00	22	22	0	32	0	18	28	33	39	50	245
20-Feb-26 10:00	22	22	0	32	0	18	25	33	39	50	242
20-Feb-26 11:00	22	22	0	32	0	18	27	33	38	50	243
20-Feb-26 12:00	22	22	0	32	0	18	29	33	38	50	244
20-Feb-26 13:00	22	22	0	32	0	18	29	33	38	49	243
20-Feb-26 14:00	22	22	0	32	0	18	30	33	38	50	245
20-Feb-26 15:00	22	22	0	32	0	18	29	33	38	50	244
20-Feb-26 16:00	22	22	0	32	0	18	28	33	38	50	243
20-Feb-26 17:00	22	22	0	33	0	20	29	33	38	50	248
20-Feb-26 18:00	22	22	0	33	0	20	30	33	38	50	248
20-Feb-26 19:00	22	22	0	33	0	20	29	33	39	50	248
20-Feb-26 20:00	22	22	0	32	0	20	29	33	39	50	248
20-Feb-26 21:00	19	22	0	33	0	21	27	33	39	50	245
20-Feb-26 22:00	22	22	0	33	0	20	25	33	40	50	244
20-Feb-26 23:00	22	22	0	33	0	21	25	33	40	50	246
21-Feb-26 00:00	22	22	0	33	0	21	27	33	40	50	249
21-Feb-26 01:00	22	22	0	33	0	20	26	33	39	50	246
21-Feb-26 02:00	22	22	0	33	0	20	27	33	40	50	248
21-Feb-26 03:00	23	22	0	33	0	20	27	33	40	50	248
21-Feb-26 04:00	22	22	0	33	0	20	28	33	41	50	249
21-Feb-26 05:00	22	22	0	33	0	20	29	33	40	50	250
21-Feb-26 06:00	22	22	0	33	0	20	24	37	40	50	250
21-Feb-26 07:00	22	22	0	32	0	20	24	37	40	50	247
21-Feb-26 08:00	22	22	0	33	0	20	23	37	40	50	247
21-Feb-26 09:00	22	22	0	32	0	21	23	37	39	50	246
21-Feb-26 10:00	19	19	0	32	7	17	26	36	39	50	245
21-Feb-26 11:00	19	19	0	31	12	22	24	34	39	50	250
21-Feb-26 12:00	21	21	0	32	30	19	0	37	38	49	248
21-Feb-26 13:00	23	22	0	32	31	18	0	36	38	50	250
21-Feb-26 14:00	22	22	0	33	31	19	0	37	38	50	251
21-Feb-26 15:00	22	23	0	33	33	19	0	37	38	50	254
21-Feb-26 16:00	22	23	0	33	33	21	0	36	38	50	255
21-Feb-26 17:00	22	23	0	33	33	17	0	34	39	50	251
21-Feb-26 18:00	22	23	0	33	33	17	0	35	38	50	250
21-Feb-26 19:00	22	23	0	33	33	17	0	37	39	50	253
21-Feb-26 20:00	22	23	0	33	33	17	0	35	39	50	254
21-Feb-26 21:00	22	22	0	34	33	18	0	35	39	50	252
21-Feb-26 22:00	22	22	0	34	34	16	0	36	39	50	253
21-Feb-26 23:00	22	22	0	33	33	17	0	35	39	50	252

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
22-Feb-26 00:00	22	22	0	34	34	18	0	36	39	50	255
22-Feb-26 01:00	22	23	0	34	33	18	0	35	39	50	254
22-Feb-26 02:00	22	22	0	34	34	18	0	36	39	50	255
22-Feb-26 03:00	22	23	0	34	33	19	0	34	39	50	254
22-Feb-26 04:00	21	22	0	34	34	17	0	35	39	50	255
22-Feb-26 05:00	21	23	0	34	34	18	0	34	39	50	253
22-Feb-26 06:00	21	23	0	33	33	18	0	36	39	50	254
22-Feb-26 07:00	21	23	0	34	34	17	0	34	39	50	251
22-Feb-26 08:00	21	22	0	34	33	18	0	34	39	50	251
22-Feb-26 09:00	21	23	0	34	34	18	0	33	38	50	251
22-Feb-26 10:00	21	23	0	34	34	17	0	29	39	50	246
22-Feb-26 11:00	21	22	0	34	34	19	0	26	38	50	245
22-Feb-26 12:00	20	23	0	34	33	19	0	30	38	50	247
22-Feb-26 13:00	20	24	0	33	33	18	0	33	38	50	249
22-Feb-26 14:00	20	23	0	33	33	19	0	33	38	50	249
22-Feb-26 15:00	20	21	0	33	33	18	0	37	38	50	251
22-Feb-26 16:00	22	22	0	33	33	19	0	35	38	50	252
22-Feb-26 17:00	22	22	0	33	34	18	0	36	39	49	253
22-Feb-26 18:00	22	22	0	33	33	17	0	38	39	50	254
22-Feb-26 19:00	22	23	0	33	33	21	0	33	39	50	254
22-Feb-26 20:00	22	22	0	33	34	20	0	33	36	50	250
22-Feb-26 21:00	22	22	0	33	34	19	0	35	39	50	254
22-Feb-26 22:00	20	23	0	33	34	20	0	35	39	50	254
22-Feb-26 23:00	22	23	0	33	33	18	0	35	39	51	254
23-Feb-26 00:00	22	23	0	33	33	21	0	34	39	50	255
23-Feb-26 01:00	22	23	0	33	34	21	0	34	38	50	256
23-Feb-26 02:00	22	23	0	33	33	21	0	27	39	50	248
23-Feb-26 03:00	22	23	0	32	33	18	0	29	39	50	246
23-Feb-26 04:00	22	23	0	33	34	19	0	29	39	50	248
23-Feb-26 05:00	22	23	0	33	34	18	0	30	39	51	249
23-Feb-26 06:00	22	23	0	33	34	19	0	30	39	50	250
23-Feb-26 07:00	22	22	0	33	34	19	0	29	39	50	249
23-Feb-26 08:00	22	23	0	32	33	19	0	29	39	50	247
23-Feb-26 09:00	19	23	0	31	32	17	0	37	39	50	249
23-Feb-26 10:00	19	23	0	32	32	17	0	37	39	50	248
23-Feb-26 11:00	19	22	0	31	32	17	0	32	39	50	243
23-Feb-26 12:00	19	22	0	31	31	16	0	36	38	50	243
23-Feb-26 13:00	20	22	0	30	35	18	0	32	38	50	244
23-Feb-26 14:00	19	22	0	30	32	16	0	36	38	50	243
23-Feb-26 15:00	19	22	0	30	32	17	0	38	38	50	245
23-Feb-26 16:00	20	22	0	29	31	16	0	36	38	50	243
23-Feb-26 17:00	20	22	0	29	31	15	0	38	38	51	244
23-Feb-26 18:00	20	23	0	29	32	15	0	36	38	50	245
23-Feb-26 19:00	20	22	0	29	32	16	0	36	39	51	246
23-Feb-26 20:00	21	22	0	29	32	16	0	36	39	50	245
23-Feb-26 21:00	20	23	0	30	32	16	0	38	39	50	248
23-Feb-26 22:00	21	22	0	30	32	16	0	37	39	50	248
23-Feb-26 23:00	21	22	0	30	32	17	0	36	39	51	248

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
24-Feb-26 00:00	21	22	0	30	32	17	0	35	39	50	248
24-Feb-26 01:00	21	22	0	30	33	17	0	34	39	49	244
24-Feb-26 02:00	21	22	0	30	33	16	0	35	38	50	245
24-Feb-26 03:00	22	23	0	31	32	18	0	32	39	51	247
24-Feb-26 04:00	21	22	0	30	32	18	0	31	39	50	243
24-Feb-26 05:00	21	22	0	30	32	18	0	33	39	50	246
24-Feb-26 06:00	21	22	0	30	32	18	0	32	39	50	245
24-Feb-26 07:00	20	23	0	29	33	17	0	31	39	50	242
24-Feb-26 08:00	19	22	0	28	31	17	0	34	39	50	240
24-Feb-26 09:00	20	23	0	28	30	17	0	35	39	50	241
24-Feb-26 10:00	20	23	0	28	29	15	0	37	39	50	240
24-Feb-26 11:00	19	22	0	28	28	16	0	32	38	50	233
24-Feb-26 12:00	19	22	0	28	29	18	0	34	38	50	238
24-Feb-26 13:00	23	21	0	28	28	18	0	33	38	50	239
24-Feb-26 14:00	20	21	0	28	28	18	0	36	38	50	240
24-Feb-26 15:00	20	21	0	28	29	17	0	37	38	50	241
24-Feb-26 16:00	20	22	0	28	29	17	0	37	38	50	242
24-Feb-26 17:00	19	22	0	28	29	17	0	37	39	50	242
24-Feb-26 18:00	20	22	0	29	29	18	0	35	38	50	242
24-Feb-26 19:00	20	23	0	28	29	18	0	37	39	50	244
24-Feb-26 20:00	21	23	0	29	31	18	0	38	39	50	249
24-Feb-26 21:00	22	23	0	30	31	18	0	35	38	50	247
24-Feb-26 22:00	21	23	0	31	30	18	0	35	39	50	248
24-Feb-26 23:00	20	22	0	30	29	17	0	35	39	50	241
25-Feb-26 00:00	20	23	0	30	30	19	0	37	39	50	248
25-Feb-26 01:00	20	23	0	30	30	19	0	36	39	50	248
25-Feb-26 02:00	20	23	0	30	30	19	0	36	39	50	247
25-Feb-26 03:00	20	23	0	30	30	19	0	37	39	50	248
25-Feb-26 04:00	21	23	0	30	30	19	0	37	39	50	248
25-Feb-26 05:00	20	23	0	30	30	19	0	36	39	50	247
25-Feb-26 06:00	20	23	0	30	30	20	0	34	39	50	246
25-Feb-26 07:00	20	22	0	30	30	20	0	35	39	50	245
25-Feb-26 08:00	20	22	0	30	30	20	0	32	38	50	241
25-Feb-26 09:00	20	22	0	30	30	19	0	26	39	50	235
25-Feb-26 10:00	19	19	0	28	27	16	0	36	39	50	234
25-Feb-26 11:00	19	19	0	28	28	18	0	34	39	50	235
25-Feb-26 12:00	19	24	0	27	28	18	0	31	38	50	235
25-Feb-26 13:00	19	21	0	29	28	20	0	27	38	49	230
25-Feb-26 14:00	19	19	0	34	28	19	0	26	38	50	233
25-Feb-26 15:00	18	19	0	27	26	15	0	37	38	49	230
25-Feb-26 16:00	19	19	0	27	27	17	0	33	38	50	230
25-Feb-26 17:00	19	19	0	27	27	17	0	37	38	49	233
25-Feb-26 18:00	21	21	0	28	28	18	0	37	39	50	240
25-Feb-26 19:00	21	21	0	29	29	18	0	37	39	50	243
25-Feb-26 20:00	21	21	0	30	30	19	0	35	39	50	245
25-Feb-26 21:00	21	21	0	30	30	19	0	36	39	50	245
25-Feb-26 22:00	21	21	0	31	31	18	0	35	39	50	245
25-Feb-26 23:00	21	21	0	32	32	19	0	33	38	50	246

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
26-Feb-26 00:00	21	21	0	32	31	19	0	34	39	50	247
26-Feb-26 01:00	21	21	0	32	32	19	0	35	38	50	248
26-Feb-26 02:00	22	21	0	32	31	19	0	36	39	50	249
26-Feb-26 03:00	21	21	0	32	32	18	0	35	39	50	247
26-Feb-26 04:00	21	21	0	31	33	19	0	35	39	50	250
26-Feb-26 05:00	21	21	0	32	32	17	0	36	39	50	248
26-Feb-26 06:00	21	21	0	32	32	19	0	35	39	49	248
26-Feb-26 07:00	22	21	0	32	32	18	0	35	39	51	250
26-Feb-26 08:00	21	21	0	30	32	17	0	34	39	50	246
26-Feb-26 09:00	21	21	0	30	32	18	0	35	39	50	246
26-Feb-26 10:00	21	22	0	30	32	18	0	32	39	50	243
26-Feb-26 11:00	21	22	0	30	32	18	0	32	38	50	243
26-Feb-26 12:00	21	21	0	30	34	18	0	30	38	50	243
26-Feb-26 13:00	21	22	0	30	34	17	0	30	38	50	242
26-Feb-26 14:00	21	22	0	30	32	16	0	34	38	49	243
26-Feb-26 15:00	21	21	0	30	32	16	0	33	38	49	240
26-Feb-26 16:00	21	21	0	30	32	18	0	33	38	49	242
26-Feb-26 17:00	21	22	0	30	32	16	0	38	38	50	246
26-Feb-26 18:00	21	21	0	31	32	16	0	34	39	50	244
26-Feb-26 19:00	21	21	0	31	32	16	0	35	39	50	245
26-Feb-26 20:00	21	21	0	31	32	17	0	34	39	50	245
26-Feb-26 21:00	21	22	0	32	32	18	0	31	39	50	245
26-Feb-26 22:00	21	22	0	32	32	18	0	30	38	50	242
26-Feb-26 23:00	20	22	0	32	32	19	0	30	39	49	243
27-Feb-26 00:00	20	22	0	31	31	19	0	33	39	50	244
27-Feb-26 01:00	20	21	0	31	31	18	0	35	39	51	245
27-Feb-26 02:00	20	21	0	31	31	16	0	36	39	50	245
27-Feb-26 03:00	20	22	0	30	31	17	0	35	39	50	244
27-Feb-26 04:00	20	21	0	32	31	18	0	33	38	50	244
27-Feb-26 05:00	20	21	0	31	31	17	0	32	39	50	242
27-Feb-26 06:00	20	21	0	31	31	18	0	33	39	50	244
27-Feb-26 07:00	20	21	0	31	31	19	0	32	39	50	244
27-Feb-26 08:00	19	23	0	29	29	18	0	34	39	50	241
27-Feb-26 09:00	20	23	0	28	30	17	0	36	38	50	241
27-Feb-26 10:00	20	23	0	28	30	18	0	35	38	50	241
27-Feb-26 11:00	20	23	0	28	29	18	0	35	38	50	240
27-Feb-26 12:00	20	22	0	28	30	18	0	36	39	50	243
27-Feb-26 13:00	23	22	0	28	29	18	0	29	39	50	238
27-Feb-26 14:00	20	22	0	28	29	16	0	34	38	50	237
27-Feb-26 15:00	19	23	0	28	29	17	0	36	38	50	238
27-Feb-26 16:00	19	23	0	28	29	15	0	37	38	50	239
27-Feb-26 17:00	19	23	0	28	29	15	0	37	38	50	240
27-Feb-26 18:00	20	22	0	28	29	16	0	37	38	50	240
27-Feb-26 19:00	20	23	0	28	29	17	0	37	39	50	242
27-Feb-26 20:00	20	23	0	28	29	15	0	37	39	50	241
27-Feb-26 21:00	22	22	0	28	30	15	0	36	39	50	241
27-Feb-26 22:00	23	22	0	28	30	17	0	33	39	50	241
27-Feb-26 23:00	21	23	0	28	29	17	0	35	39	50	242

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
28-Feb-26 00:00	20	23	0	29	30	16	0	37	39	50	243
28-Feb-26 01:00	21	23	0	28	29	16	0	36	39	50	241
28-Feb-26 02:00	21	23	0	28	29	16	0	37	39	50	242
28-Feb-26 03:00	21	23	0	28	29	16	0	37	39	51	244
28-Feb-26 04:00	20	23	0	28	29	17	0	36	38	50	242
28-Feb-26 05:00	21	23	0	28	29	17	0	37	39	50	243
28-Feb-26 06:00	21	23	0	30	30	17	0	36	39	50	245
28-Feb-26 07:00	21	23	0	28	29	17	0	34	39	50	242
28-Feb-26 08:00	21	23	0	29	30	17	0	36	39	50	244
28-Feb-26 09:00	20	23	0	28	30	16	0	36	38	50	242
28-Feb-26 10:00	20	23	0	29	30	17	0	36	38	50	243
28-Feb-26 11:00	20	23	0	28	30	17	0	33	38	50	239
28-Feb-26 12:00	20	23	0	29	30	18	0	32	38	50	239
28-Feb-26 13:00	20	23	0	29	30	18	0	31	38	50	240
28-Feb-26 14:00	20	22	0	33	30	19	0	28	38	50	240
28-Feb-26 15:00	20	21	0	29	29	17	0	36	38	50	240
28-Feb-26 16:00	20	22	0	29	30	17	0	37	38	50	243
28-Feb-26 17:00	20	23	0	30	29	18	0	36	38	50	244
28-Feb-26 18:00	20	23	0	29	29	18	0	37	38	50	245
28-Feb-26 19:00	21	23	0	31	31	19	0	36	38	50	248
28-Feb-26 20:00	20	23	0	31	31	20	0	35	38	50	248
28-Feb-26 21:00	19	23	0	32	30	19	0	36	38	50	247
28-Feb-26 22:00	20	23	0	32	30	18	0	37	38	50	248
28-Feb-26 23:00	20	23	0	31	29	19	0	36	39	50	246
01-Mar-26 00:00	20	23	0	32	30	19	0	36	39	50	247
01-Mar-26 01:00	20	23	0	32	30	19	0	35	39	50	247
01-Mar-26 02:00	20	23	0	32	30	18	0	38	38	50	249
01-Mar-26 03:00	20	23	0	32	31	19	0	36	38	50	249
01-Mar-26 04:00	20	23	0	32	31	19	0	36	39	50	249
01-Mar-26 05:00	20	23	0	33	33	20	0	35	39	50	253
01-Mar-26 06:00	20	23	0	32	33	20	0	36	39	50	252
01-Mar-26 07:00	20	23	0	32	32	21	0	33	39	50	250
01-Mar-26 08:00	20	23	0	32	32	20	0	35	38	50	250
01-Mar-26 09:00	20	23	0	32	32	19	0	34	39	50	250
01-Mar-26 10:00	20	23	0	32	32	18	0	35	38	50	249
01-Mar-26 11:00	21	23	0	33	34	21	0	26	38	50	244
01-Mar-26 12:00	20	23	0	30	32	18	0	31	38	49	242
01-Mar-26 13:00	20	23	0	30	34	19	0	28	38	49	241
01-Mar-26 14:00	20	23	0	31	34	18	0	31	38	49	244
01-Mar-26 15:00	20	23	0	31	30	17	0	35	38	49	242
01-Mar-26 16:00	21	23	0	30	30	17	0	35	37	49	242
01-Mar-26 17:00	21	23	0	31	31	18	0	37	38	49	247
01-Mar-26 18:00	20	23	0	30	30	17	6	34	38	50	248
01-Mar-26 19:00	19	21	0	29	27	17	16	33	38	50	250
01-Mar-26 20:00	19	19	0	28	27	17	16	34	39	49	247
01-Mar-26 21:00	19	19	0	30	25	18	24	24	39	50	248
01-Mar-26 22:00	19	21	0	32	0	16	37	37	38	50	251
01-Mar-26 23:00	19	20	0	32	0	16	35	37	39	51	248

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
02-Mar-26 00:00	20	22	0	33	0	18	35	37	39	50	254
02-Mar-26 01:00	20	23	0	33	0	18	34	37	39	50	254
02-Mar-26 02:00	21	23	0	33	0	17	35	37	39	50	255
02-Mar-26 03:00	21	23	0	33	0	17	35	37	39	50	254
02-Mar-26 04:00	20	23	0	33	0	16	35	37	39	50	253
02-Mar-26 05:00	20	23	0	33	0	17	33	37	39	50	252
02-Mar-26 06:00	20	23	0	33	0	17	36	37	39	50	254
02-Mar-26 07:00	20	23	0	33	0	17	35	37	39	50	254
02-Mar-26 08:00	22	23	0	33	0	16	34	37	39	50	253
02-Mar-26 09:00	22	23	0	33	0	19	30	36	39	50	253
02-Mar-26 10:00	20	21	0	33	0	18	34	36	38	50	250
02-Mar-26 11:00	20	21	0	33	0	18	36	36	38	50	251
02-Mar-26 12:00	20	21	0	33	0	19	37	32	38	49	249
02-Mar-26 13:00	22	21	0	33	0	17	33	36	38	49	250
02-Mar-26 14:00	20	21	0	33	0	18	34	36	38	49	250
02-Mar-26 15:00	22	22	0	33	0	19	32	36	38	49	251
02-Mar-26 16:00	21	22	0	33	0	19	33	36	38	49	251
02-Mar-26 17:00	21	22	0	33	0	19	36	36	38	50	255
02-Mar-26 18:00	22	22	0	32	0	18	36	36	38	50	254
02-Mar-26 19:00	22	22	0	33	0	18	36	36	39	50	255
02-Mar-26 20:00	22	22	0	33	0	18	35	36	38	50	255
02-Mar-26 21:00	22	19	0	33	0	18	37	37	39	50	254
02-Mar-26 22:00	22	22	0	33	0	17	34	36	39	50	254
02-Mar-26 23:00	22	22	0	33	0	18	34	36	38	50	254
03-Mar-26 00:00	22	22	0	33	0	18	34	36	39	50	254
03-Mar-26 01:00	22	22	0	33	0	18	35	36	39	50	255
03-Mar-26 02:00	22	22	0	33	0	18	35	36	39	50	256
03-Mar-26 03:00	22	22	0	33	0	19	35	36	38	50	256
03-Mar-26 04:00	22	22	0	33	0	19	35	36	38	51	256
03-Mar-26 05:00	21	22	0	34	0	18	35	37	39	50	256
03-Mar-26 06:00	22	22	0	33	0	18	34	36	39	50	253
03-Mar-26 07:00	22	22	0	33	0	19	32	36	39	50	252
03-Mar-26 08:00	22	22	0	33	0	18	32	36	39	50	252
03-Mar-26 09:00	22	22	0	33	0	19	30	36	38	50	250
03-Mar-26 10:00	21	21	0	34	0	19	29	36	38	50	248
03-Mar-26 11:00	21	21	0	34	0	19	31	36	38	50	250
03-Mar-26 12:00	21	21	0	33	0	19	29	36	38	50	247
03-Mar-26 13:00	20	23	0	32	0	19	30	35	38	50	247
03-Mar-26 14:00	20	21	0	32	0	18	34	35	38	49	247
03-Mar-26 15:00	20	21	0	32	0	17	34	35	38	49	246
03-Mar-26 16:00	20	21	0	33	0	19	36	35	37	49	250
03-Mar-26 17:00	20	21	0	32	0	18	36	35	38	49	249
03-Mar-26 18:00	22	22	0	33	0	19	33	35	38	50	251
03-Mar-26 19:00	22	22	0	32	0	19	32	35	38	50	249
03-Mar-26 20:00	22	22	0	32	0	18	34	35	39	50	252
03-Mar-26 21:00	22	22	0	33	0	18	33	35	36	50	249
03-Mar-26 22:00	22	22	0	33	0	21	30	35	38	50	251
03-Mar-26 23:00	22	22	0	33	0	20	31	35	39	50	251

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
04-Mar-26 00:00	22	22	0	33	0	21	31	35	39	51	254
04-Mar-26 01:00	22	22	0	33	0	20	31	35	39	50	252
04-Mar-26 02:00	22	22	0	32	0	20	32	35	39	50	253
04-Mar-26 03:00	22	22	0	32	0	20	30	35	39	51	251
04-Mar-26 04:00	23	22	0	33	0	20	31	35	39	50	253
04-Mar-26 05:00	22	22	0	32	0	19	32	35	39	50	251
04-Mar-26 06:00	22	22	0	33	0	21	30	35	39	50	252
04-Mar-26 07:00	22	22	0	32	0	20	29	35	39	50	250
04-Mar-26 08:00	19	20	0	32	0	20	35	37	39	50	251
04-Mar-26 09:00	19	19	0	32	0	20	34	37	39	50	250
04-Mar-26 10:00	19	20	0	32	0	19	32	37	39	50	248
04-Mar-26 11:00	19	19	0	32	0	20	31	37	38	50	247
04-Mar-26 12:00	19	20	0	32	0	19	32	37	38	49	245
04-Mar-26 13:00	19	20	0	32	0	18	35	37	38	49	248
04-Mar-26 14:00	19	20	0	32	0	19	35	37	37	49	248
04-Mar-26 15:00	19	22	0	32	0	17	34	37	38	49	248
04-Mar-26 16:00	19	22	0	32	0	18	35	37	38	50	251
04-Mar-26 17:00	20	22	0	32	0	17	36	37	38	49	252
04-Mar-26 18:00	20	23	0	32	0	17	35	37	38	50	251
04-Mar-26 19:00	20	23	0	32	0	17	35	37	38	49	252
04-Mar-26 20:00	20	23	0	32	0	17	35	37	39	49	252
04-Mar-26 21:00	19	23	0	32	0	18	35	37	39	49	252
04-Mar-26 22:00	20	23	0	32	0	17	37	37	39	49	255
04-Mar-26 23:00	20	23	0	32	0	18	35	37	39	49	252
05-Mar-26 00:00	20	23	0	32	0	18	37	37	39	50	256
05-Mar-26 01:00	20	23	0	32	0	17	35	37	39	49	252
05-Mar-26 02:00	20	23	0	32	0	16	36	38	39	49	254
05-Mar-26 03:00	20	23	0	32	0	16	37	37	39	50	254
05-Mar-26 04:00	20	23	0	31	0	17	35	37	39	49	252
05-Mar-26 05:00	21	23	0	32	0	17	36	38	39	50	255
05-Mar-26 06:00	21	23	0	32	0	17	36	37	38	49	253
05-Mar-26 07:00	20	23	0	32	0	17	34	37	39	49	252
05-Mar-26 08:00	21	22	0	31	0	18	31	36	39	49	248
05-Mar-26 09:00	21	23	0	32	0	17	31	36	39	50	249
05-Mar-26 10:00	20	20	0	32	0	17	34	36	39	50	247
05-Mar-26 11:00	23	20	0	32	0	16	30	33	38	49	242
05-Mar-26 12:00	21	20	0	32	0	16	37	32	38	49	246
05-Mar-26 13:00	21	20	0	32	0	17	37	28	38	49	241
05-Mar-26 14:00	20	20	0	32	0	17	34	34	38	50	245
05-Mar-26 15:00	20	20	0	32	0	16	35	35	38	50	245
05-Mar-26 16:00	20	20	0	32	0	17	34	35	38	50	246
05-Mar-26 17:00	21	21	0	31	0	15	34	36	38	50	247
05-Mar-26 18:00	21	21	0	32	0	14	34	36	38	50	246
05-Mar-26 19:00	21	21	0	32	0	16	32	36	39	50	247
05-Mar-26 20:00	20	20	0	30	0	15	30	36	39	50	240
05-Mar-26 21:00	20	19	0	30	0	15	31	36	39	50	240
05-Mar-26 22:00	20	19	0	30	0	16	30	36	39	50	240
05-Mar-26 23:00	20	19	0	30	0	16	30	36	39	50	240

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
06-Mar-26 00:00	20	19	0	30	0	15	31	36	39	50	241
06-Mar-26 01:00	19	19	0	30	0	14	33	36	40	50	240
06-Mar-26 02:00	19	19	0	30	0	15	33	36	39	50	241
06-Mar-26 03:00	19	19	0	30	0	15	32	36	39	50	241
06-Mar-26 04:00	19	19	0	30	0	14	33	36	39	50	242
06-Mar-26 05:00	19	19	0	30	0	15	32	36	39	50	240
06-Mar-26 06:00	19	19	0	30	0	15	32	36	39	50	241
06-Mar-26 07:00	19	19	0	30	0	15	31	37	40	50	241
06-Mar-26 08:00	19	19	0	30	0	15	29	36	39	50	237
06-Mar-26 09:00	19	19	0	30	0	14	31	36	39	50	237
06-Mar-26 10:00	19	19	0	30	0	15	27	36	39	50	235
06-Mar-26 11:00	19	19	0	30	0	16	26	36	38	50	235
06-Mar-26 12:00	19	19	0	30	0	15	25	36	38	50	232
06-Mar-26 13:00	19	19	0	31	0	15	27	36	38	47	231
06-Mar-26 14:00	19	19	0	33	0	18	23	30	38	49	229
06-Mar-26 15:00	19	24	0	30	0	17	27	29	38	50	233
06-Mar-26 16:00	19	19	0	30	0	17	26	36	38	49	234
06-Mar-26 17:00	19	19	0	30	0	16	26	36	38	49	235
06-Mar-26 18:00	19	19	0	30	0	17	27	37	38	49	236
06-Mar-26 19:00	19	19	0	30	0	14	29	36	39	49	235
06-Mar-26 20:00	19	19	0	30	0	17	24	34	40	50	233
06-Mar-26 21:00	19	19	0	30	0	17	25	36	40	50	235
06-Mar-26 22:00	19	19	0	30	0	13	27	32	40	49	229
06-Mar-26 23:00	19	19	0	30	12	18	24	22	40	50	233
07-Mar-26 00:00	19	19	0	27	28	19	30	21	40	50	253
07-Mar-26 01:00	19	19	0	27	28	19	30	22	36	50	251
07-Mar-26 02:00	19	19	0	27	27	17	34	0	40	50	233
07-Mar-26 03:00	19	19	0	26	27	19	32	0	40	50	233
07-Mar-26 04:00	19	19	0	27	27	18	34	0	40	50	235
07-Mar-26 05:00	19	19	0	27	28	18	33	0	40	50	234
07-Mar-26 06:00	19	19	0	27	27	18	33	0	40	50	233
07-Mar-26 07:00	19	19	0	28	28	19	31	0	40	50	234
07-Mar-26 08:00	19	19	0	27	27	18	31	0	40	50	232
07-Mar-26 09:00	19	19	0	27	27	17	31	0	39	50	229
07-Mar-26 10:00	19	19	0	26	27	16	23	0	38	49	217
07-Mar-26 11:00	19	19	0	27	28	17	23	0	38	49	219
07-Mar-26 12:00	19	19	0	26	26	16	21	0	38	50	215
07-Mar-26 13:00	19	19	0	26	34	18	22	0	38	41	216
07-Mar-26 14:00	19	19	0	26	29	16	31	0	38	40	218
07-Mar-26 15:00	19	19	0	26	27	16	25	0	38	49	218
07-Mar-26 16:00	19	19	0	26	27	18	25	0	38	49	220
07-Mar-26 17:00	19	19	0	26	27	16	28	0	38	49	223
07-Mar-26 18:00	19	19	0	26	27	16	30	0	38	49	223
07-Mar-26 19:00	19	19	0	26	27	16	30	0	39	49	225
07-Mar-26 20:00	19	19	0	26	27	17	31	0	39	49	227
07-Mar-26 21:00	19	19	0	26	27	17	33	0	39	49	228
07-Mar-26 22:00	19	19	0	26	27	16	33	0	39	49	227
07-Mar-26 23:00	19	19	0	26	27	17	32	0	39	50	227

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
08-Mar-26 00:00	19	19	0	26	27	16	32	0	39	50	227
08-Mar-26 01:00	19	19	0	26	27	17	30	0	39	50	227
08-Mar-26 02:00	19	19	0	26	27	16	30	0	39	50	226
08-Mar-26 03:00	19	19	0	26	27	16	32	0	39	50	227
08-Mar-26 04:00	19	19	0	26	26	17	31	0	39	50	227
08-Mar-26 05:00	19	19	0	26	27	16	30	0	39	50	227
08-Mar-26 06:00	19	19	0	26	27	16	30	0	40	50	227
08-Mar-26 07:00	19	19	0	26	27	17	27	0	39	50	224
08-Mar-26 08:00	19	19	0	26	28	16	27	0	39	50	223
08-Mar-26 09:00	19	19	0	26	27	17	27	0	39	50	223
08-Mar-26 10:00	19	19	0	26	27	17	28	0	39	50	225
08-Mar-26 11:00	19	19	0	26	27	18	28	0	38	49	225
08-Mar-26 12:00	23	19	0	26	27	18	25	0	38	49	225
08-Mar-26 13:00	20	19	0	25	27	16	37	0	38	40	222
08-Mar-26 14:00	19	19	0	26	27	16	32	0	38	44	221
08-Mar-26 15:00	19	19	0	26	27	16	29	0	38	49	223
08-Mar-26 16:00	19	18	0	26	27	16	30	0	38	50	225
08-Mar-26 17:00	19	19	0	25	27	17	31	0	38	49	225
08-Mar-26 18:00	19	19	0	26	27	16	31	0	39	50	225
08-Mar-26 19:00	19	19	0	26	27	16	26	0	39	50	222
08-Mar-26 20:00	19	19	0	26	27	19	29	11	38	49	238
08-Mar-26 21:00	19	19	0	26	28	19	28	19	39	50	247
08-Mar-26 22:00	19	19	0	26	27	22	25	35	36	50	259
08-Mar-26 23:00	19	19	0	26	27	23	25	35	36	50	259
09-Mar-26 00:00	19	19	0	26	27	22	25	35	36	50	260
09-Mar-26 01:00	19	19	0	26	27	21	26	35	36	50	259
09-Mar-26 02:00	19	19	0	26	27	22	25	35	36	50	259
09-Mar-26 03:00	19	19	0	26	27	22	24	35	36	50	259
09-Mar-26 04:00	19	19	0	26	27	22	25	35	36	50	259
09-Mar-26 05:00	19	19	0	26	27	22	22	35	36	50	256
09-Mar-26 06:00	18	18	0	26	27	22	27	35	36	50	259
09-Mar-26 07:00	18	18	0	26	27	21	25	35	36	50	257
09-Mar-26 08:00	18	18	0	26	27	22	24	35	36	50	256
09-Mar-26 09:00	18	18	0	26	27	21	24	35	36	50	255
09-Mar-26 10:00	18	18	0	26	27	19	23	35	36	50	252
09-Mar-26 11:00	18	18	0	26	27	19	23	35	36	49	251
09-Mar-26 12:00	18	18	0	26	26	19	24	35	36	49	251
09-Mar-26 13:00	17	23	0	26	26	17	24	35	36	48	252
09-Mar-26 14:00	17	21	0	26	26	17	24	35	36	48	251
09-Mar-26 15:00	18	18	0	26	25	18	24	37	34	50	250
09-Mar-26 16:00	18	18	0	26	26	18	25	35	36	50	252
09-Mar-26 17:00	18	18	0	26	26	19	26	35	36	50	253
09-Mar-26 18:00	18	18	0	26	26	19	26	35	37	50	255
09-Mar-26 19:00	18	18	0	26	26	20	26	35	36	50	255
09-Mar-26 20:00	18	18	0	26	26	20	27	35	36	50	255
09-Mar-26 21:00	18	18	0	26	26	20	31	35	36	50	259
09-Mar-26 22:00	18	18	0	25	26	19	31	37	34	50	257
09-Mar-26 23:00	18	18	0	26	26	20	26	37	34	50	255

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
10-Mar-26 00:00	18	18	0	26	26	19	27	37	34	50	256
10-Mar-26 01:00	18	18	0	26	26	19	28	37	34	50	256
10-Mar-26 02:00	18	18	0	26	26	19	28	37	34	50	257
10-Mar-26 03:00	18	18	0	26	26	20	27	37	34	50	256
10-Mar-26 04:00	18	18	0	26	26	20	26	37	33	50	254
10-Mar-26 05:00	18	19	0	26	26	18	27	37	34	50	254
10-Mar-26 06:00	18	18	0	26	26	20	26	37	34	50	254
10-Mar-26 07:00	18	18	0	26	26	18	25	35	36	50	252
10-Mar-26 08:00	18	18	0	26	26	20	23	35	36	50	252
10-Mar-26 09:00	18	19	0	26	26	18	24	35	36	50	250
10-Mar-26 10:00	18	19	0	25	26	18	23	35	36	50	251
10-Mar-26 11:00	18	18	0	26	25	19	22	35	36	50	250
10-Mar-26 12:00	18	18	0	26	26	19	22	35	36	50	251
10-Mar-26 13:00	18	18	0	26	26	17	25	33	37	49	249
10-Mar-26 14:00	18	18	0	26	26	16	25	35	36	49	250
10-Mar-26 15:00	18	18	0	26	26	17	25	35	36	49	250
10-Mar-26 16:00	18	18	0	26	34	19	23	35	36	46	255
10-Mar-26 17:00	18	18	0	26	32	18	24	35	36	47	255
10-Mar-26 18:00	18	18	0	26	26	18	27	34	35	50	254
10-Mar-26 19:00	18	18	0	26	26	18	29	35	36	50	257
10-Mar-26 20:00	19	18	0	26	26	18	31	36	35	47	256
10-Mar-26 21:00	19	19	0	26	26	19	28	36	34	50	256
10-Mar-26 22:00	18	19	0	26	26	18	29	36	35	50	256
10-Mar-26 23:00	18	19	0	26	26	19	29	37	33	50	256
11-Mar-26 00:00	19	19	0	26	26	18	29	37	34	50	258
11-Mar-26 01:00	18	19	0	26	26	16	30	37	34	50	256
11-Mar-26 02:00	18	19	0	26	26	17	30	37	34	49	256
11-Mar-26 03:00	18	19	0	26	26	15	31	37	34	50	255
11-Mar-26 04:00	18	19	0	26	26	17	31	37	34	50	258
11-Mar-26 05:00	18	19	0	26	26	17	31	36	34	50	257
11-Mar-26 06:00	18	19	0	26	26	18	30	37	34	50	257
11-Mar-26 07:00	18	18	0	27	26	17	29	36	36	50	256
11-Mar-26 08:00	18	19	0	26	26	16	27	35	36	50	254
11-Mar-26 09:00	18	19	0	26	27	17	28	35	36	50	256
11-Mar-26 10:00	18	19	0	27	27	19	23	35	36	50	253
11-Mar-26 11:00	18	19	0	26	26	21	25	35	36	48	254
11-Mar-26 12:00	18	19	0	26	26	20	24	35	36	48	252
11-Mar-26 13:00	18	19	0	26	26	20	26	35	36	48	253
11-Mar-26 14:00	22	18	0	26	26	19	25	35	36	46	252
11-Mar-26 15:00	19	18	0	26	26	17	29	35	36	49	254
11-Mar-26 16:00	18	18	0	26	26	21	25	35	36	50	256
11-Mar-26 17:00	18	18	0	26	26	21	26	35	36	50	256
11-Mar-26 18:00	18	18	0	26	26	22	25	35	36	50	256
11-Mar-26 19:00	18	18	0	26	26	22	27	35	36	50	258
11-Mar-26 20:00	18	18	0	26	26	22	27	35	36	50	258
11-Mar-26 21:00	18	19	0	26	25	22	25	35	36	50	256
11-Mar-26 22:00	18	18	0	26	26	23	26	35	36	50	257
11-Mar-26 23:00	18	18	0	26	26	22	27	35	36	50	257

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
12-Mar-26 00:00	18	18	0	26	26	23	25	35	36	50	257
12-Mar-26 01:00	18	18	0	26	26	23	24	35	36	50	254
12-Mar-26 02:00	18	18	0	26	26	22	24	35	36	50	255
12-Mar-26 03:00	18	18	0	25	27	19	25	35	36	48	251
12-Mar-26 04:00	18	18	0	25	26	19	24	35	36	48	249
12-Mar-26 05:00	18	18	0	25	26	19	23	35	36	47	248
12-Mar-26 06:00	18	18	0	25	26	18	23	30	31	48	238
12-Mar-26 07:00	18	18	0	25	26	16	25	30	31	45	235
12-Mar-26 08:00	18	18	0	24	26	18	25	35	35	43	242
12-Mar-26 09:00	18	18	0	25	26	19	24	35	36	44	244
12-Mar-26 10:00	18	18	0	25	26	19	25	35	36	44	247
12-Mar-26 11:00	18	18	0	25	26	19	25	35	36	44	245
12-Mar-26 12:00	18	18	0	25	26	18	26	35	35	44	246
12-Mar-26 13:00	18	18	0	25	26	19	22	35	36	45	244
12-Mar-26 14:00	18	18	0	25	25	19	24	34	35	46	244
12-Mar-26 15:00	18	18	0	25	25	16	25	30	31	46	235
12-Mar-26 16:00	18	18	0	25	25	17	25	30	30	46	234
12-Mar-26 17:00	18	18	0	25	25	15	29	30	31	46	237
12-Mar-26 18:00	18	18	0	25	25	21	25	38	32	46	248
12-Mar-26 19:00	18	18	0	25	25	20	25	36	35	47	248
12-Mar-26 20:00	18	18	0	25	25	22	24	36	35	46	248
12-Mar-26 21:00	18	18	0	25	26	22	25	36	35	45	250
12-Mar-26 22:00	18	18	0	25	26	22	23	36	35	45	248
12-Mar-26 23:00	18	18	0	25	26	23	24	35	35	45	250
13-Mar-26 00:00	18	18	0	25	26	22	24	36	35	44	249
13-Mar-26 01:00	18	18	0	25	26	22	24	36	35	44	249
13-Mar-26 02:00	18	18	0	25	27	21	24	37	35	44	249
13-Mar-26 03:00	18	18	0	25	26	20	23	36	35	44	244
13-Mar-26 04:00	17	18	0	25	26	19	25	36	35	43	243
13-Mar-26 05:00	17	18	0	25	26	20	25	36	35	44	247
13-Mar-26 06:00	17	17	0	25	26	19	26	36	35	44	245
13-Mar-26 07:00	17	17	0	25	26	19	23	36	35	46	245
13-Mar-26 08:00	17	17	0	25	25	19	24	38	32	44	241
13-Mar-26 09:00	17	17	0	25	26	18	21	38	32	45	238
13-Mar-26 10:00	16	16	0	25	26	17	25	39	33	45	242
13-Mar-26 11:00	16	16	0	25	26	17	23	37	34	45	240
13-Mar-26 12:00	16	16	0	25	26	16	23	38	33	47	240
13-Mar-26 13:00	16	16	0	25	26	15	25	36	35	48	242
13-Mar-26 14:00	16	16	0	25	26	16	24	32	38	48	240
13-Mar-26 15:00	16	16	0	25	26	16	23	35	36	48	240
13-Mar-26 16:00	16	16	0	25	25	16	25	37	33	49	243
13-Mar-26 17:00	16	16	0	25	26	15	28	37	34	49	246
13-Mar-26 18:00	16	17	0	25	26	15	25	38	32	48	243
13-Mar-26 19:00	15	15	0	24	27	15	18	35	35	30	214
13-Mar-26 20:00	16	16	0	26	26	13	23	36	35	50	241
13-Mar-26 21:00	19	16	0	26	26	13	24	36	36	47	242
13-Mar-26 22:00	16	16	0	25	26	15	32	33	32	41	237
13-Mar-26 23:00	16	16	0	26	26	13	26	36	36	50	245

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
14-Mar-26 00:00	16	16	0	26	26	13	25	35	35	50	243
14-Mar-26 01:00	16	16	0	26	26	13	24	36	35	50	242
14-Mar-26 02:00	16	16	0	26	26	13	24	36	36	50	243
14-Mar-26 03:00	16	16	0	26	26	14	23	36	35	50	242
14-Mar-26 04:00	16	16	0	26	26	13	26	36	35	50	243
14-Mar-26 05:00	17	16	0	27	26	13	26	35	35	50	247
14-Mar-26 06:00	16	16	0	26	27	14	26	36	35	50	246
14-Mar-26 07:00	16	16	0	26	27	15	23	36	35	50	244
14-Mar-26 08:00	16	16	0	26	26	14	23	38	32	50	243
14-Mar-26 09:00	16	16	0	26	26	15	22	39	32	50	242
14-Mar-26 10:00	16	16	0	26	26	15	15	38	31	50	233
14-Mar-26 11:00	16	16	0	26	26	16	25	38	32	46	240
14-Mar-26 12:00	16	16	0	26	26	17	23	38	32	47	241
14-Mar-26 13:00	22	16	0	26	26	17	24	38	33	43	245
14-Mar-26 14:00	16	16	0	26	26	16	25	38	33	50	246
14-Mar-26 15:00	16	16	0	26	26	16	26	38	32	50	245
14-Mar-26 16:00	16	16	0	26	26	15	31	38	32	50	249
14-Mar-26 17:00	16	18	0	26	26	17	26	37	33	50	249
14-Mar-26 18:00	16	18	0	26	26	16	27	37	33	50	249
14-Mar-26 19:00	16	18	0	26	26	17	27	35	35	50	250
14-Mar-26 20:00	16	18	0	26	25	17	26	35	35	50	248
14-Mar-26 21:00	16	18	0	26	26	17	28	35	35	50	251
14-Mar-26 22:00	16	18	0	26	26	18	27	36	35	50	253
14-Mar-26 23:00	16	18	0	26	26	18	26	35	35	50	250
15-Mar-26 00:00	16	18	0	26	26	18	26	36	35	50	252
15-Mar-26 01:00	16	18	0	26	26	17	26	36	35	50	251
15-Mar-26 02:00	16	18	0	26	26	17	26	35	35	50	250
15-Mar-26 03:00	16	18	0	27	26	19	26	35	35	50	252
15-Mar-26 04:00	16	18	0	26	26	18	25	36	35	50	250
15-Mar-26 05:00	16	18	0	27	26	19	24	35	35	50	250
15-Mar-26 06:00	16	18	0	26	26	18	25	36	36	50	250
15-Mar-26 07:00	16	17	0	26	26	18	24	36	36	50	249
15-Mar-26 08:00	16	17	0	26	26	18	24	38	32	50	247
15-Mar-26 09:00	16	17	0	26	26	16	26	39	33	50	248
15-Mar-26 10:00	16	18	0	26	26	17	23	39	32	50	246
15-Mar-26 11:00	16	17	0	24	26	15	26	38	33	50	245
15-Mar-26 12:00	16	18	0	25	26	17	23	37	33	50	244
15-Mar-26 13:00	16	17	0	25	26	16	24	38	32	50	243
15-Mar-26 14:00	16	17	0	25	27	17	24	34	37	49	245
15-Mar-26 15:00	16	18	0	26	26	17	23	35	36	49	247
15-Mar-26 16:00	16	18	0	25	25	17	24	35	36	50	246
15-Mar-26 17:00	16	18	0	25	26	17	25	35	35	50	246
15-Mar-26 18:00	16	19	0	25	26	17	25	35	36	50	247
15-Mar-26 19:00	16	18	0	26	26	17	27	35	36	50	250
15-Mar-26 20:00	16	18	0	26	26	18	27	35	36	50	251
15-Mar-26 21:00	16	18	0	26	26	17	26	35	36	50	250
15-Mar-26 22:00	16	18	0	26	26	18	26	35	36	50	251
15-Mar-26 23:00	16	18	0	27	26	18	29	35	36	50	254

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
16-Mar-26 00:00	16	18	0	26	26	18	28	35	35	50	252
16-Mar-26 01:00	17	18	0	26	26	18	27	35	36	50	253
16-Mar-26 02:00	16	18	0	26	26	19	28	35	36	50	253
16-Mar-26 03:00	16	18	0	26	26	19	28	35	36	50	254
16-Mar-26 04:00	16	18	0	25	26	18	30	35	36	50	254
16-Mar-26 05:00	17	18	0	26	27	18	28	35	36	50	254
16-Mar-26 06:00	16	18	0	26	26	17	28	35	36	50	251
16-Mar-26 07:00	17	18	0	26	26	19	24	35	36	50	251
16-Mar-26 08:00	17	19	0	26	26	19	22	35	36	50	251
16-Mar-26 09:00	17	19	0	26	26	19	23	35	36	50	250
16-Mar-26 10:00	17	19	0	26	26	19	21	35	36	50	250
16-Mar-26 11:00	17	19	0	26	25	18	25	35	36	50	253
16-Mar-26 12:00	17	19	0	26	26	18	23	36	36	49	250
16-Mar-26 13:00	17	18	0	26	26	18	25	35	36	50	251
16-Mar-26 14:00	17	18	0	26	26	19	26	35	36	49	252
16-Mar-26 15:00	17	18	0	26	26	18	26	35	36	49	252
16-Mar-26 16:00	17	18	0	26	26	17	28	35	36	50	253
16-Mar-26 17:00	17	18	0	26	26	17	29	35	36	50	253
16-Mar-26 18:00	18	18	0	26	26	18	26	35	36	49	253
16-Mar-26 19:00	18	18	0	26	26	18	27	35	36	50	253
16-Mar-26 20:00	18	18	0	26	26	18	26	35	36	50	253
16-Mar-26 21:00	20	18	0	26	26	18	29	35	36	47	255
16-Mar-26 22:00	18	18	0	26	26	15	29	35	36	50	253
16-Mar-26 23:00	18	18	0	26	26	16	29	36	36	50	254
17-Mar-26 00:00	18	18	0	26	27	18	26	35	36	50	253
17-Mar-26 01:00	18	18	0	26	26	15	27	35	36	50	252
17-Mar-26 02:00	18	18	0	26	26	16	26	35	36	50	251
17-Mar-26 03:00	18	18	0	26	26	17	26	35	36	50	252
17-Mar-26 04:00	18	18	0	26	27	17	25	35	36	50	251
17-Mar-26 05:00	18	18	0	26	25	17	25	35	36	50	250
17-Mar-26 06:00	18	18	0	25	26	18	28	35	36	46	250
17-Mar-26 07:00	18	18	0	26	26	18	23	35	35	50	250
17-Mar-26 08:00	17	18	0	26	27	17	27	36	36	49	253
17-Mar-26 09:00	17	18	0	26	26	17	27	35	36	50	252
17-Mar-26 10:00	17	18	0	26	26	17	25	35	36	50	250
17-Mar-26 11:00	17	18	0	26	26	17	24	36	36	50	251
17-Mar-26 12:00	19	18	0	26	26	18	24	35	36	48	249
17-Mar-26 13:00	23	18	0	26	26	17	24	35	36	41	245
17-Mar-26 14:00	17	18	0	25	26	15	27	35	36	49	249
17-Mar-26 15:00	17	18	0	25	26	16	27	35	36	49	250
17-Mar-26 16:00	17	18	0	25	26	17	29	35	36	49	253
17-Mar-26 17:00	17	18	0	26	26	17	26	35	36	50	250
17-Mar-26 18:00	17	18	0	26	26	18	27	35	36	50	252
17-Mar-26 19:00	17	18	0	26	26	19	26	35	36	50	254
17-Mar-26 20:00	17	18	0	26	26	18	27	36	35	50	254
17-Mar-26 21:00	17	19	0	26	26	18	27	35	36	50	254
17-Mar-26 22:00	17	18	0	26	26	18	29	35	36	50	255
17-Mar-26 23:00	17	18	0	26	27	18	28	35	35	50	254

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
18-Mar-26 00:00	17	18	0	26	26	17	24	35	36	48	247
18-Mar-26 01:00	17	18	0	24	26	18	28	35	36	46	248
18-Mar-26 02:00	17	18	0	25	26	19	27	35	36	50	252
18-Mar-26 03:00	17	18	0	25	26	18	27	35	36	50	251
18-Mar-26 04:00	17	18	0	25	27	17	28	35	36	50	252
18-Mar-26 05:00	17	18	0	24	26	18	28	35	36	50	252
18-Mar-26 06:00	17	18	0	25	26	18	27	35	36	50	253
18-Mar-26 07:00	17	18	0	25	26	18	27	35	36	50	253
18-Mar-26 08:00	17	18	0	25	26	17	28	35	36	50	251
18-Mar-26 09:00	17	18	0	25	26	17	25	35	36	50	250
18-Mar-26 10:00	17	18	0	25	26	16	26	37	34	50	248
18-Mar-26 11:00	17	18	0	30	21	17	25	37	34	50	248
18-Mar-26 12:00	17	18	0	26	26	17	24	37	34	50	248
18-Mar-26 13:00	17	24	0	26	25	16	27	38	32	47	252
18-Mar-26 14:00	17	18	0	26	25	14	29	38	33	46	246
18-Mar-26 15:00	17	18	0	26	26	16	29	37	34	46	249
18-Mar-26 16:00	17	19	0	26	25	17	29	37	34	46	250
18-Mar-26 17:00	18	19	0	26	26	17	32	37	34	46	254
18-Mar-26 18:00	18	19	0	26	26	18	30	37	34	46	255
18-Mar-26 19:00	18	19	0	26	26	17	30	37	34	46	252
18-Mar-26 20:00	18	19	0	27	26	17	27	38	33	50	254
18-Mar-26 21:00	16	19	0	25	26	17	27	38	33	50	252
18-Mar-26 22:00	16	19	0	26	26	15	28	38	33	50	251
18-Mar-26 23:00	17	19	0	26	26	17	26	38	33	50	250
19-Mar-26 00:00	16	19	0	26	26	17	25	39	33	50	251
19-Mar-26 01:00	16	19	0	26	26	17	25	38	33	50	251
19-Mar-26 02:00	16	19	0	26	25	16	27	38	33	50	250
19-Mar-26 03:00	16	19	0	25	26	16	31	38	33	50	253
19-Mar-26 04:00	16	19	0	26	26	17	31	38	33	50	256
19-Mar-26 05:00	17	19	0	26	26	15	31	38	33	50	255
19-Mar-26 06:00	16	19	0	26	27	16	30	38	33	50	256
19-Mar-26 07:00	16	19	0	26	26	16	28	38	33	50	251
19-Mar-26 08:00	16	19	0	25	26	17	28	38	33	50	252
19-Mar-26 09:00	16	19	0	26	26	16	27	38	33	50	251
19-Mar-26 10:00	16	19	0	26	26	16	25	38	33	50	248
19-Mar-26 11:00	16	19	0	25	25	16	25	38	33	50	248
19-Mar-26 12:00	16	19	0	26	26	17	25	38	33	50	249
19-Mar-26 13:00	16	19	0	26	26	17	27	33	38	50	251
19-Mar-26 14:00	16	19	0	26	25	16	28	37	33	49	250
19-Mar-26 15:00	16	19	0	26	26	18	29	38	33	50	254
19-Mar-26 16:00	16	19	0	26	26	17	30	38	34	50	255
19-Mar-26 17:00	16	19	0	26	25	14	35	38	34	50	256
19-Mar-26 18:00	16	19	0	26	27	17	32	38	33	50	257
19-Mar-26 19:00	16	19	0	26	26	16	33	37	33	50	256
19-Mar-26 20:00	16	19	0	25	26	15	34	37	33	50	256
19-Mar-26 21:00	17	19	0	25	26	17	33	38	33	50	258
19-Mar-26 22:00	17	19	0	26	27	17	31	38	33	50	258
19-Mar-26 23:00	17	19	0	26	26	16	31	38	33	50	256

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
20-Mar-26 00:00	17	19	0	26	27	16	32	38	33	50	257
20-Mar-26 01:00	17	19	0	26	27	15	33	38	32	51	258
20-Mar-26 02:00	17	19	0	25	26	14	32	38	33	50	256
20-Mar-26 03:00	17	19	0	26	26	15	31	38	33	50	255
20-Mar-26 04:00	17	19	0	27	27	15	32	38	33	50	259
20-Mar-26 05:00	17	19	0	26	27	15	32	38	33	50	257
20-Mar-26 06:00	17	19	0	26	26	16	30	38	33	50	254
20-Mar-26 07:00	18	19	0	26	26	17	29	38	33	50	256
20-Mar-26 08:00	17	19	0	25	26	15	28	36	36	50	252
20-Mar-26 09:00	18	18	0	25	26	16	25	35	35	50	249
20-Mar-26 10:00	17	19	0	26	26	17	27	36	35	50	255
20-Mar-26 11:00	18	19	0	25	26	18	25	35	35	50	252
20-Mar-26 12:00	23	18	0	25	26	16	29	36	36	48	256
20-Mar-26 13:00	21	18	0	25	26	17	31	35	36	48	257
20-Mar-26 14:00	19	19	0	25	26	17	27	36	35	50	255
20-Mar-26 15:00	19	19	0	25	26	17	29	35	35	50	254
20-Mar-26 16:00	19	19	0	25	26	18	30	36	36	50	259
20-Mar-26 17:00	19	19	0	25	26	17	32	36	36	50	259
20-Mar-26 18:00	19	19	0	25	26	16	34	36	36	50	260
20-Mar-26 19:00	19	19	0	25	26	17	33	35	35	50	259
20-Mar-26 20:00	19	19	0	25	26	19	31	35	35	50	259
20-Mar-26 21:00	19	19	0	25	26	18	33	35	35	50	260
20-Mar-26 22:00	19	19	0	25	26	18	33	36	36	50	260
20-Mar-26 23:00	19	19	0	25	26	18	33	35	36	50	261
21-Mar-26 00:00	19	19	0	25	26	18	32	35	35	50	260
21-Mar-26 01:00	19	19	0	25	26	17	32	36	35	49	259
21-Mar-26 02:00	19	19	0	25	26	18	31	36	36	50	260
21-Mar-26 03:00	19	19	0	25	27	19	30	35	36	50	260
21-Mar-26 04:00	19	19	0	25	27	18	31	36	35	50	259
21-Mar-26 05:00	19	19	0	25	26	17	31	36	36	49	257
21-Mar-26 06:00	19	19	0	25	26	17	30	35	35	50	258
21-Mar-26 07:00	19	19	0	25	26	18	29	36	36	50	259
21-Mar-26 08:00	19	19	0	25	26	19	26	35	35	50	255
21-Mar-26 09:00	19	19	0	25	26	17	29	36	35	50	256
21-Mar-26 10:00	19	19	0	25	26	17	26	36	35	50	253
21-Mar-26 11:00	19	19	0	25	26	17	28	35	35	50	255
21-Mar-26 12:00	19	19	0	25	26	17	25	35	36	50	252
21-Mar-26 13:00	19	22	0	25	26	18	27	36	36	45	253
21-Mar-26 14:00	19	19	0	25	26	18	27	38	33	50	255
21-Mar-26 15:00	19	19	0	25	26	18	28	37	33	50	255
21-Mar-26 16:00	19	19	0	25	26	17	29	36	36	50	256
21-Mar-26 17:00	19	19	0	25	26	16	29	35	36	50	255
21-Mar-26 18:00	19	19	0	25	26	17	31	35	36	50	258
21-Mar-26 19:00	19	19	0	25	26	17	31	36	35	50	258
21-Mar-26 20:00	19	19	0	25	26	18	30	35	36	51	257
21-Mar-26 21:00	19	18	0	25	26	18	30	35	35	50	258
21-Mar-26 22:00	19	19	0	25	26	17	30	35	35	50	257
21-Mar-26 23:00	19	19	0	25	26	16	30	35	35	50	255

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
22-Mar-26 00:00	19	19	0	25	26	16	31	36	36	50	258
22-Mar-26 01:00	19	19	0	25	26	17	32	35	36	50	259
22-Mar-26 02:00	19	19	0	25	26	17	33	36	36	50	259
22-Mar-26 03:00	19	19	0	24	26	17	31	37	34	50	257
22-Mar-26 04:00	19	19	0	26	26	18	34	31	31	49	252
22-Mar-26 05:00	19	19	0	25	26	18	32	35	36	50	260
22-Mar-26 06:00	19	19	0	24	26	16	29	36	36	50	255
22-Mar-26 07:00	19	19	0	25	26	17	28	35	35	50	255
22-Mar-26 08:00	19	19	0	24	26	17	27	35	35	50	251
22-Mar-26 09:00	19	19	0	25	26	16	29	35	35	50	254
22-Mar-26 10:00	19	19	0	25	26	17	27	35	36	50	253
22-Mar-26 11:00	19	19	0	26	26	17	27	35	36	49	254
22-Mar-26 12:00	19	19	0	25	26	18	29	36	36	50	257
22-Mar-26 13:00	19	19	0	25	26	17	26	32	38	51	253
22-Mar-26 14:00	19	19	0	25	26	16	30	35	36	50	256
22-Mar-26 15:00	19	19	0	25	26	17	30	35	36	50	257
22-Mar-26 16:00	19	19	0	25	26	16	33	35	35	50	259
22-Mar-26 17:00	19	19	0	25	26	18	32	35	35	50	258
22-Mar-26 18:00	19	19	0	25	26	16	34	35	36	50	260
22-Mar-26 19:00	19	19	0	25	27	17	31	35	36	50	260
22-Mar-26 20:00	19	19	0	25	26	16	34	35	35	48	257
22-Mar-26 21:00	19	19	0	25	25	19	31	30	30	50	248
22-Mar-26 22:00	19	19	0	24	26	18	34	35	35	50	260
22-Mar-26 23:00	19	19	0	25	26	18	35	35	36	50	263
23-Mar-26 00:00	19	19	0	25	26	18	34	35	36	50	262
23-Mar-26 01:00	19	19	0	25	26	18	35	35	36	50	263
23-Mar-26 02:00	19	18	0	25	27	17	34	35	36	50	262
23-Mar-26 03:00	19	19	0	25	26	16	34	35	35	50	259
23-Mar-26 04:00	19	19	0	25	26	17	34	35	35	50	262
23-Mar-26 05:00	19	19	0	25	26	16	34	35	35	50	260
23-Mar-26 06:00	19	19	0	24	27	17	34	36	36	50	261
23-Mar-26 07:00	19	19	0	26	26	17	33	38	34	50	260
23-Mar-26 08:00	19	19	0	25	27	17	31	38	34	50	260
23-Mar-26 09:00	18	19	0	25	26	17	32	38	34	50	258
23-Mar-26 10:00	19	19	0	25	26	17	32	37	33	50	257
23-Mar-26 11:00	19	19	0	25	27	16	32	37	33	50	258
23-Mar-26 12:00	18	19	0	25	26	15	32	37	32	50	256
23-Mar-26 13:00	19	19	0	24	26	16	37	37	32	44	254
23-Mar-26 14:00	22	19	0	25	26	17	26	35	36	50	258
23-Mar-26 15:00	19	19	0	25	26	17	33	35	36	50	259
23-Mar-26 16:00	19	19	0	26	26	16	34	36	35	50	262
23-Mar-26 17:00	19	19	0	26	27	16	34	35	35	50	261
23-Mar-26 18:00	19	19	0	26	27	15	36	36	36	50	264
23-Mar-26 19:00	19	19	0	27	27	17	35	35	36	50	264
23-Mar-26 20:00	19	19	0	26	27	16	34	35	36	50	263
23-Mar-26 21:00	19	19	0	26	27	16	33	35	35	50	260
23-Mar-26 22:00	19	19	0	26	27	15	34	35	35	50	261
23-Mar-26 23:00	18	19	0	26	27	17	33	35	36	50	262

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
24-Mar-26 00:00	19	19	0	27	27	16	35	35	36	49	265
24-Mar-26 01:00	19	19	0	27	27	17	34	35	35	50	263
24-Mar-26 02:00	19	19	0	27	28	17	33	36	35	50	263
24-Mar-26 03:00	19	19	0	27	28	16	36	36	35	50	266
24-Mar-26 04:00	19	19	0	27	28	17	32	36	36	50	263
24-Mar-26 05:00	19	19	0	26	27	16	34	35	36	50	262
24-Mar-26 06:00	19	19	0	26	27	16	28	35	36	50	257
24-Mar-26 07:00	19	18	0	26	27	15	29	37	33	50	255
24-Mar-26 08:00	19	19	0	26	27	15	29	38	34	50	257
24-Mar-26 09:00	19	19	0	26	27	16	28	38	33	50	256
24-Mar-26 10:00	19	19	0	26	27	16	27	38	33	50	254
24-Mar-26 11:00	19	19	0	26	27	15	22	37	33	50	247
24-Mar-26 12:00	19	19	0	25	26	14	23	37	34	50	247
24-Mar-26 13:00	19	19	0	33	26	16	22	37	34	42	249
24-Mar-26 14:00	19	23	0	26	27	17	23	37	34	44	251
24-Mar-26 15:00	19	22	0	26	27	17	21	37	33	44	246
24-Mar-26 16:00	19	19	0	27	26	16	25	37	34	50	252
24-Mar-26 17:00	19	19	0	25	26	15	28	38	34	50	254
24-Mar-26 18:00	19	19	0	26	26	16	29	38	34	50	255
24-Mar-26 19:00	19	19	0	26	26	17	28	35	36	50	256
24-Mar-26 20:00	19	19	0	26	26	16	33	37	33	50	260
24-Mar-26 21:00	19	19	0	26	26	15	34	37	33	50	259
24-Mar-26 22:00	19	19	0	26	26	14	36	38	33	50	261
24-Mar-26 23:00	20	20	0	26	26	14	35	38	33	50	261
25-Mar-26 00:00	19	19	0	27	26	14	35	38	33	50	261
25-Mar-26 01:00	19	19	0	27	26	15	33	38	32	50	259
25-Mar-26 02:00	19	19	0	26	26	14	35	38	33	50	261
25-Mar-26 03:00	19	19	0	26	26	14	36	38	33	50	260
25-Mar-26 04:00	19	19	0	27	27	15	34	38	33	50	261
25-Mar-26 05:00	19	19	0	27	26	14	35	38	34	50	262
25-Mar-26 06:00	19	19	0	26	26	14	34	38	34	50	260
25-Mar-26 07:00	19	19	0	27	26	15	34	38	34	51	262
25-Mar-26 08:00	19	19	0	27	26	16	32	37	34	50	260
25-Mar-26 09:00	19	19	0	26	26	16	32	37	33	50	260
25-Mar-26 10:00	19	19	0	26	26	17	32	38	34	50	260
25-Mar-26 11:00	19	19	0	26	26	16	29	37	34	50	256
25-Mar-26 12:00	19	19	0	27	26	17	28	33	38	50	256
25-Mar-26 13:00	19	19	0	27	26	18	27	33	38	49	257
25-Mar-26 14:00	19	19	0	26	33	17	26	35	36	46	256
25-Mar-26 15:00	19	19	0	26	27	17	31	37	34	49	259
25-Mar-26 16:00	19	19	0	26	27	16	33	37	34	49	260
25-Mar-26 17:00	19	19	0	26	27	16	34	37	35	49	261
25-Mar-26 18:00	20	19	0	26	27	16	34	37	33	50	262
25-Mar-26 19:00	19	19	0	26	27	15	36	35	35	49	262
25-Mar-26 20:00	19	19	0	26	27	14	37	35	35	50	263
25-Mar-26 21:00	20	19	0	26	27	17	34	35	36	49	264
25-Mar-26 22:00	20	19	0	26	27	15	35	36	36	49	264
25-Mar-26 23:00	20	19	0	26	27	16	33	35	35	50	261

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
26-Mar-26 00:00	19	19	0	26	27	16	34	36	36	50	262
26-Mar-26 01:00	19	19	0	26	27	17	34	35	36	50	263
26-Mar-26 02:00	19	19	0	26	27	18	34	35	36	50	264
26-Mar-26 03:00	19	19	0	26	27	17	36	36	36	49	266
26-Mar-26 04:00	19	19	0	26	27	17	36	35	35	49	264
26-Mar-26 05:00	20	20	0	26	27	17	35	35	35	50	265
26-Mar-26 06:00	20	20	0	26	27	18	32	36	36	49	264
26-Mar-26 07:00	19	19	0	26	27	16	33	35	35	50	260
26-Mar-26 08:00	20	18	0	26	27	15	35	36	36	50	262
26-Mar-26 09:00	20	19	0	26	27	15	34	36	35	50	261
26-Mar-26 10:00	20	19	0	26	27	14	30	36	36	50	257
26-Mar-26 11:00	20	19	0	26	27	14	31	35	36	49	258
26-Mar-26 12:00	22	19	0	26	27	15	28	35	36	49	257
26-Mar-26 13:00	22	19	0	26	27	14	25	35	36	49	255
26-Mar-26 14:00	19	19	0	26	26	13	37	35	36	45	256
26-Mar-26 15:00	19	19	0	25	26	14	33	35	35	49	257
26-Mar-26 16:00	19	19	0	26	27	13	35	36	36	49	260
26-Mar-26 17:00	19	19	0	26	27	14	37	35	36	49	261
26-Mar-26 18:00	19	19	0	26	27	13	37	36	36	49	263
26-Mar-26 19:00	20	21	0	27	27	15	34	35	36	49	265
26-Mar-26 20:00	20	21	0	27	27	15	33	35	36	50	264
26-Mar-26 21:00	20	20	0	27	27	17	33	35	35	50	263
26-Mar-26 22:00	20	20	0	27	27	17	32	35	35	50	263
26-Mar-26 23:00	20	20	0	27	26	16	33	36	36	50	265
27-Mar-26 00:00	18	18	0	25	25	15	25	22	39	43	230
27-Mar-26 01:00	18	18	0	33	0	12	32	30	39	50	232
27-Mar-26 02:00	18	18	0	33	0	14	30	30	39	50	231
27-Mar-26 03:00	18	18	0	33	0	13	29	30	38	50	230
27-Mar-26 04:00	18	18	0	33	0	15	28	30	39	50	230
27-Mar-26 05:00	18	18	0	33	0	14	29	30	39	50	231
27-Mar-26 06:00	18	18	0	32	0	12	32	30	39	50	231
27-Mar-26 07:00	18	18	0	33	0	14	26	32	39	50	230
27-Mar-26 08:00	18	18	0	34	0	14	26	31	38	50	230
27-Mar-26 09:00	18	18	0	33	0	15	25	31	39	50	228
27-Mar-26 10:00	18	18	0	33	0	13	24	32	38	50	227
27-Mar-26 11:00	18	18	0	33	0	14	25	31	38	49	228
27-Mar-26 12:00	18	18	0	33	0	12	26	31	38	49	226
27-Mar-26 13:00	18	18	0	33	0	12	30	30	38	49	229
27-Mar-26 14:00	18	23	0	31	0	13	27	30	38	50	229
27-Mar-26 15:00	18	18	0	32	0	11	28	36	38	48	229
27-Mar-26 16:00	18	18	0	31	0	10	28	36	38	50	229
27-Mar-26 17:00	18	18	0	31	0	11	29	35	39	50	231
27-Mar-26 18:00	18	18	0	31	0	12	29	36	38	50	232
27-Mar-26 19:00	18	18	0	31	0	11	29	36	39	50	231
27-Mar-26 20:00	19	19	0	31	0	11	26	36	39	50	231
27-Mar-26 21:00	19	19	0	31	0	13	26	36	39	50	233
27-Mar-26 22:00	19	19	0	31	0	11	25	36	39	50	230
27-Mar-26 23:00	19	19	0	31	0	13	24	36	39	50	230

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
28-Mar-26 00:00	19	19	0	31	0	12	25	36	39	50	231
28-Mar-26 01:00	19	19	0	31	0	13	23	36	39	50	230
28-Mar-26 02:00	19	19	0	31	0	12	25	36	39	50	229
28-Mar-26 03:00	19	19	0	31	0	12	24	36	39	50	230
28-Mar-26 04:00	19	19	0	31	0	12	24	36	39	50	229
28-Mar-26 05:00	19	19	0	31	0	13	23	36	39	50	230
28-Mar-26 06:00	18	19	0	31	0	13	24	36	39	49	230
28-Mar-26 07:00	18	19	0	31	0	13	23	36	39	50	229
28-Mar-26 08:00	18	19	0	30	0	13	23	36	39	50	227
28-Mar-26 09:00	18	18	0	31	0	12	26	36	39	50	230
28-Mar-26 10:00	18	19	0	31	0	14	24	34	39	50	228
28-Mar-26 11:00	18	18	0	31	0	15	23	33	38	50	227
28-Mar-26 12:00	18	19	0	30	0	12	25	33	38	50	225
28-Mar-26 13:00	18	19	0	30	0	14	23	33	38	49	224
28-Mar-26 14:00	18	19	0	31	0	15	24	33	38	49	227
28-Mar-26 15:00	18	19	0	31	0	14	23	33	38	49	226
28-Mar-26 16:00	18	18	0	31	0	13	27	33	38	49	227
28-Mar-26 17:00	18	19	0	30	0	14	24	36	39	50	231
28-Mar-26 18:00	18	19	0	31	0	14	24	36	38	50	229
28-Mar-26 19:00	18	19	0	31	0	14	26	36	39	50	233
28-Mar-26 20:00	18	19	0	31	0	14	25	36	39	50	231
28-Mar-26 21:00	18	19	0	31	0	14	31	29	39	50	230
28-Mar-26 22:00	18	19	0	30	0	14	26	35	38	50	230
28-Mar-26 23:00	18	19	0	30	0	14	24	37	39	50	230
29-Mar-26 00:00	18	19	0	31	0	14	24	36	39	50	231
29-Mar-26 01:00	18	19	0	31	0	13	23	37	39	49	228
29-Mar-26 02:00	18	19	0	31	0	14	23	37	39	50	230
29-Mar-26 03:00	18	19	0	31	0	14	24	37	39	50	230
29-Mar-26 04:00	18	19	0	31	0	14	24	37	39	50	230
29-Mar-26 05:00	18	19	0	31	0	15	23	37	39	50	231
29-Mar-26 06:00	18	19	0	31	0	15	22	37	39	50	229
29-Mar-26 07:00	18	19	0	31	0	15	22	35	39	49	228
29-Mar-26 08:00	18	19	0	31	0	14	23	33	38	50	226
29-Mar-26 09:00	18	19	0	30	0	14	24	30	38	50	224
29-Mar-26 10:00	18	19	0	31	0	12	26	30	38	50	224
29-Mar-26 11:00	18	18	0	30	0	13	24	30	38	50	222
29-Mar-26 12:00	18	19	0	30	0	12	26	30	38	50	223
29-Mar-26 13:00	22	19	0	31	0	13	25	25	38	50	222
29-Mar-26 14:00	18	19	0	31	0	13	25	29	38	50	221
29-Mar-26 15:00	18	19	0	31	0	13	24	30	38	50	223
29-Mar-26 16:00	18	19	0	31	0	13	27	30	38	50	224
29-Mar-26 17:00	18	19	0	31	0	13	27	30	38	50	227
29-Mar-26 18:00	18	19	0	31	0	12	28	31	39	49	226
29-Mar-26 19:00	18	19	0	31	0	13	27	32	39	50	228
29-Mar-26 20:00	18	19	0	31	0	12	25	34	39	50	228
29-Mar-26 21:00	19	19	0	31	0	14	24	34	39	50	228
29-Mar-26 22:00	19	19	0	31	0	13	24	34	38	50	227
29-Mar-26 23:00	18	19	0	31	0	14	23	34	39	50	228

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
30-Mar-26 00:00	18	19	0	31	0	13	24	34	39	50	228
30-Mar-26 01:00	18	19	0	31	0	13	24	34	39	50	228
30-Mar-26 02:00	19	19	0	30	0	12	25	34	39	50	228
30-Mar-26 03:00	18	19	0	31	0	11	22	33	39	50	223
30-Mar-26 04:00	19	19	0	31	0	12	22	33	39	49	224
30-Mar-26 05:00	18	19	0	30	0	12	23	32	39	50	224
30-Mar-26 06:00	18	19	0	30	0	12	25	34	39	50	227
30-Mar-26 07:00	18	19	0	31	0	13	25	33	39	50	228
30-Mar-26 08:00	18	19	0	31	0	14	28	31	38	50	229
30-Mar-26 09:00	18	19	0	31	0	13	27	30	38	50	226
30-Mar-26 10:00	18	19	0	31	0	14	26	30	38	50	226
30-Mar-26 11:00	18	19	0	30	0	14	25	30	38	50	225
30-Mar-26 12:00	18	19	0	31	0	14	22	30	38	50	221
30-Mar-26 13:00	19	19	0	34	0	15	25	26	38	47	223
30-Mar-26 14:00	19	19	0	33	0	16	25	26	38	47	223
30-Mar-26 15:00	19	23	0	31	0	14	28	26	38	47	226
30-Mar-26 16:00	19	19	0	31	0	14	28	26	38	50	225
30-Mar-26 17:00	19	19	0	30	0	14	29	26	38	50	226
30-Mar-26 18:00	19	19	0	31	0	13	29	26	38	50	226
30-Mar-26 19:00	19	19	0	30	0	13	29	26	39	50	225
30-Mar-26 20:00	19	19	0	31	0	14	29	26	36	50	222
30-Mar-26 21:00	19	19	0	31	0	15	29	26	39	49	227
30-Mar-26 22:00	19	19	0	31	0	14	30	26	39	50	228
30-Mar-26 23:00	19	19	0	31	0	14	32	26	39	50	230
31-Mar-26 00:00	19	19	0	30	0	13	27	31	39	50	228
31-Mar-26 01:00	19	19	0	31	0	14	26	31	39	50	229
31-Mar-26 02:00	19	19	0	31	0	14	25	31	39	50	229
31-Mar-26 03:00	19	19	0	31	0	14	25	30	39	50	227
31-Mar-26 04:00	19	19	0	31	0	13	25	31	39	50	226
31-Mar-26 05:00	19	19	0	31	0	13	25	30	39	49	225
31-Mar-26 06:00	19	19	0	31	0	14	25	29	39	50	226
31-Mar-26 07:00	19	19	0	31	0	14	26	28	39	50	226
31-Mar-26 08:00	20	19	0	31	0	14	24	28	39	50	225
31-Mar-26 09:00	20	19	0	30	0	14	24	28	38	50	223
31-Mar-26 10:00	20	19	0	30	0	12	23	31	39	50	224
31-Mar-26 11:00	20	19	0	29	0	13	24	26	38	50	219
31-Mar-26 12:00	20	19	0	30	0	13	24	26	38	50	220
31-Mar-26 13:00	20	19	0	30	0	16	24	29	38	50	226
31-Mar-26 14:00	20	19	0	30	0	13	24	33	38	49	227
31-Mar-26 15:00	20	19	0	30	0	13	24	33	38	50	227
31-Mar-26 16:00	20	19	0	30	0	13	25	34	38	50	229
31-Mar-26 17:00	20	19	0	30	0	14	26	33	38	50	230
31-Mar-26 18:00	20	19	0	30	0	13	28	33	38	50	232
31-Mar-26 19:00	20	19	0	29	0	13	28	34	39	50	232
31-Mar-26 20:00	20	19	0	30	0	13	32	31	39	50	233
31-Mar-26 21:00	19	19	0	30	0	14	28	35	39	50	233
31-Mar-26 22:00	19	19	0	30	0	14	30	35	39	50	236
31-Mar-26 23:00	19	19	0	30	0	14	30	36	38	50	236

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
01-Apr-26 00:00	20	21	0	30	0	14	33	34	39	44	235
01-Apr-26 01:00	21	22	0	32	0	14	34	34	39	38	234
01-Apr-26 02:00	22	22	0	32	0	14	35	35	39	38	236
01-Apr-26 03:00	22	22	0	32	0	14	36	36	39	38	238
01-Apr-26 04:00	22	21	0	32	0	14	35	35	39	38	236
01-Apr-26 05:00	22	22	0	32	0	14	34	34	38	38	234
01-Apr-26 06:00	21	22	0	32	0	14	35	35	39	38	235
01-Apr-26 07:00	21	22	0	32	0	15	34	33	39	38	235
01-Apr-26 08:00	20	21	0	32	0	14	37	34	39	37	234
01-Apr-26 09:00	19	19	0	32	0	13	37	36	38	39	232
01-Apr-26 10:00	19	19	0	32	0	13	37	36	38	40	233
01-Apr-26 11:00	19	19	0	32	0	14	30	36	38	42	230
01-Apr-26 12:00	19	19	0	32	0	14	34	36	38	42	234
01-Apr-26 13:00	19	19	0	32	0	13	36	34	37	42	233
01-Apr-26 14:00	22	19	0	31	0	14	31	36	37	42	233
01-Apr-26 15:00	19	19	0	32	0	14	34	37	38	42	234
01-Apr-26 16:00	19	19	0	32	0	15	32	37	38	42	234
01-Apr-26 17:00	19	19	0	32	0	15	31	36	38	47	237
01-Apr-26 18:00	19	19	0	32	0	14	27	37	38	50	236
01-Apr-26 19:00	19	19	0	32	0	15	25	36	38	50	235
01-Apr-26 20:00	18	19	0	32	0	14	25	37	38	50	233
01-Apr-26 21:00	18	19	0	32	0	15	29	35	38	50	237
01-Apr-26 22:00	18	19	0	32	0	13	29	37	38	50	237
01-Apr-26 23:00	18	19	0	31	0	14	28	36	38	50	235
02-Apr-26 00:00	18	19	0	32	0	13	30	37	38	50	237
02-Apr-26 01:00	18	19	0	32	0	14	29	36	38	50	237
02-Apr-26 02:00	18	19	0	32	0	14	30	37	39	50	240
02-Apr-26 03:00	18	19	0	32	0	14	29	37	39	50	238
02-Apr-26 04:00	18	19	0	32	0	13	30	36	38	50	236
02-Apr-26 05:00	18	19	0	32	0	13	28	37	38	50	237
02-Apr-26 06:00	18	19	0	32	0	14	28	37	39	50	237
02-Apr-26 07:00	18	19	0	32	0	14	25	36	38	50	233
02-Apr-26 08:00	18	19	0	31	0	14	27	37	38	50	235
02-Apr-26 09:00	18	19	0	32	0	14	27	36	38	50	234
02-Apr-26 10:00	19	19	0	32	0	16	22	37	38	50	233
02-Apr-26 11:00	19	19	0	32	0	15	22	36	38	50	231
02-Apr-26 12:00	19	20	0	32	0	15	24	36	38	50	233
02-Apr-26 13:00	19	23	0	32	0	13	26	32	37	49	232
02-Apr-26 14:00	18	19	0	33	0	15	25	34	37	49	231
02-Apr-26 15:00	18	19	0	31	0	12	28	37	38	50	232
02-Apr-26 16:00	19	19	0	30	0	14	28	37	38	49	235
02-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	14	28	37	38	50	236
02-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	14	29	37	38	49	237
02-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	13	29	37	38	50	236
02-Apr-26 20:00	19	19	0	30	0	14	30	37	38	50	238
02-Apr-26 21:00	19	19	0	31	0	15	30	37	38	50	238
02-Apr-26 22:00	19	19	0	31	0	13	29	37	38	50	236
02-Apr-26 23:00	19	19	0	30	0	12	31	37	38	50	238

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
03-Apr-26 00:00	19	19	0	30	0	13	30	37	38	50	237
03-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	13	30	37	38	50	237
03-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	12	30	37	38	50	237
03-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	12	30	37	38	50	236
03-Apr-26 04:00	19	19	0	30	0	12	27	37	39	50	233
03-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	12	28	38	38	50	236
03-Apr-26 06:00	19	19	0	30	0	12	29	37	39	50	235
03-Apr-26 07:00	19	19	0	31	0	12	28	37	39	50	235
03-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	14	25	37	38	50	233
03-Apr-26 09:00	19	19	0	30	0	14	28	37	38	50	235
03-Apr-26 10:00	19	19	0	31	0	14	24	37	38	50	232
03-Apr-26 11:00	19	19	0	31	0	14	24	37	38	49	231
03-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	25	34	38	49	229
03-Apr-26 13:00	19	19	0	31	0	14	25	34	38	49	228
03-Apr-26 14:00	19	19	0	31	0	14	26	34	38	49	229
03-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	14	28	34	37	49	232
03-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	14	28	34	38	49	232
03-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	14	32	34	38	49	236
03-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	14	33	34	38	48	236
03-Apr-26 19:00	19	19	0	30	0	14	32	34	38	49	236
03-Apr-26 20:00	19	19	0	31	0	14	32	34	38	49	236
03-Apr-26 21:00	20	19	0	31	0	14	32	34	38	49	237
03-Apr-26 22:00	19	19	0	30	0	13	32	34	38	49	235
03-Apr-26 23:00	19	19	0	31	0	14	33	34	39	49	238
04-Apr-26 00:00	19	19	0	30	0	14	35	34	39	49	239
04-Apr-26 01:00	19	19	0	30	0	14	33	35	39	50	240
04-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	13	31	35	39	50	236
04-Apr-26 03:00	19	19	0	30	0	13	31	35	39	50	236
04-Apr-26 04:00	19	19	0	30	0	14	31	35	39	50	237
04-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	13	31	35	39	50	236
04-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	14	31	35	38	50	236
04-Apr-26 07:00	19	19	0	30	0	14	30	35	39	50	236
04-Apr-26 08:00	19	19	0	30	0	14	29	35	39	50	234
04-Apr-26 09:00	19	19	0	31	0	14	27	35	38	50	233
04-Apr-26 10:00	19	19	0	30	0	14	24	35	38	50	229
04-Apr-26 11:00	19	19	0	30	0	14	27	35	38	50	232
04-Apr-26 12:00	21	19	0	31	0	14	25	33	38	50	231
04-Apr-26 13:00	19	19	0	30	0	14	36	26	38	48	230
04-Apr-26 14:00	19	19	0	30	0	14	37	27	38	48	232
04-Apr-26 15:00	19	19	0	30	0	14	29	36	38	48	233
04-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	14	31	36	38	48	235
04-Apr-26 17:00	19	19	0	30	0	14	32	35	38	49	235
04-Apr-26 18:00	19	19	0	30	0	14	30	35	38	49	234
04-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	31	36	39	48	237
04-Apr-26 20:00	19	19	0	30	0	14	32	36	38	48	236
04-Apr-26 21:00	19	19	0	30	0	14	33	35	39	49	238
04-Apr-26 22:00	19	19	0	30	0	14	31	36	39	48	236
04-Apr-26 23:00	19	19	0	30	0	14	31	36	39	48	235

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
05-Apr-26 00:00	19	19	0	31	0	14	33	36	39	48	238
05-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	14	32	36	38	48	237
05-Apr-26 02:00	19	19	0	30	0	14	33	36	39	48	238
05-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	14	34	36	38	48	238
05-Apr-26 04:00	19	19	0	31	0	14	34	36	39	48	239
05-Apr-26 05:00	19	19	0	30	0	14	33	36	38	48	238
05-Apr-26 06:00	19	19	0	30	0	14	33	36	38	48	236
05-Apr-26 07:00	19	19	0	31	0	14	31	36	38	48	237
05-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	14	30	36	38	48	235
05-Apr-26 09:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	47	236
05-Apr-26 10:00	19	19	0	30	0	14	28	36	38	48	232
05-Apr-26 11:00	19	19	0	30	0	14	28	36	38	48	232
05-Apr-26 12:00	19	21	0	30	0	14	26	34	38	48	231
05-Apr-26 13:00	19	22	0	31	0	14	24	34	38	48	230
05-Apr-26 14:00	19	23	0	31	0	14	24	34	38	48	230
05-Apr-26 15:00	19	19	0	33	0	15	27	31	38	50	232
05-Apr-26 16:00	19	19	0	32	0	15	26	37	38	49	235
05-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	15	28	36	38	49	235
05-Apr-26 18:00	19	19	0	30	0	14	28	36	38	50	234
05-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	14	28	36	38	50	236
05-Apr-26 20:00	19	19	0	31	0	14	30	36	38	50	237
05-Apr-26 21:00	19	19	0	30	0	14	31	36	39	50	238
05-Apr-26 22:00	19	19	0	30	0	14	30	36	38	50	237
05-Apr-26 23:00	19	19	0	30	0	14	29	36	38	49	234
06-Apr-26 00:00	19	19	0	31	0	15	28	36	39	50	236
06-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	14	29	36	39	50	235
06-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	14	29	36	39	50	237
06-Apr-26 03:00	19	19	0	30	0	14	28	36	39	50	236
06-Apr-26 04:00	19	19	0	30	0	14	29	36	39	50	236
06-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	14	28	35	39	50	234
06-Apr-26 06:00	19	19	0	30	0	14	26	36	38	50	233
06-Apr-26 07:00	19	19	0	31	0	14	26	36	39	49	233
06-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	14	26	36	39	50	233
06-Apr-26 09:00	18	19	0	31	0	13	29	36	39	51	235
06-Apr-26 10:00	18	19	0	30	0	12	28	36	38	50	232
06-Apr-26 11:00	18	19	0	30	0	12	27	36	39	49	230
06-Apr-26 12:00	18	19	0	30	0	12	26	36	38	49	228
06-Apr-26 13:00	18	19	0	30	0	12	26	36	38	49	228
06-Apr-26 14:00	18	19	0	31	0	13	26	36	37	49	228
06-Apr-26 15:00	18	19	0	31	0	13	28	36	38	49	233
06-Apr-26 16:00	18	19	0	30	0	12	30	36	38	50	233
06-Apr-26 17:00	18	19	0	31	0	13	31	36	38	50	235
06-Apr-26 18:00	18	19	0	31	0	13	30	36	38	49	235
06-Apr-26 19:00	18	19	0	31	0	13	30	36	38	50	236
06-Apr-26 20:00	18	19	0	30	0	13	31	36	38	51	237
06-Apr-26 21:00	18	19	0	31	0	13	30	37	38	50	236
06-Apr-26 22:00	18	19	0	30	0	13	31	37	35	51	234
06-Apr-26 23:00	18	19	0	30	0	14	31	37	36	50	236

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
07-Apr-26 00:00	18	19	0	30	0	13	30	37	38	50	237
07-Apr-26 01:00	18	19	0	30	0	13	31	37	38	50	236
07-Apr-26 02:00	18	19	0	31	0	13	31	37	38	50	235
07-Apr-26 03:00	18	19	0	31	0	13	30	37	39	50	236
07-Apr-26 04:00	18	19	0	30	0	13	29	37	39	50	235
07-Apr-26 05:00	18	19	0	30	0	12	29	37	39	50	233
07-Apr-26 06:00	18	19	0	31	0	13	29	37	38	50	236
07-Apr-26 07:00	18	19	0	30	0	13	29	37	39	51	235
07-Apr-26 08:00	18	19	0	30	0	14	29	37	38	50	235
07-Apr-26 09:00	18	19	0	30	0	13	30	37	38	50	235
07-Apr-26 10:00	18	19	0	31	0	13	31	36	38	49	235
07-Apr-26 11:00	18	19	0	30	0	13	31	36	38	49	235
07-Apr-26 12:00	19	19	0	30	0	13	33	36	38	49	237
07-Apr-26 13:00	22	19	0	31	0	13	29	35	38	49	236
07-Apr-26 14:00	19	19	0	31	0	13	36	32	37	49	236
07-Apr-26 15:00	19	19	0	30	0	13	34	36	38	49	237
07-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	13	35	36	38	50	241
07-Apr-26 17:00	19	19	0	32	0	12	36	37	38	50	243
07-Apr-26 18:00	20	20	0	33	0	15	35	36	38	50	246
07-Apr-26 19:00	20	20	0	32	0	15	33	36	38	50	244
07-Apr-26 20:00	19	20	0	32	0	15	34	35	39	50	244
07-Apr-26 21:00	19	19	0	32	0	15	33	37	38	50	244
07-Apr-26 22:00	19	19	0	32	0	16	32	37	38	50	242
07-Apr-26 23:00	19	19	0	32	0	14	31	37	38	50	239
08-Apr-26 00:00	19	19	0	32	0	15	30	38	38	50	241
08-Apr-26 01:00	19	19	0	33	0	16	28	37	38	50	240
08-Apr-26 02:00	19	19	0	32	0	15	28	37	39	50	238
08-Apr-26 03:00	19	19	0	32	0	14	30	37	38	50	238
08-Apr-26 04:00	19	19	0	32	0	15	29	37	38	50	238
08-Apr-26 05:00	19	19	0	32	0	15	30	37	38	50	240
08-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	17	27	37	38	50	240
08-Apr-26 07:00	19	19	0	32	0	17	28	37	38	50	240
08-Apr-26 08:00	19	19	0	32	0	16	29	37	38	50	241
08-Apr-26 09:00	19	19	0	32	0	18	25	37	38	50	238
08-Apr-26 10:00	19	19	0	32	0	13	30	37	38	50	238
08-Apr-26 11:00	19	19	0	33	0	15	34	37	38	50	244
08-Apr-26 12:00	19	19	0	33	0	15	25	36	38	49	235
08-Apr-26 13:00	19	22	0	31	0	15	25	33	37	50	233
08-Apr-26 14:00	19	19	0	31	0	14	29	36	37	49	234
08-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	14	31	37	37	49	237
08-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	13	31	36	38	49	236
08-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	15	31	36	38	50	237
08-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	15	31	36	38	50	239
08-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	31	36	38	49	239
08-Apr-26 20:00	19	19	0	31	0	14	30	36	35	49	232
08-Apr-26 21:00	19	19	0	31	0	14	31	36	38	49	238
08-Apr-26 22:00	19	19	0	31	0	13	34	36	38	49	239
08-Apr-26 23:00	19	19	0	31	0	14	31	36	38	49	237

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
09-Apr-26 00:00	19	19	0	31	0	14	32	37	39	50	240
09-Apr-26 01:00	19	18	0	31	0	15	30	36	38	50	238
09-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	240
09-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	15	29	36	38	49	238
09-Apr-26 04:00	19	19	0	30	0	14	31	36	39	50	237
09-Apr-26 05:00	19	19	0	30	0	14	30	36	38	50	236
09-Apr-26 06:00	19	19	0	30	0	14	29	36	38	50	235
09-Apr-26 07:00	19	19	0	31	0	14	28	36	38	50	235
09-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	15	29	37	38	50	237
09-Apr-26 09:00	19	19	0	30	0	14	24	36	38	50	231
09-Apr-26 10:00	19	19	0	31	0	14	25	33	38	50	230
09-Apr-26 11:00	19	19	0	31	0	15	26	32	38	49	229
09-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	28	32	38	50	231
09-Apr-26 13:00	19	19	0	31	0	14	28	32	38	49	229
09-Apr-26 14:00	19	19	0	31	0	14	30	33	37	49	231
09-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	14	31	34	38	50	235
09-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	15	31	35	38	49	238
09-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	14	31	35	38	49	236
09-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	15	31	35	38	49	237
09-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	33	35	38	49	239
09-Apr-26 20:00	20	20	0	31	0	16	36	36	38	49	246
09-Apr-26 21:00	19	20	0	31	0	15	35	36	38	49	243
09-Apr-26 22:00	20	20	0	31	0	14	35	36	38	50	244
09-Apr-26 23:00	19	20	0	31	0	14	35	37	39	49	244
10-Apr-26 00:00	19	20	0	30	0	14	33	36	38	49	240
10-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	17	33	36	38	50	242
10-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	17	32	36	38	49	241
10-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	16	31	36	38	50	241
10-Apr-26 04:00	19	19	0	31	0	17	31	36	38	49	242
10-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	17	31	36	38	49	240
10-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	17	29	36	39	50	239
10-Apr-26 07:00	19	19	0	32	0	17	29	37	39	50	241
10-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	15	29	37	38	50	237
10-Apr-26 09:00	19	19	0	31	0	13	31	37	38	50	238
10-Apr-26 10:00	19	19	0	30	0	13	30	37	38	50	237
10-Apr-26 11:00	19	19	0	30	0	12	32	37	38	50	236
10-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	31	37	37	50	237
10-Apr-26 13:00	19	19	0	31	0	14	37	29	37	49	236
10-Apr-26 14:00	22	19	0	31	0	15	25	37	37	50	236
10-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	15	30	37	38	50	238
10-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	15	32	36	37	49	239
10-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	14	32	36	38	50	239
10-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	15	31	37	38	50	239
10-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	33	37	38	50	242
10-Apr-26 20:00	19	19	0	31	0	15	32	38	38	50	243
10-Apr-26 21:00	19	19	0	31	0	15	33	35	38	50	240
10-Apr-26 22:00	19	19	0	32	0	15	31	37	38	50	241
10-Apr-26 23:00	19	19	0	31	0	15	31	37	38	50	240

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
11-Apr-26 00:00	19	19	0	32	0	15	32	37	38	50	241
11-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	14	32	37	38	50	241
11-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	14	32	37	38	51	241
11-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	240
11-Apr-26 04:00	19	19	0	32	0	15	30	37	38	50	240
11-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	15	32	36	38	50	240
11-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	14	33	36	38	50	240
11-Apr-26 07:00	19	19	0	31	0	14	29	37	38	50	237
11-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	15	30	36	38	50	238
11-Apr-26 09:00	18	19	0	31	0	13	34	37	38	50	240
11-Apr-26 10:00	20	19	0	30	0	14	33	36	38	50	240
11-Apr-26 11:00	19	19	0	31	0	14	32	37	38	50	240
11-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	32	36	38	50	240
11-Apr-26 13:00	19	23	0	31	0	14	27	36	37	50	237
11-Apr-26 14:00	19	19	0	33	0	16	27	36	37	50	238
11-Apr-26 15:00	19	19	0	33	0	15	28	36	37	49	237
11-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	49	238
11-Apr-26 17:00	19	19	0	30	0	14	31	38	38	50	238
11-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	49	239
11-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	31	37	38	51	241
11-Apr-26 20:00	19	19	0	30	0	14	31	38	38	50	239
11-Apr-26 21:00	19	19	0	31	0	15	31	37	39	50	241
11-Apr-26 22:00	19	19	0	31	0	14	33	37	38	50	242
11-Apr-26 23:00	19	19	0	31	0	15	34	38	38	50	244
12-Apr-26 00:00	19	19	0	31	0	14	33	37	38	50	241
12-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	14	33	37	38	50	242
12-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	14	32	37	38	50	240
12-Apr-26 03:00	19	19	0	32	0	14	31	37	38	50	241
12-Apr-26 04:00	19	19	0	31	0	15	31	37	38	50	240
12-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	14	33	37	38	50	242
12-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	240
12-Apr-26 07:00	19	19	0	30	0	14	30	38	38	50	238
12-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	14	30	37	38	50	239
12-Apr-26 09:00	19	19	0	31	0	14	28	37	37	50	235
12-Apr-26 10:00	19	19	0	31	0	14	29	36	37	49	236
12-Apr-26 11:00	19	19	0	30	0	14	30	36	37	49	236
12-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	28	36	38	49	235
12-Apr-26 13:00	19	19	0	32	0	14	29	36	37	49	236
12-Apr-26 14:00	19	19	0	31	0	14	25	35	38	49	231
12-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	14	25	35	38	49	231
12-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	14	30	37	37	50	237
12-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	15	30	37	38	49	237
12-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	15	30	37	38	50	239
12-Apr-26 19:00	19	19	0	30	0	14	31	37	38	50	238
12-Apr-26 20:00	19	19	0	30	0	15	32	37	38	50	239
12-Apr-26 21:00	19	19	0	31	0	15	33	36	38	50	241
12-Apr-26 22:00	19	19	0	31	0	14	34	37	38	50	242
12-Apr-26 23:00	19	19	0	31	0	15	32	36	38	50	240

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
13-Apr-26 00:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	239
13-Apr-26 01:00	19	19	0	32	0	14	32	37	38	50	240
13-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	14	33	37	38	49	241
13-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	14	33	37	38	50	241
13-Apr-26 04:00	19	19	0	30	0	14	33	37	38	50	240
13-Apr-26 05:00	19	19	0	32	0	14	33	37	38	50	242
13-Apr-26 06:00	19	19	0	32	0	15	31	37	38	50	240
13-Apr-26 07:00	19	19	0	31	0	14	30	36	38	50	236
13-Apr-26 08:00	19	19	0	31	0	15	28	37	38	50	237
13-Apr-26 09:00	19	19	0	31	0	14	30	37	38	50	238
13-Apr-26 10:00	19	19	0	31	0	14	29	37	38	50	236
13-Apr-26 11:00	19	19	0	31	0	13	29	36	38	50	235
13-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	30	37	38	50	236
13-Apr-26 13:00	22	19	0	31	0	14	25	36	37	49	234
13-Apr-26 14:00	19	19	0	32	0	13	37	29	38	49	235
13-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	14	37	32	38	49	239
13-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	14	33	36	38	49	239
13-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	15	35	37	38	50	243
13-Apr-26 18:00	19	19	0	30	0	15	31	37	38	50	238
13-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	30	37	38	50	240
13-Apr-26 20:00	19	19	0	31	0	15	32	37	38	50	240
13-Apr-26 21:00	19	19	0	31	0	13	33	37	38	50	240
13-Apr-26 22:00	19	19	0	31	0	14	33	37	38	50	241
13-Apr-26 23:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	240
14-Apr-26 00:00	19	19	0	31	0	14	32	37	38	50	240
14-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	238
14-Apr-26 02:00	19	19	0	31	0	14	32	37	38	50	240
14-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	13	31	37	38	50	238
14-Apr-26 04:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	239
14-Apr-26 05:00	19	19	0	32	0	15	30	36	38	50	240
14-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	51	240
14-Apr-26 07:00	19	19	0	31	0	15	29	36	39	50	238
14-Apr-26 08:00	18	19	0	31	0	13	29	37	38	50	236
14-Apr-26 09:00	19	19	0	31	0	14	30	37	38	50	237
14-Apr-26 10:00	19	19	0	31	0	14	31	36	38	49	237
14-Apr-26 11:00	19	19	0	31	0	15	30	36	38	50	237
14-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	28	36	37	49	233
14-Apr-26 13:00	19	22	0	31	0	14	27	34	38	49	235
14-Apr-26 14:00	19	19	0	33	0	16	29	35	37	49	235
14-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	15	28	36	37	49	234
14-Apr-26 16:00	19	19	0	31	0	14	31	36	38	49	238
14-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	15	32	36	37	49	239
14-Apr-26 18:00	19	19	0	31	0	15	32	37	38	50	240
14-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	32	36	38	50	241
14-Apr-26 20:00	19	19	0	31	0	14	32	36	38	50	240
14-Apr-26 21:00	19	19	0	30	0	15	33	36	38	50	240
14-Apr-26 22:00	19	19	0	31	0	15	31	36	38	50	240
14-Apr-26 23:00	19	18	0	31	0	14	32	36	38	50	239

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
15-Apr-26 00:00	19	19	0	30	0	14	33	36	38	50	240
15-Apr-26 01:00	19	19	0	31	0	14	35	36	38	50	243
15-Apr-26 02:00	19	19	0	32	0	15	33	36	38	50	242
15-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	14	33	36	38	50	240
15-Apr-26 04:00	19	19	0	31	0	14	33	36	38	50	239
15-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	14	33	36	38	50	241
15-Apr-26 06:00	19	19	0	30	0	13	33	37	38	50	240
15-Apr-26 07:00	17	17	0	27	0	13	28	28	0	35	164
15-Apr-26 08:00	19	19	0	30	0	14	31	31	38	50	232
15-Apr-26 09:00	19	19	0	31	0	14	28	36	38	50	234
15-Apr-26 10:00	19	19	0	30	0	14	27	36	38	50	233
15-Apr-26 11:00	19	19	0	31	0	14	24	35	38	50	229
15-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	15	26	35	37	49	231
15-Apr-26 13:00	19	19	0	30	0	15	28	35	37	49	232
15-Apr-26 14:00	19	19	0	31	0	14	30	35	37	49	235
15-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	14	32	35	37	49	236
15-Apr-26 16:00	19	19	0	30	0	14	32	35	37	49	236
15-Apr-26 17:00	19	19	0	30	0	14	37	36	38	50	241
15-Apr-26 18:00	20	20	0	32	0	15	33	36	38	50	244
15-Apr-26 19:00	20	20	0	32	0	14	31	36	38	50	241
15-Apr-26 20:00	19	19	0	31	0	14	30	37	38	50	238
15-Apr-26 21:00	19	19	0	32	0	14	32	36	38	50	240
15-Apr-26 22:00	19	19	0	32	0	15	32	36	38	50	240
15-Apr-26 23:00	19	19	0	31	0	15	31	37	38	50	240
16-Apr-26 00:00	19	19	0	32	0	14	31	37	38	50	240
16-Apr-26 01:00	19	19	0	32	0	14	31	37	38	51	242
16-Apr-26 02:00	19	19	0	32	0	15	32	37	38	50	242
16-Apr-26 03:00	19	19	0	31	0	14	32	37	38	50	241
16-Apr-26 04:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	240
16-Apr-26 05:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	239
16-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	14	31	37	38	50	239
16-Apr-26 07:00	19	19	0	32	0	14	30	37	38	50	239
16-Apr-26 08:00	19	19	0	32	0	14	30	37	38	50	239
16-Apr-26 09:00	19	19	0	32	0	15	30	37	38	50	241
16-Apr-26 10:00	19	19	0	32	0	15	29	37	38	49	239
16-Apr-26 11:00	19	19	0	32	0	15	30	36	38	49	238
16-Apr-26 12:00	19	19	0	31	0	14	29	36	38	50	237
16-Apr-26 13:00	22	19	0	31	0	14	25	35	37	49	234
16-Apr-26 14:00	19	19	0	31	0	14	36	31	37	49	238
16-Apr-26 15:00	19	19	0	31	0	14	32	36	37	50	238
16-Apr-26 16:00	19	19	0	32	0	15	33	37	38	49	240
16-Apr-26 17:00	19	19	0	31	0	15	33	36	38	50	241
16-Apr-26 18:00	19	19	0	32	0	15	33	36	38	50	241
16-Apr-26 19:00	19	19	0	31	0	15	33	36	38	50	240
16-Apr-26 20:00	19	19	0	32	0	15	34	36	38	50	242
16-Apr-26 21:00	19	19	0	31	0	15	36	35	38	50	242
16-Apr-26 22:00	19	19	0	32	0	15	33	38	38	50	243
16-Apr-26 23:00	19	19	0	32	0	15	33	37	38	50	242

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
17-Apr-26 00:00	19	19	0	32	0	15	33	38	38	50	242
17-Apr-26 01:00	19	19	0	32	0	15	31	37	38	49	240
17-Apr-26 02:00	19	19	0	32	0	15	32	37	38	50	241
17-Apr-26 03:00	19	19	0	32	0	14	33	37	38	50	241
17-Apr-26 04:00	19	19	0	32	0	14	32	37	38	50	241
17-Apr-26 05:00	19	19	0	32	0	14	32	38	38	50	241
17-Apr-26 06:00	19	19	0	31	0	15	31	37	38	50	240
17-Apr-26 07:00	19	19	0	33	0	15	32	36	38	50	242
17-Apr-26 08:00	19	19	0	32	0	15	28	36	38	50	237
17-Apr-26 09:00	19	19	0	32	0	15	29	36	38	50	237
17-Apr-26 10:00	19	19	0	32	0	16	30	36	38	50	240
17-Apr-26 11:00	19	19	0	33	0	15	31	36	38	49	240
17-Apr-26 12:00	19	20	0	33	0	15	34	36	37	49	243
17-Apr-26 13:00	19	23	0	32	0	15	31	36	37	49	242
17-Apr-26 14:00	19	21	0	33	0	14	33	36	38	49	242
17-Apr-26 15:00	19	21	0	32	0	13	35	36	37	49	243
17-Apr-26 16:00	20	21	0	32	0	14	36	36	37	49	245
17-Apr-26 17:00	20	21	0	32	0	13	35	36	38	49	245
17-Apr-26 18:00	20	21	0	33	0	14	36	36	38	49	246
17-Apr-26 19:00	20	21	0	32	0	15	35	36	38	49	245
17-Apr-26 20:00	21	21	0	32	0	15	36	35	38	50	248
17-Apr-26 21:00	20	21	0	33	9	14	31	34	38	49	249
17-Apr-26 22:00	20	21	0	33	9	17	30	31	37	49	247
17-Apr-26 23:00	22	22	0	32	25	18	30	12	38	50	247
18-Apr-26 00:00	22	22	0	33	33	20	33	30	32	50	273
18-Apr-26 01:00	22	22	0	33	33	20	32	30	31	50	273
18-Apr-26 02:00	22	22	0	32	32	20	34	29	31	49	270
18-Apr-26 03:00	22	22	0	32	32	20	34	29	31	50	271
18-Apr-26 04:00	22	22	0	32	32	19	34	29	32	50	272
18-Apr-26 05:00	22	22	0	32	32	19	34	30	32	49	272
18-Apr-26 06:00	22	22	0	32	31	20	32	29	31	49	269
18-Apr-26 07:00	22	22	0	31	31	21	35	30	32	50	273
18-Apr-26 08:00	22	22	0	31	31	20	34	30	31	50	272
18-Apr-26 09:00	22	22	0	31	31	20	33	29	31	50	270
18-Apr-26 10:00	22	22	0	32	32	21	33	29	31	49	272
18-Apr-26 11:00	22	22	0	30	33	22	31	29	31	48	269
18-Apr-26 12:00	22	22	0	32	32	22	30	23	37	49	269
18-Apr-26 13:00	21	22	0	31	31	21	32	26	35	49	268
18-Apr-26 14:00	21	22	0	32	32	21	34	29	31	48	270
18-Apr-26 15:00	21	22	0	32	32	20	36	29	32	48	273
18-Apr-26 16:00	21	22	0	32	32	21	35	29	31	49	273
18-Apr-26 17:00	22	22	0	32	32	21	35	29	31	49	274
18-Apr-26 18:00	22	22	0	32	32	20	36	30	32	49	275
18-Apr-26 19:00	22	22	0	33	33	22	35	29	32	50	278
18-Apr-26 20:00	22	22	0	33	33	22	35	30	32	50	278
18-Apr-26 21:00	22	22	0	34	33	22	34	29	31	49	276
18-Apr-26 22:00	21	22	0	33	33	21	36	30	31	50	277
18-Apr-26 23:00	21	22	0	32	32	22	35	29	31	50	275

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
19-Apr-26 00:00	22	22	0	32	33	22	35	29	31	50	276
19-Apr-26 01:00	22	22	0	33	32	21	34	29	31	49	273
19-Apr-26 02:00	21	22	0	32	32	22	35	30	32	50	275
19-Apr-26 03:00	22	22	0	32	33	21	35	29	31	50	275
19-Apr-26 04:00	21	22	0	33	33	22	33	29	31	50	274
19-Apr-26 05:00	21	22	0	33	33	21	35	29	31	50	276
19-Apr-26 06:00	21	22	0	33	33	22	32	29	31	49	272
19-Apr-26 07:00	21	22	0	32	32	20	34	29	31	50	272
19-Apr-26 08:00	21	22	0	31	32	21	32	29	31	49	269
19-Apr-26 09:00	21	22	0	32	32	20	31	29	32	50	269
19-Apr-26 10:00	22	21	0	32	32	20	32	30	31	49	269
19-Apr-26 11:00	20	20	0	30	32	19	36	29	32	49	266
19-Apr-26 12:00	20	21	0	32	32	20	32	29	31	49	268
19-Apr-26 13:00	21	21	0	31	32	19	31	30	31	49	265
19-Apr-26 14:00	21	21	0	32	32	19	33	29	31	48	267
19-Apr-26 15:00	21	22	0	32	32	20	32	30	32	49	269
19-Apr-26 16:00	21	22	0	33	32	20	32	29	32	49	269
19-Apr-26 17:00	21	22	0	32	32	20	35	29	31	49	271
19-Apr-26 18:00	21	22	0	32	32	18	36	30	32	49	271
19-Apr-26 19:00	22	22	0	33	33	20	35	30	32	49	276
19-Apr-26 20:00	22	23	0	33	34	20	35	29	31	49	277
19-Apr-26 21:00	22	20	0	33	33	20	35	30	31	50	274
19-Apr-26 22:00	22	22	0	33	32	19	36	29	32	49	274
19-Apr-26 23:00	22	22	0	33	33	19	34	29	31	49	273
20-Apr-26 00:00	22	22	0	33	33	18	34	29	31	49	273
20-Apr-26 01:00	22	22	0	33	33	18	36	29	31	50	274
20-Apr-26 02:00	22	22	0	33	33	19	35	30	31	49	274
20-Apr-26 03:00	22	22	0	34	33	18	36	29	32	50	275
20-Apr-26 04:00	22	22	0	32	33	19	36	29	31	50	274
20-Apr-26 05:00	22	22	0	32	33	18	35	29	32	49	271
20-Apr-26 06:00	22	22	0	33	33	19	35	29	32	49	274
20-Apr-26 07:00	22	22	0	33	33	19	34	29	32	50	273
20-Apr-26 08:00	22	22	0	33	32	19	36	29	31	49	274
20-Apr-26 09:00	22	22	0	33	33	19	36	29	31	49	274
20-Apr-26 10:00	22	23	0	33	34	21	33	28	32	49	276
20-Apr-26 11:00	22	22	0	33	33	21	34	29	32	49	275
20-Apr-26 12:00	22	22	0	33	33	22	34	32	29	49	276
20-Apr-26 13:00	22	23	0	33	33	22	36	36	25	49	279
20-Apr-26 14:00	22	23	0	34	34	22	36	36	25	50	280
20-Apr-26 15:00	22	23	0	34	33	22	35	37	24	50	279
20-Apr-26 16:00	22	23	0	34	33	23	34	37	24	50	278
20-Apr-26 17:00	22	22	0	34	33	23	34	37	23	50	278
20-Apr-26 18:00	22	23	0	34	33	22	34	37	24	50	278
20-Apr-26 19:00	22	22	0	34	33	22	35	36	24	50	279
20-Apr-26 20:00	22	23	0	34	34	22	35	36	24	50	278
20-Apr-26 21:00	22	23	0	33	33	21	35	31	30	50	279
20-Apr-26 22:00	22	23	0	34	34	21	35	36	25	50	279
20-Apr-26 23:00	22	23	0	34	33	22	35	35	25	50	279

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
21-Apr-26 00:00	22	23	0	34	33	21	35	35	25	50	278
21-Apr-26 01:00	22	23	0	33	34	22	35	36	25	50	279
21-Apr-26 02:00	22	22	0	32	33	22	34	35	25	50	275
21-Apr-26 03:00	22	23	0	34	34	22	34	36	25	50	279
21-Apr-26 04:00	22	23	0	33	33	22	34	35	25	50	278
21-Apr-26 05:00	22	23	0	34	34	22	34	36	25	50	279
21-Apr-26 06:00	22	22	0	34	33	22	34	36	25	50	277
21-Apr-26 07:00	22	22	0	33	33	22	33	36	25	50	276
21-Apr-26 08:00	22	22	0	33	33	21	32	36	25	50	275
21-Apr-26 09:00	22	22	0	33	33	21	33	36	24	50	274
21-Apr-26 10:00	22	22	0	33	33	21	33	36	24	50	273
21-Apr-26 11:00	22	22	0	33	33	20	33	37	30	49	280
21-Apr-26 12:00	22	22	0	33	33	20	33	36	29	49	279
21-Apr-26 13:00	22	22	0	33	33	19	34	29	38	49	279
21-Apr-26 14:00	22	22	0	33	33	22	31	28	38	49	278
21-Apr-26 15:00	22	22	0	33	33	21	34	29	36	50	279
21-Apr-26 16:00	22	22	0	33	33	20	37	30	36	50	283
21-Apr-26 17:00	22	22	0	32	33	21	36	30	36	50	283
21-Apr-26 18:00	22	23	0	33	32	20	36	29	38	50	282
21-Apr-26 19:00	22	23	0	33	33	22	36	28	38	50	285
21-Apr-26 20:00	22	23	0	33	33	24	35	28	38	50	285
21-Apr-26 21:00	20	23	0	33	33	24	36	28	38	50	285
21-Apr-26 22:00	22	23	0	33	33	24	33	28	38	50	284
21-Apr-26 23:00	22	23	0	32	32	24	32	29	36	50	281
22-Apr-26 00:00	22	23	0	33	33	24	32	30	37	50	284
22-Apr-26 01:00	22	23	0	33	33	24	32	30	37	49	284
22-Apr-26 02:00	22	23	0	33	33	23	34	30	37	50	286
22-Apr-26 03:00	22	23	0	33	33	24	32	30	36	49	284
22-Apr-26 04:00	22	23	0	33	33	25	33	30	36	49	284
22-Apr-26 05:00	22	23	0	34	33	24	33	30	37	50	286
22-Apr-26 06:00	22	23	0	33	33	25	33	29	36	50	283
22-Apr-26 07:00	21	21	0	32	33	25	32	29	37	50	279
22-Apr-26 08:00	21	22	0	33	33	23	33	30	37	50	282
22-Apr-26 09:00	21	22	0	33	33	23	33	30	37	49	280
22-Apr-26 10:00	20	21	0	33	33	24	34	30	36	49	279
22-Apr-26 11:00	20	20	0	32	33	25	34	30	36	49	280
22-Apr-26 12:00	22	20	0	33	33	26	30	29	37	49	279
22-Apr-26 13:00	21	20	0	32	31	24	36	30	37	49	279
22-Apr-26 14:00	20	21	0	31	31	24	36	30	37	49	279
22-Apr-26 15:00	19	21	0	32	33	25	35	31	37	49	282
22-Apr-26 16:00	20	21	0	33	33	25	36	30	37	49	284
22-Apr-26 17:00	21	21	0	32	33	25	36	30	37	49	283
22-Apr-26 18:00	21	21	0	33	33	27	33	30	37	49	282
22-Apr-26 19:00	21	21	0	33	33	25	35	30	37	49	282
22-Apr-26 20:00	21	21	0	32	32	24	35	30	37	49	282
22-Apr-26 21:00	20	20	0	32	32	25	34	31	36	49	279
22-Apr-26 22:00	22	21	0	32	33	24	34	30	36	50	282
22-Apr-26 23:00	22	22	0	33	32	23	34	31	36	50	283

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
23-Apr-26 00:00	22	22	0	32	32	24	32	31	36	49	280
23-Apr-26 01:00	21	22	0	33	33	23	36	30	36	49	282
23-Apr-26 02:00	22	22	0	32	33	23	36	30	36	50	283
23-Apr-26 03:00	22	22	0	33	33	25	36	30	35	49	285
23-Apr-26 04:00	22	22	0	33	33	26	36	31	36	50	289
23-Apr-26 05:00	22	23	0	33	33	25	35	31	36	50	287
23-Apr-26 06:00	22	22	0	33	33	27	33	30	36	50	287
23-Apr-26 07:00	22	22	0	32	34	27	33	30	36	49	286
23-Apr-26 08:00	22	22	0	33	33	26	35	31	36	50	288
23-Apr-26 09:00	22	22	0	32	33	27	33	31	36	50	286
23-Apr-26 10:00	22	22	0	33	33	26	33	31	36	49	286
23-Apr-26 11:00	22	22	0	33	33	26	32	31	36	49	284
23-Apr-26 12:00	22	23	0	32	33	26	32	31	36	49	283
23-Apr-26 13:00	21	22	0	33	32	27	35	31	36	49	285
23-Apr-26 14:00	21	22	0	33	32	26	34	31	36	49	284
23-Apr-26 15:00	22	22	0	32	32	26	36	36	30	49	285
23-Apr-26 16:00	22	23	0	32	33	27	35	35	33	49	288
23-Apr-26 17:00	22	23	0	32	33	26	36	35	31	49	287
23-Apr-26 18:00	22	22	0	32	33	26	36	35	32	49	287
23-Apr-26 19:00	22	23	0	33	33	26	36	35	32	50	287
23-Apr-26 20:00	22	23	0	32	33	26	35	35	32	50	287
23-Apr-26 21:00	22	22	0	33	33	27	33	31	35	50	285
23-Apr-26 22:00	22	23	0	33	33	26	36	35	32	50	289
23-Apr-26 23:00	22	22	0	33	33	26	36	35	32	50	289
24-Apr-26 00:00	22	22	0	33	33	26	36	35	33	50	290
24-Apr-26 01:00	22	23	0	33	33	26	36	35	31	50	289
24-Apr-26 02:00	22	22	0	32	33	27	35	36	30	50	287
24-Apr-26 03:00	22	22	0	33	33	26	35	36	31	50	288
24-Apr-26 04:00	21	23	0	32	33	26	36	36	30	50	285
24-Apr-26 05:00	22	23	0	32	34	26	34	36	31	50	288
24-Apr-26 06:00	22	23	0	33	33	26	35	36	30	50	289
24-Apr-26 07:00	22	23	0	33	34	25	34	36	31	50	287
24-Apr-26 08:00	22	23	0	32	33	26	33	36	30	50	284
24-Apr-26 09:00	22	23	0	32	33	27	32	36	31	49	285
24-Apr-26 10:00	22	23	0	33	33	26	32	36	30	50	286
24-Apr-26 11:00	21	21	0	33	33	26	33	36	31	50	283
24-Apr-26 12:00	21	21	0	33	33	25	35	36	31	50	284
24-Apr-26 13:00	21	21	0	33	33	24	33	36	31	50	282
24-Apr-26 14:00	21	22	0	33	32	24	35	28	38	50	282
24-Apr-26 15:00	22	22	0	32	32	22	36	28	37	50	282
24-Apr-26 16:00	22	22	0	32	32	22	35	33	35	49	282
24-Apr-26 17:00	22	22	0	32	32	22	36	33	33	50	284
24-Apr-26 18:00	22	22	0	33	32	22	36	36	30	50	283
24-Apr-26 19:00	22	22	0	32	32	23	36	36	30	50	283
24-Apr-26 20:00	22	22	0	33	32	24	35	37	29	50	284
24-Apr-26 21:00	22	22	0	32	32	23	34	37	29	50	282
24-Apr-26 22:00	22	22	0	32	32	22	37	38	29	50	284
24-Apr-26 23:00	22	22	0	33	32	23	33	38	30	50	283

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
25-Apr-26 00:00	21	22	0	33	32	23	35	37	30	50	284
25-Apr-26 01:00	22	21	0	33	32	25	34	37	29	49	282
25-Apr-26 02:00	22	21	0	32	32	24	34	37	29	50	281
25-Apr-26 03:00	22	21	0	32	32	23	35	37	28	50	280
25-Apr-26 04:00	21	21	0	33	32	25	33	38	29	50	284
25-Apr-26 05:00	21	21	0	33	32	25	34	37	29	50	281
25-Apr-26 06:00	21	21	0	32	32	25	32	38	29	50	280
25-Apr-26 07:00	19	21	0	32	32	25	31	36	31	50	278
25-Apr-26 08:00	19	20	0	33	33	25	34	36	31	50	280
25-Apr-26 09:00	19	21	0	33	32	25	35	36	31	50	282
25-Apr-26 10:00	19	21	0	33	32	24	36	36	30	50	282
25-Apr-26 11:00	19	21	0	32	32	24	36	36	35	49	284
25-Apr-26 12:00	19	21	0	32	32	23	36	36	35	50	285
25-Apr-26 13:00	22	21	0	32	32	25	28	36	35	50	281
25-Apr-26 14:00	21	21	0	31	31	22	36	36	35	50	284
25-Apr-26 15:00	20	22	0	31	32	23	35	36	35	49	284
25-Apr-26 16:00	20	22	0	32	33	25	35	36	31	50	284
25-Apr-26 17:00	20	22	0	32	32	25	35	36	31	50	283
25-Apr-26 18:00	20	22	0	32	32	25	34	36	30	49	280
25-Apr-26 19:00	20	22	0	32	32	25	35	36	31	49	283
25-Apr-26 20:00	20	22	0	33	32	25	35	37	34	50	288
25-Apr-26 21:00	20	21	0	32	33	24	35	36	34	50	286
25-Apr-26 22:00	20	22	0	32	32	26	33	37	34	50	287
25-Apr-26 23:00	20	22	0	33	33	26	35	36	34	50	289
26-Apr-26 00:00	20	22	0	33	32	26	34	37	34	50	288
26-Apr-26 01:00	20	22	0	32	32	26	34	37	34	50	287
26-Apr-26 02:00	20	21	0	32	32	27	34	37	34	50	287
26-Apr-26 03:00	20	22	0	32	32	27	34	37	34	50	287
26-Apr-26 04:00	20	22	0	33	32	26	33	37	34	50	287
26-Apr-26 05:00	20	21	0	32	32	26	34	37	34	50	287
26-Apr-26 06:00	20	22	0	32	33	27	32	37	34	51	287
26-Apr-26 07:00	20	22	0	32	33	27	30	37	34	50	284
26-Apr-26 08:00	19	21	0	32	33	26	30	37	34	50	282
26-Apr-26 09:00	19	21	0	32	33	25	31	37	34	50	281
26-Apr-26 10:00	19	21	0	33	33	26	31	37	34	50	283
26-Apr-26 11:00	19	21	0	32	32	25	30	37	34	50	280
26-Apr-26 12:00	19	21	0	32	32	25	30	37	34	51	281
26-Apr-26 13:00	19	23	0	32	32	26	28	36	34	49	281
26-Apr-26 14:00	19	20	0	33	32	25	34	37	34	50	285
26-Apr-26 15:00	19	20	0	32	31	24	36	37	33	49	282
26-Apr-26 16:00	20	22	0	32	32	25	32	37	34	49	284
26-Apr-26 17:00	20	22	0	32	32	25	33	37	34	49	283
26-Apr-26 18:00	20	22	0	32	32	25	32	37	34	50	283
26-Apr-26 19:00	19	22	0	32	32	25	33	37	34	50	283
26-Apr-26 20:00	19	21	0	32	32	25	34	37	34	50	283
26-Apr-26 21:00	19	21	0	32	33	24	35	38	33	50	286
26-Apr-26 22:00	19	21	0	32	32	23	36	38	34	50	285
26-Apr-26 23:00	19	21	0	33	32	25	34	38	34	50	286

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
27-Apr-26 00:00	19	21	0	32	32	24	35	37	34	51	285
27-Apr-26 01:00	19	21	0	32	32	23	36	37	33	50	283
27-Apr-26 02:00	19	20	0	32	32	23	36	37	33	50	283
27-Apr-26 03:00	19	21	0	32	32	24	37	38	33	50	285
27-Apr-26 04:00	19	21	0	32	32	25	34	37	33	50	284
27-Apr-26 05:00	19	21	0	32	32	25	34	38	34	50	284
27-Apr-26 06:00	19	21	0	32	32	25	30	38	33	50	280
27-Apr-26 07:00	19	21	0	32	30	25	30	37	33	50	278
27-Apr-26 08:00	19	21	0	32	30	26	32	37	33	50	281
27-Apr-26 09:00	19	19	0	28	29	23	33	37	34	50	273
27-Apr-26 10:00	19	19	0	29	29	23	33	37	34	49	271
27-Apr-26 11:00	19	19	0	29	29	23	34	33	38	49	272
27-Apr-26 12:00	19	19	0	26	33	24	30	36	34	49	271
27-Apr-26 13:00	19	19	0	29	29	23	32	36	35	49	272
27-Apr-26 14:00	19	19	0	29	29	24	35	36	34	49	273
27-Apr-26 15:00	19	19	0	29	29	23	36	37	35	49	275
27-Apr-26 16:00	19	19	0	30	30	24	34	37	35	49	277
27-Apr-26 17:00	20	20	0	32	31	23	33	36	34	49	278
27-Apr-26 18:00	20	20	0	32	32	23	31	37	34	49	277
27-Apr-26 19:00	20	20	0	32	32	23	30	37	35	49	277
27-Apr-26 20:00	20	20	0	32	32	22	35	36	35	49	281
27-Apr-26 21:00	20	20	0	32	32	23	36	36	35	49	283
27-Apr-26 22:00	20	21	0	33	32	23	34	37	35	50	285
27-Apr-26 23:00	20	20	0	33	32	24	33	36	35	49	283
28-Apr-26 00:00	20	20	0	32	32	24	34	36	34	49	282
28-Apr-26 01:00	20	20	0	32	33	23	34	37	35	49	283
28-Apr-26 02:00	20	20	0	32	32	22	34	36	35	50	282
28-Apr-26 03:00	20	20	0	33	33	23	33	36	35	50	282
28-Apr-26 04:00	20	20	0	32	32	23	32	36	34	49	277
28-Apr-26 05:00	20	20	0	32	33	22	32	36	35	49	281
28-Apr-26 06:00	20	20	0	32	32	23	33	36	34	50	279
28-Apr-26 07:00	20	20	0	32	31	22	33	36	34	50	278
28-Apr-26 08:00	20	20	0	31	31	22	34	36	35	49	279
28-Apr-26 09:00	20	20	0	31	31	20	34	36	34	49	276
28-Apr-26 10:00	20	20	0	31	31	21	30	36	34	50	274
28-Apr-26 11:00	22	20	0	30	30	20	33	37	35	49	275
28-Apr-26 12:00	19	19	0	32	30	21	36	37	35	49	277
28-Apr-26 13:00	20	20	0	31	30	23	35	36	35	49	279
28-Apr-26 14:00	20	20	0	30	31	23	35	37	35	49	280
28-Apr-26 15:00	20	20	0	31	32	23	36	36	35	49	282
28-Apr-26 16:00	20	20	0	32	32	23	34	36	34	49	280
28-Apr-26 17:00	21	21	0	32	32	22	33	36	35	49	281
28-Apr-26 18:00	22	22	0	32	33	22	30	36	35	49	281
28-Apr-26 19:00	20	22	0	32	33	21	35	36	35	49	283
28-Apr-26 20:00	20	21	0	32	33	25	31	37	34	49	282
28-Apr-26 21:00	20	20	0	32	32	26	31	36	35	49	281
28-Apr-26 22:00	20	20	0	31	32	24	34	36	35	49	283
28-Apr-26 23:00	20	21	0	32	32	25	34	36	35	49	284

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
29-Apr-26 00:00	20	21	0	32	33	26	32	36	34	49	283
29-Apr-26 01:00	20	21	0	32	32	25	32	36	35	50	283
29-Apr-26 02:00	20	21	0	32	32	24	35	36	34	50	285
29-Apr-26 03:00	20	21	0	32	32	24	33	36	34	50	282
29-Apr-26 04:00	20	21	0	32	32	26	31	36	35	49	280
29-Apr-26 05:00	20	21	0	31	32	25	31	36	34	49	280
29-Apr-26 06:00	20	19	0	32	32	24	34	36	34	50	281
29-Apr-26 07:00	19	19	0	32	33	23	33	37	35	49	279
29-Apr-26 08:00	19	19	0	31	32	22	34	37	34	49	277
29-Apr-26 09:00	19	19	0	30	31	23	35	37	34	50	277
29-Apr-26 10:00	19	19	0	30	31	23	33	37	34	50	275
29-Apr-26 11:00	19	19	0	31	31	20	36	37	34	50	276
29-Apr-26 12:00	19	20	0	32	33	21	33	37	34	50	279
29-Apr-26 13:00	19	23	0	31	32	22	31	37	33	50	279
29-Apr-26 14:00	19	21	0	34	33	23	27	38	34	50	279
29-Apr-26 15:00	19	21	0	33	33	22	33	37	33	50	280
29-Apr-26 16:00	19	21	0	32	33	23	32	37	34	50	281
29-Apr-26 17:00	19	21	0	32	32	23	35	37	34	50	284
29-Apr-26 18:00	19	22	0	33	33	25	35	37	33	49	287
29-Apr-26 19:00	21	22	0	33	33	26	33	36	33	50	287
29-Apr-26 20:00	20	23	0	32	33	24	35	37	34	50	287
29-Apr-26 21:00	20	23	0	32	33	24	36	37	34	50	288
29-Apr-26 22:00	20	23	0	32	33	23	35	37	34	50	286
29-Apr-26 23:00	20	22	0	33	33	25	33	38	34	50	288
30-Apr-26 00:00	20	23	0	32	32	26	32	37	33	50	285
30-Apr-26 01:00	19	22	0	32	33	25	32	37	34	49	284
30-Apr-26 02:00	19	22	0	32	32	26	34	37	34	50	285
30-Apr-26 03:00	19	22	0	32	32	25	35	37	34	49	285
30-Apr-26 04:00	19	22	0	32	32	25	34	37	34	50	285
30-Apr-26 05:00	19	22	0	32	32	25	34	37	34	50	285
30-Apr-26 06:00	19	22	0	33	33	26	33	37	34	49	286
30-Apr-26 07:00	19	22	0	32	32	26	33	37	34	50	285
30-Apr-26 08:00	19	21	0	32	33	25	33	37	35	49	285
30-Apr-26 09:00	19	22	0	32	33	26	32	37	34	50	285
30-Apr-26 10:00	19	22	0	32	33	24	34	37	34	50	284
30-Apr-26 11:00	19	22	0	32	33	26	31	37	34	49	282
30-Apr-26 12:00	19	22	0	32	33	25	32	36	34	49	281
30-Apr-26 13:00	19	22	0	32	33	25	30	36	34	49	279
30-Apr-26 14:00	19	22	0	32	33	23	34	33	37	49	282
30-Apr-26 15:00	19	22	0	32	32	24	34	32	38	49	281
30-Apr-26 16:00	19	22	0	33	33	24	36	37	34	49	286
30-Apr-26 17:00	19	22	0	32	33	24	35	37	34	49	285
30-Apr-26 18:00	19	22	0	32	33	24	35	37	34	50	287
30-Apr-26 19:00	20	22	0	32	33	24	32	37	33	50	284
30-Apr-26 20:00	20	22	0	32	33	25	32	37	34	50	284
30-Apr-26 21:00	19	22	0	32	33	24	34	38	34	49	284
30-Apr-26 22:00	19	22	0	32	33	24	34	37	33	50	285
30-Apr-26 23:00	19	22	0	32	33	25	33	35	35	50	284

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
01-May-26 00:00	19	22	0	32	33	25	34	37	34	50	286
01-May-26 01:00	19	22	0	32	33	26	34	38	34	50	287
01-May-26 02:00	19	22	0	33	33	25	35	37	33	50	286
01-May-26 03:00	19	22	0	33	33	25	35	38	34	50	288
01-May-26 04:00	19	22	0	32	32	26	34	38	34	50	287
01-May-26 05:00	19	22	0	32	32	26	32	37	33	50	284
01-May-26 06:00	19	22	0	32	32	25	30	35	35	50	280
01-May-26 07:00	19	21	0	32	32	24	33	33	28	50	272
01-May-26 08:00	19	21	0	32	32	24	35	33	27	50	272
01-May-26 09:00	19	20	0	32	33	24	34	33	28	50	274
01-May-26 10:00	19	19	0	32	32	24	35	33	28	49	271
01-May-26 11:00	19	19	0	31	31	25	34	33	28	49	268
01-May-26 12:00	22	19	0	31	31	25	29	33	28	49	266
01-May-26 13:00	19	20	0	29	29	22	36	33	27	49	264
01-May-26 14:00	20	20	0	31	30	23	36	33	28	49	272
01-May-26 15:00	20	19	0	32	32	25	34	33	27	49	270
01-May-26 16:00	20	20	0	33	32	23	36	33	28	49	273
01-May-26 17:00	20	20	0	32	33	25	35	33	28	48	274
01-May-26 18:00	20	20	0	33	33	26	33	33	28	49	275
01-May-26 19:00	20	20	0	32	33	26	35	33	28	50	277
01-May-26 20:00	21	21	0	32	32	26	33	33	28	49	276
01-May-26 21:00	21	20	0	32	32	24	35	33	27	49	274
01-May-26 22:00	21	21	0	33	33	25	35	33	28	49	278
01-May-26 23:00	21	21	0	32	32	24	34	33	28	50	274
02-May-26 00:00	21	21	0	32	32	26	32	33	27	49	274
02-May-26 01:00	20	21	0	32	32	26	34	33	27	49	275
02-May-26 02:00	20	21	0	33	33	25	34	33	27	49	276
02-May-26 03:00	20	21	0	32	32	26	34	33	28	50	275
02-May-26 04:00	20	21	0	32	32	25	35	34	26	50	275
02-May-26 05:00	20	21	0	32	32	24	35	34	27	50	276
02-May-26 06:00	20	21	0	32	33	25	34	34	26	49	274
02-May-26 07:00	20	20	0	32	32	24	34	34	27	50	273
02-May-26 08:00	20	21	0	32	32	24	34	34	26	50	274
02-May-26 09:00	20	21	0	32	32	23	35	34	27	50	274
02-May-26 10:00	21	21	0	33	33	23	35	34	27	49	275
02-May-26 11:00	21	21	0	32	32	23	36	34	26	49	275
02-May-26 12:00	21	23	0	33	33	24	32	34	27	49	276
02-May-26 13:00	21	22	0	33	33	23	33	34	26	49	274
02-May-26 14:00	21	22	0	32	32	24	34	37	23	49	274
02-May-26 15:00	21	22	0	33	33	24	36	36	25	49	277
02-May-26 16:00	21	22	0	32	32	24	35	36	24	49	275
02-May-26 17:00	21	22	0	32	33	23	36	36	25	49	277
02-May-26 18:00	22	22	0	33	33	24	35	36	25	49	279
02-May-26 19:00	22	23	0	32	33	26	35	36	25	49	279
02-May-26 20:00	21	22	0	33	33	25	34	36	26	49	279
02-May-26 21:00	20	22	0	33	32	26	34	35	26	50	278
02-May-26 22:00	20	22	0	33	33	26	34	35	26	50	279
02-May-26 23:00	20	22	0	33	33	25	35	35	26	50	280

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
03-May-26 00:00	20	23	0	33	33	26	33	35	25	50	276
03-May-26 01:00	20	23	0	33	32	26	35	35	26	50	280
03-May-26 02:00	20	23	0	33	33	26	34	35	26	50	280
03-May-26 03:00	20	22	0	33	33	26	35	35	26	50	279
03-May-26 04:00	20	22	0	32	32	26	36	35	26	50	279
03-May-26 05:00	20	22	0	33	32	26	34	35	26	49	278
03-May-26 06:00	20	23	0	33	33	26	35	35	26	50	280
03-May-26 07:00	20	23	0	33	33	25	32	35	26	49	276
03-May-26 08:00	20	21	0	33	32	27	33	35	26	50	278
03-May-26 09:00	20	21	0	33	33	28	31	35	25	50	275
03-May-26 10:00	20	20	0	32	32	26	35	35	26	49	274
03-May-26 11:00	20	20	0	32	32	26	35	35	25	49	273
03-May-26 12:00	20	20	0	32	33	28	34	35	26	49	276
03-May-26 13:00	20	21	0	32	33	25	35	24	37	49	276
03-May-26 14:00	21	22	0	32	32	27	33	23	37	49	277
03-May-26 15:00	21	22	0	33	32	27	33	33	28	49	278
03-May-26 16:00	20	22	0	32	33	26	35	35	26	49	279
03-May-26 17:00	21	22	0	33	33	25	36	35	26	49	281
03-May-26 18:00	22	22	0	33	33	26	36	35	26	50	282
03-May-26 19:00	22	22	0	32	33	27	35	35	26	49	281
03-May-26 20:00	22	23	0	33	33	29	32	35	26	49	281
03-May-26 21:00	22	22	0	33	32	26	35	35	26	49	280
03-May-26 22:00	22	22	0	33	32	26	34	35	26	49	279
03-May-26 23:00	22	23	0	33	33	26	35	35	26	49	281
04-May-26 00:00	22	22	0	33	33	26	32	35	26	49	279
04-May-26 01:00	22	23	0	32	32	27	33	35	25	50	279
04-May-26 02:00	22	22	0	33	32	27	33	35	26	50	280
04-May-26 03:00	22	23	0	33	33	27	33	35	26	50	281
04-May-26 04:00	22	22	0	33	32	26	33	35	26	50	278
04-May-26 05:00	22	22	0	32	32	26	33	35	26	50	279
04-May-26 06:00	22	23	0	33	33	26	33	35	26	50	280
04-May-26 07:00	22	22	0	33	33	26	31	35	25	49	276
04-May-26 08:00	21	23	0	32	32	24	32	35	25	50	273
04-May-26 09:00	21	22	0	32	32	25	31	35	26	49	274
04-May-26 10:00	21	22	0	33	33	25	29	35	26	50	274
04-May-26 11:00	21	22	0	32	32	24	30	35	25	49	272
04-May-26 12:00	21	22	0	32	32	25	30	35	26	50	273
04-May-26 13:00	22	22	0	32	32	25	30	35	26	49	272
04-May-26 14:00	21	20	0	31	32	23	36	35	26	49	274
04-May-26 15:00	19	22	0	33	33	23	35	35	26	49	274
04-May-26 16:00	20	22	0	33	32	24	33	35	25	49	275
04-May-26 17:00	20	23	0	33	33	24	34	35	26	49	275
04-May-26 18:00	20	23	0	32	32	24	36	34	25	49	276
04-May-26 19:00	20	23	0	32	32	25	34	35	27	50	278
04-May-26 20:00	20	23	0	32	32	24	35	36	25	50	276
04-May-26 21:00	20	22	0	32	32	25	35	36	24	50	277
04-May-26 22:00	20	22	0	32	33	25	35	37	25	50	279
04-May-26 23:00	20	22	0	32	33	24	33	36	25	50	276

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
05-May-26 00:00	20	22	0	32	32	25	34	36	24	50	275
05-May-26 01:00	19	22	0	32	33	23	35	36	24	50	276
05-May-26 02:00	20	22	0	32	33	25	32	36	24	50	275
05-May-26 03:00	20	21	0	31	33	25	32	36	24	50	272
05-May-26 04:00	20	22	0	32	33	25	32	36	25	51	275
05-May-26 05:00	20	22	0	32	32	25	32	36	24	50	274
05-May-26 06:00	20	22	0	32	33	26	31	36	24	50	274
05-May-26 07:00	19	22	0	32	32	25	31	36	24	50	273
05-May-26 08:00	19	22	0	33	33	24	31	37	24	51	275
05-May-26 09:00	19	22	0	32	33	25	32	36	24	51	274
05-May-26 10:00	20	22	0	31	32	20	36	36	24	50	273
05-May-26 11:00	20	22	0	32	32	20	32	36	25	50	270
05-May-26 12:00	20	22	0	32	32	20	34	36	24	50	272
05-May-26 13:00	20	23	0	33	33	21	33	37	25	50	273
05-May-26 14:00	21	22	0	32	32	22	35	30	25	50	271
05-May-26 15:00	21	22	0	32	32	23	34	35	26	50	275
05-May-26 16:00	21	22	0	33	33	21	34	35	26	50	276
05-May-26 17:00	21	22	0	32	33	21	36	36	25	50	275
05-May-26 18:00	21	22	0	32	32	23	33	36	25	50	274
05-May-26 19:00	21	22	0	32	33	23	34	36	24	50	274
05-May-26 20:00	20	23	0	32	32	23	35	36	25	50	277
05-May-26 21:00	20	23	0	32	32	23	35	35	25	51	277
05-May-26 22:00	21	23	0	32	33	23	37	35	25	50	278
05-May-26 23:00	19	22	0	32	33	22	35	36	26	51	275
06-May-26 00:00	19	22	0	32	33	22	33	35	25	50	271
06-May-26 01:00	19	21	0	32	33	21	37	36	25	51	275
06-May-26 02:00	19	22	0	32	33	21	37	36	25	51	275
06-May-26 03:00	21	23	0	32	33	23	35	35	25	50	276
06-May-26 04:00	20	22	0	32	33	23	34	36	25	50	276
06-May-26 05:00	20	22	0	32	33	23	35	36	25	51	277
06-May-26 06:00	20	23	0	33	33	23	35	36	25	50	278
06-May-26 07:00	20	22	0	32	33	23	35	36	25	50	277
06-May-26 08:00	22	22	0	32	34	22	36	36	24	50	278
06-May-26 09:00	21	22	0	32	33	23	36	36	25	50	279
06-May-26 10:00	22	22	0	32	32	23	36	36	25	50	279
06-May-26 11:00	21	22	0	33	33	24	36	36	25	50	281
06-May-26 12:00	21	22	0	33	33	24	36	35	25	49	279
06-May-26 13:00	22	22	0	32	33	22	36	35	25	50	277
06-May-26 14:00	21	22	0	32	33	26	32	35	25	49	275
06-May-26 15:00	22	22	0	33	33	26	34	35	25	49	279
06-May-26 16:00	22	22	0	33	32	25	36	35	26	49	280
06-May-26 17:00	21	22	0	32	33	26	36	35	25	49	279
06-May-26 18:00	22	22	0	33	33	26	35	36	25	49	280
06-May-26 19:00	21	22	0	33	32	26	32	35	25	49	277
06-May-26 20:00	21	22	0	32	32	24	35	36	26	49	278
06-May-26 21:00	21	22	0	32	32	25	35	35	26	50	279
06-May-26 22:00	21	22	0	33	33	25	34	35	26	50	278
06-May-26 23:00	21	22	0	33	33	24	33	35	26	50	277

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
07-May-26 00:00	21	21	0	33	32	25	30	35	25	50	273
07-May-26 01:00	21	20	0	33	33	25	30	35	25	50	272
07-May-26 02:00	21	21	0	33	33	24	31	35	26	50	272
07-May-26 03:00	21	20	0	33	33	25	29	36	26	50	273
07-May-26 04:00	21	20	0	33	33	23	31	35	26	50	273
07-May-26 05:00	20	20	0	32	32	24	32	35	26	50	271
07-May-26 06:00	19	19	0	31	32	23	34	35	26	49	267
07-May-26 07:00	19	19	0	30	30	24	32	36	24	50	264
07-May-26 08:00	19	19	0	30	30	23	35	35	26	50	268
07-May-26 09:00	19	19	0	30	30	21	36	35	26	50	266
07-May-26 10:00	21	21	0	30	30	18	37	36	25	49	267
07-May-26 11:00	22	20	0	30	30	20	32	36	24	49	263
07-May-26 12:00	23	20	0	31	31	18	35	36	25	50	268
07-May-26 13:00	21	20	0	30	30	19	37	36	25	49	268
07-May-26 14:00	21	21	0	30	31	20	34	36	24	50	266
07-May-26 15:00	20	20	0	31	31	20	36	36	25	50	269
07-May-26 16:00	21	21	0	31	31	19	36	36	25	50	270
07-May-26 17:00	21	21	0	31	32	20	35	36	25	49	270
07-May-26 18:00	21	21	0	31	31	21	36	36	25	50	272
07-May-26 19:00	21	22	0	32	32	21	34	36	25	50	271
07-May-26 20:00	21	22	0	32	32	21	32	36	24	49	271
07-May-26 21:00	21	22	0	32	32	22	33	36	24	50	270
07-May-26 22:00	21	21	0	32	32	20	33	35	26	50	271
07-May-26 23:00	21	21	0	33	32	20	33	35	26	49	271
08-May-26 00:00	21	21	0	32	32	21	31	35	26	49	268
08-May-26 01:00	20	20	0	31	32	21	34	35	25	49	266
08-May-26 02:00	20	20	0	33	32	22	30	35	27	50	269
08-May-26 03:00	20	20	0	33	32	19	30	36	27	50	268
08-May-26 04:00	20	20	0	32	32	20	30	35	25	50	264
08-May-26 05:00	20	19	0	33	32	20	28	35	26	50	264
08-May-26 06:00	19	19	0	30	30	20	34	35	26	49	263
08-May-26 07:00	19	19	0	30	30	23	29	34	26	50	259
08-May-26 08:00	19	19	0	30	30	21	30	35	26	50	259
08-May-26 09:00	19	19	0	29	29	20	32	36	26	50	259
08-May-26 10:00	19	19	0	28	29	18	36	35	26	50	260
08-May-26 11:00	19	23	0	28	29	23	26	35	27	50	259
08-May-26 12:00	19	19	0	33	28	19	30	35	26	50	258
08-May-26 13:00	19	19	0	33	28	17	28	35	26	49	254
08-May-26 14:00	19	19	0	28	28	15	36	36	24	49	255
08-May-26 15:00	19	19	0	29	30	15	37	37	24	50	260
08-May-26 16:00	19	19	0	29	31	16	35	37	23	49	258
08-May-26 17:00	19	19	0	29	30	15	35	37	24	50	258
08-May-26 18:00	19	19	0	29	30	16	35	37	24	49	258
08-May-26 19:00	19	19	0	29	30	16	34	37	23	50	258
08-May-26 20:00	19	20	0	30	30	14	34	37	24	50	258
08-May-26 21:00	19	20	0	30	30	15	32	28	33	50	258
08-May-26 22:00	19	20	0	30	30	14	34	37	25	50	259
08-May-26 23:00	19	20	0	30	30	16	33	36	24	50	259

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
09-May-26 00:00	19	20	0	30	31	15	35	37	24	50	262
09-May-26 01:00	19	20	0	30	30	16	34	36	24	50	258
09-May-26 02:00	19	20	0	31	31	15	35	37	25	50	262
09-May-26 03:00	19	20	0	30	30	14	36	37	25	50	261
09-May-26 04:00	19	20	0	30	30	14	36	37	25	50	262
09-May-26 05:00	19	20	0	30	30	14	36	37	24	50	261
09-May-26 06:00	19	20	0	30	29	15	34	37	24	50	258
09-May-26 07:00	19	20	0	30	30	15	32	37	24	51	258
09-May-26 08:00	19	20	0	29	30	15	35	37	24	50	259
09-May-26 09:00	19	20	0	28	29	15	34	37	24	50	257
09-May-26 10:00	19	20	0	29	29	16	35	37	24	50	259
09-May-26 11:00	19	20	0	29	29	16	34	36	24	49	257
09-May-26 12:00	19	20	0	29	29	17	35	37	24	49	259
09-May-26 13:00	19	20	0	28	32	18	34	37	23	49	260
09-May-26 14:00	19	20	0	31	31	17	35	24	37	49	262
09-May-26 15:00	19	20	0	31	32	16	36	25	35	49	263
09-May-26 16:00	19	20	0	31	32	17	36	36	24	49	265
09-May-26 17:00	19	20	0	31	32	17	37	37	23	49	265
09-May-26 18:00	19	21	0	31	32	15	36	36	24	49	264
09-May-26 19:00	19	21	0	32	32	18	35	37	24	49	268
09-May-26 20:00	19	21	0	32	32	18	32	37	24	49	264
09-May-26 21:00	19	22	0	32	32	17	35	37	24	49	267
09-May-26 22:00	19	22	0	32	32	18	34	36	24	49	266
09-May-26 23:00	19	22	0	32	32	18	34	37	24	49	267
10-May-26 00:00	19	22	0	32	32	17	34	37	24	49	266
10-May-26 01:00	20	22	0	33	33	18	34	37	25	49	270
10-May-26 02:00	19	22	0	32	32	17	35	36	23	49	264
10-May-26 03:00	19	22	0	33	32	18	34	37	25	50	270
10-May-26 04:00	19	22	0	32	32	19	32	37	25	50	267
10-May-26 05:00	19	22	0	33	32	17	33	37	24	49	267
10-May-26 06:00	19	22	0	32	32	15	35	37	24	49	265
10-May-26 07:00	19	21	0	30	31	16	34	36	23	50	260
10-May-26 08:00	19	21	0	31	31	18	33	37	24	50	264
10-May-26 09:00	20	21	0	31	31	18	33	37	24	50	264
10-May-26 10:00	20	21	0	31	31	17	31	37	23	50	260
10-May-26 11:00	22	20	0	29	30	17	32	37	23	49	259
10-May-26 12:00	22	20	0	29	29	16	31	36	23	49	256
10-May-26 13:00	22	20	0	29	30	17	31	36	23	49	256
10-May-26 14:00	19	21	0	29	31	17	37	37	24	49	263
10-May-26 15:00	19	21	0	31	32	17	36	36	23	48	263
10-May-26 16:00	19	21	0	31	32	17	35	37	24	49	265
10-May-26 17:00	19	21	0	30	32	18	36	37	24	49	265
10-May-26 18:00	19	21	0	30	30	19	36	36	24	49	264
10-May-26 19:00	20	21	0	31	32	17	37	37	24	51	270
10-May-26 20:00	20	21	0	32	32	19	35	38	24	50	271
10-May-26 21:00	20	20	0	32	32	18	36	35	26	50	268
10-May-26 22:00	20	22	0	32	32	19	34	37	24	50	269
10-May-26 23:00	20	22	0	32	32	21	33	31	24	51	265

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
11-May-26 00:00	21	22	0	32	32	20	31	31	25	51	264
11-May-26 01:00	21	22	0	32	32	19	31	34	27	50	268
11-May-26 02:00	21	22	0	31	32	19	32	36	25	50	268
11-May-26 03:00	20	22	0	31	32	19	31	36	24	50	266
11-May-26 04:00	21	22	0	33	32	18	32	35	24	50	268
11-May-26 05:00	21	22	0	32	32	18	31	36	25	50	267
11-May-26 06:00	21	22	0	32	32	17	33	36	25	50	267
11-May-26 07:00	19	21	0	32	32	18	34	36	25	50	267
11-May-26 08:00	20	21	0	33	33	17	35	36	25	50	270
11-May-26 09:00	20	21	0	31	31	16	37	36	24	50	265
11-May-26 10:00	21	22	0	31	31	16	35	35	24	50	266
11-May-26 11:00	21	21	0	32	32	18	35	36	25	49	269
11-May-26 12:00	21	22	0	32	31	18	34	36	24	50	267
11-May-26 13:00	21	22	0	33	32	19	34	36	25	50	271
11-May-26 14:00	19	22	0	33	32	18	35	37	23	49	268
11-May-26 15:00	21	22	0	32	32	17	36	37	24	49	270
11-May-26 16:00	21	22	0	33	32	19	34	36	25	49	272
11-May-26 17:00	21	22	0	32	31	17	35	36	26	49	269
11-May-26 18:00	21	22	0	32	32	17	35	36	25	49	269
11-May-26 19:00	21	22	0	32	32	18	31	36	25	49	267
11-May-26 20:00	20	22	0	32	32	18	30	36	25	49	263
11-May-26 21:00	19	20	0	32	32	18	34	36	25	50	266
11-May-26 22:00	20	20	0	32	32	17	32	36	25	50	265
11-May-26 23:00	20	20	0	32	32	17	35	36	25	50	268
12-May-26 00:00	20	20	0	32	32	17	34	36	25	50	267
12-May-26 01:00	20	20	0	31	32	17	35	36	24	49	265
12-May-26 02:00	20	20	0	32	32	17	34	36	25	49	266
12-May-26 03:00	20	20	0	32	32	17	33	36	24	50	265
12-May-26 04:00	20	20	0	32	32	18	32	25	26	50	255
12-May-26 05:00	20	20	0	32	32	16	33	28	28	50	261
12-May-26 06:00	21	20	0	32	31	17	32	28	28	50	258
12-May-26 07:00	20	21	0	32	32	17	32	28	28	50	260
12-May-26 08:00	20	20	0	32	32	16	34	28	28	50	262
12-May-26 09:00	20	20	0	32	32	17	32	32	29	50	265
12-May-26 10:00	19	19	0	31	31	17	36	35	26	49	262
12-May-26 11:00	19	19	0	31	31	17	34	35	26	49	262
12-May-26 12:00	19	19	0	31	34	20	28	35	26	49	261
12-May-26 13:00	19	19	0	31	31	17	35	22	38	49	262
12-May-26 14:00	19	19	0	31	31	18	33	23	38	49	260
12-May-26 15:00	19	19	0	31	31	17	34	25	36	49	261
12-May-26 16:00	19	19	0	31	31	17	35	35	27	49	263
12-May-26 17:00	19	19	0	30	31	18	33	36	26	49	260
12-May-26 18:00	19	19	0	30	31	17	33	35	25	49	259
12-May-26 19:00	19	19	0	29	31	17	35	35	25	49	261
12-May-26 20:00	19	19	0	29	31	16	36	36	25	49	261
12-May-26 21:00	19	19	0	30	31	17	33	35	26	50	261
12-May-26 22:00	19	19	0	30	31	17	35	36	26	50	264
12-May-26 23:00	19	19	0	30	31	18	35	36	25	50	262

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
13-May-26 00:00	19	19	0	30	31	19	34	35	24	49	260
13-May-26 01:00	19	19	0	30	31	18	35	36	26	50	264
13-May-26 02:00	19	19	0	31	31	18	34	36	25	50	263
13-May-26 03:00	19	19	0	30	31	18	35	35	25	50	264
13-May-26 04:00	19	19	0	30	31	17	33	36	26	50	261
13-May-26 05:00	19	19	0	29	31	17	34	35	25	50	261
13-May-26 06:00	19	19	0	30	32	17	34	35	26	50	262
13-May-26 07:00	19	19	0	30	31	18	30	36	26	50	260
13-May-26 08:00	19	19	0	30	30	17	33	36	25	50	258
13-May-26 09:00	19	19	0	30	30	17	32	36	25	50	257
13-May-26 10:00	19	19	0	30	30	17	33	36	25	50	259
13-May-26 11:00	19	19	0	30	30	18	32	36	25	50	259
13-May-26 12:00	19	19	0	30	30	17	29	36	25	50	255
13-May-26 13:00	22	19	0	30	30	17	27	36	25	50	256
13-May-26 14:00	19	19	0	30	30	16	32	36	24	50	256
13-May-26 15:00	19	19	0	30	30	17	35	36	25	50	261
13-May-26 16:00	19	19	0	30	30	17	34	36	25	50	261
13-May-26 17:00	17	18	0	26	27	14	27	36	25	39	229
13-May-26 18:00	19	20	0	30	30	15	34	36	25	50	259
13-May-26 19:00	20	21	0	30	30	16	35	36	25	50	262
13-May-26 20:00	21	22	0	30	29	16	36	36	25	50	265
13-May-26 21:00	21	22	0	30	29	17	33	36	24	50	263
13-May-26 22:00	21	22	0	29	29	16	34	36	25	50	264
13-May-26 23:00	21	22	0	29	29	17	33	36	25	50	262
14-May-26 00:00	21	22	0	28	30	16	36	37	24	50	264
14-May-26 01:00	20	22	0	29	30	17	35	37	25	50	265
14-May-26 02:00	21	22	0	28	29	17	34	37	25	50	263
14-May-26 03:00	20	22	0	30	30	16	35	37	24	50	264
14-May-26 04:00	21	22	0	29	30	16	33	36	24	51	262
14-May-26 05:00	21	22	0	29	29	17	33	37	25	50	262
14-May-26 06:00	20	22	0	29	30	16	33	36	24	51	262
14-May-26 07:00	20	22	0	29	29	17	31	37	24	50	261
14-May-26 08:00	19	22	0	29	29	17	32	37	24	51	259
14-May-26 09:00	19	22	0	29	29	17	33	36	24	50	260
14-May-26 10:00	19	22	0	29	29	15	36	37	24	50	262
14-May-26 11:00	19	22	0	30	30	16	34	36	24	50	262
14-May-26 12:00	19	22	0	30	30	16	33	37	25	49	260
14-May-26 13:00	19	23	0	30	29	16	33	36	25	49	261
14-May-26 14:00	19	22	0	33	30	17	33	37	25	50	265
14-May-26 15:00	19	22	0	30	30	16	34	36	24	49	260
14-May-26 16:00	19	22	0	31	30	17	36	36	25	49	265
14-May-26 17:00	20	20	0	30	30	16	35	36	25	50	263
14-May-26 18:00	18	12	25	27	27	15	31	36	25	50	267
14-May-26 19:00	18	12	25	27	29	17	28	36	25	50	267
14-May-26 20:00	18	12	25	27	28	17	29	36	25	50	267
14-May-26 21:00	21	0	30	27	28	14	36	26	34	50	267
14-May-26 22:00	22	0	30	27	28	15	35	29	32	50	268
14-May-26 23:00	22	0	30	27	28	15	35	31	30	50	268

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
15-May-26 00:00	22	0	30	27	28	15	35	36	24	50	268
15-May-26 01:00	22	0	30	27	28	15	33	36	24	50	266
15-May-26 02:00	22	0	30	28	28	16	34	36	25	49	267
15-May-26 03:00	22	0	30	28	29	16	36	36	25	50	272
15-May-26 04:00	22	0	30	27	29	15	35	36	25	50	268
15-May-26 05:00	21	0	31	27	29	16	33	36	24	50	267
15-May-26 06:00	21	0	31	27	29	15	33	36	24	50	267
15-May-26 07:00	21	0	31	28	29	16	32	37	25	49	268
15-May-26 08:00	21	0	31	27	29	16	33	37	24	50	269
15-May-26 09:00	21	0	31	27	29	16	33	36	24	50	267
15-May-26 10:00	21	11	25	27	28	16	32	36	25	50	272
15-May-26 11:00	21	12	23	27	27	15	34	37	25	48	268
15-May-26 12:00	21	12	24	27	27	17	28	36	24	48	264
15-May-26 13:00	19	12	35	26	26	18	27	37	25	42	267
15-May-26 14:00	19	12	28	26	26	16	33	37	25	47	269
15-May-26 15:00	20	6	28	28	28	15	34	36	25	49	269
15-May-26 16:00	21	0	29	28	32	16	31	36	25	49	267
15-May-26 17:00	21	0	29	31	31	16	35	27	33	49	272
15-May-26 18:00	21	0	29	31	31	16	34	26	38	49	275
15-May-26 19:00	21	0	29	31	31	17	34	36	25	49	274
15-May-26 20:00	21	0	29	31	31	17	33	36	25	49	273
15-May-26 21:00	22	0	29	31	31	16	34	36	25	49	273
15-May-26 22:00	21	0	29	31	31	17	34	36	25	49	273
15-May-26 23:00	21	0	29	31	31	16	36	36	25	49	274
16-May-26 00:00	21	0	29	31	31	17	32	36	25	50	272
16-May-26 01:00	21	0	28	31	31	17	32	35	25	49	269
16-May-26 02:00	21	0	28	31	31	18	31	36	25	50	271
16-May-26 03:00	21	0	28	30	30	17	31	36	25	49	267
16-May-26 04:00	22	0	28	32	32	17	35	37	25	49	276
16-May-26 05:00	21	0	28	30	31	17	33	35	25	49	270
16-May-26 06:00	21	0	28	31	31	17	31	36	25	50	270
16-May-26 07:00	21	0	27	30	30	17	33	36	25	49	269
16-May-26 08:00	21	0	27	30	30	17	33	36	25	49	268
16-May-26 09:00	21	0	27	30	30	17	34	36	25	49	270
16-May-26 10:00	22	0	27	30	30	16	32	35	26	49	268
16-May-26 11:00	21	0	36	26	26	17	32	35	26	49	268
16-May-26 12:00	21	0	27	27	29	17	36	35	26	49	268
16-May-26 13:00	22	0	28	30	29	17	34	35	26	49	269
16-May-26 14:00	21	0	27	29	30	16	34	35	26	49	268
16-May-26 15:00	22	0	28	30	30	17	33	35	26	50	270
16-May-26 16:00	21	0	28	30	30	17	36	35	26	50	273
16-May-26 17:00	21	0	28	31	31	17	36	35	26	49	275
16-May-26 18:00	21	0	28	31	31	17	35	35	26	49	273
16-May-26 19:00	21	0	29	31	31	17	36	34	27	49	275
16-May-26 20:00	21	0	29	30	30	17	34	34	27	49	271
16-May-26 21:00	21	0	28	30	30	16	35	32	28	49	269
16-May-26 22:00	21	0	28	31	31	15	37	33	28	50	275
16-May-26 23:00	22	0	28	31	31	15	34	34	27	49	272

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
17-May-26 00:00	21	0	29	31	31	15	33	35	27	50	273
17-May-26 01:00	21	0	29	31	31	15	33	34	27	49	271
17-May-26 02:00	21	0	29	31	31	16	32	34	27	49	271
17-May-26 03:00	22	0	29	30	30	16	32	34	27	49	269
17-May-26 04:00	22	0	29	31	31	16	31	33	27	50	269
17-May-26 05:00	21	0	28	30	32	15	33	34	27	49	270
17-May-26 06:00	22	0	28	31	32	15	35	34	27	49	272
17-May-26 07:00	22	0	28	30	31	16	32	34	27	50	269
17-May-26 08:00	21	0	28	30	31	13	36	34	27	49	270
17-May-26 09:00	21	0	28	30	30	16	32	35	27	50	269
17-May-26 10:00	21	0	28	30	30	16	32	34	27	49	266
17-May-26 11:00	21	0	28	33	28	18	27	34	27	49	266
17-May-26 12:00	21	0	28	29	29	16	32	35	27	49	267
17-May-26 13:00	21	0	28	29	29	16	30	33	27	48	263
17-May-26 14:00	21	0	28	29	28	15	33	34	27	49	263
17-May-26 15:00	21	0	28	29	28	16	35	34	27	49	267
17-May-26 16:00	21	0	28	29	28	14	35	35	27	49	267
17-May-26 17:00	22	0	28	29	28	14	37	34	27	49	266
17-May-26 18:00	21	0	28	29	29	16	33	33	27	49	264
17-May-26 19:00	21	0	28	28	29	16	35	34	27	50	269
17-May-26 20:00	21	0	28	29	29	16	34	33	27	49	266
17-May-26 21:00	22	0	28	29	29	17	33	30	30	49	266
17-May-26 22:00	21	0	28	29	28	16	34	34	27	49	266
17-May-26 23:00	21	0	27	29	29	15	35	34	27	50	267
18-May-26 00:00	21	0	28	29	29	15	34	34	27	50	269
18-May-26 01:00	22	0	28	29	28	14	32	34	27	49	262
18-May-26 02:00	22	0	28	30	30	16	33	34	27	49	269
18-May-26 03:00	22	0	27	31	29	15	32	35	27	50	268
18-May-26 04:00	21	0	28	29	29	15	31	34	27	50	265
18-May-26 05:00	21	0	27	29	29	16	29	34	27	50	263
18-May-26 06:00	21	0	25	27	30	15	35	34	27	50	264
18-May-26 07:00	21	0	25	27	29	16	34	35	27	50	263
18-May-26 08:00	20	0	25	27	30	16	33	36	25	49	262
18-May-26 09:00	20	0	25	27	29	16	36	36	25	50	263
18-May-26 10:00	21	0	25	26	28	15	30	36	25	50	258
18-May-26 11:00	22	0	25	26	28	16	33	36	25	50	260
18-May-26 12:00	22	0	24	27	28	16	32	36	24	49	259
18-May-26 13:00	22	0	24	27	28	18	29	27	34	49	259
18-May-26 14:00	22	0	24	27	28	18	29	22	38	49	257
18-May-26 15:00	21	0	24	27	33	19	26	36	25	49	260
18-May-26 16:00	21	0	25	27	28	16	34	37	25	49	262
18-May-26 17:00	19	0	26	27	28	14	36	36	24	50	261
18-May-26 18:00	19	0	26	27	29	15	34	37	24	49	260
18-May-26 19:00	19	0	26	27	30	16	33	36	25	50	262
18-May-26 20:00	20	0	26	27	30	15	35	36	26	49	263
18-May-26 21:00	20	0	27	27	29	15	33	36	26	49	262
18-May-26 22:00	19	0	27	27	30	15	34	36	26	50	264
18-May-26 23:00	19	0	27	27	29	15	34	36	25	50	261

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
19-May-26 00:00	19	0	27	27	30	16	33	36	25	50	262
19-May-26 01:00	19	0	27	28	30	15	32	36	26	49	262
19-May-26 02:00	19	0	27	27	30	15	32	36	25	50	261
19-May-26 03:00	19	0	27	26	29	15	32	36	25	49	258
19-May-26 04:00	20	0	28	27	29	15	32	36	25	50	260
19-May-26 05:00	19	0	27	27	30	16	31	35	25	49	260
19-May-26 06:00	19	0	27	27	30	15	31	36	26	50	262
19-May-26 07:00	20	0	27	27	28	15	31	35	25	49	257
19-May-26 08:00	19	0	26	27	28	14	33	35	25	50	258
19-May-26 09:00	19	0	26	27	27	14	35	35	25	50	257
19-May-26 10:00	19	0	25	27	28	14	34	35	26	50	257
19-May-26 11:00	19	0	25	27	27	14	36	35	25	50	259
19-May-26 12:00	19	0	25	27	27	13	35	36	26	49	257
19-May-26 13:00	19	0	25	27	27	14	37	36	26	47	257
19-May-26 14:00	22	0	25	27	28	13	34	36	26	50	260
19-May-26 15:00	19	0	36	27	27	14	25	35	25	49	257
19-May-26 16:00	18	0	36	28	28	13	25	36	25	49	259
19-May-26 17:00	19	0	25	27	29	15	34	36	24	49	258
19-May-26 18:00	19	0	25	27	28	14	34	36	25	49	256
19-May-26 19:00	19	0	25	27	29	14	35	36	25	49	260
19-May-26 20:00	19	0	25	27	28	13	35	36	25	49	258
19-May-26 21:00	19	0	25	27	29	14	37	36	25	50	261
19-May-26 22:00	19	0	25	28	29	15	35	36	24	50	261
19-May-26 23:00	20	0	26	27	29	15	35	36	25	49	261
20-May-26 00:00	21	0	26	28	29	15	33	36	24	49	261
20-May-26 01:00	21	0	25	28	29	15	32	36	25	50	261
20-May-26 02:00	21	0	26	28	28	14	32	36	24	50	259
20-May-26 03:00	21	0	25	28	28	14	33	36	24	50	261
20-May-26 04:00	21	0	25	28	29	14	33	36	24	50	260
20-May-26 05:00	21	0	25	28	29	14	32	36	25	50	259
20-May-26 06:00	21	0	25	27	28	13	32	36	25	50	259
20-May-26 07:00	21	0	25	28	29	14	32	36	25	50	260
20-May-26 08:00	21	0	25	27	29	15	30	36	25	50	256
20-May-26 09:00	21	0	25	28	29	15	30	36	25	49	258
20-May-26 10:00	21	0	25	27	28	14	31	36	25	50	257
20-May-26 11:00	21	0	25	27	28	14	29	36	25	49	254
20-May-26 12:00	21	0	25	33	28	16	24	36	25	46	253
20-May-26 13:00	21	0	25	30	28	16	26	37	23	49	255
20-May-26 14:00	21	0	25	27	28	15	31	37	24	49	257
20-May-26 15:00	21	0	25	27	28	14	32	36	25	49	257
20-May-26 16:00	21	0	25	27	28	14	34	36	25	49	260
20-May-26 17:00	21	0	27	26	28	14	34	36	25	49	261
20-May-26 18:00	21	0	27	28	29	15	34	36	25	49	264
20-May-26 19:00	21	0	27	27	28	15	32	36	25	49	259
20-May-26 20:00	21	0	27	27	28	15	32	36	25	49	259
20-May-26 21:00	21	0	27	27	28	15	33	33	28	49	261
20-May-26 22:00	21	0	27	27	28	15	32	36	25	49	261
20-May-26 23:00	21	0	27	27	28	15	33	36	25	50	262

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
21-May-26 00:00	21	0	27	27	28	15	31	36	25	50	261
21-May-26 01:00	21	0	27	27	28	14	31	36	25	49	259
21-May-26 02:00	21	0	27	27	28	16	31	36	25	50	261
21-May-26 03:00	21	0	27	27	28	16	29	37	25	49	260
21-May-26 04:00	21	0	27	27	27	15	30	36	25	49	257
21-May-26 05:00	21	0	27	28	27	16	30	36	25	50	260
21-May-26 06:00	21	0	27	27	27	15	30	36	25	50	258
21-May-26 07:00	21	0	26	27	27	15	31	36	25	50	259
21-May-26 08:00	20	0	27	27	27	16	29	36	25	50	257
21-May-26 09:00	20	0	27	27	27	13	32	36	25	50	257
21-May-26 10:00	20	0	27	27	27	13	32	36	25	50	257
21-May-26 11:00	20	0	27	26	27	13	31	36	25	49	254
21-May-26 12:00	20	0	27	27	28	13	32	36	25	50	258
21-May-26 13:00	20	0	27	27	33	16	25	36	24	47	255
21-May-26 14:00	20	0	27	27	28	13	31	30	30	50	257
21-May-26 15:00	20	0	27	27	28	13	33	23	38	49	259
21-May-26 16:00	20	0	27	27	28	13	32	36	25	50	259
21-May-26 17:00	20	0	27	27	28	14	33	36	25	50	260
21-May-26 18:00	20	0	27	27	28	14	34	36	24	50	260
21-May-26 19:00	20	0	27	28	28	13	34	36	25	50	262
21-May-26 20:00	20	0	27	27	28	15	32	36	25	50	259
21-May-26 21:00	20	0	26	27	28	13	33	36	25	50	258
21-May-26 22:00	20	0	27	27	28	15	31	36	25	50	257
21-May-26 23:00	20	0	27	27	28	14	31	36	25	50	257
22-May-26 00:00	20	0	27	27	28	14	32	36	25	50	260
22-May-26 01:00	20	0	27	28	28	13	32	36	25	50	259
22-May-26 02:00	20	0	27	27	28	14	32	36	25	50	259
22-May-26 03:00	20	0	27	27	28	15	31	36	25	50	260
22-May-26 04:00	20	0	27	28	29	15	32	36	25	50	261
22-May-26 05:00	21	0	27	27	28	16	30	36	25	50	259
22-May-26 06:00	20	0	27	27	28	14	30	36	25	50	258
22-May-26 07:00	20	0	27	28	28	14	29	34	28	51	258
22-May-26 08:00	21	0	27	27	27	14	29	36	24	50	255
22-May-26 09:00	20	0	27	27	28	14	31	36	25	50	258
22-May-26 10:00	20	0	27	27	28	14	29	36	24	50	255
22-May-26 11:00	20	0	27	28	28	14	30	36	25	50	258
22-May-26 12:00	20	0	27	27	28	16	26	36	24	50	255
22-May-26 13:00	22	0	27	27	28	15	24	36	24	50	254
22-May-26 14:00	21	0	27	27	28	16	24	36	25	50	253
22-May-26 15:00	20	0	37	28	28	16	24	36	24	41	254
22-May-26 16:00	20	0	26	27	27	14	23	27	24	50	239
22-May-26 17:00	20	0	25	27	27	13	24	27	24	50	237
22-May-26 18:00	20	0	25	27	27	13	27	27	24	50	239
22-May-26 19:00	20	0	25	27	27	14	27	28	23	50	240
22-May-26 20:00	20	0	25	27	27	13	26	28	23	50	238
22-May-26 21:00	20	0	25	27	27	13	30	29	22	50	244
22-May-26 22:00	20	0	25	27	27	13	31	30	21	50	244
22-May-26 23:00	20	0	25	27	27	13	35	36	25	50	258

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
23-May-26 00:00	20	0	25	27	26	13	36	36	24	50	258
23-May-26 01:00	20	0	25	27	27	13	34	36	25	49	256
23-May-26 02:00	20	0	25	26	27	13	34	36	25	50	255
23-May-26 03:00	20	0	25	27	27	14	35	36	25	50	258
23-May-26 04:00	20	0	25	27	27	13	34	36	25	50	257
23-May-26 05:00	19	0	25	27	27	13	32	36	25	51	255
23-May-26 06:00	20	0	25	27	27	14	32	36	25	51	257
23-May-26 07:00	20	0	25	28	27	14	30	37	25	50	255
23-May-26 08:00	20	0	25	27	27	13	30	36	25	50	253
23-May-26 09:00	19	0	25	27	27	13	29	36	25	49	252
23-May-26 10:00	20	0	25	27	27	14	28	36	25	50	252
23-May-26 11:00	20	0	25	27	27	14	30	36	25	49	254
23-May-26 12:00	19	0	25	27	27	15	26	36	24	50	250
23-May-26 13:00	19	0	25	27	27	14	29	37	24	50	252
23-May-26 14:00	20	0	25	27	27	14	29	36	25	50	252
23-May-26 15:00	20	0	25	27	27	15	30	36	25	50	254
23-May-26 16:00	20	0	25	27	26	15	32	36	24	49	254
23-May-26 17:00	20	0	25	27	27	15	33	36	25	50	258
23-May-26 18:00	20	0	25	27	27	14	34	35	25	50	257
23-May-26 19:00	20	0	25	27	27	13	35	36	24	50	257
23-May-26 20:00	19	0	25	27	27	14	36	35	26	50	259
23-May-26 21:00	19	0	25	26	27	14	35	36	24	50	256
23-May-26 22:00	19	0	25	27	27	15	35	36	25	50	258
23-May-26 23:00	19	0	25	27	27	16	34	36	25	50	259
24-May-26 00:00	19	0	25	27	28	16	34	37	24	50	259
24-May-26 01:00	19	0	26	27	28	15	34	37	25	49	260
24-May-26 02:00	19	0	25	27	27	15	34	36	24	50	257
24-May-26 03:00	19	0	25	27	27	15	34	37	24	50	257
24-May-26 04:00	19	0	25	27	28	15	32	37	24	50	258
24-May-26 05:00	19	0	25	27	27	15	31	36	24	50	256
24-May-26 06:00	19	0	25	27	28	15	31	36	24	50	255
24-May-26 07:00	19	0	25	28	27	16	30	37	25	50	256
24-May-26 08:00	19	0	25	27	27	17	29	37	25	51	257
24-May-26 09:00	19	0	25	27	27	16	27	36	24	50	252
24-May-26 10:00	19	0	25	27	27	17	28	37	25	49	254
24-May-26 11:00	19	0	25	27	27	17	26	36	24	49	252
24-May-26 12:00	19	0	25	27	27	16	27	37	25	50	254
24-May-26 13:00	19	0	25	26	33	18	25	36	24	43	249
24-May-26 14:00	19	0	25	27	28	16	27	23	37	49	250
24-May-26 15:00	19	0	25	27	27	17	26	36	25	50	253
24-May-26 16:00	19	0	25	28	28	17	28	37	25	50	257
24-May-26 17:00	19	0	25	27	28	18	29	36	25	50	257
24-May-26 18:00	19	0	25	26	27	17	26	37	24	50	250
24-May-26 19:00	19	0	24	28	27	17	31	37	25	51	258
24-May-26 20:00	19	0	24	27	27	17	33	36	25	50	259
24-May-26 21:00	19	0	25	27	27	16	31	36	25	51	256
24-May-26 22:00	19	0	25	27	27	14	35	36	25	50	257
24-May-26 23:00	19	0	25	27	27	14	34	37	23	51	257

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
25-May-26 00:00	19	0	25	26	27	14	33	36	25	51	256
25-May-26 01:00	19	0	25	27	27	15	35	37	25	50	259
25-May-26 02:00	19	0	25	26	27	14	34	36	24	50	256
25-May-26 03:00	19	0	25	27	28	15	33	37	24	50	258
25-May-26 04:00	19	0	25	27	27	14	33	37	24	50	256
25-May-26 05:00	19	0	25	27	27	15	30	37	25	50	254
25-May-26 06:00	19	0	25	27	28	16	26	37	25	50	251
25-May-26 07:00	19	0	25	28	27	15	28	37	25	50	253
25-May-26 08:00	19	0	25	27	28	16	25	37	25	50	253
25-May-26 09:00	19	0	25	27	27	15	25	36	24	50	248
25-May-26 10:00	19	0	25	26	27	15	25	25	26	49	238
25-May-26 11:00	19	0	25	26	27	16	24	25	25	49	235
25-May-26 12:00	22	0	25	26	27	15	28	25	25	45	237
25-May-26 13:00	19	0	25	26	27	17	26	25	25	49	238
25-May-26 14:00	19	0	25	26	27	16	28	25	26	49	241
25-May-26 15:00	19	0	25	26	27	17	29	25	26	49	242
25-May-26 16:00	19	0	25	26	27	15	31	25	26	49	244
25-May-26 17:00	19	0	25	26	27	15	33	36	24	49	254
25-May-26 18:00	19	0	25	26	27	16	32	36	25	49	255
25-May-26 19:00	19	0	25	26	27	15	32	36	25	50	255
25-May-26 20:00	21	0	25	26	27	16	32	36	26	49	257
25-May-26 21:00	21	0	25	26	27	14	33	33	27	49	254
25-May-26 22:00	21	0	24	26	27	15	32	35	26	49	256
25-May-26 23:00	20	0	25	26	27	14	33	35	26	49	257
26-May-26 00:00	20	0	25	26	27	15	30	36	26	49	255
26-May-26 01:00	21	0	25	26	27	16	29	35	26	49	255
26-May-26 02:00	20	0	25	26	27	16	30	35	26	49	254
26-May-26 03:00	21	0	25	26	27	16	29	35	26	49	254
26-May-26 04:00	21	0	25	26	27	16	30	36	26	49	256
26-May-26 05:00	21	0	25	27	27	15	31	35	27	49	259
26-May-26 06:00	21	0	25	27	28	16	29	35	27	49	256
26-May-26 07:00	21	0	25	26	28	17	26	35	26	50	253
26-May-26 08:00	21	0	25	26	27	15	28	35	25	50	251
26-May-26 09:00	21	0	25	26	27	16	28	35	26	50	253
26-May-26 10:00	21	0	25	27	27	15	26	36	26	50	253
26-May-26 11:00	20	0	25	32	25	16	27	25	25	45	239
26-May-26 12:00	20	0	25	33	25	16	29	25	25	44	242
26-May-26 13:00	20	0	25	27	26	16	32	25	25	49	244
26-May-26 14:00	20	0	25	27	26	16	30	25	26	49	244
26-May-26 15:00	20	0	25	27	26	16	30	25	25	49	243
26-May-26 16:00	20	0	25	27	26	15	32	25	25	49	243
26-May-26 17:00	20	0	25	28	27	16	33	26	27	49	249
26-May-26 18:00	20	0	25	27	27	17	31	37	24	49	258
26-May-26 19:00	20	0	25	27	27	17	29	36	24	49	254
26-May-26 20:00	20	0	25	27	27	17	31	36	25	49	256
26-May-26 21:00	20	0	25	27	27	17	31	36	26	49	258
26-May-26 22:00	20	0	25	27	27	17	33	35	25	49	259
26-May-26 23:00	20	0	25	27	28	17	32	35	25	49	259

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
27-May-26 00:00	20	0	25	28	29	17	33	36	25	49	261
27-May-26 01:00	20	0	25	27	28	15	33	36	25	50	260
27-May-26 02:00	20	0	25	27	28	16	32	35	25	50	259
27-May-26 03:00	20	0	25	27	28	16	32	36	25	50	258
27-May-26 04:00	20	0	25	27	28	16	30	35	26	50	257
27-May-26 05:00	20	0	25	27	28	15	31	36	25	50	257
27-May-26 06:00	20	0	25	27	28	16	32	35	26	50	258
27-May-26 07:00	20	0	25	28	28	16	30	35	25	49	255
27-May-26 08:00	20	0	25	27	28	15	30	35	26	50	256
27-May-26 09:00	19	0	25	27	28	16	30	36	25	50	255
27-May-26 10:00	19	0	25	27	28	14	31	35	26	49	255
27-May-26 11:00	19	0	25	27	28	15	32	36	25	49	257
27-May-26 12:00	19	0	25	27	28	13	28	35	25	49	250
27-May-26 13:00	19	0	25	27	32	16	23	36	25	46	249
27-May-26 14:00	19	0	25	27	27	14	28	23	37	49	248
27-May-26 15:00	19	0	25	26	27	15	28	22	38	49	250
27-May-26 16:00	19	0	25	28	27	15	32	36	25	49	257
27-May-26 17:00	19	0	25	27	27	15	32	36	24	49	254
27-May-26 18:00	19	0	25	27	27	15	33	32	30	49	257
27-May-26 19:00	19	0	25	27	27	14	35	31	29	50	258
27-May-26 20:00	19	0	25	27	27	15	34	31	29	50	257
27-May-26 21:00	19	0	27	27	27	14	35	31	30	49	259
27-May-26 22:00	19	0	30	27	27	15	30	31	30	50	260
27-May-26 23:00	19	0	26	27	27	15	34	31	29	50	260
28-May-26 00:00	19	0	26	27	27	14	37	31	29	50	261
28-May-26 01:00	19	0	26	28	28	15	36	31	30	50	261
28-May-26 02:00	19	0	26	29	28	14	36	31	30	50	264
28-May-26 03:00	20	0	26	28	28	15	34	31	30	50	262
28-May-26 04:00	19	0	27	29	28	15	35	32	30	49	264
28-May-26 05:00	19	0	26	29	28	15	34	31	30	50	263
28-May-26 06:00	19	0	26	28	28	14	30	31	30	50	256
28-May-26 07:00	19	0	26	27	27	14	31	31	30	50	255
28-May-26 08:00	19	0	26	27	27	14	31	31	30	50	254
28-May-26 09:00	19	0	26	27	27	15	32	31	30	50	258
28-May-26 10:00	19	0	26	27	26	14	34	31	30	49	257
28-May-26 11:00	19	0	26	27	27	14	29	31	30	49	252
28-May-26 12:00	19	0	26	27	27	14	28	31	30	49	251
28-May-26 13:00	19	8	25	27	27	13	34	31	30	40	255
28-May-26 14:00	22	20	0	28	28	14	32	31	30	49	253
28-May-26 15:00	19	20	0	27	28	13	36	31	30	49	254
28-May-26 16:00	19	20	0	29	29	14	36	31	30	48	255
28-May-26 17:00	19	20	0	29	29	14	35	31	30	49	256
28-May-26 18:00	19	20	0	27	28	13	35	31	30	50	254
28-May-26 19:00	19	20	0	28	28	14	36	31	30	50	255
28-May-26 20:00	19	20	0	29	29	15	35	31	30	50	257
28-May-26 21:00	19	19	0	29	29	14	37	31	30	50	258
28-May-26 22:00	19	20	0	29	29	15	36	31	30	50	260
28-May-26 23:00	19	20	0	30	31	16	37	31	30	50	264

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
29-May-26 00:00	19	20	0	30	30	16	35	30	30	49	259
29-May-26 01:00	19	20	0	30	30	15	32	31	30	50	257
29-May-26 02:00	19	20	0	30	30	16	33	31	30	50	259
29-May-26 03:00	20	20	0	30	29	16	32	31	30	50	257
29-May-26 04:00	19	20	0	30	30	16	32	31	30	50	259
29-May-26 05:00	19	20	0	30	30	16	32	31	30	50	258
29-May-26 06:00	19	20	0	30	30	17	29	31	30	50	256
29-May-26 07:00	19	20	0	29	29	16	31	31	30	50	256
29-May-26 08:00	19	20	0	29	29	17	26	31	30	50	251
29-May-26 09:00	19	20	0	29	29	16	29	30	30	50	252
29-May-26 10:00	19	20	0	29	29	17	28	30	30	49	251
29-May-26 11:00	19	20	0	29	29	16	29	30	30	49	252
29-May-26 12:00	19	23	0	28	27	16	29	28	25	49	244
29-May-26 13:00	19	21	0	27	27	15	28	27	23	49	237
29-May-26 14:00	19	20	0	28	27	13	31	27	23	49	238
29-May-26 15:00	19	20	0	28	27	14	31	28	24	49	240
29-May-26 16:00	19	20	0	29	27	14	31	28	23	49	238
29-May-26 17:00	19	20	0	28	27	15	31	28	24	49	239
29-May-26 18:00	19	20	0	28	27	14	33	28	24	49	241
29-May-26 19:00	20	20	0	28	27	14	36	30	31	49	254
29-May-26 20:00	20	20	0	28	28	15	34	30	30	49	255
29-May-26 21:00	20	20	0	27	28	14	35	30	30	49	254
29-May-26 22:00	20	20	0	28	28	15	33	30	31	50	255
29-May-26 23:00	20	20	0	28	28	16	33	30	30	50	254
30-May-26 00:00	20	20	0	28	28	17	31	30	30	50	253
30-May-26 01:00	19	20	0	28	27	15	35	30	30	51	254
30-May-26 02:00	19	20	0	28	27	16	36	30	30	50	257
30-May-26 03:00	19	20	0	28	27	16	37	30	31	50	257
30-May-26 04:00	19	20	0	28	27	15	36	30	31	50	256
30-May-26 05:00	19	20	0	28	27	17	35	30	31	50	256
30-May-26 06:00	19	20	0	29	27	17	34	30	31	50	256
30-May-26 07:00	19	20	0	28	28	17	33	30	31	50	257
30-May-26 08:00	19	20	0	28	27	17	33	30	31	50	254
30-May-26 09:00	19	20	0	28	27	18	33	30	31	50	256
30-May-26 10:00	19	20	0	28	27	18	32	26	24	50	244
30-May-26 11:00	19	20	0	28	27	16	35	30	31	50	255
30-May-26 12:00	19	20	0	28	33	19	25	30	31	47	251
30-May-26 13:00	19	20	0	29	33	17	30	30	31	49	258
30-May-26 14:00	20	20	0	27	29	16	35	30	30	50	259
30-May-26 15:00	20	20	0	28	29	15	34	30	30	50	256
30-May-26 16:00	20	20	0	28	28	16	35	30	30	49	256
30-May-26 17:00	20	20	0	28	28	16	36	30	31	49	258
30-May-26 18:00	20	20	0	27	28	15	37	30	30	49	257
30-May-26 19:00	20	20	0	28	29	16	37	30	30	49	260
30-May-26 20:00	20	21	0	28	29	16	34	30	30	50	259
30-May-26 21:00	20	21	0	28	29	13	36	30	31	50	257
30-May-26 22:00	20	21	0	28	29	16	33	30	30	50	258
30-May-26 23:00	20	20	0	27	29	16	33	30	30	50	256

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
31-May-26 00:00	20	20	0	28	29	17	32	30	30	50	258
31-May-26 01:00	20	20	0	28	29	17	32	30	31	50	258
31-May-26 02:00	20	20	0	28	29	16	34	30	30	50	257
31-May-26 03:00	20	20	0	28	29	17	33	30	30	50	256
31-May-26 04:00	20	20	0	27	29	17	34	30	31	50	258
31-May-26 05:00	20	20	0	28	29	17	34	30	30	50	258
31-May-26 06:00	20	20	0	28	29	16	34	30	31	50	259
31-May-26 07:00	20	20	0	28	29	17	31	30	30	49	254
31-May-26 08:00	20	20	0	28	29	17	32	30	31	50	258
31-May-26 09:00	20	20	0	28	29	17	32	30	31	50	257
31-May-26 10:00	20	20	0	28	30	16	29	30	31	50	254
31-May-26 11:00	20	20	0	28	29	16	31	29	31	49	253
31-May-26 12:00	22	20	0	27	29	15	24	30	30	49	247
31-May-26 13:00	21	20	0	28	29	15	29	30	30	49	249
31-May-26 14:00	18	18	0	28	28	14	37	30	31	48	252
31-May-26 15:00	20	19	0	28	29	15	33	30	30	49	254
31-May-26 16:00	20	19	0	28	28	14	32	30	30	49	250
31-May-26 17:00	20	20	0	28	28	15	31	30	30	50	252
31-May-26 18:00	20	20	0	29	29	15	33	30	31	49	256
31-May-26 19:00	20	20	0	28	27	15	33	30	30	49	251
31-May-26 20:00	20	20	0	28	28	14	35	30	31	49	255
31-May-26 21:00	20	20	0	28	28	14	34	31	31	49	254
31-May-26 22:00	20	20	0	28	28	16	31	30	30	50	252
31-May-26 23:00	20	20	0	27	28	18	30	30	31	49	253
01-Jun-26 00:00	20	20	0	27	28	17	29	29	31	49	251
01-Jun-26 01:00	20	20	0	28	28	14	34	30	30	50	255
01-Jun-26 02:00	20	20	0	27	28	14	33	31	30	50	253
01-Jun-26 03:00	20	20	0	28	29	15	31	31	31	50	254
01-Jun-26 04:00	20	20	0	28	28	16	31	30	30	50	252
01-Jun-26 05:00	20	20	0	28	28	15	32	31	30	50	255
01-Jun-26 06:00	20	20	0	28	28	16	30	31	30	50	252
01-Jun-26 07:00	20	20	0	28	28	14	31	30	30	50	252
01-Jun-26 08:00	20	20	0	28	28	15	31	31	30	50	252
01-Jun-26 09:00	19	20	0	28	28	14	32	30	31	50	252
01-Jun-26 10:00	19	20	0	28	28	14	33	31	30	50	253
01-Jun-26 11:00	19	20	0	28	28	15	32	31	30	49	252
01-Jun-26 12:00	19	20	0	28	28	15	32	31	31	50	254
01-Jun-26 13:00	19	24	0	28	27	15	27	31	30	50	249
01-Jun-26 14:00	19	20	0	33	27	15	31	31	31	46	252
01-Jun-26 15:00	19	20	0	30	27	15	32	31	30	49	253
01-Jun-26 16:00	19	19	0	28	27	15	35	31	30	49	254
01-Jun-26 17:00	19	20	0	28	27	14	34	31	30	50	253
01-Jun-26 18:00	19	20	0	28	27	15	34	30	30	50	253
01-Jun-26 19:00	19	20	0	28	27	16	36	31	30	50	256
01-Jun-26 20:00	19	20	0	27	27	17	36	31	30	50	257
01-Jun-26 21:00	19	20	0	28	27	17	34	30	30	50	254
01-Jun-26 22:00	20	20	0	27	27	18	32	29	23	50	246
01-Jun-26 23:00	20	19	0	27	26	18	31	30	30	50	252

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
02-Jun-26 00:00	20	19	0	27	27	18	32	30	30	50	253
02-Jun-26 01:00	20	19	0	27	27	18	32	30	31	50	255
02-Jun-26 02:00	20	19	0	28	28	16	33	30	31	50	254
02-Jun-26 03:00	20	19	0	27	27	17	32	30	30	50	252
02-Jun-26 04:00	20	19	0	27	27	17	31	30	30	50	252
02-Jun-26 05:00	20	19	0	28	28	17	32	31	32	50	256
02-Jun-26 06:00	20	19	0	27	27	17	32	30	31	50	253
02-Jun-26 07:00	20	19	0	27	27	17	30	30	30	49	251
02-Jun-26 08:00	20	19	0	27	27	18	30	30	31	50	252
02-Jun-26 09:00	19	19	0	27	26	17	31	30	30	50	250
02-Jun-26 10:00	20	19	0	27	27	17	30	30	31	50	251
02-Jun-26 11:00	19	19	0	28	27	16	30	30	30	49	250
02-Jun-26 12:00	20	19	0	27	27	18	32	30	31	49	253
02-Jun-26 13:00	20	19	0	27	32	19	27	30	30	45	250
02-Jun-26 14:00	19	19	0	28	27	18	29	30	31	48	249
02-Jun-26 15:00	19	19	0	27	27	17	33	30	31	49	253
02-Jun-26 16:00	19	19	0	27	27	18	32	31	31	50	253
02-Jun-26 17:00	19	19	0	28	28	16	33	30	31	50	255
02-Jun-26 18:00	19	19	0	28	28	17	34	31	31	50	257
02-Jun-26 19:00	20	20	0	29	28	17	37	30	31	50	261
02-Jun-26 20:00	20	20	0	28	28	16	36	30	31	50	260
02-Jun-26 21:00	21	20	0	28	29	17	33	30	30	50	257
02-Jun-26 22:00	20	21	0	28	29	16	37	30	31	50	261
02-Jun-26 23:00	20	22	0	28	29	15	37	31	31	50	263
03-Jun-26 00:00	20	22	0	28	29	16	35	31	30	49	260
03-Jun-26 01:00	20	21	0	29	29	16	35	31	31	50	261
03-Jun-26 02:00	20	21	0	29	28	16	34	30	30	50	260
03-Jun-26 03:00	20	21	0	28	28	17	35	30	30	50	258
03-Jun-26 04:00	20	21	0	29	30	15	35	31	31	50	261
03-Jun-26 05:00	20	21	0	29	29	16	33	30	31	50	260
03-Jun-26 06:00	20	22	0	29	29	17	34	30	31	50	261
03-Jun-26 07:00	20	21	0	28	29	16	34	30	31	50	260
03-Jun-26 08:00	20	22	0	29	29	15	34	30	31	49	260
03-Jun-26 09:00	20	22	0	28	29	15	32	30	30	50	255
03-Jun-26 10:00	20	21	0	29	29	14	34	33	28	49	258
03-Jun-26 11:00	20	21	0	29	29	16	33	35	25	49	258
03-Jun-26 12:00	22	20	0	29	29	15	33	35	25	49	257
03-Jun-26 13:00	20	19	0	29	28	15	36	35	26	49	258
03-Jun-26 14:00	20	21	0	29	30	15	33	35	26	49	258
03-Jun-26 15:00	20	21	0	29	29	16	35	35	26	49	260
03-Jun-26 16:00	20	22	0	29	30	17	33	35	25	49	260
03-Jun-26 17:00	20	22	0	29	31	16	36	35	26	49	263
03-Jun-26 18:00	20	22	0	29	30	15	36	35	25	49	262
03-Jun-26 19:00	20	22	0	31	31	16	35	35	26	49	265
03-Jun-26 20:00	20	23	0	31	31	16	35	35	25	49	265
03-Jun-26 21:00	21	21	0	31	31	17	33	35	25	50	264

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
03-Jun-26 22:00	20	22	0	31	31	17	34	35	26	50	265
03-Jun-26 23:00	20	22	0	32	31	15	34	35	27	50	266
04-Jun-26 00:00	20	22	0	31	31	17	32	35	26	50	264
04-Jun-26 01:00	20	22	0	31	31	17	33	35	26	50	266
04-Jun-26 02:00	20	22	0	31	31	17	33	35	26	50	264
04-Jun-26 03:00	20	22	0	31	31	17	33	35	26	49	264
04-Jun-26 04:00	20	22	0	31	31	16	29	35	26	50	259
04-Jun-26 05:00	20	22	0	30	30	16	36	36	26	50	266
04-Jun-26 06:00	20	22	0	30	30	16	34	35	26	50	264
04-Jun-26 07:00	20	22	0	30	31	16	33	35	26	50	262
04-Jun-26 08:00	20	22	0	30	30	15	34	34	26	50	261
04-Jun-26 09:00	20	22	0	30	30	16	33	36	25	50	262
04-Jun-26 10:00	20	12	18	28	27	17	28	36	25	48	259
04-Jun-26 11:00	20	7	26	28	27	15	31	36	24	42	256
04-Jun-26 12:00	6	21	29	29	30	18	31	36	25	35	259
04-Jun-26 13:00	0	23	28	28	28	15	32	36	25	49	264
04-Jun-26 14:00	0	22	27	33	26	16	31	36	25	49	265
04-Jun-26 15:00	0	22	30	33	30	19	28	36	25	48	271
04-Jun-26 16:00	0	22	27	31	28	16	34	37	25	49	269
04-Jun-26 17:00	0	22	27	30	28	16	36	37	25	49	270
04-Jun-26 18:00	0	22	28	30	28	19	35	36	25	49	273
04-Jun-26 19:00	0	23	29	30	28	18	34	36	25	49	273
04-Jun-26 20:00	0	23	28	31	28	18	34	36	26	49	273
04-Jun-26 21:00	0	22	29	30	28	19	33	30	31	49	271
04-Jun-26 22:00	0	23	29	30	28	18	33	35	26	49	271
04-Jun-26 23:00	0	22	28	30	28	18	33	34	26	49	270
05-Jun-26 00:00	0	22	28	30	28	18	34	35	26	49	270
05-Jun-26 01:00	0	22	28	30	28	17	35	35	27	50	273
05-Jun-26 02:00	0	23	29	30	29	19	33	34	27	50	274
05-Jun-26 03:00	0	22	28	30	28	18	32	35	26	50	269
05-Jun-26 04:00	0	23	29	29	29	19	33	34	26	50	271
05-Jun-26 05:00	0	22	29	30	29	18	33	34	26	49	270
05-Jun-26 06:00	0	22	28	30	29	18	34	34	27	50	272
05-Jun-26 07:00	0	23	28	29	29	17	34	36	26	50	271
05-Jun-26 08:00	0	23	28	28	29	16	37	36	24	50	270
05-Jun-26 09:00	0	22	28	28	29	17	35	36	24	50	269
05-Jun-26 10:00	0	22	28	28	29	18	32	36	25	50	267
05-Jun-26 11:00	0	22	28	28	29	17	34	36	25	49	268
05-Jun-26 12:00	0	22	28	28	29	18	34	36	24	49	268
05-Jun-26 13:00	0	22	28	28	29	18	36	24	38	49	271
05-Jun-26 14:00	0	22	28	28	32	19	28	23	38	49	267
05-Jun-26 15:00	0	21	28	28	29	17	35	24	38	49	268
05-Jun-26 16:00	0	22	27	29	29	17	37	37	25	49	272
05-Jun-26 17:00	0	22	28	28	29	16	37	36	24	49	268

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
05-Jun-26 18:00	0	23	27	29	29	18	35	36	24	49	272
05-Jun-26 19:00	0	22	27	29	30	18	34	36	24	50	270
05-Jun-26 20:00	0	22	27	30	30	18	36	36	24	50	274
05-Jun-26 21:00	0	23	28	30	30	19	34	37	25	50	276
05-Jun-26 22:00	0	23	28	30	30	18	36	36	24	50	275
05-Jun-26 23:00	0	22	28	30	30	19	35	36	24	50	275
06-Jun-26 00:00	0	23	28	30	30	19	35	36	24	50	275
06-Jun-26 01:00	0	22	28	31	30	19	35	36	24	50	275
06-Jun-26 02:00	0	22	28	30	30	19	34	37	24	50	273
06-Jun-26 03:00	0	22	28	30	30	19	35	37	24	50	275
06-Jun-26 04:00	0	22	28	30	30	19	35	37	24	50	276
06-Jun-26 05:00	0	22	28	30	30	18	34	36	24	50	273
06-Jun-26 06:00	0	22	27	30	30	19	33	36	25	49	272
06-Jun-26 07:00	0	22	28	31	30	19	32	37	25	50	272
06-Jun-26 08:00	0	22	28	30	30	19	30	36	24	49	269
06-Jun-26 09:00	0	22	27	30	30	19	30	37	25	49	268
06-Jun-26 10:00	0	23	27	30	30	19	29	36	25	49	268
06-Jun-26 11:00	0	22	27	30	30	18	31	37	25	49	269
06-Jun-26 12:00	0	21	31	30	30	18	30	36	24	49	269
06-Jun-26 13:00	0	22	27	29	28	17	38	37	25	49	271
06-Jun-26 14:00	0	22	27	29	29	18	37	36	24	47	269
06-Jun-26 15:00	0	23	26	29	29	18	33	37	25	50	269
06-Jun-26 16:00	0	22	27	30	29	19	34	37	25	49	272
06-Jun-26 17:00	0	23	26	29	29	18	35	36	24	50	271
06-Jun-26 18:00	0	23	26	30	29	19	34	37	25	50	273
06-Jun-26 19:00	0	22	26	30	29	18	35	36	24	50	271
06-Jun-26 20:00	0	22	27	30	29	19	33	35	26	50	272
06-Jun-26 21:00	0	20	27	29	29	19	35	36	26	50	272
06-Jun-26 22:00	0	22	27	30	29	19	36	36	25	50	274
06-Jun-26 23:00	0	22	27	30	29	19	35	36	25	50	273
07-Jun-26 00:00	0	22	27	30	30	19	35	36	25	49	274
07-Jun-26 01:00	0	22	27	30	30	18	37	36	25	50	274
07-Jun-26 02:00	0	22	27	31	30	19	36	36	24	50	275
07-Jun-26 03:00	0	22	27	30	30	18	36	36	25	50	274
07-Jun-26 04:00	0	22	27	30	30	19	36	36	25	50	273
07-Jun-26 05:00	0	22	27	29	29	19	37	36	25	50	275
07-Jun-26 06:00	0	22	27	30	30	19	35	36	25	50	273
07-Jun-26 07:00	0	22	27	30	30	18	34	36	25	50	272
07-Jun-26 08:00	0	22	27	30	30	19	32	36	24	50	269
07-Jun-26 09:00	0	22	27	30	30	18	34	36	25	50	273
07-Jun-26 10:00	0	22	27	30	29	18	36	36	25	50	274
07-Jun-26 11:00	0	22	27	30	30	18	36	36	25	50	272
07-Jun-26 12:00	0	22	27	29	30	19	35	38	24	50	273
07-Jun-26 13:00	0	23	27	30	30	19	35	38	23	49	274

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
07-Jun-26 14:00	0	24	27	30	30	19	34	36	25	50	273
07-Jun-26 15:00	0	22	26	34	30	20	31	36	25	49	273
07-Jun-26 16:00	0	22	27	31	30	19	34	36	25	49	274
07-Jun-26 17:00	0	22	27	32	30	19	35	37	25	49	277
07-Jun-26 18:00	0	22	26	32	29	19	34	36	25	50	273
07-Jun-26 19:00	0	22	27	31	29	19	34	36	25	50	273
07-Jun-26 20:00	0	22	28	29	31	19	36	36	24	50	276
07-Jun-26 21:00	0	22	27	29	31	18	37	31	30	50	277
07-Jun-26 22:00	0	23	27	30	31	18	37	36	25	49	276
07-Jun-26 23:00	0	23	27	29	31	18	35	36	25	50	274
08-Jun-26 00:00	0	23	27	29	31	18	36	36	25	50	275
08-Jun-26 01:00	0	22	27	29	31	18	35	36	25	50	275
08-Jun-26 02:00	0	23	27	29	31	20	35	36	25	50	276
08-Jun-26 03:00	0	22	27	29	31	18	35	36	25	50	273
08-Jun-26 04:00	0	22	27	29	31	18	37	36	25	50	275
08-Jun-26 05:00	0	23	27	29	31	18	35	36	25	50	274
08-Jun-26 06:00	0	23	27	29	31	19	36	36	25	50	274
08-Jun-26 07:00	0	23	27	29	31	19	36	36	25	50	276
08-Jun-26 08:00	0	23	27	29	31	17	35	36	24	50	273
08-Jun-26 09:00	0	23	27	29	31	19	35	36	26	50	276
08-Jun-26 10:00	0	23	27	29	31	17	32	36	25	50	270
08-Jun-26 11:00	0	23	27	29	31	17	32	36	25	50	269
08-Jun-26 12:00	0	22	27	29	30	17	30	36	25	49	266
08-Jun-26 13:00	0	23	27	29	33	18	28	36	25	50	268
08-Jun-26 14:00	0	23	27	29	30	16	35	23	38	49	270
08-Jun-26 15:00	0	23	28	30	30	18	37	32	30	49	276
08-Jun-26 16:00	0	23	31	31	30	18	33	36	25	50	275
08-Jun-26 17:00	0	23	34	31	31	18	35	36	24	50	279
08-Jun-26 18:00	0	22	34	31	31	18	34	36	25	50	281
08-Jun-26 19:00	0	23	34	31	31	18	35	36	25	49	283
08-Jun-26 20:00	0	23	34	31	31	17	35	36	25	50	281
08-Jun-26 21:00	0	23	33	31	31	18	35	36	25	50	280
08-Jun-26 22:00	0	22	35	31	31	18	35	36	25	50	283
08-Jun-26 23:00	0	22	34	30	32	19	33	36	25	50	281
09-Jun-26 00:00	0	22	34	31	32	18	33	36	26	50	283
09-Jun-26 01:00	0	23	34	31	32	18	32	36	25	49	280
09-Jun-26 02:00	0	23	35	31	32	19	31	36	25	49	280
09-Jun-26 03:00	0	23	34	31	32	18	32	36	25	50	281
09-Jun-26 04:00	0	22	34	30	32	19	32	36	25	50	279
09-Jun-26 05:00	0	23	34	31	32	18	32	36	24	50	280
09-Jun-26 06:00	0	23	33	31	32	19	33	36	25	50	281
09-Jun-26 07:00	0	22	33	31	31	18	33	36	25	50	279
09-Jun-26 08:00	0	23	33	31	32	18	32	36	25	50	279
09-Jun-26 09:00	0	23	30	31	31	17	34	36	24	49	276

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
09-Jun-26 10:00	0	23	28	30	32	18	36	36	25	50	277
09-Jun-26 11:00	0	22	28	30	32	17	37	36	25	50	276
09-Jun-26 12:00	0	23	30	31	32	18	34	36	25	49	278
09-Jun-26 13:00	0	23	30	30	30	17	37	36	25	49	277
09-Jun-26 14:00	0	22	36	30	31	17	32	36	25	49	277
09-Jun-26 15:00	0	22	31	30	32	18	34	36	25	48	278
09-Jun-26 16:00	0	22	31	30	32	17	34	36	25	49	276
09-Jun-26 17:00	0	22	31	30	32	17	37	36	25	49	279
09-Jun-26 18:00	0	22	32	30	32	17	37	36	25	49	279
09-Jun-26 19:00	0	22	32	31	32	17	37	36	25	49	283
09-Jun-26 20:00	0	22	33	32	32	16	36	36	25	50	281
09-Jun-26 21:00	0	22	33	31	31	16	35	36	25	50	280
09-Jun-26 22:00	0	23	33	32	32	17	35	36	25	49	282
09-Jun-26 23:00	0	22	33	32	32	16	34	36	26	50	280
10-Jun-26 00:00	0	22	33	33	32	18	33	36	25	50	281
10-Jun-26 01:00	0	22	31	32	32	17	34	36	25	49	278
10-Jun-26 02:00	0	23	31	32	32	17	34	36	25	51	282
10-Jun-26 03:00	0	23	32	31	32	18	34	36	25	50	279
10-Jun-26 04:00	0	23	32	31	31	16	36	36	24	50	280
10-Jun-26 05:00	0	23	32	31	32	17	35	36	25	50	280
10-Jun-26 06:00	0	23	32	32	32	18	34	36	25	49	281
10-Jun-26 07:00	0	23	32	33	33	18	33	37	26	50	284
10-Jun-26 08:00	0	23	32	33	32	16	35	36	25	49	280
10-Jun-26 09:00	0	23	32	32	32	16	33	36	25	49	278
10-Jun-26 10:00	0	23	30	33	32	16	35	36	25	49	279
10-Jun-26 11:00	0	23	30	32	31	16	32	36	23	49	273
10-Jun-26 12:00	0	23	30	32	32	16	36	36	25	49	278
10-Jun-26 13:00	0	23	30	33	32	17	32	36	24	49	276
10-Jun-26 14:00	0	24	30	32	32	15	36	37	23	49	279
10-Jun-26 15:00	0	23	30	31	32	16	34	36	25	49	277
10-Jun-26 16:00	0	23	30	32	33	15	37	36	25	49	280
10-Jun-26 17:00	0	23	30	31	32	16	37	36	24	50	279
10-Jun-26 18:00	0	23	32	33	32	17	36	36	24	50	283
10-Jun-26 19:00	0	22	32	32	32	16	36	36	24	50	281
10-Jun-26 20:00	0	23	32	33	33	18	35	36	24	50	283
10-Jun-26 21:00	0	23	32	32	33	18	34	36	25	50	282
10-Jun-26 22:00	0	23	32	33	33	18	32	36	25	50	281
10-Jun-26 23:00	0	22	32	33	32	18	32	36	25	50	281
11-Jun-26 00:00	0	23	32	33	33	19	29	36	24	49	279
11-Jun-26 01:00	0	23	32	33	33	17	33	36	26	50	283
11-Jun-26 02:00	0	23	32	32	33	19	31	36	25	50	281
11-Jun-26 03:00	0	23	32	33	33	17	34	36	25	50	283
11-Jun-26 04:00	0	23	32	33	33	20	30	36	24	50	279
11-Jun-26 05:00	0	22	31	32	32	17	37	36	25	50	282

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
11-Jun-26 06:00	0	22	31	32	33	17	37	36	25	50	283
11-Jun-26 07:00	0	23	31	32	33	18	34	36	25	50	282
11-Jun-26 08:00	0	22	30	32	33	18	32	36	25	50	279
11-Jun-26 09:00	0	23	31	32	32	17	32	36	25	50	278
11-Jun-26 10:00	0	22	29	32	32	18	32	36	25	50	277
11-Jun-26 11:00	0	22	29	32	32	18	33	36	25	49	277
11-Jun-26 12:00	0	23	29	32	32	17	30	36	25	49	273
11-Jun-26 13:00	0	20	29	32	33	18	34	23	38	50	277
11-Jun-26 14:00	0	20	29	32	32	18	36	36	25	49	278
11-Jun-26 15:00	18	7	29	32	32	18	29	36	25	49	277
11-Jun-26 16:00	21	0	30	32	32	16	36	36	26	49	279
11-Jun-26 17:00	0	21	31	32	32	17	29	36	25	50	271
11-Jun-26 18:00	0	22	31	31	32	16	37	36	25	50	279
11-Jun-26 19:00	0	23	31	33	32	17	35	36	25	50	280
11-Jun-26 20:00	0	22	31	32	32	15	36	36	25	50	279
11-Jun-26 21:00	0	22	31	32	33	16	35	36	25	51	280
11-Jun-26 22:00	0	23	31	32	33	16	34	36	25	50	279
11-Jun-26 23:00	0	22	31	33	33	15	34	36	25	50	280
12-Jun-26 00:00	0	23	30	33	33	16	34	36	25	51	280
12-Jun-26 01:00	0	22	30	32	33	16	34	36	24	50	278
12-Jun-26 02:00	0	22	30	32	33	16	33	37	25	51	279
12-Jun-26 03:00	0	22	30	32	33	15	34	36	25	50	278
12-Jun-26 04:00	0	22	30	32	33	14	36	36	25	51	279
12-Jun-26 05:00	0	22	30	32	33	15	35	37	25	50	280
12-Jun-26 06:00	0	23	28	32	33	15	34	37	24	50	277
12-Jun-26 07:00	0	23	30	31	33	15	34	36	24	50	277
12-Jun-26 08:00	0	23	31	33	34	15	33	37	25	50	280
12-Jun-26 09:00	0	23	31	32	33	15	33	36	25	50	279
12-Jun-26 10:00	0	23	31	32	33	16	31	36	24	50	276
12-Jun-26 11:00	0	23	31	32	32	15	33	36	25	50	277
12-Jun-26 12:00	0	23	31	32	32	16	35	37	24	50	280
12-Jun-26 13:00	0	23	31	32	32	15	31	37	24	50	276
12-Jun-26 14:00	0	22	37	29	29	16	32	37	25	50	278
12-Jun-26 15:00	0	23	36	29	29	15	30	36	24	50	271
12-Jun-26 16:00	0	21	32	29	29	14	37	36	25	49	271
12-Jun-26 17:00	21	0	31	31	31	15	35	36	25	50	274
12-Jun-26 18:00	21	0	31	32	32	16	33	36	25	50	275
12-Jun-26 19:00	20	0	32	32	32	16	32	36	25	50	276
12-Jun-26 20:00	20	0	30	32	32	16	35	36	25	50	277
12-Jun-26 21:00	20	0	31	32	32	16	34	34	27	50	274
12-Jun-26 22:00	21	0	32	32	32	16	35	36	25	50	279
12-Jun-26 23:00	20	0	33	32	32	17	34	36	25	50	278
13-Jun-26 00:00	20	0	32	32	32	16	34	36	25	50	277
13-Jun-26 01:00	20	0	32	32	32	16	34	36	25	50	278

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
13-Jun-26 02:00	20	0	32	32	32	15	34	36	24	50	276
13-Jun-26 03:00	20	0	33	32	32	15	34	36	24	50	275
13-Jun-26 04:00	20	0	32	32	32	15	34	36	24	50	276
13-Jun-26 05:00	20	0	33	31	32	16	35	36	25	50	278
13-Jun-26 06:00	21	0	33	32	32	17	33	36	25	50	279
13-Jun-26 07:00	20	0	31	31	32	17	34	36	24	50	275
13-Jun-26 08:00	21	0	31	32	32	17	34	36	25	49	277
13-Jun-26 09:00	20	0	31	32	32	17	32	36	25	49	274
13-Jun-26 10:00	20	0	31	33	32	17	33	37	26	50	278
13-Jun-26 11:00	20	0	31	33	30	17	33	36	25	49	273
13-Jun-26 12:00	21	0	31	32	32	16	36	36	24	49	278
13-Jun-26 13:00	21	0	32	32	32	18	31	37	24	49	277
13-Jun-26 14:00	21	0	32	32	32	18	32	36	26	48	276
13-Jun-26 15:00	21	0	32	32	32	17	35	36	25	48	277
13-Jun-26 16:00	21	0	33	32	32	18	34	36	25	48	279
13-Jun-26 17:00	21	0	33	32	32	17	36	35	26	49	281
13-Jun-26 18:00	20	0	34	33	32	19	37	36	25	49	284
13-Jun-26 19:00	21	0	34	32	33	21	33	35	25	49	283
13-Jun-26 20:00	21	0	33	32	32	19	35	36	25	49	283
13-Jun-26 21:00	21	0	33	32	32	17	36	30	31	49	281
13-Jun-26 22:00	21	0	33	32	32	18	35	35	26	49	281
13-Jun-26 23:00	21	0	33	32	33	17	35	35	26	49	281
14-Jun-26 00:00	21	0	33	32	32	18	35	35	25	49	281
14-Jun-26 01:00	21	0	34	32	32	17	35	35	26	49	280
14-Jun-26 02:00	22	0	32	32	32	18	34	35	25	50	280
14-Jun-26 03:00	22	0	33	32	32	19	34	36	26	50	283
14-Jun-26 04:00	22	0	32	32	33	19	33	36	25	50	282
14-Jun-26 05:00	22	0	31	32	32	19	35	36	26	49	282
14-Jun-26 06:00	22	0	32	32	32	19	35	35	25	50	282
14-Jun-26 07:00	22	0	31	32	32	19	33	36	25	49	279
14-Jun-26 08:00	22	0	30	32	32	18	32	36	25	50	276
14-Jun-26 09:00	22	0	31	31	31	19	31	36	25	50	276
14-Jun-26 10:00	23	0	30	32	32	19	30	36	25	50	275
14-Jun-26 11:00	21	0	30	31	32	18	35	36	25	48	276
14-Jun-26 12:00	21	0	31	31	32	18	33	24	37	49	274
14-Jun-26 13:00	22	0	30	31	32	20	34	28	33	48	276
14-Jun-26 14:00	22	0	30	31	31	17	35	35	25	48	274
14-Jun-26 15:00	22	0	30	31	31	18	36	35	26	48	276
14-Jun-26 16:00	22	0	30	32	32	17	37	35	26	48	279
14-Jun-26 17:00	22	0	31	31	32	19	37	36	25	49	281
14-Jun-26 18:00	22	0	33	31	32	19	34	36	24	48	279
14-Jun-26 19:00	22	0	34	32	32	19	34	36	24	48	281
14-Jun-26 20:00	22	0	34	32	32	19	33	37	25	48	282
14-Jun-26 21:00	21	0	34	32	32	18	35	36	25	49	282

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
14-Jun-26 22:00	21	0	33	31	32	18	34	36	25	49	279
14-Jun-26 23:00	21	0	33	32	33	20	34	36	25	50	283
15-Jun-26 00:00	21	0	33	32	32	18	34	36	25	50	281
15-Jun-26 01:00	21	0	33	32	32	19	34	36	25	49	282
15-Jun-26 02:00	21	0	33	32	32	19	33	36	24	51	281
15-Jun-26 03:00	21	0	33	32	33	19	33	36	25	49	281
15-Jun-26 04:00	21	0	33	32	32	19	33	36	25	50	280
15-Jun-26 05:00	21	0	32	32	32	20	34	36	25	49	281
15-Jun-26 06:00	20	0	32	32	32	18	35	36	25	50	279
15-Jun-26 07:00	21	0	31	32	32	18	32	36	25	50	276
15-Jun-26 08:00	21	0	29	31	32	15	37	36	25	50	277
15-Jun-26 09:00	22	0	29	31	32	13	37	36	25	50	275
15-Jun-26 10:00	22	0	32	32	32	14	35	36	25	50	276
15-Jun-26 11:00	22	0	32	31	32	14	31	36	26	50	273
15-Jun-26 12:00	22	0	29	32	32	15	36	36	24	49	276
15-Jun-26 13:00	23	0	30	32	32	15	34	36	25	49	278
15-Jun-26 14:00	21	0	36	32	32	15	30	36	25	49	276
15-Jun-26 15:00	21	0	32	32	32	16	32	36	25	49	274
15-Jun-26 16:00	21	0	31	32	32	13	36	37	25	50	276
15-Jun-26 17:00	22	0	32	31	32	15	34	35	26	50	277
15-Jun-26 18:00	22	0	32	32	33	15	34	35	26	50	279
15-Jun-26 19:00	22	0	31	32	32	15	35	35	26	49	277
15-Jun-26 20:00	22	0	32	32	32	15	35	35	26	49	277
15-Jun-26 21:00	22	0	32	32	32	15	34	35	26	49	277
15-Jun-26 22:00	21	0	33	32	32	15	32	35	26	49	275
15-Jun-26 23:00	22	0	31	31	32	13	35	36	25	50	275
16-Jun-26 00:00	22	0	31	32	32	13	36	36	25	50	278
16-Jun-26 01:00	22	0	31	32	32	14	34	36	25	49	274
16-Jun-26 02:00	21	0	31	31	31	12	35	36	26	50	275
16-Jun-26 03:00	21	0	31	31	31	13	34	35	25	49	273
16-Jun-26 04:00	22	0	30	32	33	14	34	36	25	49	274
16-Jun-26 05:00	21	0	30	32	32	14	33	35	25	50	273
16-Jun-26 06:00	22	0	30	32	31	14	35	36	26	50	277
16-Jun-26 07:00	21	0	30	32	31	15	34	36	25	49	274
16-Jun-26 08:00	21	0	30	32	31	17	33	36	25	50	274
16-Jun-26 09:00	22	0	29	32	31	15	35	35	25	50	273
16-Jun-26 10:00	21	0	29	32	30	15	34	36	25	50	272
16-Jun-26 11:00	22	0	28	32	30	15	31	35	25	49	267
16-Jun-26 12:00	21	0	27	32	29	15	34	36	26	49	269
16-Jun-26 13:00	21	0	27	33	29	15	33	36	25	49	267
16-Jun-26 14:00	21	0	27	31	29	14	36	36	25	49	269
16-Jun-26 15:00	22	0	27	32	29	14	37	36	25	49	271
16-Jun-26 16:00	22	0	29	31	31	15	33	36	25	49	272
16-Jun-26 17:00	22	0	29	31	31	14	36	36	25	49	273

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
16-Jun-26 18:00	22	0	29	32	31	15	35	36	25	49	273
16-Jun-26 19:00	22	0	29	32	31	13	36	36	25	50	275
16-Jun-26 20:00	22	0	29	32	32	15	35	36	25	50	277
16-Jun-26 21:00	22	0	30	32	32	16	35	35	26	50	276
16-Jun-26 22:00	22	0	30	32	32	15	35	36	25	50	277
16-Jun-26 23:00	22	0	29	32	32	15	36	36	25	50	277
17-Jun-26 00:00	22	0	30	32	32	16	34	36	25	51	279
17-Jun-26 01:00	21	0	30	32	32	16	34	36	24	50	277
17-Jun-26 02:00	22	0	30	32	33	17	33	36	25	51	279
17-Jun-26 03:00	22	0	30	32	32	16	34	36	25	50	277
17-Jun-26 04:00	22	0	29	32	32	17	33	37	24	50	277
17-Jun-26 05:00	22	0	31	32	32	16	34	36	25	51	279
17-Jun-26 06:00	23	0	29	32	32	16	33	36	25	50	275
17-Jun-26 07:00	22	0	29	32	31	16	35	36	25	49	276
17-Jun-26 08:00	22	0	29	32	31	16	36	36	25	50	276
17-Jun-26 09:00	22	0	29	32	31	17	34	36	25	50	275
17-Jun-26 10:00	22	0	27	32	31	16	35	36	25	49	273
17-Jun-26 11:00	22	0	29	32	31	17	36	36	25	49	278
17-Jun-26 12:00	22	0	30	32	32	17	34	36	25	49	277
17-Jun-26 13:00	22	0	30	32	32	18	36	25	36	49	280
17-Jun-26 14:00	22	0	30	32	31	17	37	23	38	49	279
17-Jun-26 15:00	22	0	32	32	32	17	34	35	26	49	279
17-Jun-26 16:00	22	0	32	32	32	17	34	35	26	49	280
17-Jun-26 17:00	22	0	32	32	32	17	35	35	26	49	279
17-Jun-26 18:00	22	0	32	33	32	18	35	35	26	49	281
17-Jun-26 19:00	22	0	32	31	32	16	37	35	26	49	280
17-Jun-26 20:00	22	0	32	32	32	19	36	35	26	49	283
17-Jun-26 21:00	21	0	34	32	32	18	35	35	26	49	282
17-Jun-26 22:00	22	0	35	32	32	19	32	35	26	49	282
17-Jun-26 23:00	22	0	35	32	32	19	34	35	25	49	284
18-Jun-26 00:00	22	0	35	32	32	20	32	35	26	49	283
18-Jun-26 01:00	22	0	35	32	32	20	31	35	26	49	283
18-Jun-26 02:00	22	0	35	33	33	20	32	35	25	49	283
18-Jun-26 03:00	22	0	35	33	33	19	33	35	25	49	283
18-Jun-26 04:00	22	0	33	32	32	17	36	35	26	50	282
18-Jun-26 05:00	22	0	33	32	32	19	33	36	25	50	282
18-Jun-26 06:00	22	0	33	32	32	19	32	36	25	49	280
18-Jun-26 07:00	22	0	33	32	31	16	35	36	25	50	280
18-Jun-26 08:00	22	0	33	32	32	17	34	36	26	50	281
18-Jun-26 09:00	22	0	34	32	32	16	33	36	25	50	281
18-Jun-26 10:00	22	0	32	32	32	17	35	36	25	49	282
18-Jun-26 11:00	22	0	34	32	32	17	35	36	24	49	281
18-Jun-26 12:00	23	0	32	32	31	15	31	36	24	49	275
18-Jun-26 13:00	22	0	29	32	31	15	38	36	24	49	276

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
18-Jun-26 14:00	22	0	32	32	31	15	34	36	25	48	276
18-Jun-26 15:00	22	0	33	31	31	16	31	36	25	49	274
18-Jun-26 16:00	22	0	37	31	30	15	32	37	24	49	277
18-Jun-26 17:00	22	0	30	31	30	14	34	36	25	49	271
18-Jun-26 18:00	22	0	30	31	31	17	34	36	26	49	276
18-Jun-26 19:00	22	0	33	32	31	17	32	36	25	48	276
18-Jun-26 20:00	22	0	33	31	31	17	31	36	25	48	274
18-Jun-26 21:00	22	0	31	32	30	17	34	36	25	49	275
18-Jun-26 22:00	22	0	31	30	30	18	31	36	25	49	271
18-Jun-26 23:00	22	0	30	30	30	19	30	36	26	49	272
19-Jun-26 00:00	22	0	30	30	30	17	31	36	25	48	270
19-Jun-26 01:00	22	0	29	30	30	16	30	37	25	49	269
19-Jun-26 02:00	22	0	29	30	30	16	35	36	24	49	270
19-Jun-26 03:00	22	0	30	30	30	16	37	36	25	49	274
19-Jun-26 04:00	22	0	30	29	30	17	35	36	25	49	272
19-Jun-26 05:00	22	0	30	30	30	17	34	36	25	49	273
19-Jun-26 06:00	22	0	30	30	30	18	33	36	24	49	273
19-Jun-26 07:00	22	0	30	30	30	18	33	36	25	49	273
19-Jun-26 08:00	20	0	28	31	30	18	35	36	25	50	272
19-Jun-26 09:00	20	0	28	31	30	17	35	36	25	50	272
19-Jun-26 10:00	20	0	28	31	30	18	34	36	25	50	271
19-Jun-26 11:00	20	0	28	32	30	18	33	37	25	50	273
19-Jun-26 12:00	20	0	28	31	30	18	35	36	25	49	272
19-Jun-26 13:00	20	0	28	33	31	19	30	36	24	49	269
19-Jun-26 14:00	20	0	31	31	30	17	36	37	24	49	275
19-Jun-26 15:00	20	0	30	31	31	18	36	37	23	50	276
19-Jun-26 16:00	20	0	30	31	31	18	35	36	24	49	275
19-Jun-26 17:00	20	0	30	31	31	19	34	36	25	50	276
19-Jun-26 18:00	20	0	30	31	31	18	35	36	25	50	276
19-Jun-26 19:00	20	0	30	31	31	19	34	37	25	50	276
19-Jun-26 20:00	21	0	30	31	30	15	35	36	25	50	275
19-Jun-26 21:00	21	0	30	31	30	15	36	36	25	50	274
19-Jun-26 22:00	22	0	30	31	30	14	37	36	25	50	276
19-Jun-26 23:00	22	0	30	32	30	17	37	36	25	51	281
20-Jun-26 00:00	22	0	30	32	31	16	34	36	24	50	275
20-Jun-26 01:00	22	0	30	32	30	16	35	36	25	50	276
20-Jun-26 02:00	22	0	30	32	30	15	36	36	24	50	275
20-Jun-26 03:00	21	0	30	32	32	17	34	36	25	50	276
20-Jun-26 04:00	21	0	30	32	31	16	35	36	25	50	276
20-Jun-26 05:00	21	0	30	32	32	16	35	36	25	50	277
20-Jun-26 06:00	21	0	30	32	32	16	36	38	23	51	279
20-Jun-26 07:00	21	0	30	32	32	17	33	38	24	50	275
20-Jun-26 08:00	21	0	29	32	31	16	33	38	23	50	273
20-Jun-26 09:00	21	0	30	32	32	16	33	38	23	51	275

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
20-Jun-26 10:00	21	0	29	31	32	15	33	38	24	50	273
20-Jun-26 11:00	21	0	30	32	32	16	31	37	23	49	272
20-Jun-26 12:00	21	0	30	32	31	17	34	31	31	50	277
20-Jun-26 13:00	21	0	30	32	33	16	33	22	38	49	274
20-Jun-26 14:00	19	0	30	31	31	15	35	24	36	51	272
20-Jun-26 15:00	20	0	30	32	31	16	36	37	24	50	275
20-Jun-26 16:00	20	0	30	32	31	16	34	37	24	50	274
20-Jun-26 17:00	20	0	29	32	32	16	35	37	24	50	275
20-Jun-26 18:00	20	0	29	32	32	17	34	37	24	51	275
20-Jun-26 19:00	20	0	29	32	32	17	35	37	24	50	278
20-Jun-26 20:00	20	0	29	32	31	16	36	37	24	51	277
20-Jun-26 21:00	22	0	29	32	32	16	35	37	24	50	276
20-Jun-26 22:00	21	0	29	32	31	15	36	37	24	50	276
20-Jun-26 23:00	21	0	29	32	32	17	37	37	24	50	279
21-Jun-26 00:00	22	0	29	32	32	16	35	37	23	51	277
21-Jun-26 01:00	22	0	29	32	32	16	36	37	25	50	279
21-Jun-26 02:00	21	0	29	33	33	17	36	37	24	50	280
21-Jun-26 03:00	21	0	29	32	32	16	36	37	24	50	277
21-Jun-26 04:00	21	0	29	32	33	16	36	36	24	50	279
21-Jun-26 05:00	22	0	29	32	32	16	36	37	24	51	280
21-Jun-26 06:00	21	0	30	33	32	16	37	37	25	50	282
21-Jun-26 07:00	21	0	29	32	32	16	36	37	25	50	278
21-Jun-26 08:00	21	0	29	32	33	16	35	36	24	50	276
21-Jun-26 09:00	21	0	29	33	32	17	34	37	24	50	276
21-Jun-26 10:00	21	0	29	32	33	16	36	37	24	50	278
21-Jun-26 11:00	21	0	29	32	32	15	36	36	24	50	276
21-Jun-26 12:00	22	0	29	32	32	16	32	37	24	49	273
21-Jun-26 13:00	23	0	29	33	32	16	28	36	24	49	270
21-Jun-26 14:00	20	0	37	31	31	15	33	37	25	50	280
21-Jun-26 15:00	20	0	31	32	32	15	34	36	24	50	275
21-Jun-26 16:00	21	0	32	33	32	16	33	37	25	51	278
21-Jun-26 17:00	19	0	30	31	31	16	38	37	25	50	277
21-Jun-26 18:00	20	0	30	31	31	17	34	37	23	50	273
21-Jun-26 19:00	21	0	31	33	32	16	34	37	24	50	278
21-Jun-26 20:00	21	0	31	32	32	16	35	37	24	50	278
21-Jun-26 21:00	21	0	31	32	32	17	35	36	25	50	278
21-Jun-26 22:00	21	0	31	32	32	15	35	36	25	50	278
21-Jun-26 23:00	21	0	31	31	32	17	33	36	24	50	275
22-Jun-26 00:00	21	0	31	32	32	17	34	35	26	50	279
22-Jun-26 01:00	21	0	30	33	33	16	33	36	25	50	276
22-Jun-26 02:00	21	0	31	32	32	15	36	36	25	50	278
22-Jun-26 03:00	21	0	31	32	32	16	34	36	26	51	278
22-Jun-26 04:00	21	0	31	32	32	16	34	36	25	50	276
22-Jun-26 05:00	21	0	30	32	32	16	32	36	25	50	273

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
22-Jun-26 06:00	20	0	29	32	32	15	34	36	24	50	272
22-Jun-26 07:00	20	0	28	31	32	15	34	36	25	50	273
22-Jun-26 08:00	21	0	28	31	32	15	32	36	24	51	270
22-Jun-26 09:00	20	0	28	32	32	18	29	36	25	50	271
22-Jun-26 10:00	20	0	28	32	32	17	30	37	25	50	271
22-Jun-26 11:00	21	0	28	33	30	17	32	37	25	49	270
22-Jun-26 12:00	21	0	28	32	32	17	32	36	24	48	270
22-Jun-26 13:00	21	0	28	32	32	16	32	36	24	48	269
22-Jun-26 14:00	21	0	28	32	32	14	33	36	25	48	269
22-Jun-26 15:00	20	0	28	32	32	16	36	35	25	48	273
22-Jun-26 16:00	22	0	28	32	32	16	37	36	25	49	276
22-Jun-26 17:00	22	0	30	32	32	16	34	35	26	49	277
22-Jun-26 18:00	22	0	30	32	32	15	37	36	26	48	278
22-Jun-26 19:00	22	0	33	32	32	15	35	36	25	48	278
22-Jun-26 20:00	22	0	32	32	32	15	35	36	26	48	277
22-Jun-26 21:00	22	0	32	32	32	14	36	35	25	48	276
22-Jun-26 22:00	22	0	33	32	31	15	34	35	26	49	278
22-Jun-26 23:00	22	0	32	32	32	15	36	36	27	49	280
23-Jun-26 00:00	22	0	32	32	32	15	33	35	26	49	276
23-Jun-26 01:00	22	0	32	32	32	14	34	35	26	50	278
23-Jun-26 02:00	22	0	32	32	32	14	34	35	26	49	277
23-Jun-26 03:00	22	0	32	32	32	13	34	35	26	49	276
23-Jun-26 04:00	22	0	32	32	32	14	35	35	25	49	277
23-Jun-26 05:00	22	0	32	32	32	13	33	35	25	49	275
23-Jun-26 06:00	22	0	30	31	32	14	33	35	25	50	273
23-Jun-26 07:00	22	0	28	32	32	14	34	35	26	50	272
23-Jun-26 08:00	22	0	29	32	32	15	34	35	26	50	274
23-Jun-26 09:00	22	0	29	31	32	14	33	35	26	50	273
23-Jun-26 10:00	22	0	29	32	32	16	32	35	26	50	274
23-Jun-26 11:00	22	0	29	32	32	15	35	35	26	50	276
23-Jun-26 12:00	22	0	32	33	32	16	34	35	26	48	279
23-Jun-26 13:00	22	0	30	32	31	17	35	33	28	48	277
23-Jun-26 14:00	22	0	31	32	31	18	34	24	37	48	277
23-Jun-26 15:00	22	0	31	31	31	17	35	24	37	48	276
23-Jun-26 16:00	22	0	32	31	31	18	36	36	26	48	280
23-Jun-26 17:00	22	0	34	31	32	17	36	36	25	48	281
23-Jun-26 18:00	22	0	34	32	32	17	34	36	25	48	280
23-Jun-26 19:00	22	0	34	32	32	18	35	36	25	49	282
23-Jun-26 20:00	22	0	34	31	32	18	36	36	25	49	282
23-Jun-26 21:00	21	0	34	32	32	18	33	36	25	49	279
23-Jun-26 22:00	22	0	33	32	32	17	34	36	25	49	280
23-Jun-26 23:00	22	0	30	33	32	18	34	36	25	49	279
24-Jun-26 00:00	22	0	31	31	32	18	34	36	25	49	278
24-Jun-26 01:00	21	0	32	32	33	17	34	36	25	48	278

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
24-Jun-26 02:00	22	0	32	32	32	18	32	36	26	50	280
24-Jun-26 03:00	21	0	33	32	32	17	30	36	25	50	274
24-Jun-26 04:00	21	0	31	31	31	16	33	36	25	50	275
24-Jun-26 05:00	21	0	31	32	31	17	36	36	25	50	279
24-Jun-26 06:00	21	0	30	32	31	16	36	36	25	50	277
24-Jun-26 07:00	21	0	29	31	31	17	35	36	26	50	275
24-Jun-26 08:00	21	0	29	32	32	14	33	36	25	50	273
24-Jun-26 09:00	21	0	28	33	32	14	35	36	26	49	273
24-Jun-26 10:00	21	0	30	32	32	16	36	36	26	49	279
24-Jun-26 11:00	22	0	30	33	32	15	36	35	25	49	277
24-Jun-26 12:00	22	0	30	33	32	15	34	36	25	48	276
24-Jun-26 13:00	22	0	30	33	32	15	35	36	25	49	276
24-Jun-26 14:00	20	0	36	33	32	15	33	36	25	48	278
24-Jun-26 15:00	20	0	36	33	32	16	33	36	25	48	278
24-Jun-26 16:00	20	0	30	33	31	14	36	36	25	49	274
24-Jun-26 17:00	21	0	30	33	31	14	37	36	25	48	275
24-Jun-26 18:00	22	0	30	33	31	14	36	36	25	50	276
24-Jun-26 19:00	22	0	30	33	32	14	36	36	25	49	276
24-Jun-26 20:00	22	0	30	33	32	14	37	36	25	50	278
24-Jun-26 21:00	22	0	32	33	32	14	37	37	25	50	281
24-Jun-26 22:00	22	0	34	33	32	15	36	36	25	50	283
24-Jun-26 23:00	22	0	36	33	32	15	37	36	24	50	285
25-Jun-26 00:00	22	0	35	33	32	18	35	36	25	50	286
25-Jun-26 01:00	23	0	35	33	32	17	35	36	25	50	287
25-Jun-26 02:00	22	0	35	33	33	19	33	36	25	50	286
25-Jun-26 03:00	22	0	35	33	32	19	32	36	24	51	282
25-Jun-26 04:00	22	0	35	32	31	17	31	36	25	50	279
25-Jun-26 05:00	22	0	35	33	32	17	33	36	25	50	283
25-Jun-26 06:00	22	0	33	33	32	17	32	36	25	50	281
25-Jun-26 07:00	22	0	34	33	32	15	32	36	25	51	281
25-Jun-26 08:00	22	0	29	33	32	15	35	36	25	51	278
25-Jun-26 09:00	22	0	29	32	32	14	35	36	25	50	274
25-Jun-26 10:00	22	0	30	33	32	14	35	36	25	49	276
25-Jun-26 11:00	22	0	30	33	32	14	35	36	25	50	276
25-Jun-26 12:00	22	0	30	33	33	14	34	36	25	48	274
25-Jun-26 13:00	22	0	29	33	32	14	37	36	25	49	277
25-Jun-26 14:00	22	0	29	32	32	13	36	37	24	49	276
25-Jun-26 15:00	22	0	30	33	32	14	36	36	25	50	277
25-Jun-26 16:00	22	0	30	33	32	14	34	36	25	49	274
25-Jun-26 17:00	22	0	30	32	32	13	35	37	25	50	275
25-Jun-26 18:00	22	0	30	33	32	15	34	36	24	49	275
25-Jun-26 19:00	22	0	31	33	32	15	36	36	25	49	279
25-Jun-26 20:00	22	0	31	32	32	15	35	36	25	50	278
25-Jun-26 21:00	22	0	31	32	32	15	35	27	33	50	278

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
25-Jun-26 22:00	22	0	31	32	32	15	34	37	25	50	277
25-Jun-26 23:00	22	0	31	33	32	15	36	37	24	50	280
26-Jun-26 00:00	22	0	31	33	32	15	34	37	24	50	277
26-Jun-26 01:00	22	0	31	32	32	15	34	37	24	50	276
26-Jun-26 02:00	22	0	31	32	32	14	33	37	24	49	272
26-Jun-26 03:00	22	0	31	32	32	14	34	37	25	50	277
26-Jun-26 04:00	22	0	31	32	32	15	32	37	24	49	275
26-Jun-26 05:00	22	0	31	32	32	16	33	37	24	50	277
26-Jun-26 06:00	22	0	31	32	32	15	33	37	25	49	276
26-Jun-26 07:00	22	0	28	32	30	13	36	36	25	50	273
26-Jun-26 08:00	22	0	28	32	30	14	34	36	25	49	271
26-Jun-26 09:00	22	0	27	31	31	13	33	36	25	49	267
26-Jun-26 10:00	22	0	26	30	30	13	30	36	26	50	264
26-Jun-26 11:00	22	0	27	30	30	13	33	36	24	49	265
26-Jun-26 12:00	22	0	27	30	31	15	32	36	25	48	266
26-Jun-26 13:00	22	0	27	31	32	15	31	29	33	49	269
26-Jun-26 14:00	22	0	27	30	30	15	34	24	37	49	267
26-Jun-26 15:00	22	0	28	30	30	13	36	36	25	49	268
26-Jun-26 16:00	22	0	28	31	30	16	34	36	25	49	270
26-Jun-26 17:00	22	0	27	32	30	15	33	36	25	48	269
26-Jun-26 18:00	22	0	27	32	30	15	34	36	25	48	269
26-Jun-26 19:00	22	0	27	30	30	15	35	36	25	49	269
26-Jun-26 20:00	22	0	28	31	31	17	35	35	25	49	272
26-Jun-26 21:00	20	0	30	31	31	18	33	36	25	48	273
26-Jun-26 22:00	22	0	30	31	31	18	32	36	24	49	273
26-Jun-26 23:00	22	0	29	31	31	19	35	36	25	49	279
27-Jun-26 00:00	22	0	30	31	31	19	33	36	25	50	277
27-Jun-26 01:00	22	0	30	31	30	18	34	36	25	50	276
27-Jun-26 02:00	22	0	30	33	32	18	32	36	26	49	277
27-Jun-26 03:00	22	0	28	31	31	19	32	36	25	50	274
27-Jun-26 04:00	22	0	29	31	31	19	32	36	25	48	273
27-Jun-26 05:00	22	0	28	31	31	19	35	36	25	49	278
27-Jun-26 06:00	22	0	28	32	30	18	35	36	25	50	277
27-Jun-26 07:00	22	0	28	32	30	18	33	36	25	50	273
27-Jun-26 08:00	22	0	28	32	30	19	33	36	25	50	276
27-Jun-26 09:00	22	0	28	32	30	18	34	37	26	50	276
27-Jun-26 10:00	22	0	28	32	30	19	32	36	25	49	274
27-Jun-26 11:00	22	0	28	32	30	18	35	36	25	49	276
27-Jun-26 12:00	22	0	29	32	30	18	32	36	25	48	273
27-Jun-26 13:00	21	0	36	32	30	17	32	36	26	49	280
27-Jun-26 14:00	21	0	36	30	30	17	31	36	25	49	275
27-Jun-26 15:00	21	0	32	30	30	16	37	36	24	49	274
27-Jun-26 16:00	22	0	32	31	31	17	34	36	25	48	277
27-Jun-26 17:00	22	0	32	30	31	19	33	36	25	49	276

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
27-Jun-26 18:00	22	0	30	31	32	17	35	36	25	49	278
27-Jun-26 19:00	22	0	30	32	31	18	35	36	25	49	279
27-Jun-26 20:00	22	0	30	32	32	18	32	36	25	49	277
27-Jun-26 21:00	22	0	30	32	32	18	32	36	24	49	275
27-Jun-26 22:00	22	0	30	32	32	18	32	36	25	50	278
27-Jun-26 23:00	22	0	30	32	32	18	31	36	25	49	276
28-Jun-26 00:00	22	0	30	33	33	18	32	36	25	49	277
28-Jun-26 01:00	22	0	29	30	32	18	32	36	25	49	273
28-Jun-26 02:00	22	6	29	30	33	21	30	36	25	44	275
28-Jun-26 03:00	22	21	32	7	32	19	31	36	24	50	274
28-Jun-26 04:00	22	22	33	0	32	17	36	36	25	50	273
28-Jun-26 05:00	22	22	34	0	32	18	34	36	26	50	273
28-Jun-26 06:00	22	22	34	0	32	20	29	36	25	49	270
28-Jun-26 07:00	21	21	34	0	32	16	32	36	25	49	267
28-Jun-26 08:00	21	21	34	0	32	15	33	36	25	50	266
28-Jun-26 09:00	21	21	34	0	32	15	34	36	24	49	267
28-Jun-26 10:00	22	22	32	0	32	16	34	36	25	49	267
28-Jun-26 11:00	22	22	32	0	32	16	36	37	25	49	270
28-Jun-26 12:00	22	23	32	0	32	15	33	36	24	49	265
28-Jun-26 13:00	22	23	31	0	32	16	34	36	24	48	267
28-Jun-26 14:00	22	22	32	0	31	14	36	36	24	49	266
28-Jun-26 15:00	22	22	33	0	32	16	36	37	24	49	272
28-Jun-26 16:00	23	22	33	0	32	16	34	36	25	49	271
28-Jun-26 17:00	22	23	34	0	32	15	36	35	25	49	270
28-Jun-26 18:00	23	22	33	0	32	16	34	35	25	49	268
28-Jun-26 19:00	22	22	33	0	32	16	35	36	25	49	271
28-Jun-26 20:00	23	23	34	0	32	16	34	36	26	49	272
28-Jun-26 21:00	23	22	33	0	32	16	34	36	26	50	272
28-Jun-26 22:00	22	22	34	0	32	16	32	35	25	49	268
28-Jun-26 23:00	23	22	33	0	32	16	31	35	25	49	266
29-Jun-26 00:00	23	22	32	0	32	16	32	36	25	49	267
29-Jun-26 01:00	23	22	33	0	32	15	33	36	26	49	270
29-Jun-26 02:00	22	22	33	0	32	16	31	36	25	49	267
29-Jun-26 03:00	22	22	33	0	32	15	31	35	25	49	266
29-Jun-26 04:00	22	22	33	0	32	15	30	36	25	49	265
29-Jun-26 05:00	22	22	34	0	32	16	30	36	25	49	265
29-Jun-26 06:00	22	22	30	0	32	15	33	36	25	49	265
29-Jun-26 07:00	22	22	30	0	33	15	32	36	25	49	263
29-Jun-26 08:00	22	22	30	0	32	15	31	36	25	50	263
29-Jun-26 09:00	20	20	27	0	32	14	32	37	24	50	256
29-Jun-26 10:00	19	19	27	0	32	15	31	36	25	50	254
29-Jun-26 11:00	19	19	27	0	32	15	30	36	25	49	252
29-Jun-26 12:00	19	19	27	0	32	15	33	36	24	49	254
29-Jun-26 13:00	19	19	27	0	32	15	33	30	31	49	255

บันทึกข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 69) Max 290

Date	GTG-A	GTG-B	GTG-C	GTG-D	GTG-E	STG-A	GTG-F	GTG-G	GTG-H	GTG-J	Total
	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
29-Jun-26 14:00	19	19	27	0	32	15	34	24	38	49	256
29-Jun-26 15:00	19	19	27	0	32	15	34	32	29	49	255
29-Jun-26 16:00	19	19	28	0	31	14	37	36	26	49	259
29-Jun-26 17:00	19	21	28	0	32	14	35	36	25	50	259
29-Jun-26 18:00	19	21	27	0	32	15	34	36	24	50	258
29-Jun-26 19:00	19	21	27	0	32	15	35	36	25	50	259
29-Jun-26 20:00	19	21	28	0	32	16	35	36	25	50	261
29-Jun-26 21:00	20	21	27	0	32	15	34	36	25	50	259
29-Jun-26 22:00	20	21	26	0	31	15	34	36	25	50	258
29-Jun-26 23:00	20	20	27	0	31	15	34	36	25	51	258
30-Jun-26 00:00	20	21	27	0	31	15	32	36	25	50	258
30-Jun-26 01:00	20	20	26	0	32	15	32	36	25	50	257
30-Jun-26 02:00	23	19	27	0	31	15	31	36	25	50	257
30-Jun-26 03:00	23	19	27	0	31	16	30	36	25	50	256
30-Jun-26 04:00	23	20	27	0	30	15	32	36	25	50	259
30-Jun-26 05:00	23	19	27	0	31	16	28	36	25	50	256
30-Jun-26 06:00	20	19	28	0	31	15	29	36	25	50	253
30-Jun-26 07:00	20	19	27	0	31	13	33	36	25	50	253
30-Jun-26 08:00	19	19	27	0	30	12	33	36	25	50	253
30-Jun-26 09:00	19	19	27	0	30	14	33	31	23	50	245
30-Jun-26 10:00	19	19	27	0	30	13	34	31	24	50	247
30-Jun-26 11:00	19	19	27	0	30	15	31	31	24	50	246
30-Jun-26 12:00	20	19	27	0	31	15	28	31	24	49	244
30-Jun-26 13:00	23	18	26	0	31	14	27	31	24	49	242
30-Jun-26 14:00	19	15	25	0	30	14	37	31	23	46	241
30-Jun-26 15:00	19	23	35	0	30	14	26	31	23	41	244
30-Jun-26 16:00	18	23	35	0	30	16	28	31	24	41	246
30-Jun-26 17:00	19	19	27	0	30	14	32	31	24	50	245
30-Jun-26 18:00	19	19	27	0	30	14	31	31	24	50	244
30-Jun-26 19:00	19	19	27	0	30	13	32	31	23	50	245
30-Jun-26 20:00	19	19	27	0	30	14	34	31	25	50	249
30-Jun-26 21:00	19	19	27	0	31	14	36	31	24	50	251
30-Jun-26 22:00	19	19	27	0	31	13	33	31	24	50	247
30-Jun-26 23:00	19	19	27	0	30	13	34	31	24	50	248

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
01-Jan-26 00:00	49	0	59	12	0	0	23	25	86	94	59	86	493
01-Jan-26 01:00	48	0	59	12	0	0	22	24	87	95	60	87	494
01-Jan-26 02:00	49	0	58	12	0	0	23	25	86	94	61	85	492
01-Jan-26 03:00	48	0	59	12	0	0	22	24	85	94	61	86	491
01-Jan-26 04:00	49	0	58	12	0	0	22	25	83	92	62	85	488
01-Jan-26 05:00	48	0	59	12	0	0	22	25	84	93	62	85	490
01-Jan-26 06:00	49	0	59	12	0	0	22	25	82	91	62	85	487
01-Jan-26 07:00	48	0	59	12	0	0	22	25	87	94	59	85	491
01-Jan-26 08:00	49	0	60	12	0	0	22	24	83	91	58	85	485
01-Jan-26 09:00	49	0	59	12	0	0	22	25	86	94	57	87	490
01-Jan-26 10:00	50	0	60	13	0	0	22	25	82	91	59	86	486
01-Jan-26 11:00	50	0	60	12	0	0	23	25	82	91	54	87	484
01-Jan-26 12:00	50	0	59	12	0	0	23	25	88	94	54	87	491
01-Jan-26 13:00	50	0	59	13	0	0	22	25	84	92	55	87	487
01-Jan-26 14:00	50	0	59	12	0	0	22	25	82	85	62	87	484
01-Jan-26 15:00	49	0	60	12	0	0	23	25	82	84	64	86	485
01-Jan-26 16:00	49	0	59	12	0	0	22	25	84	93	63	87	494
01-Jan-26 17:00	50	0	59	12	0	0	23	25	82	84	65	87	487
01-Jan-26 18:00	49	0	60	12	0	0	22	25	82	82	66	86	485
01-Jan-26 19:00	49	0	60	12	0	0	22	25	82	85	67	86	488
01-Jan-26 20:00	49	0	59	12	0	0	22	25	81	83	66	86	483
01-Jan-26 21:00	50	0	59	12	0	0	23	25	81	83	64	86	482
01-Jan-26 22:00	49	0	60	12	0	0	22	24	79	77	77	85	485
01-Jan-26 23:00	49	0	59	12	0	0	23	25	80	90	64	86	487
02-Jan-26 00:00	49	0	60	12	0	0	22	25	81	80	63	86	479
02-Jan-26 01:00	49	0	60	12	0	0	22	25	81	78	62	85	475
02-Jan-26 02:00	49	0	59	12	0	0	23	25	82	90	62	86	487
02-Jan-26 03:00	49	0	59	12	0	0	23	25	81	84	64	86	484
02-Jan-26 04:00	49	0	60	12	0	0	23	25	81	90	62	86	488
02-Jan-26 05:00	49	0	60	12	0	0	22	25	81	85	63	86	483
02-Jan-26 06:00	49	0	59	12	0	0	23	25	80	87	62	86	483
02-Jan-26 07:00	49	0	60	12	0	0	23	25	81	90	57	86	483
02-Jan-26 08:00	49	0	59	12	0	0	23	25	81	86	55	86	476
02-Jan-26 09:00	49	0	59	12	0	0	23	25	83	91	55	86	484
02-Jan-26 10:00	50	0	60	12	0	0	26	29	84	92	68	87	507
02-Jan-26 11:00	49	0	60	13	0	0	25	27	82	96	73	87	511
02-Jan-26 12:00	50	0	59	12	0	0	25	27	81	89	72	87	503
02-Jan-26 13:00	55	0	60	12	0	0	23	25	80	92	66	86	498
02-Jan-26 14:00	50	0	62	14	0	0	23	26	80	79	72	87	493
02-Jan-26 15:00	49	0	59	12	0	0	23	25	81	87	69	87	493
02-Jan-26 16:00	50	0	59	12	0	0	23	25	80	91	72	86	498
02-Jan-26 17:00	50	0	59	12	0	0	23	25	81	79	76	87	492
02-Jan-26 18:00	50	0	59	12	0	0	23	25	80	88	63	86	487
02-Jan-26 19:00	49	0	59	12	0	0	23	25	80	88	63	86	485

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
02-Jan-26 20:00	50	0	59	12	0	0	22	24	78	78	77	85	484
02-Jan-26 21:00	49	0	59	12	0	0	23	25	79	89	65	86	487
02-Jan-26 22:00	49	0	60	12	0	0	23	25	79	84	64	86	483
02-Jan-26 23:00	49	0	59	12	0	0	23	26	79	94	60	86	488
03-Jan-26 00:00	48	0	59	12	0	0	23	25	79	96	64	85	491
03-Jan-26 01:00	49	0	59	12	0	0	23	25	82	96	61	86	492
03-Jan-26 02:00	49	0	59	12	0	0	23	25	80	94	58	86	487
03-Jan-26 03:00	49	0	60	12	0	0	23	26	84	93	63	86	496
03-Jan-26 04:00	49	0	58	12	0	0	23	25	86	94	64	86	497
03-Jan-26 05:00	49	0	59	12	0	0	23	26	87	96	64	86	502
03-Jan-26 06:00	49	0	58	12	0	0	23	25	90	98	65	89	509
03-Jan-26 07:00	48	0	58	12	0	0	23	25	89	97	61	89	503
03-Jan-26 08:00	49	0	58	12	0	0	23	25	88	96	62	88	502
03-Jan-26 09:00	49	0	59	12	0	0	23	25	91	99	60	90	510
03-Jan-26 10:00	50	0	60	12	0	0	23	25	90	99	62	90	511
03-Jan-26 11:00	50	0	59	12	0	0	23	26	88	97	57	88	500
03-Jan-26 12:00	50	0	58	12	0	0	23	25	88	97	62	88	503
03-Jan-26 13:00	50	0	60	13	0	0	23	26	86	94	71	87	509
03-Jan-26 14:00	50	0	60	12	0	0	23	25	87	95	65	87	505
03-Jan-26 15:00	50	0	60	12	0	0	23	25	88	97	65	87	508
03-Jan-26 16:00	50	0	60	12	0	0	23	25	88	96	65	87	505
03-Jan-26 17:00	50	0	59	12	0	0	23	25	84	92	66	86	497
03-Jan-26 18:00	49	0	59	12	0	0	23	25	90	99	53	89	499
03-Jan-26 19:00	49	0	58	12	0	0	23	25	91	98	54	90	500
03-Jan-26 20:00	59	0	59	12	0	0	22	25	80	80	65	85	489
03-Jan-26 21:00	59	0	59	12	0	0	23	25	81	80	65	85	490
03-Jan-26 22:00	54	0	59	12	0	0	23	25	83	93	67	86	501
03-Jan-26 23:00	54	0	59	12	0	0	23	26	81	91	65	86	497
04-Jan-26 00:00	54	0	59	12	0	0	23	25	82	94	66	85	501
04-Jan-26 01:00	54	0	59	12	0	0	23	26	83	91	66	86	501
04-Jan-26 02:00	54	0	59	12	0	0	23	25	80	89	66	85	494
04-Jan-26 03:00	54	0	59	12	0	0	23	26	81	84	66	86	492
04-Jan-26 04:00	54	0	59	12	0	0	23	25	81	87	67	86	495
04-Jan-26 05:00	54	0	58	12	0	0	23	26	82	91	66	85	497
04-Jan-26 06:00	53	0	59	12	0	0	23	25	81	90	67	85	497
04-Jan-26 07:00	54	0	59	12	0	0	24	27	80	86	67	85	495
04-Jan-26 08:00	54	0	59	12	0	0	26	29	79	84	68	86	496
04-Jan-26 09:00	54	0	59	12	0	0	26	29	78	84	68	86	496
04-Jan-26 10:00	54	0	60	12	0	0	26	26	79	87	66	86	496
04-Jan-26 11:00	54	0	59	12	0	0	25	27	79	88	66	86	497
04-Jan-26 12:00	54	0	59	12	0	0	26	26	85	92	67	86	508
04-Jan-26 13:00	54	0	59	12	0	0	26	26	80	91	66	86	500
04-Jan-26 14:00	54	0	58	12	0	0	26	27	82	90	67	87	502
04-Jan-26 15:00	54	0	59	12	0	0	25	26	83	91	67	86	504

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
04-Jan-26 16:00	55	0	60	12	0	0	25	25	82	87	69	87	503
04-Jan-26 17:00	57	0	60	13	0	0	25	25	83	90	70	86	509
04-Jan-26 18:00	57	0	60	13	0	0	25	26	83	89	69	86	507
04-Jan-26 19:00	58	0	60	13	0	0	26	26	84	94	71	86	517
04-Jan-26 20:00	57	0	60	13	0	0	25	25	83	87	70	86	506
04-Jan-26 21:00	54	0	61	13	0	0	25	25	82	86	69	86	502
04-Jan-26 22:00	52	0	59	13	0	0	25	25	82	92	69	86	503
04-Jan-26 23:00	52	0	59	13	0	0	25	25	83	91	70	86	503
05-Jan-26 00:00	52	0	60	13	0	0	25	26	82	84	70	86	498
05-Jan-26 01:00	52	0	59	13	0	0	25	26	84	87	69	86	501
05-Jan-26 02:00	52	0	60	13	0	0	25	25	83	91	69	85	504
05-Jan-26 03:00	53	0	60	13	0	0	25	25	87	95	69	86	512
05-Jan-26 04:00	52	0	60	13	0	0	25	25	83	93	69	85	505
05-Jan-26 05:00	52	0	60	13	0	0	25	26	83	84	69	86	499
05-Jan-26 06:00	53	0	60	13	0	0	25	26	84	89	70	86	505
05-Jan-26 07:00	52	0	60	13	0	0	25	25	82	87	69	85	499
05-Jan-26 08:00	53	0	60	13	0	0	25	26	82	86	69	85	499
05-Jan-26 09:00	59	0	51	12	0	0	31	27	84	67	73	90	495
05-Jan-26 10:00	64	0	59	12	0	0	21	20	87	95	71	86	515
05-Jan-26 11:00	66	0	59	12	0	0	20	20	80	87	85	86	514
05-Jan-26 12:00	82	0	60	13	0	0	20	22	86	82	73	77	515
05-Jan-26 13:00	89	0	60	12	0	0	20	20	72	81	71	87	511
05-Jan-26 14:00	89	0	60	13	0	0	20	20	76	85	69	87	518
05-Jan-26 15:00	89	0	59	12	0	0	20	20	81	80	69	87	517
05-Jan-26 16:00	93	0	59	12	0	0	19	19	78	70	68	86	505
05-Jan-26 17:00	98	0	59	12	0	0	20	0	91	62	69	98	509
05-Jan-26 18:00	98	0	62	14	0	0	20	0	92	62	68	94	510
05-Jan-26 19:00	98	0	61	13	0	0	20	0	85	69	69	88	505
05-Jan-26 20:00	99	0	60	13	0	0	20	0	83	66	68	88	497
05-Jan-26 21:00	98	0	60	13	0	0	21	0	81	67	68	85	493
05-Jan-26 22:00	98	0	61	13	0	0	20	0	88	67	69	91	508
05-Jan-26 23:00	98	0	60	13	0	0	20	0	73	66	82	85	497
06-Jan-26 00:00	98	0	60	13	0	0	20	0	85	66	68	89	500
06-Jan-26 01:00	98	0	60	13	0	0	20	0	86	66	68	90	501
06-Jan-26 02:00	98	0	60	13	0	0	20	0	91	66	68	95	510
06-Jan-26 03:00	96	0	60	13	0	0	20	0	86	66	68	90	501
06-Jan-26 04:00	96	0	60	13	0	0	20	0	86	66	69	89	500
06-Jan-26 05:00	97	0	61	13	0	0	20	0	87	67	69	91	505
06-Jan-26 06:00	97	0	60	13	0	0	20	0	87	67	69	90	503
06-Jan-26 07:00	96	0	60	13	0	0	20	0	89	66	68	92	504
06-Jan-26 08:00	97	0	61	13	0	0	20	0	81	76	69	87	505
06-Jan-26 09:00	97	0	61	13	0	0	20	0	81	85	69	87	512
06-Jan-26 10:00	97	0	61	13	0	0	20	0	85	89	69	90	524
06-Jan-26 11:00	97	0	61	13	0	0	20	0	83	89	68	89	521

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
06-Jan-26 12:00	98	0	60	13	0	0	20	0	74	87	69	94	515
06-Jan-26 13:00	98	0	62	14	0	0	20	0	84	66	70	99	513
06-Jan-26 14:00	98	0	62	13	0	0	20	0	87	66	70	99	515
06-Jan-26 15:00	97	0	62	13	0	0	20	0	85	66	70	98	511
06-Jan-26 16:00	97	0	61	13	0	0	19	0	84	65	69	98	507
06-Jan-26 17:00	99	0	61	13	0	0	20	0	88	68	70	99	518
06-Jan-26 18:00	99	0	60	13	0	0	20	0	84	67	69	97	508
06-Jan-26 19:00	99	0	61	13	0	0	20	0	84	67	69	97	511
06-Jan-26 20:00	100	0	61	13	0	0	20	0	83	68	69	93	507
06-Jan-26 21:00	100	0	60	13	0	0	20	0	83	67	83	95	522
06-Jan-26 22:00	99	0	61	13	0	0	20	0	81	67	83	92	516
06-Jan-26 23:00	99	0	61	13	0	0	20	0	82	67	84	98	524
07-Jan-26 00:00	99	0	60	13	0	0	20	0	81	67	83	95	519
07-Jan-26 01:00	100	0	60	13	0	0	21	0	82	67	83	97	523
07-Jan-26 02:00	100	0	61	13	0	0	20	0	82	67	83	96	521
07-Jan-26 03:00	99	0	59	13	0	0	21	0	83	67	83	95	520
07-Jan-26 04:00	100	0	60	13	0	0	20	0	84	67	83	97	523
07-Jan-26 05:00	100	0	59	13	0	0	20	0	82	67	83	90	515
07-Jan-26 06:00	99	0	59	13	0	0	20	0	89	66	82	102	531
07-Jan-26 07:00	99	0	61	13	0	0	20	0	84	67	83	98	524
07-Jan-26 08:00	98	0	60	13	0	0	21	0	81	67	83	93	516
07-Jan-26 09:00	98	0	60	13	0	0	20	0	81	67	82	86	508
07-Jan-26 10:00	97	0	63	14	0	0	20	0	78	80	82	85	518
07-Jan-26 11:00	91	0	58	12	0	0	23	0	78	60	85	80	487
07-Jan-26 12:00	91	0	57	11	0	0	21	0	87	48	91	96	503
07-Jan-26 13:00	97	0	62	14	0	0	21	0	83	66	84	86	512
07-Jan-26 14:00	97	0	62	13	0	0	21	0	85	69	89	94	531
07-Jan-26 15:00	100	0	62	14	0	0	21	0	83	69	85	89	521
07-Jan-26 16:00	99	0	62	14	0	0	21	0	85	69	85	87	521
07-Jan-26 17:00	99	0	63	14	0	0	21	0	85	68	84	86	520
07-Jan-26 18:00	99	0	63	14	0	0	21	0	84	68	84	89	522
07-Jan-26 19:00	99	0	62	14	0	0	21	0	84	68	84	90	521
07-Jan-26 20:00	98	0	62	14	0	0	20	0	83	87	70	85	520
07-Jan-26 21:00	98	0	62	14	0	0	24	0	83	81	70	86	517
07-Jan-26 22:00	99	0	62	14	0	0	22	0	84	91	69	87	527
07-Jan-26 23:00	98	0	61	14	0	0	23	0	83	90	69	86	523
08-Jan-26 00:00	99	0	62	14	0	0	22	0	82	88	69	86	522
08-Jan-26 01:00	98	0	61	14	0	0	22	0	82	87	69	86	518
08-Jan-26 02:00	98	0	61	14	0	0	22	0	83	92	69	88	527
08-Jan-26 03:00	98	0	61	14	0	0	22	0	82	92	69	87	525
08-Jan-26 04:00	98	0	60	14	0	0	22	0	83	92	69	88	526
08-Jan-26 05:00	98	0	61	14	0	0	23	0	84	93	69	89	530
08-Jan-26 06:00	98	0	61	14	0	0	22	0	83	93	69	89	529
08-Jan-26 07:00	97	0	61	14	0	0	21	0	84	94	69	89	529

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
08-Jan-26 08:00	92	0	58	12	0	0	22	0	79	90	69	90	511
08-Jan-26 09:00	96	0	61	14	0	0	21	0	80	81	69	90	512
08-Jan-26 10:00	96	0	61	14	0	0	21	0	90	67	69	104	523
08-Jan-26 11:00	97	0	62	14	0	0	21	0	83	66	69	99	511
08-Jan-26 12:00	96	0	61	14	0	0	21	0	88	68	70	103	521
08-Jan-26 13:00	100	0	62	14	0	0	21	0	82	68	70	98	515
08-Jan-26 14:00	98	0	62	14	0	0	21	0	80	69	70	97	512
08-Jan-26 15:00	98	0	62	14	0	0	21	0	84	69	70	100	516
08-Jan-26 16:00	97	0	62	14	0	0	22	0	86	68	70	101	520
08-Jan-26 17:00	97	0	62	14	0	0	22	0	84	69	70	96	513
08-Jan-26 18:00	97	0	62	14	0	0	22	0	84	69	70	98	515
08-Jan-26 19:00	97	0	62	14	0	0	21	0	88	68	70	102	523
08-Jan-26 20:00	97	0	61	14	0	0	21	0	83	84	69	94	522
08-Jan-26 21:00	97	0	61	14	0	0	22	0	82	93	69	96	534
08-Jan-26 22:00	96	0	61	14	0	0	21	0	88	92	69	95	536
08-Jan-26 23:00	97	0	61	14	0	0	21	0	88	92	69	94	535
09-Jan-26 00:00	96	0	61	14	0	0	21	0	87	91	69	94	533
09-Jan-26 01:00	96	0	61	14	0	0	21	0	87	90	69	93	531
09-Jan-26 02:00	97	0	61	14	0	0	22	0	90	93	69	96	541
09-Jan-26 03:00	96	0	61	14	0	0	22	0	89	92	69	95	539
09-Jan-26 04:00	96	0	60	14	0	0	22	0	87	90	69	94	533
09-Jan-26 05:00	96	0	61	14	0	0	21	0	89	92	69	95	536
09-Jan-26 06:00	96	0	60	14	0	0	22	0	89	93	69	95	538
09-Jan-26 07:00	97	0	61	14	0	0	22	0	89	93	69	96	540
09-Jan-26 08:00	97	0	60	14	0	0	22	0	88	92	69	95	536
09-Jan-26 09:00	97	0	61	14	0	0	21	0	87	91	69	94	534
09-Jan-26 10:00	97	0	61	14	0	0	22	0	86	90	69	94	533
09-Jan-26 11:00	97	0	61	14	0	0	21	0	79	90	69	98	529
09-Jan-26 12:00	97	0	61	13	0	0	21	0	81	90	69	97	529
09-Jan-26 13:00	97	0	60	14	0	0	21	0	79	89	69	97	527
09-Jan-26 14:00	97	0	62	14	0	0	22	0	81	92	69	99	534
09-Jan-26 15:00	97	0	60	13	0	0	22	0	79	84	69	93	518
09-Jan-26 16:00	95	18	60	13	0	0	21	0	84	93	69	99	552
09-Jan-26 17:00	95	19	60	13	0	0	21	0	77	88	69	95	536
09-Jan-26 18:00	84	35	60	13	0	0	22	0	77	81	69	89	529
09-Jan-26 19:00	54	56	60	13	0	0	21	0	79	82	68	92	526
09-Jan-26 20:00	54	78	60	13	0	0	22	0	79	78	67	85	537
09-Jan-26 21:00	55	45	59	13	0	0	26	0	85	89	72	88	533
09-Jan-26 22:00	48	45	60	13	0	0	22	0	82	84	81	93	527
09-Jan-26 23:00	55	45	60	13	0	0	21	0	83	82	69	91	519
10-Jan-26 00:00	54	44	60	13	0	0	21	0	83	85	68	93	522
10-Jan-26 01:00	55	45	60	13	0	0	21	0	82	82	68	92	518
10-Jan-26 02:00	55	45	60	14	0	0	21	0	82	87	68	95	526
10-Jan-26 03:00	54	45	60	13	0	0	21	0	81	89	68	96	527

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
10-Jan-26 04:00	54	44	60	13	0	0	21	0	82	91	68	98	532
10-Jan-26 05:00	54	45	59	14	0	0	22	0	82	87	68	94	525
10-Jan-26 06:00	55	45	59	13	0	0	22	0	81	86	69	94	524
10-Jan-26 07:00	55	45	60	13	0	0	22	0	81	86	68	94	522
10-Jan-26 08:00	54	45	60	13	0	0	22	0	78	87	68	95	522
10-Jan-26 09:00	53	43	60	13	0	0	22	0	81	96	69	101	538
10-Jan-26 10:00	53	44	60	13	0	0	22	0	82	87	69	95	524
10-Jan-26 11:00	53	43	60	14	0	0	22	0	81	87	69	95	524
10-Jan-26 12:00	58	43	60	14	0	0	21	0	76	88	69	96	527
10-Jan-26 13:00	55	43	60	13	0	0	22	0	82	84	69	93	521
10-Jan-26 14:00	55	44	61	13	0	0	22	0	81	84	69	93	522
10-Jan-26 15:00	54	44	60	13	0	0	22	0	80	92	70	98	532
10-Jan-26 16:00	54	44	60	13	0	0	21	0	81	89	69	96	528
10-Jan-26 17:00	54	44	60	13	0	0	21	0	81	93	70	99	535
10-Jan-26 18:00	54	43	59	13	0	0	21	0	83	92	69	98	533
10-Jan-26 19:00	55	45	60	13	0	0	21	0	80	92	69	98	533
10-Jan-26 20:00	55	45	60	13	0	0	21	0	81	89	69	96	529
10-Jan-26 21:00	55	45	60	13	0	0	22	0	82	90	69	94	530
10-Jan-26 22:00	55	45	59	13	0	0	21	0	81	90	69	97	529
10-Jan-26 23:00	54	45	59	13	0	0	22	0	82	84	69	93	521
11-Jan-26 00:00	55	45	60	13	0	0	22	0	80	90	69	97	530
11-Jan-26 01:00	54	45	59	13	0	0	22	0	80	90	68	97	528
11-Jan-26 02:00	55	46	60	13	0	0	21	0	79	85	68	93	520
11-Jan-26 03:00	55	45	59	13	0	0	21	0	78	88	69	95	523
11-Jan-26 04:00	54	44	59	13	0	0	22	0	80	90	69	97	528
11-Jan-26 05:00	53	43	60	13	0	0	21	0	78	87	69	94	518
11-Jan-26 06:00	53	44	60	13	0	0	22	0	78	89	69	96	522
11-Jan-26 07:00	51	40	59	13	0	0	22	0	81	91	69	98	524
11-Jan-26 08:00	51	41	60	13	0	0	22	0	83	93	69	99	531
11-Jan-26 09:00	52	41	59	13	0	0	22	0	82	92	68	99	528
11-Jan-26 10:00	51	41	60	13	0	0	21	0	89	99	69	104	547
11-Jan-26 11:00	52	41	58	12	0	0	21	0	87	97	69	102	539
11-Jan-26 12:00	52	48	57	12	0	0	22	0	84	96	69	101	541
11-Jan-26 13:00	52	43	58	12	0	0	26	0	89	95	69	100	545
11-Jan-26 14:00	52	43	59	12	0	0	26	0	87	96	70	101	545
11-Jan-26 15:00	53	43	58	12	0	0	26	0	83	93	70	99	536
11-Jan-26 16:00	53	43	59	12	0	0	26	0	83	90	70	97	533
11-Jan-26 17:00	54	43	58	12	0	0	26	0	82	92	69	98	536
11-Jan-26 18:00	54	44	59	12	0	0	23	0	84	92	69	98	536
11-Jan-26 19:00	56	46	60	12	0	0	22	0	80	94	69	99	537
11-Jan-26 20:00	55	45	60	13	0	0	22	0	79	88	70	95	527
11-Jan-26 21:00	55	45	60	13	0	0	22	0	81	90	59	98	522
11-Jan-26 22:00	55	45	60	13	0	0	22	0	79	87	69	94	524
11-Jan-26 23:00	55	45	59	13	0	0	22	0	80	84	69	93	520

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
12-Jan-26 00:00	55	45	59	13	0	0	22	0	79	86	69	93	521
12-Jan-26 01:00	55	45	60	13	0	0	22	0	79	89	69	96	526
12-Jan-26 02:00	55	45	60	13	0	0	22	0	79	88	68	95	524
12-Jan-26 03:00	54	44	59	13	0	0	22	0	80	91	68	98	529
12-Jan-26 04:00	55	45	60	13	0	0	22	0	79	88	68	96	525
12-Jan-26 05:00	55	45	59	13	0	0	22	0	80	89	68	95	526
12-Jan-26 06:00	55	45	59	13	0	0	22	0	80	92	69	97	532
12-Jan-26 07:00	54	45	59	13	0	0	22	0	79	89	69	96	527
12-Jan-26 08:00	52	45	59	13	0	0	22	0	82	92	68	98	530
12-Jan-26 09:00	52	43	59	13	0	0	22	0	80	90	69	97	524
12-Jan-26 10:00	53	43	60	13	0	0	22	0	81	92	69	97	529
12-Jan-26 11:00	52	43	61	13	0	0	22	0	79	90	69	96	526
12-Jan-26 12:00	53	43	61	13	0	0	22	0	80	90	70	96	526
12-Jan-26 13:00	52	43	61	13	0	0	22	0	81	92	70	98	533
12-Jan-26 14:00	53	43	60	13	0	0	22	0	80	90	69	97	526
12-Jan-26 15:00	52	43	59	13	0	0	21	0	83	93	68	98	531
12-Jan-26 16:00	53	42	60	13	0	0	21	0	84	93	68	98	533
12-Jan-26 17:00	52	42	60	13	0	0	22	0	83	93	68	99	532
12-Jan-26 18:00	52	42	60	13	0	0	23	0	84	94	69	100	536
12-Jan-26 19:00	52	43	60	13	0	0	22	0	80	91	69	97	527
12-Jan-26 20:00	52	43	59	13	0	0	21	0	83	88	68	99	526
12-Jan-26 21:00	47	42	59	12	0	0	21	0	86	95	67	104	534
12-Jan-26 22:00	52	41	60	12	0	0	21	0	82	87	68	99	522
12-Jan-26 23:00	52	42	59	12	0	0	21	0	81	90	69	102	528
13-Jan-26 00:00	52	42	60	12	0	0	21	0	81	92	69	102	530
13-Jan-26 01:00	52	42	59	12	0	0	21	0	83	93	68	103	532
13-Jan-26 02:00	52	42	59	12	0	0	21	0	82	92	69	102	530
13-Jan-26 03:00	52	42	58	12	0	0	21	0	83	93	69	103	531
13-Jan-26 04:00	52	42	60	12	0	0	21	0	82	92	69	99	529
13-Jan-26 05:00	52	41	59	12	0	0	21	0	81	92	69	98	524
13-Jan-26 06:00	52	42	59	12	0	0	21	0	80	87	69	95	516
13-Jan-26 07:00	51	41	58	12	0	0	21	0	79	85	69	92	509
13-Jan-26 08:00	52	41	59	12	0	0	21	0	81	87	69	90	512
13-Jan-26 09:00	52	42	60	12	0	0	21	0	79	88	69	91	516
13-Jan-26 10:00	52	42	59	12	0	0	20	0	78	85	69	89	507
13-Jan-26 11:00	52	42	59	12	0	0	20	0	81	90	69	93	519
13-Jan-26 12:00	57	45	59	12	0	0	20	0	78	88	68	92	520
13-Jan-26 13:00	53	42	61	13	0	0	27	0	81	91	69	87	523
13-Jan-26 14:00	53	42	60	13	0	0	27	0	84	93	69	87	527
13-Jan-26 15:00	52	42	59	13	0	0	26	0	80	90	68	87	517
13-Jan-26 16:00	52	42	61	13	0	0	22	0	81	90	68	87	515
13-Jan-26 17:00	52	42	59	13	0	0	22	0	83	94	68	87	520
13-Jan-26 18:00	53	43	60	13	0	0	22	0	82	90	68	88	518
13-Jan-26 19:00	53	43	60	13	0	0	21	0	83	82	68	88	511

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
13-Jan-26 20:00	53	43	60	13	0	0	22	0	82	82	68	86	510
13-Jan-26 21:00	53	42	61	13	0	0	22	0	87	67	69	92	506
13-Jan-26 22:00	53	42	61	13	0	0	21	0	86	68	69	97	508
13-Jan-26 23:00	52	42	60	13	0	0	21	0	84	68	69	95	503
14-Jan-26 00:00	52	42	59	13	0	0	21	0	81	66	77	93	504
14-Jan-26 01:00	51	41	59	12	0	0	21	0	81	67	69	93	494
14-Jan-26 02:00	51	42	59	12	0	0	21	0	84	68	69	95	500
14-Jan-26 03:00	51	42	60	13	0	0	21	0	84	68	70	86	496
14-Jan-26 04:00	52	42	59	13	0	0	22	0	86	68	69	98	508
14-Jan-26 05:00	51	41	59	13	0	0	21	0	83	68	69	90	494
14-Jan-26 06:00	51	41	59	12	0	0	20	0	80	68	69	94	495
14-Jan-26 07:00	51	41	59	12	0	0	21	0	79	68	69	92	492
14-Jan-26 08:00	51	41	59	12	0	0	21	0	77	80	68	85	495
14-Jan-26 09:00	52	42	60	13	0	0	20	0	79	67	68	86	486
14-Jan-26 10:00	52	43	59	12	0	0	21	0	80	68	69	95	500
14-Jan-26 11:00	53	51	59	12	0	0	21	0	74	68	69	95	501
14-Jan-26 12:00	52	45	62	14	0	0	20	0	77	69	68	95	503
14-Jan-26 13:00	52	44	62	14	0	0	21	0	78	69	68	94	502
14-Jan-26 14:00	54	46	61	13	0	0	21	0	80	68	68	94	505
14-Jan-26 15:00	54	47	61	13	0	0	21	0	80	68	68	93	504
14-Jan-26 16:00	54	46	60	13	0	0	21	0	85	68	68	96	509
14-Jan-26 17:00	54	46	60	13	0	0	21	0	81	68	68	93	503
14-Jan-26 18:00	54	46	60	13	0	0	21	0	83	68	67	94	505
14-Jan-26 19:00	56	48	61	13	0	0	21	0	83	68	68	95	511
14-Jan-26 20:00	55	46	61	13	0	0	20	0	85	67	68	96	511
14-Jan-26 21:00	55	46	60	13	0	0	21	0	86	68	68	93	510
14-Jan-26 22:00	55	46	61	13	0	0	21	0	91	67	67	96	517
14-Jan-26 23:00	55	47	60	12	0	0	21	0	88	67	67	95	513
15-Jan-26 00:00	55	48	60	13	0	0	21	0	90	67	67	96	517
15-Jan-26 01:00	55	47	61	13	0	0	21	0	89	67	67	95	514
15-Jan-26 02:00	55	47	60	13	0	0	21	0	89	67	67	95	514
15-Jan-26 03:00	55	47	60	13	0	0	21	0	91	67	67	96	517
15-Jan-26 04:00	55	47	60	13	0	0	20	0	88	66	67	94	510
15-Jan-26 05:00	56	48	61	13	0	0	20	0	88	67	67	95	514
15-Jan-26 06:00	55	47	60	13	0	0	21	0	91	67	67	97	518
15-Jan-26 07:00	56	47	60	13	0	0	20	0	93	67	67	98	519
15-Jan-26 08:00	56	46	61	13	0	0	21	0	88	68	68	94	513
15-Jan-26 09:00	54	47	60	13	0	0	21	0	85	68	68	92	508
15-Jan-26 10:00	55	46	61	13	0	0	21	0	84	68	68	91	508
15-Jan-26 11:00	54	46	61	13	0	0	20	0	89	68	68	94	512
15-Jan-26 12:00	55	47	60	13	0	0	20	0	87	68	68	93	510
15-Jan-26 13:00	56	48	59	13	0	0	19	0	83	76	67	91	512
15-Jan-26 14:00	55	47	60	13	0	0	20	0	87	68	68	93	511
15-Jan-26 15:00	55	48	60	13	0	0	20	0	87	68	68	93	511

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
15-Jan-26 16:00	55	47	61	13	0	0	20	0	89	68	68	94	514
15-Jan-26 17:00	55	47	61	13	0	0	19	0	91	67	67	96	515
15-Jan-26 18:00	55	47	61	13	0	0	21	0	85	68	68	92	511
15-Jan-26 19:00	56	48	60	13	0	0	20	0	82	68	68	90	504
15-Jan-26 20:00	56	47	61	13	0	0	21	0	85	68	68	92	509
15-Jan-26 21:00	47	47	61	13	0	0	20	0	87	67	67	93	503
15-Jan-26 22:00	56	48	61	13	0	0	20	0	83	68	68	91	508
15-Jan-26 23:00	56	48	61	13	0	0	21	0	83	68	68	90	507
16-Jan-26 00:00	56	47	62	13	0	0	21	0	87	68	68	92	513
16-Jan-26 01:00	55	48	60	13	0	0	20	0	87	67	67	93	510
16-Jan-26 02:00	55	48	61	13	0	0	20	0	87	67	67	93	511
16-Jan-26 03:00	55	47	62	13	0	0	20	0	89	67	67	94	514
16-Jan-26 04:00	55	47	61	13	0	0	20	0	87	67	67	94	510
16-Jan-26 05:00	55	48	59	13	0	0	20	0	88	67	67	94	510
16-Jan-26 06:00	55	48	61	13	0	0	20	0	87	67	67	93	510
16-Jan-26 07:00	54	47	60	13	0	0	20	0	88	67	67	94	511
16-Jan-26 08:00	54	47	59	13	0	0	20	0	88	67	68	94	509
16-Jan-26 09:00	53	47	60	13	0	0	20	0	89	68	68	94	511
16-Jan-26 10:00	53	46	61	13	0	0	21	0	87	68	68	93	510
16-Jan-26 11:00	52	44	59	12	41	9	18	0	76	62	63	93	528
16-Jan-26 12:00	52	44	58	11	59	9	21	23	84	53	50	74	537
16-Jan-26 13:00	57	45	60	12	61	9	19	19	78	66	66	86	579
16-Jan-26 14:00	57	45	59	12	60	9	18	19	72	65	65	81	561
16-Jan-26 15:00	52	45	59	12	60	9	19	20	84	67	67	80	575
16-Jan-26 16:00	52	45	58	11	60	9	19	20	83	67	66	84	575
16-Jan-26 17:00	52	47	57	11	58	8	20	20	82	67	66	89	578
16-Jan-26 18:00	52	46	57	11	59	8	20	20	82	68	65	86	574
16-Jan-26 19:00	52	46	57	11	59	9	20	20	82	67	65	82	569
16-Jan-26 20:00	53	47	57	11	59	8	20	20	83	68	66	82	574
16-Jan-26 21:00	52	46	58	11	59	8	20	20	80	62	68	84	568
16-Jan-26 22:00	52	46	57	11	59	8	20	20	81	67	66	86	574
16-Jan-26 23:00	53	47	57	11	59	9	20	20	83	68	65	84	573
17-Jan-26 00:00	52	47	57	11	58	8	20	20	83	67	65	84	572
17-Jan-26 01:00	53	47	57	11	58	8	20	20	83	67	65	86	576
17-Jan-26 02:00	52	47	57	11	58	8	20	20	84	67	65	87	575
17-Jan-26 03:00	52	47	57	11	58	8	20	20	82	67	65	86	574
17-Jan-26 04:00	52	47	57	11	59	8	20	20	82	67	65	88	577
17-Jan-26 05:00	52	47	57	11	59	8	20	20	84	67	65	88	578
17-Jan-26 06:00	52	48	57	11	58	8	20	20	81	67	65	88	576
17-Jan-26 07:00	52	47	57	11	58	8	20	20	82	67	65	91	579
17-Jan-26 08:00	53	47	56	11	58	8	20	20	83	67	66	92	581
17-Jan-26 09:00	52	48	57	10	58	8	20	20	84	67	65	92	581
17-Jan-26 10:00	53	48	56	10	58	8	19	20	82	67	65	87	573
17-Jan-26 11:00	52	47	57	11	58	8	20	20	82	67	66	92	580

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
17-Jan-26 12:00	52	48	57	10	58	8	19	20	80	67	65	87	573
17-Jan-26 13:00	52	48	57	10	58	8	20	20	84	68	65	88	578
17-Jan-26 14:00	52	47	56	10	58	8	20	20	85	69	64	88	577
17-Jan-26 15:00	52	50	56	10	58	8	20	20	84	68	65	89	580
17-Jan-26 16:00	52	47	61	12	59	8	20	20	80	68	66	94	588
17-Jan-26 17:00	53	46	62	14	59	9	20	20	80	68	65	93	586
17-Jan-26 18:00	53	47	60	12	58	9	20	20	84	68	65	91	587
17-Jan-26 19:00	52	46	59	12	59	9	20	20	84	67	65	94	586
17-Jan-26 20:00	53	47	59	12	59	9	20	20	83	68	65	93	587
17-Jan-26 21:00	53	47	59	12	59	9	20	20	85	67	59	98	588
17-Jan-26 22:00	52	47	59	12	59	8	20	20	81	67	65	89	580
17-Jan-26 23:00	52	47	59	12	59	8	20	20	80	68	65	90	581
18-Jan-26 00:00	52	47	60	12	59	8	20	19	83	67	65	92	584
18-Jan-26 01:00	52	47	59	12	59	8	20	20	84	68	66	88	583
18-Jan-26 02:00	52	47	59	12	59	8	20	20	84	68	66	95	590
18-Jan-26 03:00	52	47	60	12	60	8	21	20	82	68	66	88	583
18-Jan-26 04:00	52	47	59	12	59	9	20	20	82	67	65	88	580
18-Jan-26 05:00	52	46	59	12	59	9	20	20	81	67	65	87	577
18-Jan-26 06:00	52	47	60	12	58	9	20	21	80	67	66	91	583
18-Jan-26 07:00	52	48	60	12	58	9	20	19	81	67	65	92	584
18-Jan-26 08:00	52	46	59	12	58	9	20	20	79	67	64	91	577
18-Jan-26 09:00	52	46	59	12	59	9	20	21	80	68	65	88	578
18-Jan-26 10:00	52	47	59	12	59	9	20	20	80	68	65	94	584
18-Jan-26 11:00	53	47	58	12	59	9	20	20	82	68	66	89	581
18-Jan-26 12:00	53	47	58	11	59	9	20	20	80	68	66	90	581
18-Jan-26 13:00	52	46	58	11	65	12	20	20	77	69	65	91	585
18-Jan-26 14:00	52	45	57	11	58	9	20	20	80	63	71	94	581
18-Jan-26 15:00	52	46	58	11	60	9	20	20	85	67	67	91	586
18-Jan-26 16:00	52	47	57	11	60	9	20	20	84	66	67	90	585
18-Jan-26 17:00	52	47	58	11	60	9	20	20	83	68	66	94	589
18-Jan-26 18:00	52	47	58	11	60	9	20	20	84	67	66	90	584
18-Jan-26 19:00	52	47	58	11	60	10	20	20	83	67	66	92	586
18-Jan-26 20:00	52	47	58	11	60	9	20	20	84	67	66	88	583
18-Jan-26 21:00	51	48	59	11	61	10	20	20	81	67	66	91	585
18-Jan-26 22:00	52	47	58	11	60	9	20	20	83	67	65	88	582
18-Jan-26 23:00	52	48	58	11	60	10	20	20	82	67	66	89	582
19-Jan-26 00:00	53	48	58	11	61	9	20	20	81	67	66	91	585
19-Jan-26 01:00	52	47	58	11	61	9	20	20	83	67	65	92	584
19-Jan-26 02:00	52	47	58	11	60	9	20	20	82	67	65	89	582
19-Jan-26 03:00	52	47	58	11	59	9	20	20	82	67	65	87	578
19-Jan-26 04:00	52	47	58	11	60	9	21	20	82	67	65	93	584
19-Jan-26 05:00	52	47	58	11	59	9	20	20	79	66	65	92	578
19-Jan-26 06:00	52	48	57	11	59	9	20	21	83	67	65	95	586
19-Jan-26 07:00	52	47	58	11	60	9	19	20	79	67	65	89	577

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
19-Jan-26 08:00	52	47	58	11	60	9	20	20	79	67	66	91	580
19-Jan-26 09:00	52	47	57	11	60	9	20	20	81	67	66	87	576
19-Jan-26 10:00	53	47	57	11	59	9	20	20	81	68	67	87	578
19-Jan-26 11:00	52	48	57	11	59	9	20	19	79	66	65	92	579
19-Jan-26 12:00	58	47	56	10	59	9	20	20	79	67	66	87	577
19-Jan-26 13:00	58	46	56	10	59	8	20	20	79	67	66	87	577
19-Jan-26 14:00	52	46	55	10	58	9	20	20	79	67	66	87	569
19-Jan-26 15:00	52	46	56	10	59	9	19	20	83	67	66	87	573
19-Jan-26 16:00	52	47	56	10	60	8	20	20	83	67	66	90	579
19-Jan-26 17:00	52	47	55	10	59	8	20	20	84	67	66	87	576
19-Jan-26 18:00	52	47	56	10	60	9	19	19	83	67	66	96	584
19-Jan-26 19:00	51	45	56	10	60	9	20	20	84	67	66	91	579
19-Jan-26 20:00	53	47	57	11	60	9	20	20	81	67	66	91	581
19-Jan-26 21:00	54	47	57	11	60	9	19	19	80	57	82	86	582
19-Jan-26 22:00	54	45	58	11	61	9	20	20	79	67	65	89	578
19-Jan-26 23:00	53	45	57	11	60	9	20	20	80	66	65	87	574
20-Jan-26 00:00	53	45	58	11	60	9	20	20	79	67	66	87	576
20-Jan-26 01:00	53	46	57	11	60	9	20	20	80	67	66	87	576
20-Jan-26 02:00	53	45	59	11	60	9	20	20	81	67	65	87	577
20-Jan-26 03:00	53	46	58	12	59	9	19	19	80	66	65	86	574
20-Jan-26 04:00	53	45	59	12	60	9	20	20	80	67	65	87	576
20-Jan-26 05:00	53	45	59	12	60	9	20	20	79	67	66	91	582
20-Jan-26 06:00	52	44	59	12	60	9	20	20	80	67	66	86	573
20-Jan-26 07:00	52	44	59	12	60	9	21	20	81	68	67	87	579
20-Jan-26 08:00	52	44	59	12	60	9	19	20	80	67	66	92	579
20-Jan-26 09:00	53	45	58	12	60	10	20	20	80	67	66	87	576
20-Jan-26 10:00	52	45	58	11	60	9	19	20	82	67	65	91	579
20-Jan-26 11:00	52	45	58	11	60	9	19	20	82	67	66	91	581
20-Jan-26 12:00	52	44	58	11	60	9	20	19	84	69	63	90	580
20-Jan-26 13:00	52	46	62	13	60	9	19	20	78	68	67	92	587
20-Jan-26 14:00	53	46	63	13	61	9	20	19	79	68	67	93	591
20-Jan-26 15:00	52	49	60	12	60	9	20	20	77	68	66	91	586
20-Jan-26 16:00	53	52	58	11	61	9	20	20	82	68	66	90	589
20-Jan-26 17:00	53	44	59	12	61	9	20	20	82	68	66	87	581
20-Jan-26 18:00	55	47	59	12	61	9	20	20	83	67	65	87	585
20-Jan-26 19:00	55	48	60	12	61	9	20	20	79	67	66	90	588
20-Jan-26 20:00	55	47	60	12	61	9	20	20	78	67	64	87	580
20-Jan-26 21:00	55	46	59	12	61	9	19	20	78	66	64	86	577
20-Jan-26 22:00	54	46	59	12	61	9	20	20	80	67	66	87	580
20-Jan-26 23:00	54	46	59	12	60	9	20	20	79	67	66	87	578
21-Jan-26 00:00	54	46	59	12	61	9	19	20	78	67	65	87	578
21-Jan-26 01:00	53	46	60	12	62	9	20	20	77	67	66	87	579
21-Jan-26 02:00	53	46	59	12	60	9	20	20	76	67	66	87	576
21-Jan-26 03:00	53	45	59	12	61	10	20	21	77	68	66	87	580

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
21-Jan-26 04:00	53	45	59	12	61	10	20	20	83	67	65	92	587
21-Jan-26 05:00	54	46	60	12	61	9	20	20	78	67	65	86	577
21-Jan-26 06:00	52	44	60	12	61	10	20	20	79	67	66	87	578
21-Jan-26 07:00	52	44	59	12	61	10	20	20	78	67	66	87	575
21-Jan-26 08:00	52	45	59	12	60	9	20	20	78	67	66	86	574
21-Jan-26 09:00	52	45	58	12	60	9	19	20	80	66	65	87	573
21-Jan-26 10:00	53	45	59	12	60	9	20	20	80	68	66	91	581
21-Jan-26 11:00	53	44	60	12	60	9	20	20	79	67	66	87	576
21-Jan-26 12:00	52	44	59	12	60	9	18	19	84	67	66	95	585
21-Jan-26 13:00	52	44	58	12	61	9	20	20	83	68	67	88	581
21-Jan-26 14:00	52	44	59	12	65	11	19	20	81	67	66	94	591
21-Jan-26 15:00	52	44	59	12	60	9	20	20	85	63	71	91	586
21-Jan-26 16:00	52	44	59	12	60	9	20	21	83	67	66	90	583
21-Jan-26 17:00	52	44	59	12	60	9	20	20	85	67	65	99	589
21-Jan-26 18:00	53	45	59	12	59	9	20	20	84	68	66	91	586
21-Jan-26 19:00	52	44	58	12	60	9	20	21	84	68	66	91	584
21-Jan-26 20:00	53	45	59	12	62	10	21	21	84	69	66	91	590
21-Jan-26 21:00	51	44	59	12	63	10	20	20	82	67	65	87	580
21-Jan-26 22:00	52	45	58	12	62	10	20	20	83	67	65	87	581
21-Jan-26 23:00	51	43	58	11	62	10	20	20	84	67	66	86	580
22-Jan-26 00:00	52	44	58	12	62	10	20	20	84	68	66	87	583
22-Jan-26 01:00	51	43	58	12	62	10	20	20	82	67	65	87	578
22-Jan-26 02:00	53	44	59	12	62	10	20	20	81	68	65	90	582
22-Jan-26 03:00	52	45	59	12	62	10	20	20	81	67	65	88	581
22-Jan-26 04:00	52	44	59	12	62	10	20	20	83	67	65	86	580
22-Jan-26 05:00	52	44	59	12	62	10	20	20	83	67	64	93	585
22-Jan-26 06:00	52	44	58	12	61	9	20	20	84	68	65	86	580
22-Jan-26 07:00	52	43	59	12	62	10	20	20	82	67	64	87	578
22-Jan-26 08:00	52	44	58	11	62	10	20	20	80	67	64	87	575
22-Jan-26 09:00	52	45	59	12	62	10	20	20	79	67	65	87	578
22-Jan-26 10:00	53	45	58	11	62	10	20	20	78	68	65	87	577
22-Jan-26 11:00	52	44	59	12	62	10	20	20	77	67	64	90	578
22-Jan-26 12:00	52	45	59	12	63	10	19	19	77	67	64	87	575
22-Jan-26 13:00	57	44	59	12	61	9	20	20	78	68	65	90	583
22-Jan-26 14:00	53	44	59	12	61	9	20	20	81	68	65	88	580
22-Jan-26 15:00	52	43	58	12	60	9	20	20	83	69	65	91	582
22-Jan-26 16:00	52	44	59	12	60	9	20	20	79	68	66	89	579
22-Jan-26 17:00	52	45	59	12	61	9	20	19	79	68	65	88	577
22-Jan-26 18:00	53	47	61	13	63	10	20	20	81	68	65	90	590
22-Jan-26 19:00	53	47	60	12	62	10	20	20	84	68	65	87	587
22-Jan-26 20:00	52	47	59	12	62	10	20	20	83	64	67	92	588
22-Jan-26 21:00	52	47	59	12	62	10	20	20	82	67	64	88	584
22-Jan-26 22:00	52	46	60	13	59	10	19	18	89	91	18	98	573
22-Jan-26 23:00	53	48	60	12	0	0	19	20	83	82	68	86	530

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
23-Jan-26 00:00	54	48	61	13	0	0	19	20	80	69	67	85	517
23-Jan-26 01:00	54	48	61	13	0	0	20	20	83	70	67	93	530
23-Jan-26 02:00	55	48	61	13	0	0	19	19	82	70	67	92	526
23-Jan-26 03:00	54	48	61	13	0	0	20	20	84	70	67	93	528
23-Jan-26 04:00	54	47	60	13	0	0	20	20	83	70	67	93	527
23-Jan-26 05:00	54	48	60	13	0	0	20	20	80	68	67	92	522
23-Jan-26 06:00	54	48	60	13	0	0	20	20	80	68	67	91	520
23-Jan-26 07:00	54	48	60	13	0	0	20	20	80	68	67	90	519
23-Jan-26 08:00	54	48	60	13	0	0	20	21	79	69	68	90	522
23-Jan-26 09:00	54	48	61	13	0	0	20	20	78	70	68	90	522
23-Jan-26 10:00	54	47	61	13	0	0	20	20	81	69	67	91	525
23-Jan-26 11:00	54	47	62	14	0	0	20	20	77	70	67	88	519
23-Jan-26 12:00	53	50	62	13	0	0	20	20	76	70	68	91	523
23-Jan-26 13:00	53	49	61	13	0	0	20	20	78	70	68	90	521
23-Jan-26 14:00	54	47	62	13	0	0	20	20	77	69	67	90	520
23-Jan-26 15:00	54	47	61	13	0	0	20	20	79	70	68	91	523
23-Jan-26 16:00	54	47	62	13	0	0	19	19	78	69	67	91	520
23-Jan-26 17:00	54	46	60	13	0	0	20	20	81	70	68	88	519
23-Jan-26 18:00	54	47	61	13	0	0	21	20	82	71	68	88	524
23-Jan-26 19:00	55	47	61	13	0	0	20	20	79	69	67	93	523
23-Jan-26 20:00	54	47	61	13	0	0	20	20	79	69	67	93	522
23-Jan-26 21:00	54	47	60	13	0	0	20	20	80	69	67	89	519
23-Jan-26 22:00	54	47	61	13	0	0	20	20	84	68	67	97	530
23-Jan-26 23:00	54	47	60	13	0	0	20	20	82	68	67	93	524
24-Jan-26 00:00	54	47	60	13	0	0	19	20	81	69	67	94	524
24-Jan-26 01:00	54	47	60	13	0	0	19	20	85	68	66	97	528
24-Jan-26 02:00	54	47	60	13	0	0	20	20	84	68	66	95	527
24-Jan-26 03:00	54	47	60	13	0	0	20	20	80	69	67	93	523
24-Jan-26 04:00	53	47	60	13	0	0	19	19	81	68	66	95	522
24-Jan-26 05:00	53	46	60	13	0	0	20	20	82	68	66	95	523
24-Jan-26 06:00	53	46	59	13	0	0	20	20	80	68	67	93	521
24-Jan-26 07:00	54	47	60	13	0	0	19	20	78	67	66	94	518
24-Jan-26 08:00	54	47	59	13	0	0	20	20	78	68	67	93	517
24-Jan-26 09:00	54	47	61	13	0	0	20	20	80	68	67	93	522
24-Jan-26 10:00	54	47	60	13	0	0	20	20	78	69	67	91	518
24-Jan-26 11:00	54	47	61	13	0	0	19	19	76	69	67	90	516
24-Jan-26 12:00	54	47	61	13	0	0	19	20	79	70	68	92	522
24-Jan-26 13:00	53	46	61	13	0	0	19	20	83	69	67	95	525
24-Jan-26 14:00	53	46	60	13	0	0	20	20	82	70	68	94	527
24-Jan-26 15:00	53	45	60	13	0	0	19	19	81	69	66	93	519
24-Jan-26 16:00	53	45	60	13	0	0	19	20	80	69	67	93	521
24-Jan-26 17:00	53	45	60	13	0	0	20	0	84	69	66	96	505
24-Jan-26 18:00	53	45	61	13	0	0	20	0	85	70	67	96	510
24-Jan-26 19:00	53	45	60	13	0	0	20	0	87	69	66	98	512

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
24-Jan-26 20:00	53	46	60	13	0	0	20	0	91	69	66	101	518
24-Jan-26 21:00	54	43	60	13	0	0	20	0	79	69	80	91	510
24-Jan-26 22:00	52	44	60	13	0	0	20	0	81	69	81	94	514
24-Jan-26 23:00	52	44	59	13	0	0	20	0	80	68	80	94	511
25-Jan-26 00:00	52	44	60	13	0	0	20	0	79	69	81	93	510
25-Jan-26 01:00	51	44	59	13	0	0	19	0	86	68	79	98	518
25-Jan-26 02:00	52	44	59	13	0	0	20	0	84	68	80	96	516
25-Jan-26 03:00	52	44	60	13	0	0	22	0	84	85	66	96	522
25-Jan-26 04:00	52	44	60	13	0	0	21	0	84	87	66	96	524
25-Jan-26 05:00	52	44	59	13	0	0	21	0	83	86	67	95	520
25-Jan-26 06:00	52	43	60	13	0	0	22	0	80	83	67	93	513
25-Jan-26 07:00	52	44	60	13	0	0	22	0	84	87	66	97	524
25-Jan-26 08:00	52	44	60	13	0	0	22	0	82	85	66	95	518
25-Jan-26 09:00	52	45	60	13	0	0	23	0	83	85	67	95	523
25-Jan-26 10:00	52	45	61	13	0	0	26	0	83	92	65	99	536
25-Jan-26 11:00	51	43	55	9	59	8	34	0	78	88	42	90	556
25-Jan-26 12:00	57	46	59	12	60	9	25	0	78	83	0	92	519
25-Jan-26 13:00	57	45	59	12	60	8	22	0	83	83	0	94	524
25-Jan-26 14:00	53	46	59	12	60	9	23	0	79	82	0	92	514
25-Jan-26 15:00	54	46	58	12	59	9	22	0	80	83	0	93	516
25-Jan-26 16:00	54	45	58	12	59	9	22	0	81	82	0	91	514
25-Jan-26 17:00	53	45	59	12	60	9	23	0	80	82	0	91	513
25-Jan-26 18:00	53	46	59	12	60	9	23	0	82	85	0	95	522
25-Jan-26 19:00	53	46	59	12	60	9	23	0	83	83	0	94	520
25-Jan-26 20:00	53	46	58	12	59	9	23	0	82	84	0	95	521
25-Jan-26 21:00	53	40	58	12	60	9	23	0	85	87	0	96	522
25-Jan-26 22:00	53	45	59	12	59	8	22	0	84	87	0	96	526
25-Jan-26 23:00	53	46	58	12	59	9	22	0	82	84	0	94	519
26-Jan-26 00:00	53	46	59	12	59	9	24	0	82	84	0	95	522
26-Jan-26 01:00	53	46	59	12	59	9	23	0	83	85	0	95	523
26-Jan-26 02:00	53	45	59	12	60	9	23	0	82	85	0	94	521
26-Jan-26 03:00	53	46	59	12	59	9	23	0	82	84	0	95	520
26-Jan-26 04:00	53	45	59	12	60	9	23	0	83	86	0	95	524
26-Jan-26 05:00	55	46	58	11	59	8	23	0	82	84	0	94	520
26-Jan-26 06:00	55	46	59	12	59	9	23	0	81	83	0	94	521
26-Jan-26 07:00	55	45	57	11	59	8	23	0	81	82	0	93	515
26-Jan-26 08:00	56	45	58	11	59	8	23	0	81	82	0	88	511
26-Jan-26 09:00	56	45	56	11	58	8	23	0	83	82	0	86	508
26-Jan-26 10:00	56	45	57	11	59	8	22	0	79	82	0	86	506
26-Jan-26 11:00	53	47	58	11	59	8	23	0	78	83	0	92	512
26-Jan-26 12:00	52	46	56	10	58	8	23	0	80	84	0	87	506
26-Jan-26 13:00	52	49	56	10	58	8	22	0	81	70	0	92	499
26-Jan-26 14:00	52	44	62	14	58	8	23	0	86	70	0	97	513
26-Jan-26 15:00	53	46	57	11	58	8	23	0	81	70	0	91	498

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
26-Jan-26 16:00	52	47	57	11	59	8	22	0	90	69	0	100	513
26-Jan-26 17:00	53	48	56	10	58	8	23	0	81	69	0	94	500
26-Jan-26 18:00	53	47	57	10	58	8	23	0	79	70	0	92	498
26-Jan-26 19:00	53	48	56	10	58	8	24	0	80	70	0	93	499
26-Jan-26 20:00	51	48	56	10	58	8	22	0	77	69	0	87	487
26-Jan-26 21:00	52	48	56	10	58	8	23	0	79	68	0	87	489
26-Jan-26 22:00	52	48	57	10	58	8	22	0	78	69	0	87	489
26-Jan-26 23:00	52	48	56	10	58	8	23	0	78	68	0	80	482
27-Jan-26 00:00	52	48	56	10	58	8	23	0	79	68	0	92	494
27-Jan-26 01:00	48	44	57	11	58	8	23	0	86	68	0	98	499
27-Jan-26 02:00	49	44	56	10	57	8	23	0	89	69	0	100	504
27-Jan-26 03:00	49	45	56	10	57	8	23	0	90	69	0	101	509
27-Jan-26 04:00	48	44	56	11	58	8	23	0	88	69	0	99	503
27-Jan-26 05:00	47	44	55	10	57	8	23	0	77	86	0	91	499
27-Jan-26 06:00	46	44	56	10	57	7	22	0	77	86	0	91	497
27-Jan-26 07:00	49	43	56	10	57	7	23	0	80	89	0	94	509
27-Jan-26 08:00	49	44	56	10	57	7	22	0	79	88	0	92	504
27-Jan-26 09:00	48	45	57	10	57	7	22	0	79	88	0	92	505
27-Jan-26 10:00	46	44	56	10	57	8	23	0	79	89	0	93	506
27-Jan-26 11:00	46	45	56	10	58	7	23	0	77	84	0	90	496
27-Jan-26 12:00	45	43	55	10	57	7	23	0	80	90	0	93	503
27-Jan-26 13:00	45	43	55	9	57	7	23	0	78	85	0	91	493
27-Jan-26 14:00	46	43	56	10	57	7	23	0	79	87	0	92	499
27-Jan-26 15:00	48	43	55	10	57	7	23	0	78	87	0	92	499
27-Jan-26 16:00	47	42	56	10	58	7	22	0	78	87	0	92	498
27-Jan-26 17:00	46	42	55	10	57	7	22	0	75	85	0	89	490
27-Jan-26 18:00	45	42	55	10	57	7	23	0	77	86	0	91	492
27-Jan-26 19:00	45	42	56	10	57	7	23	0	77	86	0	90	494
27-Jan-26 20:00	44	42	55	10	57	7	24	0	77	86	0	91	493
27-Jan-26 21:00	46	42	55	10	57	7	24	0	74	83	0	92	489
27-Jan-26 22:00	46	42	56	10	57	7	26	0	66	83	0	93	485
27-Jan-26 23:00	46	42	55	10	57	7	24	0	70	84	0	87	481
28-Jan-26 00:00	45	42	55	9	57	7	25	0	69	83	0	94	487
28-Jan-26 01:00	46	42	55	10	57	7	26	0	69	83	0	95	490
28-Jan-26 02:00	44	42	56	10	57	7	25	0	81	85	0	86	493
28-Jan-26 03:00	44	42	56	9	57	7	25	0	82	84	0	86	491
28-Jan-26 04:00	42	42	55	10	57	7	25	0	84	87	0	87	497
28-Jan-26 05:00	46	42	55	10	57	7	25	0	75	83	0	86	487
28-Jan-26 06:00	46	42	55	10	57	7	24	0	78	82	0	86	489
28-Jan-26 07:00	48	42	55	10	56	7	24	0	77	82	0	86	487
28-Jan-26 08:00	47	42	55	10	57	7	24	0	70	81	0	86	480
28-Jan-26 09:00	46	43	56	10	57	7	22	0	73	83	0	86	483
28-Jan-26 10:00	46	42	55	10	57	7	22	0	69	69	0	86	464
28-Jan-26 11:00	45	44	55	10	57	8	22	0	68	70	0	87	466

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
28-Jan-26 12:00	44	43	55	10	58	7	23	0	66	70	0	88	463
28-Jan-26 13:00	44	43	55	10	57	7	23	0	67	71	0	87	463
28-Jan-26 14:00	46	43	55	10	57	7	22	0	70	69	0	91	471
28-Jan-26 15:00	47	43	55	10	57	7	22	0	72	70	0	90	472
28-Jan-26 16:00	47	43	55	10	57	7	22	0	77	69	0	95	481
28-Jan-26 17:00	49	42	54	10	57	7	23	0	76	70	0	87	475
28-Jan-26 18:00	46	42	55	10	57	7	22	0	79	70	0	95	483
28-Jan-26 19:00	47	42	56	10	57	7	22	0	81	70	0	98	491
28-Jan-26 20:00	46	42	55	10	57	7	23	0	73	70	0	92	475
28-Jan-26 21:00	49	41	55	10	57	7	21	0	73	66	0	83	462
28-Jan-26 22:00	46	42	55	10	57	7	20	0	74	68	0	88	469
28-Jan-26 23:00	47	41	55	9	57	7	21	0	80	68	0	92	479
29-Jan-26 00:00	48	42	55	10	57	8	21	0	78	68	0	90	476
29-Jan-26 01:00	48	42	55	10	57	7	21	0	77	68	0	91	475
29-Jan-26 02:00	48	41	55	9	57	7	21	0	76	67	0	89	470
29-Jan-26 03:00	48	42	55	10	57	7	21	0	75	68	0	89	471
29-Jan-26 04:00	47	42	55	10	57	8	21	0	72	68	0	87	467
29-Jan-26 05:00	48	42	55	10	57	7	21	0	73	68	0	88	468
29-Jan-26 06:00	50	41	55	9	57	7	21	0	80	68	0	91	481
29-Jan-26 07:00	50	41	55	10	57	7	21	0	75	69	0	89	473
29-Jan-26 08:00	50	42	55	10	57	7	21	0	76	68	0	82	468
29-Jan-26 09:00	52	42	55	10	57	7	21	0	78	70	0	91	483
29-Jan-26 10:00	50	42	56	10	57	7	21	0	75	69	0	81	468
29-Jan-26 11:00	49	43	56	10	57	7	20	0	72	69	0	81	466
29-Jan-26 12:00	48	42	55	10	57	7	21	0	73	69	0	92	474
29-Jan-26 13:00	47	42	55	9	57	7	21	0	76	69	0	94	478
29-Jan-26 14:00	49	42	56	10	57	7	21	0	75	70	0	91	477
29-Jan-26 15:00	48	49	55	10	57	7	21	0	73	70	0	87	477
29-Jan-26 16:00	45	42	63	14	57	8	21	0	74	71	0	94	488
29-Jan-26 17:00	50	42	57	12	57	7	21	0	76	69	0	86	478
29-Jan-26 18:00	51	44	56	10	57	7	22	0	78	71	0	87	483
29-Jan-26 19:00	52	44	56	10	57	7	22	0	79	70	0	90	488
29-Jan-26 20:00	53	46	56	10	57	7	21	0	79	69	0	90	487
29-Jan-26 21:00	53	44	56	10	57	8	22	0	80	71	0	90	491
29-Jan-26 22:00	53	45	57	10	57	8	21	0	78	70	0	88	486
29-Jan-26 23:00	53	44	56	10	57	7	22	0	79	71	0	91	491
30-Jan-26 00:00	53	44	56	10	57	7	22	0	79	70	0	91	488
30-Jan-26 01:00	53	44	57	10	57	7	22	0	79	70	0	93	492
30-Jan-26 02:00	53	45	56	10	58	7	21	0	78	69	0	88	486
30-Jan-26 03:00	53	45	56	10	57	8	21	0	78	70	0	90	487
30-Jan-26 04:00	53	44	56	10	57	7	21	0	79	70	0	92	488
30-Jan-26 05:00	54	44	56	10	57	8	21	0	80	70	0	95	496
30-Jan-26 06:00	53	44	56	10	57	7	22	0	79	70	0	96	494
30-Jan-26 07:00	53	45	56	10	57	7	21	0	78	69	0	94	491

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
30-Jan-26 08:00	52	44	56	10	57	7	24	0	79	71	0	87	488
30-Jan-26 09:00	52	45	57	10	58	7	23	0	79	70	0	94	495
30-Jan-26 10:00	54	45	57	10	57	8	22	0	78	69	0	96	496
30-Jan-26 11:00	54	45	56	10	57	8	23	0	80	70	0	92	494
30-Jan-26 12:00	52	44	56	10	57	7	24	0	79	70	0	93	492
30-Jan-26 13:00	48	44	57	10	65	10	23	0	73	70	0	89	489
30-Jan-26 14:00	52	44	56	10	58	8	23	0	79	69	0	88	487
30-Jan-26 15:00	53	46	56	10	57	7	23	0	87	70	0	87	497
30-Jan-26 16:00	53	44	56	10	57	8	23	0	87	70	0	87	494
30-Jan-26 17:00	54	44	56	10	57	7	23	0	80	71	0	93	494
30-Jan-26 18:00	53	44	56	10	57	7	23	0	80	70	0	92	491
30-Jan-26 19:00	54	44	56	10	57	8	23	0	81	70	0	91	494
30-Jan-26 20:00	54	45	56	10	57	8	23	0	79	70	0	90	491
30-Jan-26 21:00	53	46	56	10	57	8	23	0	80	70	0	90	493
30-Jan-26 22:00	53	45	57	10	58	8	24	0	80	70	0	87	491
30-Jan-26 23:00	52	45	57	10	58	8	23	0	80	71	0	87	489
31-Jan-26 00:00	52	45	56	10	58	7	24	0	79	70	0	87	488
31-Jan-26 01:00	53	47	57	10	58	8	23	0	80	71	0	88	495
31-Jan-26 02:00	53	46	56	10	58	8	23	0	78	70	0	84	486
31-Jan-26 03:00	52	46	57	10	58	8	23	0	79	70	0	87	489
31-Jan-26 04:00	53	47	57	10	58	8	23	0	79	70	0	82	486
31-Jan-26 05:00	53	46	56	10	58	8	23	0	80	71	0	84	490
31-Jan-26 06:00	53	45	56	10	57	8	23	0	78	69	0	89	488
31-Jan-26 07:00	52	45	56	10	57	7	23	0	78	69	0	84	483
31-Jan-26 08:00	52	46	57	10	58	8	23	0	77	69	0	84	483
31-Jan-26 09:00	53	47	57	10	58	8	23	0	78	70	0	87	491
31-Jan-26 10:00	53	46	57	10	58	8	22	0	79	70	0	86	489
31-Jan-26 11:00	52	45	57	10	57	8	23	0	78	70	0	87	487
31-Jan-26 12:00	52	46	56	10	58	7	24	0	80	71	0	87	491
31-Jan-26 13:00	52	45	57	10	59	8	23	0	85	70	0	81	490
31-Jan-26 14:00	57	46	57	10	58	8	24	0	75	71	0	83	488
31-Jan-26 15:00	53	44	56	10	58	8	23	0	79	70	0	86	488
31-Jan-26 16:00	53	45	57	10	58	7	23	0	79	70	0	86	488
31-Jan-26 17:00	53	44	56	10	57	8	23	0	80	70	0	87	489
31-Jan-26 18:00	54	46	57	10	58	8	23	0	81	70	0	87	495
31-Jan-26 19:00	54	47	56	10	58	8	23	0	80	70	0	85	492
31-Jan-26 20:00	53	48	57	11	58	8	23	0	80	70	0	81	489
31-Jan-26 21:00	53	47	57	11	58	8	23	0	80	70	0	86	492
31-Jan-26 22:00	53	46	57	10	58	7	23	0	79	69	0	86	489
31-Jan-26 23:00	52	46	56	10	58	8	23	0	80	70	0	83	486
01-Feb-26 00:00	52	46	57	10	59	8	24	0	79	70	0	83	488
01-Feb-26 01:00	52	46	56	10	58	8	24	0	88	70	0	86	497
01-Feb-26 02:00	51	46	57	11	58	8	23	0	80	69	0	88	492
01-Feb-26 03:00	53	47	57	10	58	8	23	0	79	70	0	89	493

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
01-Feb-26 04:00	53	47	56	10	57	8	23	0	79	70	0	88	491
01-Feb-26 05:00	52	46	57	10	58	7	23	0	79	71	0	91	494
01-Feb-26 06:00	52	47	56	10	58	7	23	0	79	70	0	91	495
01-Feb-26 07:00	53	47	56	10	57	8	23	0	78	69	0	93	494
01-Feb-26 08:00	53	46	56	10	57	8	23	0	80	71	0	94	498
01-Feb-26 09:00	52	46	56	10	57	7	23	0	79	70	0	93	494
01-Feb-26 10:00	52	46	57	10	58	7	24	0	83	70	0	96	503
01-Feb-26 11:00	52	45	56	10	57	7	26	0	90	69	0	88	501
01-Feb-26 12:00	52	46	56	10	57	8	25	0	85	70	0	87	497
01-Feb-26 13:00	50	49	56	10	58	7	25	0	90	69	0	87	501
01-Feb-26 14:00	52	45	62	14	57	8	25	0	79	70	0	95	506
01-Feb-26 15:00	52	46	56	11	57	8	25	0	78	70	0	95	498
01-Feb-26 16:00	54	45	56	10	58	7	26	0	80	70	0	95	501
01-Feb-26 17:00	54	44	56	10	57	7	24	0	81	70	0	92	494
01-Feb-26 18:00	54	46	56	10	57	7	24	0	84	70	0	90	497
01-Feb-26 19:00	53	46	56	10	58	7	24	0	81	70	0	90	494
01-Feb-26 20:00	53	48	56	10	58	8	24	0	81	71	0	89	499
01-Feb-26 21:00	53	48	57	10	58	8	24	0	81	71	0	89	499
01-Feb-26 22:00	53	47	57	11	57	8	24	0	83	71	0	91	501
01-Feb-26 23:00	53	45	57	11	58	8	23	0	81	69	0	91	496
02-Feb-26 00:00	52	45	57	11	58	8	24	0	81	70	0	90	497
02-Feb-26 01:00	52	45	56	10	58	8	24	0	82	70	0	92	497
02-Feb-26 02:00	52	44	56	10	59	8	24	0	83	70	0	93	499
02-Feb-26 03:00	53	45	56	11	57	8	23	0	82	69	0	90	494
02-Feb-26 04:00	52	45	56	10	57	8	24	0	82	70	0	92	494
02-Feb-26 05:00	51	44	55	10	58	8	23	0	81	69	0	91	491
02-Feb-26 06:00	51	44	56	10	58	7	24	0	83	69	0	91	493
02-Feb-26 07:00	52	44	56	10	58	8	24	0	83	69	0	95	498
02-Feb-26 08:00	52	44	56	10	57	8	24	0	86	69	0	94	500
02-Feb-26 09:00	52	45	56	10	58	8	23	0	84	70	0	98	503
02-Feb-26 10:00	52	45	56	10	58	7	20	20	78	69	0	90	505
02-Feb-26 11:00	53	44	56	10	57	8	20	20	79	69	0	91	507
02-Feb-26 12:00	52	44	57	10	58	7	20	20	79	68	21	89	527
02-Feb-26 13:00	52	46	56	10	58	8	21	21	82	70	30	94	549
02-Feb-26 14:00	53	45	57	11	58	8	20	19	75	69	64	87	566
02-Feb-26 15:00	52	44	56	11	58	8	20	20	76	66	66	92	570
02-Feb-26 16:00	52	44	56	10	57	8	20	20	79	63	70	87	566
02-Feb-26 17:00	51	43	55	9	64	10	20	20	78	65	68	87	571
02-Feb-26 18:00	52	46	56	10	60	9	20	19	78	65	68	87	571
02-Feb-26 19:00	52	44	56	10	60	8	21	21	81	65	68	87	572
02-Feb-26 20:00	52	44	56	10	61	9	21	20	79	65	68	86	570
02-Feb-26 21:00	53	44	56	10	60	9	21	20	80	65	68	86	574
02-Feb-26 22:00	52	46	56	10	60	9	20	20	84	65	68	94	584
02-Feb-26 23:00	53	45	57	11	60	9	20	20	80	65	68	94	582

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
03-Feb-26 00:00	53	46	56	11	60	9	20	20	80	64	67	92	578
03-Feb-26 01:00	53	46	57	10	61	9	20	19	79	64	67	94	579
03-Feb-26 02:00	53	46	56	10	60	9	21	20	82	65	68	94	583
03-Feb-26 03:00	53	45	56	10	59	9	20	21	82	64	67	95	580
03-Feb-26 04:00	54	45	56	10	60	9	20	21	78	64	67	93	577
03-Feb-26 05:00	55	45	56	10	60	9	20	20	81	65	68	93	583
03-Feb-26 06:00	54	45	56	11	59	9	21	20	79	64	68	92	577
03-Feb-26 07:00	55	45	55	10	59	9	20	21	79	64	67	91	575
03-Feb-26 08:00	56	46	55	10	59	8	20	19	84	63	67	93	580
03-Feb-26 09:00	56	46	56	10	59	9	21	20	79	64	67	92	578
03-Feb-26 10:00	55	45	56	10	60	9	20	20	79	64	68	90	576
03-Feb-26 11:00	56	46	56	10	59	8	20	20	79	65	68	90	577
03-Feb-26 12:00	56	45	56	10	60	8	20	20	83	65	68	94	585
03-Feb-26 13:00	54	45	56	10	58	8	20	20	81	65	68	87	570
03-Feb-26 14:00	55	46	56	10	59	8	21	20	80	65	69	89	577
03-Feb-26 15:00	54	46	57	10	58	8	21	20	82	65	69	87	577
03-Feb-26 16:00	56	47	56	10	60	8	21	20	82	66	69	88	583
03-Feb-26 17:00	55	46	56	10	61	9	21	21	79	66	69	88	580
03-Feb-26 18:00	55	45	56	10	59	8	20	21	78	64	68	87	571
03-Feb-26 19:00	56	46	57	10	60	8	20	20	78	64	68	92	579
03-Feb-26 20:00	55	45	56	10	59	8	20	20	78	65	68	89	573
03-Feb-26 21:00	55	44	57	10	60	8	21	20	82	57	68	95	578
03-Feb-26 22:00	56	44	58	11	60	8	21	21	82	65	68	87	579
03-Feb-26 23:00	55	45	57	11	60	8	21	20	81	65	69	87	577
04-Feb-26 00:00	55	46	57	11	59	8	21	21	79	65	68	88	578
04-Feb-26 01:00	55	47	57	11	59	8	21	20	78	65	68	88	577
04-Feb-26 02:00	55	47	57	11	59	8	20	20	79	64	67	90	579
04-Feb-26 03:00	55	46	58	11	59	8	20	19	78	64	68	92	579
04-Feb-26 04:00	54	46	56	11	59	8	21	21	80	65	68	88	577
04-Feb-26 05:00	55	46	57	11	59	8	20	19	78	64	67	94	578
04-Feb-26 06:00	55	47	57	11	59	8	20	20	78	64	67	88	576
04-Feb-26 07:00	55	46	57	11	59	8	20	21	76	64	68	90	574
04-Feb-26 08:00	52	47	56	11	58	8	20	21	79	64	67	86	570
04-Feb-26 09:00	53	47	57	10	59	8	20	20	82	65	67	94	582
04-Feb-26 10:00	52	48	56	10	58	8	20	20	80	68	64	91	575
04-Feb-26 11:00	52	46	57	10	58	8	21	20	79	68	65	87	572
04-Feb-26 12:00	53	46	57	10	58	8	20	20	80	69	65	86	573
04-Feb-26 13:00	52	49	57	10	58	8	20	19	77	69	65	94	578
04-Feb-26 14:00	52	44	62	14	58	8	21	20	82	68	66	96	591
04-Feb-26 15:00	52	45	56	10	57	8	20	20	83	69	63	87	570
04-Feb-26 16:00	52	45	56	11	58	8	19	19	87	69	63	96	583
04-Feb-26 17:00	52	46	56	10	58	8	21	20	82	68	65	90	575
04-Feb-26 18:00	52	46	56	10	58	8	20	20	81	67	65	89	573
04-Feb-26 19:00	52	46	56	10	58	7	20	21	81	67	65	86	570

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
04-Feb-26 20:00	52	46	57	10	58	8	21	20	81	68	65	88	574
04-Feb-26 21:00	52	46	57	10	58	8	20	20	82	68	56	96	573
04-Feb-26 22:00	52	46	57	10	58	7	20	20	81	67	64	92	574
04-Feb-26 23:00	52	47	56	10	57	8	20	20	83	68	65	88	574
05-Feb-26 00:00	52	46	56	10	57	8	21	21	81	67	65	87	570
05-Feb-26 01:00	52	46	56	10	58	8	20	20	82	67	65	86	569
05-Feb-26 02:00	52	46	56	10	57	7	20	20	82	67	65	86	570
05-Feb-26 03:00	52	46	57	10	58	7	21	20	82	67	66	89	575
05-Feb-26 04:00	52	45	56	10	58	8	20	20	83	67	65	95	579
05-Feb-26 05:00	52	46	57	10	58	8	20	20	83	67	65	88	575
05-Feb-26 06:00	53	45	57	11	58	8	20	20	82	67	65	92	576
05-Feb-26 07:00	53	46	56	10	58	8	21	20	82	67	65	89	575
05-Feb-26 08:00	52	46	57	11	58	8	20	20	83	68	64	94	580
05-Feb-26 09:00	52	45	57	10	59	8	20	20	83	68	65	93	582
05-Feb-26 10:00	52	46	57	10	58	8	20	20	81	66	66	91	575
05-Feb-26 11:00	52	46	56	10	59	8	19	20	83	67	66	90	576
05-Feb-26 12:00	52	46	56	10	58	8	20	20	81	68	67	88	575
05-Feb-26 13:00	52	45	56	10	64	10	20	20	77	67	66	87	574
05-Feb-26 14:00	52	46	56	10	60	8	20	19	85	63	70	95	585
05-Feb-26 15:00	52	46	56	10	59	8	20	20	82	64	71	91	580
05-Feb-26 16:00	52	47	58	10	60	8	20	20	82	66	66	97	586
05-Feb-26 17:00	53	47	57	10	60	8	21	20	83	67	67	93	586
05-Feb-26 18:00	52	48	57	11	59	8	21	21	82	67	67	94	588
05-Feb-26 19:00	52	47	56	10	59	8	21	20	83	67	67	92	583
05-Feb-26 20:00	52	48	57	10	59	8	21	21	84	67	67	92	585
05-Feb-26 21:00	52	47	57	11	60	8	20	20	86	67	67	95	590
05-Feb-26 22:00	52	47	57	11	58	8	20	20	84	67	65	94	584
05-Feb-26 23:00	53	48	56	11	59	8	20	20	84	67	67	94	586
06-Feb-26 00:00	52	48	57	10	59	8	21	21	84	66	67	93	586
06-Feb-26 01:00	52	47	56	10	59	8	21	21	83	66	66	95	586
06-Feb-26 02:00	53	47	56	10	59	8	21	21	83	67	67	95	585
06-Feb-26 03:00	52	46	56	10	59	8	21	20	83	68	67	95	585
06-Feb-26 04:00	52	46	56	10	58	8	20	20	83	66	66	95	581
06-Feb-26 05:00	52	46	56	10	58	8	21	20	82	67	67	97	585
06-Feb-26 06:00	52	46	56	10	59	8	20	21	86	66	66	92	581
06-Feb-26 07:00	53	47	57	10	59	8	20	21	81	67	67	90	578
06-Feb-26 08:00	53	47	57	10	58	8	21	20	81	66	69	89	580
06-Feb-26 09:00	54	47	57	10	59	8	21	21	85	65	69	91	585
06-Feb-26 10:00	53	44	56	10	58	8	20	20	82	66	69	89	574
06-Feb-26 11:00	52	44	56	10	59	8	20	20	83	65	69	91	578
06-Feb-26 12:00	52	45	54	9	60	9	20	20	81	65	69	88	572
06-Feb-26 13:00	52	46	54	10	60	8	20	21	80	65	68	88	573
06-Feb-26 14:00	52	45	55	10	60	8	20	20	82	66	68	88	575
06-Feb-26 15:00	52	45	55	10	59	9	20	20	84	65	69	91	578

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
06-Feb-26 16:00	52	45	55	10	60	8	20	20	82	65	69	89	577
06-Feb-26 17:00	52	45	55	10	60	8	21	20	82	66	69	88	574
06-Feb-26 18:00	52	45	56	10	59	8	21	20	82	65	69	86	575
06-Feb-26 19:00	53	45	56	10	60	8	21	21	81	65	68	84	572
06-Feb-26 20:00	52	46	56	10	59	8	21	20	82	64	68	86	573
06-Feb-26 21:00	52	43	55	10	59	8	20	20	83	64	67	81	563
06-Feb-26 22:00	53	46	57	10	60	8	21	21	80	65	69	84	573
06-Feb-26 23:00	53	46	56	10	60	8	20	20	81	64	67	87	572
07-Feb-26 00:00	53	46	56	10	59	8	20	20	82	65	68	82	570
07-Feb-26 01:00	53	47	56	10	59	8	19	20	85	64	68	91	580
07-Feb-26 02:00	53	45	57	11	60	8	20	20	82	65	68	86	576
07-Feb-26 03:00	54	46	57	11	60	8	20	20	82	65	69	86	578
07-Feb-26 04:00	53	46	57	11	59	8	20	20	83	64	68	89	578
07-Feb-26 05:00	54	46	57	11	59	8	20	20	80	65	69	86	575
07-Feb-26 06:00	53	46	57	11	59	8	21	21	79	65	68	82	571
07-Feb-26 07:00	53	46	57	11	59	8	21	21	79	65	68	84	571
07-Feb-26 08:00	53	45	57	11	59	8	20	20	78	64	68	81	565
07-Feb-26 09:00	53	45	57	11	60	8	20	20	81	63	67	89	576
07-Feb-26 10:00	54	46	57	11	60	8	20	20	77	65	69	88	574
07-Feb-26 11:00	52	45	57	11	60	8	20	20	79	64	68	84	568
07-Feb-26 12:00	52	49	58	11	60	8	20	20	77	64	68	87	574
07-Feb-26 13:00	53	45	62	14	58	8	20	21	71	65	69	83	567
07-Feb-26 14:00	53	45	62	13	58	8	20	20	75	65	69	89	577
07-Feb-26 15:00	52	44	56	10	60	8	21	20	81	68	65	87	572
07-Feb-26 16:00	53	46	56	10	60	8	20	20	80	65	69	90	577
07-Feb-26 17:00	53	45	56	10	60	8	20	20	80	64	67	91	574
07-Feb-26 18:00	53	46	57	10	60	8	20	20	81	65	69	93	581
07-Feb-26 19:00	52	45	57	11	59	9	20	20	81	64	67	86	572
07-Feb-26 20:00	53	47	56	10	60	9	20	20	79	65	68	92	578
07-Feb-26 21:00	52	46	57	10	60	8	21	20	79	64	73	92	583
07-Feb-26 22:00	53	46	57	10	60	8	20	20	80	65	69	87	574
07-Feb-26 23:00	53	46	57	10	60	8	21	21	81	66	69	88	580
08-Feb-26 00:00	52	46	56	10	60	8	21	20	80	65	68	86	574
08-Feb-26 01:00	53	46	57	10	59	8	20	21	78	65	69	87	573
08-Feb-26 02:00	52	45	57	10	60	8	21	21	80	65	69	87	575
08-Feb-26 03:00	53	46	56	10	59	8	20	20	79	64	68	89	574
08-Feb-26 04:00	52	45	56	10	59	8	21	20	79	65	68	90	574
08-Feb-26 05:00	52	45	56	10	60	8	21	20	79	65	69	87	572
08-Feb-26 06:00	53	46	57	10	60	8	20	21	78	64	68	87	571
08-Feb-26 07:00	53	46	57	10	60	8	20	20	76	64	68	88	573
08-Feb-26 08:00	53	47	57	10	59	8	20	20	76	65	68	87	571
08-Feb-26 09:00	52	45	56	11	60	9	20	20	74	65	68	89	569
08-Feb-26 10:00	53	44	57	10	60	9	21	20	76	65	68	93	576
08-Feb-26 11:00	53	45	57	10	60	9	20	19	77	66	69	91	576

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
08-Feb-26 12:00	53	44	56	10	62	9	20	20	76	66	69	92	578
08-Feb-26 13:00	53	45	56	10	64	11	20	20	76	66	69	90	581
08-Feb-26 14:00	53	45	56	10	60	8	21	20	79	64	71	87	573
08-Feb-26 15:00	53	44	56	10	60	8	20	20	80	64	71	87	573
08-Feb-26 16:00	53	45	56	10	60	8	20	19	78	65	68	90	572
08-Feb-26 17:00	72	55	64	14	0	0	0	40	103	0	0	120	468
08-Feb-26 18:00	71	54	59	12	0	0	0	24	82	36	71	88	498
08-Feb-26 19:00	70	55	61	13	34	7	0	20	81	53	71	97	563
08-Feb-26 20:00	62	53	61	13	40	7	0	31	75	50	84	90	567
08-Feb-26 21:00	50	44	56	10	56	7	0	23	66	50	70	86	519
08-Feb-26 22:00	52	45	56	10	56	8	0	28	66	49	71	89	528
08-Feb-26 23:00	50	42	56	10	56	8	0	29	67	50	72	85	525
09-Feb-26 00:00	50	41	55	9	56	7	0	32	65	70	68	89	542
09-Feb-26 01:00	50	42	56	10	55	7	0	22	64	65	70	86	526
09-Feb-26 02:00	50	42	56	10	56	7	0	21	66	46	70	89	512
09-Feb-26 03:00	51	42	56	10	56	7	0	20	65	46	70	88	511
09-Feb-26 04:00	51	42	56	10	56	7	0	20	63	47	71	85	508
09-Feb-26 05:00	50	42	56	10	56	7	0	21	61	45	70	87	508
09-Feb-26 06:00	51	42	56	10	56	8	0	23	65	49	72	82	513
09-Feb-26 07:00	51	42	56	10	56	7	0	21	61	46	70	87	508
09-Feb-26 08:00	50	42	56	10	56	7	0	23	64	48	71	81	510
09-Feb-26 09:00	51	42	56	10	57	7	0	22	66	46	70	83	510
09-Feb-26 10:00	51	41	56	10	56	7	0	22	69	44	72	86	514
09-Feb-26 11:00	51	41	56	10	57	7	0	22	65	57	71	83	519
09-Feb-26 12:00	51	42	56	10	56	7	0	23	61	59	71	81	518
09-Feb-26 13:00	52	42	56	10	56	7	0	21	63	60	72	82	520
09-Feb-26 14:00	51	41	56	10	56	8	0	20	63	56	69	80	510
09-Feb-26 15:00	51	42	56	10	57	7	0	20	71	54	71	82	520
09-Feb-26 16:00	51	42	56	10	56	7	0	21	62	63	70	81	520
09-Feb-26 17:00	51	41	56	10	56	7	0	21	64	64	71	86	526
09-Feb-26 18:00	51	41	56	10	56	7	0	21	64	65	71	80	523
09-Feb-26 19:00	51	41	56	10	56	7	0	23	64	68	72	81	529
09-Feb-26 20:00	51	41	56	10	57	7	0	21	70	65	71	80	527
09-Feb-26 21:00	50	40	56	10	56	7	0	20	68	67	71	80	527
09-Feb-26 22:00	50	41	56	10	56	7	0	21	65	68	71	88	533
09-Feb-26 23:00	50	41	56	10	56	7	0	21	65	64	71	85	525
10-Feb-26 00:00	50	41	56	10	56	7	0	21	65	63	70	84	523
10-Feb-26 01:00	49	42	56	10	56	7	0	21	62	63	71	85	522
10-Feb-26 02:00	49	42	56	10	56	7	0	21	63	59	71	81	515
10-Feb-26 03:00	50	43	56	10	56	7	0	22	63	61	72	82	520
10-Feb-26 04:00	49	43	55	10	56	7	0	22	63	60	71	82	517
10-Feb-26 05:00	49	43	56	10	55	8	0	22	59	60	72	84	517
10-Feb-26 06:00	49	43	57	10	56	7	0	21	60	63	71	82	519
10-Feb-26 07:00	49	43	56	10	57	8	0	21	60	59	71	81	513

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
10-Feb-26 08:00	49	43	56	10	56	7	0	22	61	60	72	82	518
10-Feb-26 09:00	49	43	56	10	56	8	0	21	60	64	71	85	522
10-Feb-26 10:00	50	44	56	10	56	7	0	21	60	55	71	85	516
10-Feb-26 11:00	54	0	57	10	56	7	0	24	71	70	71	85	506
10-Feb-26 12:00	53	0	56	9	56	7	0	24	71	73	71	87	509
10-Feb-26 13:00	53	0	62	12	56	7	0	23	66	79	70	91	520
10-Feb-26 14:00	52	0	62	13	57	7	0	23	68	79	71	90	524
10-Feb-26 15:00	53	0	56	10	56	8	0	25	72	82	71	91	524
10-Feb-26 16:00	53	0	56	10	56	7	0	24	73	77	70	89	517
10-Feb-26 17:00	52	0	56	10	57	7	0	24	75	80	71	90	523
10-Feb-26 18:00	52	0	57	10	56	7	0	23	74	80	70	89	519
10-Feb-26 19:00	53	0	56	10	57	8	0	24	72	77	70	88	515
10-Feb-26 20:00	53	0	56	10	56	7	0	24	70	83	62	92	513
10-Feb-26 21:00	53	0	56	10	56	7	0	25	68	78	71	89	512
10-Feb-26 22:00	52	0	57	10	57	7	0	24	61	77	70	85	501
10-Feb-26 23:00	53	0	57	10	56	7	0	26	65	79	71	89	512
11-Feb-26 00:00	52	0	57	10	56	7	0	25	63	78	71	87	507
11-Feb-26 01:00	52	0	56	10	56	7	0	24	61	80	72	90	508
11-Feb-26 02:00	53	0	57	10	56	7	0	24	66	77	72	87	510
11-Feb-26 03:00	52	0	56	10	55	7	0	24	67	78	72	88	509
11-Feb-26 04:00	52	0	56	10	56	7	0	24	65	78	71	89	510
11-Feb-26 05:00	52	0	56	10	56	7	0	25	58	80	72	93	510
11-Feb-26 06:00	52	0	56	10	56	7	0	24	70	76	71	86	510
11-Feb-26 07:00	53	0	56	10	56	7	0	24	73	73	71	86	509
11-Feb-26 08:00	53	0	56	10	57	7	0	24	65	75	72	87	506
11-Feb-26 09:00	52	0	56	10	57	7	0	24	66	73	71	87	504
11-Feb-26 10:00	53	0	56	10	57	7	16	24	69	75	71	89	527
11-Feb-26 11:00	52	0	57	10	57	7	21	25	78	54	71	96	528
11-Feb-26 12:00	53	0	57	10	57	7	19	20	71	53	70	92	509
11-Feb-26 13:00	53	0	56	10	56	7	20	21	73	50	71	93	510
11-Feb-26 14:00	53	0	56	10	56	7	20	20	72	49	71	94	508
11-Feb-26 15:00	52	0	56	10	56	7	20	20	77	49	71	92	510
11-Feb-26 16:00	53	0	56	10	63	10	20	21	70	49	71	89	512
11-Feb-26 17:00	53	0	56	10	56	7	20	21	77	49	71	90	508
11-Feb-26 18:00	52	0	56	10	56	7	19	20	77	49	70	92	509
11-Feb-26 19:00	52	0	56	10	56	7	19	19	82	49	70	98	517
11-Feb-26 20:00	52	0	56	10	57	7	20	20	79	49	71	90	511
11-Feb-26 21:00	52	0	56	10	56	7	20	21	79	49	71	87	507
11-Feb-26 22:00	52	0	56	10	57	7	19	20	81	48	70	98	517
11-Feb-26 23:00	52	0	56	10	56	7	21	21	79	51	72	88	513
12-Feb-26 00:00	53	0	56	10	57	7	20	20	78	49	71	95	516
12-Feb-26 01:00	53	0	56	10	56	7	20	20	79	49	71	95	517
12-Feb-26 02:00	52	0	56	10	56	7	20	20	78	50	71	93	514
12-Feb-26 03:00	53	0	56	10	56	7	20	20	78	49	71	98	518

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
12-Feb-26 04:00	52	0	56	10	56	7	20	21	79	49	71	96	517
12-Feb-26 05:00	53	0	56	10	56	7	20	20	78	49	71	96	515
12-Feb-26 06:00	53	0	56	10	56	7	20	20	80	48	71	98	518
12-Feb-26 07:00	52	0	56	10	56	7	20	21	79	48	71	96	517
12-Feb-26 08:00	52	0	56	10	56	7	20	21	79	48	71	97	516
12-Feb-26 09:00	52	0	56	10	56	7	20	20	79	49	72	92	513
12-Feb-26 10:00	53	0	56	10	56	7	20	20	78	50	71	94	514
12-Feb-26 11:00	52	0	56	10	56	7	19	20	78	49	71	89	508
12-Feb-26 12:00	57	0	57	10	56	7	19	20	74	49	70	96	515
12-Feb-26 13:00	52	0	55	10	57	7	20	20	79	50	71	93	513
12-Feb-26 14:00	53	0	56	10	56	7	20	20	77	50	71	94	514
12-Feb-26 15:00	53	0	56	10	55	7	20	21	77	50	71	93	514
12-Feb-26 16:00	52	0	56	10	56	7	21	21	75	50	71	93	512
12-Feb-26 17:00	52	0	56	10	57	7	20	21	77	50	71	87	507
12-Feb-26 18:00	52	0	57	10	57	7	19	19	74	48	70	89	503
12-Feb-26 19:00	56	0	56	10	56	7	20	19	80	47	69	97	518
12-Feb-26 20:00	54	0	56	10	56	7	20	19	77	48	70	95	512
12-Feb-26 21:00	53	0	56	10	57	7	21	21	77	49	71	96	517
12-Feb-26 22:00	52	0	56	10	56	7	21	21	78	49	71	91	512
12-Feb-26 23:00	52	0	55	10	57	7	21	20	79	49	72	87	509
13-Feb-26 00:00	52	0	56	10	56	7	21	20	79	50	71	92	514
13-Feb-26 01:00	52	0	56	10	56	7	20	20	80	49	71	93	514
13-Feb-26 02:00	52	0	56	10	56	7	22	21	81	50	73	89	516
13-Feb-26 03:00	52	0	56	10	56	7	21	21	79	49	71	89	510
13-Feb-26 04:00	52	0	55	10	56	7	21	21	80	51	72	88	514
13-Feb-26 05:00	52	0	56	10	56	7	21	20	78	48	71	88	508
13-Feb-26 06:00	52	0	56	10	56	7	20	20	77	48	71	91	509
13-Feb-26 07:00	52	0	56	10	57	7	20	19	81	48	70	97	517
13-Feb-26 08:00	52	0	56	10	56	7	20	20	73	52	71	86	504
13-Feb-26 09:00	52	0	56	10	56	7	20	20	71	58	71	86	507
13-Feb-26 10:00	52	0	55	10	56	7	22	21	71	59	73	86	512
13-Feb-26 11:00	53	0	56	10	56	7	20	20	77	44	70	97	508
13-Feb-26 12:00	53	0	56	10	57	7	21	20	66	44	70	84	487
13-Feb-26 13:00	53	0	56	10	57	7	22	21	72	70	72	82	520
13-Feb-26 14:00	53	0	56	10	56	7	65	21	65	59	71	86	549
13-Feb-26 15:00	53	0	63	14	56	7	36	44	62	40	70	86	531
13-Feb-26 16:00	52	0	54	10	56	7	19	73	74	55	70	86	557
13-Feb-26 17:00	52	0	56	10	57	7	19	20	78	62	71	91	524
13-Feb-26 18:00	53	0	56	9	57	7	20	19	55	79	71	87	513
13-Feb-26 19:00	52	0	56	10	57	7	20	19	59	80	71	86	516
13-Feb-26 20:00	52	0	56	10	57	7	20	21	60	76	70	87	515
13-Feb-26 21:00	52	0	56	10	56	7	19	20	66	79	71	87	523
13-Feb-26 22:00	52	0	56	10	56	7	20	19	67	78	70	86	521
13-Feb-26 23:00	53	0	56	10	57	7	20	20	65	79	71	85	522

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
14-Feb-26 00:00	52	0	56	10	56	7	20	20	67	77	71	81	517
14-Feb-26 01:00	52	0	55	10	56	7	20	20	66	76	71	81	513
14-Feb-26 02:00	53	0	56	10	57	7	20	20	66	78	71	82	519
14-Feb-26 03:00	52	0	56	10	57	7	20	20	67	76	71	81	515
14-Feb-26 04:00	52	0	55	10	56	7	20	20	66	76	70	81	514
14-Feb-26 05:00	52	0	56	10	56	7	20	20	66	78	71	81	517
14-Feb-26 06:00	52	0	56	10	57	7	20	20	66	78	71	86	523
14-Feb-26 07:00	52	0	56	10	56	7	20	20	64	76	71	86	518
14-Feb-26 08:00	52	0	55	10	57	7	20	20	54	84	71	89	518
14-Feb-26 09:00	52	0	55	10	57	7	19	20	60	84	71	87	521
14-Feb-26 10:00	53	0	55	10	56	7	20	19	61	81	70	87	519
14-Feb-26 11:00	52	0	56	10	56	7	21	20	54	82	71	87	517
14-Feb-26 12:00	52	0	56	10	56	7	20	20	54	81	71	87	514
14-Feb-26 13:00	52	0	56	10	57	7	20	20	56	81	71	86	516
14-Feb-26 14:00	52	0	56	10	64	10	19	20	51	81	70	87	520
14-Feb-26 15:00	52	0	56	10	56	7	20	21	54	82	71	88	518
14-Feb-26 16:00	53	0	56	10	57	7	20	21	54	83	72	87	520
14-Feb-26 17:00	52	0	55	10	57	8	20	21	56	83	71	86	519
14-Feb-26 18:00	52	0	55	10	57	7	20	20	55	82	71	81	509
14-Feb-26 19:00	52	0	56	10	57	7	20	21	61	86	71	85	525
14-Feb-26 20:00	52	0	56	10	57	7	21	22	59	85	71	86	526
14-Feb-26 21:00	52	0	56	10	57	7	20	21	61	85	71	83	521
14-Feb-26 22:00	52	0	55	10	57	7	20	21	64	82	71	83	523
14-Feb-26 23:00	53	0	56	10	57	7	20	22	62	80	71	82	520
15-Feb-26 00:00	52	0	56	10	57	7	20	21	64	84	71	85	526
15-Feb-26 01:00	52	0	56	10	57	7	19	22	63	85	70	85	527
15-Feb-26 02:00	53	0	56	10	57	7	20	21	64	84	71	84	528
15-Feb-26 03:00	53	0	56	9	57	7	20	22	63	83	71	84	523
15-Feb-26 04:00	53	0	56	10	56	7	20	21	61	84	71	84	524
15-Feb-26 05:00	52	0	55	10	56	7	20	22	63	84	71	84	525
15-Feb-26 06:00	52	0	55	10	57	7	20	22	62	83	71	84	523
15-Feb-26 07:00	52	0	56	10	57	7	20	22	60	83	71	84	522
15-Feb-26 08:00	52	0	56	10	57	7	20	22	58	86	71	86	525
15-Feb-26 09:00	52	0	56	10	57	7	20	22	55	85	71	85	520
15-Feb-26 10:00	52	0	55	10	56	7	21	22	55	82	72	89	523
15-Feb-26 11:00	53	0	56	10	57	7	20	22	54	85	71	88	522
15-Feb-26 12:00	53	0	56	10	57	7	19	21	52	85	71	85	516
15-Feb-26 13:00	57	0	56	10	57	8	21	22	56	83	71	84	524
15-Feb-26 14:00	52	0	56	10	57	7	19	30	54	80	70	82	516
15-Feb-26 15:00	52	0	56	10	57	7	20	21	60	82	71	82	518
15-Feb-26 16:00	52	0	56	10	57	7	21	21	63	82	71	83	523
15-Feb-26 17:00	52	0	56	10	57	7	20	21	62	82	71	82	521
15-Feb-26 18:00	53	0	56	10	57	7	20	21	64	81	71	82	521
15-Feb-26 19:00	52	0	56	10	57	7	20	21	65	82	71	82	522

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
15-Feb-26 20:00	52	0	56	10	57	7	20	21	63	81	84	81	532
15-Feb-26 21:00	52	0	55	10	57	7	20	22	65	83	70	84	527
15-Feb-26 22:00	52	0	56	10	57	7	20	22	64	84	71	84	528
15-Feb-26 23:00	53	0	56	10	57	7	20	21	63	86	71	85	529
16-Feb-26 00:00	52	0	56	10	57	7	20	20	63	85	71	85	526
16-Feb-26 01:00	52	0	56	10	57	7	20	21	65	84	71	85	529
16-Feb-26 02:00	53	0	55	10	57	7	20	21	65	83	71	84	526
16-Feb-26 03:00	52	0	56	10	56	7	20	22	67	85	71	85	531
16-Feb-26 04:00	52	0	56	10	57	7	21	22	66	82	71	83	527
16-Feb-26 05:00	52	0	55	10	57	7	21	21	64	84	71	85	527
16-Feb-26 06:00	52	0	56	10	57	7	20	21	64	83	71	84	527
16-Feb-26 07:00	52	0	55	10	57	7	20	21	65	83	71	83	525
16-Feb-26 08:00	53	0	56	10	57	7	20	21	63	83	71	84	525
16-Feb-26 09:00	52	0	55	10	57	7	20	21	64	85	70	86	528
16-Feb-26 10:00	52	0	55	10	56	7	20	20	77	80	70	81	528
16-Feb-26 11:00	55	0	56	10	56	7	20	21	72	96	70	90	553
16-Feb-26 12:00	53	0	56	10	56	7	21	22	74	97	71	84	552
16-Feb-26 13:00	54	0	62	14	57	7	20	21	75	87	70	88	556
16-Feb-26 14:00	53	0	56	10	57	7	21	22	84	85	71	83	549
16-Feb-26 15:00	55	0	58	11	60	8	21	22	82	74	71	86	549
16-Feb-26 16:00	55	0	58	11	60	9	20	22	85	76	70	82	548
16-Feb-26 17:00	55	0	58	11	60	8	21	22	86	75	70	81	546
16-Feb-26 18:00	55	0	58	11	59	8	20	21	85	74	69	81	543
16-Feb-26 19:00	52	0	56	10	57	7	20	21	84	89	70	81	549
16-Feb-26 20:00	52	0	56	10	57	8	21	22	66	80	71	85	528
16-Feb-26 21:00	53	0	56	10	57	7	21	22	66	82	71	82	528
16-Feb-26 22:00	53	0	56	10	57	7	22	22	64	82	73	83	529
16-Feb-26 23:00	52	0	56	10	57	7	21	21	59	82	71	83	519
17-Feb-26 00:00	52	0	57	10	58	7	20	20	58	80	71	81	515
17-Feb-26 01:00	53	0	57	10	57	7	20	20	62	80	71	81	518
17-Feb-26 02:00	52	0	56	10	57	7	20	20	65	80	70	81	520
17-Feb-26 03:00	52	0	55	10	57	7	20	21	61	80	70	82	516
17-Feb-26 04:00	52	0	56	10	58	7	20	21	59	80	70	83	515
17-Feb-26 05:00	53	0	57	10	57	7	19	21	54	80	70	85	514
17-Feb-26 06:00	52	0	56	10	57	7	20	20	61	81	71	82	517
17-Feb-26 07:00	52	0	57	10	57	7	21	21	53	81	72	87	518
17-Feb-26 08:00	53	0	57	10	58	7	20	20	51	81	71	92	520
17-Feb-26 09:00	52	0	57	10	58	7	20	20	56	77	70	90	517
17-Feb-26 10:00	53	0	56	10	57	7	20	20	54	75	71	87	508
17-Feb-26 11:00	53	0	55	10	56	7	20	20	48	78	71	87	507
17-Feb-26 12:00	53	0	56	10	56	7	19	20	50	78	70	90	509
17-Feb-26 13:00	53	0	56	10	64	10	20	20	50	75	70	87	515
17-Feb-26 14:00	52	0	56	10	57	7	20	21	55	86	71	95	531
17-Feb-26 15:00	53	0	53	9	56	7	20	20	65	81	71	87	522

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
17-Feb-26 16:00	53	0	54	10	56	7	20	20	65	77	71	89	522
17-Feb-26 17:00	53	0	55	10	57	7	20	20	65	80	70	91	528
17-Feb-26 18:00	53	0	54	10	57	7	20	20	64	81	70	87	524
17-Feb-26 19:00	52	0	55	10	57	7	21	22	69	81	72	87	533
17-Feb-26 20:00	52	0	54	10	57	7	20	20	65	80	70	86	522
17-Feb-26 21:00	53	0	55	10	57	7	21	21	66	81	71	87	527
17-Feb-26 22:00	53	0	55	10	56	7	20	20	66	79	70	86	521
17-Feb-26 23:00	53	0	55	10	57	7	21	21	66	81	72	88	529
18-Feb-26 00:00	53	0	54	10	56	7	20	20	67	79	70	86	523
18-Feb-26 01:00	53	0	54	10	56	7	20	21	65	80	70	87	523
18-Feb-26 02:00	53	0	55	10	57	7	21	20	67	81	71	87	528
18-Feb-26 03:00	53	0	55	10	57	7	20	21	65	79	71	86	525
18-Feb-26 04:00	53	0	55	10	56	7	20	21	65	79	70	86	522
18-Feb-26 05:00	52	0	55	10	56	7	20	21	65	80	70	86	523
18-Feb-26 06:00	52	0	55	10	56	7	20	20	65	79	70	88	522
18-Feb-26 07:00	53	0	54	10	56	7	20	21	65	80	71	86	523
18-Feb-26 08:00	52	0	55	10	57	7	21	21	64	81	71	92	531
18-Feb-26 09:00	53	0	55	10	56	7	21	20	65	81	72	91	531
18-Feb-26 10:00	53	0	55	10	56	7	20	21	54	86	71	96	529
18-Feb-26 11:00	53	0	55	10	57	7	19	21	59	83	70	92	527
18-Feb-26 12:00	53	0	55	10	56	7	20	21	65	82	70	93	532
18-Feb-26 13:00	57	0	55	10	56	7	21	20	54	86	71	95	531
18-Feb-26 14:00	55	0	56	10	57	7	20	20	60	85	71	95	536
18-Feb-26 15:00	55	0	54	10	56	7	19	20	65	88	70	97	542
18-Feb-26 16:00	55	0	57	12	59	8	24	26	66	81	71	89	546
18-Feb-26 17:00	52	0	54	10	56	7	26	27	59	79	70	87	527
18-Feb-26 18:00	53	0	55	10	56	7	21	21	58	79	71	87	517
18-Feb-26 19:00	52	0	55	11	58	8	21	21	58	80	71	91	527
18-Feb-26 20:00	53	23	55	11	58	8	21	21	46	85	71	95	546
18-Feb-26 21:00	53	28	55	11	57	8	20	20	52	82	71	93	551
18-Feb-26 22:00	52	39	56	11	40	5	22	22	67	79	73	88	553
18-Feb-26 23:00	55	46	60	14	0	0	20	20	65	81	71	92	524
19-Feb-26 00:00	54	45	62	14	0	0	20	20	64	79	71	86	515
19-Feb-26 01:00	56	47	61	14	0	0	21	21	60	80	71	87	516
19-Feb-26 02:00	56	46	62	14	0	0	21	20	54	81	70	90	514
19-Feb-26 03:00	56	47	62	14	0	0	20	20	54	81	70	87	511
19-Feb-26 04:00	55	46	61	14	0	0	20	20	57	83	71	94	523
19-Feb-26 05:00	56	47	61	14	0	0	20	20	55	83	71	94	522
19-Feb-26 06:00	56	48	62	14	0	0	20	20	54	81	71	91	517
19-Feb-26 07:00	56	48	58	12	0	0	22	22	65	82	73	88	526
19-Feb-26 08:00	61	48	50	8	0	0	28	29	79	82	71	88	545
19-Feb-26 09:00	60	55	51	8	0	0	28	29	78	82	71	88	552
19-Feb-26 10:00	60	52	45	8	0	0	29	29	71	79	70	87	530
19-Feb-26 11:00	61	54	52	8	0	0	29	27	73	88	70	91	553

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
19-Feb-26 12:00	56	46	60	10	0	0	25	24	80	77	56	81	514
19-Feb-26 13:00	57	48	59	11	0	0	20	21	78	75	71	87	527
19-Feb-26 14:00	56	48	58	12	0	0	21	21	81	83	71	89	538
19-Feb-26 15:00	56	48	58	12	0	0	21	21	80	82	71	88	536
19-Feb-26 16:00	56	48	59	13	0	0	21	21	81	86	71	90	545
19-Feb-26 17:00	56	48	59	12	0	0	21	21	81	83	71	89	541
19-Feb-26 18:00	56	48	60	13	0	0	20	21	81	84	70	88	541
19-Feb-26 19:00	56	48	61	12	0	0	21	21	81	85	71	89	547
19-Feb-26 20:00	56	49	59	12	0	0	21	21	80	83	71	89	541
19-Feb-26 21:00	56	48	60	12	0	0	21	21	80	92	61	95	545
19-Feb-26 22:00	56	48	60	12	0	0	21	22	70	88	71	92	540
19-Feb-26 23:00	56	48	60	12	0	0	20	20	69	86	70	90	533
20-Feb-26 00:00	55	47	60	12	0	0	20	21	72	88	71	91	539
20-Feb-26 01:00	56	48	60	12	0	0	21	21	69	85	71	91	535
20-Feb-26 02:00	56	49	59	12	0	0	20	21	68	86	71	90	531
20-Feb-26 03:00	56	48	60	13	0	0	21	21	68	85	71	90	532
20-Feb-26 04:00	56	48	60	12	0	0	21	21	69	86	71	90	535
20-Feb-26 05:00	56	48	61	12	0	0	21	21	67	84	71	89	529
20-Feb-26 06:00	56	48	60	13	0	0	21	21	74	91	71	94	549
20-Feb-26 07:00	55	48	60	13	0	0	21	21	47	84	71	91	510
20-Feb-26 08:00	56	48	60	13	0	0	21	21	49	83	71	88	509
20-Feb-26 09:00	56	48	60	12	0	0	21	20	60	84	71	87	520
20-Feb-26 10:00	56	49	61	13	0	0	21	21	55	84	70	88	518
20-Feb-26 11:00	56	49	61	13	0	0	20	20	59	83	70	88	519
20-Feb-26 12:00	56	49	61	13	0	0	21	21	63	78	71	88	520
20-Feb-26 13:00	56	49	61	13	0	0	21	21	64	78	71	88	520
20-Feb-26 14:00	56	49	61	13	0	0	20	20	65	82	70	92	527
20-Feb-26 15:00	56	49	61	13	0	0	21	21	64	79	71	91	525
20-Feb-26 16:00	56	49	61	13	0	0	21	21	62	86	70	95	534
20-Feb-26 17:00	56	47	60	13	0	0	21	21	63	86	70	95	533
20-Feb-26 18:00	56	48	60	13	0	0	20	20	64	87	70	96	536
20-Feb-26 19:00	56	48	61	13	0	0	20	21	64	86	71	95	534
20-Feb-26 20:00	56	47	60	13	0	0	21	21	61	88	71	96	533
20-Feb-26 21:00	55	48	60	13	0	0	21	21	59	88	71	96	531
20-Feb-26 22:00	57	48	60	13	0	0	21	21	53	93	71	100	537
20-Feb-26 23:00	56	47	61	13	0	0	21	21	52	90	71	98	530
21-Feb-26 00:00	56	48	61	13	0	0	20	21	57	84	71	94	525
21-Feb-26 01:00	56	47	60	12	0	0	21	22	56	85	71	93	523
21-Feb-26 02:00	56	47	60	13	0	0	20	21	58	83	71	93	522
21-Feb-26 03:00	56	47	61	12	0	0	21	21	57	84	72	94	525
21-Feb-26 04:00	56	47	60	13	0	0	21	21	71	77	71	86	521
21-Feb-26 05:00	56	47	61	13	0	0	21	21	61	82	71	93	525
21-Feb-26 06:00	56	48	61	13	0	0	21	21	52	87	71	96	524
21-Feb-26 07:00	55	47	60	12	0	0	20	20	50	87	71	96	518

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
21-Feb-26 08:00	56	47	60	12	0	0	21	21	48	88	71	96	522
21-Feb-26 09:00	56	47	59	12	0	0	21	21	49	85	71	95	516
21-Feb-26 10:00	53	44	60	12	32	4	21	21	55	89	71	97	559
21-Feb-26 11:00	53	43	61	13	43	7	21	21	52	84	70	95	563
21-Feb-26 12:00	56	46	59	13	59	9	21	0	0	90	71	98	522
21-Feb-26 13:00	57	48	60	12	60	9	20	0	0	85	70	94	515
21-Feb-26 14:00	57	48	61	13	60	9	21	0	0	86	71	95	521
21-Feb-26 15:00	56	48	60	13	60	9	20	0	0	87	70	95	518
21-Feb-26 16:00	57	49	61	13	62	10	21	0	0	88	71	97	528
21-Feb-26 17:00	56	48	61	13	62	10	20	0	0	80	71	91	512
21-Feb-26 18:00	56	48	60	13	62	9	21	0	0	79	71	89	509
21-Feb-26 19:00	56	48	60	13	61	10	21	0	0	81	70	87	506
21-Feb-26 20:00	56	48	61	13	63	10	21	0	0	80	70	89	510
21-Feb-26 21:00	56	48	61	13	62	10	21	0	0	78	71	88	509
21-Feb-26 22:00	56	46	61	13	62	10	21	0	0	83	70	92	513
21-Feb-26 23:00	56	47	61	13	62	10	21	0	0	80	71	90	510
22-Feb-26 00:00	56	47	62	13	63	10	21	0	0	80	70	90	512
22-Feb-26 01:00	56	48	61	13	63	10	21	0	0	80	71	91	515
22-Feb-26 02:00	56	48	61	13	63	10	22	0	0	81	72	91	516
22-Feb-26 03:00	57	49	61	13	63	10	21	0	0	78	71	86	510
22-Feb-26 04:00	55	48	60	13	63	10	21	0	0	80	71	90	511
22-Feb-26 05:00	55	49	61	13	62	10	21	0	0	78	71	90	512
22-Feb-26 06:00	55	48	62	13	63	10	22	0	0	80	72	92	516
22-Feb-26 07:00	55	47	61	13	63	10	21	0	0	79	71	90	510
22-Feb-26 08:00	55	48	61	13	63	10	21	0	0	78	70	90	510
22-Feb-26 09:00	55	48	61	13	62	10	22	0	0	79	72	90	511
22-Feb-26 10:00	55	49	61	13	63	10	21	0	0	83	70	93	517
22-Feb-26 11:00	55	48	62	14	63	10	21	0	0	82	70	93	519
22-Feb-26 12:00	54	48	62	14	62	9	20	0	0	84	70	93	516
22-Feb-26 13:00	53	49	61	13	62	10	21	0	0	86	72	96	523
22-Feb-26 14:00	54	50	61	13	63	9	21	0	0	87	71	96	524
22-Feb-26 15:00	55	46	61	13	62	10	20	0	0	87	70	97	521
22-Feb-26 16:00	57	48	61	13	62	10	21	0	0	86	70	96	523
22-Feb-26 17:00	56	47	61	13	62	10	21	0	0	86	70	96	521
22-Feb-26 18:00	55	47	61	13	62	10	21	0	0	89	71	98	526
22-Feb-26 19:00	56	48	61	13	63	10	21	0	0	95	73	102	542
22-Feb-26 20:00	56	48	60	13	63	10	21	0	0	93	76	101	541
22-Feb-26 21:00	57	48	60	13	62	10	21	0	0	81	85	93	530
22-Feb-26 22:00	54	47	60	13	62	10	22	0	0	91	86	100	546
22-Feb-26 23:00	56	47	60	13	62	10	21	0	0	94	90	101	554
23-Feb-26 00:00	57	49	60	13	63	10	21	0	0	89	85	98	543
23-Feb-26 01:00	56	48	60	13	63	10	22	0	0	90	86	99	547
23-Feb-26 02:00	56	47	61	13	63	10	20	0	0	87	87	99	543
23-Feb-26 03:00	56	48	60	13	62	10	21	0	0	85	85	91	530

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
23-Feb-26 04:00	56	48	60	13	62	10	21	0	0	84	84	90	529
23-Feb-26 05:00	56	47	60	12	62	9	20	0	0	85	84	91	527
23-Feb-26 06:00	56	48	61	13	62	10	20	0	0	83	84	89	527
23-Feb-26 07:00	56	48	60	13	62	10	20	0	0	84	85	90	528
23-Feb-26 08:00	56	48	60	13	63	10	21	0	0	87	86	91	534
23-Feb-26 09:00	52	49	59	12	61	9	20	0	0	86	86	85	520
23-Feb-26 10:00	53	49	59	12	61	9	22	0	0	84	85	89	521
23-Feb-26 11:00	53	48	60	12	62	9	21	0	0	84	85	90	523
23-Feb-26 12:00	53	48	58	11	60	9	22	0	0	84	85	90	520
23-Feb-26 13:00	53	47	57	11	65	10	21	0	0	82	85	93	526
23-Feb-26 14:00	53	47	58	11	62	9	21	0	0	83	84	94	521
23-Feb-26 15:00	53	47	58	11	62	10	20	0	0	83	83	94	521
23-Feb-26 16:00	54	49	57	11	61	9	22	0	0	83	84	93	522
23-Feb-26 17:00	53	47	57	11	60	9	21	0	0	84	84	95	522
23-Feb-26 18:00	53	47	57	11	61	9	21	0	0	87	88	97	532
23-Feb-26 19:00	54	48	57	11	62	10	21	0	0	83	84	94	524
23-Feb-26 20:00	55	48	57	11	62	9	22	0	0	84	85	95	528
23-Feb-26 21:00	55	47	58	11	61	9	21	0	0	88	88	96	535
23-Feb-26 22:00	55	48	57	11	61	9	22	0	0	90	91	99	543
23-Feb-26 23:00	55	48	57	11	61	10	21	0	0	88	89	98	539
24-Feb-26 00:00	55	48	58	11	62	9	21	0	0	87	88	96	535
24-Feb-26 01:00	55	48	58	11	61	9	21	0	0	87	88	97	535
24-Feb-26 02:00	55	47	58	11	62	9	21	0	0	90	91	99	543
24-Feb-26 03:00	55	48	58	11	62	9	21	0	0	87	87	96	533
24-Feb-26 04:00	55	47	58	12	61	9	21	0	0	88	90	97	538
24-Feb-26 05:00	55	48	58	11	61	9	21	0	0	86	87	96	532
24-Feb-26 06:00	54	48	58	11	61	9	21	0	0	86	87	95	531
24-Feb-26 07:00	53	47	57	11	62	9	21	0	0	86	87	96	529
24-Feb-26 08:00	53	47	58	10	61	9	21	0	0	82	85	93	519
24-Feb-26 09:00	54	47	57	11	60	9	21	0	0	90	90	97	534
24-Feb-26 10:00	54	48	57	11	59	8	26	0	0	105	96	91	555
24-Feb-26 11:00	53	48	56	10	58	8	23	0	0	101	92	89	538
24-Feb-26 12:00	53	48	57	10	58	8	20	0	0	105	95	93	549
24-Feb-26 13:00	57	46	57	10	58	8	20	21	0	94	84	87	542
24-Feb-26 14:00	54	47	58	11	58	8	21	21	0	98	85	87	547
24-Feb-26 15:00	54	48	56	10	59	8	21	21	0	97	87	88	547
24-Feb-26 16:00	54	47	56	11	58	8	21	21	0	113	106	113	608
24-Feb-26 17:00	53	47	57	11	59	8	22	0	0	97	86	95	535
24-Feb-26 18:00	53	48	57	11	59	9	20	0	0	87	84	91	520
24-Feb-26 19:00	54	48	56	10	59	8	21	0	0	87	85	92	520
24-Feb-26 20:00	55	48	57	11	60	8	21	0	0	90	86	93	530
24-Feb-26 21:00	55	48	57	11	61	9	21	0	0	87	85	92	526
24-Feb-26 22:00	55	48	59	12	60	8	21	0	0	87	85	91	526
24-Feb-26 23:00	54	48	58	11	59	8	20	0	0	88	85	93	523

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
25-Feb-26 00:00	54	48	58	11	59	9	21	0	0	91	85	94	531
25-Feb-26 01:00	53	48	58	11	60	9	20	0	0	89	85	93	528
25-Feb-26 02:00	54	48	58	11	60	8	21	0	0	90	86	94	530
25-Feb-26 03:00	54	48	58	11	59	8	21	0	0	91	85	94	531
25-Feb-26 04:00	54	48	57	11	59	8	20	0	0	90	85	94	527
25-Feb-26 05:00	54	48	58	11	60	8	21	0	0	90	85	94	529
25-Feb-26 06:00	54	49	58	12	60	9	21	0	0	89	85	93	530
25-Feb-26 07:00	54	48	58	11	60	8	20	0	0	89	86	94	528
25-Feb-26 08:00	54	48	58	12	60	9	21	0	0	88	86	93	529
25-Feb-26 09:00	54	48	58	11	60	8	20	0	0	89	85	94	526
25-Feb-26 10:00	53	44	56	11	58	8	20	0	0	94	84	97	525
25-Feb-26 11:00	53	45	57	11	59	8	21	0	0	91	86	95	524
25-Feb-26 12:00	53	50	56	10	58	8	20	0	0	90	84	94	524
25-Feb-26 13:00	53	49	56	11	58	8	21	0	0	90	83	94	522
25-Feb-26 14:00	53	45	62	13	59	8	20	0	0	83	84	89	516
25-Feb-26 15:00	49	45	55	10	57	8	21	0	0	92	85	96	517
25-Feb-26 16:00	54	44	56	10	57	8	22	0	0	90	84	94	518
25-Feb-26 17:00	53	46	56	10	57	7	22	0	0	91	85	94	521
25-Feb-26 18:00	54	46	57	11	59	8	21	0	0	89	85	94	523
25-Feb-26 19:00	55	46	57	11	58	8	21	0	0	91	85	94	526
25-Feb-26 20:00	55	47	58	11	59	8	21	0	0	88	84	90	522
25-Feb-26 21:00	55	47	58	12	60	9	21	0	0	83	84	84	513
25-Feb-26 22:00	55	46	59	12	61	9	21	0	0	87	84	87	522
25-Feb-26 23:00	55	47	60	12	61	9	21	0	0	86	85	87	523
26-Feb-26 00:00	55	46	60	12	61	9	21	0	0	88	85	87	524
26-Feb-26 01:00	55	46	59	12	61	9	21	0	0	88	85	87	524
26-Feb-26 02:00	55	47	60	12	62	9	21	0	0	89	85	88	529
26-Feb-26 03:00	54	47	60	12	62	9	21	0	0	89	84	89	527
26-Feb-26 04:00	55	46	59	12	62	9	21	0	0	89	85	87	525
26-Feb-26 05:00	55	46	60	12	62	9	21	0	0	90	84	88	527
26-Feb-26 06:00	55	46	60	12	62	9	22	0	0	89	86	89	530
26-Feb-26 07:00	55	46	59	12	61	9	20	0	0	87	85	86	521
26-Feb-26 08:00	55	46	58	11	61	9	21	0	0	86	85	86	518
26-Feb-26 09:00	55	47	58	11	61	9	20	0	0	87	84	91	522
26-Feb-26 10:00	55	47	59	11	62	9	20	0	0	85	84	90	522
26-Feb-26 11:00	55	46	58	11	61	9	18	0	0	96	88	99	541
26-Feb-26 12:00	55	47	58	12	64	11	22	0	0	87	86	92	533
26-Feb-26 13:00	56	48	59	12	64	11	20	0	0	87	85	92	532
26-Feb-26 14:00	54	47	58	11	61	9	21	0	0	80	83	86	512
26-Feb-26 15:00	55	47	58	11	60	9	21	0	0	80	85	87	514
26-Feb-26 16:00	56	47	58	11	61	9	21	0	0	78	84	87	512
26-Feb-26 17:00	54	47	58	11	61	9	20	0	0	81	84	88	513
26-Feb-26 18:00	55	47	59	12	61	9	21	0	0	81	85	87	517
26-Feb-26 19:00	54	47	59	12	61	9	21	0	0	81	85	88	517

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
26-Feb-26 20:00	55	48	59	12	62	9	21	0	0	82	85	90	521
26-Feb-26 21:00	55	48	60	12	61	9	20	0	0	83	85	89	521
26-Feb-26 22:00	55	46	59	12	62	9	21	0	0	91	84	95	534
26-Feb-26 23:00	55	47	60	12	61	10	21	0	0	90	85	94	535
27-Feb-26 00:00	54	47	59	12	60	9	21	0	0	89	85	94	530
27-Feb-26 01:00	54	48	59	12	61	9	21	0	0	91	86	95	535
27-Feb-26 02:00	54	47	58	12	60	9	21	0	0	93	88	97	539
27-Feb-26 03:00	53	46	59	12	60	9	20	0	0	93	88	96	537
27-Feb-26 04:00	54	47	58	12	60	9	21	0	0	91	86	94	533
27-Feb-26 05:00	54	47	59	12	60	8	21	0	0	96	91	95	542
27-Feb-26 06:00	54	47	59	12	61	9	20	0	0	99	95	97	552
27-Feb-26 07:00	54	47	58	12	60	9	21	0	0	93	89	92	535
27-Feb-26 08:00	53	48	57	11	59	8	21	0	0	93	87	91	529
27-Feb-26 09:00	54	48	56	10	59	8	21	0	0	92	87	90	525
27-Feb-26 10:00	54	49	56	10	59	8	21	0	0	92	87	90	528
27-Feb-26 11:00	54	48	56	10	59	9	20	0	0	91	86	91	524
27-Feb-26 12:00	54	48	56	10	59	8	20	0	0	93	88	91	527
27-Feb-26 13:00	58	49	57	10	59	8	21	0	0	90	85	91	529
27-Feb-26 14:00	54	48	57	11	60	8	20	0	0	96	91	98	542
27-Feb-26 15:00	53	48	56	11	59	8	21	0	0	94	89	96	536
27-Feb-26 16:00	52	47	57	11	58	8	21	0	0	94	90	97	536
27-Feb-26 17:00	53	48	57	10	58	8	21	0	0	96	90	97	538
27-Feb-26 18:00	53	48	57	10	59	8	21	0	0	95	91	98	541
27-Feb-26 19:00	54	48	56	11	59	8	21	0	0	92	87	95	533
27-Feb-26 20:00	54	48	57	10	59	8	21	0	0	95	90	97	539
27-Feb-26 21:00	57	48	56	10	60	8	21	0	0	94	88	96	538
27-Feb-26 22:00	58	47	57	11	60	8	21	0	0	92	87	96	537
27-Feb-26 23:00	55	49	57	10	59	8	21	0	0	93	88	96	536
28-Feb-26 00:00	54	48	57	10	59	8	21	0	0	93	88	96	535
28-Feb-26 01:00	54	48	57	11	59	8	21	0	0	92	87	95	532
28-Feb-26 02:00	54	48	56	11	59	8	21	0	0	93	87	96	534
28-Feb-26 03:00	54	49	56	10	60	8	20	0	0	93	88	97	536
28-Feb-26 04:00	54	49	56	11	59	8	21	0	0	92	87	96	533
28-Feb-26 05:00	55	48	57	11	59	8	22	0	0	93	88	96	538
28-Feb-26 06:00	54	47	58	11	61	8	20	0	0	93	88	96	536
28-Feb-26 07:00	55	48	58	11	60	8	21	0	0	92	88	96	536
28-Feb-26 08:00	54	50	57	11	59	8	21	0	0	92	86	95	533
28-Feb-26 09:00	53	48	56	11	59	8	22	0	0	93	88	96	534
28-Feb-26 10:00	54	48	57	11	59	8	21	0	0	93	88	96	535
28-Feb-26 11:00	54	49	57	11	60	8	21	0	0	92	87	96	534
28-Feb-26 12:00	54	48	57	11	60	8	21	0	0	92	87	95	534
28-Feb-26 13:00	54	50	57	11	60	8	21	0	0	91	86	96	534
28-Feb-26 14:00	54	48	62	13	60	8	20	0	0	90	86	95	537
28-Feb-26 15:00	53	47	58	11	60	8	20	0	0	96	88	96	536

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
28-Feb-26 16:00	54	46	57	11	59	8	20	0	0	93	88	96	533
28-Feb-26 17:00	54	47	57	11	59	8	28	0	0	92	85	91	532
28-Feb-26 18:00	54	48	57	11	59	8	22	0	0	98	85	95	538
28-Feb-26 19:00	54	48	59	12	61	9	23	0	0	98	85	95	545
28-Feb-26 20:00	54	48	59	12	61	9	23	0	0	96	86	94	542
28-Feb-26 21:00	54	48	59	12	59	8	21	0	0	98	86	95	540
28-Feb-26 22:00	53	48	59	12	59	8	21	0	0	100	85	98	544
28-Feb-26 23:00	54	49	59	12	59	8	20	0	0	97	85	96	539
01-Mar-26 00:00	54	48	59	12	59	8	22	0	0	100	85	97	545
01-Mar-26 01:00	53	48	59	12	59	8	21	0	0	94	85	102	540
01-Mar-26 02:00	54	49	59	12	59	8	22	0	0	99	88	106	557
01-Mar-26 03:00	53	48	59	12	60	9	22	0	0	97	86	104	550
01-Mar-26 04:00	54	49	59	12	60	8	21	0	0	96	86	104	550
01-Mar-26 05:00	54	48	60	12	62	9	20	0	0	96	84	103	549
01-Mar-26 06:00	55	49	60	12	62	9	21	0	0	97	87	104	555
01-Mar-26 07:00	54	48	60	12	62	9	21	0	0	97	86	100	550
01-Mar-26 08:00	54	49	60	12	62	10	21	0	0	100	89	98	554
01-Mar-26 09:00	54	49	59	12	62	9	21	0	0	100	90	94	549
01-Mar-26 10:00	53	48	60	12	62	9	20	0	0	102	91	94	550
01-Mar-26 11:00	54	49	60	12	62	10	21	0	0	98	89	93	547
01-Mar-26 12:00	55	49	58	11	62	10	21	0	0	96	86	91	539
01-Mar-26 13:00	54	49	58	11	64	10	21	0	0	95	87	92	542
01-Mar-26 14:00	54	48	58	11	65	11	21	0	0	101	91	94	554
01-Mar-26 15:00	54	48	58	12	59	9	20	0	0	99	89	92	540
01-Mar-26 16:00	54	48	59	12	60	9	20	0	0	106	99	87	553
01-Mar-26 17:00	53	47	59	12	60	8	21	0	0	111	102	82	555
01-Mar-26 18:00	54	48	57	11	59	8	21	0	0	111	104	82	557
01-Mar-26 19:00	53	46	57	10	58	8	20	0	0	109	101	88	550
01-Mar-26 20:00	53	44	57	11	57	8	21	0	31	107	100	105	593
01-Mar-26 21:00	52	44	59	11	57	7	21	0	67	87	84	82	572
01-Mar-26 22:00	53	47	61	12	0	0	21	0	87	89	85	93	548
01-Mar-26 23:00	54	45	59	13	0	0	22	0	88	90	86	94	551
02-Mar-26 00:00	54	48	61	13	0	0	22	0	99	93	71	92	552
02-Mar-26 01:00	54	48	60	13	0	0	22	0	98	93	71	92	551
02-Mar-26 02:00	55	48	60	13	0	0	21	0	94	95	71	99	557
02-Mar-26 03:00	54	48	60	13	0	0	21	0	94	94	70	98	552
02-Mar-26 04:00	54	49	61	13	0	0	21	0	96	96	71	99	559
02-Mar-26 05:00	54	47	61	13	0	0	21	0	94	95	70	98	552
02-Mar-26 06:00	53	48	59	13	0	0	21	0	95	95	71	98	553
02-Mar-26 07:00	54	48	60	13	0	0	22	0	98	93	72	101	559
02-Mar-26 08:00	56	48	60	13	0	0	21	0	96	90	70	98	551
02-Mar-26 09:00	56	50	61	13	0	0	23	0	100	94	71	102	570
02-Mar-26 10:00	54	48	60	13	0	0	23	21	94	87	71	97	568
02-Mar-26 11:00	54	46	61	13	0	0	22	21	96	90	70	94	566

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
02-Mar-26 12:00	55	47	62	13	0	0	22	22	95	89	70	93	568
02-Mar-26 13:00	57	46	60	13	0	0	23	22	95	90	71	94	571
02-Mar-26 14:00	56	46	61	13	0	0	23	22	96	89	71	93	568
02-Mar-26 15:00	58	49	61	13	0	0	22	21	95	92	70	95	576
02-Mar-26 16:00	55	48	62	13	0	0	23	22	95	89	71	94	572
02-Mar-26 17:00	55	48	62	13	0	0	24	23	94	94	70	89	573
02-Mar-26 18:00	56	48	60	13	0	0	23	24	94	94	71	89	572
02-Mar-26 19:00	56	47	60	13	0	0	23	23	94	95	71	93	575
02-Mar-26 20:00	56	48	61	13	0	0	23	24	95	96	70	94	580
02-Mar-26 21:00	56	43	61	13	0	0	23	23	94	94	70	93	569
02-Mar-26 22:00	56	50	62	13	0	0	24	24	92	95	71	93	579
02-Mar-26 23:00	56	47	60	13	0	0	23	24	93	94	71	93	574
03-Mar-26 00:00	56	47	61	13	0	0	23	23	84	85	85	88	566
03-Mar-26 01:00	56	47	60	13	0	0	23	23	87	88	84	88	569
03-Mar-26 02:00	56	47	60	13	0	0	24	23	87	89	85	89	572
03-Mar-26 03:00	56	47	60	13	0	0	23	23	87	88	85	89	572
03-Mar-26 04:00	56	47	61	13	0	0	23	24	86	87	85	88	570
03-Mar-26 05:00	56	47	61	13	0	0	23	23	89	90	84	90	577
03-Mar-26 06:00	56	48	61	13	0	0	24	24	85	86	85	83	565
03-Mar-26 07:00	56	47	61	13	0	0	23	24	83	86	84	86	563
03-Mar-26 08:00	56	47	61	13	0	0	24	24	83	85	85	86	565
03-Mar-26 09:00	57	48	60	13	0	0	24	24	81	85	85	86	564
03-Mar-26 10:00	55	47	62	14	0	0	24	24	82	84	85	86	561
03-Mar-26 11:00	54	47	62	13	0	0	23	24	84	85	85	87	564
03-Mar-26 12:00	55	47	61	13	0	0	23	23	82	86	84	87	562
03-Mar-26 13:00	53	49	61	13	0	0	24	24	82	84	85	86	562
03-Mar-26 14:00	54	47	61	13	0	0	23	23	85	87	84	87	565
03-Mar-26 15:00	54	47	61	13	0	0	23	23	87	88	84	89	568
03-Mar-26 16:00	54	46	61	13	0	0	23	23	86	87	84	88	564
03-Mar-26 17:00	54	46	59	12	0	0	23	23	86	88	84	88	564
03-Mar-26 18:00	57	48	61	13	0	0	23	23	84	86	85	87	568
03-Mar-26 19:00	56	47	60	13	0	0	23	23	85	87	84	88	566
03-Mar-26 20:00	56	48	61	13	0	0	24	24	85	87	84	88	570
03-Mar-26 21:00	55	48	61	13	0	0	24	23	88	90	76	94	572
03-Mar-26 22:00	56	48	61	13	0	0	23	23	92	93	85	93	588
03-Mar-26 23:00	56	48	60	12	0	0	23	24	90	90	85	90	578
04-Mar-26 00:00	56	48	61	13	0	0	24	24	89	91	86	91	582
04-Mar-26 01:00	56	47	60	12	0	0	23	23	90	91	85	91	578
04-Mar-26 02:00	56	47	60	13	0	0	23	24	91	92	85	92	582
04-Mar-26 03:00	56	47	60	12	0	0	24	24	90	92	85	91	582
04-Mar-26 04:00	56	47	60	13	0	0	24	23	90	90	86	91	578
04-Mar-26 05:00	56	46	59	13	0	0	23	23	91	92	84	92	580
04-Mar-26 06:00	56	48	61	12	0	0	23	24	89	91	84	87	576
04-Mar-26 07:00	56	48	60	13	0	0	23	24	89	90	85	85	573

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
04-Mar-26 08:00	53	46	60	13	0	0	24	24	91	91	86	91	577
04-Mar-26 09:00	53	45	60	12	0	0	21	23	93	87	85	91	572
04-Mar-26 10:00	53	45	59	13	0	0	21	23	98	94	71	97	575
04-Mar-26 11:00	53	46	60	13	0	0	21	23	97	92	71	96	572
04-Mar-26 12:00	53	45	60	13	0	0	21	23	97	90	70	98	571
04-Mar-26 13:00	53	45	59	13	0	0	20	23	100	88	70	101	572
04-Mar-26 14:00	53	46	60	13	0	0	21	22	97	85	71	99	567
04-Mar-26 15:00	53	48	60	13	0	0	21	22	88	82	71	96	552
04-Mar-26 16:00	53	48	60	12	0	0	20	0	92	86	71	101	544
04-Mar-26 17:00	53	48	60	13	0	0	22	0	94	89	71	102	551
04-Mar-26 18:00	54	48	59	13	0	0	21	0	93	88	70	101	545
04-Mar-26 19:00	54	48	59	12	0	0	21	0	92	88	70	101	545
04-Mar-26 20:00	54	49	59	12	0	0	22	0	90	86	85	91	548
04-Mar-26 21:00	54	48	60	13	0	0	21	0	92	86	85	91	550
04-Mar-26 22:00	53	47	59	13	0	0	23	0	94	90	85	93	558
04-Mar-26 23:00	54	48	59	12	0	0	22	0	91	87	85	91	551
05-Mar-26 00:00	54	49	60	12	0	0	22	0	93	88	86	92	555
05-Mar-26 01:00	54	48	59	12	0	0	21	0	96	92	84	95	561
05-Mar-26 02:00	53	48	59	13	0	0	22	0	101	95	85	93	568
05-Mar-26 03:00	54	47	58	12	0	0	21	0	102	96	84	94	568
05-Mar-26 04:00	54	48	60	12	0	0	22	0	101	97	85	94	572
05-Mar-26 05:00	54	48	59	13	0	0	22	0	101	96	86	94	572
05-Mar-26 06:00	54	48	59	12	0	0	21	0	103	97	85	94	573
05-Mar-26 07:00	54	49	60	12	0	0	22	0	100	96	85	93	570
05-Mar-26 08:00	56	48	59	12	0	0	21	0	103	98	84	95	577
05-Mar-26 09:00	55	48	59	12	0	0	21	0	100	96	90	93	574
05-Mar-26 10:00	54	45	59	12	0	0	22	0	95	90	85	88	551
05-Mar-26 11:00	58	44	59	12	0	0	22	0	96	91	84	89	555
05-Mar-26 12:00	55	45	60	12	0	0	22	0	96	89	85	88	552
05-Mar-26 13:00	55	46	59	12	0	0	21	0	95	89	84	89	551
05-Mar-26 14:00	54	45	60	12	0	0	22	0	96	91	85	89	553
05-Mar-26 15:00	53	45	59	12	0	0	21	0	96	91	84	90	552
05-Mar-26 16:00	54	46	60	12	0	0	18	0	93	92	93	83	552
05-Mar-26 17:00	55	46	59	12	0	0	22	0	94	90	85	89	551
05-Mar-26 18:00	55	46	59	12	0	0	22	0	96	90	85	90	555
05-Mar-26 19:00	55	46	59	12	0	0	22	0	93	89	85	88	549
05-Mar-26 20:00	54	45	57	11	0	0	21	0	92	87	85	92	544
05-Mar-26 21:00	54	45	57	11	0	0	22	0	92	91	84	92	549
05-Mar-26 22:00	54	45	59	11	0	0	22	0	93	89	85	93	551
05-Mar-26 23:00	54	44	58	11	0	0	21	0	93	88	85	92	547
06-Mar-26 00:00	53	44	58	11	0	0	21	0	94	89	84	93	547
06-Mar-26 01:00	53	45	59	11	0	0	21	0	90	85	85	91	540
06-Mar-26 02:00	53	46	58	11	0	0	21	0	91	87	85	91	544
06-Mar-26 03:00	53	45	57	12	0	0	22	0	92	88	85	92	546

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
06-Mar-26 04:00	52	45	58	11	0	0	22	0	94	90	84	93	549
06-Mar-26 05:00	53	44	58	11	0	0	21	0	92	88	85	92	544
06-Mar-26 06:00	53	44	59	11	0	0	21	0	91	88	85	92	544
06-Mar-26 07:00	53	44	58	11	0	0	22	0	94	89	85	93	548
06-Mar-26 08:00	53	45	58	11	0	0	22	0	92	88	86	93	547
06-Mar-26 09:00	53	45	58	11	0	0	20	0	92	87	84	92	543
06-Mar-26 10:00	53	44	57	11	0	0	22	0	91	88	85	92	543
06-Mar-26 11:00	53	45	58	11	0	0	22	0	92	88	85	92	547
06-Mar-26 12:00	52	44	58	11	0	0	22	0	87	82	84	87	528
06-Mar-26 13:00	53	44	59	11	0	0	22	0	85	80	84	86	524
06-Mar-26 14:00	53	45	63	13	0	0	21	0	79	82	84	87	527
06-Mar-26 15:00	53	50	57	12	0	0	22	0	75	79	84	86	518
06-Mar-26 16:00	53	44	58	12	0	0	23	0	81	83	70	90	514
06-Mar-26 17:00	53	44	58	11	0	0	23	0	83	85	70	90	515
06-Mar-26 18:00	53	46	57	11	0	0	22	0	81	84	70	90	514
06-Mar-26 19:00	52	43	58	11	0	0	22	0	83	85	71	90	515
06-Mar-26 20:00	53	45	57	11	0	0	22	0	78	80	72	88	505
06-Mar-26 21:00	53	44	58	11	0	0	22	0	77	81	72	88	507
06-Mar-26 22:00	53	44	58	11	0	0	22	0	82	84	71	90	515
06-Mar-26 23:00	53	44	57	11	42	6	22	22	86	43	85	91	562
07-Mar-26 00:00	53	44	56	10	58	8	21	19	74	37	82	84	546
07-Mar-26 01:00	53	43	56	10	58	8	21	20	85	50	68	92	563
07-Mar-26 02:00	53	44	56	10	58	7	20	20	91	0	71	95	525
07-Mar-26 03:00	53	43	56	10	58	8	21	21	86	0	72	93	521
07-Mar-26 04:00	52	43	56	10	58	8	21	20	84	0	71	91	513
07-Mar-26 05:00	52	43	56	10	58	8	21	20	84	0	72	91	515
07-Mar-26 06:00	52	43	57	10	58	8	21	21	84	0	71	91	516
07-Mar-26 07:00	53	44	57	10	58	8	20	20	82	0	71	90	511
07-Mar-26 08:00	52	44	57	10	58	8	21	21	84	0	71	91	516
07-Mar-26 09:00	53	44	57	10	58	8	21	0	89	0	85	93	517
07-Mar-26 10:00	53	45	55	10	57	8	21	0	79	0	85	89	502
07-Mar-26 11:00	53	44	56	10	58	7	22	0	64	0	89	98	503
07-Mar-26 12:00	54	44	56	10	58	8	21	0	61	0	92	99	503
07-Mar-26 13:00	53	45	55	10	65	11	21	0	61	0	90	97	508
07-Mar-26 14:00	53	45	56	10	60	8	21	0	79	0	84	86	501
07-Mar-26 15:00	53	45	55	10	58	7	21	0	79	0	85	87	500
07-Mar-26 16:00	53	45	55	10	58	8	21	0	75	0	85	86	496
07-Mar-26 17:00	53	43	55	10	57	8	24	0	89	0	84	93	516
07-Mar-26 18:00	53	44	55	9	57	7	23	0	88	0	85	93	515
07-Mar-26 19:00	53	44	55	10	57	7	24	0	87	0	84	92	514
07-Mar-26 20:00	53	44	55	9	57	7	24	0	85	0	86	91	511
07-Mar-26 21:00	52	45	55	10	58	7	24	0	81	0	87	91	509
07-Mar-26 22:00	53	44	55	10	57	7	24	0	85	0	88	92	514
07-Mar-26 23:00	53	44	55	10	58	8	24	0	83	0	86	91	513

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
08-Mar-26 00:00	53	44	55	10	58	7	24	0	84	0	86	91	511
08-Mar-26 01:00	53	44	55	10	58	8	24	0	82	0	86	90	510
08-Mar-26 02:00	53	44	55	10	57	7	24	0	83	0	87	91	512
08-Mar-26 03:00	52	43	56	10	58	8	24	0	84	0	87	91	513
08-Mar-26 04:00	53	44	56	10	57	8	23	0	82	0	85	90	507
08-Mar-26 05:00	52	44	55	10	58	8	24	0	84	0	86	92	513
08-Mar-26 06:00	52	43	55	9	58	7	24	0	82	0	85	90	506
08-Mar-26 07:00	53	45	56	10	57	8	23	0	81	0	86	91	509
08-Mar-26 08:00	52	44	55	10	57	7	24	0	83	0	84	90	507
08-Mar-26 09:00	53	44	56	10	57	8	24	0	81	0	85	89	507
08-Mar-26 10:00	53	45	56	10	57	8	23	0	80	0	85	89	505
08-Mar-26 11:00	53	46	55	10	57	8	23	0	77	0	85	87	501
08-Mar-26 12:00	58	44	56	10	58	8	23	0	75	0	84	88	504
08-Mar-26 13:00	55	45	55	10	58	7	23	0	85	0	84	85	506
08-Mar-26 14:00	54	45	55	10	58	8	25	0	80	0	85	85	505
08-Mar-26 15:00	53	44	55	10	57	7	24	0	78	0	84	87	500
08-Mar-26 16:00	52	44	56	10	57	8	24	0	77	0	84	86	498
08-Mar-26 17:00	53	45	56	10	58	8	25	0	78	0	86	88	504
08-Mar-26 18:00	53	44	55	10	58	7	24	0	77	0	84	87	499
08-Mar-26 19:00	53	44	55	9	58	7	22	15	75	0	84	86	508
08-Mar-26 20:00	53	44	55	10	57	7	23	24	78	0	72	87	511
08-Mar-26 21:00	53	44	55	10	58	8	21	22	80	35	70	89	545
08-Mar-26 22:00	53	44	55	10	58	8	21	21	82	65	68	89	572
08-Mar-26 23:00	53	45	55	10	58	8	21	21	67	65	67	86	555
09-Mar-26 00:00	53	44	55	10	57	8	21	21	69	66	68	87	559
09-Mar-26 01:00	53	44	55	10	58	8	21	21	69	65	68	87	556
09-Mar-26 02:00	53	44	56	10	58	8	21	21	69	66	68	88	560
09-Mar-26 03:00	53	45	55	10	58	8	21	21	71	66	68	88	563
09-Mar-26 04:00	52	44	55	10	57	8	21	21	68	65	67	87	556
09-Mar-26 05:00	53	44	56	10	58	8	21	21	69	65	67	88	558
09-Mar-26 06:00	51	41	55	10	57	8	21	21	71	65	67	88	555
09-Mar-26 07:00	51	42	55	10	57	7	21	21	70	65	67	88	554
09-Mar-26 08:00	51	42	55	10	58	8	21	21	69	66	67	88	556
09-Mar-26 09:00	52	43	55	9	58	7	21	20	73	66	67	89	561
09-Mar-26 10:00	52	43	56	10	57	7	20	21	63	65	67	87	548
09-Mar-26 11:00	51	42	56	10	58	8	21	21	64	66	67	87	549
09-Mar-26 12:00	51	42	56	10	57	7	21	21	66	66	68	87	553
09-Mar-26 13:00	50	50	55	9	57	7	22	22	65	67	69	86	559
09-Mar-26 14:00	51	50	55	10	57	7	21	21	66	67	68	85	556
09-Mar-26 15:00	52	43	56	10	57	8	22	21	67	70	66	91	562
09-Mar-26 16:00	52	42	56	10	57	8	21	21	69	65	67	94	561
09-Mar-26 17:00	52	42	55	10	56	7	22	21	69	66	68	87	555
09-Mar-26 18:00	51	42	55	10	56	7	21	21	70	66	68	87	555
09-Mar-26 19:00	52	43	55	10	57	7	21	21	71	65	68	87	558

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
09-Mar-26 20:00	51	42	55	10	57	7	21	21	70	65	67	87	552
09-Mar-26 21:00	52	43	55	10	57	7	21	21	78	66	67	87	562
09-Mar-26 22:00	51	42	55	9	57	7	20	19	79	67	66	87	559
09-Mar-26 23:00	51	42	55	9	57	7	21	20	73	67	67	87	557
10-Mar-26 00:00	51	42	55	10	57	7	20	20	74	67	65	86	555
10-Mar-26 01:00	51	42	56	10	57	7	21	20	74	68	67	87	558
10-Mar-26 02:00	51	42	55	9	57	7	21	20	74	67	66	87	555
10-Mar-26 03:00	52	43	55	10	57	8	20	20	74	66	66	86	556
10-Mar-26 04:00	51	43	56	10	57	8	21	21	72	67	66	86	556
10-Mar-26 05:00	51	44	56	10	57	7	20	20	75	66	65	86	556
10-Mar-26 06:00	52	43	55	10	57	7	21	19	70	68	66	87	557
10-Mar-26 07:00	51	43	55	9	56	7	20	20	71	65	67	86	550
10-Mar-26 08:00	51	42	56	10	56	7	21	20	63	79	68	87	560
10-Mar-26 09:00	51	43	56	10	56	8	21	20	62	65	67	86	544
10-Mar-26 10:00	52	44	55	10	57	7	21	20	70	67	68	87	558
10-Mar-26 11:00	52	44	56	10	57	7	20	20	68	66	68	88	555
10-Mar-26 12:00	52	44	56	10	57	8	21	20	68	65	68	88	557
10-Mar-26 13:00	52	43	55	10	57	8	21	19	67	64	70	87	553
10-Mar-26 14:00	52	43	56	10	57	8	20	19	83	66	68	87	570
10-Mar-26 15:00	52	43	56	10	57	7	21	20	76	66	68	87	561
10-Mar-26 16:00	51	42	55	10	65	10	20	19	75	66	68	86	569
10-Mar-26 17:00	52	43	56	10	66	10	21	20	69	66	68	85	565
10-Mar-26 18:00	51	42	55	10	56	7	22	24	73	65	67	86	557
10-Mar-26 19:00	50	42	56	10	57	7	21	23	74	65	67	86	558
10-Mar-26 20:00	51	42	56	10	57	7	21	20	76	67	67	84	559
10-Mar-26 21:00	52	45	55	10	57	7	21	20	76	66	67	87	561
10-Mar-26 22:00	52	42	55	10	57	7	21	20	76	66	66	86	557
10-Mar-26 23:00	52	44	55	9	56	7	21	20	76	67	65	86	558
11-Mar-26 00:00	52	44	56	10	56	8	21	20	79	67	66	88	566
11-Mar-26 01:00	51	43	55	10	57	7	20	20	79	66	65	89	563
11-Mar-26 02:00	51	44	55	10	57	7	20	20	77	66	65	87	560
11-Mar-26 03:00	51	43	55	10	56	7	21	21	78	67	66	86	562
11-Mar-26 04:00	51	43	56	10	56	7	21	20	78	67	66	86	562
11-Mar-26 05:00	51	43	55	10	57	7	21	20	82	66	65	89	566
11-Mar-26 06:00	52	44	56	10	57	7	21	20	77	67	66	86	563
11-Mar-26 07:00	51	43	55	10	57	7	21	20	79	66	67	88	564
11-Mar-26 08:00	51	43	55	10	56	7	22	22	72	66	68	87	560
11-Mar-26 09:00	51	44	55	9	57	7	20	20	73	65	67	87	556
11-Mar-26 10:00	52	45	55	10	56	7	20	20	66	65	67	86	551
11-Mar-26 11:00	52	44	55	10	57	7	21	20	66	66	68	88	554
11-Mar-26 12:00	52	44	56	10	57	7	20	20	67	66	68	85	551
11-Mar-26 13:00	51	43	56	10	57	7	20	20	70	66	68	86	555
11-Mar-26 14:00	57	42	55	10	56	7	21	20	68	67	68	84	557
11-Mar-26 15:00	51	42	56	10	57	7	21	20	76	66	68	87	560

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
11-Mar-26 16:00	52	42	56	10	57	7	20	20	69	67	68	90	557
11-Mar-26 17:00	51	42	56	9	57	7	20	20	70	65	67	87	551
11-Mar-26 18:00	51	42	55	10	57	7	21	20	69	66	67	87	551
11-Mar-26 19:00	51	42	55	10	56	7	20	20	70	65	67	92	556
11-Mar-26 20:00	51	42	55	10	57	7	20	20	71	66	67	90	557
11-Mar-26 21:00	51	41	55	10	56	7	20	20	67	66	68	91	553
11-Mar-26 22:00	52	42	55	10	57	7	20	20	68	66	68	88	552
11-Mar-26 23:00	51	41	55	10	57	7	20	20	70	65	67	91	556
12-Mar-26 00:00	52	42	55	10	57	7	20	20	67	65	67	91	553
12-Mar-26 01:00	51	42	55	10	57	7	21	20	67	65	67	91	553
12-Mar-26 02:00	52	42	55	10	57	7	21	20	67	66	68	91	556
12-Mar-26 03:00	51	41	54	9	57	7	21	20	68	66	67	85	546
12-Mar-26 04:00	51	41	54	10	57	7	20	21	68	66	68	85	548
12-Mar-26 05:00	51	41	55	10	57	7	21	20	69	66	68	85	552
12-Mar-26 06:00	51	41	54	10	57	8	20	20	77	60	63	85	547
12-Mar-26 07:00	50	40	54	9	56	7	20	20	67	60	62	83	529
12-Mar-26 08:00	50	40	54	10	57	7	21	21	69	66	68	87	551
12-Mar-26 09:00	51	41	54	10	56	7	20	20	66	65	67	82	539
12-Mar-26 10:00	51	41	54	10	56	7	20	20	68	65	67	82	542
12-Mar-26 11:00	51	41	54	10	56	8	20	20	66	65	67	82	539
12-Mar-26 12:00	51	41	55	9	57	7	21	20	68	65	67	82	543
12-Mar-26 13:00	51	42	55	9	56	7	21	20	62	66	67	78	533
12-Mar-26 14:00	51	42	54	10	56	7	20	20	66	65	68	79	538
12-Mar-26 15:00	52	42	54	9	55	7	21	21	69	62	64	80	536
12-Mar-26 16:00	52	42	54	9	56	7	19	19	71	61	63	79	533
12-Mar-26 17:00	51	42	54	9	56	7	21	20	73	62	64	84	543
12-Mar-26 18:00	51	42	54	9	56	7	20	20	68	68	64	86	545
12-Mar-26 19:00	51	42	54	10	55	7	20	19	70	65	66	85	545
12-Mar-26 20:00	51	41	55	10	56	7	20	19	72	64	65	88	547
12-Mar-26 21:00	51	42	54	10	57	7	20	20	69	66	60	87	542
12-Mar-26 22:00	51	41	55	10	57	7	20	20	64	66	67	86	543
12-Mar-26 23:00	52	41	55	10	56	7	19	20	65	66	67	82	540
13-Mar-26 00:00	51	42	55	9	57	7	19	19	70	64	65	85	544
13-Mar-26 01:00	51	41	54	10	57	7	20	20	65	65	66	82	540
13-Mar-26 02:00	52	41	54	10	56	7	20	20	64	66	66	82	538
13-Mar-26 03:00	52	42	54	10	57	8	20	20	63	66	67	85	542
13-Mar-26 04:00	48	41	54	10	57	8	21	21	68	67	68	82	544
13-Mar-26 05:00	49	42	54	9	56	7	20	20	67	66	66	84	539
13-Mar-26 06:00	48	39	54	10	56	7	21	20	68	65	67	82	538
13-Mar-26 07:00	48	39	54	9	56	7	21	20	62	66	66	85	534
13-Mar-26 08:00	48	39	54	9	56	7	21	20	65	68	64	85	536
13-Mar-26 09:00	48	39	54	10	56	7	21	21	59	68	64	84	532
13-Mar-26 10:00	47	38	54	10	57	7	20	19	66	69	65	83	535
13-Mar-26 11:00	48	39	55	10	57	8	20	21	66	67	66	85	540

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
13-Mar-26 12:00	47	38	55	10	57	7	20	19	67	69	65	85	538
13-Mar-26 13:00	48	38	54	9	56	7	20	20	68	67	67	87	542
13-Mar-26 14:00	47	38	54	10	57	7	20	20	70	63	71	87	544
13-Mar-26 15:00	47	38	54	10	57	8	20	20	64	66	68	85	536
13-Mar-26 16:00	47	38	54	10	56	8	20	20	70	68	66	87	544
13-Mar-26 17:00	46	37	55	10	57	7	20	20	75	67	66	90	550
13-Mar-26 18:00	46	37	54	10	56	7	20	20	69	81	63	85	549
13-Mar-26 19:00	48	41	54	9	56	8	25	25	54	80	81	78	558
13-Mar-26 20:00	45	36	54	10	57	8	21	21	68	66	68	87	539
13-Mar-26 21:00	50	37	55	10	57	7	21	21	66	67	68	85	542
13-Mar-26 22:00	50	42	55	9	57	7	25	27	81	66	67	83	570
13-Mar-26 23:00	47	37	55	10	56	7	20	21	69	65	67	87	543
14-Mar-26 00:00	47	37	55	10	56	7	21	21	75	66	67	91	553
14-Mar-26 01:00	46	37	55	10	56	8	20	20	70	66	67	88	544
14-Mar-26 02:00	47	37	55	10	57	7	20	20	67	66	67	86	539
14-Mar-26 03:00	46	37	56	10	57	7	20	20	67	66	67	86	540
14-Mar-26 04:00	47	38	55	10	56	7	21	20	70	66	67	88	544
14-Mar-26 05:00	47	38	55	10	56	7	21	20	67	66	68	86	540
14-Mar-26 06:00	46	38	55	10	57	7	21	21	69	65	67	87	542
14-Mar-26 07:00	47	37	55	10	57	7	20	19	72	66	67	88	545
14-Mar-26 08:00	47	37	54	10	56	8	20	20	68	68	64	88	541
14-Mar-26 09:00	47	38	55	10	57	7	20	20	61	68	64	103	549
14-Mar-26 10:00	48	38	56	10	58	7	20	20	50	68	64	98	535
14-Mar-26 11:00	47	38	55	10	57	7	20	20	66	68	63	88	542
14-Mar-26 12:00	48	39	56	10	57	8	20	19	68	69	65	85	544
14-Mar-26 13:00	58	38	56	10	56	8	20	19	68	69	65	87	553
14-Mar-26 14:00	47	38	55	10	56	7	21	19	67	69	65	88	543
14-Mar-26 15:00	47	37	55	10	57	7	21	20	69	69	65	88	545
14-Mar-26 16:00	47	38	55	10	56	7	21	19	77	69	65	87	550
14-Mar-26 17:00	47	43	56	10	57	7	20	19	71	68	66	87	550
14-Mar-26 18:00	47	43	55	10	57	7	20	20	77	67	65	91	560
14-Mar-26 19:00	47	42	55	10	57	7	20	19	73	66	67	89	551
14-Mar-26 20:00	47	42	55	10	57	8	20	20	72	66	67	89	553
14-Mar-26 21:00	47	42	56	10	57	7	22	20	71	66	83	87	567
14-Mar-26 22:00	47	42	55	10	56	7	20	19	69	66	67	86	545
14-Mar-26 23:00	46	42	56	10	56	7	20	19	69	65	66	88	544
15-Mar-26 00:00	47	42	55	10	57	8	21	20	65	66	67	86	542
15-Mar-26 01:00	46	42	56	10	57	7	20	20	71	65	67	86	547
15-Mar-26 02:00	46	41	55	10	56	7	20	20	69	65	66	87	543
15-Mar-26 03:00	47	42	55	10	57	7	20	19	69	66	67	86	546
15-Mar-26 04:00	46	42	55	10	57	8	20	20	69	66	67	88	547
15-Mar-26 05:00	46	42	55	10	57	7	20	20	68	65	67	88	545
15-Mar-26 06:00	46	42	55	10	56	7	20	19	71	65	66	89	547
15-Mar-26 07:00	46	39	55	10	57	8	20	22	64	65	66	85	538

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
15-Mar-26 08:00	47	40	55	9	57	7	20	21	69	68	64	87	544
15-Mar-26 09:00	47	40	56	10	57	7	21	21	69	68	64	88	547
15-Mar-26 10:00	47	42	55	10	57	7	19	21	61	66	78	85	549
15-Mar-26 11:00	47	40	54	10	56	8	20	21	69	70	79	88	563
15-Mar-26 12:00	47	41	54	10	57	7	20	20	67	67	79	87	556
15-Mar-26 13:00	47	40	54	10	57	7	20	20	66	68	77	87	554
15-Mar-26 14:00	48	41	55	9	56	7	20	21	65	65	83	87	558
15-Mar-26 15:00	47	42	54	9	56	7	20	21	65	66	82	87	556
15-Mar-26 16:00	47	42	54	10	57	7	20	21	70	66	81	87	561
15-Mar-26 17:00	48	42	54	9	57	7	20	21	71	66	82	88	565
15-Mar-26 18:00	47	44	54	10	57	7	21	22	70	66	82	88	567
15-Mar-26 19:00	47	42	55	10	57	7	20	21	72	66	82	87	568
15-Mar-26 20:00	48	42	55	10	56	8	20	21	72	66	81	91	569
15-Mar-26 21:00	48	43	55	10	56	8	20	21	70	66	83	89	569
15-Mar-26 22:00	47	42	55	10	56	8	20	21	70	66	81	87	562
15-Mar-26 23:00	47	42	55	10	57	7	20	21	76	65	81	82	562
16-Mar-26 00:00	47	42	55	10	57	8	20	21	75	66	82	84	567
16-Mar-26 01:00	46	42	55	10	56	7	21	21	73	65	81	84	562
16-Mar-26 02:00	48	43	56	10	56	7	20	21	75	66	82	81	566
16-Mar-26 03:00	47	42	55	10	57	7	20	21	74	66	82	85	566
16-Mar-26 04:00	47	42	55	10	57	7	21	22	77	66	82	81	565
16-Mar-26 05:00	47	42	55	10	57	7	21	22	73	66	82	85	567
16-Mar-26 06:00	47	42	55	10	57	7	21	21	73	65	81	84	563
16-Mar-26 07:00	49	42	56	9	57	7	20	21	67	66	81	88	564
16-Mar-26 08:00	50	45	55	10	56	7	21	21	66	66	81	91	570
16-Mar-26 09:00	50	45	55	10	57	7	21	22	65	66	82	91	569
16-Mar-26 10:00	50	44	55	10	57	8	18	19	70	65	87	92	574
16-Mar-26 11:00	50	44	55	10	57	8	21	21	67	66	82	87	567
16-Mar-26 12:00	49	43	55	10	56	7	21	22	61	65	84	93	566
16-Mar-26 13:00	49	42	55	10	57	7	21	22	69	66	82	91	571
16-Mar-26 14:00	49	42	55	10	56	8	20	21	69	65	81	88	563
16-Mar-26 15:00	50	43	55	10	57	8	21	22	70	67	83	87	572
16-Mar-26 16:00	49	42	55	10	56	7	21	21	72	66	82	87	568
16-Mar-26 17:00	49	42	55	10	57	7	20	21	75	65	80	86	567
16-Mar-26 18:00	51	42	56	10	57	7	20	21	70	66	82	87	569
16-Mar-26 19:00	52	42	55	10	56	7	21	21	70	66	81	86	567
16-Mar-26 20:00	51	43	55	10	57	7	20	21	70	65	81	85	565
16-Mar-26 21:00	54	43	55	10	57	7	20	20	75	65	67	84	558
16-Mar-26 22:00	51	42	55	10	57	7	21	21	74	66	68	91	562
16-Mar-26 23:00	51	42	54	10	56	7	19	20	77	65	67	94	562
17-Mar-26 00:00	52	42	55	10	56	8	20	21	72	66	67	90	558
17-Mar-26 01:00	51	42	55	10	56	7	21	22	74	66	67	90	561
17-Mar-26 02:00	51	41	54	9	56	7	21	21	73	66	67	89	556
17-Mar-26 03:00	51	42	55	10	57	7	21	22	74	66	68	90	562

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
17-Mar-26 04:00	51	41	55	10	56	7	20	21	72	65	67	89	554
17-Mar-26 05:00	51	42	55	10	56	7	21	21	68	66	67	86	550
17-Mar-26 06:00	60	40	54	10	56	7	21	21	71	65	67	84	554
17-Mar-26 07:00	51	41	54	10	56	7	21	21	65	65	67	86	545
17-Mar-26 08:00	49	42	55	10	57	7	21	21	70	66	68	86	552
17-Mar-26 09:00	48	42	55	9	57	7	20	20	70	65	67	86	547
17-Mar-26 10:00	49	42	55	10	57	7	20	20	66	66	68	86	546
17-Mar-26 11:00	49	42	55	9	57	7	20	20	75	66	68	90	559
17-Mar-26 12:00	53	42	55	10	56	7	21	21	70	66	68	89	559
17-Mar-26 13:00	58	43	55	10	56	7	20	20	65	65	67	83	551
17-Mar-26 14:00	50	42	54	9	57	7	21	21	70	65	67	86	549
17-Mar-26 15:00	49	42	54	9	56	7	21	21	79	66	68	92	565
17-Mar-26 16:00	50	42	53	9	57	7	21	21	75	66	68	89	557
17-Mar-26 17:00	49	42	55	10	57	7	21	21	68	66	67	86	548
17-Mar-26 18:00	49	41	55	10	57	7	20	21	72	65	67	88	553
17-Mar-26 19:00	50	42	55	10	57	7	20	20	70	65	67	86	550
17-Mar-26 20:00	50	42	55	10	56	7	20	20	73	66	66	86	552
17-Mar-26 21:00	50	43	55	10	57	7	22	21	74	67	69	88	562
17-Mar-26 22:00	50	42	55	10	57	7	21	21	76	66	68	87	559
17-Mar-26 23:00	51	42	55	10	56	7	21	21	74	66	68	87	559
18-Mar-26 00:00	50	41	55	9	57	7	21	21	66	66	68	85	546
18-Mar-26 01:00	50	42	54	9	57	7	21	20	73	65	67	88	554
18-Mar-26 02:00	50	42	54	10	56	7	21	20	76	66	67	92	561
18-Mar-26 03:00	49	41	54	10	56	8	21	21	71	65	67	86	549
18-Mar-26 04:00	49	41	55	9	57	7	21	21	72	65	67	88	552
18-Mar-26 05:00	49	41	54	10	56	7	21	21	72	65	67	87	550
18-Mar-26 06:00	49	41	54	10	56	7	21	21	71	65	67	86	549
18-Mar-26 07:00	49	41	54	9	57	7	21	21	71	65	68	89	552
18-Mar-26 08:00	50	42	54	10	56	7	21	20	73	66	67	86	553
18-Mar-26 09:00	50	42	54	10	57	7	21	21	67	65	67	86	547
18-Mar-26 10:00	49	41	54	9	56	7	22	21	71	67	65	89	551
18-Mar-26 11:00	50	42	58	12	54	7	21	20	66	66	65	86	545
18-Mar-26 12:00	50	42	55	10	57	7	21	20	72	67	65	89	554
18-Mar-26 13:00	50	50	55	10	56	7	22	20	74	82	64	89	579
18-Mar-26 14:00	50	42	56	10	57	7	24	23	78	85	69	87	587
18-Mar-26 15:00	50	42	55	10	56	7	22	21	75	81	66	84	569
18-Mar-26 16:00	49	44	55	10	56	7	22	21	81	67	65	89	566
18-Mar-26 17:00	51	43	55	10	57	7	22	21	82	67	66	89	570
18-Mar-26 18:00	52	44	56	10	57	8	22	21	80	67	66	88	569
18-Mar-26 19:00	51	44	55	10	57	7	22	22	78	67	65	90	568
18-Mar-26 20:00	52	45	55	10	56	7	22	21	77	68	66	92	571
18-Mar-26 21:00	47	44	55	10	56	7	22	20	74	68	66	91	562
18-Mar-26 22:00	47	44	55	10	57	7	23	22	84	68	66	89	569
18-Mar-26 23:00	47	44	55	10	57	7	22	20	84	69	66	88	569

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
19-Mar-26 00:00	47	44	55	10	56	7	22	21	79	68	65	93	567
19-Mar-26 01:00	47	44	55	10	56	7	22	20	81	68	65	94	569
19-Mar-26 02:00	46	43	55	9	56	7	22	22	81	67	65	93	568
19-Mar-26 03:00	46	44	55	10	57	7	22	21	85	67	64	87	564
19-Mar-26 04:00	47	44	55	10	57	7	22	21	83	67	65	90	568
19-Mar-26 05:00	46	43	54	9	57	7	23	21	79	68	66	93	565
19-Mar-26 06:00	46	43	54	10	56	7	22	21	81	67	65	93	565
19-Mar-26 07:00	46	45	55	10	57	7	23	22	74	68	65	91	562
19-Mar-26 08:00	46	44	55	10	57	7	21	20	71	81	65	86	563
19-Mar-26 09:00	46	43	55	10	57	7	22	21	76	68	65	90	559
19-Mar-26 10:00	46	44	55	10	57	7	23	21	75	68	65	91	561
19-Mar-26 11:00	46	43	55	10	57	7	22	21	81	68	65	93	568
19-Mar-26 12:00	47	44	54	10	57	7	22	21	78	84	66	89	579
19-Mar-26 13:00	48	44	55	10	56	8	22	21	75	81	71	87	577
19-Mar-26 14:00	47	43	55	10	56	7	22	21	79	84	65	87	577
19-Mar-26 15:00	48	44	55	10	57	7	22	20	76	82	65	87	574
19-Mar-26 16:00	48	44	55	10	56	7	23	22	82	87	67	90	590
19-Mar-26 17:00	47	43	54	10	56	7	21	20	90	93	79	94	615
19-Mar-26 18:00	48	44	55	10	57	7	22	21	79	82	66	88	579
19-Mar-26 19:00	47	43	55	10	57	7	22	21	80	81	65	87	573
19-Mar-26 20:00	47	44	55	10	57	7	22	21	80	81	65	87	575
19-Mar-26 21:00	49	44	55	10	56	7	22	21	79	81	66	87	577
19-Mar-26 22:00	50	44	55	10	57	8	22	21	78	84	65	89	582
19-Mar-26 23:00	50	43	55	10	57	7	22	21	78	83	65	88	580
20-Mar-26 00:00	50	44	55	10	56	7	22	20	80	85	65	89	583
20-Mar-26 01:00	50	44	55	10	57	7	22	21	80	86	65	89	586
20-Mar-26 02:00	49	43	55	10	57	7	22	20	81	86	65	89	585
20-Mar-26 03:00	49	44	55	10	57	8	22	21	81	86	64	90	587
20-Mar-26 04:00	50	44	55	10	57	7	22	21	79	84	65	88	581
20-Mar-26 05:00	50	43	55	10	57	7	21	21	80	85	65	88	583
20-Mar-26 06:00	51	44	55	9	57	7	22	21	84	68	65	92	576
20-Mar-26 07:00	51	44	55	10	57	7	22	20	85	68	65	92	576
20-Mar-26 08:00	51	43	56	10	56	7	22	21	87	66	67	93	577
20-Mar-26 09:00	51	43	55	10	56	7	22	21	68	65	67	87	550
20-Mar-26 10:00	51	45	55	9	56	7	21	20	86	67	68	87	572
20-Mar-26 11:00	51	44	54	10	57	7	21	20	84	66	67	87	568
20-Mar-26 12:00	57	42	55	9	56	7	22	21	84	67	68	90	579
20-Mar-26 13:00	56	43	54	10	56	7	22	21	84	68	68	89	578
20-Mar-26 14:00	52	43	55	9	57	7	21	20	82	66	67	91	573
20-Mar-26 15:00	53	44	55	10	57	7	22	22	83	67	68	88	575
20-Mar-26 16:00	54	46	54	10	56	8	21	21	90	67	68	87	580
20-Mar-26 17:00	53	44	53	9	56	7	22	21	91	67	68	88	578
20-Mar-26 18:00	53	43	55	9	56	7	22	20	86	80	67	86	584
20-Mar-26 19:00	52	44	55	9	56	7	22	21	85	79	67	86	584

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
20-Mar-26 20:00	53	44	54	10	56	8	22	21	83	79	68	87	585
20-Mar-26 21:00	53	43	55	9	57	7	21	21	85	79	67	87	583
20-Mar-26 22:00	53	44	54	10	56	7	22	21	79	79	67	86	578
20-Mar-26 23:00	53	44	55	9	57	7	21	20	82	79	67	86	581
21-Mar-26 00:00	53	44	54	10	57	8	22	20	80	80	68	87	582
21-Mar-26 01:00	53	44	54	10	57	8	22	20	85	79	67	86	584
21-Mar-26 02:00	53	44	55	10	57	7	22	21	79	81	69	87	583
21-Mar-26 03:00	53	44	54	10	57	7	22	21	79	80	68	87	582
21-Mar-26 04:00	53	45	54	10	57	7	22	21	80	80	68	87	584
21-Mar-26 05:00	53	44	55	10	57	7	21	21	85	79	67	86	586
21-Mar-26 06:00	53	44	55	9	57	7	22	21	81	79	67	87	582
21-Mar-26 07:00	52	44	54	9	57	7	22	20	82	79	67	86	578
21-Mar-26 08:00	53	45	55	10	57	8	21	21	79	79	67	87	581
21-Mar-26 09:00	53	45	53	9	56	7	21	20	82	80	68	87	583
21-Mar-26 10:00	53	43	54	9	57	7	21	20	78	80	68	87	580
21-Mar-26 11:00	53	45	55	10	57	7	21	20	80	79	67	87	579
21-Mar-26 12:00	53	44	54	9	56	7	22	21	77	80	68	88	578
21-Mar-26 13:00	52	47	55	9	57	7	22	21	81	79	67	82	580
21-Mar-26 14:00	53	44	54	10	56	8	21	20	79	82	65	89	581
21-Mar-26 15:00	53	44	53	9	56	7	20	19	87	88	65	96	598
21-Mar-26 16:00	53	44	55	9	57	7	22	21	85	95	69	91	609
21-Mar-26 17:00	53	44	54	10	56	7	22	21	85	95	68	91	604
21-Mar-26 18:00	54	45	54	10	57	8	21	20	83	94	67	90	603
21-Mar-26 19:00	53	43	54	10	56	7	21	21	83	94	68	90	599
21-Mar-26 20:00	53	44	54	10	56	7	22	21	81	94	67	90	600
21-Mar-26 21:00	53	44	55	9	56	7	21	21	82	93	67	89	599
21-Mar-26 22:00	53	43	55	9	57	7	22	20	83	95	81	91	616
21-Mar-26 23:00	53	43	55	9	57	7	22	20	83	94	81	90	616
22-Mar-26 00:00	53	43	54	9	57	7	22	20	81	93	82	89	610
22-Mar-26 01:00	53	44	54	9	57	7	22	21	81	92	80	89	610
22-Mar-26 02:00	53	44	55	10	57	7	22	21	83	95	81	90	617
22-Mar-26 03:00	53	44	55	10	57	7	21	20	81	93	81	89	611
22-Mar-26 04:00	53	44	54	10	57	7	22	20	80	87	77	87	598
22-Mar-26 05:00	53	45	54	10	57	7	21	20	79	81	81	86	594
22-Mar-26 06:00	52	44	54	9	57	7	21	20	76	85	80	86	591
22-Mar-26 07:00	53	44	54	9	57	7	21	20	74	84	81	86	589
22-Mar-26 08:00	53	44	54	9	57	7	22	21	74	87	68	89	584
22-Mar-26 09:00	53	44	54	9	57	7	22	20	81	80	68	90	586
22-Mar-26 10:00	53	44	55	10	57	8	21	20	88	86	68	95	605
22-Mar-26 11:00	53	45	54	10	56	7	22	21	90	86	69	93	606
22-Mar-26 12:00	53	45	54	10	57	7	21	20	85	84	67	92	595
22-Mar-26 13:00	53	46	55	10	57	8	21	20	81	80	70	90	592
22-Mar-26 14:00	53	44	55	9	57	7	21	21	83	80	67	90	589
22-Mar-26 15:00	53	44	54	10	56	7	22	20	82	81	68	90	587

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
22-Mar-26 16:00	53	44	54	10	57	7	22	20	82	79	67	90	585
22-Mar-26 17:00	53	45	54	10	57	7	21	20	79	79	68	88	581
22-Mar-26 18:00	53	44	54	9	57	7	22	20	81	80	68	89	583
22-Mar-26 19:00	53	44	53	10	56	7	22	21	78	80	68	88	581
22-Mar-26 20:00	53	45	55	10	57	8	21	20	82	79	67	90	586
22-Mar-26 21:00	53	44	55	10	57	7	21	20	82	79	77	91	596
22-Mar-26 22:00	54	46	55	10	57	8	21	21	83	82	81	91	608
22-Mar-26 23:00	53	44	54	9	57	7	22	21	81	80	81	90	600
23-Mar-26 00:00	53	44	54	10	56	7	22	21	83	80	82	90	600
23-Mar-26 01:00	53	44	55	10	57	7	21	21	81	80	82	89	600
23-Mar-26 02:00	53	44	54	10	57	7	21	20	80	79	81	89	595
23-Mar-26 03:00	52	43	55	10	57	7	22	20	82	79	67	90	586
23-Mar-26 04:00	53	44	54	10	56	8	21	20	82	80	67	89	585
23-Mar-26 05:00	53	43	55	10	57	8	23	21	81	80	68	90	588
23-Mar-26 06:00	53	44	54	9	56	7	21	21	81	80	67	90	583
23-Mar-26 07:00	53	44	55	10	57	7	21	20	81	82	65	90	585
23-Mar-26 08:00	53	44	54	9	57	7	22	20	79	83	66	89	583
23-Mar-26 09:00	52	44	55	10	57	7	21	20	79	83	66	89	584
23-Mar-26 10:00	52	44	54	9	56	7	22	21	81	83	65	89	584
23-Mar-26 11:00	52	44	54	9	56	7	21	21	82	82	65	90	584
23-Mar-26 12:00	52	44	54	9	57	7	22	21	80	83	66	89	585
23-Mar-26 13:00	52	44	54	10	57	7	22	20	84	83	65	88	586
23-Mar-26 14:00	58	44	54	10	56	7	21	21	70	79	67	86	574
23-Mar-26 15:00	53	45	54	10	56	7	20	19	83	83	66	88	585
23-Mar-26 16:00	52	44	55	10	57	8	21	19	84	84	66	89	591
23-Mar-26 17:00	52	44	55	10	57	7	22	20	81	79	67	89	584
23-Mar-26 18:00	52	44	55	10	57	7	22	20	83	80	68	87	586
23-Mar-26 19:00	53	44	56	10	58	8	22	21	82	80	68	88	590
23-Mar-26 20:00	53	45	56	10	57	8	22	21	81	80	68	88	589
23-Mar-26 21:00	53	44	56	10	58	7	22	21	81	78	67	90	587
23-Mar-26 22:00	52	43	56	10	58	8	23	21	81	80	68	88	588
23-Mar-26 23:00	53	44	56	10	58	8	21	20	79	79	67	88	584
24-Mar-26 00:00	53	44	55	10	58	7	22	21	82	79	67	86	584
24-Mar-26 01:00	52	43	56	10	58	7	22	21	80	79	67	86	583
24-Mar-26 02:00	53	44	55	10	58	8	21	21	80	86	68	89	592
24-Mar-26 03:00	54	45	55	10	57	8	21	20	82	88	68	91	600
24-Mar-26 04:00	54	45	56	10	58	8	22	21	79	86	68	89	594
24-Mar-26 05:00	52	43	55	10	57	8	21	21	81	85	67	89	589
24-Mar-26 06:00	53	45	55	10	58	7	22	21	77	83	68	88	585
24-Mar-26 07:00	52	44	56	10	58	7	21	21	81	87	65	89	591
24-Mar-26 08:00	53	44	56	10	57	7	22	21	80	85	65	89	588
24-Mar-26 09:00	53	44	55	10	57	8	21	20	78	83	65	88	581
24-Mar-26 10:00	53	45	55	10	57	8	21	20	77	85	66	89	585
24-Mar-26 11:00	53	44	54	10	57	8	21	20	69	84	65	89	574

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
24-Mar-26 12:00	53	44	55	10	58	7	22	21	73	87	66	90	586
24-Mar-26 13:00	53	44	62	14	57	7	22	21	61	97	66	97	601
24-Mar-26 14:00	53	48	55	10	58	7	21	20	63	92	66	93	586
24-Mar-26 15:00	53	49	56	10	57	8	22	20	74	84	66	87	586
24-Mar-26 16:00	52	44	55	10	57	7	22	21	74	82	66	90	580
24-Mar-26 17:00	52	44	55	9	57	7	22	20	79	83	66	92	586
24-Mar-26 18:00	53	44	55	10	56	7	21	21	80	82	65	89	584
24-Mar-26 19:00	53	44	55	10	57	7	22	20	82	80	68	90	588
24-Mar-26 20:00	52	44	55	10	57	7	21	21	85	88	65	91	595
24-Mar-26 21:00	53	45	55	10	57	7	22	20	84	89	66	89	597
24-Mar-26 22:00	53	45	55	10	57	7	22	20	86	91	66	87	598
24-Mar-26 23:00	54	45	55	10	57	7	22	21	83	88	66	87	596
25-Mar-26 00:00	53	44	56	10	57	8	22	20	83	87	66	90	595
25-Mar-26 01:00	53	44	56	10	57	7	22	20	80	85	65	88	587
25-Mar-26 02:00	53	44	56	10	56	7	21	21	82	89	66	92	596
25-Mar-26 03:00	53	45	55	10	56	7	21	20	82	87	65	89	591
25-Mar-26 04:00	53	45	56	10	57	7	21	20	81	87	65	91	593
25-Mar-26 05:00	53	44	55	10	57	7	21	20	80	80	64	86	576
25-Mar-26 06:00	53	44	56	10	57	7	21	20	84	90	65	93	600
25-Mar-26 07:00	53	45	55	10	57	7	22	21	80	85	80	87	601
25-Mar-26 08:00	53	44	55	10	56	7	21	20	81	86	79	90	601
25-Mar-26 09:00	53	44	56	10	57	7	22	21	81	86	79	89	605
25-Mar-26 10:00	53	44	56	10	57	7	22	21	80	85	79	89	604
25-Mar-26 11:00	53	44	56	10	57	7	21	20	81	86	79	90	604
25-Mar-26 12:00	53	44	56	10	56	8	21	20	77	84	84	88	601
25-Mar-26 13:00	53	44	56	10	57	7	21	20	80	85	85	89	607
25-Mar-26 14:00	53	44	55	10	64	11	22	20	77	82	82	88	608
25-Mar-26 15:00	53	44	56	10	58	7	23	21	87	92	80	94	625
25-Mar-26 16:00	53	45	56	10	57	8	21	20	87	91	80	94	621
25-Mar-26 17:00	53	44	55	10	58	7	21	20	84	89	80	92	613
25-Mar-26 18:00	54	45	56	10	58	7	21	20	87	91	80	94	622
25-Mar-26 19:00	53	44	55	10	58	8	22	21	81	84	81	89	606
25-Mar-26 20:00	53	45	55	10	57	8	21	20	83	91	81	93	617
25-Mar-26 21:00	54	45	55	10	58	8	22	20	81	86	81	90	609
25-Mar-26 22:00	53	45	55	10	57	8	21	21	81	84	81	87	603
25-Mar-26 23:00	54	44	56	10	57	8	21	20	82	88	80	91	611
26-Mar-26 00:00	53	45	55	10	58	8	21	21	82	87	81	90	610
26-Mar-26 01:00	53	44	55	10	58	8	21	21	80	84	81	89	604
26-Mar-26 02:00	53	44	55	10	57	8	21	20	83	88	81	91	610
26-Mar-26 03:00	52	44	55	10	58	8	21	20	84	88	81	91	612
26-Mar-26 04:00	53	45	55	10	58	7	22	20	84	88	81	91	616
26-Mar-26 05:00	54	44	55	10	58	7	21	20	82	88	80	90	609
26-Mar-26 06:00	54	45	56	10	58	8	21	20	81	86	81	89	608
26-Mar-26 07:00	52	44	55	10	57	7	22	21	85	90	81	92	615

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
26-Mar-26 08:00	54	45	55	10	57	8	22	21	81	84	81	87	603
26-Mar-26 09:00	54	44	54	10	57	8	21	20	80	83	81	87	600
26-Mar-26 10:00	54	43	55	10	58	8	22	21	88	67	68	94	588
26-Mar-26 11:00	54	44	56	10	58	7	22	21	94	67	68	92	593
26-Mar-26 12:00	58	45	55	10	58	8	21	20	78	94	67	81	595
26-Mar-26 13:00	58	44	55	10	58	8	23	21	72	81	69	83	581
26-Mar-26 14:00	52	43	54	10	56	7	22	20	84	88	67	85	587
26-Mar-26 15:00	59	44	54	10	56	7	21	21	96	100	67	96	632
26-Mar-26 16:00	53	44	55	10	58	8	22	20	94	99	68	95	626
26-Mar-26 17:00	53	44	54	9	57	7	22	20	99	101	67	96	630
26-Mar-26 18:00	53	44	56	10	58	8	21	20	94	97	68	93	622
26-Mar-26 19:00	54	47	56	10	57	7	21	19	92	97	81	93	634
26-Mar-26 20:00	54	47	56	10	58	8	21	21	86	91	81	87	618
26-Mar-26 21:00	54	43	57	10	58	8	22	20	81	88	81	86	607
26-Mar-26 22:00	54	46	57	10	58	8	20	19	78	84	80	87	600
26-Mar-26 23:00	54	46	56	10	58	7	22	21	80	80	82	87	604
27-Mar-26 00:00	52	42	54	10	56	7	30	23	70	60	85	84	574
27-Mar-26 01:00	60	45	62	13	0	0	31	21	85	83	85	92	576
27-Mar-26 02:00	51	42	60	13	0	0	24	20	91	89	88	97	576
27-Mar-26 03:00	52	42	60	13	0	0	24	21	92	89	87	96	576
27-Mar-26 04:00	52	42	60	13	0	0	24	22	90	88	86	95	574
27-Mar-26 05:00	51	42	60	13	0	0	24	21	92	90	88	97	578
27-Mar-26 06:00	52	42	60	13	0	0	24	22	96	92	91	98	590
27-Mar-26 07:00	52	42	59	13	0	0	25	22	91	91	89	98	582
27-Mar-26 08:00	52	43	61	13	0	0	24	21	93	90	89	97	583
27-Mar-26 09:00	52	42	59	13	0	0	29	21	92	94	87	99	588
27-Mar-26 10:00	52	43	62	13	0	0	30	20	90	95	86	96	588
27-Mar-26 11:00	53	43	60	13	0	0	30	20	87	102	89	97	595
27-Mar-26 12:00	52	43	61	13	0	0	30	21	86	104	90	98	597
27-Mar-26 13:00	58	54	63	13	0	0	49	20	102	115	104	108	686
27-Mar-26 14:00	58	63	59	12	0	0	50	21	89	106	93	99	650
27-Mar-26 15:00	58	55	59	12	0	0	50	21	85	103	89	97	629
27-Mar-26 16:00	58	57	61	12	0	0	50	20	84	100	86	96	625
27-Mar-26 17:00	59	57	61	12	0	0	50	20	84	102	89	97	629
27-Mar-26 18:00	58	56	58	12	0	0	50	20	96	111	98	103	661
27-Mar-26 19:00	59	53	59	12	0	0	50	21	90	105	91	98	637
27-Mar-26 20:00	60	57	60	12	0	0	51	21	85	102	87	95	631
27-Mar-26 21:00	60	54	57	12	0	0	50	20	88	104	90	97	633
27-Mar-26 22:00	53	44	61	12	0	0	27	20	87	105	71	99	577
27-Mar-26 23:00	53	44	58	12	0	0	20	20	90	106	71	100	573
28-Mar-26 00:00	52	45	60	12	0	0	21	20	88	105	71	98	572
28-Mar-26 01:00	53	45	59	12	0	0	21	20	86	105	71	99	569
28-Mar-26 02:00	52	44	61	12	0	0	22	21	89	105	72	99	577
28-Mar-26 03:00	53	44	58	12	0	0	21	20	89	106	71	99	573

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
28-Mar-26 04:00	52	46	61	12	0	0	21	21	90	106	72	100	581
28-Mar-26 05:00	53	44	59	12	0	0	21	20	87	106	71	99	572
28-Mar-26 06:00	52	44	58	12	0	0	21	20	91	104	71	101	575
28-Mar-26 07:00	52	44	58	12	0	0	21	20	94	104	71	102	577
28-Mar-26 08:00	52	43	58	12	0	0	22	20	92	102	71	100	572
28-Mar-26 09:00	52	44	57	12	0	0	23	20	96	103	71	101	580
28-Mar-26 10:00	52	45	58	12	0	0	22	20	88	103	84	97	580
28-Mar-26 11:00	53	45	60	12	0	0	23	20	87	104	85	98	587
28-Mar-26 12:00	52	43	59	12	0	0	22	20	91	106	85	98	588
28-Mar-26 13:00	52	44	59	12	0	0	22	20	86	102	84	92	574
28-Mar-26 14:00	52	44	57	12	0	0	22	20	88	105	84	93	578
28-Mar-26 15:00	53	44	59	12	0	0	22	20	87	104	85	93	577
28-Mar-26 16:00	52	43	60	12	0	0	22	20	89	105	84	94	582
28-Mar-26 17:00	52	44	59	12	0	0	22	20	86	105	84	93	577
28-Mar-26 18:00	52	43	58	12	0	0	23	20	87	105	85	94	579
28-Mar-26 19:00	52	44	57	12	0	0	23	21	88	104	85	93	580
28-Mar-26 20:00	53	44	59	12	0	0	22	20	87	104	85	93	578
28-Mar-26 21:00	52	44	59	12	0	0	22	20	94	106	85	97	592
28-Mar-26 22:00	52	43	60	12	0	0	23	20	88	106	85	94	582
28-Mar-26 23:00	52	44	60	12	0	0	23	20	87	104	84	93	579
29-Mar-26 00:00	51	44	59	12	0	0	23	20	88	105	85	94	581
29-Mar-26 01:00	52	45	59	12	0	0	23	20	89	105	85	94	583
29-Mar-26 02:00	51	43	57	12	0	0	23	20	92	108	85	96	586
29-Mar-26 03:00	52	44	57	12	0	0	23	21	91	108	85	96	590
29-Mar-26 04:00	51	43	58	12	0	0	23	20	92	107	85	96	586
29-Mar-26 05:00	51	44	59	11	0	0	22	20	90	107	85	95	584
29-Mar-26 06:00	52	44	57	11	0	0	24	21	62	117	92	108	587
29-Mar-26 07:00	51	44	60	12	0	0	23	20	85	111	84	99	589
29-Mar-26 08:00	52	43	60	12	0	0	24	19	89	106	85	99	590
29-Mar-26 09:00	52	44	59	12	0	0	32	20	71	103	85	94	571
29-Mar-26 10:00	57	59	58	12	0	0	42	20	91	103	95	98	635
29-Mar-26 11:00	57	61	59	12	0	0	44	20	80	87	85	110	614
29-Mar-26 12:00	57	59	57	12	0	0	44	20	86	90	84	113	622
29-Mar-26 13:00	63	60	60	12	0	0	44	20	84	88	84	113	627
29-Mar-26 14:00	57	58	60	12	0	0	44	20	84	88	84	112	619
29-Mar-26 15:00	57	60	59	12	0	0	45	21	90	101	85	110	639
29-Mar-26 16:00	57	61	58	12	0	0	44	20	88	98	85	110	632
29-Mar-26 17:00	57	59	58	12	0	0	44	20	85	97	85	109	625
29-Mar-26 18:00	57	60	59	12	0	0	44	20	84	95	85	113	629
29-Mar-26 19:00	57	58	56	12	0	0	45	20	82	95	85	109	620
29-Mar-26 20:00	58	61	60	12	0	0	44	20	84	97	85	111	632
29-Mar-26 21:00	58	58	58	12	0	0	45	20	81	94	85	115	626
29-Mar-26 22:00	58	61	60	12	0	0	44	20	80	92	85	115	627
29-Mar-26 23:00	58	59	59	12	0	0	45	20	79	93	85	114	624

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
30-Mar-26 00:00	58	58	60	12	0	0	44	20	80	93	85	114	622
30-Mar-26 01:00	58	58	60	12	0	0	44	20	82	94	84	115	629
30-Mar-26 02:00	58	58	57	12	0	0	44	20	85	97	85	117	632
30-Mar-26 03:00	58	61	61	12	0	0	45	19	81	97	85	116	635
30-Mar-26 04:00	58	61	60	12	0	0	44	21	84	96	85	117	636
30-Mar-26 05:00	58	59	58	12	0	0	44	20	86	97	84	118	636
30-Mar-26 06:00	58	58	58	12	0	0	44	20	86	96	85	117	634
30-Mar-26 07:00	57	59	59	12	0	0	44	20	83	94	85	117	630
30-Mar-26 08:00	57	61	58	12	0	0	44	20	81	93	86	116	626
30-Mar-26 09:00	57	61	59	12	0	0	44	20	81	93	86	115	628
30-Mar-26 10:00	56	60	59	12	0	0	44	20	80	90	84	116	622
30-Mar-26 11:00	57	62	60	12	0	0	44	20	78	90	85	115	624
30-Mar-26 12:00	58	59	59	12	0	0	44	20	78	90	84	108	612
30-Mar-26 13:00	63	61	63	14	0	0	44	20	81	93	84	111	635
30-Mar-26 14:00	63	62	62	14	0	0	44	20	84	96	84	113	641
30-Mar-26 15:00	63	66	57	12	0	0	45	20	80	92	85	110	631
30-Mar-26 16:00	62	61	59	12	0	0	44	20	84	96	88	114	642
30-Mar-26 17:00	62	58	59	12	0	0	45	20	87	97	90	115	645
30-Mar-26 18:00	63	52	59	12	0	0	44	20	92	96	89	113	641
30-Mar-26 19:00	62	52	59	12	0	0	45	21	90	94	86	112	632
30-Mar-26 20:00	60	53	58	12	0	0	44	20	88	93	85	112	627
30-Mar-26 21:00	61	54	59	12	0	0	45	20	92	97	89	114	641
30-Mar-26 22:00	61	52	58	12	0	0	44	20	92	96	89	113	636
30-Mar-26 23:00	60	53	58	12	0	0	44	20	93	96	90	114	640
31-Mar-26 00:00	61	52	59	12	0	0	44	20	92	97	88	113	638
31-Mar-26 01:00	61	52	58	12	0	0	45	21	95	99	92	116	648
31-Mar-26 02:00	61	53	59	12	0	0	45	20	94	99	91	114	647
31-Mar-26 03:00	61	52	58	12	0	0	45	20	94	99	91	111	644
31-Mar-26 04:00	61	54	58	12	0	0	45	20	94	99	91	118	653
31-Mar-26 05:00	61	54	58	12	0	0	44	20	97	101	94	120	660
31-Mar-26 06:00	60	54	57	12	0	0	44	20	96	100	92	119	654
31-Mar-26 07:00	60	54	58	12	0	0	45	21	97	99	92	120	659
31-Mar-26 08:00	63	51	58	12	0	0	50	20	107	91	85	122	659
31-Mar-26 09:00	65	56	58	11	0	0	51	20	107	79	84	129	659
31-Mar-26 10:00	75	65	58	11	0	0	41	23	108	78	86	132	677
31-Mar-26 11:00	74	66	58	12	0	0	47	19	108	67	83	136	671
31-Mar-26 12:00	75	66	59	12	0	0	51	20	109	91	96	136	714
31-Mar-26 13:00	76	69	57	11	0	0	51	19	109	74	84	136	686
31-Mar-26 14:00	75	68	58	11	0	0	37	20	109	79	85	133	674
31-Mar-26 15:00	75	67	59	12	0	0	35	18	108	84	91	122	672
31-Mar-26 16:00	73	66	58	12	0	0	37	20	95	95	94	130	680
31-Mar-26 17:00	74	66	57	11	0	0	40	20	93	91	90	132	675
31-Mar-26 18:00	75	68	59	11	0	0	40	20	90	86	85	132	667
31-Mar-26 19:00	68	67	58	11	0	0	42	21	98	96	89	109	657

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
31-Mar-26 20:00	67	68	56	12	0	0	44	21	99	95	85	115	661
31-Mar-26 21:00	66	68	57	11	0	0	41	17	90	83	84	107	624
31-Mar-26 22:00	61	67	57	11	0	0	45	22	95	93	89	108	648
31-Mar-26 23:00	61	68	58	11	0	0	43	20	103	101	94	113	672
01-Apr-26 00:00	64	71	58	11	0	0	43	21	102	98	91	115	673
01-Apr-26 01:00	64	71	61	12	0	0	43	20	118	116	115	87	706
01-Apr-26 02:00	64	70	59	12	0	0	43	19	116	114	112	84	694
01-Apr-26 03:00	64	70	58	12	0	0	43	20	119	117	114	87	705
01-Apr-26 04:00	64	69	59	12	0	0	43	20	119	116	114	86	703
01-Apr-26 05:00	64	70	60	12	0	0	43	20	120	118	116	89	712
01-Apr-26 06:00	64	69	61	13	0	0	43	20	109	106	104	75	666
01-Apr-26 07:00	64	71	60	12	0	0	43	20	107	104	102	73	657
01-Apr-26 08:00	62	70	60	12	0	0	43	20	111	108	106	72	665
01-Apr-26 09:00	60	67	58	12	0	0	43	19	112	110	108	74	663
01-Apr-26 10:00	60	67	59	12	0	0	43	20	116	115	112	79	682
01-Apr-26 11:00	61	68	60	12	0	0	43	20	114	113	111	76	677
01-Apr-26 12:00	60	67	60	12	0	0	43	20	107	103	101	76	651
01-Apr-26 13:00	60	67	60	12	0	0	43	20	115	113	110	76	676
01-Apr-26 14:00	64	67	60	13	0	0	43	20	110	108	106	77	668
01-Apr-26 15:00	60	67	60	12	0	0	43	20	115	112	109	76	674
01-Apr-26 16:00	60	67	62	12	0	0	43	20	116	115	112	85	691
01-Apr-26 17:00	60	66	60	12	0	0	43	19	112	111	108	85	676
01-Apr-26 18:00	61	67	60	12	0	0	43	20	115	114	112	87	693
01-Apr-26 19:00	61	68	60	12	0	0	43	20	111	111	108	87	682
01-Apr-26 20:00	60	68	61	12	0	0	43	20	103	115	112	88	682
01-Apr-26 21:00	59	67	60	12	0	0	43	20	102	116	111	86	677
01-Apr-26 22:00	59	67	59	12	0	0	43	19	103	117	113	88	681
01-Apr-26 23:00	60	68	60	12	0	0	44	21	102	116	113	87	682
02-Apr-26 00:00	59	67	60	12	0	0	46	21	101	115	112	88	681
02-Apr-26 01:00	60	68	60	12	0	0	46	20	106	120	117	90	699
02-Apr-26 02:00	59	67	58	12	0	0	49	20	103	116	113	87	685
02-Apr-26 03:00	59	67	59	12	0	0	50	20	104	117	114	87	690
02-Apr-26 04:00	59	68	60	12	0	0	49	19	101	114	111	87	680
02-Apr-26 05:00	59	67	59	12	0	0	49	20	97	112	109	87	673
02-Apr-26 06:00	59	66	59	12	0	0	50	20	102	117	113	87	687
02-Apr-26 07:00	59	67	60	12	0	0	49	20	101	115	112	87	683
02-Apr-26 08:00	59	67	59	12	0	0	49	20	102	115	112	87	681
02-Apr-26 09:00	58	67	59	12	0	0	49	20	103	115	112	87	683
02-Apr-26 10:00	60	67	58	12	0	0	49	20	99	115	112	88	681
02-Apr-26 11:00	60	67	60	12	0	0	49	20	98	113	110	87	678
02-Apr-26 12:00	59	67	61	12	0	0	50	20	98	112	110	88	677
02-Apr-26 13:00	59	72	60	12	0	0	49	20	114	115	91	87	680
02-Apr-26 14:00	58	67	63	13	0	0	49	19	113	112	87	87	668
02-Apr-26 15:00	57	67	58	12	0	0	50	20	117	114	85	88	667

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
02-Apr-26 16:00	59	67	57	12	0	0	50	21	116	111	85	87	665
02-Apr-26 17:00	60	67	58	12	0	0	50	20	116	114	90	87	673
02-Apr-26 18:00	60	68	59	12	0	0	50	20	119	117	94	90	688
02-Apr-26 19:00	60	66	59	12	0	0	50	20	113	110	84	87	661
02-Apr-26 20:00	61	68	57	12	0	0	50	21	104	122	94	87	675
02-Apr-26 21:00	60	67	59	12	0	0	50	20	99	118	90	87	662
02-Apr-26 22:00	60	67	59	12	0	0	50	21	102	121	92	87	672
02-Apr-26 23:00	60	67	58	12	0	0	50	21	94	113	86	87	648
03-Apr-26 00:00	61	67	58	12	0	0	49	20	98	116	88	87	655
03-Apr-26 01:00	61	67	59	12	0	0	50	20	99	118	88	87	660
03-Apr-26 02:00	61	67	59	12	0	0	50	20	96	108	86	87	645
03-Apr-26 03:00	60	66	59	12	0	0	49	20	102	111	93	87	659
03-Apr-26 04:00	61	68	58	12	0	0	49	19	100	110	88	86	650
03-Apr-26 05:00	60	68	60	12	0	0	50	20	102	111	90	86	659
03-Apr-26 06:00	61	67	59	12	0	0	50	20	99	107	90	87	651
03-Apr-26 07:00	60	67	59	12	0	0	49	20	105	114	96	86	668
03-Apr-26 08:00	60	67	59	12	0	0	50	20	107	117	100	87	679
03-Apr-26 09:00	60	67	59	12	0	0	49	19	108	114	96	86	669
03-Apr-26 10:00	59	67	58	12	0	0	50	20	104	113	93	87	663
03-Apr-26 11:00	59	67	59	12	0	0	50	21	99	107	87	87	648
03-Apr-26 12:00	60	68	59	12	0	0	50	20	84	94	85	87	618
03-Apr-26 13:00	59	66	58	12	0	0	49	20	78	90	84	86	601
03-Apr-26 14:00	59	68	59	12	0	0	50	20	74	87	84	86	598
03-Apr-26 15:00	59	67	58	12	0	0	50	20	82	93	85	86	611
03-Apr-26 16:00	59	67	59	12	0	0	44	20	81	93	85	86	606
03-Apr-26 17:00	59	67	58	12	0	0	44	20	81	92	85	85	603
03-Apr-26 18:00	59	67	59	12	0	0	44	20	92	102	84	85	625
03-Apr-26 19:00	60	67	58	12	0	0	44	20	90	96	84	86	617
03-Apr-26 20:00	59	67	58	11	0	0	44	20	91	96	84	86	617
03-Apr-26 21:00	59	67	58	11	0	0	43	0	95	99	92	86	611
03-Apr-26 22:00	60	66	59	11	0	0	44	0	94	98	87	85	604
03-Apr-26 23:00	61	67	59	12	0	0	48	0	99	103	96	86	631
04-Apr-26 00:00	62	68	57	11	0	0	50	0	99	102	93	86	630
04-Apr-26 01:00	62	68	58	12	0	0	50	0	92	97	85	87	610
04-Apr-26 02:00	62	67	58	12	0	0	39	0	87	90	86	88	588
04-Apr-26 03:00	62	67	58	12	0	0	27	0	93	97	86	87	589
04-Apr-26 04:00	62	67	58	12	0	0	27	0	83	87	86	87	568
04-Apr-26 05:00	62	68	58	11	0	0	21	0	88	93	85	87	574
04-Apr-26 06:00	61	67	59	12	0	0	21	0	85	90	86	87	568
04-Apr-26 07:00	61	68	57	12	0	0	21	0	96	100	86	87	588
04-Apr-26 08:00	62	67	58	12	0	0	21	0	96	100	86	87	588
04-Apr-26 09:00	61	67	59	12	0	0	21	0	98	102	88	88	597
04-Apr-26 10:00	61	67	58	12	0	0	21	0	95	101	86	87	587
04-Apr-26 11:00	61	68	58	12	0	0	20	0	100	102	87	87	594

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
04-Apr-26 12:00	66	68	58	12	0	0	21	0	98	103	92	87	604
04-Apr-26 13:00	61	67	59	12	0	0	21	0	107	97	88	85	598
04-Apr-26 14:00	61	68	59	12	0	0	21	0	101	105	90	85	601
04-Apr-26 15:00	60	67	59	12	0	0	21	0	101	104	89	85	598
04-Apr-26 16:00	60	67	60	12	0	0	21	0	101	104	91	85	601
04-Apr-26 17:00	60	67	59	12	0	0	21	0	95	99	85	86	583
04-Apr-26 18:00	61	67	59	12	0	0	21	0	97	101	87	85	590
04-Apr-26 19:00	61	66	59	12	0	0	21	0	95	98	85	85	583
04-Apr-26 20:00	62	67	59	12	0	0	21	0	93	97	85	85	578
04-Apr-26 21:00	61	66	58	11	0	0	21	0	95	98	84	85	580
04-Apr-26 22:00	61	67	59	11	0	0	20	0	93	99	85	85	580
04-Apr-26 23:00	61	66	58	12	0	0	21	0	94	97	85	85	579
05-Apr-26 00:00	62	67	58	11	0	0	21	0	97	100	85	85	585
05-Apr-26 01:00	62	66	58	12	0	0	21	0	95	100	85	84	583
05-Apr-26 02:00	61	67	59	11	0	0	21	0	98	101	85	85	589
05-Apr-26 03:00	62	67	57	12	0	0	21	0	96	99	85	85	584
05-Apr-26 04:00	61	67	58	11	0	0	21	0	96	99	85	85	583
05-Apr-26 05:00	61	67	59	11	0	0	21	0	96	100	85	85	584
05-Apr-26 06:00	62	66	58	12	0	0	20	0	95	100	84	84	581
05-Apr-26 07:00	62	67	56	11	0	0	21	0	92	96	85	85	577
05-Apr-26 08:00	61	67	58	12	0	0	21	0	95	99	85	85	582
05-Apr-26 09:00	61	66	58	12	0	0	21	0	96	99	85	85	582
05-Apr-26 10:00	61	66	58	11	0	0	21	0	99	103	91	85	595
05-Apr-26 11:00	61	66	58	12	0	0	21	0	97	100	86	85	586
05-Apr-26 12:00	60	65	58	12	0	0	21	0	98	100	86	85	585
05-Apr-26 13:00	60	72	60	12	0	0	21	0	97	102	90	85	599
05-Apr-26 14:00	60	71	57	11	0	0	21	0	97	101	88	85	593
05-Apr-26 15:00	60	67	62	13	0	0	20	0	99	101	86	86	594
05-Apr-26 16:00	60	67	58	12	0	0	20	0	101	104	91	86	599
05-Apr-26 17:00	60	66	59	12	0	0	21	0	101	103	89	86	597
05-Apr-26 18:00	61	67	59	12	0	0	21	0	98	102	87	86	592
05-Apr-26 19:00	61	67	59	12	0	0	21	0	98	101	86	86	590
05-Apr-26 20:00	62	67	58	12	0	0	21	0	97	99	85	87	587
05-Apr-26 21:00	62	68	58	12	0	0	21	0	93	97	85	87	581
05-Apr-26 22:00	62	67	59	12	0	0	21	0	98	102	88	87	594
05-Apr-26 23:00	61	67	59	12	0	0	21	0	97	102	87	86	592
06-Apr-26 00:00	61	67	57	12	0	0	20	0	96	100	85	86	584
06-Apr-26 01:00	62	67	58	11	0	0	21	0	94	97	85	87	582
06-Apr-26 02:00	62	67	59	12	0	0	21	0	96	101	85	87	590
06-Apr-26 03:00	61	67	57	12	0	0	21	0	99	104	90	85	596
06-Apr-26 04:00	62	67	57	12	0	0	20	0	95	99	84	86	582
06-Apr-26 05:00	62	67	58	11	0	0	21	0	95	99	85	86	584
06-Apr-26 06:00	61	66	59	12	0	0	21	0	93	98	84	86	581
06-Apr-26 07:00	62	67	58	12	0	0	21	0	92	97	84	86	580

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
06-Apr-26 08:00	61	67	59	12	0	0	22	0	92	96	85	87	580
06-Apr-26 09:00	58	46	59	12	0	0	21	0	101	104	91	87	578
06-Apr-26 10:00	52	45	59	12	0	0	21	0	105	107	93	88	582
06-Apr-26 11:00	52	45	58	11	0	0	21	0	101	104	91	87	572
06-Apr-26 12:00	52	44	57	12	0	0	20	0	96	109	91	87	569
06-Apr-26 13:00	52	44	57	12	0	0	20	0	95	109	88	87	564
06-Apr-26 14:00	52	44	60	12	0	0	21	0	94	108	88	87	565
06-Apr-26 15:00	52	45	59	12	0	0	20	0	96	110	91	87	570
06-Apr-26 16:00	52	44	58	12	0	0	21	0	94	109	90	88	568
06-Apr-26 17:00	52	44	59	12	0	0	21	0	97	111	92	88	575
06-Apr-26 18:00	52	44	58	12	0	0	21	0	94	109	89	87	565
06-Apr-26 19:00	51	44	57	12	0	0	21	0	102	112	93	90	583
06-Apr-26 20:00	52	44	57	12	0	0	21	0	104	101	85	88	564
06-Apr-26 21:00	52	44	58	12	0	0	21	0	106	102	84	87	566
06-Apr-26 22:00	52	44	60	12	0	0	20	0	106	104	85	87	569
06-Apr-26 23:00	52	44	59	12	0	0	20	0	107	104	85	88	570
07-Apr-26 00:00	51	45	59	11	0	0	20	0	108	107	88	87	576
07-Apr-26 01:00	51	44	56	12	0	0	21	0	108	106	87	88	574
07-Apr-26 02:00	52	44	58	12	0	0	22	0	105	102	85	87	566
07-Apr-26 03:00	51	45	58	12	0	0	21	0	104	101	86	88	566
07-Apr-26 04:00	52	44	58	12	0	0	21	0	103	100	84	87	561
07-Apr-26 05:00	52	44	60	12	0	0	21	0	103	101	84	87	564
07-Apr-26 06:00	52	44	58	12	0	0	21	0	103	99	84	87	560
07-Apr-26 07:00	52	44	59	12	0	0	20	0	110	109	91	87	583
07-Apr-26 08:00	52	44	59	12	0	0	21	0	108	104	85	88	572
07-Apr-26 09:00	52	44	59	12	0	0	21	0	104	114	85	88	577
07-Apr-26 10:00	51	44	58	12	0	0	21	0	81	108	84	87	546
07-Apr-26 11:00	52	44	58	12	0	0	21	0	79	105	84	87	542
07-Apr-26 12:00	53	44	59	12	0	0	20	0	80	106	84	87	545
07-Apr-26 13:00	57	45	59	12	0	0	21	0	82	107	87	86	556
07-Apr-26 14:00	54	45	59	12	0	0	20	0	84	107	88	87	554
07-Apr-26 15:00	53	44	59	12	0	0	21	0	82	106	86	87	548
07-Apr-26 16:00	53	44	60	12	0	0	21	0	82	103	84	88	547
07-Apr-26 17:00	53	44	59	12	0	0	21	0	85	86	85	88	534
07-Apr-26 18:00	54	46	60	12	0	0	21	0	83	95	70	87	528
07-Apr-26 19:00	54	46	60	12	0	0	21	0	81	88	71	87	520
07-Apr-26 20:00	53	46	60	12	0	0	21	0	82	89	71	87	522
07-Apr-26 21:00	53	45	59	12	0	0	21	0	83	89	70	87	519
07-Apr-26 22:00	53	44	59	12	0	0	21	0	82	88	71	87	518
07-Apr-26 23:00	53	44	61	12	0	0	20	0	81	86	71	87	515
08-Apr-26 00:00	52	43	59	12	0	0	21	0	82	87	71	87	515
08-Apr-26 01:00	53	44	61	12	0	0	21	0	82	89	71	87	521
08-Apr-26 02:00	53	45	61	12	0	0	21	0	81	89	71	87	520
08-Apr-26 03:00	53	45	60	13	0	0	21	0	84	90	70	87	523

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
08-Apr-26 04:00	53	45	60	12	0	0	21	0	83	90	70	87	520
08-Apr-26 05:00	53	43	59	12	0	0	21	0	83	89	71	87	519
08-Apr-26 06:00	53	45	61	12	0	0	21	0	81	86	70	87	516
08-Apr-26 07:00	53	43	60	12	0	0	21	0	78	84	70	87	509
08-Apr-26 08:00	53	44	59	12	0	0	21	0	78	84	71	88	512
08-Apr-26 09:00	53	45	61	13	0	0	23	0	71	71	73	89	498
08-Apr-26 10:00	53	44	59	12	0	0	20	0	76	67	70	87	489
08-Apr-26 11:00	53	44	59	12	0	0	21	0	87	69	71	87	504
08-Apr-26 12:00	53	45	62	13	0	0	21	0	83	67	71	87	504
08-Apr-26 13:00	54	49	59	12	0	0	20	0	86	65	70	87	503
08-Apr-26 14:00	53	44	59	12	0	0	21	0	77	68	71	88	494
08-Apr-26 15:00	53	44	59	12	0	0	21	0	83	66	70	87	496
08-Apr-26 16:00	53	44	60	12	0	0	21	0	78	67	70	87	492
08-Apr-26 17:00	53	45	58	12	0	0	20	0	88	66	70	92	504
08-Apr-26 18:00	53	44	58	12	0	0	21	0	82	67	70	87	494
08-Apr-26 19:00	53	46	59	12	0	0	20	0	89	66	70	86	501
08-Apr-26 20:00	53	45	60	12	0	0	21	0	89	67	66	90	502
08-Apr-26 21:00	53	44	59	12	0	0	21	0	86	67	70	86	498
08-Apr-26 22:00	53	44	59	12	0	0	21	0	80	66	70	86	492
08-Apr-26 23:00	53	44	60	12	0	0	21	0	78	66	70	86	491
09-Apr-26 00:00	53	44	58	12	0	0	21	0	81	67	70	86	492
09-Apr-26 01:00	53	44	59	12	0	0	21	0	89	67	71	87	503
09-Apr-26 02:00	53	44	59	12	0	0	21	0	88	66	71	87	500
09-Apr-26 03:00	53	44	58	12	0	0	21	0	99	67	70	96	520
09-Apr-26 04:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	93	71	86	518
09-Apr-26 05:00	52	42	58	12	0	0	23	0	81	90	71	87	516
09-Apr-26 06:00	53	45	59	12	0	0	21	0	78	91	70	86	516
09-Apr-26 07:00	53	44	60	12	0	0	21	0	76	87	71	87	510
09-Apr-26 08:00	53	44	58	12	0	0	21	0	75	89	71	87	510
09-Apr-26 09:00	53	44	59	12	0	0	21	0	80	93	72	87	521
09-Apr-26 10:00	53	45	59	12	0	0	21	0	75	88	71	87	511
09-Apr-26 11:00	52	44	59	12	0	0	20	0	76	89	70	87	509
09-Apr-26 12:00	53	44	59	12	0	0	21	0	82	93	71	88	523
09-Apr-26 13:00	53	44	59	12	0	0	21	0	81	94	70	86	521
09-Apr-26 14:00	53	44	59	12	0	0	20	0	92	105	70	87	542
09-Apr-26 15:00	53	44	59	12	0	0	20	0	86	98	70	86	529
09-Apr-26 16:00	53	44	59	12	0	0	21	0	83	97	71	87	527
09-Apr-26 17:00	53	44	59	12	0	0	21	0	78	90	71	86	515
09-Apr-26 18:00	53	44	60	12	0	0	20	0	83	98	70	85	525
09-Apr-26 19:00	53	44	59	12	0	0	21	0	80	85	71	86	511
09-Apr-26 20:00	54	45	58	12	0	0	21	0	80	80	70	86	505
09-Apr-26 21:00	50	45	59	12	0	0	21	0	81	87	71	86	512
09-Apr-26 22:00	54	45	59	12	0	0	21	0	83	81	71	87	513
09-Apr-26 23:00	53	45	59	12	0	0	21	0	82	88	71	87	517

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
10-Apr-26 00:00	54	45	59	12	0	0	21	0	81	81	72	87	512
10-Apr-26 01:00	53	44	60	12	0	0	21	0	80	89	70	87	515
10-Apr-26 02:00	53	44	58	12	0	0	21	0	79	90	71	86	513
10-Apr-26 03:00	53	44	59	12	0	0	21	0	80	93	70	86	519
10-Apr-26 04:00	53	44	57	12	0	0	22	0	81	94	71	87	519
10-Apr-26 05:00	53	44	58	12	0	0	21	0	81	94	71	87	521
10-Apr-26 06:00	53	44	59	12	0	0	21	0	80	93	70	86	519
10-Apr-26 07:00	53	44	58	12	0	0	21	0	79	92	71	86	515
10-Apr-26 08:00	52	44	60	12	0	0	21	0	81	95	71	87	523
10-Apr-26 09:00	52	44	60	12	0	0	20	0	79	88	70	87	512
10-Apr-26 10:00	53	44	59	12	0	0	20	0	86	98	71	87	530
10-Apr-26 11:00	53	44	59	12	0	0	20	0	79	80	69	86	504
10-Apr-26 12:00	53	45	60	12	0	0	20	0	84	93	71	87	525
10-Apr-26 13:00	53	44	59	12	0	0	20	0	84	78	70	87	508
10-Apr-26 14:00	57	45	58	12	0	0	22	0	86	101	72	88	541
10-Apr-26 15:00	53	44	58	12	0	0	20	0	80	85	70	87	509
10-Apr-26 16:00	53	44	58	12	0	0	20	0	79	87	70	87	511
10-Apr-26 17:00	53	44	60	12	0	0	21	0	80	87	71	87	514
10-Apr-26 18:00	52	44	60	12	0	0	20	0	78	84	70	86	507
10-Apr-26 19:00	53	44	57	12	0	0	20	0	82	91	70	87	517
10-Apr-26 20:00	53	44	57	12	0	0	21	0	80	90	71	87	516
10-Apr-26 21:00	53	45	59	12	0	0	21	0	80	81	72	88	510
10-Apr-26 22:00	53	44	59	12	0	0	20	0	79	83	71	87	507
10-Apr-26 23:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	81	71	87	506
11-Apr-26 00:00	53	45	60	12	0	0	21	0	80	84	72	87	514
11-Apr-26 01:00	53	44	60	12	0	0	20	0	79	81	70	87	506
11-Apr-26 02:00	53	44	59	12	0	0	20	0	79	83	70	87	508
11-Apr-26 03:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	85	71	87	511
11-Apr-26 04:00	53	44	60	12	0	0	21	0	78	87	71	87	512
11-Apr-26 05:00	52	44	59	12	0	0	20	0	79	89	70	87	513
11-Apr-26 06:00	53	44	60	12	0	0	21	0	80	81	72	88	511
11-Apr-26 07:00	53	45	60	12	0	0	21	0	78	81	71	87	507
11-Apr-26 08:00	53	44	59	12	0	0	21	0	82	81	71	88	510
11-Apr-26 09:00	53	45	59	12	0	0	20	0	79	80	70	82	500
11-Apr-26 10:00	53	44	59	12	0	0	21	0	82	82	71	83	508
11-Apr-26 11:00	53	44	60	12	0	0	20	0	80	86	70	82	508
11-Apr-26 12:00	53	44	60	12	0	0	20	0	80	82	70	83	505
11-Apr-26 13:00	53	49	60	12	0	0	21	0	77	86	70	82	509
11-Apr-26 14:00	52	44	62	13	0	0	21	0	82	89	70	82	517
11-Apr-26 15:00	53	44	62	13	0	0	20	0	78	84	70	83	507
11-Apr-26 16:00	53	44	60	12	0	0	20	0	87	97	70	82	525
11-Apr-26 17:00	53	44	59	12	0	0	20	0	93	94	70	85	529
11-Apr-26 18:00	53	44	60	12	0	0	21	0	88	94	71	86	529
11-Apr-26 19:00	53	44	57	12	0	0	21	0	81	93	71	88	520

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
11-Apr-26 20:00	53	44	60	12	0	0	21	0	80	93	70	87	520
11-Apr-26 21:00	53	45	58	12	0	0	21	0	80	93	71	87	520
11-Apr-26 22:00	53	44	59	12	0	0	21	0	80	94	71	87	519
11-Apr-26 23:00	53	44	60	12	0	0	21	0	85	98	71	87	531
12-Apr-26 00:00	53	45	59	12	0	0	21	0	80	86	86	87	527
12-Apr-26 01:00	53	44	59	12	0	0	20	0	79	88	84	87	526
12-Apr-26 02:00	52	43	59	12	0	0	21	0	78	94	84	87	531
12-Apr-26 03:00	53	44	60	12	0	0	22	0	80	91	85	87	533
12-Apr-26 04:00	53	44	58	12	0	0	21	0	79	85	85	88	525
12-Apr-26 05:00	54	45	57	12	0	0	21	0	80	85	85	87	525
12-Apr-26 06:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	83	84	87	522
12-Apr-26 07:00	53	44	60	12	0	0	21	0	78	86	85	87	526
12-Apr-26 08:00	53	45	58	12	0	0	21	0	78	83	85	87	521
12-Apr-26 09:00	53	44	59	12	0	0	21	0	76	82	85	87	520
12-Apr-26 10:00	53	44	60	12	0	0	20	0	76	81	84	86	516
12-Apr-26 11:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	82	84	87	522
12-Apr-26 12:00	53	44	58	12	0	0	21	0	76	82	84	86	516
12-Apr-26 13:00	53	44	60	12	0	0	21	0	77	82	85	87	521
12-Apr-26 14:00	53	44	60	12	0	0	19	0	81	94	84	86	532
12-Apr-26 15:00	53	44	59	12	0	0	21	0	71	83	85	87	515
12-Apr-26 16:00	53	44	58	12	0	0	21	0	78	82	84	87	520
12-Apr-26 17:00	53	44	60	12	0	0	20	0	77	81	84	87	518
12-Apr-26 18:00	54	46	58	12	0	0	21	0	79	83	85	87	524
12-Apr-26 19:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	80	85	87	521
12-Apr-26 20:00	53	44	59	12	0	0	20	0	78	79	83	86	514
12-Apr-26 21:00	53	44	59	12	0	0	21	0	78	92	71	87	517
12-Apr-26 22:00	53	45	58	12	0	0	20	0	80	87	70	86	512
12-Apr-26 23:00	53	44	57	12	0	0	21	0	80	94	71	87	517
13-Apr-26 00:00	53	44	59	12	0	0	21	0	78	90	71	87	515
13-Apr-26 01:00	54	45	59	12	0	0	21	0	78	93	71	87	522
13-Apr-26 02:00	53	44	58	11	0	0	21	0	82	95	70	86	519
13-Apr-26 03:00	53	44	58	12	0	0	21	0	80	94	71	87	519
13-Apr-26 04:00	53	44	56	12	0	0	22	0	81	87	72	88	515
13-Apr-26 05:00	53	44	58	12	0	0	21	0	80	94	71	87	520
13-Apr-26 06:00	54	45	60	12	0	0	21	0	80	94	70	87	523
13-Apr-26 07:00	53	43	58	12	0	0	20	0	78	89	70	87	510
13-Apr-26 08:00	53	44	60	12	0	0	20	0	77	91	70	86	514
13-Apr-26 09:00	53	44	60	12	0	0	21	0	78	91	71	87	517
13-Apr-26 10:00	53	44	60	12	0	0	21	0	78	92	71	87	517
13-Apr-26 11:00	53	45	59	12	0	0	21	0	80	91	71	87	519
13-Apr-26 12:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	90	71	87	515
13-Apr-26 13:00	57	45	59	12	0	0	21	0	77	92	71	87	521
13-Apr-26 14:00	53	44	60	12	0	0	21	0	85	85	84	87	530
13-Apr-26 15:00	53	46	59	12	0	0	21	0	84	92	84	87	538

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
13-Apr-26 16:00	53	45	57	12	0	0	21	0	80	91	84	87	530
13-Apr-26 17:00	53	45	59	12	0	0	20	0	82	94	84	87	537
13-Apr-26 18:00	53	44	59	12	0	0	20	0	81	94	84	87	534
13-Apr-26 19:00	53	45	58	11	0	0	21	0	83	96	85	88	540
13-Apr-26 20:00	53	44	58	12	0	0	20	0	79	91	84	87	530
13-Apr-26 21:00	52	44	60	12	0	0	20	0	80	85	84	86	523
13-Apr-26 22:00	53	44	60	12	0	0	20	0	80	80	70	87	505
13-Apr-26 23:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	81	71	87	506
14-Apr-26 00:00	53	44	59	12	0	0	21	0	79	81	70	87	505
14-Apr-26 01:00	52	44	60	12	0	0	21	0	78	80	70	87	504
14-Apr-26 02:00	52	43	59	12	0	0	21	0	80	86	71	87	511
14-Apr-26 03:00	53	44	60	12	0	0	21	0	79	80	71	87	507
14-Apr-26 04:00	53	44	60	12	0	0	21	0	79	80	70	87	508
14-Apr-26 05:00	53	44	58	12	0	0	21	0	78	82	71	88	507
14-Apr-26 06:00	54	45	60	12	0	0	21	0	79	84	70	87	511
14-Apr-26 07:00	53	45	57	12	0	0	21	0	75	87	71	87	507
14-Apr-26 08:00	53	44	60	12	0	0	20	0	77	88	70	87	511
14-Apr-26 09:00	53	44	58	12	0	0	21	0	78	89	71	88	512
14-Apr-26 10:00	53	44	59	12	0	0	20	0	79	86	70	87	508
14-Apr-26 11:00	53	44	59	12	0	0	21	0	78	90	70	87	515
14-Apr-26 12:00	54	45	60	12	0	0	21	0	76	86	71	87	512
14-Apr-26 13:00	53	49	59	12	0	0	21	0	75	82	71	86	508
14-Apr-26 14:00	53	45	60	13	0	0	21	0	84	96	71	85	527
14-Apr-26 15:00	53	46	59	12	0	0	21	0	78	91	70	87	518
14-Apr-26 16:00	54	45	58	12	0	0	21	0	79	89	70	87	514
14-Apr-26 17:00	53	45	59	12	0	0	21	0	80	93	71	87	521
14-Apr-26 18:00	53	44	59	12	0	0	21	0	82	94	70	87	522
14-Apr-26 19:00	53	45	59	12	0	0	21	0	80	90	71	87	516
14-Apr-26 20:00	53	45	60	12	0	0	21	0	79	89	71	88	518
14-Apr-26 21:00	52	43	59	12	0	0	21	0	81	91	71	87	517
14-Apr-26 22:00	53	44	60	12	0	0	21	15	79	90	70	87	531
14-Apr-26 23:00	53	45	59	12	0	0	21	16	79	89	70	87	531
15-Apr-26 00:00	53	44	58	12	0	0	20	20	83	94	70	87	543
15-Apr-26 01:00	52	44	61	12	0	0	20	20	84	100	70	87	549
15-Apr-26 02:00	53	44	59	12	0	0	20	20	81	94	71	87	542
15-Apr-26 03:00	53	44	60	12	0	0	21	21	80	94	71	87	541
15-Apr-26 04:00	53	45	58	12	0	0	20	20	84	96	70	88	547
15-Apr-26 05:00	53	44	59	12	0	0	20	20	83	90	70	87	539
15-Apr-26 06:00	53	44	59	12	0	0	20	20	84	90	71	88	541
15-Apr-26 07:00	53	40	58	10	0	0	25	29	92	96	0	77	478
15-Apr-26 08:00	53	44	59	12	0	0	21	22	79	83	84	88	545
15-Apr-26 09:00	53	44	57	11	0	0	22	22	80	86	85	88	548
15-Apr-26 10:00	53	45	59	12	0	0	22	22	79	85	85	88	549
15-Apr-26 11:00	53	45	59	12	0	0	22	22	75	82	84	87	542

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
15-Apr-26 12:00	53	45	59	12	0	0	21	22	79	84	84	87	545
15-Apr-26 13:00	53	47	59	12	0	0	22	21	78	84	83	87	544
15-Apr-26 14:00	53	45	59	11	0	0	21	22	79	84	84	87	544
15-Apr-26 15:00	54	47	59	11	0	0	22	23	80	85	85	87	552
15-Apr-26 16:00	52	44	59	12	0	0	22	22	84	92	84	90	561
15-Apr-26 17:00	53	44	59	12	0	0	22	22	84	81	85	87	549
15-Apr-26 18:00	54	46	60	12	0	0	22	22	80	84	84	87	552
15-Apr-26 19:00	54	46	60	12	0	0	21	22	79	84	84	87	549
15-Apr-26 20:00	53	45	59	12	0	0	22	22	79	85	85	88	550
15-Apr-26 21:00	52	44	61	12	0	0	22	22	82	89	84	88	557
15-Apr-26 22:00	53	45	59	12	0	0	22	22	80	81	85	88	545
15-Apr-26 23:00	53	44	60	12	0	0	22	22	85	85	71	89	542
16-Apr-26 00:00	52	44	60	12	0	0	22	22	86	86	70	89	545
16-Apr-26 01:00	53	44	59	12	0	0	22	22	87	88	70	87	544
16-Apr-26 02:00	53	45	59	12	0	0	22	22	85	84	71	87	540
16-Apr-26 03:00	53	45	61	12	0	0	22	22	84	84	71	88	541
16-Apr-26 04:00	53	45	59	12	0	0	21	21	85	85	70	87	538
16-Apr-26 05:00	53	45	60	12	0	0	22	22	87	88	71	87	547
16-Apr-26 06:00	53	45	59	12	0	0	22	22	85	84	70	87	539
16-Apr-26 07:00	53	45	60	12	0	0	22	22	83	83	70	87	538
16-Apr-26 08:00	53	44	60	12	0	0	22	23	78	82	72	88	535
16-Apr-26 09:00	53	46	59	12	0	0	21	22	77	81	70	88	529
16-Apr-26 10:00	53	46	60	12	0	0	21	22	86	84	70	92	546
16-Apr-26 11:00	53	45	60	12	0	0	22	22	82	81	70	90	537
16-Apr-26 12:00	53	45	60	12	0	0	22	22	78	88	71	88	539
16-Apr-26 13:00	57	45	59	12	0	0	21	22	73	86	70	87	533
16-Apr-26 14:00	53	44	59	12	0	0	21	21	84	83	71	87	537
16-Apr-26 15:00	53	45	59	12	0	0	21	22	79	90	70	88	540
16-Apr-26 16:00	53	44	60	12	0	0	22	22	80	91	71	87	543
16-Apr-26 17:00	53	45	60	12	0	0	22	22	80	81	71	88	534
16-Apr-26 18:00	53	44	59	12	0	0	21	22	80	93	71	90	545
16-Apr-26 19:00	53	45	60	12	0	0	22	22	80	89	71	87	540
16-Apr-26 20:00	53	44	61	12	0	0	22	22	81	80	70	87	532
16-Apr-26 21:00	53	44	60	12	0	0	22	22	82	79	70	86	530
16-Apr-26 22:00	53	42	60	12	0	0	22	22	80	82	71	87	531
16-Apr-26 23:00	53	44	60	12	0	0	22	22	80	82	70	87	532
17-Apr-26 00:00	53	44	60	12	0	0	21	21	79	84	71	87	532
17-Apr-26 01:00	53	44	61	12	0	0	22	22	79	88	70	87	537
17-Apr-26 02:00	53	44	60	12	0	0	21	22	79	82	70	87	531
17-Apr-26 03:00	53	44	58	12	0	0	22	22	79	82	70	87	530
17-Apr-26 04:00	53	44	58	12	0	0	22	22	79	88	70	87	535
17-Apr-26 05:00	52	44	61	12	0	0	22	22	80	90	70	88	539
17-Apr-26 06:00	53	44	58	12	0	0	21	22	78	91	70	89	539
17-Apr-26 07:00	53	44	60	12	0	0	22	22	79	91	70	88	541

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
17-Apr-26 08:00	53	45	60	12	0	0	22	22	76	90	70	88	538
17-Apr-26 09:00	53	44	59	12	0	0	22	22	76	80	71	87	526
17-Apr-26 10:00	53	44	59	13	0	0	23	22	79	82	72	88	535
17-Apr-26 11:00	53	44	62	13	0	0	22	22	78	80	70	87	531
17-Apr-26 12:00	53	45	62	13	0	0	21	22	81	89	70	86	541
17-Apr-26 13:00	53	49	60	13	0	0	22	23	79	93	71	87	550
17-Apr-26 14:00	53	47	61	13	0	0	22	22	80	85	71	87	541
17-Apr-26 15:00	53	48	60	13	0	0	21	22	82	88	70	87	542
17-Apr-26 16:00	53	47	61	13	0	0	21	22	83	84	70	87	541
17-Apr-26 17:00	54	47	60	13	0	0	22	22	82	85	71	86	542
17-Apr-26 18:00	54	47	60	13	0	0	22	22	83	86	70	85	541
17-Apr-26 19:00	54	46	60	13	0	0	22	23	83	81	72	87	541
17-Apr-26 20:00	54	47	60	13	0	0	21	22	82	79	70	86	533
17-Apr-26 21:00	54	46	61	12	31	9	21	22	78	78	71	86	570
17-Apr-26 22:00	54	46	61	12	37	9	21	22	78	76	70	87	573
17-Apr-26 23:00	57	48	60	12	55	7	22	22	79	34	85	87	570
18-Apr-26 00:00	57	48	61	13	63	11	21	21	88	61	83	88	614
18-Apr-26 01:00	56	48	60	13	63	11	22	22	81	61	77	86	599
18-Apr-26 02:00	56	48	60	12	62	10	21	21	86	60	80	86	603
18-Apr-26 03:00	57	48	60	12	62	10	22	22	82	62	77	87	602
18-Apr-26 04:00	56	48	59	12	61	10	22	22	81	61	77	86	595
18-Apr-26 05:00	56	47	59	12	61	10	22	22	82	61	81	86	600
18-Apr-26 06:00	57	48	60	12	61	9	21	22	80	61	79	86	596
18-Apr-26 07:00	56	49	59	12	61	10	21	21	81	60	77	86	593
18-Apr-26 08:00	56	48	59	12	60	10	22	22	84	61	81	87	602
18-Apr-26 09:00	57	47	59	12	61	10	22	22	82	61	79	87	599
18-Apr-26 10:00	57	48	60	12	61	10	21	22	80	61	78	87	597
18-Apr-26 11:00	57	48	59	11	64	11	21	22	78	61	77	86	594
18-Apr-26 12:00	56	48	60	13	62	10	21	22	85	49	84	87	596
18-Apr-26 13:00	55	48	59	12	62	10	21	22	79	54	81	86	588
18-Apr-26 14:00	55	48	59	12	62	10	21	21	81	61	77	86	593
18-Apr-26 15:00	55	48	60	12	63	10	21	22	83	61	77	86	597
18-Apr-26 16:00	55	47	60	12	61	10	22	22	84	63	80	87	603
18-Apr-26 17:00	56	48	60	13	62	10	22	23	82	63	79	87	605
18-Apr-26 18:00	56	48	61	12	63	10	22	21	84	62	80	86	604
18-Apr-26 19:00	56	47	60	13	63	10	22	22	86	61	86	87	614
18-Apr-26 20:00	56	48	60	12	62	10	22	22	87	62	84	87	613
18-Apr-26 21:00	56	48	60	13	62	10	21	22	88	61	85	86	613
18-Apr-26 22:00	56	47	60	12	63	10	22	22	87	62	85	87	614
18-Apr-26 23:00	55	49	59	13	62	10	22	22	85	61	83	87	608
19-Apr-26 00:00	56	48	60	12	62	10	21	22	85	61	83	87	607
19-Apr-26 01:00	55	48	60	13	63	10	21	22	88	61	86	87	614
19-Apr-26 02:00	55	47	60	12	63	10	21	22	86	62	85	87	611
19-Apr-26 03:00	55	48	60	13	62	10	21	22	89	61	87	87	616

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
19-Apr-26 04:00	56	48	60	13	62	10	22	22	88	62	87	87	617
19-Apr-26 05:00	56	47	60	13	63	10	21	22	88	61	86	87	615
19-Apr-26 06:00	56	48	61	13	63	10	21	22	85	61	83	87	609
19-Apr-26 07:00	55	48	60	12	62	10	21	22	86	61	84	87	609
19-Apr-26 08:00	55	48	60	12	62	10	21	22	80	62	78	87	597
19-Apr-26 09:00	55	47	60	12	62	10	22	21	79	62	78	87	597
19-Apr-26 10:00	57	47	61	12	63	10	21	21	78	61	77	87	594
19-Apr-26 11:00	54	46	58	11	62	10	21	22	84	61	78	87	594
19-Apr-26 12:00	55	47	60	12	62	10	21	22	78	61	77	87	593
19-Apr-26 13:00	56	47	61	13	63	10	21	21	80	61	79	87	599
19-Apr-26 14:00	55	46	61	13	62	10	20	20	83	60	85	86	601
19-Apr-26 15:00	56	48	60	12	62	10	21	22	78	61	77	86	594
19-Apr-26 16:00	56	48	60	12	62	10	21	22	78	62	77	86	594
19-Apr-26 17:00	55	48	59	12	62	10	21	22	82	61	77	86	595
19-Apr-26 18:00	55	48	60	12	62	10	21	22	84	62	77	86	600
19-Apr-26 19:00	57	49	61	13	63	10	22	22	84	62	82	86	610
19-Apr-26 20:00	56	48	60	13	63	10	21	22	83	61	81	86	606
19-Apr-26 21:00	57	46	60	13	63	10	22	22	84	61	82	87	608
19-Apr-26 22:00	56	48	60	13	63	10	21	22	85	61	82	86	607
19-Apr-26 23:00	57	48	61	13	63	10	22	22	84	61	82	86	609
20-Apr-26 00:00	56	48	61	13	63	10	22	22	84	62	82	87	608
20-Apr-26 01:00	57	48	61	13	63	10	22	21	85	62	82	86	611
20-Apr-26 02:00	57	48	61	13	63	11	22	22	90	62	89	88	624
20-Apr-26 03:00	57	48	60	13	62	10	22	22	84	74	78	88	617
20-Apr-26 04:00	56	48	61	13	63	10	20	22	88	73	87	87	627
20-Apr-26 05:00	56	48	60	13	63	10	22	22	81	74	80	87	618
20-Apr-26 06:00	56	48	60	13	63	10	22	22	81	74	77	87	612
20-Apr-26 07:00	56	48	60	13	63	10	22	23	82	76	78	88	618
20-Apr-26 08:00	56	48	61	13	62	10	22	22	92	75	64	89	614
20-Apr-26 09:00	57	48	61	13	63	10	22	22	88	81	64	87	615
20-Apr-26 10:00	57	49	62	13	64	11	27	22	81	77	65	87	616
20-Apr-26 11:00	57	49	61	13	63	10	21	22	86	80	65	87	616
20-Apr-26 12:00	57	48	62	13	63	10	21	22	89	83	61	87	616
20-Apr-26 13:00	56	49	62	13	63	10	21	22	93	86	53	87	616
20-Apr-26 14:00	56	48	63	14	64	11	21	22	93	86	52	87	616
20-Apr-26 15:00	56	48	62	14	63	11	21	22	90	84	49	86	606
20-Apr-26 16:00	56	48	62	14	63	11	22	22	93	88	50	87	614
20-Apr-26 17:00	56	48	62	14	63	10	21	22	96	90	50	87	619
20-Apr-26 18:00	56	48	62	13	63	11	22	22	91	84	50	86	610
20-Apr-26 19:00	56	48	62	13	64	11	21	22	90	82	51	87	607
20-Apr-26 20:00	56	49	62	13	64	11	21	22	87	87	51	86	608
20-Apr-26 21:00	56	48	62	13	64	10	21	22	84	83	60	87	611
20-Apr-26 22:00	56	48	61	13	64	10	22	22	86	85	53	87	607
20-Apr-26 23:00	56	48	62	13	64	11	22	22	81	79	54	87	600

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
21-Apr-26 00:00	57	48	61	13	63	11	21	22	83	82	54	87	600
21-Apr-26 01:00	57	48	62	13	63	10	22	22	81	79	53	87	598
21-Apr-26 02:00	57	48	62	13	64	11	22	22	83	82	54	88	604
21-Apr-26 03:00	56	48	61	13	63	11	21	21	88	87	53	87	609
21-Apr-26 04:00	57	48	62	13	63	10	22	22	82	80	54	87	601
21-Apr-26 05:00	56	48	60	13	63	10	22	22	83	81	54	87	600
21-Apr-26 06:00	56	48	60	13	62	10	21	22	85	85	52	87	601
21-Apr-26 07:00	56	47	61	13	63	10	21	21	89	90	52	86	610
21-Apr-26 08:00	57	48	61	13	63	10	21	22	85	84	53	87	601
21-Apr-26 09:00	56	47	61	13	63	10	21	22	83	82	52	87	598
21-Apr-26 10:00	57	48	61	13	63	10	21	22	83	82	52	87	599
21-Apr-26 11:00	57	48	60	13	62	11	22	21	85	84	62	87	612
21-Apr-26 12:00	57	48	62	13	63	10	21	22	84	84	62	87	613
21-Apr-26 13:00	57	48	61	13	64	11	21	21	80	73	70	86	604
21-Apr-26 14:00	57	48	62	13	63	11	22	22	79	77	71	87	611
21-Apr-26 15:00	57	48	61	13	63	10	21	21	81	77	68	87	606
21-Apr-26 16:00	57	48	61	13	62	9	21	22	83	79	68	87	611
21-Apr-26 17:00	56	48	61	13	63	9	22	21	84	79	68	87	610
21-Apr-26 18:00	56	49	61	13	62	10	21	22	83	76	71	88	613
21-Apr-26 19:00	56	49	61	13	63	10	21	21	84	82	71	87	616
21-Apr-26 20:00	56	49	61	13	62	10	21	22	81	76	85	87	624
21-Apr-26 21:00	52	49	61	13	62	10	21	22	83	73	85	87	618
21-Apr-26 22:00	57	49	60	13	63	10	21	22	80	78	85	87	624
21-Apr-26 23:00	57	49	61	13	63	10	21	22	79	80	83	87	626
22-Apr-26 00:00	56	49	61	13	63	10	21	22	80	76	82	87	621
22-Apr-26 01:00	57	49	61	13	63	10	22	22	80	76	83	87	622
22-Apr-26 02:00	56	49	61	13	63	10	22	23	81	76	83	87	623
22-Apr-26 03:00	56	48	61	13	63	10	21	22	79	75	82	86	616
22-Apr-26 04:00	56	49	61	13	62	10	21	22	80	76	83	87	620
22-Apr-26 05:00	56	49	60	13	62	10	21	22	79	75	82	86	617
22-Apr-26 06:00	56	49	61	13	63	10	21	21	80	77	82	87	621
22-Apr-26 07:00	55	46	62	13	63	11	21	21	78	75	82	87	613
22-Apr-26 08:00	55	47	61	13	63	10	22	22	81	75	69	87	605
22-Apr-26 09:00	55	48	61	13	63	10	21	22	80	75	69	87	604
22-Apr-26 10:00	54	46	61	13	63	10	21	22	80	74	68	86	599
22-Apr-26 11:00	54	46	61	13	63	11	21	22	81	75	68	86	602
22-Apr-26 12:00	57	45	61	13	63	11	21	21	77	75	69	86	600
22-Apr-26 13:00	53	46	59	12	61	10	21	22	84	75	69	86	599
22-Apr-26 14:00	53	46	59	12	61	10	21	21	89	82	69	86	610
22-Apr-26 15:00	53	47	61	13	63	10	22	22	88	80	70	86	614
22-Apr-26 16:00	54	47	60	13	62	10	21	21	83	76	69	86	602
22-Apr-26 17:00	55	47	60	13	62	10	22	22	83	76	69	86	604
22-Apr-26 18:00	55	47	61	13	63	10	21	22	79	75	68	85	600
22-Apr-26 19:00	55	47	60	13	62	10	22	22	82	76	70	86	604

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
22-Apr-26 20:00	55	46	60	13	62	10	22	22	83	76	70	86	605
22-Apr-26 21:00	54	43	60	12	62	9	20	22	81	75	74	86	599
22-Apr-26 22:00	56	48	60	12	63	10	22	22	86	78	68	86	611
22-Apr-26 23:00	55	47	60	13	62	10	21	22	90	82	68	85	615
23-Apr-26 00:00	56	48	61	13	62	10	21	21	85	78	68	86	609
23-Apr-26 01:00	56	47	60	13	62	10	21	22	87	80	68	86	611
23-Apr-26 02:00	57	48	60	13	63	10	21	22	85	78	67	87	611
23-Apr-26 03:00	57	48	61	13	63	10	21	21	90	83	68	87	624
23-Apr-26 04:00	56	48	61	13	63	10	21	22	91	84	68	87	625
23-Apr-26 05:00	56	47	61	13	63	10	22	21	92	86	69	87	629
23-Apr-26 06:00	56	48	60	13	62	10	21	22	86	79	68	87	613
23-Apr-26 07:00	56	48	61	13	64	10	21	21	88	81	69	87	619
23-Apr-26 08:00	56	48	60	13	63	11	21	21	88	80	68	87	616
23-Apr-26 09:00	56	48	60	13	63	10	21	22	85	77	67	86	607
23-Apr-26 10:00	56	48	61	13	63	10	21	21	80	75	68	86	603
23-Apr-26 11:00	56	48	61	13	63	10	21	21	87	77	68	87	611
23-Apr-26 12:00	56	50	60	13	62	10	22	22	85	78	69	86	613
23-Apr-26 13:00	55	47	61	13	62	10	22	22	90	81	83	87	633
23-Apr-26 14:00	56	48	62	13	63	10	21	21	86	79	68	86	612
23-Apr-26 15:00	57	49	60	13	63	10	22	21	92	87	63	86	623
23-Apr-26 16:00	56	49	60	13	64	11	21	21	90	84	65	87	620
23-Apr-26 17:00	56	49	60	13	63	10	21	21	88	81	64	86	612
23-Apr-26 18:00	56	48	60	13	63	10	22	21	89	82	64	86	614
23-Apr-26 19:00	56	48	60	13	63	10	21	22	88	81	64	87	612
23-Apr-26 20:00	56	48	60	13	62	10	21	22	87	80	64	87	611
23-Apr-26 21:00	56	49	60	13	63	10	21	21	87	81	67	87	616
23-Apr-26 22:00	56	49	60	13	63	10	21	21	87	81	64	86	610
23-Apr-26 23:00	56	48	60	13	63	10	22	22	89	82	65	87	615
24-Apr-26 00:00	56	48	60	13	62	10	22	22	89	83	65	87	618
24-Apr-26 01:00	56	48	60	13	63	10	21	21	90	84	64	86	616
24-Apr-26 02:00	56	49	61	12	62	10	22	22	88	81	64	87	614
24-Apr-26 03:00	56	48	60	13	63	10	22	22	90	83	63	87	616
24-Apr-26 04:00	56	48	61	13	63	10	21	21	90	83	63	86	614
24-Apr-26 05:00	56	48	61	13	64	10	21	22	89	83	63	87	618
24-Apr-26 06:00	56	48	61	13	64	10	21	21	89	83	63	86	615
24-Apr-26 07:00	56	48	60	13	63	10	21	22	90	84	63	87	615
24-Apr-26 08:00	56	48	60	13	63	10	21	22	89	83	63	87	615
24-Apr-26 09:00	57	49	60	13	63	10	22	22	89	83	64	87	616
24-Apr-26 10:00	56	49	60	13	63	10	21	22	88	81	64	87	614
24-Apr-26 11:00	54	46	61	13	63	10	21	22	87	80	64	87	609
24-Apr-26 12:00	55	47	61	13	63	10	20	21	89	81	63	86	609
24-Apr-26 13:00	55	47	59	13	64	11	21	22	83	79	63	87	604
24-Apr-26 14:00	55	48	61	13	62	10	22	22	86	74	71	87	611
24-Apr-26 15:00	57	48	61	13	63	10	23	23	85	75	73	89	621

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
24-Apr-26 16:00	57	48	60	13	62	10	22	22	82	78	82	87	624
24-Apr-26 17:00	56	48	60	13	62	10	21	21	88	81	66	87	612
24-Apr-26 18:00	56	47	60	13	62	10	21	22	90	83	63	87	612
24-Apr-26 19:00	57	48	60	13	62	10	22	21	88	81	63	87	610
24-Apr-26 20:00	57	49	60	12	62	10	22	21	83	82	61	87	607
24-Apr-26 21:00	56	48	60	13	62	10	22	22	81	82	61	87	604
24-Apr-26 22:00	56	48	60	13	62	10	22	22	84	82	61	87	607
24-Apr-26 23:00	56	49	60	13	62	10	22	22	90	88	60	87	620
25-Apr-26 00:00	56	47	60	13	62	10	22	22	92	86	60	86	615
25-Apr-26 01:00	56	47	60	13	62	10	21	21	90	84	60	87	610
25-Apr-26 02:00	56	46	60	13	62	10	22	22	91	85	62	87	614
25-Apr-26 03:00	55	47	61	13	62	10	21	21	92	86	60	87	616
25-Apr-26 04:00	56	46	60	12	62	10	22	21	88	81	61	87	606
25-Apr-26 05:00	55	47	60	13	62	10	22	22	90	83	61	87	611
25-Apr-26 06:00	54	47	61	13	62	10	21	21	90	81	59	86	606
25-Apr-26 07:00	55	47	60	13	62	10	21	21	88	81	63	86	608
25-Apr-26 08:00	53	46	60	13	62	10	21	21	89	82	63	87	608
25-Apr-26 09:00	53	47	60	13	62	10	22	22	89	81	64	87	610
25-Apr-26 10:00	53	47	61	13	63	10	21	21	92	86	63	87	615
25-Apr-26 11:00	53	47	60	13	62	10	21	22	92	86	67	87	619
25-Apr-26 12:00	53	46	60	13	61	10	22	21	90	83	67	87	615
25-Apr-26 13:00	57	47	60	13	62	10	21	21	85	80	66	87	610
25-Apr-26 14:00	53	46	59	12	61	10	22	22	89	81	68	87	610
25-Apr-26 15:00	54	48	59	12	62	10	21	21	88	80	66	86	608
25-Apr-26 16:00	54	47	60	13	62	10	22	21	90	83	64	87	614
25-Apr-26 17:00	54	48	60	13	62	10	21	21	89	81	63	87	609
25-Apr-26 18:00	54	47	60	13	62	10	22	22	88	81	63	87	609
25-Apr-26 19:00	54	47	60	13	62	10	22	22	90	84	63	87	614
25-Apr-26 20:00	54	48	60	13	62	10	22	22	84	80	66	87	608
25-Apr-26 21:00	54	47	61	13	63	10	22	22	82	81	66	87	605
25-Apr-26 22:00	54	47	60	13	62	10	23	22	81	82	68	89	612
25-Apr-26 23:00	54	48	60	13	62	10	22	21	88	80	66	87	611
26-Apr-26 00:00	53	47	60	13	63	10	22	21	84	80	66	88	606
26-Apr-26 01:00	53	47	60	13	62	10	22	21	84	80	66	87	605
26-Apr-26 02:00	54	47	60	13	63	10	22	21	87	80	66	87	610
26-Apr-26 03:00	53	47	60	12	63	10	22	21	87	81	66	88	611
26-Apr-26 04:00	53	47	60	12	62	10	22	22	85	80	66	87	607
26-Apr-26 05:00	54	47	60	12	62	10	22	22	87	80	66	88	610
26-Apr-26 06:00	53	47	60	12	62	10	22	22	79	81	66	87	601
26-Apr-26 07:00	54	48	61	12	63	10	22	22	83	81	67	87	609
26-Apr-26 08:00	53	46	61	12	62	10	22	22	77	81	66	87	601
26-Apr-26 09:00	53	46	60	13	62	11	22	22	81	82	67	87	605
26-Apr-26 10:00	53	46	60	13	63	11	22	21	81	82	67	87	605
26-Apr-26 11:00	53	46	61	13	62	10	21	21	81	82	66	87	603

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
26-Apr-26 12:00	53	47	60	13	62	11	22	22	83	82	66	87	607
26-Apr-26 13:00	53	49	60	13	62	10	22	22	83	83	67	87	610
26-Apr-26 14:00	53	45	62	13	62	10	22	22	88	88	66	87	619
26-Apr-26 15:00	53	45	60	12	61	10	22	22	89	87	65	87	613
26-Apr-26 16:00	53	48	59	12	62	10	22	21	85	85	66	87	611
26-Apr-26 17:00	53	49	60	12	62	10	21	21	87	87	66	86	615
26-Apr-26 18:00	53	47	60	12	62	10	22	21	88	88	66	87	616
26-Apr-26 19:00	53	48	60	12	62	10	22	22	88	87	67	87	616
26-Apr-26 20:00	53	46	60	12	62	10	22	22	86	86	65	87	610
26-Apr-26 21:00	53	48	60	12	62	10	21	21	84	86	79	86	623
26-Apr-26 22:00	53	46	60	12	62	10	22	22	85	85	80	88	624
26-Apr-26 23:00	53	46	60	13	62	10	22	21	81	81	79	87	617
27-Apr-26 00:00	53	46	60	12	62	10	22	22	81	80	79	87	614
27-Apr-26 01:00	53	47	60	12	62	10	21	21	86	86	65	87	612
27-Apr-26 02:00	53	46	60	12	62	10	22	22	87	87	65	87	612
27-Apr-26 03:00	53	46	59	12	62	10	22	22	85	85	66	87	609
27-Apr-26 04:00	53	46	60	12	62	10	22	21	82	81	66	87	604
27-Apr-26 05:00	53	46	61	12	63	10	22	22	81	81	65	87	602
27-Apr-26 06:00	53	46	60	12	62	10	22	22	78	81	65	87	598
27-Apr-26 07:00	53	47	59	12	60	9	22	22	82	81	66	87	600
27-Apr-26 08:00	53	47	60	12	61	9	22	22	84	84	66	87	608
27-Apr-26 09:00	53	45	57	11	59	9	21	21	86	86	66	87	602
27-Apr-26 10:00	53	45	58	11	60	9	22	23	80	82	67	88	597
27-Apr-26 11:00	53	45	57	11	59	9	21	21	80	77	70	86	588
27-Apr-26 12:00	53	45	56	10	64	11	21	22	78	80	67	87	592
27-Apr-26 13:00	52	44	57	11	59	9	22	22	80	79	67	86	587
27-Apr-26 14:00	53	44	58	11	59	8	22	21	82	80	67	86	592
27-Apr-26 15:00	53	45	57	11	58	8	22	22	83	81	67	87	595
27-Apr-26 16:00	53	44	58	11	60	9	22	22	85	84	68	87	603
27-Apr-26 17:00	54	46	59	11	61	10	22	22	80	68	67	86	587
27-Apr-26 18:00	54	45	60	13	62	10	22	22	79	67	67	86	587
27-Apr-26 19:00	54	45	59	12	62	10	22	22	78	67	67	85	582
27-Apr-26 20:00	54	45	59	12	62	10	22	22	81	67	67	86	587
27-Apr-26 21:00	54	45	60	12	62	10	22	21	82	66	65	86	585
27-Apr-26 22:00	54	46	60	12	62	10	22	22	82	68	68	87	594
27-Apr-26 23:00	54	46	61	13	62	10	22	22	81	67	67	87	592
28-Apr-26 00:00	55	46	61	12	62	10	22	21	88	68	67	87	599
28-Apr-26 01:00	54	46	61	13	63	10	22	22	85	67	67	86	595
28-Apr-26 02:00	54	45	60	13	62	10	22	22	86	67	68	87	597
28-Apr-26 03:00	54	45	60	13	62	10	22	22	89	68	67	87	598
28-Apr-26 04:00	54	46	60	13	62	10	21	22	83	66	66	86	589
28-Apr-26 05:00	54	45	59	13	62	10	22	23	86	67	67	86	594
28-Apr-26 06:00	54	46	60	13	63	10	22	22	83	67	66	86	591
28-Apr-26 07:00	54	45	60	12	61	10	21	21	82	66	66	86	584

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
28-Apr-26 08:00	55	46	59	12	61	10	22	21	83	67	67	87	589
28-Apr-26 09:00	54	45	60	12	61	10	21	21	80	66	65	84	578
28-Apr-26 10:00	54	45	59	12	62	10	21	21	82	67	66	81	581
28-Apr-26 11:00	57	46	58	11	60	9	22	21	80	67	67	82	580
28-Apr-26 12:00	53	44	59	12	59	8	22	21	84	67	67	81	578
28-Apr-26 13:00	54	46	59	12	60	9	21	21	82	67	68	81	583
28-Apr-26 14:00	54	46	59	12	61	10	22	21	99	69	67	82	601
28-Apr-26 15:00	54	46	59	12	61	10	22	22	88	68	67	82	590
28-Apr-26 16:00	54	45	60	12	62	10	22	22	87	67	67	82	590
28-Apr-26 17:00	56	46	60	12	62	10	22	22	80	68	68	82	588
28-Apr-26 18:00	56	48	60	13	62	11	23	22	80	67	68	86	595
28-Apr-26 19:00	54	48	61	13	63	10	23	23	83	67	67	86	598
28-Apr-26 20:00	53	46	60	13	63	10	23	22	78	67	66	86	587
28-Apr-26 21:00	54	45	60	12	62	10	22	22	79	67	67	86	586
28-Apr-26 22:00	54	45	59	12	62	10	22	22	81	67	67	86	588
28-Apr-26 23:00	54	46	59	12	62	10	22	21	81	66	67	86	587
29-Apr-26 00:00	54	48	59	12	62	10	21	22	83	66	66	86	589
29-Apr-26 01:00	54	47	60	12	62	10	22	22	86	67	67	87	595
29-Apr-26 02:00	54	47	59	12	61	10	22	21	90	67	67	87	598
29-Apr-26 03:00	54	46	60	12	62	10	22	21	89	67	67	87	596
29-Apr-26 04:00	54	47	60	12	62	10	22	21	86	67	67	87	594
29-Apr-26 05:00	54	47	59	12	62	10	22	22	79	67	66	87	588
29-Apr-26 06:00	54	45	60	12	62	10	22	21	92	67	67	86	599
29-Apr-26 07:00	53	44	60	12	62	10	22	21	96	67	67	86	601
29-Apr-26 08:00	53	44	58	12	61	9	21	21	89	67	66	82	584
29-Apr-26 09:00	53	44	58	12	60	10	22	21	91	67	66	82	587
29-Apr-26 10:00	53	44	59	12	61	10	21	21	90	68	66	82	587
29-Apr-26 11:00	53	45	59	12	62	10	21	21	83	67	66	82	580
29-Apr-26 12:00	53	46	59	12	62	10	21	21	91	67	66	81	591
29-Apr-26 13:00	53	50	59	12	62	10	22	21	81	67	65	86	588
29-Apr-26 14:00	53	47	63	14	63	10	22	21	79	68	66	87	592
29-Apr-26 15:00	53	47	60	13	63	10	22	21	105	70	66	88	618
29-Apr-26 16:00	53	47	61	13	63	10	22	21	87	69	67	88	600
29-Apr-26 17:00	52	47	60	12	62	10	22	21	86	68	67	87	595
29-Apr-26 18:00	53	47	61	13	63	11	22	21	89	68	67	87	603
29-Apr-26 19:00	55	48	61	13	62	11	21	21	88	67	66	86	599
29-Apr-26 20:00	54	48	60	12	62	10	22	21	88	67	66	86	597
29-Apr-26 21:00	54	48	60	12	62	10	21	21	89	67	62	86	592
29-Apr-26 22:00	54	48	60	12	62	10	22	21	91	68	67	87	603
29-Apr-26 23:00	54	48	60	12	63	11	22	21	86	67	66	89	598
30-Apr-26 00:00	54	48	59	12	62	10	21	21	87	68	66	86	596
30-Apr-26 01:00	53	48	60	13	62	10	21	21	85	67	66	90	596
30-Apr-26 02:00	53	48	59	12	62	10	21	21	83	67	66	87	591
30-Apr-26 03:00	53	48	60	12	62	10	21	21	85	67	65	89	595

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
30-Apr-26 04:00	53	48	60	12	62	10	22	21	84	68	67	87	592
30-Apr-26 05:00	53	48	59	12	62	10	21	21	84	67	65	88	591
30-Apr-26 06:00	53	48	60	12	62	10	22	21	82	68	67	88	593
30-Apr-26 07:00	53	48	59	12	62	10	22	21	81	68	67	87	591
30-Apr-26 08:00	53	48	60	13	63	11	22	21	82	68	67	87	596
30-Apr-26 09:00	53	48	60	12	63	11	21	21	83	68	67	87	592
30-Apr-26 10:00	52	47	60	12	62	10	21	21	86	68	66	89	595
30-Apr-26 11:00	53	47	60	13	63	11	22	21	80	69	67	87	593
30-Apr-26 12:00	53	47	61	13	63	11	21	21	82	68	67	87	593
30-Apr-26 13:00	53	48	60	13	64	11	22	22	84	69	67	88	598
30-Apr-26 14:00	53	48	60	13	64	11	21	21	93	65	70	94	613
30-Apr-26 15:00	53	48	60	13	62	10	21	21	87	64	70	91	601
30-Apr-26 16:00	53	48	60	13	63	11	22	21	85	69	67	88	598
30-Apr-26 17:00	53	48	60	12	63	11	22	21	83	69	67	88	598
30-Apr-26 18:00	54	48	60	13	62	10	22	21	83	69	66	87	594
30-Apr-26 19:00	54	48	60	13	64	11	22	21	79	68	65	87	591
30-Apr-26 20:00	54	48	59	13	63	11	22	21	80	68	80	87	604
30-Apr-26 21:00	53	48	59	12	62	10	22	22	79	69	67	87	591
30-Apr-26 22:00	53	48	60	12	63	10	22	21	81	69	66	87	593
30-Apr-26 23:00	53	48	60	12	63	10	22	21	80	66	68	88	591
01-May-26 00:00	53	48	59	12	62	10	21	21	87	68	66	89	597
01-May-26 01:00	53	47	60	12	63	10	22	21	82	69	67	88	594
01-May-26 02:00	53	47	60	12	63	10	22	23	88	68	67	94	608
01-May-26 03:00	53	48	60	12	63	10	22	22	82	68	66	92	597
01-May-26 04:00	53	48	60	12	62	10	22	22	81	67	66	92	596
01-May-26 05:00	53	48	60	12	63	11	22	22	80	68	66	89	595
01-May-26 06:00	53	48	59	12	62	10	21	22	77	65	66	88	585
01-May-26 07:00	53	48	60	12	61	10	22	23	83	64	58	92	588
01-May-26 08:00	53	46	59	12	62	10	22	22	91	64	58	97	596
01-May-26 09:00	53	45	60	12	62	11	22	22	86	78	58	93	603
01-May-26 10:00	52	45	59	12	62	10	22	23	87	77	58	95	601
01-May-26 11:00	53	45	59	12	61	9	22	23	89	77	59	97	606
01-May-26 12:00	58	45	59	12	62	10	21	22	99	77	58	105	626
01-May-26 13:00	53	46	57	11	59	9	21	22	95	93	58	98	624
01-May-26 14:00	54	46	59	12	60	9	22	23	93	94	60	99	631
01-May-26 15:00	53	45	61	13	63	10	21	22	92	94	59	99	631
01-May-26 16:00	54	45	60	12	62	11	22	23	92	93	59	98	631
01-May-26 17:00	54	46	60	12	62	11	22	23	90	91	59	97	627
01-May-26 18:00	54	46	60	13	62	10	22	22	86	86	59	94	613
01-May-26 19:00	54	46	61	13	62	10	22	22	89	90	59	94	621
01-May-26 20:00	55	47	60	13	63	10	22	22	87	87	59	95	620
01-May-26 21:00	55	43	60	13	62	10	22	22	87	88	58	94	614
01-May-26 22:00	55	47	60	13	63	10	22	22	87	87	59	95	619
01-May-26 23:00	55	47	60	13	62	10	22	23	88	88	59	95	623

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
02-May-26 00:00	55	47	60	13	63	10	22	22	85	86	59	94	616
02-May-26 01:00	54	46	60	12	62	10	22	22	86	86	59	94	615
02-May-26 02:00	54	46	60	13	62	10	22	23	85	85	59	94	613
02-May-26 03:00	54	47	60	13	62	10	22	23	86	86	59	94	616
02-May-26 04:00	54	47	60	12	62	10	22	23	87	87	56	95	614
02-May-26 05:00	54	46	60	12	63	10	22	23	89	89	56	97	621
02-May-26 06:00	63	47	60	12	62	10	27	30	81	82	72	91	638
02-May-26 07:00	54	45	60	12	62	10	24	23	82	82	70	92	615
02-May-26 08:00	54	47	60	12	61	10	20	21	82	82	70	93	614
02-May-26 09:00	54	47	59	12	61	10	20	21	86	86	70	95	621
02-May-26 10:00	55	48	60	13	62	10	20	20	98	100	81	104	671
02-May-26 11:00	55	47	61	13	62	10	19	19	96	97	76	102	658
02-May-26 12:00	54	50	61	13	62	11	20	20	93	93	72	99	648
02-May-26 13:00	54	48	62	13	63	10	20	20	93	95	74	100	653
02-May-26 14:00	56	48	61	13	63	10	21	21	93	95	71	99	651
02-May-26 15:00	56	48	60	13	62	10	20	20	94	94	75	101	652
02-May-26 16:00	55	48	60	13	62	10	20	20	94	95	74	100	652
02-May-26 17:00	55	48	60	13	62	10	20	20	94	94	73	100	650
02-May-26 18:00	56	48	61	13	63	10	20	21	89	90	67	97	635
02-May-26 19:00	56	49	60	13	63	10	20	20	88	90	69	97	635
02-May-26 20:00	55	48	60	13	62	10	21	21	93	93	73	100	647
02-May-26 21:00	54	48	61	13	62	11	20	20	92	93	71	99	643
02-May-26 22:00	54	48	61	13	63	11	21	20	93	94	73	100	652
02-May-26 23:00	53	48	61	13	63	11	20	21	94	95	75	101	654
03-May-26 00:00	54	49	60	13	62	11	20	20	92	94	73	100	647
03-May-26 01:00	54	48	60	13	63	11	20	20	92	93	72	99	645
03-May-26 02:00	54	48	61	13	63	11	20	20	92	93	72	99	644
03-May-26 03:00	54	49	61	13	62	11	20	20	91	92	70	98	640
03-May-26 04:00	54	48	61	13	62	11	20	20	92	92	71	99	641
03-May-26 05:00	54	48	60	13	63	11	21	20	92	93	72	99	645
03-May-26 06:00	54	49	60	13	62	11	20	20	91	92	71	98	641
03-May-26 07:00	54	48	61	13	62	11	20	20	92	94	74	99	648
03-May-26 08:00	54	47	60	13	63	11	20	20	93	93	72	95	639
03-May-26 09:00	55	47	61	13	63	11	20	20	91	92	71	94	638
03-May-26 10:00	53	45	61	13	62	10	20	20	94	94	72	95	639
03-May-26 11:00	54	46	61	12	63	11	20	21	94	94	74	95	644
03-May-26 12:00	54	46	60	13	65	11	20	20	92	92	71	94	637
03-May-26 13:00	55	48	60	12	63	10	20	20	90	83	82	92	634
03-May-26 14:00	56	48	61	13	63	10	20	20	87	87	84	90	639
03-May-26 15:00	56	48	61	13	63	11	20	20	92	94	73	94	645
03-May-26 16:00	55	48	60	13	63	11	20	21	94	95	75	95	648
03-May-26 17:00	56	47	60	13	62	10	19	20	94	95	75	96	646
03-May-26 18:00	56	47	60	13	62	11	20	20	95	95	75	96	651
03-May-26 19:00	67	48	60	13	63	11	20	21	97	99	80	99	677

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
03-May-26 20:00	67	48	61	13	63	11	20	20	97	98	79	98	674
03-May-26 21:00	68	54	60	13	62	10	22	22	94	96	76	97	673
03-May-26 22:00	68	56	61	13	63	10	21	22	93	95	74	96	671
03-May-26 23:00	67	55	61	13	62	11	21	22	93	94	73	95	665
04-May-26 00:00	68	54	60	13	63	11	22	23	91	93	73	95	664
04-May-26 01:00	67	54	60	13	62	10	22	22	91	93	72	94	661
04-May-26 02:00	67	55	61	13	62	10	21	22	91	93	72	94	664
04-May-26 03:00	67	55	60	13	62	10	21	22	90	91	70	93	657
04-May-26 04:00	67	53	61	13	63	10	21	22	91	92	72	94	660
04-May-26 05:00	68	53	61	13	63	10	21	22	92	93	72	95	663
04-May-26 06:00	67	54	60	13	62	10	21	22	91	93	72	95	661
04-May-26 07:00	68	54	61	13	63	11	22	21	91	92	72	94	661
04-May-26 08:00	66	53	59	12	62	10	22	22	91	93	71	94	656
04-May-26 09:00	66	53	60	12	62	10	21	22	92	93	72	94	657
04-May-26 10:00	65	53	61	12	62	10	21	22	91	93	71	94	655
04-May-26 11:00	65	54	61	13	62	10	21	21	93	94	74	95	663
04-May-26 12:00	65	55	62	13	63	11	22	22	93	95	75	96	671
04-May-26 13:00	66	53	59	13	62	10	22	23	93	94	73	95	662
04-May-26 14:00	63	53	60	12	62	10	22	23	94	96	76	97	667
04-May-26 15:00	63	53	60	13	62	10	24	25	94	95	75	96	671
04-May-26 16:00	64	53	60	13	62	11	23	25	92	93	72	94	662
04-May-26 17:00	65	53	60	13	62	10	23	24	92	93	72	94	661
04-May-26 18:00	64	53	61	13	62	10	26	27	91	92	71	95	665
04-May-26 19:00	65	54	61	12	62	10	22	22	91	92	71	93	656
04-May-26 20:00	65	53	60	12	62	10	22	21	86	93	71	94	649
04-May-26 21:00	65	53	60	12	63	10	20	22	84	91	68	92	641
04-May-26 22:00	65	48	61	12	63	11	20	22	82	89	67	91	630
04-May-26 23:00	65	48	60	12	62	11	21	22	83	90	68	96	637
05-May-26 00:00	65	48	60	12	62	11	21	21	80	86	65	95	626
05-May-26 01:00	61	47	60	13	61	10	20	20	83	84	68	97	624
05-May-26 02:00	62	48	59	12	62	10	21	21	87	87	73	100	642
05-May-26 03:00	62	47	59	12	61	10	21	21	85	86	71	99	635
05-May-26 04:00	62	48	59	12	62	10	21	20	86	86	71	99	636
05-May-26 05:00	62	47	60	12	62	11	20	20	85	86	71	98	634
05-May-26 06:00	62	48	60	12	62	10	20	20	84	84	70	98	631
05-May-26 07:00	61	48	60	12	62	10	20	20	85	86	72	99	636
05-May-26 08:00	61	47	59	12	62	10	20	20	87	88	73	99	639
05-May-26 09:00	62	48	60	12	63	11	21	21	88	89	75	101	649
05-May-26 10:00	61	47	59	12	62	10	20	20	85	83	68	97	625
05-May-26 11:00	62	48	61	13	63	10	20	21	86	88	73	99	642
05-May-26 12:00	61	48	60	13	62	10	20	20	86	87	72	98	639
05-May-26 13:00	62	49	61	13	64	10	21	21	86	87	73	99	645
05-May-26 14:00	64	48	59	12	61	10	27	29	86	86	72	99	654
05-May-26 15:00	64	49	59	12	62	10	23	22	88	89	75	100	654

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
05-May-26 16:00	63	47	60	12	62	10	22	23	88	89	75	100	653
05-May-26 17:00	62	48	60	12	63	10	23	23	92	92	78	102	665
05-May-26 18:00	63	49	60	12	62	10	23	22	89	90	76	100	657
05-May-26 19:00	63	48	60	12	62	10	22	23	89	89	74	100	653
05-May-26 20:00	63	49	59	12	62	10	22	23	89	89	75	100	654
05-May-26 21:00	62	48	61	12	63	11	22	21	88	89	75	100	652
05-May-26 22:00	63	49	60	12	63	10	22	22	87	88	74	100	650
05-May-26 23:00	61	47	60	12	63	10	22	21	90	90	76	101	653
06-May-26 00:00	61	47	60	12	63	10	22	21	88	90	76	101	652
06-May-26 01:00	61	46	60	12	62	10	21	21	90	90	76	101	651
06-May-26 02:00	62	47	60	12	62	10	22	22	89	90	75	101	652
06-May-26 03:00	63	48	60	12	62	10	22	21	87	88	74	100	648
06-May-26 04:00	63	49	60	13	63	10	22	21	88	90	75	101	654
06-May-26 05:00	62	48	60	12	63	10	22	21	88	89	74	100	650
06-May-26 06:00	62	48	61	12	63	10	22	21	88	88	74	100	650
06-May-26 07:00	63	48	60	13	62	11	22	21	87	87	73	100	647
06-May-26 08:00	64	48	61	13	63	11	22	21	91	91	77	102	664
06-May-26 09:00	63	49	61	13	62	11	22	21	88	89	75	101	656
06-May-26 10:00	63	48	60	13	62	10	22	21	88	88	74	100	650
06-May-26 11:00	64	48	61	13	64	11	22	21	86	87	72	99	648
06-May-26 12:00	63	48	61	13	64	11	22	21	86	85	71	98	644
06-May-26 13:00	62	48	61	13	63	11	22	22	89	89	75	100	654
06-May-26 14:00	62	49	61	13	63	10	22	21	91	93	79	103	666
06-May-26 15:00	63	49	61	13	63	10	23	22	90	92	77	102	665
06-May-26 16:00	63	49	61	13	63	11	24	23	90	91	71	88	646
06-May-26 17:00	63	48	60	13	62	10	21	21	94	95	74	85	648
06-May-26 18:00	63	48	60	13	63	10	21	22	94	95	73	86	648
06-May-26 19:00	64	49	61	13	62	10	22	21	91	93	72	86	645
06-May-26 20:00	64	48	60	13	62	11	22	21	92	92	71	86	642
06-May-26 21:00	63	49	60	13	62	10	23	21	91	91	69	87	639
06-May-26 22:00	64	48	61	13	62	10	22	21	90	92	69	87	640
06-May-26 23:00	63	47	61	13	62	10	22	21	91	91	69	87	637
07-May-26 00:00	63	47	61	13	63	10	22	22	90	92	70	86	639
07-May-26 01:00	62	46	61	13	62	10	22	22	89	91	69	87	634
07-May-26 02:00	55	46	60	13	63	10	22	21	81	80	68	87	605
07-May-26 03:00	56	47	60	13	62	10	22	21	81	81	69	87	609
07-May-26 04:00	55	45	60	13	62	10	22	21	84	83	68	87	611
07-May-26 05:00	54	45	60	13	62	10	22	22	82	81	69	87	607
07-May-26 06:00	53	46	58	11	62	10	22	22	84	84	68	86	607
07-May-26 07:00	53	45	58	11	61	10	22	22	84	84	68	86	603
07-May-26 08:00	54	45	58	11	60	9	23	22	84	84	68	87	603
07-May-26 09:00	53	44	58	11	59	9	22	22	83	82	68	86	598
07-May-26 10:00	55	46	58	11	60	9	22	22	86	85	52	86	593
07-May-26 11:00	58	46	58	11	61	9	20	20	82	84	52	86	588

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
07-May-26 12:00	57	45	59	12	60	10	21	20	84	85	52	86	591
07-May-26 13:00	55	47	60	12	60	9	20	20	85	84	52	87	589
07-May-26 14:00	56	47	59	11	61	9	20	20	83	84	53	87	591
07-May-26 15:00	54	45	59	12	60	10	20	20	83	83	53	87	586
07-May-26 16:00	56	47	59	12	61	10	20	20	84	83	53	87	591
07-May-26 17:00	56	47	59	12	62	10	21	20	83	83	53	87	591
07-May-26 18:00	55	46	59	12	61	9	20	20	83	82	52	86	585
07-May-26 19:00	55	48	61	12	62	10	20	20	83	84	52	87	592
07-May-26 20:00	56	47	60	12	62	10	20	20	83	83	52	86	592
07-May-26 21:00	56	48	60	12	61	10	21	20	83	84	52	87	594
07-May-26 22:00	55	47	60	12	62	10	20	19	84	84	55	86	594
07-May-26 23:00	55	45	59	12	61	10	20	19	83	82	54	81	582
08-May-26 00:00	55	47	60	12	62	10	20	19	83	83	54	80	586
08-May-26 01:00	54	45	60	13	62	10	21	20	82	83	54	81	584
08-May-26 02:00	54	46	60	12	62	10	20	20	81	81	55	81	582
08-May-26 03:00	54	46	59	12	61	10	20	20	82	82	53	82	582
08-May-26 04:00	54	45	60	12	61	10	20	19	83	82	54	86	587
08-May-26 05:00	54	45	60	12	61	10	20	20	80	82	54	86	584
08-May-26 06:00	54	45	59	11	59	9	20	20	81	79	54	86	578
08-May-26 07:00	53	45	58	11	60	9	20	19	77	80	54	86	573
08-May-26 08:00	53	45	59	11	60	10	20	19	80	65	54	86	562
08-May-26 09:00	53	44	58	11	60	10	21	20	80	66	56	87	565
08-May-26 10:00	53	44	57	10	59	8	21	19	83	66	54	86	560
08-May-26 11:00	53	67	57	10	59	8	20	20	83	66	55	87	584
08-May-26 12:00	54	46	63	14	58	9	20	20	95	66	55	89	586
08-May-26 13:00	54	45	61	13	58	9	20	19	83	66	70	87	585
08-May-26 14:00	53	45	57	10	59	8	21	19	98	68	51	90	579
08-May-26 15:00	53	43	57	11	59	9	20	19	102	67	49	87	577
08-May-26 16:00	53	44	57	11	60	9	21	19	103	67	48	86	578
08-May-26 17:00	53	45	57	11	59	9	20	20	87	67	50	86	564
08-May-26 18:00	53	45	57	11	60	9	20	20	92	67	48	85	568
08-May-26 19:00	53	45	57	11	60	9	20	19	91	66	48	86	564
08-May-26 20:00	53	46	58	11	59	9	20	20	90	67	49	86	567
08-May-26 21:00	53	45	58	11	60	9	20	19	95	57	57	86	570
08-May-26 22:00	53	45	58	11	60	9	20	20	92	66	50	86	571
08-May-26 23:00	53	46	58	11	60	9	20	20	91	67	50	86	572
09-May-26 00:00	53	45	58	11	60	9	20	20	94	67	50	86	573
09-May-26 01:00	53	45	59	11	60	9	20	20	84	88	49	86	582
09-May-26 02:00	53	45	57	11	59	9	20	20	89	79	49	86	579
09-May-26 03:00	53	45	58	11	60	8	21	19	95	82	50	86	589
09-May-26 04:00	53	45	57	11	59	9	21	19	90	80	49	86	580
09-May-26 05:00	53	46	58	11	60	8	20	20	92	80	49	86	583
09-May-26 06:00	53	46	58	11	60	9	20	20	91	80	48	86	582
09-May-26 07:00	54	46	58	11	60	9	20	20	90	80	48	86	582

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
09-May-26 08:00	53	45	57	11	59	9	20	20	89	80	49	86	579
09-May-26 09:00	53	46	57	11	59	9	21	20	90	81	50	86	581
09-May-26 10:00	53	45	58	11	60	8	21	20	89	81	49	87	581
09-May-26 11:00	53	46	58	11	60	9	20	20	84	82	51	87	581
09-May-26 12:00	53	45	57	11	59	9	21	20	88	82	51	87	584
09-May-26 13:00	54	46	57	11	63	10	20	19	89	81	50	87	586
09-May-26 14:00	54	46	59	12	62	9	20	20	86	69	70	87	593
09-May-26 15:00	53	46	60	12	63	10	20	19	85	71	68	87	594
09-May-26 16:00	54	48	59	12	62	9	21	20	93	81	52	87	597
09-May-26 17:00	54	47	59	12	62	9	20	20	93	80	51	87	592
09-May-26 18:00	53	46	59	12	62	10	21	20	93	80	51	87	595
09-May-26 19:00	53	47	60	12	62	10	20	20	88	86	51	87	596
09-May-26 20:00	54	49	60	12	61	10	21	20	86	68	66	87	592
09-May-26 21:00	53	47	60	12	62	10	20	20	89	67	68	86	595
09-May-26 22:00	54	48	60	12	62	10	20	20	89	67	68	86	596
09-May-26 23:00	53	48	60	12	62	10	20	19	88	67	66	86	591
10-May-26 00:00	53	48	61	13	62	10	21	19	89	67	68	87	596
10-May-26 01:00	53	47	60	12	62	10	20	20	89	67	68	87	597
10-May-26 02:00	54	48	60	13	62	10	21	20	88	67	65	86	591
10-May-26 03:00	53	47	60	13	62	10	21	20	87	67	66	81	588
10-May-26 04:00	54	48	60	13	62	10	20	20	87	66	66	81	586
10-May-26 05:00	53	47	60	13	61	10	21	19	95	67	76	81	603
10-May-26 06:00	53	47	60	12	62	9	21	20	87	79	72	81	604
10-May-26 07:00	54	46	59	12	61	9	21	20	84	80	69	86	602
10-May-26 08:00	54	46	59	12	60	9	21	20	86	80	72	88	607
10-May-26 09:00	53	47	59	12	61	9	22	20	85	73	66	88	593
10-May-26 10:00	54	47	60	12	62	9	22	20	90	69	69	87	600
10-May-26 11:00	57	45	58	11	61	8	21	19	90	69	69	87	596
10-May-26 12:00	57	45	58	11	61	8	21	19	88	68	68	87	590
10-May-26 13:00	57	46	58	11	61	8	21	19	91	68	71	86	597
10-May-26 14:00	53	47	58	11	61	9	22	19	92	69	70	82	594
10-May-26 15:00	53	46	59	11	62	10	21	19	93	68	73	80	598
10-May-26 16:00	53	46	59	12	62	10	21	20	91	68	70	82	592
10-May-26 17:00	53	47	59	12	62	10	21	19	89	67	68	81	586
10-May-26 18:00	53	46	59	12	62	10	21	19	89	68	67	81	588
10-May-26 19:00	53	46	59	12	62	9	21	19	88	68	65	82	585
10-May-26 20:00	54	47	60	12	62	9	22	20	88	68	67	83	593
10-May-26 21:00	53	46	60	13	62	10	22	20	92	61	72	83	592
10-May-26 22:00	55	48	60	12	62	10	21	19	88	67	68	83	593
10-May-26 23:00	62	47	60	13	62	10	26	24	80	77	67	85	613
11-May-26 00:00	63	47	60	12	61	10	26	24	80	76	65	86	611
11-May-26 01:00	63	47	60	12	61	10	26	24	79	79	70	87	618
11-May-26 02:00	62	47	60	12	62	10	25	23	82	79	67	86	616
11-May-26 03:00	63	47	60	12	61	10	25	24	82	80	66	86	618

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
11-May-26 04:00	54	47	60	12	62	9	25	24	81	79	65	86	604
11-May-26 05:00	54	48	60	12	61	9	26	24	79	69	66	87	596
11-May-26 06:00	55	48	59	12	62	9	21	21	83	66	68	86	590
11-May-26 07:00	53	47	60	12	62	10	21	21	83	67	69	87	591
11-May-26 08:00	54	47	60	12	61	10	20	20	83	66	68	86	587
11-May-26 09:00	54	47	59	12	61	9	21	21	83	67	66	87	589
11-May-26 10:00	55	48	60	12	61	9	21	21	85	67	71	87	598
11-May-26 11:00	55	46	60	12	62	10	20	20	81	79	66	86	596
11-May-26 12:00	56	49	60	13	62	10	21	21	86	66	71	87	601
11-May-26 13:00	56	48	61	13	62	10	21	21	85	67	71	86	602
11-May-26 14:00	53	48	62	13	62	9	21	21	85	69	68	87	597
11-May-26 15:00	57	48	60	13	62	10	21	20	83	68	65	86	594
11-May-26 16:00	55	48	61	13	63	9	21	21	86	68	72	87	603
11-May-26 17:00	55	48	61	12	62	9	21	21	82	67	68	87	592
11-May-26 18:00	55	48	60	13	62	9	21	21	87	67	74	87	604
11-May-26 19:00	55	48	60	12	62	9	21	21	82	66	68	86	593
11-May-26 20:00	56	48	60	13	62	9	21	22	86	66	72	86	601
11-May-26 21:00	53	45	60	12	62	9	21	21	88	67	73	87	597
11-May-26 22:00	54	46	60	12	61	9	21	21	86	67	71	87	597
11-May-26 23:00	54	46	60	12	62	9	21	21	84	66	70	87	592
12-May-26 00:00	54	46	60	12	62	9	21	21	83	67	69	87	591
12-May-26 01:00	53	44	60	12	63	9	21	21	87	66	74	86	597
12-May-26 02:00	54	46	60	12	62	9	21	21	83	66	68	86	590
12-May-26 03:00	54	46	60	13	62	10	21	19	82	65	71	85	590
12-May-26 04:00	63	45	59	12	61	9	30	33	81	64	67	85	608
12-May-26 05:00	63	48	60	12	61	9	32	33	80	70	72	86	624
12-May-26 06:00	63	46	60	12	61	9	31	33	80	57	72	86	610
12-May-26 07:00	61	46	59	12	60	9	32	33	84	57	72	86	612
12-May-26 08:00	54	47	59	12	61	9	21	21	83	82	72	86	607
12-May-26 09:00	54	47	59	12	61	10	21	21	80	83	74	86	607
12-May-26 10:00	53	44	58	12	61	9	21	22	87	65	70	86	588
12-May-26 11:00	53	44	59	12	60	9	21	21	84	66	68	86	582
12-May-26 12:00	53	44	60	12	64	11	21	21	76	67	69	86	586
12-May-26 13:00	53	43	59	12	60	10	21	21	89	48	85	87	589
12-May-26 14:00	54	44	59	12	61	9	21	21	89	46	85	87	589
12-May-26 15:00	53	43	58	12	61	9	20	21	91	51	80	90	589
12-May-26 16:00	53	45	58	12	60	9	20	21	89	65	75	88	594
12-May-26 17:00	53	44	58	11	61	9	21	21	89	67	77	88	598
12-May-26 18:00	53	45	58	11	61	9	20	21	90	66	76	85	594
12-May-26 19:00	54	45	58	11	60	9	21	21	90	66	77	83	594
12-May-26 20:00	53	45	57	11	60	9	21	21	86	67	71	81	582
12-May-26 21:00	53	44	58	11	60	9	21	21	88	66	73	86	591
12-May-26 22:00	53	44	58	11	61	9	21	20	82	67	68	86	581
12-May-26 23:00	53	45	58	11	60	9	20	19	84	66	73	86	585

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
13-May-26 00:00	53	45	58	11	61	10	21	21	83	66	69	86	583
13-May-26 01:00	53	44	58	11	60	9	20	21	85	66	71	86	584
13-May-26 02:00	54	45	59	11	61	9	20	21	85	66	71	85	586
13-May-26 03:00	53	44	58	11	60	9	20	21	85	66	71	86	584
13-May-26 04:00	53	43	58	11	61	9	20	21	82	66	68	86	578
13-May-26 05:00	53	44	58	11	61	9	21	20	82	67	68	87	583
13-May-26 06:00	53	45	58	11	60	9	20	20	89	66	75	86	594
13-May-26 07:00	53	44	58	11	60	9	20	21	89	66	76	87	594
13-May-26 08:00	53	45	58	11	60	9	20	21	83	80	68	86	594
13-May-26 09:00	53	46	58	11	60	9	20	20	84	80	70	87	597
13-May-26 10:00	53	45	58	11	60	9	20	21	84	80	69	87	597
13-May-26 11:00	53	44	58	11	61	9	20	20	86	80	72	87	603
13-May-26 12:00	54	45	59	11	61	9	20	21	89	80	77	87	613
13-May-26 13:00	56	44	58	11	60	9	21	21	89	81	76	88	613
13-May-26 14:00	53	44	58	11	60	9	20	20	91	79	78	88	612
13-May-26 15:00	53	44	58	11	60	9	20	21	90	80	76	88	610
13-May-26 16:00	53	44	58	11	60	9	21	21	90	81	78	88	614
13-May-26 17:00	57	42	55	9	58	8	25	27	74	80	67	86	589
13-May-26 18:00	53	45	58	11	60	8	21	20	89	83	69	87	606
13-May-26 19:00	54	47	58	12	60	9	21	21	86	80	67	87	600
13-May-26 20:00	55	48	57	11	60	9	22	21	87	81	67	87	604
13-May-26 21:00	55	49	58	11	60	9	22	21	87	87	67	88	614
13-May-26 22:00	55	50	58	11	60	8	22	21	88	88	66	88	615
13-May-26 23:00	55	48	57	11	59	9	22	21	87	88	67	88	612
14-May-26 00:00	55	48	57	11	60	9	21	20	89	87	65	87	610
14-May-26 01:00	55	48	58	11	60	9	22	21	87	87	67	87	611
14-May-26 02:00	54	47	56	10	59	9	21	21	86	86	65	86	601
14-May-26 03:00	54	48	56	11	59	9	22	21	86	87	64	86	603
14-May-26 04:00	54	47	58	11	59	9	22	21	86	86	65	87	604
14-May-26 05:00	54	47	57	11	59	8	22	20	84	83	65	86	596
14-May-26 06:00	54	47	56	11	59	8	22	22	81	87	64	86	599
14-May-26 07:00	54	47	56	11	59	8	22	22	79	89	64	86	598
14-May-26 08:00	53	48	57	11	59	9	22	22	79	86	65	86	596
14-May-26 09:00	53	48	57	11	59	9	22	22	79	85	66	87	597
14-May-26 10:00	54	48	57	11	59	9	22	22	84	80	66	87	600
14-May-26 11:00	54	47	59	12	61	9	22	22	82	82	68	87	603
14-May-26 12:00	54	48	59	11	61	9	22	22	80	80	67	87	599
14-May-26 13:00	54	49	59	11	60	9	23	23	81	81	67	87	605
14-May-26 14:00	54	49	62	13	61	8	22	22	85	85	70	87	616
14-May-26 15:00	54	49	58	12	61	9	21	21	82	82	68	86	602
14-May-26 16:00	53	48	58	12	60	9	22	22	83	80	67	86	600
14-May-26 17:00	55	49	58	11	60	9	22	22	82	81	67	87	604
14-May-26 18:00	51	84	56	10	58	8	22	22	79	67	68	87	611
14-May-26 19:00	52	85	55	10	58	8	22	22	76	67	68	87	612

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
14-May-26 20:00	52	85	56	10	59	8	22	22	76	66	67	87	609
14-May-26 21:00	56	64	57	10	58	8	26	27	91	56	80	87	620
14-May-26 22:00	56	64	56	10	58	8	27	28	90	60	79	88	626
14-May-26 23:00	57	63	56	10	59	8	26	27	93	63	80	87	628
15-May-26 00:00	56	62	56	10	59	8	26	28	93	66	81	87	632
15-May-26 01:00	56	62	56	10	59	8	26	28	93	66	83	88	634
15-May-26 02:00	56	61	56	10	58	8	26	27	89	80	76	87	635
15-May-26 03:00	56	63	56	10	59	8	26	28	88	79	74	84	631
15-May-26 04:00	56	65	55	10	59	8	26	27	91	79	78	82	637
15-May-26 05:00	57	63	57	10	60	8	26	27	80	79	66	82	615
15-May-26 06:00	55	63	56	10	60	8	26	28	80	79	66	82	615
15-May-26 07:00	56	63	57	10	60	8	26	25	82	82	66	82	616
15-May-26 08:00	56	65	55	10	60	8	30	20	82	82	67	81	616
15-May-26 09:00	56	64	56	10	60	8	21	23	91	92	74	82	638
15-May-26 10:00	55	82	56	10	59	8	20	20	89	88	64	82	633
15-May-26 11:00	55	85	56	10	58	8	20	19	83	80	52	80	605
15-May-26 12:00	55	84	56	10	58	8	19	20	80	80	52	80	603
15-May-26 13:00	52	111	54	10	56	7	20	20	80	81	52	75	617
15-May-26 14:00	53	94	56	10	57	8	20	20	86	87	53	79	622
15-May-26 15:00	54	74	57	11	59	8	21	20	84	83	55	82	607
15-May-26 16:00	56	62	56	11	63	10	20	20	86	85	68	81	617
15-May-26 17:00	56	61	59	12	61	8	20	20	92	89	65	82	624
15-May-26 18:00	55	62	58	12	61	9	20	19	87	87	70	81	621
15-May-26 19:00	56	62	59	12	62	10	20	20	94	95	54	81	623
15-May-26 20:00	56	64	59	12	61	9	20	20	92	94	54	81	621
15-May-26 21:00	55	63	59	12	61	8	20	19	92	92	54	82	617
15-May-26 22:00	56	64	59	12	61	9	21	20	86	87	67	81	624
15-May-26 23:00	55	62	59	12	61	9	21	20	87	87	67	82	621
16-May-26 00:00	56	63	59	12	61	9	21	20	85	85	68	82	622
16-May-26 01:00	55	61	59	12	61	9	21	20	85	85	67	81	617
16-May-26 02:00	56	62	59	12	62	9	21	19	84	85	67	81	618
16-May-26 03:00	56	63	59	12	61	9	21	20	87	88	67	81	626
16-May-26 04:00	55	62	59	12	61	9	21	20	85	85	67	80	615
16-May-26 05:00	56	62	59	12	61	9	21	20	84	83	67	82	616
16-May-26 06:00	55	61	58	12	61	9	21	20	84	85	68	81	615
16-May-26 07:00	55	60	58	11	60	9	20	19	84	85	67	81	610
16-May-26 08:00	55	60	57	11	60	9	21	20	86	88	68	81	616
16-May-26 09:00	55	59	57	11	60	9	21	20	88	89	67	82	620
16-May-26 10:00	57	61	58	11	61	9	20	19	88	89	69	81	624
16-May-26 11:00	56	71	55	10	56	7	21	20	86	87	70	82	623
16-May-26 12:00	56	60	56	10	60	8	20	20	88	89	70	81	618
16-May-26 13:00	56	63	59	12	59	8	20	20	87	89	70	82	623
16-May-26 14:00	55	62	58	11	61	8	21	19	88	88	70	82	625
16-May-26 15:00	56	61	58	11	61	9	21	19	89	90	70	81	626

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
16-May-26 16:00	55	61	58	11	60	9	20	20	89	89	69	81	622
16-May-26 17:00	55	61	59	12	61	9	21	20	92	92	70	81	632
16-May-26 18:00	56	62	58	11	60	8	21	20	91	92	71	80	630
16-May-26 19:00	55	60	58	11	60	9	21	19	93	94	74	81	636
16-May-26 20:00	56	63	58	11	60	9	21	19	94	95	75	80	641
16-May-26 21:00	57	62	58	11	60	8	21	21	98	102	81	81	659
16-May-26 22:00	56	61	58	12	61	8	21	19	98	100	80	81	654
16-May-26 23:00	56	64	59	12	61	9	20	20	96	97	77	82	655
17-May-26 00:00	56	63	58	12	61	9	20	20	94	96	74	81	645
17-May-26 01:00	56	63	59	12	61	9	20	20	93	94	72	81	639
17-May-26 02:00	55	64	58	12	62	9	20	20	91	92	70	80	634
17-May-26 03:00	55	63	58	12	61	9	21	19	92	94	72	81	637
17-May-26 04:00	55	62	59	12	60	9	21	20	93	96	75	81	643
17-May-26 05:00	56	62	58	12	61	9	20	20	93	93	72	80	635
17-May-26 06:00	56	61	57	11	61	9	20	20	92	94	73	80	635
17-May-26 07:00	55	63	58	12	62	9	21	20	91	94	72	82	638
17-May-26 08:00	56	61	58	11	61	9	20	19	94	94	72	81	636
17-May-26 09:00	55	62	58	11	60	8	21	20	92	94	71	81	632
17-May-26 10:00	56	61	58	12	60	8	21	20	92	95	74	81	637
17-May-26 11:00	56	63	62	13	59	8	20	20	91	94	74	81	639
17-May-26 12:00	56	61	57	11	59	8	21	19	93	96	75	81	639
17-May-26 13:00	56	63	58	11	60	8	20	20	92	94	73	80	635
17-May-26 14:00	56	61	57	11	58	8	21	20	93	95	74	84	638
17-May-26 15:00	56	61	57	11	58	8	20	20	93	94	73	86	638
17-May-26 16:00	56	63	57	11	58	8	21	19	92	95	73	86	639
17-May-26 17:00	56	62	57	11	58	8	21	20	93	94	74	86	639
17-May-26 18:00	56	62	57	11	60	8	20	20	92	95	75	85	641
17-May-26 19:00	56	64	57	11	59	8	21	20	93	95	75	85	645
17-May-26 20:00	56	62	57	11	59	8	21	20	93	95	74	86	643
17-May-26 21:00	56	62	58	11	60	9	21	19	95	95	80	81	646
17-May-26 22:00	56	63	57	11	59	8	21	20	94	95	74	81	639
17-May-26 23:00	55	61	57	11	59	8	20	19	97	96	76	81	642
18-May-26 00:00	56	60	57	11	59	8	20	19	95	96	76	82	639
18-May-26 01:00	55	61	58	11	60	8	20	20	96	96	76	81	640
18-May-26 02:00	56	62	57	11	59	8	21	20	96	97	78	82	646
18-May-26 03:00	56	60	57	11	59	8	21	19	94	96	76	81	636
18-May-26 04:00	55	61	57	11	59	8	21	20	93	94	73	81	633
18-May-26 05:00	56	61	57	11	59	8	21	20	93	94	74	81	634
18-May-26 06:00	55	55	56	10	58	8	21	20	95	96	76	80	631
18-May-26 07:00	56	57	56	10	60	8	21	20	92	94	73	81	627
18-May-26 08:00	54	56	55	10	59	8	21	20	92	93	73	81	622
18-May-26 09:00	54	55	56	10	59	8	22	20	101	67	85	86	622
18-May-26 10:00	56	55	56	10	59	8	21	20	96	66	80	85	611
18-May-26 11:00	56	55	56	10	58	8	21	20	97	67	78	84	609

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
18-May-26 12:00	56	54	56	10	59	8	21	20	96	67	78	82	605
18-May-26 13:00	56	56	55	10	58	8	20	20	98	60	84	82	606
18-May-26 14:00	56	55	56	10	59	8	20	19	105	47	90	83	608
18-May-26 15:00	56	54	56	10	64	9	21	20	96	67	82	82	618
18-May-26 16:00	56	55	56	10	59	8	21	20	86	67	77	82	597
18-May-26 17:00	53	58	55	10	59	8	21	19	87	81	52	82	585
18-May-26 18:00	54	57	55	10	60	8	21	19	86	87	52	82	592
18-May-26 19:00	53	57	56	10	60	8	20	19	89	90	54	82	598
18-May-26 20:00	53	59	55	10	60	8	20	19	87	87	53	81	593
18-May-26 21:00	53	60	55	10	60	8	20	19	86	85	54	82	592
18-May-26 22:00	53	59	56	10	60	8	21	20	89	89	54	81	599
18-May-26 23:00	53	59	56	10	60	8	21	19	89	89	54	81	599
19-May-26 00:00	53	60	56	10	60	8	20	20	88	89	54	81	599
19-May-26 01:00	53	59	56	10	60	8	20	19	87	88	53	81	596
19-May-26 02:00	53	60	56	10	59	8	21	20	87	87	53	81	596
19-May-26 03:00	53	59	56	10	60	8	20	20	87	87	53	81	593
19-May-26 04:00	53	60	56	10	59	8	20	20	87	88	53	80	595
19-May-26 05:00	53	60	56	10	60	8	21	19	90	91	54	81	604
19-May-26 06:00	53	60	55	10	60	8	21	19	86	86	54	81	593
19-May-26 07:00	54	60	56	10	59	8	21	20	84	85	53	81	590
19-May-26 08:00	53	58	56	10	59	8	20	19	80	80	54	82	578
19-May-26 09:00	53	59	56	10	58	8	21	20	82	79	54	82	580
19-May-26 10:00	53	55	55	10	57	8	21	20	81	85	54	82	582
19-May-26 11:00	53	56	56	10	58	8	20	19	82	87	53	81	585
19-May-26 12:00	53	56	55	10	58	8	21	20	92	66	54	81	574
19-May-26 13:00	52	54	56	10	58	8	21	19	95	66	53	83	575
19-May-26 14:00	57	55	56	10	57	8	20	19	91	66	53	81	575
19-May-26 15:00	52	65	56	10	58	8	21	20	88	67	54	82	580
19-May-26 16:00	52	71	56	10	57	8	20	20	81	66	53	81	574
19-May-26 17:00	53	56	57	10	59	8	21	20	102	66	53	81	586
19-May-26 18:00	53	56	56	10	60	8	21	19	97	67	53	81	581
19-May-26 19:00	53	56	55	10	58	8	21	20	98	67	54	82	582
19-May-26 20:00	53	57	56	10	58	8	21	20	81	66	67	81	578
19-May-26 21:00	53	55	56	10	59	8	21	19	99	67	53	81	580
19-May-26 22:00	54	55	56	10	59	8	22	21	83	81	53	83	583
19-May-26 23:00	53	56	57	10	59	8	21	19	84	93	53	82	596
20-May-26 00:00	55	57	57	10	59	8	21	20	81	89	52	82	591
20-May-26 01:00	55	57	57	10	59	8	21	20	81	88	52	82	589
20-May-26 02:00	55	56	56	10	59	8	21	19	83	90	52	82	592
20-May-26 03:00	55	56	56	10	58	8	21	19	82	88	53	82	589
20-May-26 04:00	55	57	56	10	58	8	20	19	80	85	52	82	583
20-May-26 05:00	55	57	57	10	59	8	21	19	80	88	53	82	589
20-May-26 06:00	55	54	57	10	59	8	20	20	81	87	52	82	585
20-May-26 07:00	55	57	56	10	59	8	21	19	82	81	52	82	583

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
20-May-26 08:00	55	57	56	10	58	8	21	19	85	85	52	82	589
20-May-26 09:00	56	55	56	10	58	8	21	20	86	87	53	81	592
20-May-26 10:00	55	56	56	10	58	8	21	20	88	90	53	82	597
20-May-26 11:00	55	55	56	10	59	8	21	19	89	91	53	81	597
20-May-26 12:00	55	57	62	13	58	8	20	19	91	97	53	78	614
20-May-26 13:00	56	56	59	12	59	8	21	19	83	82	66	81	601
20-May-26 14:00	56	56	57	10	58	8	21	20	86	86	65	82	604
20-May-26 15:00	55	56	55	10	58	8	20	20	83	82	67	81	595
20-May-26 16:00	54	55	55	10	58	7	20	19	89	89	67	81	606
20-May-26 17:00	55	60	56	10	58	8	20	19	88	88	53	80	596
20-May-26 18:00	55	60	55	10	57	8	21	20	89	89	54	81	598
20-May-26 19:00	55	61	55	10	58	8	21	19	88	88	54	81	597
20-May-26 20:00	55	61	56	10	58	8	20	19	84	83	63	81	598
20-May-26 21:00	55	59	56	10	59	8	21	20	84	88	60	81	601
20-May-26 22:00	55	59	56	10	58	8	20	20	88	88	53	81	596
20-May-26 23:00	55	60	56	10	58	8	20	20	87	87	52	81	595
21-May-26 00:00	55	59	56	10	59	8	20	20	84	84	53	82	589
21-May-26 01:00	55	58	56	10	58	8	21	19	87	88	53	81	594
21-May-26 02:00	55	60	56	10	58	8	20	20	84	83	53	82	589
21-May-26 03:00	55	61	56	10	58	8	20	20	89	90	53	81	600
21-May-26 04:00	56	59	57	10	57	7	21	20	86	85	53	81	593
21-May-26 05:00	55	61	56	10	58	7	21	19	89	90	54	82	602
21-May-26 06:00	55	58	55	10	58	8	21	19	92	94	53	82	605
21-May-26 07:00	55	60	56	10	58	8	20	20	89	90	52	81	599
21-May-26 08:00	54	61	56	10	57	8	21	19	88	88	53	82	596
21-May-26 09:00	54	61	56	10	58	8	21	20	82	81	53	83	586
21-May-26 10:00	54	61	56	10	57	8	20	20	83	84	53	82	589
21-May-26 11:00	54	59	56	10	58	8	21	19	87	88	53	81	593
21-May-26 12:00	54	61	57	10	59	8	21	19	88	89	54	82	599
21-May-26 13:00	54	60	56	10	64	11	20	20	88	91	52	79	606
21-May-26 14:00	54	61	56	10	59	8	21	20	83	80	62	82	597
21-May-26 15:00	53	59	55	10	58	8	20	19	80	72	70	82	587
21-May-26 16:00	55	62	56	10	58	7	20	20	88	89	53	87	605
21-May-26 17:00	54	59	55	10	58	8	21	19	80	80	53	87	584
21-May-26 18:00	54	59	56	10	58	8	20	18	80	79	51	86	580
21-May-26 19:00	53	59	56	10	58	8	21	20	81	80	53	87	588
21-May-26 20:00	54	60	56	10	59	8	21	20	79	80	52	87	585
21-May-26 21:00	55	56	56	10	58	8	21	19	81	80	53	88	584
21-May-26 22:00	54	59	56	10	58	8	20	20	80	80	52	87	585
21-May-26 23:00	55	61	56	10	59	8	21	20	80	80	53	88	590
22-May-26 00:00	54	60	56	10	59	8	21	20	83	82	53	87	592
22-May-26 01:00	54	59	56	10	58	8	21	19	81	81	53	87	587
22-May-26 02:00	54	59	55	10	58	8	20	20	82	82	52	87	587
22-May-26 03:00	55	60	56	10	59	8	21	20	82	83	53	87	592

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
22-May-26 04:00	54	59	56	10	58	8	21	20	82	81	52	87	587
22-May-26 05:00	54	61	57	10	58	8	20	20	80	80	52	86	587
22-May-26 06:00	54	59	56	10	59	8	20	20	85	85	51	86	592
22-May-26 07:00	59	59	56	10	59	8	24	26	80	80	55	86	601
22-May-26 08:00	54	58	56	10	59	8	24	25	82	82	51	86	597
22-May-26 09:00	54	59	56	10	57	8	23	24	83	84	50	86	593
22-May-26 10:00	56	61	56	10	59	8	24	26	83	84	51	86	603
22-May-26 11:00	55	60	56	10	58	8	24	25	85	85	52	87	605
22-May-26 12:00	55	60	56	10	58	8	24	26	83	86	51	87	604
22-May-26 13:00	58	61	56	10	58	8	24	25	81	84	51	87	603
22-May-26 14:00	57	59	56	10	58	8	24	24	74	81	52	87	590
22-May-26 15:00	54	70	56	10	59	8	25	26	67	81	52	82	591
22-May-26 16:00	54	59	56	10	57	8	24	25	80	78	50	87	588
22-May-26 17:00	54	57	56	10	57	8	26	25	81	77	50	87	588
22-May-26 18:00	54	55	56	10	58	8	26	25	79	78	50	87	585
22-May-26 19:00	54	55	56	10	58	8	26	25	88	88	48	87	602
22-May-26 20:00	54	55	56	10	58	8	22	23	87	87	48	86	594
22-May-26 21:00	54	56	56	10	58	8	22	23	90	91	45	86	598
22-May-26 22:00	54	57	56	10	58	8	21	20	90	91	45	86	596
22-May-26 23:00	54	54	56	10	57	8	20	20	106	108	52	101	647
23-May-26 00:00	54	54	56	10	58	8	21	20	96	97	52	87	613
23-May-26 01:00	54	56	57	10	58	7	22	22	90	90	54	88	608
23-May-26 02:00	54	55	57	10	58	8	22	20	95	97	54	89	617
23-May-26 03:00	54	55	55	10	58	8	21	20	95	96	53	87	612
23-May-26 04:00	54	55	57	10	58	8	21	19	94	95	53	87	610
23-May-26 05:00	54	56	56	10	57	8	22	20	91	92	53	88	606
23-May-26 06:00	54	56	56	10	57	8	21	20	94	95	52	87	609
23-May-26 07:00	53	55	57	10	58	8	21	20	92	94	53	87	609
23-May-26 08:00	54	57	57	10	58	8	25	26	87	88	52	87	609
23-May-26 09:00	53	56	56	10	58	8	23	21	92	93	53	87	610
23-May-26 10:00	54	56	57	10	59	8	23	22	84	84	54	87	599
23-May-26 11:00	53	55	56	10	58	8	21	20	89	90	53	87	601
23-May-26 12:00	54	57	56	10	57	8	21	21	81	86	67	88	607
23-May-26 13:00	54	56	56	10	58	8	24	22	78	83	67	89	605
23-May-26 14:00	54	57	56	10	58	8	22	20	82	82	67	87	602
23-May-26 15:00	60	55	57	10	59	8	23	20	79	81	67	87	604
23-May-26 16:00	60	55	56	10	57	8	22	20	83	81	67	87	606
23-May-26 17:00	61	55	56	10	58	8	23	21	81	81	68	87	608
23-May-26 18:00	61	57	55	10	57	8	22	20	80	79	66	86	601
23-May-26 19:00	60	54	56	10	58	8	23	20	82	80	67	86	605
23-May-26 20:00	60	56	57	10	58	8	23	20	83	81	68	87	611
23-May-26 21:00	60	56	57	10	58	8	23	20	83	82	67	87	611
23-May-26 22:00	61	58	56	10	58	8	20	20	81	82	67	86	605
23-May-26 23:00	60	56	56	10	58	8	20	20	80	80	66	87	599

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
24-May-26 00:00	61	56	56	10	58	8	21	21	81	81	66	87	604
24-May-26 01:00	61	57	57	10	59	8	20	20	82	83	52	87	595
24-May-26 02:00	61	56	55	10	57	7	20	21	82	85	52	88	594
24-May-26 03:00	61	57	56	10	58	8	21	21	83	84	52	87	597
24-May-26 04:00	61	55	56	10	58	8	20	20	82	81	52	87	589
24-May-26 05:00	61	55	56	10	58	8	21	20	79	81	53	88	590
24-May-26 06:00	61	55	56	10	58	8	20	19	82	84	50	87	590
24-May-26 07:00	61	55	56	10	58	8	20	20	78	80	51	87	583
24-May-26 08:00	60	56	57	10	59	8	21	20	81	81	51	87	590
24-May-26 09:00	59	55	56	10	58	8	20	20	73	80	51	87	579
24-May-26 10:00	59	57	56	10	58	8	20	20	78	80	52	86	586
24-May-26 11:00	59	56	57	10	57	8	21	20	71	81	52	86	578
24-May-26 12:00	59	55	56	10	59	8	21	20	74	82	53	87	582
24-May-26 13:00	58	55	57	10	65	10	21	20	73	81	52	82	583
24-May-26 14:00	58	55	57	10	59	8	20	19	72	64	70	86	579
24-May-26 15:00	59	57	55	10	57	8	20	20	76	81	52	85	581
24-May-26 16:00	59	55	55	10	57	8	20	20	81	82	52	82	581
24-May-26 17:00	61	57	56	10	58	8	21	20	83	84	53	83	593
24-May-26 18:00	60	55	57	10	58	8	20	20	83	82	52	83	590
24-May-26 19:00	60	55	56	10	57	8	20	20	82	81	51	82	582
24-May-26 20:00	58	55	56	10	58	8	20	20	83	83	52	87	591
24-May-26 21:00	57	55	56	10	59	8	20	21	82	95	52	88	603
24-May-26 22:00	58	55	57	10	58	8	21	20	82	87	53	88	596
24-May-26 23:00	58	55	56	10	58	7	21	20	80	87	52	87	592
25-May-26 00:00	58	56	57	10	58	8	21	20	80	81	52	88	589
25-May-26 01:00	57	56	55	10	58	8	21	20	82	83	52	88	591
25-May-26 02:00	58	55	56	10	59	8	20	20	81	84	53	88	591
25-May-26 03:00	58	56	57	10	58	8	21	20	81	86	53	88	596
25-May-26 04:00	58	54	56	10	58	8	20	20	79	87	52	87	590
25-May-26 05:00	58	55	56	10	58	8	21	20	78	89	52	88	592
25-May-26 06:00	58	55	57	10	58	8	20	20	76	91	51	87	590
25-May-26 07:00	57	55	56	10	58	8	20	20	77	90	51	86	589
25-May-26 08:00	58	56	57	10	57	8	20	20	75	89	52	87	589
25-May-26 09:00	58	56	56	10	58	8	21	20	75	89	52	87	588
25-May-26 10:00	58	57	56	10	58	8	20	21	69	81	54	87	579
25-May-26 11:00	66	57	55	10	57	8	22	20	70	77	55	86	583
25-May-26 12:00	66	55	56	10	58	8	21	20	81	75	54	88	593
25-May-26 13:00	63	56	56	10	58	8	21	20	75	76	55	87	584
25-May-26 14:00	62	56	55	10	57	8	21	20	76	75	55	86	580
25-May-26 15:00	62	57	55	10	57	8	21	20	76	76	55	86	582
25-May-26 16:00	62	56	56	10	58	8	21	20	79	78	54	86	589
25-May-26 17:00	62	56	56	10	58	8	21	20	82	84	53	86	596
25-May-26 18:00	63	55	56	10	57	8	21	21	80	80	53	86	591
25-May-26 19:00	64	56	56	10	58	8	21	21	79	80	52	86	591

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
25-May-26 20:00	63	55	56	10	58	8	22	20	81	81	54	87	594
25-May-26 21:00	64	54	56	10	57	8	21	21	80	73	64	87	596
25-May-26 22:00	64	55	56	10	58	7	22	20	81	82	55	87	595
25-May-26 23:00	64	57	55	10	57	8	22	20	82	82	55	86	600
26-May-26 00:00	64	57	55	10	58	7	22	20	80	81	54	86	595
26-May-26 01:00	64	55	55	10	58	7	21	19	81	82	55	86	594
26-May-26 02:00	64	56	55	10	58	8	21	20	78	80	55	86	592
26-May-26 03:00	65	56	56	10	58	8	21	19	80	81	54	86	593
26-May-26 04:00	64	56	55	10	58	7	21	20	79	80	55	86	592
26-May-26 05:00	63	54	55	10	57	7	22	21	81	80	54	85	590
26-May-26 06:00	64	55	55	10	57	8	21	20	80	81	54	86	591
26-May-26 07:00	65	55	55	10	57	8	21	20	78	79	54	87	589
26-May-26 08:00	64	56	55	10	58	8	22	21	74	80	55	88	589
26-May-26 09:00	63	55	54	10	57	7	22	20	75	80	55	88	587
26-May-26 10:00	63	57	55	10	58	7	22	21	76	68	53	88	578
26-May-26 11:00	61	56	60	12	56	7	21	20	75	74	55	83	581
26-May-26 12:00	62	56	61	13	57	7	21	20	77	67	54	82	577
26-May-26 13:00	61	57	56	10	57	7	20	19	92	52	54	92	578
26-May-26 14:00	61	57	56	10	57	7	21	20	77	70	54	87	578
26-May-26 15:00	61	55	56	10	57	7	21	20	78	66	54	86	571
26-May-26 16:00	62	55	57	10	57	7	21	20	79	67	54	86	575
26-May-26 17:00	62	56	56	10	57	8	21	20	79	53	54	86	563
26-May-26 18:00	62	55	56	10	57	8	21	20	84	69	51	86	580
26-May-26 19:00	62	55	57	10	58	8	21	20	77	67	52	86	573
26-May-26 20:00	62	55	56	10	58	8	21	20	79	67	53	86	576
26-May-26 21:00	62	54	56	10	58	8	21	20	78	66	55	85	575
26-May-26 22:00	63	56	56	10	57	7	21	20	84	67	54	87	583
26-May-26 23:00	62	56	56	10	58	8	21	20	96	66	54	88	596
27-May-26 00:00	63	56	56	10	59	8	21	20	88	68	68	87	606
27-May-26 01:00	63	55	56	10	58	8	22	20	86	67	73	87	606
27-May-26 02:00	62	56	56	10	59	8	21	20	85	67	71	87	603
27-May-26 03:00	62	56	56	10	58	8	21	20	87	67	73	86	603
27-May-26 04:00	63	56	56	10	58	8	21	20	86	66	74	86	604
27-May-26 05:00	63	56	56	10	58	8	21	20	85	66	53	86	583
27-May-26 06:00	63	54	56	10	58	8	22	20	86	67	54	87	584
27-May-26 07:00	63	57	57	10	58	8	21	20	86	67	54	87	588
27-May-26 08:00	62	55	56	10	59	8	21	20	85	66	53	87	584
27-May-26 09:00	58	54	55	10	59	8	21	20	88	67	54	87	580
27-May-26 10:00	58	56	56	10	58	8	21	20	93	67	54	87	588
27-May-26 11:00	58	56	56	10	58	8	21	20	88	67	52	86	580
27-May-26 12:00	58	55	56	10	58	8	21	20	101	67	53	86	595
27-May-26 13:00	57	57	56	10	63	10	21	19	86	67	53	79	579
27-May-26 14:00	57	55	56	10	58	8	20	19	87	50	70	81	571
27-May-26 15:00	57	56	57	10	58	8	22	20	102	48	71	86	594

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
27-May-26 16:00	57	57	56	10	57	8	22	21	102	67	54	84	596
27-May-26 17:00	58	57	56	10	57	8	21	20	79	80	53	81	580
27-May-26 18:00	58	57	55	10	57	8	21	20	87	63	63	81	582
27-May-26 19:00	58	55	56	10	58	7	22	21	88	64	63	87	588
27-May-26 20:00	58	56	56	10	58	8	21	20	82	63	62	87	581
27-May-26 21:00	58	59	56	10	58	8	21	20	80	62	62	86	580
27-May-26 22:00	59	64	56	10	58	8	22	21	77	64	63	87	589
27-May-26 23:00	58	60	57	10	58	8	22	20	82	63	63	87	588
28-May-26 00:00	59	57	56	10	58	8	22	21	84	64	63	87	589
28-May-26 01:00	59	60	57	11	58	8	21	20	82	63	62	87	588
28-May-26 02:00	59	59	57	10	59	8	21	20	83	63	62	87	589
28-May-26 03:00	59	57	57	11	58	8	22	21	81	64	63	87	586
28-May-26 04:00	58	58	57	11	59	8	21	20	82	63	63	86	586
28-May-26 05:00	59	60	56	10	58	8	22	20	81	63	63	82	583
28-May-26 06:00	58	58	57	10	58	8	22	21	79	63	63	81	578
28-May-26 07:00	59	57	56	10	58	8	22	20	79	64	63	82	577
28-May-26 08:00	58	57	55	10	57	8	22	21	80	64	63	82	578
28-May-26 09:00	58	59	56	10	58	8	22	21	83	64	64	82	583
28-May-26 10:00	57	59	55	10	58	8	21	20	83	63	62	81	578
28-May-26 11:00	58	59	56	10	57	8	22	21	78	63	64	82	579
28-May-26 12:00	57	57	55	10	57	8	22	20	82	63	63	81	575
28-May-26 13:00	57	59	56	10	58	8	21	20	84	63	63	76	575
28-May-26 14:00	61	44	57	10	59	8	22	21	80	64	64	82	571
28-May-26 15:00	58	45	56	10	58	8	22	21	89	63	63	82	574
28-May-26 16:00	58	44	57	11	60	8	21	20	86	63	63	81	572
28-May-26 17:00	59	44	57	11	60	8	21	20	82	63	63	82	570
28-May-26 18:00	60	44	56	11	59	8	21	20	83	63	63	82	571
28-May-26 19:00	60	45	57	10	58	8	21	20	83	62	62	82	568
28-May-26 20:00	60	43	57	11	60	8	21	20	88	63	63	83	577
28-May-26 21:00	60	44	57	11	60	8	21	20	86	58	62	82	569
28-May-26 22:00	60	44	58	12	60	8	22	21	84	63	63	83	578
28-May-26 23:00	61	44	58	12	61	8	21	20	84	63	63	82	577
29-May-26 00:00	60	45	58	11	60	9	22	20	93	63	63	82	586
29-May-26 01:00	60	44	58	12	61	9	21	19	92	63	62	85	586
29-May-26 02:00	61	44	59	11	60	8	22	21	89	63	63	88	590
29-May-26 03:00	60	44	58	11	60	8	21	20	88	63	63	86	583
29-May-26 04:00	60	44	58	12	60	9	21	20	91	63	63	89	591
29-May-26 05:00	60	46	58	11	61	8	21	20	83	76	63	84	591
29-May-26 06:00	60	45	58	11	60	9	21	20	81	75	62	82	585
29-May-26 07:00	60	45	57	11	60	8	21	20	82	76	63	83	586
29-May-26 08:00	60	44	57	11	60	8	21	20	76	75	62	82	578
29-May-26 09:00	59	45	57	11	60	8	21	20	76	75	62	82	576
29-May-26 10:00	60	44	58	11	59	8	21	20	76	75	63	82	578
29-May-26 11:00	60	44	57	11	59	8	21	20	84	76	64	83	586

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
29-May-26 12:00	59	49	56	11	58	8	21	20	85	71	54	86	577
29-May-26 13:00	59	50	56	10	57	8	22	20	76	82	50	82	571
29-May-26 14:00	58	43	57	10	58	7	21	20	79	86	51	82	571
29-May-26 15:00	59	44	57	10	58	8	21	20	78	85	49	81	568
29-May-26 16:00	59	44	56	11	57	8	21	20	81	88	49	81	575
29-May-26 17:00	58	45	57	10	58	8	21	20	83	91	51	83	584
29-May-26 18:00	60	44	56	10	58	7	23	21	81	90	51	82	583
29-May-26 19:00	61	43	57	10	58	8	22	21	82	78	62	81	584
29-May-26 20:00	54	44	56	10	58	8	21	20	81	77	62	81	573
29-May-26 21:00	54	44	58	10	59	8	21	21	83	76	63	81	579
29-May-26 22:00	54	44	57	10	59	8	21	20	80	79	63	82	578
29-May-26 23:00	55	44	57	10	58	8	21	20	80	78	63	83	576
30-May-26 00:00	54	43	57	10	59	8	22	20	79	76	63	82	574
30-May-26 01:00	53	45	57	10	58	8	22	20	82	76	63	83	576
30-May-26 02:00	53	45	57	10	58	8	22	20	84	77	63	82	579
30-May-26 03:00	53	44	56	10	57	8	22	20	84	78	63	82	578
30-May-26 04:00	53	43	56	10	57	8	21	20	82	78	63	81	574
30-May-26 05:00	53	44	56	10	58	8	21	20	81	79	63	82	575
30-May-26 06:00	53	44	57	10	58	8	21	19	80	78	63	82	574
30-May-26 07:00	53	44	57	10	58	8	22	21	80	76	63	82	572
30-May-26 08:00	53	44	57	10	57	8	21	19	79	76	63	87	575
30-May-26 09:00	52	44	57	10	58	8	21	20	81	74	64	87	574
30-May-26 10:00	61	45	57	10	57	8	22	21	79	84	51	87	583
30-May-26 11:00	53	44	57	10	57	8	22	20	88	62	63	92	577
30-May-26 12:00	53	45	56	10	64	10	21	20	86	62	63	91	582
30-May-26 13:00	53	44	57	10	64	10	21	20	81	62	64	87	575
30-May-26 14:00	54	44	57	10	59	8	22	21	83	62	63	89	572
30-May-26 15:00	54	43	56	10	58	8	21	20	88	62	63	92	576
30-May-26 16:00	54	45	57	10	58	8	21	20	89	62	62	92	579
30-May-26 17:00	54	44	57	11	59	8	21	20	88	62	63	91	577
30-May-26 18:00	54	43	57	10	59	8	21	21	88	62	63	91	577
30-May-26 19:00	54	43	57	11	59	8	21	20	86	63	66	90	579
30-May-26 20:00	54	44	57	10	59	9	22	21	81	63	63	88	570
30-May-26 21:00	55	45	57	10	60	8	22	21	83	63	63	88	575
30-May-26 22:00	54	44	56	10	59	8	21	21	83	62	63	87	569
30-May-26 23:00	54	44	56	10	59	8	22	20	80	63	63	88	569
31-May-26 00:00	54	44	56	10	60	8	21	20	81	62	63	88	568
31-May-26 01:00	54	44	57	10	59	8	22	20	82	62	63	83	565
31-May-26 02:00	54	43	57	10	59	8	21	20	84	62	63	81	561
31-May-26 03:00	54	44	56	10	59	8	22	20	81	63	63	82	563
31-May-26 04:00	54	45	56	10	59	8	21	20	83	62	63	81	563
31-May-26 05:00	54	43	57	10	60	8	21	20	87	62	62	81	563
31-May-26 06:00	54	45	57	10	59	8	22	20	81	63	64	82	563
31-May-26 07:00	53	43	57	10	60	8	21	20	88	62	63	81	567

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
31-May-26 08:00	54	44	57	10	59	9	21	20	87	62	63	81	567
31-May-26 09:00	54	44	56	10	60	8	21	20	89	62	63	82	569
31-May-26 10:00	54	44	57	10	60	8	21	20	86	63	63	82	569
31-May-26 11:00	54	44	57	11	60	8	21	20	89	62	64	82	572
31-May-26 12:00	58	45	57	10	59	8	21	20	87	88	63	82	600
31-May-26 13:00	55	44	57	10	59	8	21	20	85	90	63	81	593
31-May-26 14:00	50	40	57	11	59	8	21	20	96	90	63	81	594
31-May-26 15:00	55	41	57	10	59	8	21	20	88	85	63	81	588
31-May-26 16:00	54	43	57	10	58	8	21	20	90	85	63	82	592
31-May-26 17:00	54	44	56	10	59	8	21	19	93	90	64	82	600
31-May-26 18:00	54	44	57	10	59	8	21	20	96	92	63	86	611
31-May-26 19:00	54	44	57	10	58	8	21	20	88	84	63	86	595
31-May-26 20:00	54	43	56	10	58	8	21	20	80	74	77	86	588
31-May-26 21:00	55	43	56	10	58	8	21	20	89	82	63	87	592
31-May-26 22:00	54	44	56	11	58	8	21	21	91	86	62	86	599
31-May-26 23:00	54	44	58	10	59	8	21	19	91	85	64	86	600
01-Jun-26 00:00	64	43	57	10	59	8	25	26	85	77	63	86	603
01-Jun-26 01:00	60	45	56	10	58	8	22	22	87	81	61	87	597
01-Jun-26 02:00	54	44	57	10	58	8	20	20	92	87	62	86	597
01-Jun-26 03:00	54	44	57	10	59	8	20	21	95	91	63	89	610
01-Jun-26 04:00	54	44	56	10	59	8	20	21	85	84	76	86	604
01-Jun-26 05:00	54	43	56	10	58	8	20	20	85	85	75	86	600
01-Jun-26 06:00	54	44	57	10	58	8	20	20	86	88	76	85	607
01-Jun-26 07:00	54	44	57	10	59	8	20	21	80	87	62	99	601
01-Jun-26 08:00	54	45	58	10	59	8	22	21	82	89	63	100	608
01-Jun-26 09:00	53	44	57	10	58	8	21	20	81	89	63	100	604
01-Jun-26 10:00	53	44	57	10	58	8	21	21	85	77	77	93	604
01-Jun-26 11:00	53	44	57	10	59	8	21	21	87	81	77	96	613
01-Jun-26 12:00	53	43	56	10	58	8	22	22	85	79	64	94	596
01-Jun-26 13:00	53	48	56	10	57	8	21	21	72	76	63	88	572
01-Jun-26 14:00	53	44	62	13	58	8	21	21	78	76	63	83	581
01-Jun-26 15:00	53	44	58	11	58	8	22	21	80	64	64	93	576
01-Jun-26 16:00	53	42	57	10	58	8	22	21	82	63	63	98	577
01-Jun-26 17:00	53	44	57	10	58	8	21	21	81	63	63	97	575
01-Jun-26 18:00	53	44	56	10	58	8	22	22	81	63	63	87	567
01-Jun-26 19:00	53	44	56	10	58	8	22	22	82	63	63	92	571
01-Jun-26 20:00	53	44	56	10	57	8	22	23	87	63	63	92	577
01-Jun-26 21:00	53	42	57	10	58	8	22	21	81	63	63	90	568
01-Jun-26 22:00	65	44	56	10	58	8	23	24	90	60	46	102	585
01-Jun-26 23:00	65	42	56	10	57	8	22	22	82	63	63	97	586
02-Jun-26 00:00	65	42	56	10	57	8	22	21	79	62	63	93	578
02-Jun-26 01:00	65	42	56	10	58	8	22	21	79	62	63	94	580
02-Jun-26 02:00	54	42	56	10	57	8	22	22	81	62	63	94	570
02-Jun-26 03:00	53	44	56	10	57	8	21	21	80	63	63	96	572

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
02-Jun-26 04:00	53	43	56	10	58	8	21	21	78	62	62	93	566
02-Jun-26 05:00	54	42	56	10	57	8	22	22	80	63	64	93	570
02-Jun-26 06:00	53	42	56	10	58	8	22	22	80	63	64	97	572
02-Jun-26 07:00	53	42	56	10	58	8	22	22	79	63	63	95	571
02-Jun-26 08:00	54	42	57	10	58	8	21	22	78	63	64	91	567
02-Jun-26 09:00	54	42	56	10	58	8	22	22	79	63	63	91	569
02-Jun-26 10:00	53	42	56	10	57	8	21	21	78	62	63	92	562
02-Jun-26 11:00	53	43	56	10	58	8	21	21	78	63	63	94	569
02-Jun-26 12:00	54	44	56	10	57	8	22	22	79	62	64	90	567
02-Jun-26 13:00	54	42	56	10	64	10	22	21	77	62	62	92	574
02-Jun-26 14:00	53	43	56	10	58	9	21	22	77	63	64	91	566
02-Jun-26 15:00	53	43	56	10	58	7	21	21	80	62	62	92	565
02-Jun-26 16:00	53	43	55	10	57	8	21	21	79	62	63	90	563
02-Jun-26 17:00	53	42	56	10	58	8	21	22	80	62	63	92	568
02-Jun-26 18:00	54	43	56	10	57	8	22	22	81	62	64	91	571
02-Jun-26 19:00	54	44	57	11	58	8	22	23	85	63	64	88	577
02-Jun-26 20:00	54	44	57	10	59	8	22	22	83	62	63	87	571
02-Jun-26 21:00	55	44	56	10	60	8	22	21	81	63	63	88	572
02-Jun-26 22:00	54	46	57	10	59	8	21	21	85	63	63	93	582
02-Jun-26 23:00	54	46	57	10	59	8	22	22	83	62	63	93	577
03-Jun-26 00:00	54	45	57	11	59	9	22	22	82	63	64	88	576
03-Jun-26 01:00	54	45	57	11	60	9	21	22	81	61	63	96	580
03-Jun-26 02:00	54	45	57	11	60	8	21	22	81	62	62	98	580
03-Jun-26 03:00	54	46	57	11	59	8	22	22	82	63	64	85	573
03-Jun-26 04:00	54	45	56	11	59	8	22	22	81	62	63	90	571
03-Jun-26 05:00	54	44	57	11	60	8	22	21	80	62	63	91	572
03-Jun-26 06:00	53	45	57	10	59	8	22	22	81	62	63	85	566
03-Jun-26 07:00	54	46	56	11	59	8	21	21	80	62	63	87	567
03-Jun-26 08:00	54	45	57	11	59	8	22	22	81	63	64	88	573
03-Jun-26 09:00	54	46	56	11	59	8	22	21	79	62	62	81	562
03-Jun-26 10:00	54	45	57	11	59	8	22	21	80	64	59	85	565
03-Jun-26 11:00	54	46	58	11	59	8	21	22	81	66	55	83	563
03-Jun-26 12:00	56	44	58	11	60	8	22	22	80	66	55	86	567
03-Jun-26 13:00	54	45	58	11	59	8	21	21	83	65	54	85	565
03-Jun-26 14:00	54	46	58	11	60	8	22	22	81	67	55	93	577
03-Jun-26 15:00	54	46	58	11	60	8	21	21	81	66	55	88	568
03-Jun-26 16:00	54	47	57	11	61	8	22	21	80	66	55	87	570
03-Jun-26 17:00	54	46	57	11	60	9	22	21	84	67	56	84	570
03-Jun-26 18:00	54	45	57	11	61	8	21	22	83	66	54	88	572
03-Jun-26 19:00	54	45	59	12	61	9	22	22	81	66	55	88	574
03-Jun-26 20:00	54	46	59	12	60	9	22	22	82	66	54	88	573
03-Jun-26 21:00	54	47	59	12	61	9	20	21	82	64	53	90	574
03-Jun-26 22:00	54	46	59	12	62	9	22	22	80	66	55	88	574
03-Jun-26 23:00	54	45	58	12	61	9	23	22	81	67	55	88	575

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
04-Jun-26 00:00	54	48	58	12	61	9	22	22	79	66	54	88	573
04-Jun-26 01:00	54	45	58	12	61	9	22	22	80	66	55	85	569
04-Jun-26 02:00	54	46	59	12	61	9	21	21	80	66	55	88	572
04-Jun-26 03:00	54	46	59	12	62	9	21	22	80	66	55	87	572
04-Jun-26 04:00	54	46	59	12	61	9	21	22	77	66	55	88	569
04-Jun-26 05:00	54	46	58	11	60	9	22	22	82	66	54	83	565
04-Jun-26 06:00	54	46	57	11	60	9	22	23	81	66	55	84	567
04-Jun-26 07:00	54	47	57	11	60	9	21	22	80	66	54	85	565
04-Jun-26 08:00	54	45	58	12	60	9	22	21	87	71	54	95	587
04-Jun-26 09:00	54	45	58	12	60	9	22	21	84	67	53	93	578
04-Jun-26 10:00	54	71	56	10	58	8	22	22	77	67	54	85	584
04-Jun-26 11:00	55	58	57	11	57	8	21	21	78	67	53	95	581
04-Jun-26 12:00	74	64	57	11	60	8	22	22	79	67	53	86	604
04-Jun-26 13:00	55	63	57	10	58	8	22	22	79	67	53	82	577
04-Jun-26 14:00	53	62	61	13	56	7	22	22	79	67	53	92	589
04-Jun-26 15:00	53	66	62	13	60	9	22	22	84	67	53	100	609
04-Jun-26 16:00	53	59	58	11	58	8	22	22	83	68	50	96	588
04-Jun-26 17:00	55	59	57	11	58	8	22	22	84	67	53	97	593
04-Jun-26 18:00	55	63	57	12	57	8	22	22	81	67	53	87	583
04-Jun-26 19:00	55	64	58	12	58	8	22	22	81	67	53	85	583
04-Jun-26 20:00	54	61	58	11	58	8	22	22	81	67	52	85	578
04-Jun-26 21:00	54	63	58	11	58	8	22	22	80	62	54	91	582
04-Jun-26 22:00	54	62	57	11	58	8	22	22	79	66	56	85	581
04-Jun-26 23:00	55	61	58	11	58	8	22	21	80	65	55	84	577
05-Jun-26 00:00	54	63	58	11	59	8	22	22	81	65	55	86	583
05-Jun-26 01:00	55	63	57	11	58	8	22	22	83	66	55	96	595
05-Jun-26 02:00	55	65	58	11	59	8	22	22	79	65	55	89	589
05-Jun-26 03:00	55	64	58	11	59	8	22	22	79	66	56	88	589
05-Jun-26 04:00	55	63	58	12	60	8	22	22	80	65	55	90	587
05-Jun-26 05:00	55	62	58	11	60	8	22	22	79	65	55	87	583
05-Jun-26 06:00	54	62	58	11	59	8	22	22	80	65	55	87	586
05-Jun-26 07:00	54	61	57	11	59	8	21	22	81	66	52	90	581
05-Jun-26 08:00	54	60	56	11	59	8	22	22	84	67	54	89	585
05-Jun-26 09:00	55	60	57	11	60	8	21	22	81	66	52	90	582
05-Jun-26 10:00	54	61	57	11	60	8	23	23	79	67	54	89	585
05-Jun-26 11:00	54	62	56	11	60	8	22	22	80	66	52	90	584
05-Jun-26 12:00	54	61	56	11	59	8	22	22	81	67	54	91	586
05-Jun-26 13:00	54	62	57	10	59	8	21	21	83	48	69	92	586
05-Jun-26 14:00	55	63	56	11	64	10	22	22	77	50	71	88	589
05-Jun-26 15:00	53	60	56	10	60	9	22	22	86	51	71	84	584
05-Jun-26 16:00	54	60	57	10	59	8	22	22	84	67	52	81	577
05-Jun-26 17:00	54	62	57	10	59	8	22	22	83	66	52	85	580
05-Jun-26 18:00	55	60	56	11	59	8	22	22	86	67	52	90	589
05-Jun-26 19:00	54	59	58	11	61	9	22	22	80	67	52	87	581

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
05-Jun-26 20:00	54	59	58	11	60	8	22	22	83	67	52	85	583
05-Jun-26 21:00	55	64	59	11	60	9	22	21	81	67	53	84	586
05-Jun-26 22:00	54	62	58	11	61	9	22	22	82	67	52	88	589
05-Jun-26 23:00	54	61	57	11	60	9	23	23	82	67	52	87	585
06-Jun-26 00:00	54	62	57	11	60	8	22	22	82	67	52	85	584
06-Jun-26 01:00	55	61	58	11	61	9	21	21	81	66	51	89	584
06-Jun-26 02:00	54	62	58	11	60	8	22	22	81	67	52	89	586
06-Jun-26 03:00	55	61	58	11	60	8	22	22	82	67	53	88	589
06-Jun-26 04:00	54	62	58	11	60	9	22	22	83	67	52	89	589
06-Jun-26 05:00	55	60	58	11	61	9	22	22	85	66	51	88	588
06-Jun-26 06:00	54	62	58	11	60	9	22	22	81	67	52	89	589
06-Jun-26 07:00	54	62	58	11	61	9	22	23	79	67	52	90	588
06-Jun-26 08:00	55	60	58	12	60	9	22	22	78	67	52	89	584
06-Jun-26 09:00	55	62	58	11	60	9	21	21	79	67	52	89	585
06-Jun-26 10:00	54	63	58	12	60	9	22	22	80	67	52	91	590
06-Jun-26 11:00	55	60	58	12	60	9	22	22	79	67	52	89	586
06-Jun-26 12:00	55	64	59	12	60	8	21	21	83	67	52	93	594
06-Jun-26 13:00	54	61	56	11	58	8	22	22	85	67	52	88	584
06-Jun-26 14:00	54	59	57	11	59	8	22	22	85	67	52	83	580
06-Jun-26 15:00	54	59	58	11	59	8	22	22	80	67	52	90	582
06-Jun-26 16:00	55	59	57	11	60	8	22	22	81	67	52	91	584
06-Jun-26 17:00	55	59	57	11	60	8	22	22	82	67	52	85	581
06-Jun-26 18:00	55	59	58	11	60	8	22	22	81	68	53	84	580
06-Jun-26 19:00	54	58	58	11	59	8	22	22	82	67	52	88	583
06-Jun-26 20:00	54	61	59	11	60	8	22	22	80	66	55	86	583
06-Jun-26 21:00	54	62	58	11	59	8	22	23	82	67	53	84	584
06-Jun-26 22:00	54	60	58	11	60	9	22	22	83	66	52	85	581
06-Jun-26 23:00	54	61	58	11	59	9	22	22	82	66	52	88	583
07-Jun-26 00:00	54	59	58	11	60	9	22	22	82	67	53	84	583
07-Jun-26 01:00	54	61	58	11	60	9	22	22	83	67	53	83	583
07-Jun-26 02:00	54	62	58	11	60	9	22	22	83	67	52	85	584
07-Jun-26 03:00	54	60	59	11	60	8	22	22	83	67	53	86	586
07-Jun-26 04:00	54	58	58	11	60	9	22	23	83	67	53	82	578
07-Jun-26 05:00	54	58	58	11	60	9	22	22	84	66	53	85	582
07-Jun-26 06:00	54	60	58	11	60	9	22	22	82	67	53	85	584
07-Jun-26 07:00	54	61	58	11	60	9	22	23	81	67	52	84	582
07-Jun-26 08:00	54	60	59	11	61	9	22	21	79	67	53	88	584
07-Jun-26 09:00	54	60	58	12	60	9	21	20	81	66	52	87	580
07-Jun-26 10:00	53	59	58	11	60	9	22	21	83	67	53	86	581
07-Jun-26 11:00	54	58	57	11	60	8	22	20	83	67	53	86	580
07-Jun-26 12:00	54	60	57	11	60	8	22	21	82	69	50	87	581
07-Jun-26 13:00	54	60	58	11	61	8	22	20	82	69	49	88	584
07-Jun-26 14:00	56	60	59	11	61	9	22	21	80	67	53	86	585
07-Jun-26 15:00	54	60	62	13	60	9	22	21	78	66	52	91	587

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
07-Jun-26 16:00	54	59	60	12	60	9	22	21	82	67	53	83	580
07-Jun-26 17:00	54	59	60	12	60	8	22	21	82	68	54	85	586
07-Jun-26 18:00	54	59	59	12	60	8	22	20	81	67	53	87	583
07-Jun-26 19:00	54	59	59	12	60	8	22	20	81	67	53	87	581
07-Jun-26 20:00	55	60	58	11	61	9	22	20	83	67	53	88	586
07-Jun-26 21:00	54	58	58	11	61	9	22	21	84	61	62	86	587
07-Jun-26 22:00	55	59	57	11	61	9	22	21	84	67	54	87	587
07-Jun-26 23:00	55	59	56	11	60	9	22	21	82	66	53	87	582
08-Jun-26 00:00	55	58	57	11	60	9	22	21	83	67	54	87	583
08-Jun-26 01:00	55	59	58	11	61	9	22	21	82	67	54	90	589
08-Jun-26 02:00	55	61	58	11	61	9	22	20	84	67	55	91	594
08-Jun-26 03:00	55	59	58	11	61	9	22	21	82	66	53	96	592
08-Jun-26 04:00	55	59	57	11	61	9	22	21	84	67	53	97	595
08-Jun-26 05:00	54	60	58	11	62	9	22	21	83	66	52	100	597
08-Jun-26 06:00	55	61	57	11	61	9	22	21	83	67	53	94	594
08-Jun-26 07:00	55	59	58	11	62	9	22	20	87	67	53	91	593
08-Jun-26 08:00	55	58	57	11	61	9	21	20	81	80	52	87	592
08-Jun-26 09:00	55	60	57	11	61	9	22	20	82	67	53	91	588
08-Jun-26 10:00	55	59	57	11	62	9	22	21	82	67	53	94	592
08-Jun-26 11:00	55	62	57	11	61	9	22	21	82	67	54	92	592
08-Jun-26 12:00	55	62	58	11	61	9	23	21	81	68	54	91	594
08-Jun-26 13:00	55	59	57	11	64	11	23	21	81	67	54	91	594
08-Jun-26 14:00	54	61	58	11	61	9	22	20	86	49	71	95	596
08-Jun-26 15:00	55	59	58	11	61	8	22	21	85	63	62	87	592
08-Jun-26 16:00	55	66	58	12	60	8	23	22	80	67	53	91	594
08-Jun-26 17:00	54	67	59	12	60	9	22	20	81	66	53	92	595
08-Jun-26 18:00	54	66	58	12	60	9	22	21	81	66	52	86	587
08-Jun-26 19:00	55	66	59	12	61	8	22	20	83	67	53	83	588
08-Jun-26 20:00	55	67	58	12	61	9	22	21	82	67	53	87	596
08-Jun-26 21:00	55	69	59	12	61	8	20	19	77	64	61	91	597
08-Jun-26 22:00	55	66	59	12	61	9	22	21	83	67	53	83	591
08-Jun-26 23:00	55	66	59	12	62	9	23	21	81	67	54	88	597
09-Jun-26 00:00	55	66	59	12	62	9	21	20	79	66	53	91	595
09-Jun-26 01:00	55	66	58	12	61	9	22	21	81	67	53	91	596
09-Jun-26 02:00	55	68	59	12	62	9	22	21	80	67	53	91	599
09-Jun-26 03:00	54	67	59	12	63	9	22	20	79	67	52	90	595
09-Jun-26 04:00	55	68	59	12	62	9	22	21	79	66	52	91	595
09-Jun-26 05:00	55	68	59	12	62	10	22	21	79	67	53	91	599
09-Jun-26 06:00	54	67	59	12	62	10	22	21	80	67	52	87	594
09-Jun-26 07:00	54	64	58	12	61	9	22	21	80	66	53	91	592
09-Jun-26 08:00	54	66	59	12	62	9	22	21	80	67	53	89	594
09-Jun-26 09:00	54	62	59	12	61	9	22	21	82	67	52	90	591
09-Jun-26 10:00	55	61	58	12	62	10	22	21	83	67	53	85	588
09-Jun-26 11:00	55	63	58	11	62	9	22	21	84	66	53	87	593

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
09-Jun-26 12:00	54	64	59	12	62	9	22	20	81	67	52	88	592
09-Jun-26 13:00	54	64	58	11	61	9	22	21	84	67	54	82	587
09-Jun-26 14:00	54	70	57	11	60	8	22	20	80	67	54	90	593
09-Jun-26 15:00	55	68	58	11	62	9	23	22	83	68	55	82	598
09-Jun-26 16:00	54	64	58	12	62	9	22	21	81	66	52	93	595
09-Jun-26 17:00	54	64	57	11	61	9	23	21	85	81	54	86	608
09-Jun-26 18:00	54	64	58	11	62	9	22	20	84	80	53	92	611
09-Jun-26 19:00	54	67	59	12	62	9	22	21	85	81	54	83	608
09-Jun-26 20:00	54	66	59	12	61	9	22	21	88	66	52	98	609
09-Jun-26 21:00	55	67	60	12	63	9	22	21	87	67	54	98	615
09-Jun-26 22:00	55	67	60	12	62	9	22	21	86	66	53	95	608
09-Jun-26 23:00	55	65	60	13	62	9	22	20	90	66	52	99	613
10-Jun-26 00:00	55	66	60	12	62	9	22	21	80	67	53	91	598
10-Jun-26 01:00	54	64	60	12	63	9	21	20	84	65	51	95	599
10-Jun-26 02:00	55	64	60	13	62	9	22	20	81	66	52	93	596
10-Jun-26 03:00	54	65	60	12	62	9	22	20	81	67	53	92	598
10-Jun-26 04:00	54	66	59	12	62	9	22	21	83	67	53	96	604
10-Jun-26 05:00	54	64	59	13	62	9	22	21	83	67	53	96	603
10-Jun-26 06:00	55	65	60	12	62	10	21	20	82	67	53	92	599
10-Jun-26 07:00	55	66	60	12	62	9	22	21	84	67	53	93	603
10-Jun-26 08:00	55	66	60	12	62	9	22	21	82	80	53	91	615
10-Jun-26 09:00	55	65	59	12	61	9	22	21	80	80	53	89	607
10-Jun-26 10:00	55	65	60	12	62	9	21	20	81	80	53	95	614
10-Jun-26 11:00	55	63	61	13	62	9	22	21	80	80	53	95	615
10-Jun-26 12:00	55	63	61	12	62	9	23	21	84	81	54	92	617
10-Jun-26 13:00	54	65	62	13	62	9	22	21	79	80	53	82	603
10-Jun-26 14:00	57	65	59	12	63	10	22	21	83	69	51	96	607
10-Jun-26 15:00	55	64	59	12	62	9	22	21	81	67	53	94	599
10-Jun-26 16:00	55	64	60	12	62	10	22	21	84	67	53	99	609
10-Jun-26 17:00	56	64	60	12	62	9	22	21	84	67	53	94	603
10-Jun-26 18:00	54	64	61	12	63	9	22	21	83	67	52	93	601
10-Jun-26 19:00	55	67	60	13	62	9	22	21	83	67	52	92	603
10-Jun-26 20:00	55	65	61	13	63	10	22	21	82	67	53	94	607
10-Jun-26 21:00	55	65	60	13	63	10	23	21	82	68	54	91	604
10-Jun-26 22:00	55	65	61	13	63	10	22	21	79	66	52	95	601
10-Jun-26 23:00	55	65	61	13	63	10	22	20	80	67	53	96	605
11-Jun-26 00:00	55	65	61	13	63	10	21	21	77	67	52	91	596
11-Jun-26 01:00	55	64	61	13	63	10	21	20	80	67	53	95	601
11-Jun-26 02:00	55	66	61	13	63	10	22	20	78	66	52	91	597
11-Jun-26 03:00	54	66	60	13	63	9	22	20	81	67	53	94	603
11-Jun-26 04:00	55	65	61	13	64	9	21	20	78	67	53	95	600
11-Jun-26 05:00	54	62	59	12	62	9	22	20	83	67	52	89	592
11-Jun-26 06:00	54	63	59	12	63	9	21	20	83	67	52	93	597
11-Jun-26 07:00	54	62	59	12	62	9	22	21	81	67	52	86	587

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
11-Jun-26 08:00	55	64	60	12	62	10	21	20	84	80	52	89	610
11-Jun-26 09:00	55	64	60	12	62	10	22	21	86	67	53	90	601
11-Jun-26 10:00	55	63	59	12	62	9	22	21	85	67	54	90	599
11-Jun-26 11:00	55	66	61	12	62	9	21	21	83	67	54	87	597
11-Jun-26 12:00	55	64	60	13	62	10	21	20	80	67	54	86	592
11-Jun-26 13:00	52	64	60	12	64	10	22	21	85	47	71	89	597
11-Jun-26 14:00	53	65	59	12	61	9	22	21	83	67	52	86	590
11-Jun-26 15:00	78	64	59	12	62	9	22	21	73	80	53	82	614
11-Jun-26 16:00	55	64	60	12	62	10	21	20	86	67	53	89	599
11-Jun-26 17:00	69	63	60	12	62	9	22	21	78	68	54	83	600
11-Jun-26 18:00	55	66	59	12	62	9	22	21	83	66	52	85	591
11-Jun-26 19:00	55	66	60	12	62	9	21	20	82	67	52	84	591
11-Jun-26 20:00	54	63	60	12	62	10	22	21	82	67	52	83	588
11-Jun-26 21:00	54	63	60	12	63	10	21	20	80	66	51	83	583
11-Jun-26 22:00	54	66	60	13	62	9	22	20	80	67	52	85	589
11-Jun-26 23:00	54	64	60	13	62	9	20	19	80	66	56	83	585
12-Jun-26 00:00	54	63	60	13	63	10	22	20	80	66	51	86	588
12-Jun-26 01:00	54	64	60	12	63	9	22	21	83	67	51	88	596
12-Jun-26 02:00	55	64	60	12	62	9	21	20	81	66	51	92	593
12-Jun-26 03:00	55	65	60	12	63	9	22	21	83	66	51	93	599
12-Jun-26 04:00	54	64	60	12	62	9	21	20	83	67	51	93	597
12-Jun-26 05:00	54	63	59	12	62	9	22	22	82	67	53	92	596
12-Jun-26 06:00	54	63	59	12	62	9	22	21	86	67	51	96	604
12-Jun-26 07:00	55	64	60	12	63	9	22	21	89	66	51	103	615
12-Jun-26 08:00	55	65	59	12	61	9	22	21	83	79	49	97	614
12-Jun-26 09:00	54	63	60	12	62	9	22	21	90	67	51	102	614
12-Jun-26 10:00	55	66	59	12	62	9	22	20	86	67	51	99	608
12-Jun-26 11:00	55	66	59	12	62	9	22	21	83	67	51	99	607
12-Jun-26 12:00	55	65	60	12	63	9	22	20	84	68	52	97	607
12-Jun-26 13:00	55	65	60	13	62	9	21	20	83	67	52	96	603
12-Jun-26 14:00	55	71	58	11	58	8	22	21	81	68	53	95	601
12-Jun-26 15:00	54	70	57	11	59	8	21	20	83	66	51	97	597
12-Jun-26 16:00	55	64	58	11	59	8	22	21	87	67	52	96	599
12-Jun-26 17:00	56	66	59	11	60	8	22	21	86	67	52	95	602
12-Jun-26 18:00	54	65	59	12	61	9	22	21	84	68	52	93	601
12-Jun-26 19:00	54	67	60	12	62	9	22	21	83	67	52	92	599
12-Jun-26 20:00	54	65	60	12	61	9	22	21	83	67	52	92	600
12-Jun-26 21:00	54	63	60	13	62	9	22	21	82	65	57	90	597
12-Jun-26 22:00	54	65	60	12	62	9	22	21	82	67	52	92	597
12-Jun-26 23:00	54	66	60	12	62	9	22	20	81	67	53	87	594
13-Jun-26 00:00	54	67	61	13	62	9	22	20	86	67	52	95	608
13-Jun-26 01:00	54	66	59	12	61	9	22	21	83	67	53	93	600
13-Jun-26 02:00	54	66	60	13	62	10	22	21	85	67	52	94	604
13-Jun-26 03:00	54	65	59	13	61	9	22	21	83	67	52	93	599

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
13-Jun-26 04:00	54	65	61	13	62	10	22	21	82	67	52	92	600
13-Jun-26 05:00	54	66	60	12	62	9	23	21	82	67	53	90	599
13-Jun-26 06:00	54	66	60	12	62	10	22	20	81	66	52	91	597
13-Jun-26 07:00	53	65	60	13	62	9	22	21	81	66	52	89	594
13-Jun-26 08:00	54	63	60	13	62	9	21	20	80	80	52	93	607
13-Jun-26 09:00	54	64	60	12	62	9	22	20	80	67	52	95	598
13-Jun-26 10:00	53	64	61	12	61	9	22	21	80	67	53	95	599
13-Jun-26 11:00	54	65	62	13	60	9	22	20	82	67	53	96	603
13-Jun-26 12:00	54	64	60	13	62	10	22	21	84	69	52	97	607
13-Jun-26 13:00	55	67	60	13	63	10	21	21	81	67	53	95	606
13-Jun-26 14:00	55	65	60	13	63	10	22	20	80	67	54	92	602
13-Jun-26 15:00	54	64	62	13	63	10	22	21	82	67	55	93	605
13-Jun-26 16:00	54	65	60	12	62	9	22	20	81	67	54	87	595
13-Jun-26 17:00	54	66	60	13	61	9	22	21	83	66	54	87	596
13-Jun-26 18:00	54	66	60	12	62	10	22	21	85	67	54	86	599
13-Jun-26 19:00	54	68	60	12	62	10	21	20	79	79	53	80	601
13-Jun-26 20:00	54	67	60	12	62	9	22	21	82	80	54	82	607
13-Jun-26 21:00	54	64	60	12	62	9	23	22	83	63	64	82	598
13-Jun-26 22:00	54	66	60	12	62	10	22	21	82	67	55	90	602
13-Jun-26 23:00	55	68	59	12	61	10	22	21	82	66	54	89	599
14-Jun-26 00:00	54	65	60	13	62	10	21	21	81	66	53	91	597
14-Jun-26 01:00	55	67	60	13	62	10	22	21	84	66	53	94	606
14-Jun-26 02:00	56	64	59	12	61	10	21	21	88	66	53	97	608
14-Jun-26 03:00	56	65	60	12	62	9	22	20	81	67	69	91	614
14-Jun-26 04:00	55	66	60	12	62	9	21	20	86	66	67	95	622
14-Jun-26 05:00	56	63	60	12	61	9	21	20	84	66	67	94	614
14-Jun-26 06:00	55	67	59	12	62	10	22	20	88	80	68	97	639
14-Jun-26 07:00	55	65	60	12	62	9	21	20	86	80	67	95	635
14-Jun-26 08:00	55	63	60	13	62	9	21	21	85	79	67	94	630
14-Jun-26 09:00	55	65	60	12	62	10	22	21	84	81	67	94	633
14-Jun-26 10:00	56	64	60	13	62	10	22	20	85	80	67	99	638
14-Jun-26 11:00	55	62	58	11	63	10	21	19	87	80	68	100	637
14-Jun-26 12:00	55	66	59	12	62	9	21	20	86	64	83	99	635
14-Jun-26 13:00	55	66	59	12	62	10	21	20	85	70	78	98	634
14-Jun-26 14:00	55	64	59	12	61	10	21	20	89	94	54	97	637
14-Jun-26 15:00	55	63	60	12	62	9	21	20	89	84	54	102	630
14-Jun-26 16:00	55	64	59	12	61	9	21	21	90	84	54	102	633
14-Jun-26 17:00	55	65	60	13	62	10	21	20	90	84	53	102	635
14-Jun-26 18:00	55	66	61	13	62	9	22	21	86	86	53	103	637
14-Jun-26 19:00	56	65	60	13	62	9	22	21	85	85	53	102	631
14-Jun-26 20:00	55	67	60	12	62	9	22	20	80	80	68	94	630
14-Jun-26 21:00	55	68	59	12	61	10	22	21	83	81	67	92	632
14-Jun-26 22:00	55	65	60	13	62	9	21	21	81	80	66	89	622
14-Jun-26 23:00	54	67	60	12	62	9	22	21	81	80	66	88	623

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
15-Jun-26 00:00	54	67	60	12	62	9	22	22	81	80	66	89	624
15-Jun-26 01:00	54	65	59	12	62	9	21	21	80	80	66	90	621
15-Jun-26 02:00	54	67	60	12	62	9	21	21	80	80	66	91	624
15-Jun-26 03:00	54	64	59	12	61	9	21	21	79	79	66	88	614
15-Jun-26 04:00	54	67	60	12	62	9	21	20	79	79	66	90	619
15-Jun-26 05:00	54	67	60	12	61	9	22	22	81	83	52	92	616
15-Jun-26 06:00	55	66	60	12	62	9	21	19	82	82	52	96	616
15-Jun-26 07:00	54	63	60	13	61	9	21	21	79	80	53	87	601
15-Jun-26 08:00	54	62	59	12	62	10	21	21	83	66	52	85	588
15-Jun-26 09:00	56	66	59	12	63	10	22	22	86	68	54	94	612
15-Jun-26 10:00	55	65	59	12	61	9	21	20	81	66	52	92	595
15-Jun-26 11:00	55	65	59	12	62	9	21	21	78	66	53	96	598
15-Jun-26 12:00	55	64	60	12	62	9	21	21	83	67	53	86	594
15-Jun-26 13:00	56	64	60	12	62	10	21	21	82	67	53	84	592
15-Jun-26 14:00	53	71	59	13	62	9	21	20	77	66	53	90	594
15-Jun-26 15:00	54	70	60	12	62	9	21	20	79	66	52	86	589
15-Jun-26 16:00	54	65	60	13	62	10	22	21	84	68	53	83	594
15-Jun-26 17:00	55	66	60	12	62	9	21	21	82	66	55	83	592
15-Jun-26 18:00	55	63	59	12	62	9	21	21	81	66	54	84	588
15-Jun-26 19:00	54	64	60	12	62	9	22	21	81	66	55	82	588
15-Jun-26 20:00	55	66	60	12	62	9	22	21	82	66	55	84	593
15-Jun-26 21:00	55	67	59	12	62	9	22	22	81	67	56	88	600
15-Jun-26 22:00	55	66	59	12	62	9	21	21	79	66	53	93	597
15-Jun-26 23:00	55	64	60	12	62	9	21	20	83	66	53	98	604
16-Jun-26 00:00	55	63	60	12	62	9	21	21	82	66	53	90	595
16-Jun-26 01:00	55	64	59	12	62	9	22	21	81	67	54	91	596
16-Jun-26 02:00	55	64	60	12	62	9	22	21	82	67	54	93	601
16-Jun-26 03:00	55	63	60	12	62	9	22	21	82	67	54	98	606
16-Jun-26 04:00	55	64	59	12	62	9	22	21	82	67	54	96	603
16-Jun-26 05:00	54	64	59	12	61	9	21	21	79	65	67	93	606
16-Jun-26 06:00	55	64	60	12	60	9	21	21	81	66	67	85	602
16-Jun-26 07:00	55	64	60	12	61	9	22	21	81	67	67	87	606
16-Jun-26 08:00	55	63	60	12	61	9	21	21	83	66	53	101	605
16-Jun-26 09:00	54	64	60	12	61	9	22	22	82	66	53	99	602
16-Jun-26 10:00	55	63	60	12	61	8	22	21	82	67	54	93	598
16-Jun-26 11:00	55	64	60	13	60	8	21	21	82	66	53	92	596
16-Jun-26 12:00	55	62	61	12	59	8	21	20	80	79	53	81	593
16-Jun-26 13:00	54	62	62	13	59	8	21	20	80	81	53	84	599
16-Jun-26 14:00	54	59	60	12	59	8	21	21	83	79	53	81	592
16-Jun-26 15:00	54	60	59	12	59	8	21	21	87	67	53	95	598
16-Jun-26 16:00	55	64	60	12	62	9	21	21	86	67	53	94	604
16-Jun-26 17:00	55	64	60	12	61	9	21	20	86	66	52	94	600
16-Jun-26 18:00	55	63	59	12	61	9	22	21	85	67	53	94	600
16-Jun-26 19:00	55	64	59	12	62	9	21	22	85	66	52	95	602

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
16-Jun-26 20:00	55	65	60	12	62	9	22	21	83	67	68	91	613
16-Jun-26 21:00	55	62	60	12	61	9	22	22	81	67	57	90	599
16-Jun-26 22:00	55	63	60	12	62	9	21	21	82	67	52	92	595
16-Jun-26 23:00	55	65	60	12	62	9	22	21	87	67	53	96	609
17-Jun-26 00:00	55	64	60	12	61	9	21	21	83	80	53	92	612
17-Jun-26 01:00	55	63	60	12	62	9	21	21	84	80	52	93	613
17-Jun-26 02:00	55	64	60	12	62	9	21	21	82	81	52	92	612
17-Jun-26 03:00	55	64	60	12	62	9	21	21	83	80	51	92	610
17-Jun-26 04:00	55	65	61	12	63	9	21	20	82	81	52	92	613
17-Jun-26 05:00	56	63	60	12	62	9	21	21	83	80	51	93	610
17-Jun-26 06:00	56	63	60	12	62	10	22	21	83	81	52	93	615
17-Jun-26 07:00	55	64	60	12	61	9	21	20	83	80	52	92	611
17-Jun-26 08:00	56	62	61	12	61	9	21	21	86	81	51	94	615
17-Jun-26 09:00	55	62	60	13	61	9	22	21	83	81	52	97	615
17-Jun-26 10:00	55	59	61	13	61	9	21	21	87	80	53	99	620
17-Jun-26 11:00	55	63	60	13	62	9	21	20	84	81	53	96	618
17-Jun-26 12:00	55	65	60	13	64	10	21	21	87	80	52	100	628
17-Jun-26 13:00	54	63	60	13	64	10	21	20	84	68	68	97	620
17-Jun-26 14:00	55	63	60	12	61	9	21	20	86	63	71	99	622
17-Jun-26 15:00	56	65	61	12	62	10	22	22	84	80	55	99	626
17-Jun-26 16:00	55	66	59	13	61	9	22	20	83	80	54	96	618
17-Jun-26 17:00	55	66	59	12	60	9	21	21	82	80	54	89	609
17-Jun-26 18:00	55	64	60	13	62	9	22	21	83	81	55	88	614
17-Jun-26 19:00	56	65	61	12	62	9	22	21	85	80	54	93	620
17-Jun-26 20:00	55	67	60	12	62	9	21	20	83	79	53	97	620
17-Jun-26 21:00	50	67	60	12	62	10	21	21	88	80	54	101	627
17-Jun-26 22:00	56	69	59	12	61	10	21	21	85	79	54	98	626
17-Jun-26 23:00	55	67	60	13	63	10	21	21	90	79	54	101	632
18-Jun-26 00:00	55	69	60	12	62	10	21	21	86	79	54	98	627
18-Jun-26 01:00	55	67	60	13	62	10	22	21	88	80	54	100	632
18-Jun-26 02:00	55	68	60	12	62	10	21	21	89	80	54	101	633
18-Jun-26 03:00	55	69	60	13	63	10	21	21	91	79	54	102	637
18-Jun-26 04:00	55	66	60	12	62	10	22	21	95	82	53	106	643
18-Jun-26 05:00	55	67	60	12	62	10	22	21	89	90	53	99	637
18-Jun-26 06:00	55	66	59	12	62	10	21	21	87	89	52	95	630
18-Jun-26 07:00	56	68	60	12	61	10	22	21	89	90	53	97	638
18-Jun-26 08:00	55	66	60	12	62	10	21	21	88	89	53	96	632
18-Jun-26 09:00	55	67	61	13	63	10	22	21	85	84	54	93	627
18-Jun-26 10:00	56	66	60	12	62	10	21	21	84	84	54	97	627
18-Jun-26 11:00	56	66	61	13	62	10	22	21	81	80	67	95	633
18-Jun-26 12:00	57	67	60	12	61	9	22	21	84	85	53	98	630
18-Jun-26 13:00	55	61	60	12	61	9	22	21	85	83	52	97	617
18-Jun-26 14:00	55	67	60	12	61	9	21	21	81	86	53	98	625
18-Jun-26 15:00	55	66	60	12	61	9	21	21	84	84	52	97	622

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
18-Jun-26 16:00	55	71	58	12	60	9	21	20	84	84	53	98	627
18-Jun-26 17:00	56	63	58	12	59	9	22	20	88	89	53	101	630
18-Jun-26 18:00	55	62	60	12	61	9	21	21	83	84	52	97	616
18-Jun-26 19:00	55	65	60	12	60	9	22	21	81	81	51	95	613
18-Jun-26 20:00	55	66	60	12	61	9	22	21	80	81	51	93	611
18-Jun-26 21:00	55	65	59	12	59	9	21	20	79	82	50	96	609
18-Jun-26 22:00	55	64	58	11	59	9	21	21	78	80	52	93	600
18-Jun-26 23:00	55	65	58	11	59	9	22	21	79	79	52	94	603
19-Jun-26 00:00	54	64	58	11	60	9	21	20	84	83	52	97	614
19-Jun-26 01:00	56	62	58	11	60	9	21	20	80	80	51	94	601
19-Jun-26 02:00	55	62	58	11	60	9	22	21	82	81	53	87	600
19-Jun-26 03:00	55	63	58	11	60	9	21	21	83	80	52	90	603
19-Jun-26 04:00	55	64	58	11	60	9	22	21	81	80	53	92	606
19-Jun-26 05:00	55	63	58	11	60	9	21	20	80	80	52	90	599
19-Jun-26 06:00	55	63	58	11	60	8	21	20	79	79	51	93	600
19-Jun-26 07:00	55	63	58	11	60	9	21	21	80	80	53	94	605
19-Jun-26 08:00	53	61	59	12	60	9	21	20	81	80	52	90	597
19-Jun-26 09:00	53	61	59	12	59	9	21	21	82	82	52	96	607
19-Jun-26 10:00	53	60	59	12	60	9	21	20	82	81	53	96	606
19-Jun-26 11:00	53	61	59	12	60	9	22	20	80	80	53	95	605
19-Jun-26 12:00	53	62	59	12	60	9	21	21	83	81	54	96	612
19-Jun-26 13:00	54	64	61	13	61	9	21	20	81	81	52	95	613
19-Jun-26 14:00	53	64	59	12	60	9	21	21	84	84	51	97	615
19-Jun-26 15:00	53	64	59	12	61	9	21	21	82	82	50	96	611
19-Jun-26 16:00	53	64	59	12	61	9	21	21	82	80	52	97	610
19-Jun-26 17:00	53	65	59	12	61	9	21	21	80	80	52	92	606
19-Jun-26 18:00	53	65	59	12	61	9	21	21	82	80	52	94	609
19-Jun-26 19:00	54	63	59	12	61	9	22	21	81	81	52	91	606
19-Jun-26 20:00	54	65	60	12	60	9	22	21	82	67	52	91	595
19-Jun-26 21:00	55	63	59	12	61	9	21	21	82	67	51	92	592
19-Jun-26 22:00	54	63	59	12	60	9	21	21	84	67	51	93	593
19-Jun-26 23:00	55	64	59	12	60	9	21	21	82	66	51	91	589
20-Jun-26 00:00	55	64	60	12	60	9	21	21	81	66	50	90	587
20-Jun-26 01:00	55	63	60	12	61	9	22	21	82	67	51	93	597
20-Jun-26 02:00	55	65	60	12	60	9	21	21	82	67	51	96	600
20-Jun-26 03:00	54	63	59	12	61	9	21	20	81	66	51	95	591
20-Jun-26 04:00	54	61	58	12	60	9	21	21	81	66	51	93	589
20-Jun-26 05:00	53	64	60	12	62	9	21	20	82	67	52	87	589
20-Jun-26 06:00	54	62	59	12	60	9	21	20	81	67	48	92	586
20-Jun-26 07:00	54	62	60	12	61	10	21	21	79	67	48	92	587
20-Jun-26 08:00	54	63	59	12	61	10	23	23	79	81	49	92	606
20-Jun-26 09:00	55	64	60	12	62	9	23	22	79	81	49	93	609
20-Jun-26 10:00	54	63	60	12	62	9	24	24	81	83	49	92	612
20-Jun-26 11:00	54	65	60	12	62	10	23	22	80	82	51	94	615

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
20-Jun-26 12:00	54	63	59	12	61	10	22	21	81	63	75	87	607
20-Jun-26 13:00	54	63	60	12	64	10	22	21	87	47	71	99	611
20-Jun-26 14:00	53	63	60	13	61	9	23	22	81	50	68	93	596
20-Jun-26 15:00	53	64	60	12	61	9	25	25	82	66	50	87	594
20-Jun-26 16:00	53	64	60	12	61	9	22	22	80	67	50	94	594
20-Jun-26 17:00	53	64	60	12	61	10	22	22	81	67	50	89	592
20-Jun-26 18:00	53	64	60	12	61	10	22	22	80	67	50	95	595
20-Jun-26 19:00	53	64	60	12	61	10	21	22	82	67	53	90	596
20-Jun-26 20:00	53	65	60	12	62	10	22	22	83	67	50	93	598
20-Jun-26 21:00	53	63	60	13	63	10	22	22	82	67	51	96	600
20-Jun-26 22:00	55	62	59	13	62	10	22	22	83	68	52	94	600
20-Jun-26 23:00	54	62	60	12	62	10	21	21	86	67	51	99	605
21-Jun-26 00:00	55	62	60	13	62	10	22	22	84	67	51	98	604
21-Jun-26 01:00	55	63	60	12	61	10	22	23	82	67	51	95	600
21-Jun-26 02:00	54	63	60	13	62	10	22	21	82	67	51	93	599
21-Jun-26 03:00	55	64	60	12	62	10	21	22	83	67	51	93	600
21-Jun-26 04:00	55	63	60	12	63	10	22	22	84	68	52	92	602
21-Jun-26 05:00	55	64	60	12	62	10	22	22	84	68	51	90	599
21-Jun-26 06:00	54	62	60	12	62	10	22	22	83	67	51	92	598
21-Jun-26 07:00	55	63	59	12	61	9	21	22	82	66	50	92	594
21-Jun-26 08:00	54	64	60	12	62	9	22	22	85	68	52	93	603
21-Jun-26 09:00	55	62	60	13	62	9	21	22	87	67	51	95	605
21-Jun-26 10:00	55	63	61	13	62	10	21	21	91	68	51	99	615
21-Jun-26 11:00	55	63	60	13	62	9	21	22	93	67	51	101	617
21-Jun-26 12:00	55	62	61	13	63	9	21	22	88	68	52	97	609
21-Jun-26 13:00	57	63	62	13	62	10	21	22	89	68	52	97	616
21-Jun-26 14:00	53	71	59	12	61	8	22	22	89	68	52	97	613
21-Jun-26 15:00	53	67	60	12	61	9	22	22	83	84	50	98	621
21-Jun-26 16:00	53	65	60	12	62	9	22	22	83	84	51	97	621
21-Jun-26 17:00	51	63	59	12	61	9	22	22	86	68	52	99	604
21-Jun-26 18:00	53	65	60	12	62	9	21	21	85	67	50	99	605
21-Jun-26 19:00	53	65	59	13	62	10	22	22	83	68	52	98	607
21-Jun-26 20:00	54	65	59	12	62	10	22	23	84	68	52	96	606
21-Jun-26 21:00	54	65	59	12	62	10	21	22	86	67	53	95	606
21-Jun-26 22:00	54	64	60	12	61	10	18	21	92	65	52	100	610
21-Jun-26 23:00	54	63	60	12	61	10	24	22	80	67	53	88	593
22-Jun-26 00:00	54	64	59	12	61	10	21	22	83	67	54	93	600
22-Jun-26 01:00	54	65	61	12	62	10	20	22	88	67	53	96	609
22-Jun-26 02:00	54	64	60	12	61	9	20	22	90	67	52	97	608
22-Jun-26 03:00	54	65	60	12	62	10	20	22	88	66	52	97	609
22-Jun-26 04:00	54	65	60	12	62	9	20	22	84	67	53	98	606
22-Jun-26 05:00	54	63	61	13	62	10	20	22	81	67	53	96	601
22-Jun-26 06:00	53	61	59	12	61	9	20	22	85	67	50	98	598
22-Jun-26 07:00	54	61	59	12	61	9	21	23	84	67	52	98	600

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
22-Jun-26 08:00	53	64	60	12	62	9	19	19	91	65	51	103	607
22-Jun-26 09:00	54	61	60	12	62	9	20	22	82	67	52	96	597
22-Jun-26 10:00	54	62	59	12	62	9	20	21	83	67	53	96	598
22-Jun-26 11:00	53	63	62	13	60	8	19	22	85	67	52	97	603
22-Jun-26 12:00	54	61	60	13	63	9	20	22	81	69	53	95	598
22-Jun-26 13:00	53	63	60	13	63	9	20	22	88	68	53	99	610
22-Jun-26 14:00	53	63	60	13	62	10	19	21	94	67	52	106	620
22-Jun-26 15:00	54	64	61	13	62	10	20	22	85	66	55	97	609
22-Jun-26 16:00	56	62	60	13	63	9	20	22	84	67	55	91	601
22-Jun-26 17:00	56	63	60	12	62	9	20	22	82	67	55	91	599
22-Jun-26 18:00	56	65	60	13	63	10	20	22	84	67	55	88	601
22-Jun-26 19:00	55	64	60	13	61	9	20	22	81	66	54	90	596
22-Jun-26 20:00	55	65	60	13	62	9	21	22	82	66	53	89	597
22-Jun-26 21:00	55	66	60	12	62	9	21	22	83	67	54	86	598
22-Jun-26 22:00	56	64	60	13	62	9	21	23	82	67	56	89	601
22-Jun-26 23:00	56	65	59	12	62	9	20	22	82	66	54	95	603
23-Jun-26 00:00	55	65	60	12	62	10	21	22	82	65	54	96	605
23-Jun-26 01:00	55	66	60	12	62	10	20	22	80	65	54	91	597
23-Jun-26 02:00	55	65	59	12	62	9	21	23	81	66	55	86	595
23-Jun-26 03:00	55	66	59	12	62	9	21	23	84	66	55	93	607
23-Jun-26 04:00	55	64	60	12	63	9	21	22	84	66	55	93	603
23-Jun-26 05:00	55	65	61	13	62	9	20	22	84	66	54	93	604
23-Jun-26 06:00	55	65	60	12	61	9	21	22	80	66	54	91	596
23-Jun-26 07:00	54	64	60	12	61	9	20	22	80	66	54	86	589
23-Jun-26 08:00	55	64	60	12	62	10	21	22	81	66	55	90	599
23-Jun-26 09:00	55	64	60	12	62	9	21	22	81	66	54	98	604
23-Jun-26 10:00	55	64	61	12	62	10	21	23	83	67	56	91	606
23-Jun-26 11:00	56	64	60	12	61	9	20	22	82	66	55	92	600
23-Jun-26 12:00	56	65	60	13	64	10	20	22	94	67	56	86	612
23-Jun-26 13:00	56	65	61	13	63	10	20	22	87	64	59	97	618
23-Jun-26 14:00	56	66	61	13	61	10	20	22	86	50	69	96	611
23-Jun-26 15:00	56	66	60	13	61	10	20	22	85	50	70	95	606
23-Jun-26 16:00	56	65	59	12	61	9	21	22	84	67	56	91	603
23-Jun-26 17:00	56	65	59	12	61	9	21	23	84	67	54	95	607
23-Jun-26 18:00	55	66	59	12	61	9	20	23	84	66	53	95	603
23-Jun-26 19:00	55	67	59	12	62	9	20	22	87	66	53	98	610
23-Jun-26 20:00	55	66	59	12	61	9	20	22	88	67	54	97	610
23-Jun-26 21:00	55	66	59	12	61	9	20	23	81	66	68	91	612
23-Jun-26 22:00	55	65	59	13	61	9	20	23	81	67	67	95	615
23-Jun-26 23:00	55	65	60	13	62	9	20	23	80	66	67	93	614
24-Jun-26 00:00	55	64	59	13	62	9	20	22	88	67	53	96	609
24-Jun-26 01:00	56	64	60	12	62	9	20	23	91	66	52	98	613
24-Jun-26 02:00	55	64	60	13	60	9	20	23	88	66	53	96	606
24-Jun-26 03:00	55	66	60	12	62	9	20	22	89	66	53	96	611

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
24-Jun-26 04:00	54	65	60	13	61	10	21	23	87	66	53	95	606
24-Jun-26 05:00	54	64	60	12	61	10	20	22	89	67	53	96	607
24-Jun-26 06:00	54	63	60	12	61	9	20	22	90	66	52	97	606
24-Jun-26 07:00	54	63	59	13	61	9	20	21	90	66	53	97	607
24-Jun-26 08:00	54	64	60	12	61	9	21	22	82	67	54	91	598
24-Jun-26 09:00	54	62	60	12	61	9	20	22	82	80	54	82	599
24-Jun-26 10:00	54	69	61	13	62	9	20	22	84	66	53	92	604
24-Jun-26 11:00	55	65	61	13	61	10	20	21	92	67	53	91	610
24-Jun-26 12:00	56	65	61	13	62	10	20	22	90	67	54	86	606
24-Jun-26 13:00	57	63	61	13	62	9	20	22	84	67	54	97	610
24-Jun-26 14:00	53	69	61	13	62	9	21	22	81	67	54	96	609
24-Jun-26 15:00	53	69	61	13	62	10	19	22	80	85	52	94	622
24-Jun-26 16:00	54	66	62	13	61	9	20	22	84	80	54	91	616
24-Jun-26 17:00	53	62	61	13	61	8	21	22	87	67	54	99	608
24-Jun-26 18:00	55	63	60	13	61	9	21	23	83	67	54	96	604
24-Jun-26 19:00	55	63	60	13	62	10	20	22	84	66	53	88	597
24-Jun-26 20:00	55	63	61	13	62	10	22	22	84	66	52	87	596
24-Jun-26 21:00	55	65	61	13	62	9	21	23	84	67	53	88	601
24-Jun-26 22:00	55	66	61	13	62	10	21	22	86	66	52	99	612
24-Jun-26 23:00	56	68	61	13	62	10	22	22	85	67	68	89	623
25-Jun-26 00:00	55	68	61	13	62	10	21	22	82	67	68	95	625
25-Jun-26 01:00	55	66	61	13	63	10	25	26	86	67	70	98	640
25-Jun-26 02:00	63	67	62	13	63	10	25	27	81	67	67	95	640
25-Jun-26 03:00	63	67	60	13	61	10	26	27	79	67	66	94	632
25-Jun-26 04:00	63	69	60	13	62	10	26	28	80	67	66	96	639
25-Jun-26 05:00	63	66	60	13	61	9	21	21	80	66	51	88	599
25-Jun-26 06:00	61	67	61	13	62	10	22	23	85	67	52	96	619
25-Jun-26 07:00	55	67	60	13	61	10	22	22	80	67	53	91	598
25-Jun-26 08:00	55	64	60	13	61	10	21	21	85	67	52	98	606
25-Jun-26 09:00	55	64	61	13	62	9	21	21	86	67	53	98	610
25-Jun-26 10:00	55	63	62	13	62	9	22	22	95	69	55	89	617
25-Jun-26 11:00	55	62	60	13	63	10	21	21	112	66	52	82	616
25-Jun-26 12:00	55	64	62	13	63	10	21	22	95	68	54	82	609
25-Jun-26 13:00	55	65	62	13	62	10	22	22	85	68	53	89	605
25-Jun-26 14:00	56	63	60	13	62	9	21	21	84	69	52	87	598
25-Jun-26 15:00	55	64	61	13	61	9	21	21	83	68	53	89	600
25-Jun-26 16:00	56	64	60	13	62	9	22	22	81	68	53	95	606
25-Jun-26 17:00	56	65	60	13	62	9	21	22	81	67	52	88	595
25-Jun-26 18:00	55	62	60	13	62	10	21	22	81	68	53	93	599
25-Jun-26 19:00	55	62	60	13	62	10	22	21	84	68	53	87	596
25-Jun-26 20:00	55	63	60	12	62	10	22	22	82	68	53	93	602
25-Jun-26 21:00	55	66	60	12	62	10	22	22	82	58	59	88	598
25-Jun-26 22:00	55	64	61	13	62	10	21	22	81	68	52	92	601
25-Jun-26 23:00	55	64	60	13	61	9	21	21	82	67	51	89	594

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
26-Jun-26 00:00	55	64	60	13	62	9	21	21	85	67	50	96	603
26-Jun-26 01:00	55	64	60	12	62	10	21	22	80	67	50	93	596
26-Jun-26 02:00	55	63	60	12	62	9	21	22	80	67	50	98	600
26-Jun-26 03:00	55	66	60	13	62	9	21	22	80	67	51	92	596
26-Jun-26 04:00	55	66	60	12	61	9	21	21	79	67	50	94	596
26-Jun-26 05:00	55	66	60	13	62	10	22	21	80	68	67	92	614
26-Jun-26 06:00	55	65	60	13	62	10	21	21	80	67	51	95	600
26-Jun-26 07:00	55	60	59	12	59	9	21	21	83	67	52	88	587
26-Jun-26 08:00	55	62	60	13	60	9	21	22	82	67	53	98	600
26-Jun-26 09:00	55	60	60	12	62	9	21	21	81	67	52	94	592
26-Jun-26 10:00	56	59	58	12	60	9	21	22	79	68	54	82	580
26-Jun-26 11:00	56	59	59	12	60	9	21	21	85	67	53	93	593
26-Jun-26 12:00	55	58	58	12	61	9	21	21	79	67	53	89	582
26-Jun-26 13:00	55	61	58	11	64	10	21	22	79	59	65	81	587
26-Jun-26 14:00	56	61	58	12	61	9	21	22	81	50	71	81	581
26-Jun-26 15:00	56	60	58	12	60	8	20	21	82	66	52	85	580
26-Jun-26 16:00	56	62	59	12	60	8	22	22	82	67	53	89	592
26-Jun-26 17:00	55	59	60	12	61	9	21	22	80	67	53	89	588
26-Jun-26 18:00	55	59	59	12	60	8	22	21	82	67	53	86	585
26-Jun-26 19:00	55	59	58	12	60	8	22	22	83	68	54	82	582
26-Jun-26 20:00	56	60	59	12	62	9	21	21	82	67	53	80	583
26-Jun-26 21:00	55	61	59	12	61	9	21	22	79	66	52	80	578
26-Jun-26 22:00	55	64	59	12	61	9	21	21	79	66	52	86	586
26-Jun-26 23:00	56	65	60	12	61	9	21	22	83	67	53	83	591
27-Jun-26 00:00	55	65	59	12	61	9	22	22	80	67	54	82	589
27-Jun-26 01:00	55	64	59	12	61	9	21	21	80	66	51	88	589
27-Jun-26 02:00	55	64	58	12	61	9	21	22	80	68	54	82	586
27-Jun-26 03:00	55	62	59	12	61	9	21	21	80	67	53	83	583
27-Jun-26 04:00	56	60	60	12	61	9	21	21	82	69	55	83	588
27-Jun-26 05:00	55	62	59	12	61	9	20	21	82	67	52	93	592
27-Jun-26 06:00	55	63	60	12	61	8	21	21	82	67	53	89	592
27-Jun-26 07:00	55	60	59	12	60	8	21	21	82	68	53	87	587
27-Jun-26 08:00	55	62	60	12	60	8	20	21	80	66	52	86	583
27-Jun-26 09:00	55	61	60	12	60	8	20	21	80	67	53	89	586
27-Jun-26 10:00	55	61	60	12	60	9	20	21	79	66	53	85	580
27-Jun-26 11:00	56	64	60	12	61	8	20	21	83	68	54	82	590
27-Jun-26 12:00	57	61	60	12	61	8	20	21	80	67	54	88	590
27-Jun-26 13:00	55	65	60	12	60	9	21	21	79	67	53	89	590
27-Jun-26 14:00	53	70	58	12	60	9	20	20	80	67	53	90	592
27-Jun-26 15:00	54	66	58	11	60	8	21	21	85	67	53	84	590
27-Jun-26 16:00	55	64	59	12	61	9	21	21	82	68	54	88	593
27-Jun-26 17:00	55	66	59	12	61	9	21	21	80	67	54	85	590
27-Jun-26 18:00	54	62	59	12	60	9	21	22	82	66	53	83	582
27-Jun-26 19:00	54	64	60	13	61	9	20	21	83	67	53	86	591

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
27-Jun-26 20:00	55	65	60	12	62	9	21	21	80	67	53	86	591
27-Jun-26 21:00	55	65	60	12	63	9	21	22	80	67	53	84	591
27-Jun-26 22:00	55	63	60	13	62	9	21	21	80	67	53	85	589
27-Jun-26 23:00	56	65	59	12	61	9	20	21	79	67	53	88	591
28-Jun-26 00:00	55	64	60	12	62	9	20	20	84	67	53	93	601
28-Jun-26 01:00	55	61	58	11	62	9	20	22	87	67	53	95	600
28-Jun-26 02:00	55	88	58	11	62	9	20	20	77	66	52	91	609
28-Jun-26 03:00	55	113	30	8	62	10	20	21	84	85	53	98	639
28-Jun-26 04:00	56	113	0	0	62	10	20	21	88	94	52	100	616
28-Jun-26 05:00	55	118	0	0	61	10	21	21	87	88	53	100	614
28-Jun-26 06:00	56	120	0	0	61	9	20	20	84	87	52	98	607
28-Jun-26 07:00	55	117	0	0	62	11	20	21	81	80	52	96	595
28-Jun-26 08:00	55	117	0	0	61	10	20	21	81	80	54	94	593
28-Jun-26 09:00	54	116	0	0	62	10	20	21	82	80	52	96	595
28-Jun-26 10:00	56	112	0	0	62	10	20	21	81	80	53	90	585
28-Jun-26 11:00	56	112	0	0	61	10	20	20	84	81	53	89	586
28-Jun-26 12:00	56	113	0	0	63	10	20	20	80	80	53	99	594
28-Jun-26 13:00	56	113	0	0	62	10	20	21	81	80	52	95	591
28-Jun-26 14:00	56	114	0	0	61	9	21	21	84	83	52	96	597
28-Jun-26 15:00	56	113	0	0	63	10	20	20	84	82	51	94	593
28-Jun-26 16:00	56	114	0	0	63	9	21	21	82	80	55	93	594
28-Jun-26 17:00	57	114	0	0	63	10	20	21	85	81	54	100	604
28-Jun-26 18:00	56	112	0	0	62	10	21	21	81	80	54	94	591
28-Jun-26 19:00	56	114	0	0	62	9	20	21	83	80	54	93	592
28-Jun-26 20:00	56	114	0	0	62	10	20	21	81	79	54	95	592
28-Jun-26 21:00	56	113	0	0	63	10	21	22	81	67	54	86	572
28-Jun-26 22:00	56	113	0	0	62	10	20	21	80	66	53	85	567
28-Jun-26 23:00	56	113	0	0	62	10	20	21	79	66	53	83	562
29-Jun-26 00:00	56	112	0	0	63	10	21	21	79	66	52	90	589
29-Jun-26 01:00	56	113	0	0	62	10	21	21	81	68	54	93	577
29-Jun-26 02:00	56	114	0	0	62	10	21	21	79	66	53	93	574
29-Jun-26 03:00	56	112	0	0	61	10	21	21	81	67	54	95	577
29-Jun-26 04:00	56	114	0	0	62	10	21	21	80	66	53	95	577
29-Jun-26 05:00	56	113	0	0	63	9	20	21	77	66	53	93	571
29-Jun-26 06:00	55	110	0	0	63	10	20	21	80	66	52	98	574
29-Jun-26 07:00	55	110	0	0	63	9	20	21	83	67	52	97	577
29-Jun-26 08:00	56	111	0	0	63	10	20	21	81	67	52	95	574
29-Jun-26 09:00	53	106	0	0	62	9	20	21	80	80	52	87	570
29-Jun-26 10:00	53	104	0	0	62	10	20	21	79	80	52	86	567
29-Jun-26 11:00	53	106	0	0	62	10	21	22	79	81	53	86	572
29-Jun-26 12:00	53	106	0	0	62	10	20	21	81	80	52	91	575
29-Jun-26 13:00	53	106	0	0	64	10	20	21	79	75	62	88	579
29-Jun-26 14:00	53	104	0	0	62	10	21	22	81	63	71	91	577
29-Jun-26 15:00	52	105	0	0	62	10	20	22	82	76	62	85	575

บันทึกข้อมูลการเดินระบบไอน้ำ (ม.ค. - มิ.ย. 69)

Max. 714

Date	H-3701	H-3703	H-3704 HP	H-3704 LP	H-3705 HP	H-3705 LP	H-3706	H-3707	H-3708	H-3709	H-3710	H-3711	Total
	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
29-Jun-26 16:00	52	105	0	0	62	9	21	22	87	67	53	96	576
29-Jun-26 17:00	53	109	0	0	61	10	21	21	84	67	53	98	576
29-Jun-26 18:00	53	109	0	0	61	9	21	22	86	67	53	98	577
29-Jun-26 19:00	53	108	0	0	62	10	21	22	85	67	53	98	579
29-Jun-26 20:00	53	106	0	0	62	10	21	21	85	67	52	97	574
29-Jun-26 21:00	53	106	0	0	61	9	20	22	81	66	53	95	567
29-Jun-26 22:00	53	106	0	0	61	10	21	21	81	67	53	95	567
29-Jun-26 23:00	53	106	0	0	61	9	21	21	81	67	52	95	565
30-Jun-26 00:00	53	105	0	0	60	10	20	21	80	66	52	94	561
30-Jun-26 01:00	53	105	0	0	61	10	20	21	82	67	53	95	567
30-Jun-26 02:00	55	104	0	0	60	9	21	21	81	66	52	95	565
30-Jun-26 03:00	64	105	0	0	60	9	21	22	79	67	53	92	571
30-Jun-26 04:00	66	105	0	0	60	9	21	22	80	67	52	89	571
30-Jun-26 05:00	66	105	0	0	59	9	20	22	76	66	52	95	570
30-Jun-26 06:00	59	106	0	0	61	9	20	21	82	66	52	96	572
30-Jun-26 07:00	53	104	0	0	60	9	21	22	80	67	53	95	565
30-Jun-26 08:00	53	105	0	0	60	9	21	21	85	67	53	98	571
30-Jun-26 09:00	52	104	0	0	60	9	20	21	89	63	50	101	569
30-Jun-26 10:00	53	105	0	0	61	9	20	22	90	63	51	101	574
30-Jun-26 11:00	54	104	0	0	61	9	21	21	88	63	51	101	574
30-Jun-26 12:00	53	106	0	0	61	9	21	22	85	63	51	99	571
30-Jun-26 13:00	57	101	0	0	60	9	20	21	86	63	50	97	565
30-Jun-26 14:00	53	101	0	0	61	9	21	21	97	64	51	107	585
30-Jun-26 15:00	53	118	0	0	61	8	20	22	75	63	50	91	562
30-Jun-26 16:00	51	152	0	0	60	9	21	21	73	63	51	84	586
30-Jun-26 17:00	53	107	0	0	62	9	21	21	85	64	51	93	565
30-Jun-26 18:00	53	105	0	0	61	9	21	21	86	63	50	93	564
30-Jun-26 19:00	53	104	0	0	61	9	20	21	88	63	50	95	564
30-Jun-26 20:00	53	104	0	0	60	8	20	21	86	63	51	94	561
30-Jun-26 21:00	52	104	0	0	60	9	21	21	85	63	50	93	559
30-Jun-26 22:00	53	102	0	0	61	9	20	22	82	62	49	91	551
30-Jun-26 23:00	52	102	0	0	61	9	20	21	87	63	50	95	559

ภาคผนวก ข.7

Procedure เรื่อง การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานผลิตยูทิลิตี้

W-(U-P1-OP)-012

การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
ของหน่วยผลิตยูทิลิตี้

จัดทำโดย : [redacted]
(Day Manager)

อนุมัติโดย: [redacted]
(Division Manager-Plant Operation Utility)

ตารางแจกจ่าย

สำนาเลขที่	ผู้ถือ	สถานที่
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[redacted]

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(U-P1-OP)-012: การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกของหน่วยผลิตยูทิลิตี้

[redacted]

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(U-P1-OP)-012: การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกของหน่วยผลิตยูทิลิตี้

[redacted]

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(U-P1-OP)-012: การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกของหน่วยผลิตยูทิลิตี้

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(U-P1-OP)-012: การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกของหน่วยผลิตยูทิลิตี้



[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(U-P1-OP)-012: การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกของหน่วยผลิตยูทิลิตี้

[redacted]

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(U-P1-OP)-012: การควบคุมการระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกของหน่วยผลิตยูทิลิตี้

[redacted]

ภาคผนวก ข.8

เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

หนังสือรับแจ้ง

การมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เลขที่หนังสือ อก0313256810970 **ออกให้ ณ วันที่** 11 ตุลาคม 2568

เลขที่คำขอ F25680510

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 72070002725352

น.42(1)-27/2535-ญนพ.

ประกอบกิจการ ผลิตเอททิลีน โปรไพลีน ไฟฟ้า ไอน้ำ และโรงบำบัดน้ำเสียรวม

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 14 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

โทรศัพท์ -

ผลการพิจารณา 1. ประเภทที่เข้าข่าย

☑ มลพิษน้ำ

☑ มลพิษอากาศ

☑ มลพิษกากอุตสาหกรรม

หนังสือฉบับนี้ออกให้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Signed by DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS
Date: 2025-10-11T18:27:37.405+07:00
Reason: รับรองและผ่านการพิจารณาแล้ว
8a2e85f4

ตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2430 6315 ต่อ 2405
โทรสาร 0 2430 6315 ต่อ 2499
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

2. รายชื่อบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	นางสาววรรณธนา วุฒิรัตน์

ลำดับที่	**ผู้ควบคุมระบบบำบัด**	**เลขทะเบียน**	**มลพิษ**		
			น้ำ	**อากาศ**	**กากอุตสาหกรรม**
1			✔		✔
2				✔	
3				✔	
4			✔		
5			✔	✔	
6			✔		
7			✔	✔	✔
8			✔		

หนังสือฉบับนี้ออกให้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8a2e85f4

ตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2430 6315 ต่อ 2405
โทรสาร 0 2430 6315 ต่อ 2499
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ลำดับที่	ผู้ปฏิบัติงาน ประจำระบบบำบัด	มลพิษ		
		น้ำ	อากาศ	กากอุตสาหกรรม
1			✔	
2		✔		
3		✔	✔	
4		✔	✔	
5				✔
6			✔	
7			✔	
8			✔	
9			✔	
10			✔	
11			✔	
12		✔		
13		✔	✔	
14		✔	✔	
15			✔	
16			✔	✔
17			✔	
18			✔	

หนังสือฉบับนี้ออกให้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8a2e85f4

ตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2430 6315 ต่อ 2405
โทรสาร 0 2430 6315 ต่อ 2499
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ลำดับที่	ผู้ปฏิบัติงาน ประจำระบบบำบัด	มลพิษ		
		น้ำ	อากาศ	กากอุตสาหกรรม
19			✔	
20		✔		✔
21			✔	
22		✔		
23		✔		
24		✔		
25		✔	✔	✔
26		✔	✔	✔
27				✔
28				✔
29				✔
30				✔
31			✔	
32			✔	
33		✔		✔
34		✔		
35		✔	✔	
36		✔		

หนังสือฉบับนี้ออกให้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8a2e85f4

ตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2430 6315 ต่อ 2405
โทรสาร 0 2430 6315 ต่อ 2499
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ลำดับที่	ผู้ปฏิบัติงาน ประจำระบบบำบัด	มลพิษ		
		น้ำ	อากาศ	กากอุตสาหกรรม
37		✔		
38		✔		✔
39		✔		
40		✔		✔
41		✔		✔

แจ้งการมีบุคลากรฯ ครั้งถัดไปภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2570

หนังสือฉบับนี้ออกให้โดยยกเลิกหนังสือเลขที่ อก0313256810844 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2568

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือฉบับนี้ออกให้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8a2e85f4

ตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2430 6315 ต่อ 2405
โทรสาร 0 2430 6315 ต่อ 2499
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ภาคผนวก ข.9

เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ (PM Plan)

ประจำปี พ.ศ.2569

Gas & Flame Detector

MaintPlant	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	Location	User status	MaintItem text	Planner group	System status	ABC indic.	Main Work	Functional Loc.
1033	PM	A-39E-96HA-IR-9A	POWER GENERATOR Unit D	301762328	28-05-2026	28-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39E-96HA-IR-9B	POWER GENERATOR Unit D	301762308	28-05-2026	28-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39E-96HT-IR-1A	POWER GENERATOR Unit D	301762323	28-05-2026	28-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39E-96HT-IR-1B	POWER GENERATOR Unit D	301762316	28-05-2026	28-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39D-96HA-IR-9A	GT GENERATOR UNIT E	301762315	19-05-2026	19-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39D-96HA-IR-9B	GT GENERATOR UNIT E	301762327	19-05-2026	19-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39D-96HT-IR-1A	GT GENERATOR UNIT E	301762307	19-05-2026	19-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39D-96HT-IR-1B	GT GENERATOR UNIT E	301762322	19-05-2026	19-05-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39E-96HA-IR-9A	POWER GENERATOR Unit D	301702358	27-02-2026	27-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39E-96HA-IR-9B	POWER GENERATOR Unit D	301702320	27-02-2026	27-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39E-96HT-IR-1A	POWER GENERATOR Unit D	301702355	27-02-2026	27-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39E-96HT-IR-1B	POWER GENERATOR Unit D	301702344	27-02-2026	27-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901E
1033	PM	A-39D-96HA-IR-9A	GT GENERATOR UNIT E	301702343	04-02-2026	04-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39D-96HA-IR-9B	GT GENERATOR UNIT E	301702357	04-02-2026	04-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39D-96HT-IR-1A	GT GENERATOR UNIT E	301702319	04-02-2026	04-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39D-96HT-IR-1B	GT GENERATOR UNIT E	301702354	04-02-2026	04-02-2026	3900	WC	6M CALIBRATION GAS DETECTOR	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A392_G3901D

Safety Valve & Control Valve

MaintPlant	Order Ty	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	Location	User status	MaintItem text	Planner group	System status	ABC indic.	Main Work	Functional Loc.
1033	PM	A-31-SB-1SA	CLARIFIER A	600388613	19-12-2026	19-12-2026	3100	WC	1Y-INSPECTION SOLENOID VALVE BOX	U42	CLSD CNF GMPS NTUP PPRT PRC SETC	B	U42IC-S	A31_S3101A
1033	PM	A-31-SB-1SB	CLARIFIER B	600388614	19-12-2026	19-12-2026	3100	WC	1Y-INSPECTION SOLENOID VALVE BOX	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U42IC-S	A31_S3101B
1033	PM	A-31-SB-2A	RAPID GRAVITY FILTER	600388615	19-12-2026	19-12-2026	3100	WC	1Y-INSPECTION SOLENOID VALVE BOX	U41	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U42IC-S	A31_S3102A
1033	PM	A-31-SB-2B	RAPID GRAVITY FILTER	600388616	19-12-2026	19-12-2026	3100	WC	1Y-INSPECTION SOLENOID VALVE BOX	U41	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U42IC-S	A31_S3102B
1033	PM	A-31-SB-2C	RAPID GRAVITY FILTER	600388617	19-12-2026	19-12-2026	3100	WC	1Y-INSPECTION SOLENOID VALVE BOX	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U42IC-S	A31_S3102C
1033	PM	A-31-SB-2D	RAPID GRAVITY FILTER	600388618	19-12-2026	19-12-2026	3100	WC	1Y-INSPECTION SOLENOID VALVE BOX	U42	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U42IC-S	A31_S3102D
1033	PM	A-31-SB-2E	RAPID GRAVITY FILTER	600388619	19-12-2026	19-12-2026	3100	WC	1Y-INSPECTION SOLENOID VALVE BOX	U44	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U42IC-S	A31_S3102E
1033	PM	A-35-PSV-341	MIXED BED POLISHER	301443830	24-01-2026	31-01-2026	3500	WC	4Y- SAFETY VALVE INSPECTION	U44	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	A	U41MC-S	A35_V3505A
1033	PM	A-36-PSV-703B	WASTE HEAT STEAM BOILER (WHSB 1)	301427480	06-10-2026	31-10-2026	3600	WC	3Y- SAFETY VALVE INSPECTION.	U44	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	A	U41MC-T	A37_H3701
1033	PM	A-36-PSV-703R	WASTE HEAT STEAM BOILER (WHSB 1)	301427476	01-11-2026	01-11-2026	3600	WC	3Y- SAFETY VALVE INSPECTION.	U41	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	A	U41MC-S	A37_H3701
1033	PM	A-36-PSV-718R	WASTE HEAT STEAM BOILER (WHSB 1)	301426725	01-11-2026	01-11-2026	3600	WC	3Y- SAFETY VALVE INSPECTION.	U44	CLSD CNF GMPS NTUP PPRT PRC SETC	A	U41MC-S	A37_H3701
1033	PM	A-39G-FS	Fogging Skid at GTG-G	600433044	20-02-2026	20-02-2026	3900	WC	3Y: SOLENOID VALVE SEAL FLUSH INSPECTION	U44	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U42IC-S	A_A-39G-FS
1033	PM	A-39G-FS	Fogging Skid at GTG-G	301656819	09-09-2026	09-09-2026	3900	WC	1Y: NOZZLE REPLACEMENT ON CONDITION	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	A_A-39G-FS
1033	PM	A-39-PSV-005A	POWER GENERATOR Unit D	301625104	25-10-2026	31-10-2026	3900	WC	*3Y : Inspection	U44	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	S	U41MC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-39-PSV-005B	POWER GENERATOR Unit D	301625105	16-10-2026	31-10-2026	3900	WC	*3Y : Inspection	U44	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	S	U41MC-S	A392_G3901D
1033	PM	A-43-PSV-705	FUEL GAS HEATER	301394624	24-11-2026	30-11-2026	4300	WC	(Q)4Y- SAFETY VALVE INSPECTION	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U41MC-S	A43_E4301
1033	PM	A-43-PSV-723A	NITROGEN TO GTG-E	301404368	06-10-2026	31-10-2026	4300	WC	4Y-PSV INSPECTION	U44	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	S	U41MC-S	
1033	PM	A-43-PSV-723R	NITROGEN TO GTG-E	301404369	01-10-2026	01-10-2026	4300	WC	4Y-PSV INSPECTION	U44	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	S	U41MC-S	A43_V4306_43FOS01
1033	PM	A-54-PV-333B	SL STEAM HEADER	301443821	08-11-2026	08-11-2026	5400	WC	5Y-OVERHAUL CONTROL VALVE	U41	CLSD CNF PRT CSER GMPS NTUP PRC SETC	A	U42IC-S	A54_54PV333B
1033	PM	A-54-XDH-7121	DESUPER HEAT FOR LP STEAM LETDOWN	300755613	29-03-2026	29-03-2026	5400	WC	3Y OVERHAUL CONTROL VALVE	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U42IC-S	A54_54XDH7121
1033	PM	A-58-PCV-4007	De-ludge system for 4209-TR-101	300750357	16-01-2026	16-01-2026	5800	WC	3Y OVERHAUL DELUGE VALVE (Nov'24)	U41	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A42_TR101_PCV4007
1033	PM	A-58-PCV-4008	De-ludge system for 4209-TR-201	300756613	13-01-2026	13-01-2026	5800	WC	3Y OVERHAUL DELUTE VALVE (Dec'24)	U41	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U42IC-S	A42_TR201_PCV4008
1033	PM	A-PSV3161	MF Filtrate Tank	301618041	15-08-2026	15-08-2026	3160	WC	1Y Inspection & Test	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_MF
1033	PM	A-PSV3162	MF Filtrate Tank	301618034	19-08-2026	19-08-2026	3160	WC	1Y Inspection & Test	U41	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_MF
1033	PM	A-PSV325A	Pressure Relief Valve	301625160	06-09-2026	06-09-2026	3160	WC	1Y Inspection & Test	U42	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_SW_N-3165A_PSV325A
1033	IM	A-PSV325B	Pressure Relief Valve	301625168	03-09-2026	03-09-2026	3160	WC	1Y Inspection & Test	U42	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_SW_N-3165B_PSV325B
1033	IM	A-PSV325C	Pressure Relief Valve	301625152	05-09-2026	05-09-2026	3160	WC	1Y Inspection & Test	U42	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_SW_N-3165C_PSV325C
1033	IM	A-PSV325D	Pressure Relief Valve	301625143	09-09-2026	09-09-2026	3160	WC	1Y Inspection & Test	U42	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_SW_N-3165D_PSV325D
1033	IM	A-PSV325E	Pressure Relief Valve	301625135	05-09-2026	05-09-2026	3160	WC	1Y Inspection & Test	U42	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_SW_N-3165E_PSV325E
1033	IM	A-XV0091	Pneumatic Actuator	301709514	12-06-2026	12-06-2026	3160	WC	1Y INSPECT XV VALVE	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_MF-RK1_5-31631_XV0091
1033	IM	A-XV0097	Pneumatic Actuator	301709515	12-06-2026	12-06-2026	3160	WC	1Y INSPECT XV VALVE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_MF-RK7_5-31637_XV0097
1033	IM	A-XV0098	Pneumatic Actuator	301743698	12-06-2026	12-06-2026	3160	WC	1Y INSPECT XV VALVE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	A31-SWRO_MF-RK8_5-31638_XV0098

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	Planner grou	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Personnel no.
1033	PM	A-B-3101A	BACKWASH BLOWER	301643727	23-04-2026	11-05-2026	WF	1Y-CHANGE LUBE OIL & REPLACE BELT	U22	REL CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3101R	BACKWASH BLOWER	301627891	23-04-2026	23-04-2026	WF	1Y-CHANGE LUBE OIL & REPLACE BELT	U22	REL CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3161A	MF Filtrate Tank	301757051	13-05-2026	13-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3161A	MF Filtrate Tank	301656790	23-08-2026	23-08-2026	WC	1Y-CLEAN AND INSPECT AFTER COOLER	U44	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3161B	MF Filtrate Tank	301656778	20-08-2026	20-08-2026	WC	1Y-CLEAN AND INSPECT AFTER COOLER	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3161C	RO SYSTEM	301757073	13-05-2026	13-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3161D	RO SYSTEM	301757064	13-05-2026	13-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3403	COOLING TOWER	301656898	15-01-2026	15-01-2026	WC	1Y- REPLACE BELT	U22	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3403	COOLING TOWER	301428022	07-03-2026	07-03-2026	WC	1Y-REGREASE SERVICE	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3405B	Cooling tower B	301426618	19-08-2026	19-08-2026	WC	1Y-CHANGE GEAR LUBE OIL	U41	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-B-3405B	Cooling tower B	301511826	17-08-2026	19-08-2026	WC	4Y-OVERHAUL	U41	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3405R	Cooling tower R	301625125	20-09-2026	20-09-2026	WC	1Y-CHANGE GEAR LUBE OIL	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3501A	DEGASIFIER	301608738	20-10-2026	23-10-2026	WF	4Y-MAJOR OVERHAUL	U22	REL CNF PRT CSER GMPS MACM NTUP PRC *	B	U22MC-S	REL CNF PRT CSER GMPS MACM NTUP PRC *
1033	PM	A-B-3501A	DEGASIFIER	301656133	26-09-2026	26-09-2026	WC	1Y-REGREASE <(>&<)> INSPECTION	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3501R	DEGASIFIER	301444652	21-09-2026	22-09-2026	WC	4Y-MAJOR OVERHAUL	U41	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3501R	DEGASIFIER	301578372	14-03-2026	14-03-2026	WC	1Y-REGREASE & INSPECTION	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3502R	NEUTRALIZATION PIT	301733783	07-05-2026	14-05-2026	WF	4M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3502R	NEUTRALIZATION PIT	301643724	14-01-2026	14-01-2026	WC	8M-BELT REPLACE CHANGE L/O, INSEC BLOWER	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3503	MIXED BED POLISHER	301643720	27-03-2026	27-03-2026	WC	4M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3503	MIXED BED POLISHER	301643721	17-01-2026	17-01-2026	WC	8M-BELT REPLACE CHANGE L/O, INSEC BLOWER	U22	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC
1033	PM	A-B-3511A	DEGASSIFIER	301620574	07-07-2026	15-07-2026	WF	3Y- MAJOR OVERHAUL.	U22	REL CNF CSER MACM PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3511A	DEGASSIFIER	301661845	02-07-2026	05-07-2026	WF	4M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3511R	DEGASSIFIER	301649143	23-05-2026	23-05-2026	WF	4M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3511R	DEGASSIFIER	301643726	25-02-2026	25-02-2026	WC	8M-BELT REPLACE,REGREASE,INSPEC BLOWER	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3511R	DEGASSIFIER	301548971	31-08-2026	31-08-2026	WC	3Y- MAJOR OVERHAUL.	U41	CLSD CNF PRT CSER GMPS NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF PRT CSER GMPS NTUP PRC SETC
1033	PM	A-B-3513	MIXED BED POLISHER	301743714	02-06-2026	02-06-2026	WF	4M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	A	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3513	MIXED BED POLISHER	301643731	23-01-2026	23-01-2026	WC	8M-BELT REPLACE CHANGE L/O, INSEC BLOWER	U22	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC
1033	PM	A-B-3513	MIXED BED POLISHER	301728187	13-01-2026	13-01-2026	WC	4M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3516	XED BED EXCHANGERS (CPP	301745790	04-06-2026	04-06-2026	WF	6M-Regrease & Change L/O	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	A	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3516	XED BED EXCHANGERS (CPP	300639253	09-08-2026	11-08-2026	WC	(Q) 4Y- MAJOR OVERHAUL FOR B-3516	U41	TECO CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	A	U41MC-S	TECO CNF PRT GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-B-3517A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301743641	01-04-2026	01-04-2026	WC	6M-Regrease & Change L/O	U22	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3517A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301521849	07-05-2026	08-05-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR B-3517A	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3517R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301721658	01-04-2026	01-04-2026	WC	6M-Regrease & Change L/O	U22	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3517R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301521843	11-05-2026	11-05-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL EVERY FOR B-3517R	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3523A	TA FLOW METER OF B-3523A	301701094	27-05-2026	27-05-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3523R	TA FLOW METER OF B-3523A	301701096	27-05-2026	27-05-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3708A	EPS-HRSG NO.1	301721644	02-05-2026	02-05-2026	WF	6M-Regrease	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3708R	EPS-HRSG NO.1	301743643	02-05-2026	02-05-2026	WF	6M-Regrease	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3818A	EPS-HRSG NO.1	301746809	17-06-2026	17-06-2026	WF	6M-REGREASE AND CHANGE LUBE OIL	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3818R	EPS-HRSG NO.1	301746810	27-06-2026	27-06-2026	WF	6M-REGREASE AND CHANGE LUBE OIL	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3819A	EPS-HRSG NO.2	301688959	26-03-2026	26-03-2026	WF	6M-REGREASE AND CHANGE LUBE OIL	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3819R	EPS-HRSG NO.2	301688960	21-05-2026	21-05-2026	WF	6M-REGREASE AND CHANGE LUBE OIL	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3820A	EPS-HRSG NO.3	301690220	10-12-2026	11-12-2026	WC	6M-REGREASE AND CHANGE LUBE OIL	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3820R	EPS-HRSG NO.3	301690221	11-12-2026	11-12-2026	WC	6M-REGREASE AND CHANGE LUBE OIL	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-3902	M TURBINE GENERATOR STG	301737242	02-06-2026	09-06-2026	WF	6M-REGREASE BEARING	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	A	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402A	STEAM TURBINE AT B-4402A	301709519	01-06-2026	30-06-2026	WF	6M REGREASE GEAR COUPLING	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402A	STEAM TURBINE AT B-4402A	301709520	01-06-2026	30-06-2026	WF	6M-CLEAN AIR FILTER	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402A	STEAM TURBINE AT B-4402A	301514002	22-05-2026	31-05-2026	WC	*1Y-CLEAN AND INSPECTION IMPELLER	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402B	ENTRIFUGAL AIR COMPRESSC	301535299	12-02-2026	28-02-2026	WF	5Y- MAJOR OVERHAUL	U41	REL CNF GMPS MACM NTUP PPRT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF GMPS MACM NTUP PPRT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402B	ENTRIFUGAL AIR COMPRESSC	301728607	04-02-2026	28-02-2026	WF	*6M REGREASE GEAR COUPLING	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402B	ENTRIFUGAL AIR COMPRESSC	301728608	04-02-2026	28-02-2026	WF	*6M- CLEAN AIR FILTER	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402B	ENTRIFUGAL AIR COMPRESSC	301661897	18-01-2026	18-01-2026	WC	1Y- CLEAN AND INSPECTION IMPELLER	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402R	AIR COMPRESSOR	301661907	06-05-2026	06-05-2026	WF	6M REGREASE GEAR COUPLING	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402R	AIR COMPRESSOR	301661908	15-01-2026	15-01-2026	WC	6M-CLEAN AIR FILTER	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-B-4402R	AIR COMPRESSOR	301576560	13-01-2026	13-01-2026	WC	1Y-CHANGE AIR FILTER ON CONDITION	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3101A	BACKWASH BLOWER	301637213	01-07-2026	01-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-BM-3101R	BACKWASH BLOWER	301688972	10-03-2026	10-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3161A	Air Comp.Motor UnitA	301757061	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3161B	Air Comp.Motor UnitB	301757044	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3161C	RO SYSTEM	301757055	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3161D	RO SYSTEM	301757062	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3403	COOLING TOWER	301693930	27-03-2026	27-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3405A	Cooling tower A	301713891	03-07-2026	03-07-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3405A	Cooling tower A	301625046	17-06-2026	17-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3405B	Cooling tower B	301712951	07-07-2026	07-07-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3405R	Cooling tower R	301709465	08-07-2026	08-07-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	Planner grou	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Personnel no.
1033	PM	A-BM-3406A	Cooling tower A	301703573	05-03-2026	05-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3406R	Cooling tower A	301713913	03-07-2026	03-07-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3501A	DEGASIFIER	301703566	11-06-2026	11-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3501R	DEGASIFIER	301703586	22-05-2026	22-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3502A	NEUTRALIZATION PIT	301711290	11-06-2026	11-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3502R	NEUTRALIZATION PIT	301643790	05-10-2026	05-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3503	MIXED BED POLISHER	301643808	29-09-2026	29-09-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3511A	DEGASSIFIER	301636324	08-07-2026	08-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-BM-3511R	DEGASSIFIER	301620599	18-06-2026	18-06-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-BM-3513	MIXED BED POLISHER	301728617	19-06-2026	19-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3517A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301643772	14-10-2026	14-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3517R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301643776	19-10-2026	19-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-BM-3522A	LOW METER OF B-3522A/R F	600386799	02-11-2026	02-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-BM-3522R	LOW METER OF B-3522A/R F	600386801	06-10-2026	06-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3704	as Recirculation Motor for H	301552211	22-01-2026	22-01-2026	WC	\6M-INSPECTION LV. MOTOR 1 Hr.	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3705	Recirculation Fan for H-3707	301648660	17-10-2026	24-11-2026	WC	6Y Overhaul motor	U43	CLSD CNF GMPS NMAT PRC SETC	A	U43EE-S	CLSD CNF GMPS NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3705	Recirculation Fan for H-3707	301262123	23-01-2026	23-01-2026	WC	\6M-INSPECTION LV. MOTOR 1 Hr.	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3708A	EPS-HRSG NO.1	301643809	20-10-2026	20-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3708R	EPS-HRSG NO.1	301643796	15-08-2026	20-08-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-BM-3709A	EPS-HRSG NO.2	301643792	20-10-2026	20-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3709R	EPS-HRSG NO.2	301643820	19-10-2026	19-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3710A	EPS-HRSG NO.3	301643777	20-10-2026	20-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3710R	EPS-HRSG NO.3	301643815	19-10-2026	19-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3818A	EPS-HRSG NO.1	301702375	12-03-2026	12-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3818R	EPS-HRSG NO.1	301743719	24-06-2026	24-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3819A	EPS-HRSG NO.2	301702373	27-02-2026	27-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3819R	EPS-HRSG NO.2	301743718	24-06-2026	24-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3820A	EPS-HRSG NO.3	301702378	27-02-2026	27-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-3820R	EPS-HRSG NO.3	301743720	03-07-2026	03-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-4402B	AIR COMPRESSOR	301754118	28-05-2026	28-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-4402B	AIR COMPRESSOR	301632352	02-11-2026	02-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION HIGH VOLTAGE MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-4402R	Motor for B-4402R	301712953	09-06-2026	09-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION HIGH VOLTAGE MOTOR 2Hrs.	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BM-4402R	Motor for B-4402R	301754119	28-05-2026	28-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BMT-3818A	EPS-HRSG NO.1	301643807	03-11-2026	03-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BMT-3818R	EPS-HRSG NO.1	301717238	24-06-2026	27-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BMT-3819A	EPS-HRSG NO.2	301643794	07-11-2026	07-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BMT-3819R	EPS-HRSG NO.2	301627906	12-06-2026	12-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BMT-3820A	EPS-HRSG NO.3	301643779	07-11-2026	07-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BMT-3820R	EPS-HRSG NO.3	301711292	03-07-2026	03-07-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BN-4402A	STEAM TURBINE AT B-4402A	301380466	02-05-2026	31-05-2026	WC	*1Y- OVER SPEED TT <(>&<)> CHANGE LUBE O	U41	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-BPM-02-4402A	STEAM TURBINE AT B-4402A	301650839	07-12-2026	07-12-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BPM-02-4402R	tor for Lube Oil Pump (B-440	301705886	09-06-2026	09-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BS-01-4402A	STEAM TURBINE AT B-4402A	301665436	01-07-2026	01-07-2026	WF	2M-REPLACE SECONDARY INLET AIR FILTER->	U41	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-BS-01-4402R	AIR COMPRESSOR	301646757	02-07-2026	02-07-2026	WF	2M-REPLACE SECONDARY INLET AIR FILTER->	U41	REL CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-BS-02-3901A	Power Generation	301721675	02-06-2026	09-06-2026	WF	6M PM VISUAL INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BS-02-3901B	Power Generation	301721680	02-06-2026	09-06-2026	WF	6M PM VISUAL INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BS-02-3901C	Power Generation	301721669	02-06-2026	09-06-2026	WF	6M PM VISUAL INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BS-02-3901R	Power Generation	301721676	02-06-2026	09-06-2026	WF	6M PM VISUAL INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BS-02-3902	M TURBINE GENERATOR STG	301757129	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M-CHANGE LUBE OIL & INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-BS-02-3902	M TURBINE GENERATOR STG	301558761	09-06-2026	13-06-2026	WF	*6Y REPLACE FLEXIBLE HOSE ON CONDITION	U22	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3102A	SLUDGE PUMP	301688942	20-01-2026	20-01-2026	WC	1Y- CHANGE LUBE OIL.	U22	CLSD CNF PRT CSER MACM PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF PRT CSER MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3102R	SLUDGE PUMP	301535301	04-12-2026	04-12-2026	WC	3Y-MAJOR OVERHAUL	U41	TECO CNF CSER NTUP PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF CSER NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3103A	EIVED WATER RECYCLING PL	301748915	16-06-2026	18-06-2026	WF	2M- CLEAN SUCTION STRAINER.	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3103A	EIVED WATER RECYCLING P

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	anner grou	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Person.no.
1033	PM	A-P-3107A	ERM TREATED WATER TRAN	301265388	24-06-2026	26-06-2026	WC	4Y-OVERHAUL PUMP	U22	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PRC SETC	C	U22MC-T	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3107R	ERM TREATED WATER TRAN	301643767	16-01-2026	16-01-2026	WC	1Y-REGREASE&CLEAN SUCTION STRAINER.	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3107R	ERM TREATED WATER TRAN	301437795	04-06-2026	07-06-2026	WC	4Y-OVERHAUL PUMP	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3108A	COAGULANT PUMP	301656866	26-02-2026	26-02-2026	WC	1Y-CHANGE L/O<(>&<)>CLEAN SUCTION STRAIN	U22	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3108A	COAGULANT PUMP	301429597	08-03-2026	08-03-2026	WC	3Y-MAJOR OVERHAUL	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3108R	COAGULANT PUMP	301736083	08-05-2026	08-05-2026	WF	1Y-CHANGE L/O&CLEAN SUCTION STRAINER	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3110A	POLYELECTROLYTE PUMP(2)	301664962	03-02-2026	03-02-2026	WC	*1Y- CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3110R	POLYELECTROLYTE PUMP(2)	301426215	05-02-2026	05-02-2026	WF	3Y-MAJOR OVERHAUL	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3110R	POLYELECTROLYTE PUMP(2)	301427608	05-02-2026	05-02-2026	WC	1Y- CHANGE LUBE OIL	U41	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3111A	CAUSTIC SODA PUMP	301629949	14-07-2026	21-07-2026	WF	*3Y-MAJOR OVERHAUL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3111A	CAUSTIC SODA PUMP	301664987	03-02-2026	03-02-2026	WC	*1Y- CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3111R	CAUSTIC SODA PUMP	301736090	08-05-2026	08-05-2026	WF	1Y- CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3111R	CAUSTIC SODA PUMP	301274180	01-02-2026	29/2/2026	WF	3Y-MAJOR OVERHAUL	U41	REL CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3120A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301603746	04-12-2026	04-12-2026	WC	1Y-CHANGE LUBE OIL	U41	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3120A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301517973	01-07-2026	06-07-2026	WC	4Y-OVERHAUL	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3120R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301608834	04-12-2026	04-12-2026	WC	1Y-CHANGE LUBE OIL	U41	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3120R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301540991	01-07-2026	08-08-2026	WC	4Y-OVERHAUL	U41	TECO CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3125A	RAW WATER PUMP ZONE 7	301721686	01-04-2026	01-04-2026	WC	6M-PM INSPECTION	U22	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3125B	RAW WATER PUMP ZONE 7	301721688	01-04-2026	01-04-2026	WC	6M-PM INSPECTION	U22	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3140A	ERM TREATED WATER TRAN	301659231	02-07-2026	02-07-2026	WF	6M-PM INSPECTION	U41	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3142A	INDUSTRIAL WATER TANK	301757177	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3142R	INDUSTRIAL WATER TANK	301757173	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3145A	TION PRESSURE OF P-3145A	301757170	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3145B	TION PRESSURE OF P-3145A	301757176	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3145R	TION PRESSURE OF P-3145A	301757172	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161A	MF Filtrate Tank	301754149	08-05-2026	08-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161A	MF Filtrate Tank	301666338	10-03-2026	10-03-2026	WC	1 Y INSPECTION TEST PSV HEADER DISCHARGE	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161B	MF Filtrate Tank	301757050	08-05-2026	08-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161C	MF Filtrate Tank	301757040	08-05-2026	08-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161D	MF Filtrate Tank	301757043	09-05-2026	09-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161E	MF Filtrate Tank	301748910	09-05-2026	09-05-2026	WC	4KH-LUBRICATION	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161E	MF Filtrate Tank	301757067	09-05-2026	09-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3161R	MF Filtrate Tank	301757052	09-05-2026	09-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3162A	MF Filtrate Tank	301757068	02-05-2026	02-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3162R	MF Filtrate Tank	301757873	02-05-2026	02-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3163A	MF Filtrate Tank	301757065	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3163R	MF Filtrate Tank	301757879	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164A	RO SYSTEM	301760592	21-05-2026	21-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164A	RO SYSTEM	301666292	22-08-2026	22-08-2026	WC	1KH-LUBRICATION	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164B	RO SYSTEM	301760617	21-05-2026	21-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164C	RO SYSTEM	301761625	21-05-2026	21-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164C	RO SYSTEM	301661831	22-08-2026	22-08-2026	WC	1KH-LUBRICATION	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164D	RO SYSTEM	301757074	19-05-2026	19-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164E	RO SYSTEM	301761618	19-05-2026	19-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3164R	RO SYSTEM	301761658	19-05-2026	19-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165A1	Sea Water Train	301761619	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165A2	Sea Water Train	301761620	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165B1	Sea Water Train	301762262	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165B2	Sea Water Train	301761660	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165B2	Sea Water Train	301746787	17-03-2026	17-03-2026	WC	1KH-LUBRICATION	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165B2	Sea Water Train	301559958	03-09-2026	03-09-2026	WC	15KH-OVERHAUL	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165C1	Sea Water Train	301761621	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165C2	Sea Water Train	301761656	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165D1	Sea Water Train	301762285	20-06-2026	20-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165D2	Sea Water Train	301762279	20-06-2026	20-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165E1	Sea Water Train	301762282	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3165E2	Sea Water Train	301762275	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3166A	RO SYSTEM	301762284	11-06-2026	11-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3166R	RO SYSTEM	301764060	11-06-2026	11-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3167A	Backit Osmosis Unit	301764072	23-06-2026	23-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3167B	RO SYSTEM	301764069	18-06-2026	18-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3167C	RO SYSTEM	301764047	18-06-2026	18-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3167D	RO SYSTEM	301764070	24-06-2026	24-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3167E	RO SYSTEM	301764048	18-06-2026	18-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3168A	CIP circulation PumpA	301764052	19-06-2026	19-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3168B	RO SYSTEM	301764074	19-06-2026	19-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	anner grou	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Person.no.
1033	PM	A-P-3168C	RO SYSTEM	301764068	19-06-2026	19-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3170A	RO SYSTEM	301767217	25-06-2026	25-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3170B	RO SYSTEM	301767235	25-06-2026	25-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3170C	RO SYSTEM	301767227	26-06-2026	26-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3170D	RO SYSTEM	301767238	26-06-2026	26-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3170R	RO SYSTEM	301767237	25-06-2026	25-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3171A	RO SYSTEM	301769166	02-07-2026	02-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3171B	RO SYSTEM	301769168	02-07-2026	02-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3171R	RO SYSTEM	301769167	02-07-2026	02-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3172	RO SYSTEM	301769159	04-07-2026	04-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3173A	Electrical Group	301721704	11-07-2026	11-07-2026	WC	15KH-OVERHAUL	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-P-3173A	Electrical Group	600276246	24-10-2026	24-10-2026	WC	1Y-ANNUAL PERFORMANCE TEST FIRE PUMP	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3173B	Electrical Group	301773156	11-07-2026	11-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-P-3173B	Electrical Group	600375693	07-10-2026	07-10-2026	WC	1Y-ANNUAL PERFORMANCE TEST FIRE PUMP	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3173C	Electrical Group	301773149	11-07-2026	11-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3174A	RO SYSTEM	301773161	04-07-2026	04-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3174R	RO SYSTEM	301773167	04-07-2026	04-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3403A	COOLING TOWER	301688944	05-06-2026	05-06-2026	WF	3M-CHANGE LUBE OIL	U41	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3403B	COOLING TOWER	301757131	01-07-2026	01-07-2026	WF	3M-CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3403R	ACOOLING TOWER	301656152	02-07-2026	02-07-2026	WF	6M-CHANGE LUBE OIL	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3405A	COOLING TOWER	301746803	05-06-2026	05-06-2026	WF	3M-CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3405B	COOLING TOWER	301717244	01-07-2026	01-07-2026	WF	3M-CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3405R	ACOOLING TOWER	301696402	10-04-2026	10-04-2026	WC	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3415A	Cooling tower A	301696380	03-01-2026	03-01-2026	WC	6M REGREASE BEARING	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3415B	Cooling tower A	301639125	02-07-2026	02-07-2026	WF	1M REGREASE BEARING	U41	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3415R	Cooling tower A	301696381	03-01-2026	03-01-2026	WC	6M REGREASE BEARING	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3501A	DEGASIFIER	301739975	02-06-2026	09-06-2026	WF	6M- CHANGE LUBE OIL.	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3501R	DEGASIFIER	301717227	26-03-2026	26-03-2026	WC	6M- CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3502A	CARTRIDGE FILTER	301730409	01-04-2026	01-04-2026	WC	6M-CHANGE L/O<(>&<)>CK SHAFT COUPLING RU	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3502R	CARTRIDGE FILTER	301717226	26-03-2026	26-03-2026	WC	6M-CHANGE L/O&CK SHAFT COUPLING RUBBER.	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3503A	EMIN WATER STORAGE TAN	301757137	02-07-2026	02-07-2026	WF	6M-CHANGE LUBE OIL & INSPECTION.	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3503B	EMIN WATER STORAGE TAN	301652287	07-07-2026	15-07-2026	WF	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3503B.	U22	REL CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3503B	EMIN WATER STORAGE TAN	301745787	05-06-2026	05-06-2026	WF	6M-REGREASE&INSP FLEX.ELEMENT COUPLING	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3503R	EMIN WATER STORAGE TAN	301712926	12-03-2026	12-03-2026	WC	6M-CLEAN STRAINER & INSPECT	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3504A	NEUTRALIZATION PIT	301721664	01-04-2026	01-04-2026	WC	6M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	TECO CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3504A	NEUTRALIZATION PIT	301665071	14-01-2026	14-01-2026	WC	8M-BELT REPLACE , REGREASE & INSPEC	U22	CLSD CNF CSER MACM PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3504A	NEUTRALIZATION PIT	301548975	04-10-2026	07-10-2026	WC	4Y-OVERHAUL P-3504A	U41	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3504R	NEUTRALIZATION PIT	301622744	07-07-2026	15-07-2026	WF	4Y- OVERHAUL P-3504R.	U22	REL CNF CSER GMPS NMAT NTUP PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER GMPS NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3504R	NEUTRALIZATION PIT	301701088	27-05-2026	27-05-2026	WF	4M-BELT TENSION CHECK & INSPECTION	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3504R	NEUTRALIZATION PIT	301656904	27-03-2026	27-03-2026	WC	*8M-BELT REPLACE , REGREASE <(>&<)> INSP	U22	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3505A	EMIN WATER STORAGE TAN	301690248	26-03-2026	26-03-2026	WC	6M- CHANGE LUBE OIL.	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3505A	EMIN WATER STORAGE TAN	301576556	07-06-2026	09-06-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL PUMP.	U41	TECO CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3505R	EMIN WATER STORAGE TAN	301680396	12-03-2026	12-03-2026	WC	6M- CHANGE LUBE OIL.	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3505R	EMIN WATER STORAGE TAN	301478329	08-07-2026	08-07-2026	WF	4Y- MAJOR OVERHAUL PUMP.	U41	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3511A	DEGASSIFIER	301730412	21-04-2026	24-04-2026	WF	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3511A	DEGASSIFIER	301525416	31-05-2026	31-05-2026	WC	4Y-MAJOR OVERHAUL.	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3511R	DEGASSIFIER	301733802	21-04-2026	28-04-2026	WF	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3511R	DEGASSIFIER	301512164	26-03-2026	26-03-2026	WC	4Y-MAJOR OVERHAUL.	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3514A	NEUTRALIZATION PIT	301719871	24-03-2026	24-03-2026	WC	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3514A	NEUTRALIZATION PIT	300756537	21-01-2026	21-01-2026	WC	4Y-MAJOR OVERHAUL.	U41	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	C	U41MC-S	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3514R	NEUTRALIZATION PIT	301536991	10-03-2026	11-03-2026	WC	*4Y-MAJOR OVERHAUL.	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3514R	NEUTRALIZATION PIT	301721657	10-03-2026	11-03-2026	WC	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3515A	ACID STORAGE TANK	301733790	21-04-2026	28-04-2026	WF	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3515A	ACID STORAGE TANK	301525415	27-09-2026	29-09-2026	WC	4Y- OVERHAUL ,INSPECTION	U41	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-P-3515R	ACID STORAGE TANK	301745795	02-06-2026	04-06-2026	WF	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3519A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301646776	13-12-2026	13-12-2026	WC	1Y-CHANGE LUBE OIL	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3519A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301521847	03-05-2026	05-05-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3519A	U41	TECO CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3519R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301605957	07-07-2026	15-07-2026	WF	3Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3519R	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3519R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301646775	13-12-2026	13-12-2026	WC	1Y-CHANGE LUBE OIL	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3520A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301646780	13-12-2026	13-12-2026	WC	1Y-CHANGE LUBE OIL	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3520A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301521852	31-05-2026	31-05-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3520A	U41	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC
1033

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	anner grou	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Main WorkCtr
1033	PM	A-P-3521R	emin & Demin Water Supply	301558763	16-05-2026	18-05-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3521R	U41	TECO CNF PRT CSER GMPS NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF PRT CSER GMPS NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3522A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301656889	23-01-2026	23-01-2026	WC	*1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3522R	XED BED EXCHANGERS (CPP	301656883	23-01-2026	23-01-2026	WC	*1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3523A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301656900	23-01-2026	23-01-2026	WC	*1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3523A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301523514	19-03-2026	19-03-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3523A	U41	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC	C	U41MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3523R	XED BED EXCHANGERS (CPP	301656874	23-01-2026	23-01-2026	WC	1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3523R	XED BED EXCHANGERS (CPP	301413378	18-04-2026	19-04-2026	WC	3Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3523R	U41	TECO CNF PRT CSER GMPS NTUP PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF PRT CSER GMPS NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3524A	TED CONDENSATE WATER TA	301656890	23-01-2026	23-01-2026	WC	*1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3524A	TED CONDENSATE WATER TA	301525419	28-03-2026	30-03-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3524A	U41	TECO CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3524R	TED CONDENSATE WATER TA	301656875	23-01-2026	23-01-2026	WC	*1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3524R	TED CONDENSATE WATER TA	301416238	12-05-2026	13-05-2026	WC	3Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3524R	U41	TECO CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3525A	CONDENSATE RETURN TANK	301656892	23-01-2026	23-01-2026	WC	1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3525A	CONDENSATE RETURN TANK	301525417	20-05-2026	21-05-2026	WC	4Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3525A	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3525R	CONDENSATE RETURN TANK	301656879	23-01-2026	23-01-2026	WC	*1Y-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3525R	CONDENSATE RETURN TANK	301395908	18-08-2026	19-08-2026	WC	3Y- MAJOR OVERHAUL FOR P-3525R	U41	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3537A	emin & Demin Water Supply	301701091	27-05-2026	27-05-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3537B	emin & Demin Water Supply	301701095	27-05-2026	27-05-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3537R	emin & Demin Water Supply	301701092	27-05-2026	27-05-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3538A	emin & Demin Water Supply	301701097	27-05-2026	27-05-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3538R	emin & Demin Water Supply	301701093	27-05-2026	27-05-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3539A	TA FLOW METER OF B-3521A	301717253	25-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3539R	TA FLOW METER OF B-3521A	301717257	25-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3579A	emin & Demin Water Supply	301717255	25-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3579R	emin & Demin Water Supply	301717258	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3580A	HARGE PRESSURE OF P-3580	301757169	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Re-Grease	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3580B	HARGE PRESSURE OF P-3580	301757175	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Re-Grease	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3581A	HARGE PRESSURE OF P-3580	301757168	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Re-Grease	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3581R	HARGE PRESSURE OF P-3580	301757174	30-06-2026	30-06-2026	WF	6M Re-Grease	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3583A	LOW METER OF B-3522A/R F	301717256	25-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3583R	LOW METER OF B-3522A/R F	301717254	25-06-2026	30-06-2026	WF	6M Change Lube Oil	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3601A	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301702370	11-06-2026	11-06-2026	WF	6M- CHANGE LUBE OIL (TRIBOL)	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3601B	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301713914	01-07-2026	01-07-2026	WF	6M- CHANGE LUBE OIL (TRIBOL)	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3601R	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301667947	10-03-2026	11-03-2026	WC	6M- CHANGE LUBE OIL (TRIBOL)	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3601R	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301356599	02-05-2026	17-05-2026	WF	6Y-MAJOR OVERHAUL.	U22	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3602A	COVERY STEAM GENERATOR	301667950	27-01-2026	27-01-2026	WC	6M- CHANGE LUBE OIL.	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3602B	COVERY STEAM GENERATOR	301671581	03-02-2026	13-02-2026	WC	6M- CHANGE LUBE OIL.	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3603A	COVERY STEAM GENERATOR	301552184	04-12-2026	04-12-2026	WC	1Y- REGREASE GEAR COUPLNG	U41	TECO CNF PRT GMPS NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	TECO CNF PRT GMPS NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-3603R	COVERY STEAM GENERATOR	301688933	04-09-2026	04-09-2026	WF	1Y- REGREASE GEAR COUPLNG	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3604A	COVERY STEAM GENERATOR	301712958	12-06-2026	12-06-2026	WF	6M- CHANGE LUBE OIL	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3604R	COVERY STEAM GENERATOR	301687661	26-02-2026	26-02-2026	WC	6M- CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3605A	WASTE HEAT STEAM BOILER	301603661	27-02-2026	27-02-2026	WC	2Y-REGREASE GEAR COUPLING	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3605R	WASTE HEAT STEAM BOILER	301617986	25-02-2026	25-02-2026	WC	2Y-REGREASE GEAR COUPLING	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3606A	WASTE HEAT STEAM BOILER	301617987	25-02-2026	25-02-2026	WC	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3606R	WASTE HEAT STEAM BOILER	301617988	25-02-2026	25-02-2026	WC	6M-CHANGE LUBE OIL	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3606R	WASTE HEAT STEAM BOILER	300853699	08-07-2026	12-07-2026	WC	6Y-MAJOR OVERHAUL. Move to 2022	U22	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS NTUP PPRT PRC SETC
1033	PM	A-P-3628A	EPS-HRSG NO.1	301664295	05-02-2026	05-02-2026	WF	1Y-CHANGE LUBE OIL	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3902A	M TURBINE GENERATOR STG	301664988	09-01-2026	09-01-2026	WC	1Y- REGREASE SERVICE	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3902B	M TURBINE GENERATOR STG	301664989	22-01-2026	22-01-2026	WC	1Y- REGREASE SERVICE	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-3902R	M TURBINE GENERATOR STG	301664990	09-01-2026	09-01-2026	WC	1Y- REGREASE SERVICE	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	B	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-P-6302	COOLING TOWER	301688950	01-07-2026	01-07-2026	WF	4M-CLEANSUCTION STRAINER	U41	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U41MC-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-6303	COOLING TOWER	301688951	01-07-2026	01-07-2026	WF	4M-CLEANSUCTION STRAINER	U41	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	S	U41MC-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-P-6304	COOLING TOWER	301688953	01-07-2026	01-07-2026	WF	4M-CLEANSUCTION STRAINER	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	S	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PD-3173B	Electrical Group	301773168	11-07-2026	11-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PD-3201B	FIRE WATER PUMP	301754142	27-05-2026	27-05-2026	WF	3M-CLEAN SUCTION STR AND TEST RUN ENGINE	U22	REL CNF CSER NMAT PRC SETC	S	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PD-3201B	FIRE WATER PUMP	301694597	06-03-2026	06-03-2026	WC	*1Y- INSPECTION FOR DIESEL ENGINE.	U22	CLSD CNF CSER NMAT NTUP PRC SETC	S	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PD-3201C	FIRE WATER PUMP	301754141	27-05-2026	27-05-2026	WF	3M-CLEAN SUCTION STR AND TEST RUN ENGINE	U22	REL CNF CSER NMAT NTUP PRC SETC	S	U22MC-S	REL CNF CSER NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PD-3201C	FIRE WATER PUMP	301664995	06-03-2026	06-03-2026	WC	1Y- INSPECTION FOR DIESEL ENGINE.	U22	CLSD CNF PRT CSER MACM PRC SETC	S	U22MC-S	CLSD CNF PRT CSER MACM PRC SETC
1033	PM	A-PDM-3201B	FIRE WATER PUMP	301646778	04-12-2026	04-12-2026	WC	1Y INSPECTION AND TEST	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	S	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PDM-3201C	FIRE WATER PUMP	301646784	06-12-2026	06-12-2026	WC	1Y INSPECTION AND TEST	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	S	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3102A	SLUDGE PUMP	301712955	17-06-2026	17-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3102R	SLUDGE PUMP	301612912	27-05-2026	27-05-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3103A	EIVED WATER RECYCLING PL	301649181	28-09-2026	28-09-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3103R	EIVED WATER RECYCLING PL	301688975	20-03-2026	20-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3104A	FILTERED WATER TANK	301688974	07-03-2026	07-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3104R	FILTERED WATER TANK	301671587	20-02-2026	20-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3105A	FILTERED WATER TANK	301643812	06-10-2026	06-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	anner grou	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Main WorkCtr
1033	PM	A-PM-3105B	FILTERED WATER TANK	301693916	10-03-2026	10-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3105R	FILTERED WATER TANK	301702374	29-05-2026	29-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3106A	FILTERED WATER TANK	301576550	01-12-2026	01-12-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3106R	FILTERED WATER TANK	301711281	20-03-2026	20-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3107A	ERM TREATED WATER TRAN	301643785	20-02-2026	20-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3107R	ERM TREATED WATER TRAN	301703588	09-05-2026	09-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3108A	COAGULANT PUMP	301703562	09-05-2026	09-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3108R	COAGULANT PUMP	301656150	24-11-2026	24-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3109A	POLYELECTROLYTE PUMP(1)	301649197	27-10-2026	27-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3109R	POLYELECTROLYTE PUMP(1)	301703570	22-05-2026	22-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3110A	POLYELECTROLYTE PUMP(2)	301649193	02-11-2026	02-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3111A	CAUSTIC SODA PUMP	301649196	07-11-2026	07-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3111R	CAUSTIC SODA PUMP	301656148	16-11-2026	16-11-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3112A	HYDRORIPPLE CLARIFIER	301728356	22-01-2026	22-01-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3112R	HYDRORIPPLE CLARIFIER	301721694	20-06-2026	20-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3113A	HYDRORIPPLE CLARIFIER	301733259	17-02-2026	17-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3113R	HYDRORIPPLE CLARIFIER	301643780	13-10-2026	13-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3114A	HYDRORIPPLE CLARIFIER	301636321	01-07-2026	01-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3114R	HYDRORIPPLE CLARIFIER	301643813	13-10-2026	13-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3120A	KED BED EXCHANGERS (DEM	301705581	11-06-2026	11-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3120R	KED BED EXCHANGERS (DEM	301703589	29-05-2026	29-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3125A	aw Treat & Supply Of Treat W	301693948	09-04-2026	09-04-2026	WC	\1Y-PM INSPECTION	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3125B	aw Treat & Supply Of Treat W	301693947	09-04-2026	09-04-2026	WC	\1Y-PM INSPECTION	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3140A	EIVED WATER RECYCLING PL	301585014	10-10-2026	10-10-2026	WC	*1Y-PM INSPECTION	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-PM-3142A	INDUSTRIAL WATER TANK	600404006	20-03-2026	20-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-PM-3142R	INDUSTRIAL WATER TANK	600386800	05-10-2026	05-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161A	MF Filtrate Tank	301754116	08-05-2026	08-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161A	MF Filtrate Tank	301679258	15-08-2026	15-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161B	MF Filtrate Tank	301757038	08-05-2026	08-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161B	MF Filtrate Tank	301679259	15-08-2026	15-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161C	MF Filtrate Tank	301757046	08-05-2026	08-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161C	MF Filtrate Tank	301679260	15-08-2026	15-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161D	MF Filtrate Tank	301757070	09-05-2026	09-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161D	MF Filtrate Tank	301679261	15-08-2026	15-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161E	MF Filtrate Tank	301757069	09-05-2026	09-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161E	MF Filtrate Tank	301679262	15-08-2026	15-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161E	MF Filtrate Tank	301625098	14-05-2026	14-05-2026	WC	15KH-OVERHAUL	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161R	MF Filtrate Tank	301757048	09-05-2026	09-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3161R	MF Filtrate Tank	301679263	15-08-2026	15-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3162A	MF Filtrate Tank	301757066	02-05-2026	02-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3162A	MF Filtrate Tank	301650632	13-08-2026	13-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3162R	MF Filtrate Tank	301757060	02-05-2026	02-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3162R	MF Filtrate Tank	301650664	13-08-2026	13-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3163A	MF CIP Circulation P Motor	301757042	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3163A	MF CIP Circulation P Motor	301650660	13-08-2026	13-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3163R	MF CIP Circulation P Motor	301757045	06-05-2026	06-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3163R	MF CIP Circulation P Motor	301650644	13-08-2026	13-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164A	RO SYSTEM	301760591	21-05-2026	21-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164A	RO SYSTEM	301587582	22-08-2026	22-08-2026	WC	15KH-OVERHAUL	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164A	RO SYSTEM	301652264	22-08-2026	22-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164B	RO SYSTEM	301760615	21-05-2026	21-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164B	RO SYSTEM	301652273	22-08-2026	22-08-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164C	RO SYSTEM	301761668	21-05-2026	21-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164C	RO SYSTEM	301587576	22-08-2026	22-08-2026	WC	15KH-OVERHAUL	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164D	RO SYSTEM	301761667	19-05-2026	19-05-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3164D	RO SYSTEM	301652280	21-08-2026	21-08-2026

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	OrderType	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	Planner gro	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	
1033	PM	A-PM-3165B2	WRO High Pressure MotorB-	301761657	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165B2	WRO High Pressure MotorB-	301605995	03-09-2026	03-09-2026	WC	15KH-OVERHAUL - Refer to MO: 301659143	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165B2	WRO High Pressure MotorB-	301659143	03-09-2026	03-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165C1	WRO High Pressure MotorC-	301761615	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165C1	WRO High Pressure MotorC-	301659150	05-09-2026	05-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165C2	WRO High Pressure MotorC-	301761616	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165C2	WRO High Pressure MotorC-	301659138	05-09-2026	05-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165D1	WRO High Pressure MotorD-	301762265	20-06-2026	20-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165D1	WRO High Pressure MotorD-	301692549	09-09-2026	09-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165D2	WRO High Pressure P MotorD	301762280	20-06-2026	20-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165D2	WRO High Pressure P MotorD	301692550	09-09-2026	09-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165E1	WRO High Pressure MotorE-	301762281	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165E1	WRO High Pressure MotorE-	301659147	04-09-2026	04-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165E2	WRO High Pressure MotorE-	301762286	06-06-2026	06-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165E2	WRO High Pressure MotorE-	301659121	04-09-2026	04-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3165E2	WRO High Pressure MotorE-	301578359	11-03-2026	11-03-2026	WC	3M-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3166A	Flusing Pump MotorA	301762278	11-06-2026	11-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3166A	Flusing Pump MotorA	301661804	10-09-2026	10-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3166R	Flusing Pump MotorR	301764064	11-06-2026	11-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3166R	Flusing Pump MotorR	301661834	10-09-2026	10-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167A	WRO High Pressure P Motor	301764053	23-06-2026	23-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167A	WRO High Pressure P Motor	301692542	12-09-2026	12-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167B	RO SYSTEM	301764045	18-06-2026	18-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167B	RO SYSTEM	301692543	13-09-2026	13-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167C	RO SYSTEM	301764073	18-06-2026	18-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167C	RO SYSTEM	301692544	16-09-2026	16-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167D	RO SYSTEM	301764054	24-06-2026	24-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167D	RO SYSTEM	301692545	17-09-2026	17-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167E	RO SYSTEM	301764065	18-06-2026	18-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167E	RO SYSTEM	301692546	18-09-2026	18-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167E	RO SYSTEM	301622725	11-06-2026	11-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3167E	RO SYSTEM	301581555	14-03-2026	14-03-2026	WC	3M-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3168A	JP circulation PumpA Motor	301764067	19-06-2026	19-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3168A	JP circulation PumpA Motor	301692560	10-09-2026	10-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3168B	JP circulation PumpB Motor	301764066	19-06-2026	19-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3168B	JP circulation PumpB Motor	301665847	10-09-2026	10-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3168C	JP circulation PumpC Motor	301764057	19-06-2026	19-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3168C	JP circulation PumpC Motor	301665848	10-09-2026	10-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170A	Brine Pump MotorA	301767220	25-06-2026	25-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170A	Brine Pump MotorA	301666305	19-09-2026	19-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170B	Brine Pump MotorB	301767231	25-06-2026	25-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170B	Brine Pump MotorB	301666306	23-09-2026	23-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170C	Brine Pump MotorC	301767234	26-06-2026	26-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170C	Brine Pump MotorC	301666256	23-09-2026	23-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170D	Brine Pump MotorD	301767228	26-06-2026	26-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170D	Brine Pump MotorD	301666289	19-09-2026	19-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170R	Brine Pump MotorR	301767236	25-06-2026	25-06-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3170R	Brine Pump MotorR	301666298	19-09-2026	19-09-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3171A	RO SYSTEM	301770071	02-07-2026	02-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3171A	RO SYSTEM	301671535	01-10-2026	01-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3171B	RO SYSTEM	301770070	02-07-2026	02-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3171B	RO SYSTEM	301671532	01-10-2026	01-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3171R	RO SYSTEM	301770067	02-07-2026	02-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3171R	RO SYSTEM	301671530	01-10-2026	01-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3172	RO SYSTEM	301773166	04-07-2026	04-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3172	RO SYSTEM	301671540	03-10-2026	03-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	A	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3173A	Electrical Group	301773148	11-07-2026	11-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3173A	Electrical Group	301679204	07-10-2026	07-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3173C	Electrical Group	301773162	11-07-2026	11-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3173C	Electrical Group	301679196	07-10-2026	07-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	S	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3174A	Service pump motor	301773165	04-07-2026	04-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3174A	Service pump motor	301679181	04-10-2026	04-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3174R	Service pump motor	301773163	04-07-2026	04-07-2026	WC	3M-INSPECT	U44	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3174R	Service pump motor	301679199	04-10-2026	04-10-2026	WC	1Y-INSPECT	U44	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U44SW-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3201A	FIRE WATER PUMP	301661887	05-12-2026	05-12-2026	WC	1Y-1Y MV MOTOR INSPECTION. 12Hr	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	S	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3201A	FIRE WATER PUMP	301527333	12-02-2026	12-02-2026	WC	3Y- INSPECTION FOR MV MOTOR.	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	OrderType	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	Planner gro	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	
1033	PM	A-PM-3403A	COOLING TOWER	301652314	01-12-2026	01-12-2026	WC	1Y-INSPECTION HIGH VOLTAGE MOTOR 2HRS	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3403A	COOLING TOWER	301402034	20-07-2026	24-07-2026	WC	6Y-OVERHAUL MOTOR	U43	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3404	COOLING TOWER	301701070	29-05-2026	29-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3405A	COOLING TOWER	301709443	19-06-2026	19-06-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3405A	COOLING TOWER	301636310	20-07-2026	24-07-2026	WC	6Y-OVERHAUL MOTOR	U43	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3405A	COOLING TOWER	301619081	17-06-2026	17-06-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3405B	COOLING TOWER	301665869	23-01-2026	23-01-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3405R	ACOOLING TOWER	301709455	17-06-2026	17-06-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3415A	Cooling tower A	301703574	05-03-2026	05-03-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3415A	Cooling tower A	301451626	15-08-2026	20-08-2026	WC	6Y-OVERHAUL MOTOR	U43	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3415B	Cooling tower B	301711275	07-07-2026	07-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3415B	Cooling tower B	301517979	16-06-2026	20-06-2026	WC	6Y-OVERHAUL MOTOR	U43	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PPRT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3415B	Cooling tower B	301620584	12-06-2026	12-06-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR*	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3415R	Cooling tower R	301711279	08-07-2026	08-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3416A	Cooling tower A	301703563	05-03-2026	05-03-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3416R	Cooling tower A	301713912	08-07-2026	08-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3501A	DEGASIFIER	301643781	28-09-2026	28-09-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3501R	DEGASIFIER	301703571	23-05-2026	23-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3502A	CARTRIDGE FILTER	301649194	16-11-2026	16-11-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3502A	CARTRIDGE FILTER	301548996	25-01-2026	25-01-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3502R	CARTRIDGE FILTER	301703591	23-05-2026	23-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3502R	CARTRIDGE FILTER	301618005	28-05-2026	28-05-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3503B	EMIN WATER STORAGE TAN	301643802	23-10-2026	23-10-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3503B	EMIN WATER STORAGE TAN	301402007	01-07-2026	05-07-2026	WC	6Y-OVERHAUL MOTOR	U43	CLSD CNF GMPS NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF GMPS NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3503R	EMIN WATER STORAGE TAN	301693920	09-04-2026	09-04-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3504A	NEUTRALIZATION PIT	301646788	23-10-2026	23-10-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3504R	NEUTRALIZATION PIT	301638909	23-07-2026	23-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3505A	EMIN WATER STORAGE TAN	301690245	10-03-2026	10-03-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3505R	EMIN WATER STORAGE TAN	301701058	29-05-2026	29-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3511A	DEGASSIFIER	301701064	29-05-2026	29-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3511R	DEGASSIFIER	301703575	17-06-2026	17-06-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3514A	NEUTRALIZATION PIT	301649182	27-10-2026	27-10-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3514R	NEUTRALIZATION PIT	301643821	05-10-2026	05-10-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3515A	ACID STORAGE TANK	301548988	19-01-2026	19-01-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3515R	ACID STORAGE TANK	301703572	23-05-2026	23-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3519A	XED BED EXCHANGERS (DEM	301734882	20-03-2026	20-03-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3519R	XED BED EXCHANGERS (DEM	301705876	22-05-2026	22-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3520A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301705920	11-06-2026	11-06-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3520R	XED BED EXCHANGERS (CPP	301705654	29-05-2026	29-05-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3521A	Demin & Demin Water Suppl	301629902	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3521R	Demin & Demin Water Suppl	301646774	01-12-2026	01-12-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3522A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301636323	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3522R	XED BED EXCHANGERS (CPP	301636319	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3523A	XED BED EXCHANGERS (CPP	301636327	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3523R	XED BED EXCHANGERS (CPP	301637214	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3524A	TED CONDENSATE WATER TA	301637205	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3524A	TED CONDENSATE WATER TA	301333385	25-03-2026	29-03-2026	WC	6Y-OVERHAUL MOTOR	U43	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3524R	TED CONDENSATE WATER TA	301637215	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3525A	CONDENSATE RETURN TANK	301728615	03-04-2026	03-04-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3525R	CONDENSATE RETURN TANK	301637208	01-07-2026	01-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3530	NEUTRALIZATION PIT	301637212	08-07-2026	08-07-2026	WF	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3579A	Demin & Demin Water Suppl	301757881	28-05-2026	28-05-2026	WC	3M-MOTOR REGREASE	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-PM-3579A	Demin & Demin Water Suppl	600410515	09-04-2026	09-04-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3583A	LOW METER OF B-3522A/R F	301757882	28-05-2026	28-05-2026	WC	3M-MOTOR REGREASE	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-PM-3583A	LOW METER OF B-3522A/R F	600410513	03-04-2026	03-04-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3583R	LOW METER OF B-3522A/R F	301757880	28-05-2026	28-05-2026	WC	3M-MOTOR REGREASE	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	IM	A-PM-3583R	LOW METER OF B-3522A/R F	600410512	23-04-2026	23-04-2026	WC	1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3601R	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301643824	13-10-2026	13-10-2026	WC	1Y- INSPECTION FOR MV MOTOR. 12Hr	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3601R	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301649198	13-10-2026	13-10-2026	WC	3Y- INSPECTION FOR MV MOTOR.	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3602R	COVERY STEAM GENERATOR	301639936

เครื่องจักรที่มีเสียงดัง

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	User status	MaintItem text	lanner grou	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Functional Loc.
1033	PM	A-PM-3606A	WASTE HEAT STEAM BOILER	301701075	11-06-2026	11-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3606R	WASTE HEAT STEAM BOILER	301705583	09-06-2026	09-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3606R	WASTE HEAT STEAM BOILER	301629858	05-07-2026	12-07-2026	WC	6Y-OVERHAUL MOTOR	U43	TECO CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3626A	Boiler Feed Water Motor A	301754122	22-05-2026	22-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3626A	Boiler Feed Water Motor A	301694606	25-02-2026	25-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION MV. MOTOR 1 Hr.	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3626B	Boiler Feed Water Motor B	301754123	22-05-2026	22-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3626B	Boiler Feed Water Motor B	301700377	27-02-2026	27-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION MV. MOTOR 1 Hr.	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3626R	Boiler Feed Water Motor R	301754124	22-05-2026	22-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3626R	Boiler Feed Water Motor R	301694618	24-02-2026	24-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION MV. MOTOR 1 Hr.	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3628R	EPS-HRSG NO.1	301754125	22-05-2026	22-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3628R	EPS-HRSG NO.1	301637216	03-07-2026	03-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3629R	EPS-HRSG NO.2	301754126	20-05-2026	20-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3629R	EPS-HRSG NO.2	301638967	17-07-2026	17-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3630R	EPS-HRSG NO.3	301754127	20-05-2026	20-05-2026	WC	3M REGREASE BEARING	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3630R	EPS-HRSG NO.3	301638915	17-07-2026	17-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3801	AMMONIA STORAGE TANK	301638918	17-07-2026	17-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3808A	EPS-HRSG NO.1	301638910	13-10-2026	13-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3808R	EPS-HRSG NO.1	301701084	26-02-2026	26-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3809A	EPS-HRSG NO.2	301701072	28-02-2026	28-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3809R	EPS-HRSG NO.2	301701065	26-02-2026	26-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3810A	EPS-HRSG NO.3	301701074	12-03-2026	12-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3810R	EPS-HRSG NO.3	301701060	26-02-2026	26-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-3901A	POWER GENERATOR Unit D	301637218	03-07-2026	03-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	A-PM-3901R	POWER GENERATOR Unit D	301700381	17-06-2026	17-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-5656A	WATER COLLECTING BASIN (	301702371	27-05-2026	27-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-5656R	WATER COLLECTING BASIN (	301701069	27-05-2026	27-05-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-6302	COOLING TOWER	301694608	01-04-2026	01-04-2026	WC	\1Y-INSPECTIOM LV MOTOR 2 hrs.	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-6303	COOLING TOWER	301694607	01-04-2026	01-04-2026	WC	\1Y-INSPECTIOM LV MOTOR 2 hrs.	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-6304	COOLING TOWER	301694619	01-04-2026	01-04-2026	WC	\1Y-INSPECTIOM LV MOTOR 2 hrs.	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PM-6411	OTOR FOR SUBMERSIBLE PUI	301656895	12-01-2026	12-01-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PN-3503A	EMIN WATER STORAGE TAN	301608833	25-09-2026	25-09-2026	WC	1Y- OVER SPEED TT CHG L/O <(>&<)> CLN L/	U41	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC	B	U41MC-S	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-PN-3601A	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301620577	03-03-2026	03-03-2026	WC	1Y- OVER SPEED TT CHG L/O & CLN L/O FTR	U22	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-PN-3601B	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301666327	14-03-2026	14-03-2026	WC	1Y- OVER SPEED TT CHG L/O & CLN L/O FTR	U22	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-PN-3602A	OVERY STEAM GENERATOR	301599352	16-02-2026	16-02-2026	WC	1Y- OVER SPEED TT CHG L/O & CLN L/O FTR	U22	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-PN-3602B	OVERY STEAM GENERATOR	301661889	03-02-2026	16-02-2026	WC	1Y- OVER SPEED TT CHG L/O & CLN L/O FTR	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	A	U22MC-S	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PN-3628A	EPS-HRSG NO.1	301711251	08-05-2026	30-05-2026	WF	6M LUBE OIL SAMPLING	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PN-3629A	EPS-HRSG NO.2	301665264	13-05-2026	13-05-2026	WF	*1Y-OVER SPEED TT CHG L/O <(>&<)> CLN L/	U41	REL CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC	A	U41MC-S	REL CNF PRT CSER GMPS MACM PRC SETC
1033	PM	A-PN-3629A	EPS-HRSG NO.2	301711252	08-05-2026	30-05-2026	WF	6M LUBE OIL SAMPLING	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-PN-3630A	EPS-HRSG NO.3	301581568	05-06-2026	05-06-2026	WF	1Y-OVER SPEED TT CHG L/O <(>&<)> CLN L/O	U41	REL CNF PRT CSER GMPS MACM NTUP PRC *	A	U41MC-S	REL CNF PRT CSER GMPS MACM NTUP PRC *
1033	PM	A-PN-3630A	EPS-HRSG NO.3	301711253	08-05-2026	30-05-2026	WF	6M LUBE OIL SAMPLING	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	-PNPM-01R-3503	EMIN WATER STORAGE TAN	301709458	09-06-2026	09-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	-PNPM-01R-3601	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301719503	20-01-2026	20-01-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	-PNPM-01R-3601	TE HEAT STEAM BOILER (WH	301713901	17-01-2026	17-01-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	-PNPM-01R-3602	OVERY STEAM GENERATOR	301693927	23-04-2026	23-04-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC
1033	PM	-PNPM-01R-3602	OVERY STEAM GENERATOR	301719504	21-01-2026	21-01-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UP-3416A	Cooling tower A	301680395	07-02-2026	07-02-2026	WF	6M-CHANGE L/O & CLEAN STRAINER	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UP-3417A	Cooling tower A	301625126	11-02-2026	11-02-2026	WF	6M-CHANGE L/O	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UP-3418A	Cooling tower A	301636354	11-03-2026	11-03-2026	WF	6M-CHANGE L/O <(>&<)> CLEAN STRAINER	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UP-3418R	Cooling tower A	301702364	23-05-2026	23-05-2026	WF	6M-CHANGE L/O & CLEAN STRAINER	U41	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U41MC-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3410A	COOLING TOWER	301643797	14-10-2026	14-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3410R	ACOOLING TOWER	301643810	14-10-2026	14-10-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3411A	COOLING TOWER	301733262	10-02-2026	10-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3411R	ACOOLING TOWER	301705657	09-06-2026	09-06-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3412A	COOLING TOWER	301733263	10-02-2026	10-02-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	TECO CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3412R	ACOOLING TOWER	301687667	10-03-2026	10-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3416A	Cooling tower A	301701061	12-03-2026	12-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3416R	Cooling tower A	301701078	06-03-2026	06-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3417A	Cooling tower A	301701059	12-03-2026	12-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3417R	Cooling tower A	301701062	06-03-2026	06-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3418A	Cooling tower A	301701085	12-03-2026	12-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UPM-3418R	Cooling tower A	301701087	06-03-2026	06-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UTAM-3416	Cooling tower A	301713903	03-07-2026	03-07-2026	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	REL CNF NMAT PRC SETC
1033	PM	A-UTAM-3418	Cooling tower A	301701077	12-03-2026	12-03-2026	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	CLSD CNF NMAT PRC SETC

ระบบ Cooling Tower

MaintPlan	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	Location	User status	MaintItem text	Planner group	System status	ABC indic.	Main Work	Functional Loc.
1033	PM	A-34-AT-7021	Cooling tower A	301745797	20-06-2026	20-06-2026	3410	WC	1M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF GMPS MACM PPRT PRC SE	B	U42IC-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-AT-7022	Cooling tower A	301743682	13-06-2026	13-06-2026	3410	WC	3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-FIT-041	COOLING TOWER	301629948	29-10-2026	29-10-2026	3410	WC	1Y-Flow Calibration #KEEP (Waiting PO)	U42	CLSD CNF GMPS NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A34_Q3403A
1033	PM	A-34-LIT-282A	COOLING TOWER	301711278	06-06-2026	06-06-2026	3410	WC	4M INSPECTION <(>&<)> FLASMING SAMPLING	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U42IC-S	A34_Q3403A
1033	PM	A-34-LIT-282B	COOLING TOWER	301711293	06-06-2026	06-06-2026	3410	WC	4M INSPECTION <(>&<)> FLASMING SAMPLING	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U42IC-S	A34_Q3403B
1033	PM	A-34-LIT-282C	ACOOLING TOWER	301711282	06-06-2026	06-06-2026	3410	WC	4M INSPECTION <(>&<)> FLASMING SAMPLING	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	S	U42IC-S	A34_Q3403C
1033	PM	A-34-LT-2021A	Cooling tower A	301650687	13-06-2026	13-06-2026	3410	WC	3Y-INSPECTION <(>&<)> CALIBRATE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A34_Q3405A
1033	IM	A-34-LT-2021B	Cooling tower A	301770074	18-07-2026	18-07-2026	3410	WF	3Y-INSPECTION <(>&<)> CALIBRATE	U42	REL CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8021A	Cooling tower A	301739369	30-05-2026	30-05-2026	3410	WC	2Y-MOV INSPECTION	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8021A	Cooling tower A	301603698	15-08-2026	20-08-2026	3410	WC	1Y- INSPECTION	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8021B	Cooling tower A	301740050	04-08-2026	04-08-2026	3410	REDY	2Y-MOV INSPECTION	U43	CRTD MANC NMAT PRC	C	U43EE-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8021B	Cooling tower A	301603699	19-08-2026	19-08-2026	3410	WC	1Y- INSPECTION	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8021R	Cooling tower A	301603700	19-08-2026	19-08-2026	3410	WC	1Y- INSPECTION	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	C	U43EE-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8022A	Cooling tower A	301740051	04-08-2026	04-08-2026	3410	REDY	2Y-MOV INSPECTION	U43	REL NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8022A	Cooling tower A	301603701	19-08-2026	19-08-2026	3410	WC	1Y- INSPECTION	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-34-XVM-8022B	Cooling tower B	301603702	19-08-2026	19-08-2026	3410	WC	1Y- INSPECTION	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	A34_Q3405B
1033	PM	A-34-XVM-8022R	Cooling tower R	301603703	19-08-2026	19-08-2026	3410	WC	1Y- INSPECTION	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	A34_Q3405R
1033	PM	A-Q-3403A	COOLING TOWER	301705550	15-02-2026	15-03-2026	3410	WC	1Y CHANGE L/O & BLADE INSPECTION	U22	CLSD CNF PRT CSER GMPS MACM PR	B	U22MC-S	A34_Q3403A
1033	PM	A-Q-3403A	COOLING TOWER	600309030	01-07-2026	17-07-2026	3410	WC	3Y INSPECT PLATFORM	U41	CLSD CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U41MC-S	A34_Q3403A
1033	PM	A-Q-3403A	COOLING TOWER	301412508	04-06-2026	28-06-2026	3410	WC	1Y CHANGE L/O & BLADE INSPECTION	U41	CLSD CNF PRT GMPS MACM PRC SET	B	U41MC-S	A34_Q3403A
1033	PM	A-Q-3403C	ACOOLING TOWER	301703521	18-03-2026	18-03-2026	3410	WC	1Y CHANGE L/O <(>&<)> BLADE INSPECTION	U22	CLSD CNF CSER GMPS MACM PRC SE	B	U22MC-S	A34_Q3403C
1033	PM	A-QM-3403A	COOLING TOWER	301690230	27-03-2026	27-03-2026	3410	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	A34_Q3403A
1033	PM	A-QM-3403B	COOLING TOWER	301603743	04-09-2026	04-09-2026	3410	WF	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	REL CNF NMAT NTUP PRC SETC	B	U43EE-S	A34_Q3403B
1033	PM	A-QM-3403C	ACOOLING TOWER	301656897	11-01-2026	11-01-2026	3410	WC	\1Y-INSPECTION SWGR,MCC AND MOTOR	U43	CLSD CNF NMAT PRC SETC	B	U43EE-S	A34_Q3403C
1033	PM	A-S-3405A	Cooling tower A	301625088	12-09-2026	12-09-2026	3410	WC	1Y-INSPECTION & TOP UP SAND	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	A34_Q3405A
1033	PM	A-S-3405R	Cooling tower A	301754202	01-08-23	01-10-2026	3410	WC	1Y-INSPECTION & TOP UP SAND	U22	CLSD CNF CSER NMAT PRC SETC	C	U22MC-S	A34_Q3405A

ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

MaintPlant	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	Location	User status	MaintItem text	Planner group	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Functional Loc.
1033	PM	A-37-AIT-1001	EPS3-Boiler unit 3711	301422735	12-07-26	12-07-26	3700	WF	1M-CALIBRATION & INSPECTION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3706
1033	PM	A-37-AIT-1001	EPS-HRSG NO.3	301366140	26-01-26	26-01-26	3700	WF	1Y Replace permapure dryer	U45	REL CNF GMPS MACM PPRT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3706
1033	PM	A-37-AIT-1001	Auxiliary Boiler No. 1	301404393	10-01-26	11-01-26	3700	WF	1Y-THIRD PARTY RATA TEST	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U45QM-S	A37_H3706
1033	PM	A-37-AIT-1001	EPS-HRSG NO.1	301404382	11-01-26	12-01-26	3700	WF	1Y- CD TEST	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U45QM-S	A37_H3706
1033	PM	A-37-AIT-2001	EPS-HRSG NO.1	301404383	12-01-26	13-01-26	3700	WF	1M-CALIBRATION & INSPECTION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-2001	EPS-HRSG NO.2	301408120	25-01-26	25-01-26	3700	WF	1Y Replace permapure dryer	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-2001	EPS-HRSG NO.2	301408125	25-01-26	25-01-26	3700	WC	*1Y-THIRD PARTY RATA TEST	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	IM	A-37-AIT-2001	EPS-HRSG NO.1	301408109	24-01-26	24-01-26	3700	WF	*1Y- CD TEST	U45	REL CNF MACM PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-2002	EPS-HRSG NO.1	301408126	24-01-26	24-01-26	3700	WF	1M-CALIBRATION & INSPECTION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-2002	EPS-HRSG NO.2	301408094	25-01-26	25-01-26	3700	WF	1Y Replace permapure dryer	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-2002	EPS-HRSG NO.2	301408121	25-01-26	25-01-26	3700	WC	*1Y-THIRD PARTY RATA TEST	U45	TECO CNF GMPS NMAT NTUP PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-2002	CEMS LOCAL CABINET	301425204	26-01-26	27-01-26	3700	WF	1Y- CD TEST	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-3001	EPS-HRSG NO.3	301411627	26-01-26	26-01-26	3700	WF	1M-CALIBRATION & INSPECTION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3711
1033	PM	A-37-AIT-3001	EPS-HRSG NO.3	301411628	26-01-26	26-01-26	3700	WC	*1Y-THIRD PARTY RATA TEST	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3711
1033	PM	A-37-AIT-3001	Oxygen sensor for flue gas of H-3706	301374615	30-01-26	30-01-26	3700	WC	*1Y-CD TEST	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3711
1033	PM	A-37-AIT-7391A	Oxygen sensor for flue gas of H-3707	301374668	30-01-26	30-01-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7391B	CEMS LOCAL BABINET	301428769	25-01-26	27-01-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7391C	CEMS LOCAL BABINET	301428777	26-01-26	27-01-26	3700	WC	\1M-CALIBRATION AND CLEAN ELECTRODE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7391D	CEMS LOCAL BABINET	301428785	12-07-26	12-07-26	3700	WC	\3M-AIR CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7392A	CEMS LOCAL BABINET	301428793	27-01-26	27-01-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7392B	CEMS LOCAL BABINET	301380498	25-01-26	28-01-26	3700	WC	\1M-CALIBRATION AND CLEAN ELECTRODE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7393A	CEMS LOCAL BABINET	301380499	26-01-26	28-01-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7393B	CEMS LOCAL BABINET	301380500	27-01-26	28-01-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3708
1033	PM	A-37-AIT-7491A	CEMS LOCAL BABINET	301380501	27-01-26	28-01-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7491B	Auxiliary Boiler No. 1	301385231	14-02-26	15-02-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7491C	EPS-HRSG NO.1	301385232	15-02-26	16-02-26	3700	WC	\1M-CALIBRATION AND CLEAN ELECTRODE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7491D	EPS-HRSG NO.1	301385233	16-02-26	17-02-26	3700	WC	\3M-AIR CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7492A	EPS3-Boiler unit 3711	301429045	09-03-26	20-04-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7492B	Auxiliary Boiler No. 1	301416271	14-02-26	15-02-26	3700	WC	\1M-CALIBRATION AND CLEAN ELECTRODE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7493A	EPS-HRSG NO.1	301416261	15-02-26	16-02-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7493B	EPS-HRSG NO.1	301416262	16-02-26	16-02-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7495A	EPS-HRSG NO.1	301422202	17-02-26	17-02-26	3700	WC	\3M-CALIBRATE AND CLEAN SENSOR AND CHECK	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7495B	EPS-HRSG NO.1	301422218	17-02-26	17-02-26	3700	WC	\3M-CALIBRATE AND CLEAN SENSOR AND CHECK	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3709
1033	PM	A-37-AIT-7591A	EPS-HRSG NO.2	301422186	17-02-26	17-02-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7591B	EPS-HRSG NO.2	301422212	17-02-26	17-02-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7591C	EPS-HRSG NO.3	301422187	17-02-26	17-02-26	3700	WC	\1M-CALIBRATION AND CLEAN ELECTRODE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7591D	EPS-HRSG NO.3	301422190	17-02-26	17-02-26	3700	WC	\3M-AIR CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7591D	EPS3-Boiler unit 3711	301429046	13-07-26	13-07-26	3700	WC	\1Y-REPLACE ELECTRODE & CLEAN FLOW	U42	CLSD CNF CSER MACM PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7592A	EPS-HRSG NO.1	301424328	21-03-26	21-03-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7592B	EPS-HRSG NO.1	301424323	21-03-26	21-03-26	3700	WC	\1M-CALIBRATION AND CLEAN ELECTRODE	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7593A	EPS-HRSG NO.1	301424322	21-03-26	21-03-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	B	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-7593B	EPS-HRSG NO.1	301424338	21-03-26	21-03-26	3700	WC	\3M-CALIBRATION AND CLEAN	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	C	U42IC-S	A37_H3710
1033	PM	A-37-AIT-8101	EPS-HRSG NO.1	301424340	22-03-26	22-03-26	3700	WF	\3M-INSPECTION AND CALIBRATE WITH STD	U42	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	U42IC-S	A37_HF3706_AIT8101
1033	PM	A-37-AIT-8201	EPS-HRSG NO.1	301424349	22-03-26	22-03-26	3700	WC	\3M-INSPECTION AND CALIBRATE WITH STD	U42	TECO CNF NMAT NTUP PRC SETC	A	U42IC-S	A37_HF3707_AIT8201
1033	PM	A-CEMS-H-3701	EPS-HRSG NO.2	301424361	23-03-26	23-03-26	3700	WF	2M-CALIBRATION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3701_CEMSH3701
1033	PM	A-CEMS-H-3701	EPS-HRSG NO.2	301424324	23-03-26	23-03-26	3700	WF	*1Y CLEAN <(>&<)> REPLCAEMENT	U45	REL CNF GMPS MACM PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3701_CEMSH3701
1033	PM	A-CEMS-H-3701	EPS-HRSG NO.2	301424320	23-03-26	23-03-26	3700	WC	*6M CHANGE CATALYST FOR NO2/NO CONVERTER	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3701_CEMSH3701
1033	PM	A-CEMS-H-3701	EPS-HRSG NO.2	301424346	23-03-26	23-03-26	3700	WF	1Y- CD TEST	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U45QM-S	A37_H3701_CEMSH3701
1033	PM	A-CEMS-H-3703	EPS-HRSG NO.2	301424365	24-03-26	24-03-26	3700	WF	2M-CALIBRATION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_3710_H3703_CEMSH3703

ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

MaintPlant	Order Type	Equipment	Description	Order	Bas. start date	Basic fin. date	Location	User status	MaintItem text	Planner group	System status	ABC indic.	Main WorkCtr	Functional Loc.
1033	PM	A-CEMS-H-3703	EPS-HRSG NO.2	301424364	24-03-26	24-03-26	3700	WF	*1Y CLEAN <(>&<)> REPLCAEMENT	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_3710_H3703_CEMSH3703
1033	PM	A-CEMS-H-3703	EPS-HRSG NO.3	301424356	27-03-26	27-03-26	3700	WC	*6M CHANGE CATALYST FOR NO2/NO CONVERTER	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_3710_H3703_CEMSH3703
1033	PM	A-CEMS-H-3703	EPS-HRSG NO.3	301424336	27-03-26	27-03-26	3700	WF	*1Y-THIRD PARTY RATA TEST	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U45QM-S	A37_3710_H3703_CEMSH3703
1033	PM	A-CEMS-H-3703	EPS-HRSG NO.3	301424355	27-03-26	27-03-26	3700	WF	1Y- CD TEST	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	U45QM-S	A37_3710_H3703_CEMSH3703
1033	PM	A-CEMS-H-3704	EPS-HRSG NO.3	301424326	27-03-26	27-03-26	3700	WF	2M-CALIBRATION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3704_CEMSH3704
1033	PM	A-CEMS-H-3704	EPS-HRSG NO.3	301424337	28-03-26	28-03-26	3700	WF	*1Y CLEAN <(>&<)> REPLCAEMENT	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3704_CEMSH3704
1033	PM	A-CEMS-H-3704	EPS-HRSG NO.3	301424350	28-03-26	28-03-26	3700	WC	*6M CHANGE CATALYST FOR NO2/NO CONVERTER	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3704_CEMSH3704
1033	PM	A-CEMS-H-3704	Auxiliary Boiler No. 1	301425266	27-03-26	27-03-26	3700	WF	1Y- CD TEST	U45	REL CNF GMPS MACM PPRT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3704_CEMSH3704
1033	PM	A-CEMS-H-3704	EPS-HRSG NO.1	301425253	28-03-26	28-03-26	3700	WC	*1Y-THIRD PARTY RATA TEST	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3704_CEMSH3704
1033	PM	A-CEMS-H-3705	EPS-HRSG NO.1	301425254	29-03-26	29-03-26	3700	WF	2M-CALIBRATION	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3705_CEMSH3705
1033	PM	A-CEMS-H-3705	CEMS LOCAL BABINET	301428770	09-03-26	10-03-26	3700	WF	*1Y CLEAN <(>&<)> REPLCAEMENT	U45	REL CNF PRT MACM PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3705_CEMSH3705
1033	PM	A-CEMS-H-3705	CEMS LOCAL BABINET	301428778	09-03-26	10-03-26	3700	WC	*6M CHANGE CATALYST FOR NO2/NO CONVERTER	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3705_CEMSH3705
1033	PM	A-CEMS-H-3705	CEMS LOCAL BABINET	301428786	12-07-26	12-07-26	3700	WC	*1Y-THIRD PARTY RATA TEST	U45	TECO CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3705_CEMSH3705
1033	PM	A-CEMS-H-3705	CEMS LOCAL BABINET	301428794	09-03-26	10-03-26	3700	WF	1Y- CD TEST	U45	REL CNF NMAT PRC SETC	A	O54QM-S	A37_H3705_CEMSH3705

ภาคผนวก ข.10

Procedure เรื่อง การควบคุมการทำงานของระบบหล่อเย็น

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานผลิตยูทิลิตี้

W-(U-P1-OP)-028

การ Start Up & Shut Down Cooling Water System

Unit 3403

จัดทำโดย : [redacted]

(Day Manager)

อนุมัติโดย : [redacted]

(Division Manager-Plant Operation Utility)

ตารางแจกจ่าย

สำเนาเลขที่	ผู้ถือ	สถานที่
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[redacted]

[redacted]

[redacted]



กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(O-UT-OP)-028 : การ Start Up & Shut Down Cooling Water System Unit 3403





GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(O-UT-OP)-028 : การ Start Up & Shut Down Cooling Water System Unit 3403





กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(O-UT-OP)-028 : การ Start Up & Shut Down Cooling Water System Unit 3403



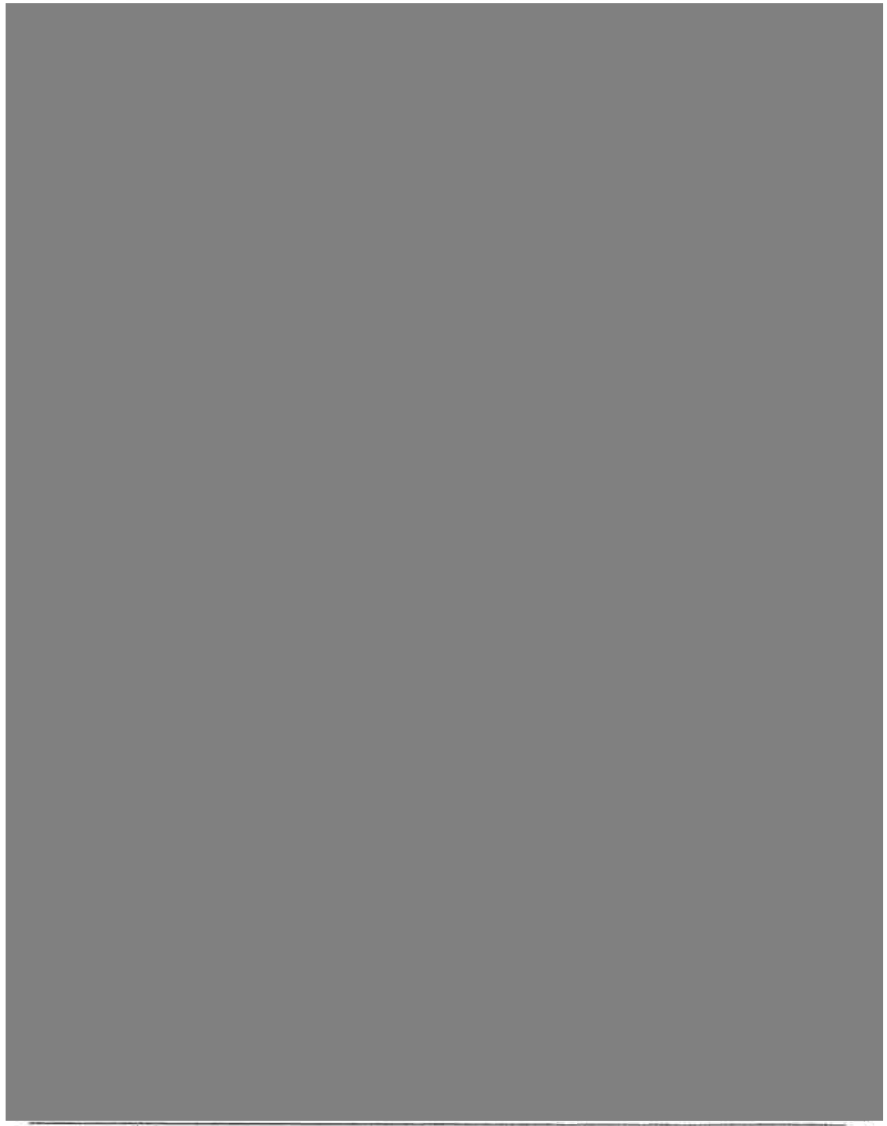



[redacted]

[redacted]







GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(O-UT-OP)-028 : การ Start Up & Shut Down Cooling Water System Unit 3403





กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(O-UT-OP)-028 : การ Start Up & Shut Down Cooling Water System Unit 3403



ภาคผนวก ข.11

WI เรื่อง การควบคุมการเดินเครื่องหน่วยบำบัดน้ำเสีย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานผลิตโอเลฟินส์ 1

W - (O-P1-OP1) - 323

วิธีปฏิบัติงาน Waste Water Treatment [U-5600]

จัดทำโดย : [redacted]
(Senior Operator)

อนุมัติโดย : [redacted]
(ผู้จัดการส่วนหน่วยงานปฏิบัติการผลิต 1)

ตารางแจกจ่าย

สำเนาเลขที่	ผู้ถือ	สถานที่
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

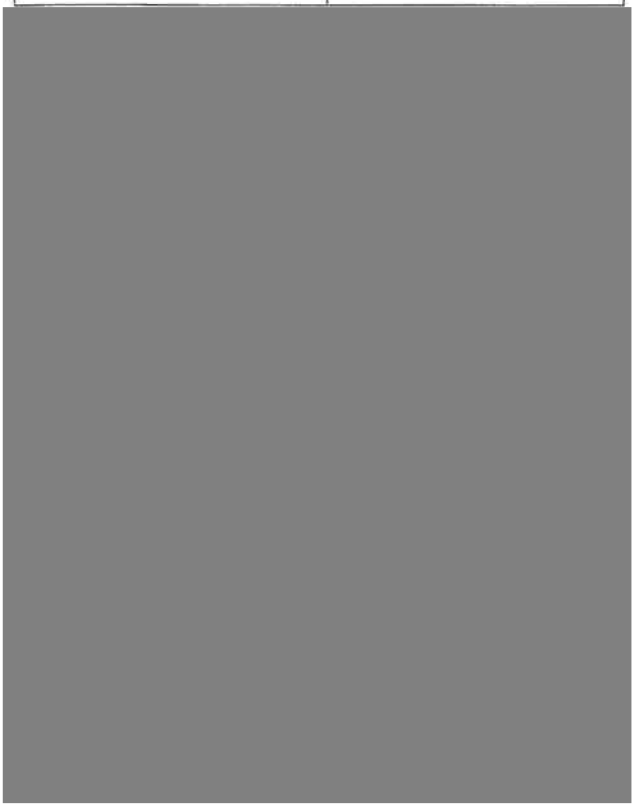

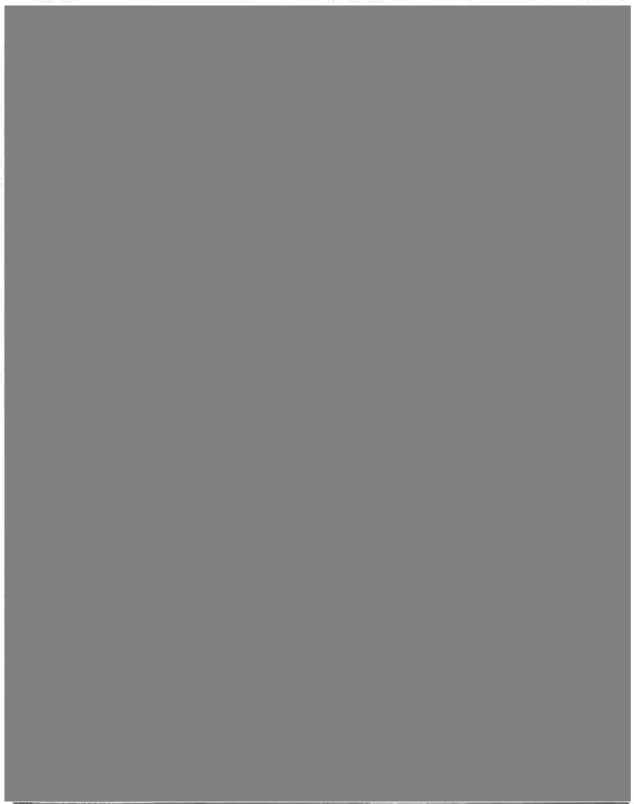



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

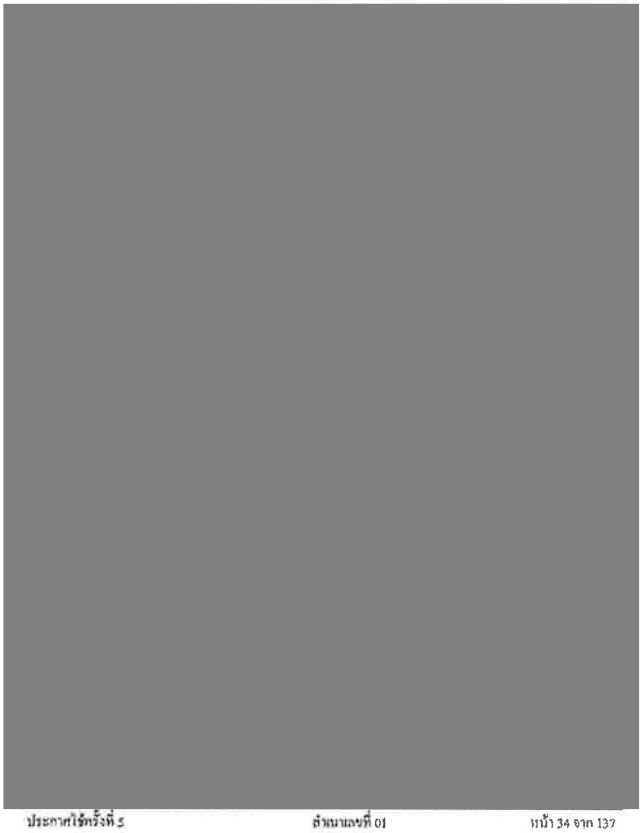

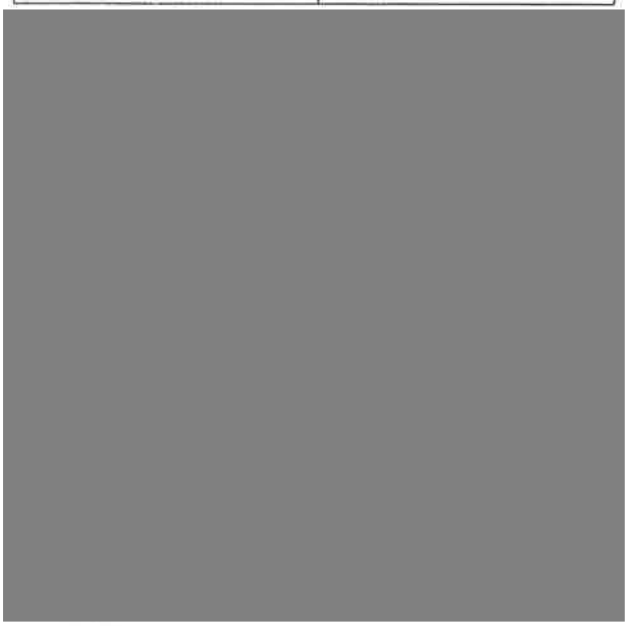

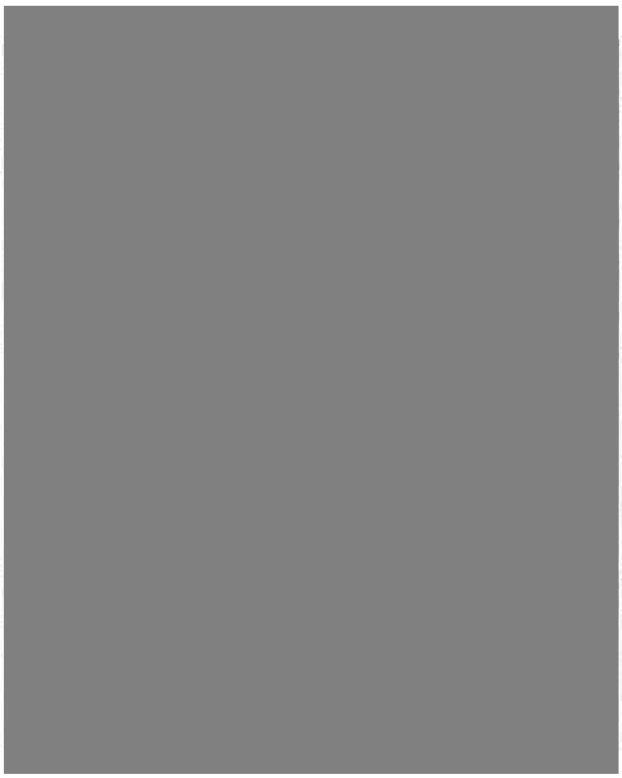

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



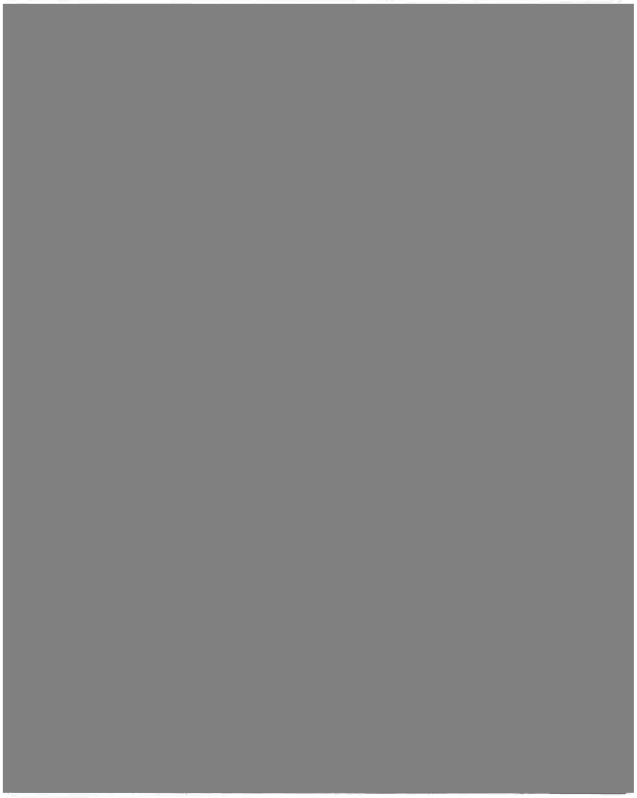

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



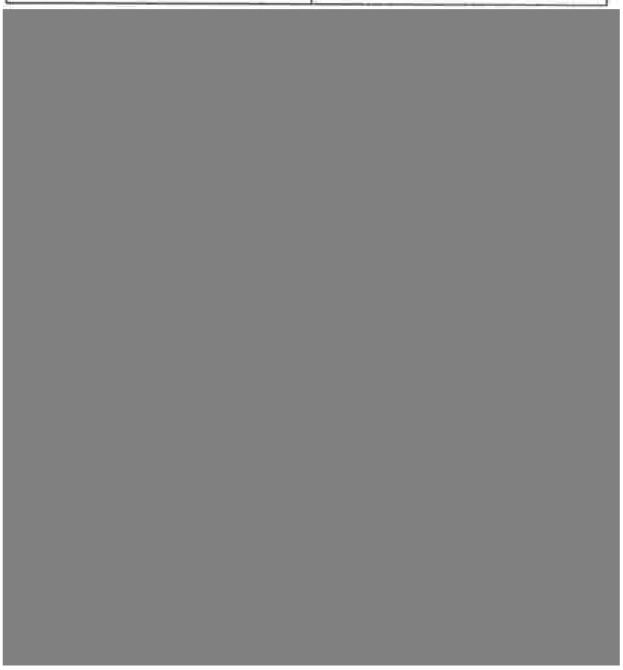

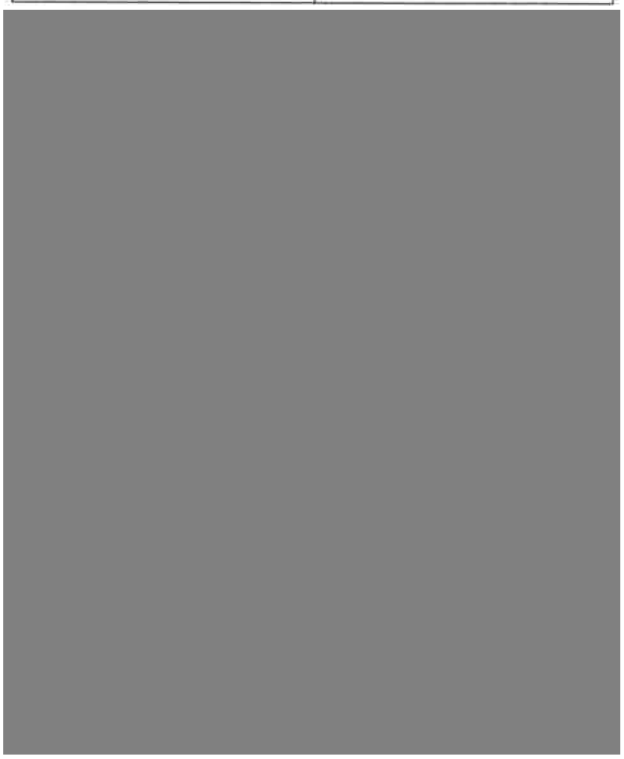

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ภาคผนวก ข.12

ผลการจัดทำ Noise Contour Map

ประจำปี พ.ศ.2569

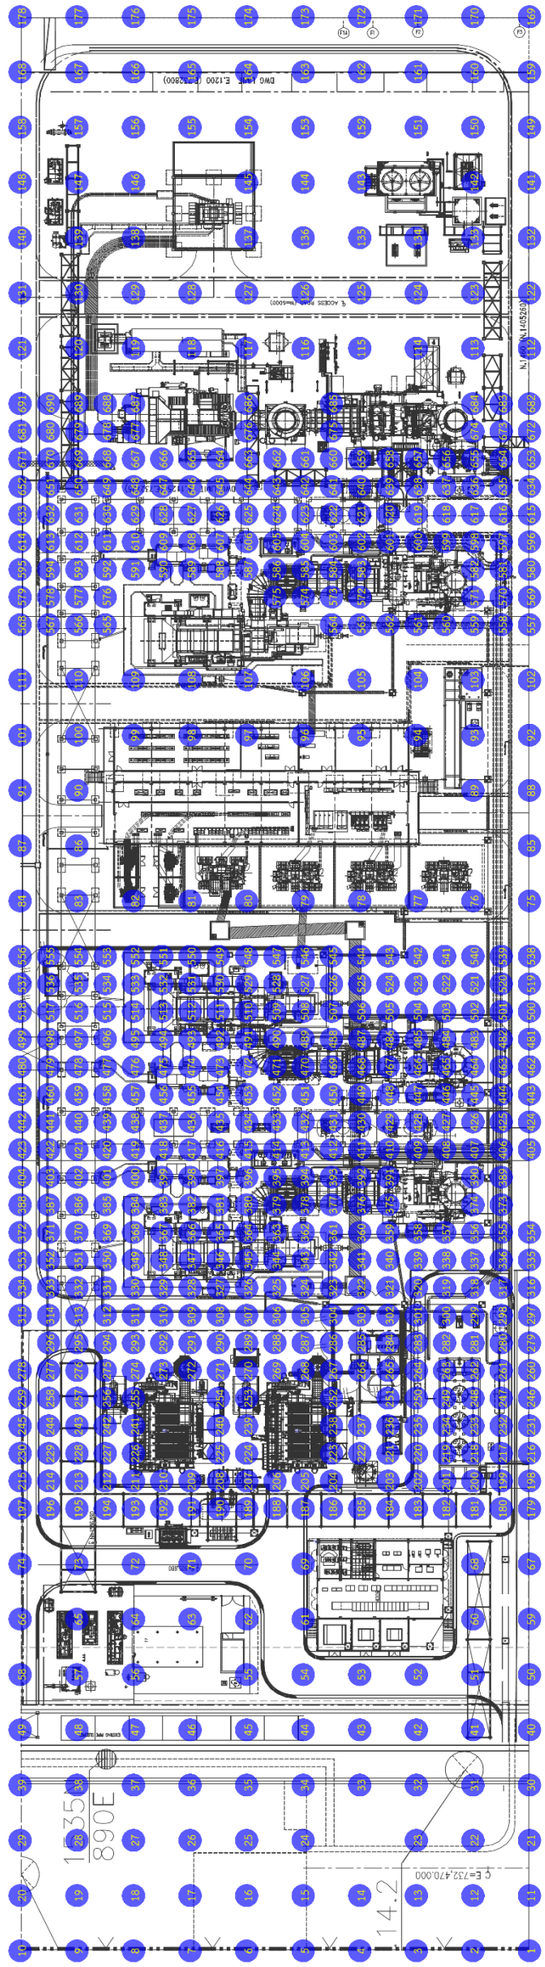

ตัวเลขในวงกลม หมายถึง จุดตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 691 จุด

รูปที่ 1 ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 1 (EPS)
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

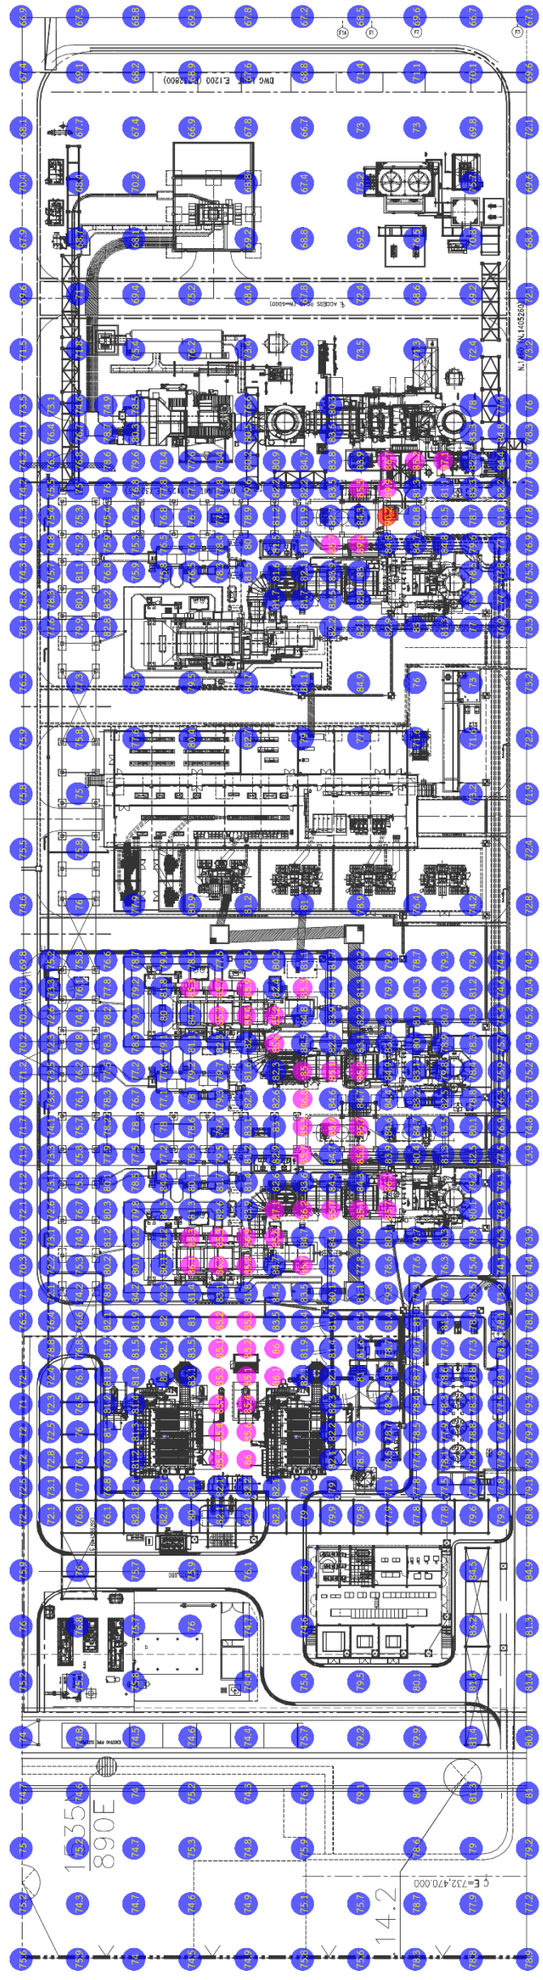

หมายถึง ระดับเสียง น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ
หมายถึง ระดับเสียง 85-90 เดซิเบลเอ
หมายถึง ระดับเสียง มากกว่า 90 เดซิเบลเอ

ตัวเลขใน ○ หมายถึง ระดับเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ
ค่าต่ำสุด 66.7 เดซิเบลเอ
ค่าสูงสุด 90.2 เดซิเบลเอ

รูปที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 1 (EPS)
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

95 90 85 80 75 70 65 60 55

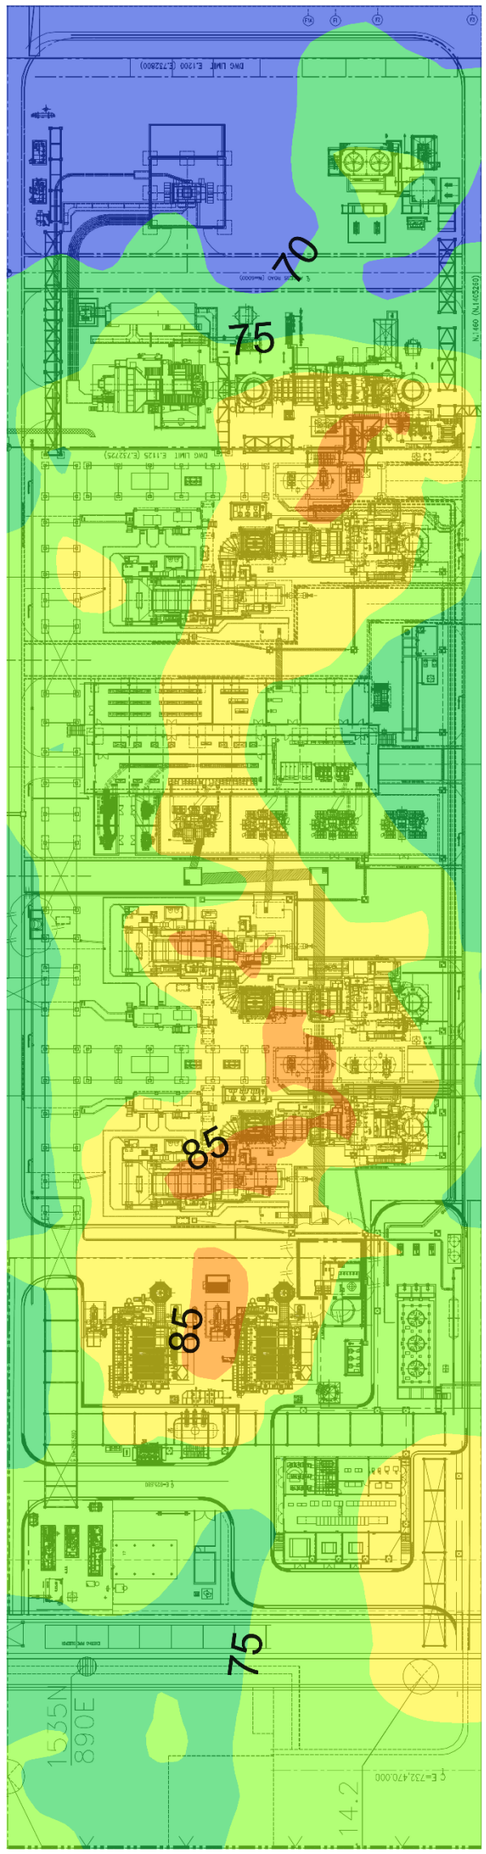

รูปที่ 3 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 1 (EPS)
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

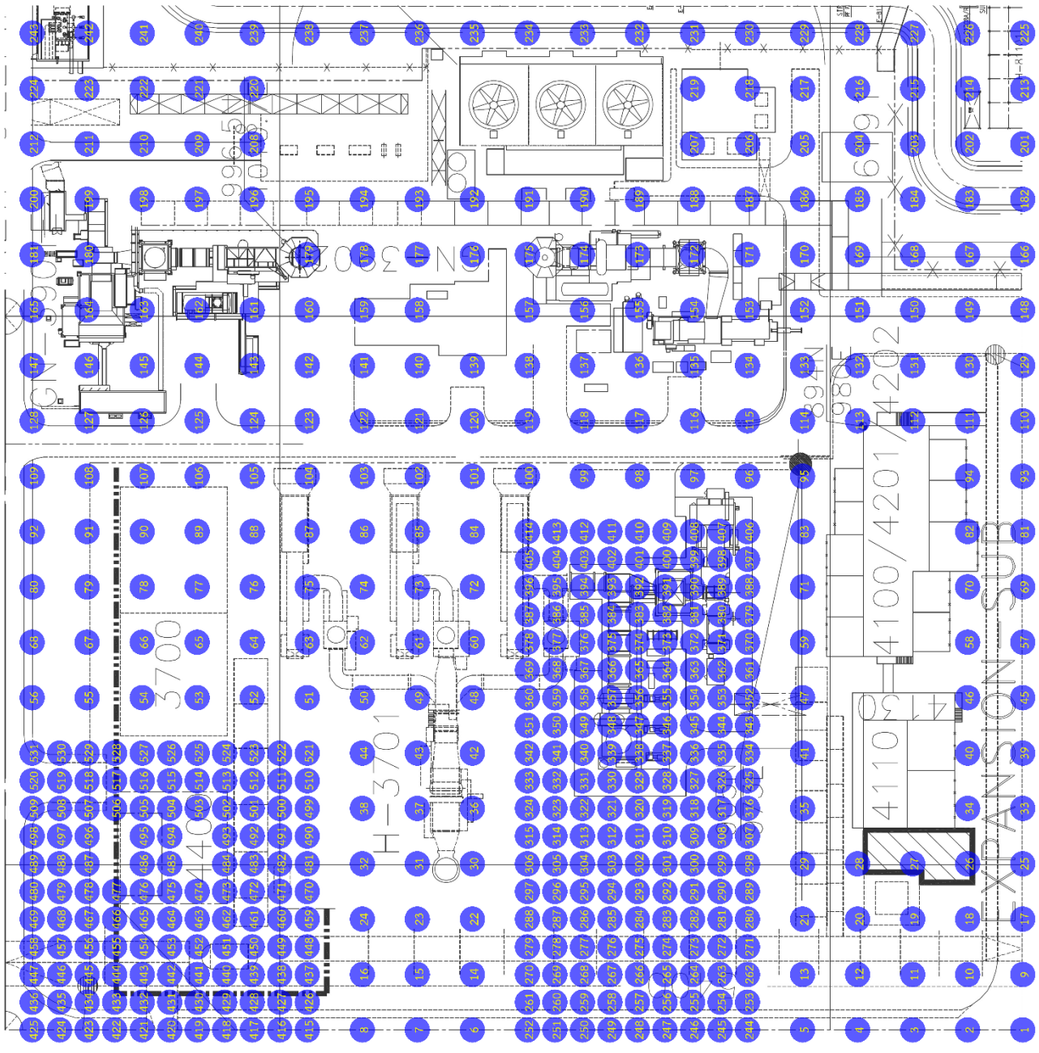
3700
4400
H-3701
4110/4201
4100/4201
99.86
99.56
99.84
99.69
99.82
99.71
99.80
99.73
99.78
99.75
99.76
99.77
99.74
99.79
99.72
99.81
99.70
99.83
99.68
99.85
99.67
99.87
99.66
99.88
99.65
99.89
99.64
99.90
99.63
99.91
99.62
99.92
99.61
99.93
99.60
99.94
99.59
99.95
99.58
99.96
99.57
99.97
99.56
99.98
99.55
99.99
99.54
100.00
99.53
100.01
99.52
100.02
99.51
100.03
99.50
100.04
99.49
100.05
99.48
100.06

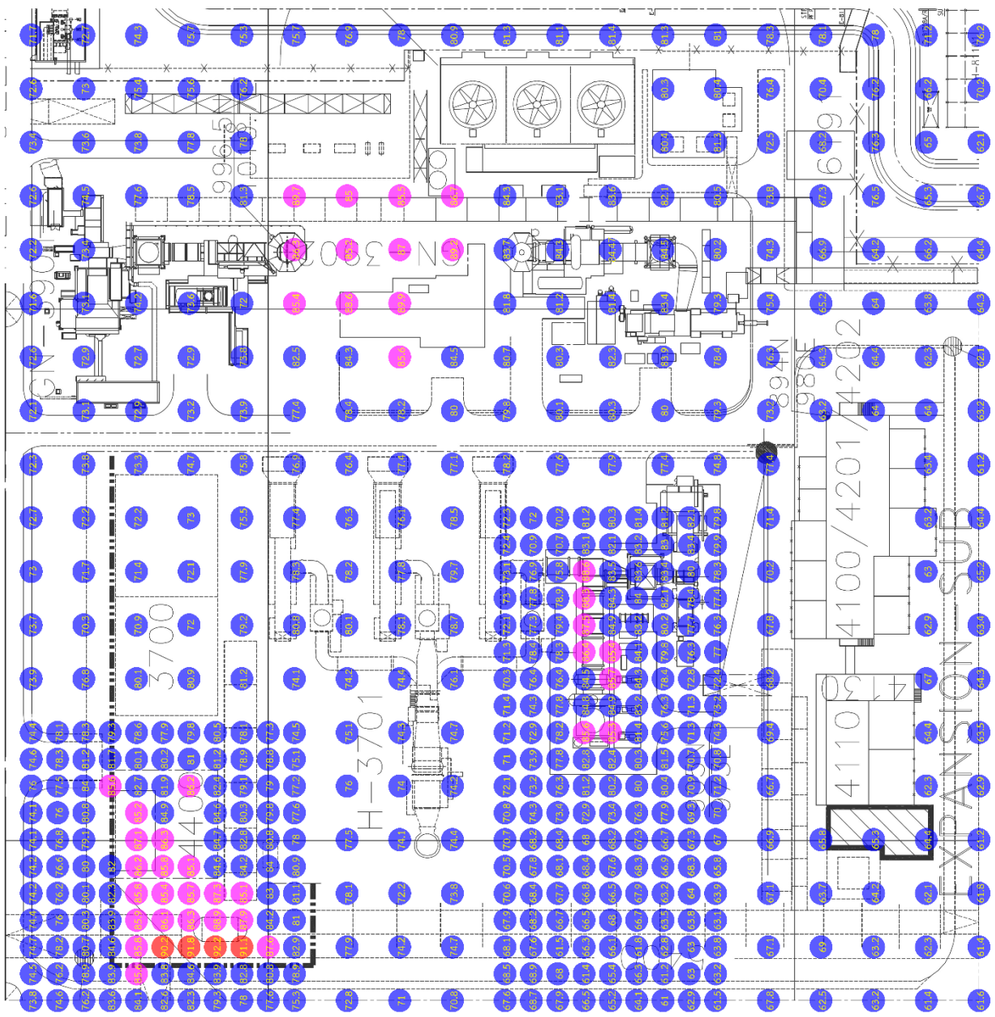

รูปที่ 5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 5
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

95 90 85 80 75 70 65 60 55

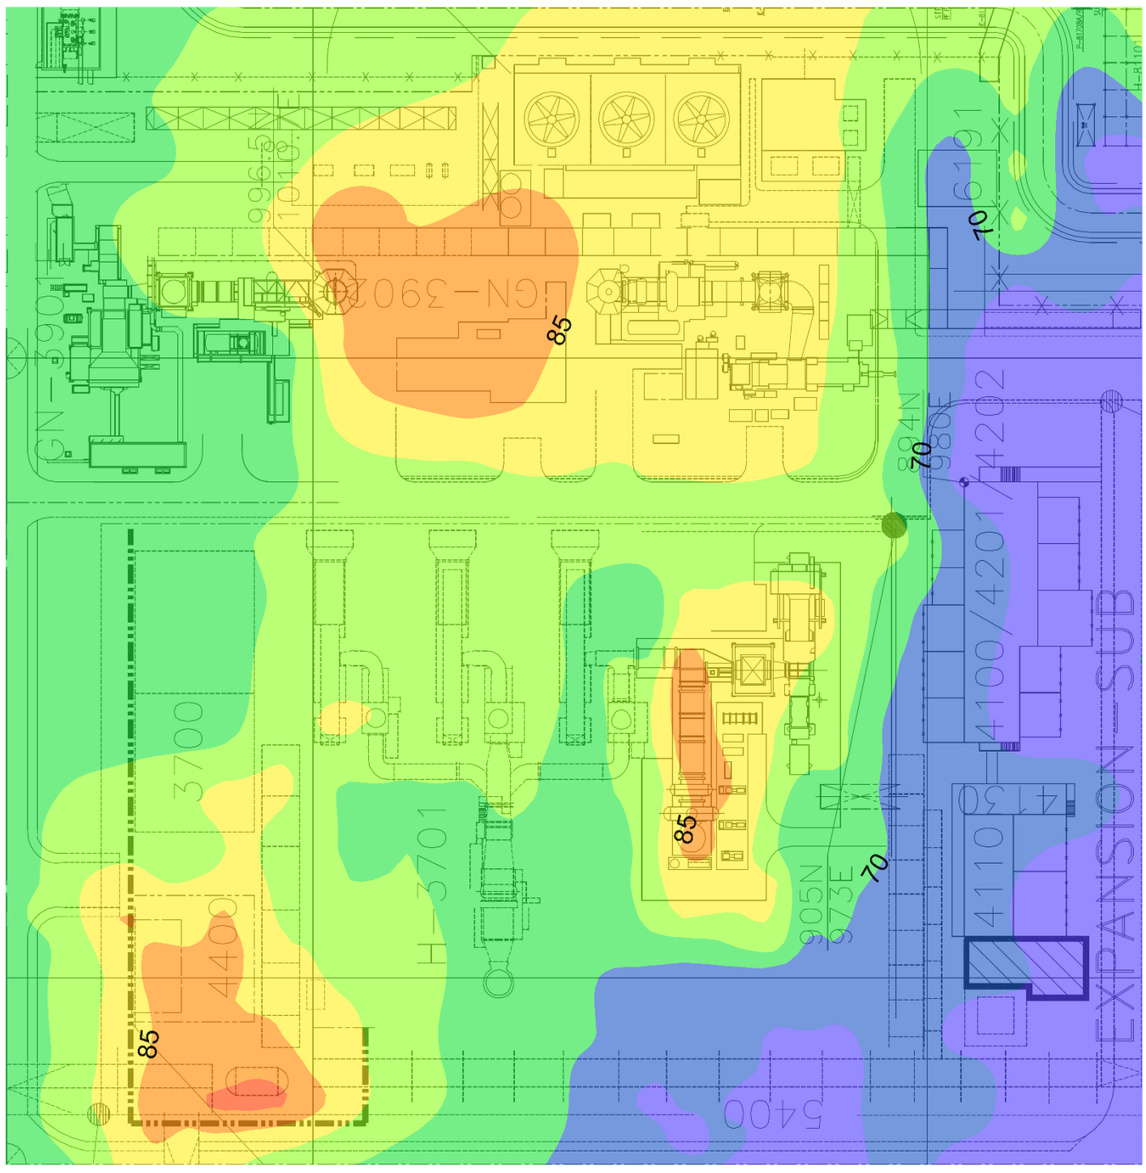

รูปที่ 6 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 5
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ตัวเลขใน ◯ หมายถึง จุดตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 231 จุด

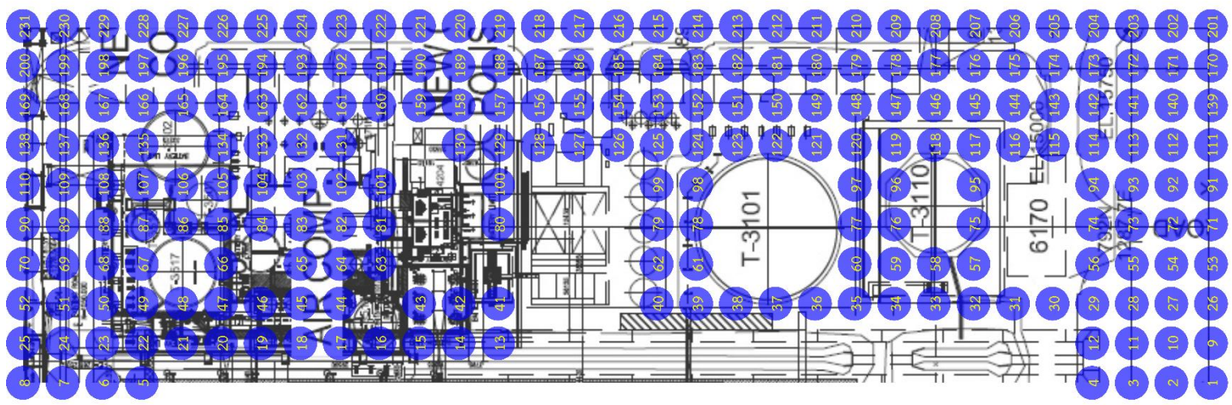

รูปที่ 7 ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 6 (Water Plant)
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

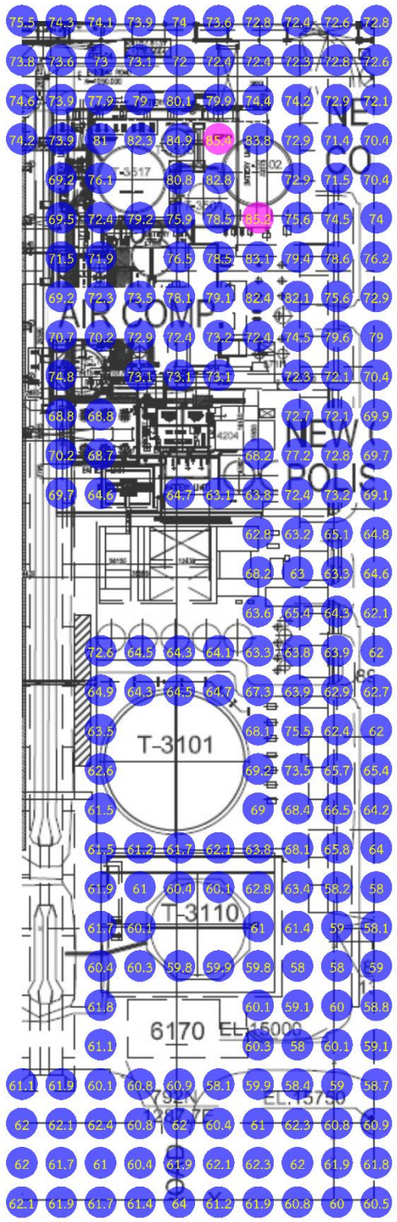

ตัวเลขใน ○ หมายถึง ระดับเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ค่าต่ำสุด 58.0 เดซิเบลเอ

ค่าสูงสุด 85.4 เดซิเบลเอ

● หมายถึง ระดับเสียง น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ

● หมายถึง ระดับเสียง 85-90 เดซิเบลเอ

รูปที่ 8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 6 (Water Plant)
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

95 90 85 80 75 70 65 60 55

รูปที่ 9 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริเวณกระบวนการผลิต Zone 6 (Water Plant)
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ภาคผนวก ข.13

เอกสารการรณรงค์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

สงกรานต์ปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง

พันธะสัญญาความปลอดภัย: เดินทางอุ่นใจ ปฏิบัติงานมีสติ เพื่อคนที่เรารัก

เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งในการเดินทางและการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงความปลอดภัยเข้ากับความรักและความห่วงใยต่อครอบครัว รวมถึงการปลูกฝังวินัยและสติในการทำงาน

ภาคผนวก ข.14

เอกสารการส่งกำจัดกากของเสีย
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

Waste Yard GC2

Waste Yard GC2

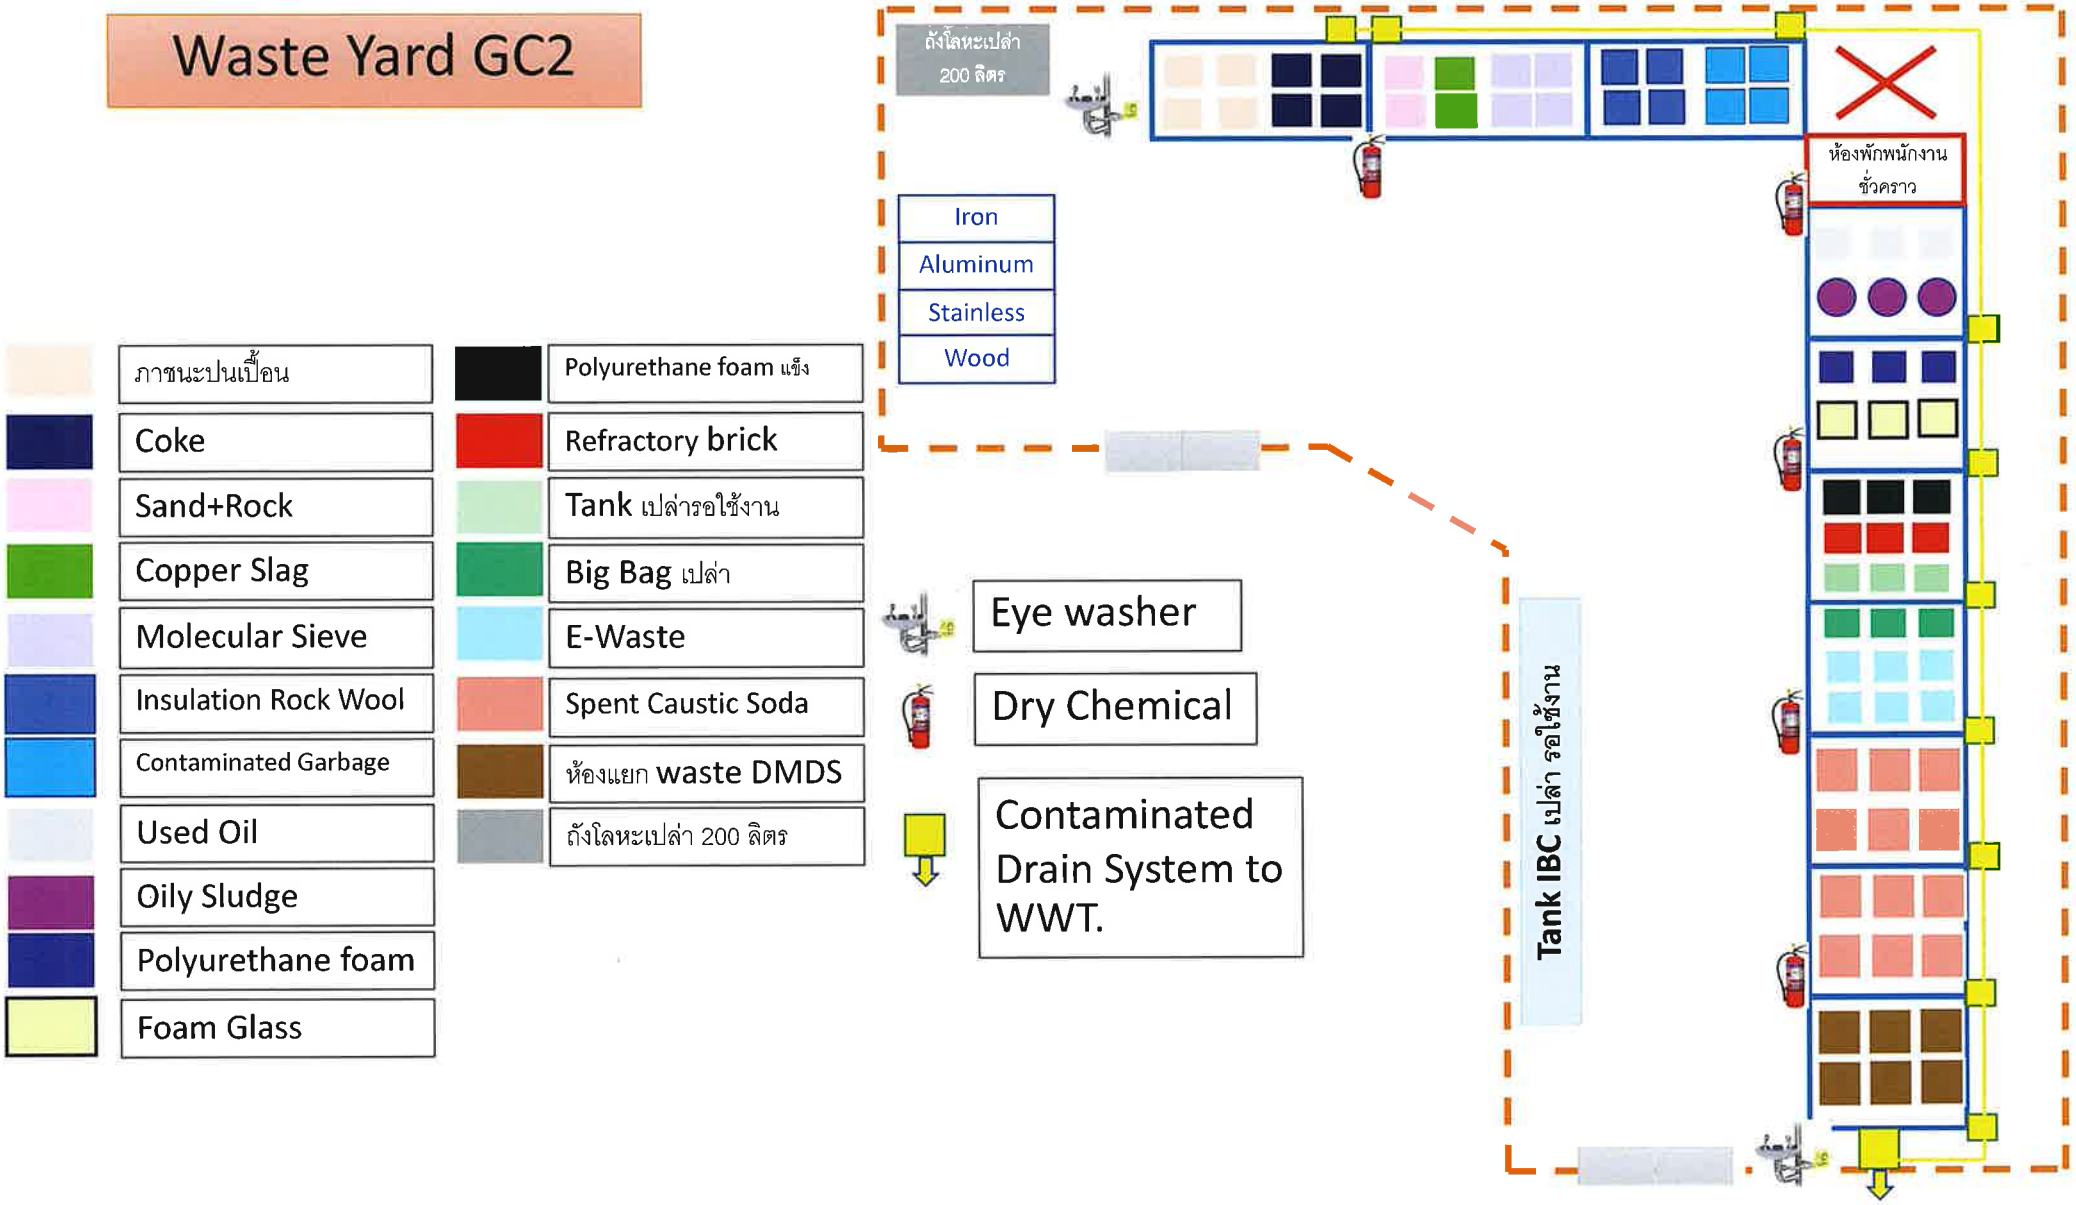

ภาพถ่ายการจัดเก็บและการจัดการกากของเสีย
จากกระบวนการผลิต GC2

ห้องจัดเก็บ Waste

ภาชนะปนเปื้อน

Molecular Sieve And Inner Ball

Coke

ห้องจัดเก็บ Waste

- Sand + Rock Contaminate
- Spent Activated Carbon Contaminated
- Spray Can
- Copper Slag

ห้องจัดเก็บ Waste

- Tank เสื่อมสภาพ
- ทรายฉุกเฉิน
- Tank Vocs
- สายสูบ-ปล่อย

ห้องจัดเก็บ Waste

- Oily Sludge
- Used Oil
- หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ

ห้องจัดเก็บ Waste

- Used Oil
- Polyurethen Foam
- Foam Glass

ห้องจัดเก็บ Waste

- Waste Yellow Oil And Caustic Soda
- Spent Caustic

ห้องจัดเก็บ Waste

- Waste Yellow Oil And Caustic Soda

ห้องจัดเก็บ Waste

- Waste Yellow Oil And Caustic Soda
- ห้องแยก Liquid Waste

ห้องจัดเก็บ Waste

- E-Waste
- แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
- ถังโลหะเปล่า 200 ลิตร

หนังสือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

(ข้อมูลแสดงชนิดและปริมาณกากของเสีย ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่โครงการโรงโอเลฟินส์ 1 โรงโอเลฟินส์ 4 หน่วยผลิตไฟฟ้า (Power Plant) และโรงงานผลิตสารโพลิเอทิลีน (HDPE2) โดยการรายงานปริมาณของกากของเสียของโรงงานที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานราชการ จึงครอบคลุมรายละเอียดของทั้ง 3 โครงการดังกล่าว)

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	2,500.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	700.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	500.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	1,000.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	50.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	100.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	100.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	500.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	500.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	10.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	50.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	50.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	100.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	80.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	5.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	3.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	10.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	10.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	1,000.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	100.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	50.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	50.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	1.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	100.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	50.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	50.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	50.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	100.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	100.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	100.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	100.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	20.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	5.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	50.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	50.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	50.000	011	10110100225577	
37	160216	สายไฟ	50.000	011	10210005325595	
38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	100.000	044	10190000325446	
39	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	100.000	042	10190104125536	
40	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	100.000	048	72070001525621	
41	170503	Sand+Rock Contaminated with oil and chemical	100.000	045	10130001925570	
42	198003	Sludge	300.000	045	10190107125533	
43	150110	Contaminated Container	100.000	039	10190107125533	
44	170604	Insulation (Polyurethane foam)	100.000	048	72070001525621	
45	150202	Air filter	100.000	042	10130001925570	
46	150202	Molecular Sieve and inner ball	800.000	045	10190000825494	
47	150202	Molecular Sieve and inner ball	700.000	045	10190107125533	
48	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	100.000	049	10200172025656	
49	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	100.000	049	10240004525614	
50	160801	Spent Palladium Alumina Catalyst	50.000	054	10210001825572	
51	070101	Yellow Oil And Caustic Soda	500.000	042	82170009625627	
52	150202	Air Filter	100.000	041	10190000325446	
53	170203	Fill Pack	100.000	042	10190000825494	
54	160708	Oily Wastewater	2,000.000	042	10190000825494	
55	130507	Oily Waste Water	500.000	042	72080000125455	
56	161001	Oily Waste Water	500.000	075	72020000125477	
57	160601	แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว	20.000	021	10200172025656	
58	070109	Molecular Sieve	200.000	044	10190500125452	
59	190904	Spent Activated Carbon	20.000	055	10210001825572	
60	150202	Sand+Rock Contaminated	100.000	042	10190107125533	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้งานแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ

031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ

032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน

033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน

039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ

041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery)โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)

042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator)เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง

043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)

044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)

045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง

046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง

047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)

051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/regeneration)

052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)

053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)

054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)

055 เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันตภัณฑ์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)

056 เข้ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ใช้งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)

061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)

062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน

063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบาบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)

065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)

066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)

067 ปรับเสียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)

068 ปรับเสถียรหรือครึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)

069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ

071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)

073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)

074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)

076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)

077 อัดฉีดลงบ่อใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)

079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ

081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)

082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

084 ทาอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่องเท่านั้น

เหตุผลกรณีอื่นๆ

01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ นำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม

03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน

04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับนำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย

07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลการไม่อนุญาต

99 อื่นๆ ระบุ.....

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ดังนี้

11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)

17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)

18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย

19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ว.อ.6)

21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน

22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง

23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง

24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	100.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	50.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	40.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	4.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	0.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	40.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	10.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	1.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	0.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	0.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	30.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	5.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	5.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	0.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	0.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	0.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	0.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	0.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	0.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	0.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	0.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	0.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	0.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	0.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	0.000	011	10110100225577	

37	160216	สายไฟ	0.000	011	10210005325595	
38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	044	10190000325446	
39	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	5.000	042	10190104125536	
40	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	5.000	048	72070001525621	
41	170503	Sand+Rock Contaminated with oil and chemical	0.000	045	10130001925570	
42	198003	Sludge	0.000	045	10190107125533	
43	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
44	170604	Insulation (Polyurethane foam)	0.000	048	72070001525621	
45	150202	Air filter	0.000	042	10130001925570	
46	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190000825494	
47	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190107125533	
48	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10200172025656	
49	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10240004525614	
50	160801	Spent Palladium Alumina Catalyst	0.000	054	10210001825572	
51	070101	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	82170009625627	
52	150202	Air Filter	0.000	041	10190000325446	
53	170203	Fill Pack	0.000	042	10190000825494	
54	160708	Oily Wastewater	0.000	042	10190000825494	
55	130507	Oily Waste Water	0.000	042	72080000125455	
56	161001	Oily Waste Water	0.000	075	72020000125477	
57	160601	แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว	0.000	021	10200172025656	
58	070109	Molecular Sieve	0.000	044	10190500125452	
59	190904	Spent Activated Carbon	0.000	055	10210001825572	
60	150202	Sand+Rock Contaminated	0.000	042	10190107125533	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	100.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	50.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	100.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	40.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	4.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	30.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	40.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	10.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	0.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	0.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	0.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	30.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	5.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	5.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	0.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	0.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	0.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	10.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	10.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	20.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	0.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	20.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	3.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	0.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	0.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	0.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	0.000	011	10110100225577	
37	160216	สายไฟ	0.000	011	10210005325595	

38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminated฿ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	100.000	044	10190000325446	
39	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminated฿ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	10.000	042	10190104125536	
40	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminated฿ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	10.000	048	72070001525621	
41	170503	Sand+Rock Contaminated with oil and chemical	0.000	045	10130001925570	
42	198003	Sludge	0.000	045	10190107125533	
43	150110	Contaminated Container	10.000	039	10190107125533	
44	170604	Insulation (Polyurethane foam)	0.000	048	72070001525621	
45	150202	Air filter	0.000	042	10130001925570	
46	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190000825494	
47	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190107125533	
48	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10200172025656	
49	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10240004525614	
50	160801	Spent Palladium Alumina Catalyst	0.000	054	10210001825572	
51	070101	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	82170009625627	
52	150202	Air Filter	0.000	041	10190000325446	
53	170203	Fill Pack	0.000	042	10190000825494	
54	160708	Oily Wastewater	0.000	042	10190000825494	
55	130507	Oily Waste Water	0.000	042	72080000125455	
56	161001	Oily Waste Water	0.000	075	72020000125477	
57	160601	แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว	0.000	021	10200172025656	
58	070109	Molecular Sieve	0.000	044	10190500125452	
59	190904	Spent Activated Carbon	0.000	055	10210001825572	
60	150202	Sand+Rock Contaminated	0.000	042	10190107125533	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	150.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	50.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	60.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	140.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	10.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	0.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	10.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	0.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	0.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	0.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	0.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	5.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	0.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	0.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	0.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	0.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	30.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	30.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	0.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	0.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	5.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	0.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	5.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	0.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	0.000	011	10110100225577	
37	160216	สายไฟ	0.000	011	10210005325595	
38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminated฿ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	044	10190000325446	

39	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	042	10190104125536	
40	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	10.000	048	72070001525621	
41	170503	Sand+Rock Contaminated with oil and chemical	20.000	045	10130001925570	
42	198003	Sludge	50.000	045	10190107125533	
43	150110	Contaminated Container	10.000	039	10190107125533	
44	170604	Insulation (Polyurethane foam)	10.000	048	72070001525621	
45	150202	Air filter	10.000	042	10130001925570	
46	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190000825494	
47	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190107125533	
48	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10200172025656	
49	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10240004525614	
50	160801	Spent Palladium Alumina Catalyst	0.000	054	10210001825572	
51	070101	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	82170009625627	
52	150202	Air Filter	0.000	041	10190000325446	
53	170203	Fill Pack	0.000	042	10190000825494	
54	160708	Oily Wastewater	0.000	042	10190000825494	
55	130507	Oily Waste Water	0.000	042	72080000125455	
56	161001	Oily Waste Water	0.000	075	72020000125477	
57	160601	แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว	0.000	021	10200172025656	
58	070109	Molecular Sieve	0.000	044	10190500125452	
59	190904	Spent Activated Carbon	0.000	055	10210001825572	
60	150202	Sand+Rock Contaminated	0.000	042	10190107125533	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	50.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	50.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	30.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	300.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	10.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	0.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	0.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	0.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	0.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	0.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	10.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	0.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	0.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	0.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	0.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	0.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	0.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	0.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	0.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	0.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	0.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	0.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	0.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	0.000	011	10110100225577	
37	160216	สายไฟ	0.000	011	10210005325595	
38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	044	10190000325446	

39	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	042	10190104125536	
40	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	10.000	048	72070001525621	
41	170503	Sand+Rock Contaminated with oil and chemical	0.000	045	10130001925570	
42	198003	Sludge	0.000	045	10190107125533	
43	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
44	170604	Insulation (Polyurethane foam)	10.000	048	72070001525621	
45	150202	Air filter	0.000	042	10130001925570	
46	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190000825494	
47	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190107125533	
48	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10200172025656	
49	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10240004525614	
50	160801	Spent Palladium Alumina Catalyst	0.000	054	10210001825572	
51	070101	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	82170009625627	
52	150202	Air Filter	0.000	041	10190000325446	
53	170203	Fill Pack	0.000	042	10190000825494	
54	160708	Oily Wastewater	0.000	042	10190000825494	
55	130507	Oily Waste Water	0.000	042	72080000125455	
56	161001	Oily Waste Water	0.000	075	72020000125477	
57	160601	แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว	0.000	021	10200172025656	
58	070109	Molecular Sieve	0.000	044	10190500125452	
59	190904	Spent Activated Carbon	0.000	055	10210001825572	
60	150202	Sand+Rock Contaminated	0.000	042	10190107125533	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	200.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	50.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	30.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	0.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	4.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	10.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	10.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	30.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	40.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	10.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	20.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	0.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	1.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	1.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	30.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	10.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	5.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	10.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	0.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	0.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	0.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	20.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	0.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	0.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	2.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	0.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	0.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	0.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	0.000	011	10110100225577	
37	160216	สายไฟ	0.000	011	10210005325595	
38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	044	10190000325446	

39	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	10.000	042	10190104125536	
40	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	10.000	048	72070001525621	
41	170503	Sand+Rock Contaminated with oil and chemical	10.000	045	10130001925570	
42	198003	Sludge	50.000	045	10190107125533	
43	150110	Contaminated Container	5.000	039	10190107125533	
44	170604	Insulation (Polyurethane foam)	10.000	048	72070001525621	
45	150202	Air filter	10.000	042	10130001925570	
46	150202	Molecular Sieve and inner ball	100.000	045	10190000825494	
47	150202	Molecular Sieve and inner ball	100.000	045	10190107125533	
48	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10200172025656	
49	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10240004525614	
50	160801	Spent Palladium Alumina Catalyst	10.000	054	10210001825572	
51	070101	Yellow Oil And Caustic Soda	50.000	042	82170009625627	
52	150202	Air Filter	0.000	041	10190000325446	
53	170203	Fill Pack	0.000	042	10190000825494	
54	160708	Oily Wastewater	0.000	042	10190000825494	
55	130507	Oily Waste Water	0.000	042	72080000125455	
56	161001	Oily Waste Water	0.000	075	72020000125477	
57	160601	แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว	0.000	021	10200172025656	
58	070109	Molecular Sieve	0.000	044	10190500125452	
59	190904	Spent Activated Carbon	0.000	055	10210001825572	
60	150202	Sand+Rock Contaminated	0.000	042	10190107125533	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	100.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	50.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	0.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	30.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	0.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	0.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	0.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	0.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	5.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	3.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	0.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	0.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	0.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	0.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	0.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	0.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	0.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	0.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	0.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	0.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	0.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	0.000	011	10110100225577	
37	160216	สายไฟ	0.000	011	10210005325595	
38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	044	10190000325446	

39	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	10.000	042	10190104125536	
40	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	5.000	048	72070001525621	
41	170503	Sand+Rock Contaminated with oil and chemical	5.000	045	10130001925570	
42	198003	Sludge	0.000	045	10190107125533	
43	150110	Contaminated Container	5.000	039	10190107125533	
44	170604	Insulation (Polyurethane foam)	5.000	048	72070001525621	
45	150202	Air filter	0.000	042	10130001925570	
46	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190000825494	
47	150202	Molecular Sieve and inner ball	0.000	045	10190107125533	
48	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	049	10200172025656	
49	130208	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	5.000	049	10240004525614	
50	160801	Spent Palladium Alumina Catalyst	0.000	054	10210001825572	
51	070101	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	82170009625627	
52	150202	Air Filter	0.000	041	10190000325446	
53	170203	Fill Pack	0.000	042	10190000825494	
54	160708	Oily Wastewater	0.000	042	10190000825494	
55	130507	Oily Waste Water	0.000	042	72080000125455	
56	161001	Oily Waste Water	0.000	075	72020000125477	
57	160601	แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว	0.000	021	10200172025656	
58	070109	Molecular Sieve	0.000	044	10190500125452	
59	190904	Spent Activated Carbon	0.000	055	10210001825572	
60	150202	Sand+Rock Contaminated	0.000	042	10190107125533	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-7381
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070002725352

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190810	Oily Waste Water	300.000	042	10190001625562	
2	190810	Oily Sludge	50.000	042	10190000825494	
3	160708	Yellow Oil And Caustic Soda	0.000	042	10190107125533	
4	190810	Oily Waste Water	0.000	042	10190107125533	
5	130206	Used Oil (น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว)	0.000	042	10190107125533	
6	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	044	10190000325446	
7	070110	Coke Molecular Sieve	0.000	042	10190104125536	
8	070107	Spent Caustic	0.000	042	10190001625562	
9	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	042	10190001625562	
10	070201	Waste water From Cleaning Yellow Oil and Caustic soda สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442	
11	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	72080000125455	
12	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	033	72020000525320	
13	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	048	72070001525621	
14	150110	Contaminated Container บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีคงค้าง ถุงปนเปื้อน Stabilizer บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	039	10110102325581	
15	160213	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	049	10210333425646	
16	160215	หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	0.000	049	10130001925570	
17	160305	Polymer	0.000	042	10190104125536	
18	160305	Polymer	0.000	048	72070001525621	
19	161001	Chemical Cleaning Waste Water	0.000	065	91060300125410	
20	170603	Insulation (Rock wool Ceramic Fiber) Insulation (foam glass)	5.000	045	10130001925570	
21	170604	Insulation (Polyurethane foam)	5.000	042	10190104125536	
22	190905	Rensin	0.000	042	10190003325500	
23	150111	Spray Can	0.000	049	72080000125455	
24	160709	Monoethanolamine and Water	0.000	042	10190001625562	
25	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210004225564	
26	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10110100225577	
27	170402	อลูมิเนียม	0.000	011	10210005325595	
28	170405	เหล็ก	0.000	011	10210004225564	
29	170405	เหล็ก	0.000	011	10210259425638	
30	170405	เหล็ก	0.000	011	10110100225577	
31	170405	เหล็ก	0.000	011	10210005325595	
32	150101	กระดาษ	0.000	011	10210004225564	
33	191204	ปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติก	0.000	011	10110100225577	
34	160216	สายไฟ	0.000	011	10210004225564	
35	160216	สายไฟ	0.000	011	10210259425638	
36	160216	สายไฟ	0.000	011	10110100225577	
37	160216	สายไฟ	0.000	011	10210005325595	
38	150202	Monoethanolamine and Water Sand rock contaminatedฯ with oil and chemical Oil Contaminated Garbage Spent Activated carbon contaminated Air Filter Resin	0.000	044	10190000325446	

หนังสือแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

(ข้อมูลแสดงชนิดและปริมาณกากของเสีย ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่โครงการโรงโอเลฟินส์ 1 โรงโอเลฟินส์ 4 หน่วยผลิตไฟฟ้า (Power Plant) และโรงงานผลิตสารโพลิเอทิลีน (HDPE2) โดยการรายงานปริมาณของกากของเสียของโรงงานที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานราชการ จึงครอบคลุมรายละเอียดของทั้ง 3 โครงการดังกล่าว)

เลขที่อ้างอิง 1-19-0169-116948-0-N

69-040 แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน : 72070002725352

สถานที่ตั้งโรงงาน : 14 หมู่ที่ 0 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000325446

สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง : Q-SH-UT

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Air Filter	150202	Roll off	1	3.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 3 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย[redacted]

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted]69

ปริมาณที่ส่งมอบ : 3 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 30/01/2569

เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 30/01/2569

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000325446

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : มายังจังหวัด :

ใช้ระยะเวลา : วัน

วันที่มาถึง :

เวลาที่มาถึง :

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : เวลาที่มอบ :

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :

ปริมาณคงเหลือ : ตัน

[ ] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ลายมือชื่อ : วันที่ :

เลขที่อ้างอิง 1-19-0369-043293-0-N

69-094 แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน : 72070002725352
สถานที่ตั้งโรงงาน : 14 หมู่ที่ 0 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000325446
สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Air Filter	150202	Roll off	1	3.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 3 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] 0/03/2569

ปริมาณที่ส่งมอบ : 3 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 10/03/2569
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 10/03/2569

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000325446

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : มายังจังหวัด :
ใช้ระยะเวลา : วัน
วันที่มาถึง :
เวลาที่มาถึง :

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : เวลาที่มอบ :
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :
ปริมาณคงเหลือ : ตัน
[ ] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนขยะมูลฝอย

ติดไว้ในที่เปิดเผย

ให้มาต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียม
ก่อนวันที่ 21 กันยายน 2569 มิฉะนั้น จะถูก
ปรับอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียม
ขอใบอนุญาตทุกครั้งนำใบอนุญาตเดิมมาด้วย

ใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขน / กำจัด ขยะมูลฝอย
โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ

เล่มที่ - เลขที่ 6 ปี 2568

อนุญาตให้ ~~บุคคลธรรมดา~~ นิติบุคคล ชื่อ **บริษัท ไทยเอ็นวิรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด**
อายุ - ปี สัญชาติ - เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0 1035 35035 75 8
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 112/45 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ถนน -
ตำบล/~~แขวง~~ บางจาก อำเภอ/~~เขต~~ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-8175950-3 โทรสาร 02-8177183

ประกอบกิจการ เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
โดยการคิดค่าบริการ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลมาบตาพุด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
ค่าธรรมเนียม 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ RCPT-0382/68 ลงวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า บริษัท ไทยเอ็นวิรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 112/45
ตรอก/ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ถนน - ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-8175950-3 โทรสาร 02-8177183

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

(1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
(2) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
(3) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560

ใบอนุญาตนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569
ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(ลายมือชื่อ) .....
(นายสุเมธ คณฑา)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลิกกิจการแจ้งก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 30 วัน

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ

.....

ใบอนุญาตเล่มที่ - เลขที่ 6 ปี 2568

ผู้ได้รับอนุญาต : **บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด**
เลขที่ 112/45 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทขยะมูลฝอยที่เก็บขน : มูลฝอยติดเชื้อ

สถานที่ที่เก็บขน :
1. **บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด**
เลขที่ 8 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. **บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด สาขา 00001**
เลขที่ 5 ถ.ไอ-เจ็ด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
3. **บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด สาขา 00002**
เลขที่ 8 ถ.ไอ-สอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
4. **บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด**
เลขที่ 5/1 ถ.ไอ-เจ็ด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
5. **คลินิกปันน้ำใจ**
เลขที่ 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
6. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 1**
เลขที่ 59 ถ.ราษฎร์นิยม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
7. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2**
เลขที่ 14 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
8. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3**
เลขที่ 9 ถ.ไอ-สี่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
9. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4**
เลขที่ 4 ถ.ไอ-สอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
10. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5**
เลขที่ 98/9 ถ.ทางหลวง 3191 นิคมฯอาร์ไอแอล ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
11. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6**
เลขที่ 8 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
12. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11**
เลขที่ 8 ถ.ผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
13. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12**
เลขที่ 8 ถ.ไอ-สิบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
14. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 16**
เลขที่ 9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
15. **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 17**
เลขที่ 7 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

16. บริษัท พีทีที...

16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 18
เลขที่ 9 ซ.จี-เก้า ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

17. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 19
เลขที่ 12 ซ.จี-สี่ ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

18. บริษัท จีซี โพลิออลส์ จำกัด
เลขที่ 9 ซอยจี-สิบสี่ ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

19. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด
เลขที่ 6 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

20. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 22/2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ข้อปฏิบัติ : ผู้ได้รับอนุญาตฯ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องรักษาคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจฯ ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติของเทศบาลฯ ตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินกิจการตามใบอนุญาต

2. ต้องปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจการที่แสดงไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตเมื่อตกลงให้บริการกับผู้รับบริการรายใด จะต้องจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้รับบริการรายนั้น โดยในสัญญานั้นอย่างน้อยจะต้องกำหนดเงื่อนไข วิธีการให้บริการ อัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ความรับผิดในกรณีผิดสัญญาการให้บริการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ และผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับบริการทุกครั้งที่ให้บริการ โดยสัญญาที่จัดทำนั้นผู้ได้รับใบอนุญาตต้องพร้อมที่จะให้เทศบาลตรวจสอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญา

4. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่

4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

4.3 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560

5. หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต หากผู้ได้รับใบอนุญาตตกลงให้บริการกับผู้รับบริการรายใดเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ***ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเทศบาลเมืองมาบตาพุดภายใน 15 วัน หลังจากจัดทำสัญญากับผู้รับบริการรายนั้นๆ***

6. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ

ลงชื่อ.....(นายสุเมธ คณฑา).....ผู้อนุญาต
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ **ใบอนุญาตเล่มที่** - **เลขที่** 6 **ปี** 2568 รับทราบเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ [redacted] ผู้ได้รับอนุญาต
(.....)

สรุปชนิดและปริมาณกากของเสีย
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

Waste Summary Report 2026

Power Plant

Hazardous waste

Item	Type of waste	Waste Code	Disposed by	2026						Total (Kg.)
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	
1	Air Filter	15 02 02	044 : เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์	870.0	0.0	290.0	0.0	0.0	0.0	1,160.0
2	Spent Activated Carbon	19 09 04	055 : เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	20,000.0
Total (Kg.)				870.0	0.0	290.0	0.0	20,000.0	0.0	21,160.0

ภาคผนวก ข.15

ข้อกำหนดผู้ว่าจ้างด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1
รายละเอียดของงานจ้างและหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติหน้าที่และยินยอมผูกพันตน ตามขอบเขตของงาน และเงื่อนไขที่ได้ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1แห่งสัญญานี้

1. **ขอบเขตงาน**
   1.1 ประเภทของของเสีย

รายการหลัก

No.	Company	Branch	Plant	รายการ Waste	รหัส 6 หลัก
1	GC			Insulation (Rock Wool,Ceramic Fiber)	17 06 03 HA
2	GC			Fluorescent	16 02 15 HA
3	GC			Olgone Catalysts (EM-1800)	16 08 02
4	GC			Insulation	17 06 03
5	GC			ภาชนะปนเปื้อน (Lab Bottle)	15 01 10 HA
6	GC			Waste Water Sludge	07 01 11 HA
7	GC			สารเคมีเสื่อมสภาพ	16 05 08 HA
8	GC			Gas in pressure container	16 05 04 HA
9	GC			ภาชนะปนเปื้อน (Lab Bottle)	15 01 10 HA
10	GC			Contaminated Container	15 01 10
11	GC			Insulation (Rock wool , Ceramic Fiber)	17 06 03
12	GC			Oily Sludge	19 08 10
13	GC			กระป๋องสีและกระป๋องทินเนอร์ใช้งานแล้ว	15 01 10
14	GC			ถังพลาสติกเปล่าขนาด 200 ลิตร	15 01 10

No.	Company	Branch	Plant	รายการ Waste	รหัส 6 หลัก
15	GC			Insulation (Rock wool , Ceramic Fiber)	17 06 03
16	GC			กระป๋องสีและกระป๋องทินเนอร์ใช้งานแล้ว	15 01 10
17	GC			Catalyst in Mineral oil	07 02 14 HM

รายการรอง

No.	Company	Branch	Plant	รายการ Waste	รหัส 6 หลัก
1	GC			Contaminated Container	15 01 10 HA
2	GC			Copper Slage	12 01 16 HA
3	GC			Fluorescent	16 02 15
4	GC			Empty contaminated container / Oily contaminated material	15 01 10
5	GC			Insulation (Rock Wool)	17 06 03 HA
6	GC			Activated Carbon	15 02 02 HA
7	GC			Sulfur Scrubber Waste	05 01 16 HA
8	GC			Insulation (Rock Wool,Ceramic Fiber)	17 06 03 HA
9	GC			Fluorescent	16 02 15 HA
10	GC			Refractory Brick	16 11 05 HA
11	GC			Oily Sand	17 05 05 HA
12	GC			Oil Contaminated Soil	17 05 03 HA
13	GC			ขยะทั่วไป (RDF)	19 12 10
14	GC			กระป๋องสีและกระป๋องทินเนอร์ใช้งานแล้ว	15 01 10 HM
15	GC			Insulation (rock wool)	17 06 03 HM

No.	Company	Branch	Plant	รายการ Waste	รหัส 6 หลัก
16	GC			Battery เสื่อมสภาพ	16 06 01
17	GC			Insulation (Foam Glass)	17 06 03
18	GC			Spray Can	15 01 11
19	GC			Waste Lab	16 05 06
20	GC			ถังโลหะเปล่าขนาด 200 ลิตร	15 01 10
21	GC			Air Filter	15 02 02
22	GC			Filter กรองน้ำมัน	15 02 02 HM
23	GC			ถังน้ำยาแอร์	16 05 04 HM
24	GC			Insulation (Rock Wool)	17 06 03 HM
25	GC			สารเคมีหมดอายุ	07 01 99
26	GC			Insulation (Rock wool, Ceremic Fiber)	17 06 03
27	GC			Waste Lab	16 05 06
28	GC			Contaminated container	150110
29	GC			หลอดไฟชำรุด	160215
30	GC			Empty contaminated container / Oily contaminated material	15 01 10

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอาจตกลงกันในภายหลังเพื่อเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรหัสของของเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของสัญญา

1.2 รายละเอียดการให้บริการ

1.2.1 ผู้รับจ้างต้องรับดำเนินการจัดการกากของเสียของอุตสาหกรรม ตามที่บริษัทกำหนด

1.2.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการนำกากของเสียอุสาหกรรม ของบริษัทออกจากพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดหรือบำบัดตามหลักวิชาการตามที่ได้รับจาก GC และบริษัทในเครือพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปส่งมอบงานภายใน 15 วันหลังจากการดำเนินงาน (ขึ้นอยู่กับรายการที่ GC และบริษัทในเครือต้องการ)

1.2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหารถที่มีการติดตั้งระบบ GPS ในการขนส่งทุกคัน

1.2.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลรายละเอียดของปริมาณการขนส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวกับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายและข้อมูลเส้นทางการขนส่ง และระยะเวลาการเดินทางจากสถานที่รับกากของเสียไปยังสถานที่กำจัดของเสีย (GPS) Data Logger ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่นำกากของเสียอุตสาหกรรมออกนอกพื้นที่

1.2.5 กรณีที่มีปริมาณกากของเสียเกิดขึ้นในโรงงานเป็นจำนวนมาก บริษัทสามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการนำกากของเสียอันตรายออกจากพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดหรือบำบัดตามหลักวิชาการ โดย GC และบริษัทในเครือจะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนและปริมาณกากของเสีย โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการนำกากของเสียออกจากพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดหรือบำบัดตามหลักวิชาการภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

1.2.6 รถขนส่งจะต้องติดป้ายแสดงสถานะว่า เป็นรถขนกากของเสีย พร้อมระบุเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

1.2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด

1.2.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหายานพาหนะ อุปกรณ์ แรงงานในการสนับสนุนการขนกากของเสียขึ้นรถขนส่งเพื่อบรรทุกให้เพียงพอและเหมาะสม

1.2.9 ผู้รับจ้างต้องเสนอเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมโดยจะต้องหลีกเลี่ยงการผ่านพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตในการดำเนินการในเส้นทางดังกล่าว จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบรรษัทในเครือ ก่อนเริ่มดำเนินการ

1.2.10 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนทุกครั้งที่มีการติดต่อ การดำเนินการขนส่ง การแจ้งรายละเอียดต่างๆ

1.2.11 ผู้รับจ้างจะต้องนำภาชนะที่บรรจุของเสียที่ได้ขนออกไปจากพื้นที่กลับมาคืนให้ครบถ้วนโดยภาชนะที่ส่งกลับคืนจะต้องอยู่ในสภาพดี หรือสภาพเดิมที่ได้ขนออกจากพื้นที่และสภาพเหมาะกับการใช้งานต่อไป

1.2.12 ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำข้อมูลหรือเอกสารที่เกิดขึ้นจากการรับจ้างงานให้กับบริษัทไปเผยแพร่กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

1.2.13 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งกากของเสียให้กับผู้รับจ้าง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการจัดการกากของเสีย

1.2.14 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งกากของเสียให้กับผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างรายอื่น กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการจัดการกากของเสียให้ได้ทันเวลาที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

1.2.15 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ให้กับบริษัททุกครั้งที่มีการดำเนินการจัดการกากของเสีย ทั้งนี้ต้องลงรายละเอียดให้ครบถ้วนและใช้ตัวบรรจง

1.2.16 ผู้รับจ้างต้องแจ้งข้อมูลการรับดำเนินการกากของเสียพร้อมรายละเอียดทั้งหมดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-license) ทันทีที่กากของเสียออกนอกบริษัท

1.2.17 ในการขออนุญาตทุกกรณีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-license) ผู้รับจ้างต้องตอบรับการดำเนินการอย่างไม่รีรอ และผู้รับจ้างมีหน้าที่เร่งรัดการอนุมัติกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำการพิจารณาอย่างเร็วที่สุด

1.2.18 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ค่าความเป็นอันตรายในห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานของกากของเสียทุกรายการหากบริษัทร้องขอ และต้องส่งผลการวิเคราะห์ให้กับทางบริษัทรับทราบด้วย

1.2.19 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการร่วมพิจารณารหัสของชนิดและประเภทของกากของเสีย รวมทั้งรหัสวิธีการกำจัดด้วย

1.2.20 ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการในการควบคุม ทำลายหรือกำจัดโลโก้ของผลิตภัณฑ์/โลโก้บริษัท หรือเครื่องหมายอื่นใดที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของบริษัทในกลุ่ม GC ที่ปรากฏอยู่บนกากของเสียก่อนออกจากนอกบริษัท

1.2.21 กรณีผสมรวม ผู้รับจ้างจะต้องจำแนกแยกแยะปริมาณก่อนการนำไปผสมรวมและหลังผสมรวม เพื่อแสดงว่ามีการดำเนินการส่งกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุไม่ใช้แล้วขั้นสุดท้ายตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอย่างครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์

1.2.22 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียให้พร้อมใช้งานก่อนวันที่บริษัทในกลุ่มเรียกใช้บริการขณะเข้ามาวางภาชนะบรรจุของเสีย และในกรณีที่ภาชนะบรรจุของเสียไม่มีฝาผิดต้องมีผ้าใบคลุมตลอดเวลาขณะเคลื่อนย้ายทุกกรณี

1.2.23 ผู้รับจ้างจะต้องมีแผนการตรวจสอบภาชนะบรรจุของเสียพร้อมผลการตรวจสอบ

1.2.24 ผู้รับจ้างจะต้องจัดคนขับรถเข้าอบรมความปลอดภัยและทำบัตรตามข้อกำหนดของ GC และบริษัทในเครือให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการขนส่งกากของเสียในโรงงาน ซึ่งระเบียบการอบรมจะเป็นไปตามที่แต่บริษัทกำหนด

1.2.25 สภาพรถขนส่งของเสียอันตรายจะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของ GC และบริษัทในเครือ

1.2.26 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการจ้างเหมาดำเนินการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้กับ GC และบริษัทในเครือพร้อมพัสดุ/อุปกรณ์ (ถ้ามี) ตลอดอายุสัญญา และระหว่างเวลารับประกันผลงาน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ คุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ตลอดจนงานดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่กำหนด หรือ ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ภาคผนวก ข.16

เอกสารโครงการปรับลดหรือนำของเสียกลับไปใช้ใหม่

โครงการปรับลดหรือนำของเสียกลับไปใช้ใหม่

- โครงการแยก Oily waste ออกจาก Polymer
- การลดปริมาณน้ำเสีย โดยหลัก 3Rs
- โครงการคัดแยก Insulation
- โครงการคัดแยกภาชนะปนเปื้อน
- โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)
- โครงการคัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการคัดแยก Air Filter
- โครงการ Green Turn Around
- โครงการธนาคารขยะในโรงงาน
- โครงการ Zero Waste to Landfill

ประเภท Waste	มาตรการ
Air filter	▪ แยกกระดาษกรองและโครงสังกะสีออกจากกัน เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม
Insulation	▪ งานซ่อมบำรุงที่ต้องรื้อฉนวนที่ติดตั้งไว้ตามอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรต่างๆ กำหนดให้มีการใช้ซ้ำ (Reuse) ▪ ส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์
Molecular sieve	▪ ส่งกำจัดด้วยวิธีการปรับคุณภาพ (Fuel blending) ▪ ส่งกำจัดด้วยวิธีวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์
Copper slag, Sand blast	▪ นำกลับโลหะที่มีค่าเพื่อนำส่งขายต่อ ▪ ส่งกำจัดด้วยวิธีวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์

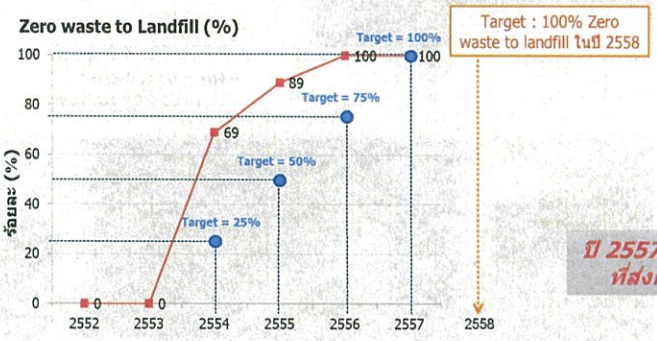

ปี 2557-ปัจจุบัน ไม่มีกากของเสียที่ส่งกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ

โครงการปรับลดหรือนำของเสียกลับไปใช้ใหม่

- **โครงการธนาคารขยะ**

❖ วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน คัดแยกขยะโดยหลัก 3R ก่อนทิ้งลงถัง
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มุ่งสู่องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว หรือ Green Industry ระดับที่ 4
3. เพื่อให้เกิดระบบการจัดการด้านกากของเสียที่ดี ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดยังเทศบาล เพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย และเตรียมความพร้อมสำหรับ Zero Domestic Waste to Landfill

ผลการดำเนินงาน :
ปริมาณขยะทั่วไปที่ไม่ต้องส่งกำจัดที่เทศบาล

- *ปี 2561 ปริมาณ 12,426 กิโลกรัม*
- *ปี 2562 (ม.ค.-ค.ค. 62) ปริมาณ 12,035 กิโลกรัม*

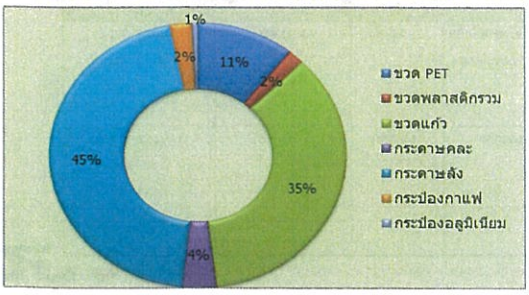

ปริมาณขยะสำนักงานที่นำฝากเข้าธนาคารขยะ GC2

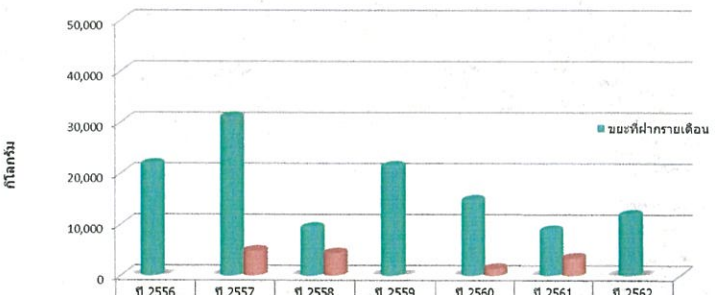

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ขยะที่ฝากรายเดือน	22,055	31,290	9,583	21636	14937	8,985	12,035.00
ขยะที่ฝากช่วงกิจกรรมซ่อมบำรุง		4798.8	4370		1346	3,441	

โครงการปรับลดหรือนำของเสียกลับไปใช้ใหม่

- **โครงการ Green Insulation**

❖ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำ Insulation ที่มีสภาพดี และยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
2. เพื่อลดปริมาณ Waste ตามนโยบาย Zero waste to landfill

หลักการปฏิบัติ :

รื้อ/ถอด เพื่อให้ Insulation เสียหายน้อยที่สุด/ให้อยู่ในสภาพดี

จัดเก็บ Insulation สภาพดี ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุด

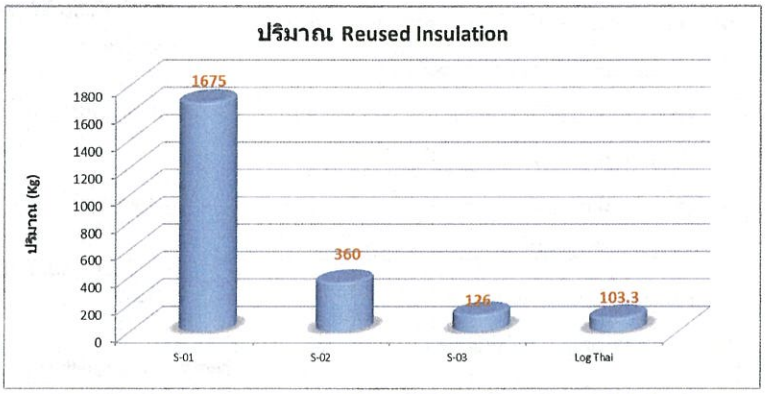

ผลการดำเนินงาน :

- ***ปี 2561 ลดปริมาณเฉลวนที่ส่งกำจัด 2,204 กิโลกรัม***

เครงการปรับลดหรือนำของเสียกลับไปใช้ใหม่

- **Domestic waste reduction**

ปี 2561 ปริมาณ 5,000 ลิตร ลดขยะจากโรงอาหารได้ 750 กิโลกรัม
ปี 2562 ปริมาณ 10,000 ลิตร ลดขยะจากโรงอาหารได้ 2,000 กิโลกรัม

- **โครงการศึกษาการพัฒนาระบบแยก Yellow oil ออกจาก Caustic**

อยู่ระหว่างดำเนินจัดเป็นจัดทำรายงาน IEE เสนอ กนอ. พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA

GC

แบบฟอร์มเสนอแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

OLE1

ENVIRONMENTAL ASPECTS	OBJECTIVES	TARGETS	MAIN ACTIVITIES	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้สนับสนุน / ผู้เกี่ยวข้อง
โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากน้ำ EM	เพื่อสนับสนุนโครงการ Circular economy และเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปุ๋ยเคมี	ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่สีเขียว	นำน้ำ EM ไปเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ในพื้นที่สีเขียว และทดลองใช้งานกับพื้นที่สีเขียว	31 ธ.ค. 62	H-GA-BM	Q-SH-O1, H-GA-BM
ติดตั้งระบบแยก Yellow oil ออกจาก Caustic ที่ระบบ Skim oil at Caustic tower (โครงการ phase ต่อเนื่อง)	ลดกลิ่น, ของเสียที่ส่งกำจัดและ VOCs	-ลดกิจกรรมการแยก Yellow oil ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพผู้ทำงาน -ลดของเสียที่ส่งกำจัดและ VOCs	ปรับปรุง (ขยายหรือออกแบบ) ระบบแยก Yellow oil ออกจาก Caustic	31 ธ.ค. 62	O-P1-TE	O-P1, TP-PP-PA, O-P1-OP1, Q-SH-O1

ภาคผนวก ข.17

รายงานการตรวจสอบการเดินรถขนส่งกากอุตสาหกรรม

รายงานการติดตามยานพาหนะ

Onelink Technology Co.,Ltd.

รายงาน: รายละเอียดการเดินทาง พนักงานขับรถ: [redacted]

ทะเบียน: [redacted] รหัสรถ: [redacted] ตั้งแต่: 30 ม.ค. 69 (ศ.) 8:00 ถึง: 30 ม.ค. 69 (ศ.) 23:59

จอดดับเครื่อง จอดติดเครื่อง เดินทาง ความเร็วเกินกำหนด

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
30 ม.ค. 69 08:00:17	null	null	-	0	0	0	0		74	0.0	0.0	-		บ้านเก่า	พานทอง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:05:17	null	null	-	0	0	0	0		79	0.6	6.4	-		ดอนหัวฬ่อ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:10:17	null	null	-	0	0	0	0		66	0.6	12.9	-		หนองรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:15:17	null	null	-	0	0	0	0		76	0.7	19.4	-		หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:20:17	null	null	-	0	0	0	0		81	0.7	26.0	-		บางพระ	ศรีราชา	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:25:17	null	null	-	0	0	0	0		80	0.6	32.4	-		บางพระ	ศรีราชา	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:30:17	null	null	-	0	0	0	0		85	0.7	38.9	-		หนองขาม	ศรีราชา	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:35:17	null	null	-	0	0	0	0		79	0.7	45.5	-		บึง	ศรีราชา	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:40:17	null	null	-	0	0	0	0		77	0.7	51.9	-		ตะเคียนเตี้ย	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:45:17	null	null	-	0	0	0	0		26	0.1	56.6	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:50:17	null	null	-	0	0	0	0		8	0.0	60.1	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 08:55:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	60.1	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 09:00:17	null	null	-	0	0	0	0		66	0.5	64.8	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 09:05:17	null	null	-	0	0	0	0		77	0.7	71.5	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 09:10:17	null	null	-	0	0	0	0		75	0.6	77.9	-		มะขามคู่	นิคมพัฒนา	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:15:17	null	null	-	0	0	0	0		78	0.7	84.7	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:20:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	87.6	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:25:17	null	null	-	0	0	0	0		83	0.7	90.9	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:30:17	null	null	-	0	0	0	0		80	0.6	94.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:35:17	null	null	-	0	0	0	0		75	0.6	97.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:40:12	null	null	-	0	0	0	0		4	0.0	101.2	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:45:17	null	null	-	0	0	0	0		46	0.3	102.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
30 ม.ค. 69 09:50:17	null	null	-	0	0	0	0		22	0.1	105.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 09:55:17	null	null	-	0	0	0	0		37	0.3	107.6	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	107.9	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:05:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	107.9	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:10:12	null	null	-	0	0	0	0		6	0.0	108.2	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:15:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	109.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:20:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	109.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:25:17	null	null	-	0	0	0	0		3	0.1	109.7	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:30:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	110.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:35:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	110.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:40:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	110.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:45:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	110.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:50:16	null	null	-	0	0	0	0		11	0.0	110.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 10:55:17	null	null	-	0	0	0	0		38	0.1	112.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	112.4	-		ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:05:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	112.4	-		ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:10:17	null	null	-	0	0	0	0		60	0.4	114.4	-		ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:15:17	null	null	-	0	0	0	0		23	0.0	116.4	-		ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:20:17	null	null	-	0	0	0	0		23	0.3	120.7	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:25:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	122.1	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:30:17	null	null	-	0	0	0	0		58	0.5	126.9	-		นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:35:17	null	null	-	0	0	0	0		80	0.7	133.1	-		มะขามคู่	นิคมพัฒนา	ระยอง
30 ม.ค. 69 11:40:17	null	null	-	0	0	0	0		89	0.7	138.6	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 11:45:17	null	null	-	0	0	0	0		49	0.5	144.1	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 11:50:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 11:55:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:05:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:10:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ่นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
30 ม.ค. 69 12:15:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:20:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:25:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:30:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:35:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:40:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:45:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:50:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 12:55:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:05:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:10:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:15:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:20:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:25:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:30:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:35:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:40:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:45:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:50:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 13:55:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:05:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:10:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:15:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:20:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:25:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:30:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:35:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ่นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
30 ม.ค. 69 14:40:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:45:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:50:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 14:55:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:05:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:10:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:15:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	144.9	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:20:17	null	null	-	0	0	0	0		56	0.5	147.5	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:25:17	null	null	-	0	0	0	0		71	0.6	152.7	-		เขาไม้แก้ว	บางละมุง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:30:17	null	null	-	0	0	0	0		69	0.6	158.6	-		บ่อวิน	ศรีราชา	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:35:17	null	null	-	0	0	0	0		68	0.6	164.3	-		บ่อวิน	ศรีราชา	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:40:17	null	null	-	0	0	0	0		73	0.6	169.8	-		เขาคันทรง	ศรีราชา	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:45:17	null	null	-	0	0	0	0		67	0.5	175.3	-		คลองกิว	บ้านบึง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:50:17	null	null	-	0	0	0	0		71	0.6	181.2	-		คลองกิว	บ้านบึง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 15:55:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	185.7	-		หนองไผ่แก้ว	บ้านบึง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:00:17	null	null	-	0	0	0	0		63	0.5	189.1	-		หนองอิรุณ	บ้านบึง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:05:17	null	null	-	0	0	0	0		41	0.3	193.0	-		หนองอิรุณ	บ้านบึง	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:10:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	197.4	-		หมอนนาง	พนัสนิคม	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:15:17	null	null	-	0	0	0	0		64	0.5	200.2	-		หมอนนาง	พนัสนิคม	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:20:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	204.3	-		ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:25:17	null	null	-	0	0	0	0		68	0.5	206.0	-		ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:30:17	null	null	-	0	0	0	0		69	0.6	211.9	-		นาวังหิน	พนัสนิคม	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:35:17	null	null	-	0	0	0	0		17	0.1	215.3	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:40:17	null	null	-	0	0	0	0		73	0.7	220.5	-		หัวถนน	พนัสนิคม	ชลบุรี
30 ม.ค. 69 16:45:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	225.0	-		วังเย็น	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 16:50:17	null	null	-	0	0	0	0		55	0.4	227.2	-		วังเย็น	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 16:55:17	null	null	-	0	0	0	0		79	0.6	232.5	-		หัวสำโรง	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	235.6	-		หัวสำโรง	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
30 ม.ค. 69 17:05:17	null	null	-	0	0	0	0		76	0.6	240.5	-		ท่าทองหลาง	บางคล้า	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:10:17	null	null	-	0	0	0	0		54	0.4	245.1	-		เมืองใหม่	ราชสาสน์	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:15:17	null	null	-	0	0	0	0		64	0.5	249.2	-		เมืองใหม่	ราชสาสน์	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:20:17	null	null	-	0	0	0	0		56	0.5	254.5	-		เมืองเก่า	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:25:17	null	null	-	0	0	0	0		70	0.6	259.9	-		บางคา	ราชสาสน์	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:30:17	null	null	-	0	0	0	0		59	0.5	264.1	-		ดงน้อย	ราชสาสน์	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:35:17	null	null	-	0	0	0	0		72	0.6	267.4	-		ดงน้อย	ราชสาสน์	ฉะเชิงเทรา
30 ม.ค. 69 17:40:17	null	null	-	0	0	0	0		75	0.6	273.2	-		กระทุ่มแพ้ว	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 17:45:17	null	null	-	0	0	0	0		79	0.7	277.6	-		บางปลาร้า	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 17:50:17	null	null	-	0	0	0	0		66	0.5	283.7	-		บางพลวง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 17:55:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	288.3	-		บ้านสร้าง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 18:00:17	null	null	-	0	0	0	0		18	0.3	290.4	-		บ้านสร้าง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 18:05:17	null	null	-	0	0	0	0		36	0.1	292.7	-		บ้านสร้าง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 18:10:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	292.9	-		บ้านสร้าง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 18:15:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	292.9	-		บ้านสร้าง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
30 ม.ค. 69 18:20:17	null	null	-	0	0	0	0		44	0.2	296.6	-		ศรีจุฬา	เมืองนครนายก	นครนายก
30 ม.ค. 69 18:25:17	null	null	-	0	0	0	0		67	0.6	302.4	-		ศรีจุฬา	เมืองนครนายก	นครนายก
30 ม.ค. 69 18:30:17	null	null	-	0	0	0	0		76	0.6	308.3	-		ดงละคร	เมืองนครนายก	นครนายก
30 ม.ค. 69 18:35:17	null	null	-	0	0	0	0		67	0.5	314.4	-		ท่าช้าง	เมืองนครนายก	นครนายก
30 ม.ค. 69 18:40:17	null	null	-	0	0	0	0		13	0.0	315.3	-		นครนายก	เมืองนครนายก	นครนายก
30 ม.ค. 69 18:45:17	null	null	-	0	0	0	0		57	0.6	320.4	-		พรหมณี	เมืองนครนายก	นครนายก
30 ม.ค. 69 18:50:17	null	null	-	0	0	0	0		66	0.4	323.0	-		พรหมณี	เมืองนครนายก	นครนายก
30 ม.ค. 69 18:55:17	null	null	-	0	0	0	0		53	0.4	328.1	-		บ้านพร้าว	บ้านนา	นครนายก
30 ม.ค. 69 19:00:17	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	331.6	-		บ้านนา	บ้านนา	นครนายก
30 ม.ค. 69 19:05:17	null	null	-	0	0	0	0		11	0.1	332.4	-		บ้านนา	บ้านนา	นครนายก
30 ม.ค. 69 19:10:17	null	null	-	0	0	0	0		79	0.7	335.1	-		ป่าขะ	บ้านนา	นครนายก
30 ม.ค. 69 19:15:17	null	null	-	0	0	0	0		73	0.6	341.3	-		เขาเพิม	บ้านนา	นครนายก
30 ม.ค. 69 19:20:17	null	null	-	0	0	0	0		76	0.7	347.7	-		ขะอม	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 19:25:17	null	null	-	0	0	0	0		90	0.6	354.2	-		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
30 ม.ค. 69 19:30:17	null	null	-	0	0	0	0		60	0.5	360.4	-		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 21:38:17	30 ม.ค. 69 19:33:47	30 ม.ค. 69 21:45:13	0 วัน 02 ชม 11 นาที	0	0	0	0		0	0.0	362.1	-		ข่าผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 21:45:13	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	362.1	-		ข่าผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 21:50:13	null	null	-	0	0	0	0		51	0.4	364.6	-		ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 21:55:13	null	null	-	0	0	0	0		59	0.5	369.1	-		ตาลเดียว	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:00:13	null	null	-	0	0	0	0		54	0.4	374.0	-		บ้านป่า	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:05:13	null	null	-	0	0	0	0		67	0.6	378.7	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:10:13	null	null	-	0	0	0	0		46	0.4	383.7	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:17:13	30 ม.ค. 69 22:14:43	30 ม.ค. 69 22:17:43	0 วัน 00 ชม 03 นาที	0	0	0	0		0	0.0	385.9	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:17:43	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	385.9	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:31:43	30 ม.ค. 69 22:19:13	30 ม.ค. 69 22:32:13	0 วัน 00 ชม 13 นาที	0	0	0	0		0	0.0	386.0	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:32:13	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	386.0	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:44:43	30 ม.ค. 69 22:33:43	30 ม.ค. 69 22:45:13	0 วัน 00 ชม 11 นาที	0	0	0	0		0	0.0	386.0	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:45:13	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	386.0	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:50:13	null	null	-	0	0	0	0		10	0.1	387.1	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 22:55:13	null	null	-	0	0	0	0		22	0.2	388.2	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:00:13	null	null	-	0	0	0	0		16	0.1	390.1	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:05:13	null	null	-	0	0	0	0		18	0.1	392.2	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:10:13	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	393.5	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:15:13	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	393.6	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:20:13	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	393.7	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:25:13	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	393.7	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:30:13	null	null	-	0	0	0	0		5	0.2	394.5	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:35:13	null	null	-	0	0	0	0		31	0.3	396.5	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:40:13	null	null	-	0	0	0	0		26	0.3	398.2	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:45:09	null	null	-	0	0	0	0		11	0.0	398.9	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:50:13	null	null	-	0	0	0	0		62	0.5	403.3	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:55:13	null	null	-	0	0	0	0		72	0.6	409.4	-		บ้านป่า	แก่งคอย	สระบุรี
30 ม.ค. 69 23:59:43	null	null	-	0	0	0	0		54	0.4	413.8	-		ตาลเดียว	แก่งคอย	สระบุรี

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด

ข้อมูล GPS วันที่ : 30/1/2026 ใบกำกับการขนส่งเลขที่ : 11901691169480N

ทะเบียนรถ : [redacted] พนักงานขับรถ: [redacted]

ปลายทางผู้รับกำจัด : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อลูกค้า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง)

ที่อยู่ : เลขที่ 14 ถนน ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

Waste Name: Air Filter

ตารางการเดินรถ

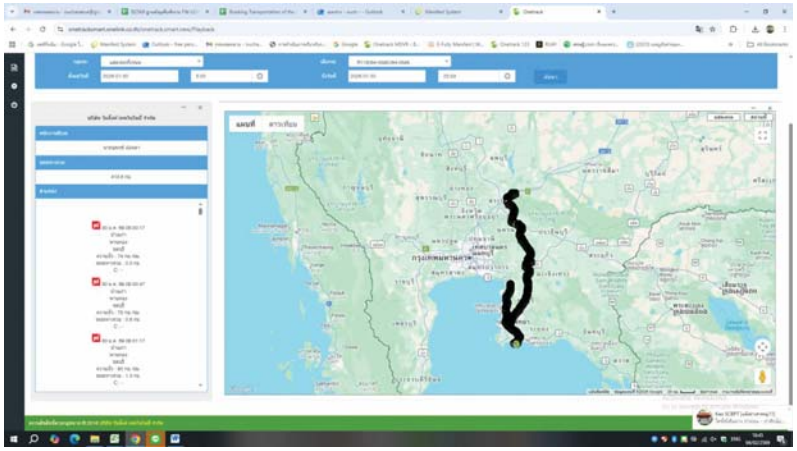

ระยะเวลาทั้งสิ้น	0 วัน 07 ชม 17 นาที
ระยะเวลาที่รถวิ่ง	0 วัน 05 ชม 48 นาที
ระยะเวลาจอด	0 วัน 02 ชม 38 นาที
ระยะทาง	413.8

onetrack

รายงานการติดตามยานพาหนะ

Onelink Technology Co.,Ltd.

รายงาน: รายละเอียดการเดินทาง พนักงานขับรถ: ไม่มีพนักงานขับรถ

ทะเบียน: [redacted] รหัสรถ: [redacted] ตั้งแต่: 10 มี.ค. 69 (อ.) 8:00 ถึง: 10 มี.ค. 69 (อ.) 23:59

จอดดับเครื่อง จอดติดเครื่อง เดินทาง ความเร็วเกินกำหนด

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
10 มี.ค. 69 08:00:00	null	null	-	0	0	0	0		61	0.0	0.0	-		ตะเคียนเตี้ย	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 08:04:56	null	null	-	0	0	0	0		53	0.2	4.4	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 08:10:00	null	null	-	0	0	0	0		49	0.2	9.4	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 08:15:00	null	null	-	0	0	0	0		54	0.2	14.4	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 08:20:00	null	null	-	0	0	0	0		61	0.1	19.5	-		มะขามคู่	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 08:25:00	null	null	-	0	0	0	0		62	0.1	24.9	-		มะขามคู่	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 08:29:59	null	null	-	0	0	0	0		76	0.2	30.8	-		นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 08:35:00	null	null	-	0	0	0	0		7	0.0	35.1	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 08:39:57	null	null	-	0	0	0	0		76	0.2	36.9	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 08:44:52	null	null	-	0	0	0	0		53	0.2	40.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 08:50:00	null	null	-	0	0	0	0		34	0.2	44.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 08:55:00	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	45.7	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:01:00	10 มี.ค. 69 08:58:06	10 มี.ค. 69 09:01:19	0 วัน 00 ชม 03 นาที	0	0	0	0		0	0.0	45.7	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:01:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	45.7	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:06:30	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	46.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:11:30	null	null	-	0	0	0	0		13	0.1	46.6	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:18:30	10 มี.ค. 69 09:14:07	10 มี.ค. 69 09:18:53	0 วัน 00 ชม 04 นาที	0	0	0	0		0	0.0	46.9	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:18:53	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	46.9	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:24:00	null	null	-	0	0	0	0		16	0.1	47.6	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:29:00	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	48.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:36:00	10 มี.ค. 69 09:31:21	10 มี.ค. 69 09:41:04	0 วัน 00 ชม 09 นาที	0	0	0	0		0	0.0	48.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:41:04	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	48.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
10 มี.ค. 69 09:46:00	null	null	-	0	0	0	0		46	0.1	49.4	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 09:54:22	10 มี.ค. 69 09:49:24	10 มี.ค. 69 10:15:33	0 วัน 00 ชม 26 นาที	0	0	0	0		0	0.0	50.3	-		ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 10:15:33	null	null	-	0	0	0	0		19	0.0	50.3	-		ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 10:20:39	null	null	-	0	0	0	0		42	0.2	54.6	-		ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง
10 มี.ค. 69 10:25:40	null	null	-	0	0	0	0		43	0.2	57.9	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 10:30:43	null	null	-	0	0	0	0		65	0.2	62.5	-		มาบข่า	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 10:35:44	null	null	-	0	0	0	0		59	0.2	67.7	-		มะขามคู่	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 10:40:39	null	null	-	0	0	0	0		54	0.2	72.6	-		มะขามคู่	นิคมพัฒนา	ระยอง
10 มี.ค. 69 10:45:42	null	null	-	0	0	0	0		60	0.2	78.1	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 10:50:42	null	null	-	0	0	0	0		77	0.2	83.8	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 10:55:46	null	null	-	0	0	0	0		61	0.2	89.4	-		โป่ง	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:00:43	null	null	-	0	0	0	0		69	0.2	93.7	-		หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:05:38	null	null	-	0	0	0	0		66	0.2	99.1	-		บึง	ศรีราชา	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:10:33	null	null	-	0	0	0	0		71	0.2	104.6	-		บึง	ศรีราชา	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:15:37	null	null	-	0	0	0	0		67	0.2	110.2	-		สุรศักดิ์	ศรีราชา	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:20:38	null	null	-	0	0	0	0		69	0.2	115.9	-		บางพระ	ศรีราชา	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:25:40	null	null	-	0	0	0	0		63	0.2	121.5	-		บางพระ	ศรีราชา	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:30:43	null	null	-	0	0	0	0		64	0.2	127.2	-		หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:35:41	null	null	-	0	0	0	0		63	0.2	131.8	-		หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:40:45	null	null	-	0	0	0	0		65	0.2	137.2	-		นาป่า	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:45:50	null	null	-	0	0	0	0		66	0.2	142.8	-		ดอนหัวฬ่อ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:50:50	null	null	-	0	0	0	0		68	0.2	148.1	-		บางนาง	พานทอง	ชลบุรี
10 มี.ค. 69 11:55:50	null	null	-	0	0	0	0		67	0.1	153.7	-		เขาดิน	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:00:50	null	null	-	0	0	0	0		41	0.1	159.1	-		ท่าสะอ้าน	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:05:50	null	null	-	0	0	0	0		55	0.1	160.5	-		ท่าสะอ้าน	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:10:49	null	null	-	0	0	0	0		56	0.2	165.6	-		ลาดขวาง	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:15:50	null	null	-	0	0	0	0		34	0.1	169.0	-		คลองประเวศ	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:20:50	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	169.9	-		คลองประเวศ	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:25:50	null	null	-	0	0	0	0		30	0.2	173.1	-		หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
10 มี.ค. 69 12:30:50	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	174.0	-		หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:35:50	null	null	-	0	0	0	0		62	0.1	178.4	-		วังตะเคียน	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:40:50	null	null	-	0	0	0	0		54	0.2	182.3	-		ท่าไข่	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:45:50	null	null	-	0	0	0	0		4	0.0	187.1	-		บางขวัญ	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:50:45	null	null	-	0	0	0	0		58	0.2	189.9	-		โพรงอากาศ	บางน้าเปรียว	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 12:55:50	null	null	-	0	0	0	0		41	0.2	194.9	-		โพรงอากาศ	บางน้าเปรียว	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 13:00:50	null	null	-	0	0	0	0		50	0.1	197.0	-		บางน้าเปรียว	บางน้าเปรียว	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 13:05:50	null	null	-	0	0	0	0		56	0.2	202.0	-		สิงโตทอง	บางน้าเปรียว	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 13:10:50	null	null	-	0	0	0	0		61	0.2	207.0	-		ดอนเกาะกา	บางน้าเปรียว	ฉะเชิงเทรา
10 มี.ค. 69 13:15:50	null	null	-	0	0	0	0		35	0.2	211.7	-		บางสมบูรณ์	องครักษ์	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:20:50	null	null	-	0	0	0	0		64	0.2	216.5	-		บางลูกเสือ	องครักษ์	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:25:50	null	null	-	0	0	0	0		53	0.1	220.4	-		บางลูกเสือ	องครักษ์	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:30:50	null	null	-	0	0	0	0		63	0.1	225.4	-		องครักษ์	องครักษ์	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:35:50	null	null	-	0	0	0	0		58	0.1	228.6	-		องครักษ์	องครักษ์	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:40:50	null	null	-	0	0	0	0		63	0.2	231.8	-		คลองใหญ่	องครักษ์	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:45:50	null	null	-	0	0	0	0		60	0.1	236.9	-		ทรายมูล	องครักษ์	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:50:48	null	null	-	0	0	0	0		64	0.2	242.0	-		ทองหลาง	บ้านนา	นครนายก
10 มี.ค. 69 13:55:44	null	null	-	0	0	0	0		60	0.2	246.2	-		ทองหลาง	บ้านนา	นครนายก
10 มี.ค. 69 14:00:43	null	null	-	0	0	0	0		29	0.1	251.0	-		บ้านนา	บ้านนา	นครนายก
10 มี.ค. 69 14:05:48	null	null	-	0	0	0	0		59	0.2	253.0	-		ป่าขะ	บ้านนา	นครนายก
10 มี.ค. 69 14:10:50	null	null	-	0	0	0	0		63	0.1	258.2	-		ป่าขะ	บ้านนา	นครนายก
10 มี.ค. 69 14:15:49	null	null	-	0	0	0	0		67	0.2	263.5	-		เขาเพิม	บ้านนา	นครนายก
10 มี.ค. 69 14:20:50	null	null	-	0	0	0	0		56	0.2	268.6	-		ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 14:25:50	null	null	-	0	0	0	0		62	0.1	273.6	-		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 14:30:48	null	null	-	0	0	0	0		66	0.2	278.9	-		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 14:35:50	null	null	-	0	0	0	0		60	0.2	281.3	-		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 14:40:46	null	null	-	0	0	0	0		65	0.2	286.4	-		ตาลเดียว	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 14:45:47	null	null	-	0	0	0	0		50	0.2	291.6	-		แก่งคอย	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 14:50:42	null	null	-	0	0	0	0		64	0.2	295.9	-		บ้านป่า	แก่งคอย	สระบุรี

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
10 มี.ค. 69 14:55:45	null	null	-	0	0	0	0		57	0.2	300.7	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:00:44	null	null	-	0	0	0	0		16	0.2	305.3	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:05:50	10 มี.ค. 69 15:05:50	10 มี.ค. 69 15:05:50	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:05:50	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:10:50	10 มี.ค. 69 15:06:20	10 มี.ค. 69 15:29:00	0 วัน 00 ชม 22 นาที	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:29:00	null	null	-	0	0	0	0		8	0.1	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:34:47	10 มี.ค. 69 15:29:31	10 มี.ค. 69 15:35:01	0 วัน 00 ชม 05 นาที	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:35:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 15:39:47	10 มี.ค. 69 15:35:06	10 มี.ค. 69 16:32:08	0 วัน 00 ชม 57 นาที	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 16:32:08	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 16:37:26	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 16:42:26	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 17:53:48	10 มี.ค. 69 16:45:06	10 มี.ค. 69 17:54:07	0 วัน 01 ชม 09 นาที	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 17:54:07	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 17:59:48	10 มี.ค. 69 17:54:08	10 มี.ค. 69 18:07:01	0 วัน 00 ชม 12 นาที	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:07:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	305.4	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:12:19	null	null	-	0	0	0	0		12	0.1	305.8	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:17:19	null	null	-	0	0	0	0		16	0.1	306.7	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:22:16	null	null	-	0	0	0	0		20	0.1	308.2	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:27:14	null	null	-	0	0	0	0		11	0.1	309.8	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:32:19	null	null	-	0	0	0	0		22	0.1	311.5	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:37:17	null	null	-	0	0	0	0		7	0.0	312.9	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:42:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.1	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:47:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.1	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:52:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.1	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 18:57:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.1	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:02:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.1	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:07:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.2	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:12:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.2	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซ็นเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
10 มี.ค. 69 19:17:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	313.3	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:22:14	null	null	-	0	0	0	0		29	0.2	314.6	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:27:19	null	null	-	0	0	0	0		15	0.1	316.7	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:32:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	318.0	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:37:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	318.0	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:42:19	null	null	-	0	0	0	0		11	0.1	318.3	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:47:14	null	null	-	0	0	0	0		37	0.2	319.3	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:52:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	320.8	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 19:57:14	null	null	-	0	0	0	0		55	0.2	322.9	-		ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 20:02:12	null	null	-	0	0	0	0		63	0.2	328.5	-		บ้านป่า	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 20:07:13	null	null	-	0	0	0	0		54	0.2	333.3	-		ตาลเตี้ยว	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 20:12:12	null	null	-	0	0	0	0		64	0.2	338.5	-		ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 20:17:19	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	340.9	-		ช่าผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 20:22:14	null	null	-	0	0	0	0		17	0.0	343.5	-		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 20:27:17	null	null	-	0	0	0	0		9	0.0	345.0	-		ช่าผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี
10 มี.ค. 69 20:34:19	10 มี.ค. 69 20:29:49	10 มี.ค. 69 20:34:19	0 วัน 00 ชม 04 นาที	0	0	0	0		0	0.0	345.1	-		ช่าผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี

เวลาเดินทางรวม	0 วัน 06 ชม 53 นาที
รวมเวลาเดินเบา	0 วัน 02 ชม 01 นาที
รวมเวลาจอด	0 วัน 03 ชม 39 นาที
ระยะทางรวม	345.1

TARF

บริษัท ทีเอาร์เอฟ จำกัด

ข้อมูล GPS วันที่ : 10/3/2026

ใบกำกับการขนส่งเลขที่ : 1190369043293ON

ทะเบียนรถ : [redacted]

พนักงานขับรถ: [redacted]

ปลายทางผู้รับกำจัด : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน3

ชื่อลูกค้า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง)

ที่อยู่ : เลขที่ 14 ถนน ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

Waste Name: Air Filter

ตารางการเดินรถ

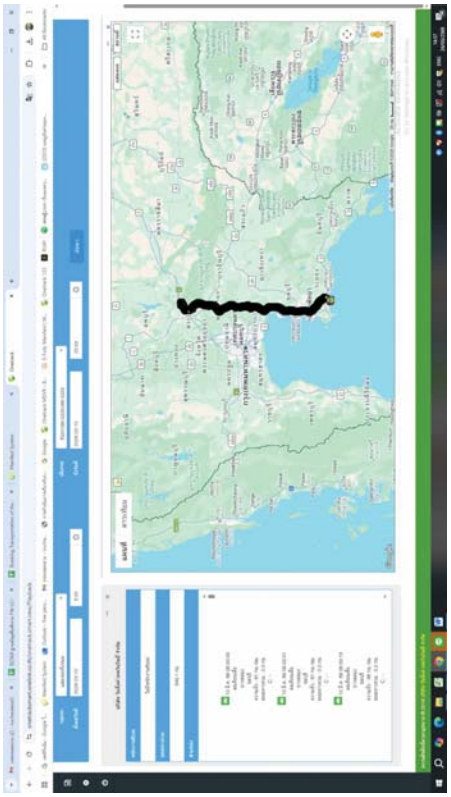

ภาคผนวก ข.18

เอกสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ

ประจำปี พ.ศ.2569

สรุปการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
UTY (Jetty & Power plant)

รายงานโดย หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่ 1
ฝ่ายบริหารกิจการเพื่อสังคม
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569

2026 UTY CSR Programs

STATUS: ● Done ● On plan ● Delay ● Not Start/Hold

CSR Portfolio	Projects	Status / Time Period	Activities	Focus Area	Focal Point	Target/Result
Environment ดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากร	โครงการเก็บขยะชายหาด	● On plan	ทำความสะอาดชายหาด	ชายหาด BTF Jetty	Pramuk (U-CM-OP) C-SR-CR1	• ปริมาณขยะทั่วไป • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50 คน
Economy สนับสนุนส่งเสริมรายได้สู่ชุมชน	โครงการพัฒนาอาชีพประมง	● On plan	สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล	กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยายชา	Anusorn (U-TM-RM) C-SR-CR1	• จำนวนสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น • รายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/เดือน
Quality of Life ส่งเสริมความปลอดภัยชุมชนอย่างมีมาตรฐาน	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	● Done	ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลกรณีไฟฟ้าดูดไฟรั่ว ไฟช็อต	รร.วัดโขดหิน	Chaowalit (U-TM-EN) C-SR-CR1	• จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน • มีความเข้าใจมากขึ้นในระดับดีมาก (>86-90%)
	โครงการ Light for the Better Living	● Done	บำรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงหลอดไฟ LED	รร.วัดโขดหิน	Anusorn (U-TM-RM) C-SR-CR1	• ปริมาณไฟ (ยูนิต)
Health ดูแลสุขภาวะอนามัย	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	● On plan	กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรค NCDS	รพ.สต. เกาะกก	Anucha (U-CM-OP) C-SR-CR1	• จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50 คน • ค่ามาตรฐานของร่างกายดีขึ้น
Education ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ	โครงการแนะแนวอาชีพ (โครงการนักล่าฝัน สู่อาชีพในอนาคต ปี 3)	● On plan	กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ ให้กับน้องๆ นักเรียนและคณะผู้ปกครอง	โรงเรียนในพื้นที่การดูแล/ขยายโอกาส รวม 10 แห่ง	Worasorn (U-P1-TE) C-SR-CR1	• นักเรียนตอบความต้องการทางอาชีพของตัวเองได้ • คะแนนความพึงพอใจ • จำนวนผู้เข้าร่วม xx คน
Relations สานสัมพันธ์กับชุมชน	Get Together กิจกรรม ประเพณีชุมชนในพื้นที่	● On plan	ร่วมกิจกรรม ประเพณีชุมชนในพื้นที่ อาทิ - งานปีใหม่ / งานบุญข้าวหลาม / งานสงกรานต์ - งานกฐิน ผ้าป่า Get Together	ชุมชนรอบรั้วโรงงาน	All	• ผู้บริหารและพนักงาน UTY ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี

Private & Confidential

Environment
สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมกิจกรรม โครงการเก็บขยะชายหาด

กิจกรรม

โครงการเก็บขยะชายหาด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้จิตอาสามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานจิตอาสา

เวลาดำเนินงาน

มีนาคม – สิงหาคม 2569
(ทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

ผลการดำเนินงาน

- ✓ เก็บขยะชายหาด 4/6 ครั้ง
- ✓ ปริมาณขยะ จำนวน 3,209 กิโลกรัม
- ✓ ปริมาณขวดพลาสติก จำนวน 3.6 กิโลกรัม

ณ ชายหาด **BTF JETTY**

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

Health
สุขภาพ

ความปลอดภัย

การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมกิจกรรม โครงการสร้างสุขชะลอวัย ห่างไกลโรค NCDs

กิจกรรม

โครงการสร้างสุขชะลอวัย ห่างไกลโรค NCDs เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสร้างการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุจากศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง ของเทศบาลนครมาบตาพุด

เวลาดำเนินงาน

พฤษภาคม – สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงาน

- ✓ ผู้สูงอายุมีอัตราการน้ำหนักลดลง %
- ✓ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ %

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ณ **GC RO** , ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

Quality of life
ความปลอดภัย

การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

ครู และนักเรียน

เวลาดำเนินงาน

12 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงาน

- ✓ นักเรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- ✓ นักเรียนมีความพึงพอใจ 80.32 %

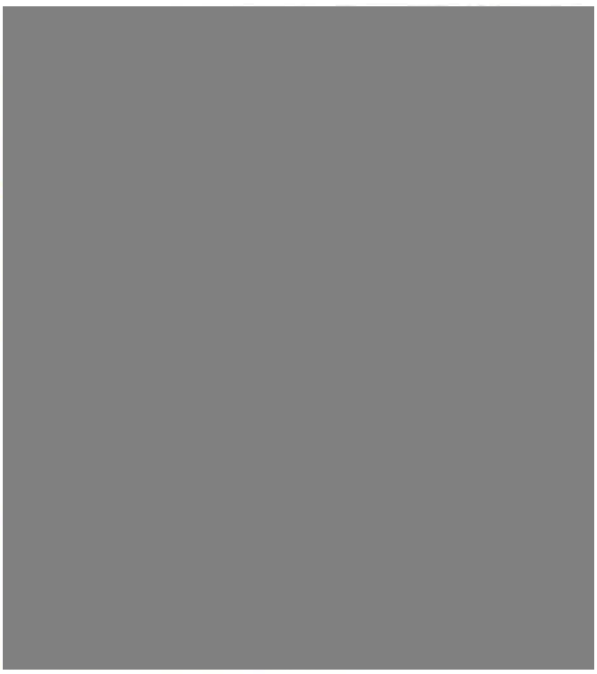

ณ โรงเรียนวัดตากวน

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

Quality of life
ความปลอดภัย

การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการ Light for better Living

กิจกรรม

โครงการ Light for better Living เพื่อบำรุงซ่อมแซมและเพิ่มแสงสว่างในการใช้งานให้กับคุณครูและนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักเรียน

เวลาดำเนินงาน

12 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงาน

- ✓ ดำเนินการติดหลอดไฟ จำนวน 6 หลอด
- ✓ นักเรียนมีความพึงพอใจ 80.32 %

ณ โรงเรียนวัดโขดหิน

ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2569

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

Education
การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรม

มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนใน 4 เขตเทศบาล (ทน. มาบตาพุด ทม. บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง และ ทต. มาบข่าพัฒนา) และกลุ่มประมงเรือเล็ก 15 กลุ่ม

เวลาดำเนินงาน

เดือน มกราคม 2569

ผลการดำเนินงาน

✓ ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่ชุมชน และโรงเรียน ใน 4 เขตเทศบาล

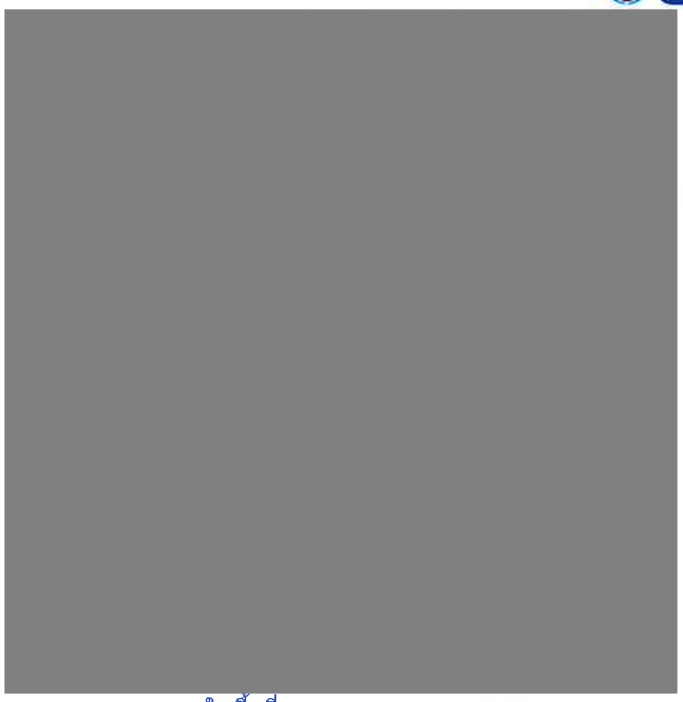

ณ ชุมชนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาลนครมาบตาพุด

ร่วมกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

Education
การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรม

กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลาน ให้แก่ชุมชน 4 เขตเทศบาล รอบรั้วโรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

✓ เยาวชนใน 4 เขตเทศบาล (ทน. มาบตาพุด ทม.บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง และ ทต. มาบข่าพัฒนา) และกลุ่มประมงเรือเล็ก 15 กลุ่ม

เวลาดำเนินงาน

✓ เดือน พ.ค. – มิ.ย 2569

ผลการดำเนินงาน

✓ เยาวชนเข้าร่วมรับทุนกว่า 3,000 คน

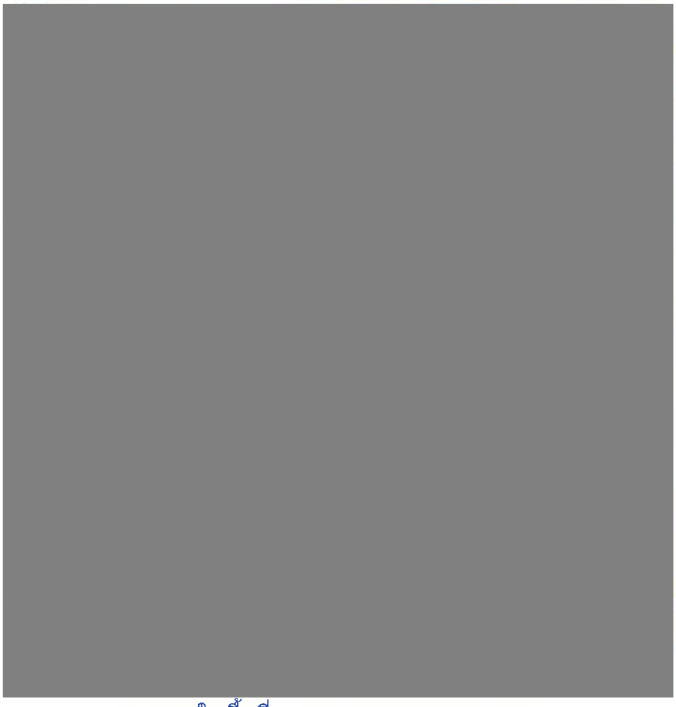

ณ ชุมชนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาลนครมาบตาพุด

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

การศึกษา

Community Relation
สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2569

- **กิจกรรม**

  ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2569 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒธรรมของชุมชน

- **กลุ่มเป้าหมาย**

  ✓ ชุมชนรอบรั้วโรงงาน

- **เวลาดำเนินงาน**

  ✓ เดือน ม.ค. – ก.พ. 2569

- **ผลการดำเนินงาน**

  ✓ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนชุมชน ใน 4 เขตเทศบาล

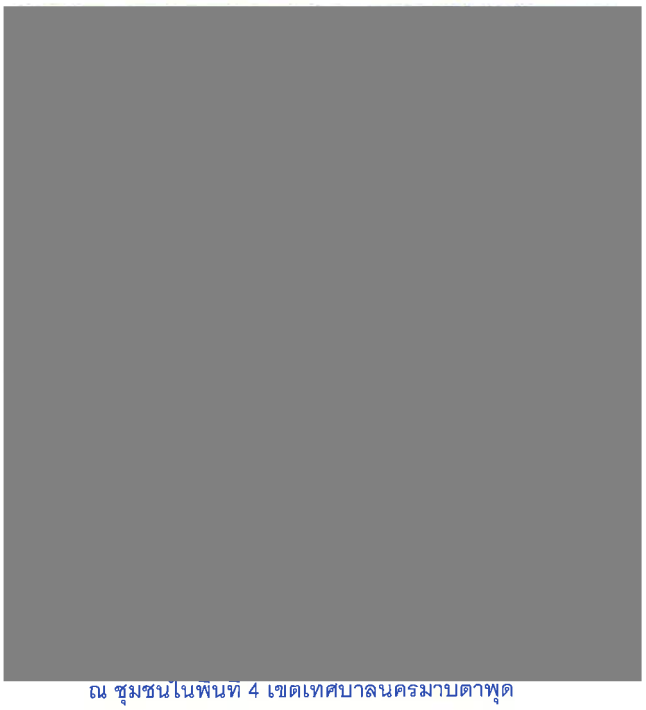

ณ ชุมชนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาลนครมาบตาพุด

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

การศึกษา

Community Relation
สานสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรม Get Together สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน

- **กิจกรรม**

  กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน เพื่อให้ผู้บริหาร พบปะผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ และเปลี่ยนความคิด

- **กลุ่มเป้าหมาย**

  ✓ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนเทศบาลนครมาบตาพุด /เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

  ✓ กลุ่มประมงเรือเล็กฯ จ.ระยอง

- **เวลาดำเนินงาน**

  ✓ วันที่ 11, 24 มิถุนายน 2569

- **ผลการดำเนินงาน**

  ✓ ผู้บริหารและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 170 คน

ณ ร้านอาหารหาดแสงจันทร์ซีฟู้ด

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

การศึกษา

Community Relation
สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569

กิจกรรม

ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒธรรมของชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

✓ ชุมชนรอบรั้วโรงงาน

เวลาดำเนินงาน

✓ เดือน เมษายน 2569

ผลการดำเนินงาน

✓ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนชุมชน ใน 4 เขตเทศบาล

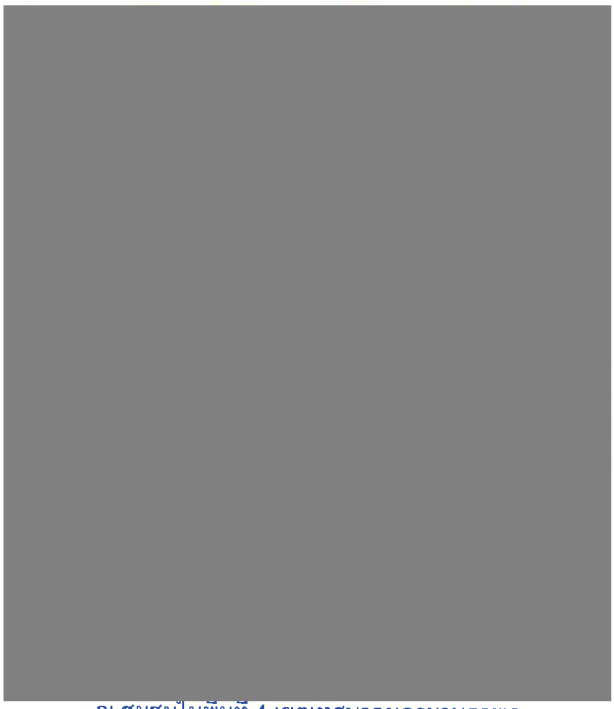

ณ ชุมชนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาลนครมาบตาพุด

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

การศึกษา

Community Relation
สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ประจำปี 2569

กิจกรรม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2569

กลุ่มเป้าหมาย

✓ ชุมชนรอบรั้วโรงงาน

เวลาดำเนินงาน

✓ เดือน มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงาน

✓ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนชุมชน ใน 4 เขตเทศบาล

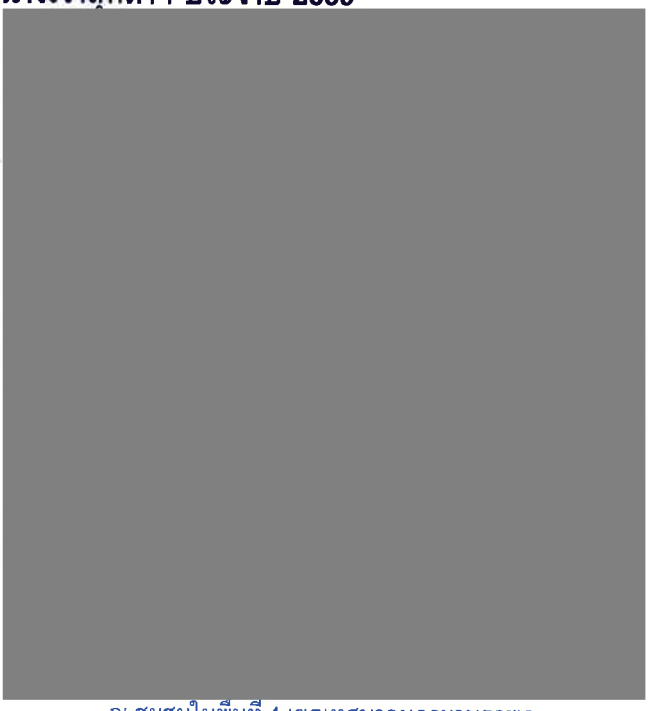

ณ ชุมชนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาลนครมาบตาพุด

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

Education
การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการนักล่าฝัน สู่อาชีพในอนาคต ปี 3

- **กิจกรรม**

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียนและคณะผู้ปกครอง

- **กลุ่มเป้าหมาย**

โรงเรียนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด และ เทศบาลตำบลมาบข่า พัฒนา

- **เวลาดำเนินงาน**

26 – 27 สิงหาคม 2569

- **ผลการดำเนินงาน**

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน Xx คน
นักเรียนมีความพึงพอใจ xx %

อยู่ระหว่างดำเนินการ

สิ่งแวดล้อม

Economy
คุณภาพชีวิต

สุขภาพ

ความปลอดภัย

การศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพประมง

- **กิจกรรม**

โครงการพัฒนาอาชีพประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล

- **กลุ่มเป้าหมาย**

กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยายชา

- **เวลาดำเนินงาน**

มีนาคม – ตุลาคม 2569

- **ผลการดำเนินงาน**

✓ ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น xx บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ภาคผนวก ข.19

Procedure เรื่อง การสื่อสารการมีส่วนร่วม และการปรึกษา สำหรับระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Technical Safety and PSM

P-(Q-TS)-004

Safety Health & Environment (SHE)

Communication and Complaints

จัดทำโดย : [redacted]

(ผู้จัดการส่วนSHE Aromatics 2)

อนุมัติโดย : [redacted]

(ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเทคนิคและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต)

Internal Use Only

ตารางการแจกจ่าย

สำเนาเลขที่	ผู้ถือ	สถานที่
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[redacted]

[redacted]

GC	กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

[redacted]

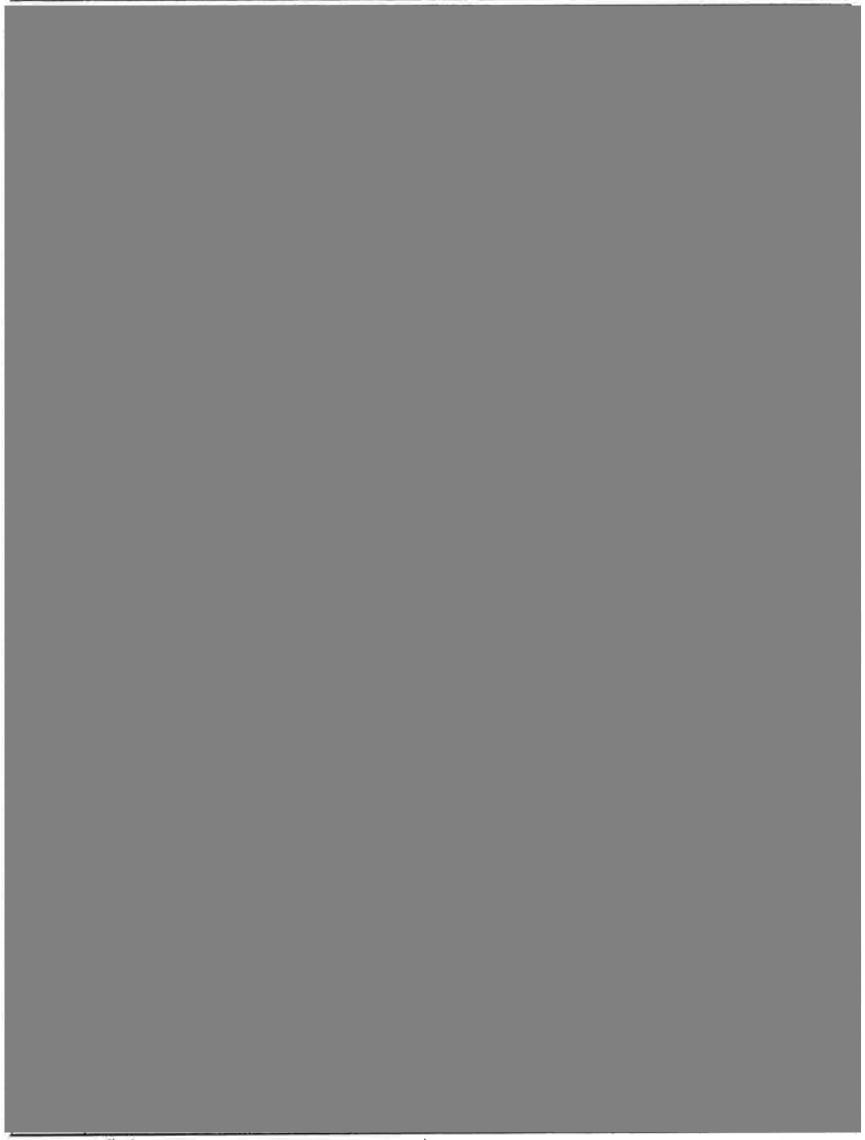





กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

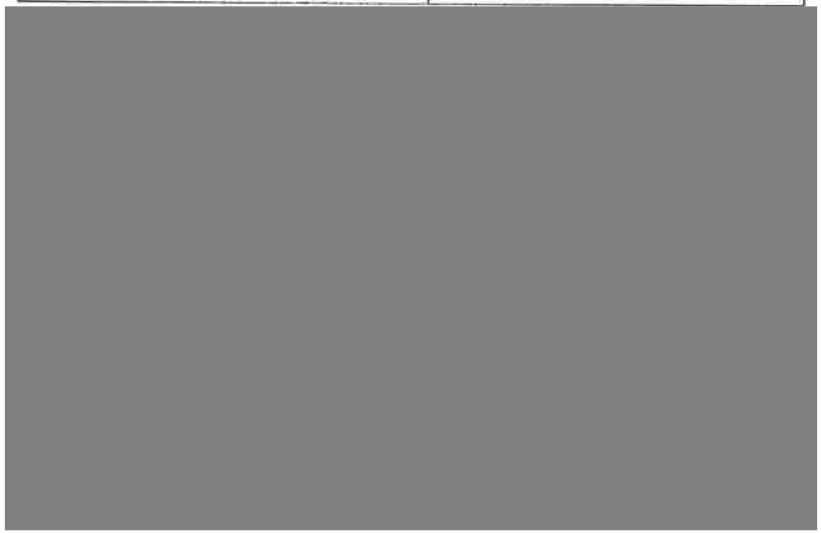



[redacted]

GC กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

[redacted]



4.4 เกณฑ์การนับเรื่องร้องเรียน

[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



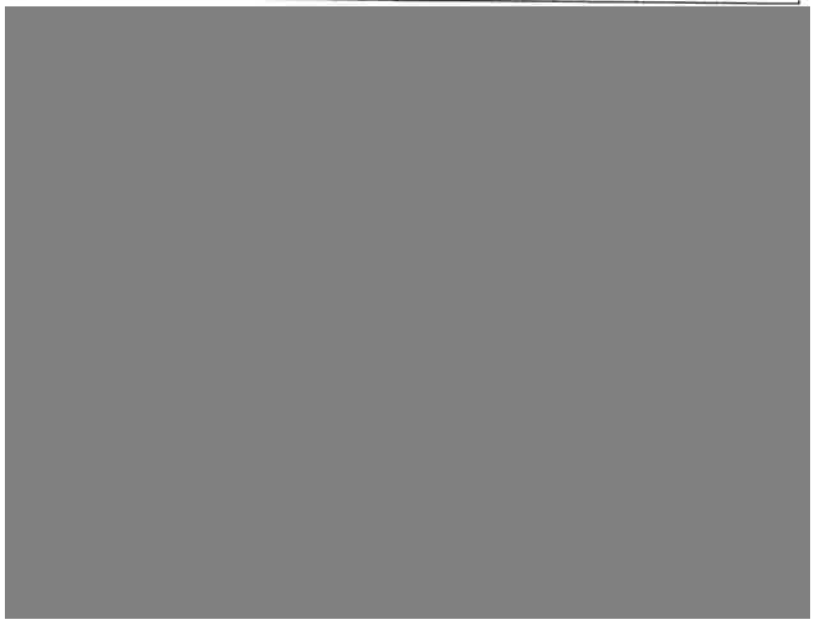

ภาคผนวก ข.20

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม

คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ ๓๓๔ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นั้น

เพื่อให้องค์ประกอบและหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการฯ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเป็นไปตามโครงสร้างปัจจุบันขององค์กร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)	ประธานกรรมการ
๑.๒	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	รองประธานกรรมการ
๑.๓	ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ	กรรมการ
๑.๔	สาธารณสุขจังหวัดระยอง	กรรมการ
๑.๕	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	กรรมการ
๑.๖	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด	กรรมการ
๑.๗	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๘	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๙	กำนันตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๑๐	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๑๒	ประธานชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน ๓ คน	กรรมการ
๑.๑๓	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน ๙ คน	กรรมการ
๑.๑๔	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน ๓ คน	กรรมการ

/๑.๑๕ ผู้แทน...

๑.๑๕	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน ๓ คน	กรรมการ
๑.๑๖	ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็ก	กรรมการ
๑.๑๗	ผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดระยอง	กรรมการ
๑.๑๘	ผู้แทนโครงการกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ประสานงานและกำกับดูแลให้โครงการฯ ดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนของชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ

๒.๓ พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น

๒.๕ ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่อง ให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการฯ ต่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

๒.๖ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๒.๗ พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการฯ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราว ให้เหมาะสมกับชุมชน

๒.๘ พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของโครงการฯ

๒.๙ จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ การดูงานภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และในทุก ๒ ปี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่หรือตามความเหมาะสม

๒.๑๐ กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือมากกว่า หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิริศ อัมระปาล)
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ ๒๗๕ /๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๓๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๓ หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๔ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	กรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๖ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครมาบตาพุด หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๗ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๘ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๙ กำนันเทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๑๐ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด จำนวน ๔ คน	กรรมการ
๑.๑๑ ผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง	กรรมการ
๑.๑๒ ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด จำนวน ๑๐ คน	กรรมการ
๑.๑๓ ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน ๒ คน	กรรมการ
๑.๑๔ ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน ๓ คน	กรรมการ

/๑.๑๕ ผู้แทน...

๑.๑๕ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็ก	กรรมการ
๑.๑๖ ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี ติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ กรรมการอาจพ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนา หรือเมื่อพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อขาดคุณสมบัติของกรรมการ หากมีกรรมการท่านใดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้นจะต้องดำเนินการคัดเลือกกรรมการท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ประสานงานและกำกับ ดูแล ให้โครงการดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนของชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ

๒.๓ พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่องจักร ให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

๒.๕ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราว ให้เหมาะสมกับชุมชน

๒.๗ พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของโครงการฯ

๒.๘ จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ และการศึกษาดูงานภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และในทุก ๒ ปี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่หรือตามความเหมาะสม

๒.๙ เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น

๒.๑๐ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือมากกว่านั้น หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนมวลชนสัมพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ)
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569
ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เรื่อง	ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ครั้งที่	1 / 2569
วันที่	19 กุมภาพันธ์ 2569
สถานที่	ณ ห้องประชุม 1 โรงงานโอเลฟินส์ 3 (GC 11) อาคารดับเพลิง ชั้น 2

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล</u>

1.	[redacted]	นายช่าง 7	ประธานในที่ประชุม
		ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	รองประธานกรรมการ
2.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
		ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)	
3.		นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
		ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดระยอง	
4.		ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
		ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	
5.		รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
		ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง	
6.		เลขานุการฯ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
		ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง	
7.		ผู้ช่วยกำนันตำบลบ้านฉางหมู่ที่ 7	กรรมการ
		ผู้แทน กำนันตำบลบ้านฉางหมู่ที่ 7	
8.		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
		ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง	

9.	[redacted]	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
10.		ประธานชุมชนอิสลาม	กรรมกร
11.		ประธานชุมชนหนองแฟบ	กรรมการ
12.		ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง	กรรมการ
13.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
14.		ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็ก	กรรมการ
15.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
16.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
17.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
18.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
19.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
20.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
21.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
22.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
23.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
24.		ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
25.		ผู้แทน สื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดระยอง	กรรมการ
26.		กรรมการกิตติมศักดิ์	กรรมการ
27.		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1.	[redacted]	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)	ประธาน
2.		นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด	กรรมการ
3.		ผู้แทนชุมชนวัดมาบตาพุด	กรรมการ
4.		เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ	กรรมการ
5.		กรรมการกิตติมศักดิ์	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (ผู้ติดตาม)

1. [redacted] เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)
3. นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล</u>

1. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้จัดการส่วน หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม
3. ผู้จัดการส่วน หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
4. พนักงานชุมชนสัมพันธ์อาวุโส หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
5. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 4 (Olefins Plant 4)
6. ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 2 (HDPE 2)
7. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 2 (Olefins Plant 2)
8. ผู้จัดการส่วน ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ (BTF & Jetty)
9. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 3 (Olefins Plant 3)
10. ผู้จัดการส่วน โรงงานแอลแอลดีพีอี 1
11. ผู้จัดการส่วน โรงงานแอลแอลดีพีอี 2
12. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลดีพีอี (LDPE)
13. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานเอชดีพีอี 1 (HDPE 1)
14. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล (Ethylene Oxide/Ethylene Glycol) และโรงงานเอทานอลเอมีน (Ethanolamine)
15. รักษาการผู้จัดการฝ่าย โรงงานโพลีสไตรีน (GC Styrenics)
16. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานฟีนอล (Phenol)
17. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide)

18. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี โพลีออลส์ (GC Polyols)
19. รักษาการผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี-เอ็ม พีทีเอ (GC-M PTA)
20. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโสและอาชีวอนามัย บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
21. รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) และบริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอล จำกัด (KAC)
22. วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม
23. วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team</u> (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

1. [redacted]
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

<u>วาระที่ 1</u>: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
1.1	[redacted] - แจ้งเพื่อทราบ ผอ.สุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ติดภาระกิจในวันนี้ จึงขอมอบหมายให้ทาง คุณนุชิต สุรกานต์กุล เป็นประธานในที่ประชุมแทน - แจ้งเพื่อทราบ พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ (เจ้าอาวาสวัด-หนองแฟบ) อาพาธ และไม่สามารถมาร่วมประชุมในวันนี้ได้		เพื่อทราบ

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
1.1 (ต่อ)	[redacted] - [redacted] กล่าวเปิดการประชุม และต้อนรับคณะทำงานฯ ทุกท่าน ในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2569 **Safety Share** โดย [redacted] - เรื่อง POMS: นวัตกรรมเฝ้าระวังมลพิษโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม [redacted] - ขอนำเรียนเพิ่มเติม เรื่อง POMS: นวัตกรรมเฝ้าระวังมลพิษโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมโรงงานยังให้ความสำคัญว่าควรนำข้อมูลที่รายงานมา สื่อสารให้กับทางหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว		

<u>วาระที่ 2</u>: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2568

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
2.1	**มติที่ประชุม** - ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2568	ทุกท่าน	เพื่อทราบ

<u>วาระที่ 3</u>: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6 / 2568

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
3.1	- ไม่มี		

<u>วาระที่ 4</u>: การดำเนินงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
4.1	**การดำเนินงาน ด้านมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล** โดย [redacted] **สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม** **ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2569**		เพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1 / 2569
ณ ห้องประชุม 1 โรงงานโอเลฟินส์ 3 (GC 11) อาคารดับเพลิง ชั้น 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

[redacted]

รายงานการประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2569
ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เรื่อง	ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ครั้งที่	2 / 2569
วันที่	29 เมษายน 2569
สถานที่	ณ ห้องประชุม 1 โรงงานโอเลฟินส์ 3 (GC 11) อาคารดับเพลิง ชั้น 2

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล</u>

1.	[redacted]	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)	ประธานในที่ประชุม
2.	[redacted]	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดระยอง	กรรมการ
3.	[redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	กรรมการ
4.	[redacted]	รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
5.	[redacted]	เลขานุการฯ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
6.	[redacted]	ผู้ช่วยกำนันตำบลบ้านฉางหมู่ที่ 7 ผู้แทน กำนันตำบลบ้านฉางหมู่ที่ 7	กรรมการ
7.	[redacted]	ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
8.	[redacted]	ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
9.	[redacted]	ประธานชุมชนหนองแฟบ	กรรมการ

10.	[redacted]	ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง	กรรมการ
11.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
12.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนวัดมาบตาพุด	
13.	[redacted]	ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็ก	กรรมการ
14.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
15.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
16.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
17.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
18.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
19.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลนครมาบตาพุด	กรรมการ
20.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
21.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
22.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
23.	[redacted]	ผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
24.	[redacted]	ผู้แทน สื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดระยอง	กรรมการ
25.	[redacted]	กรรมการกิตติมศักดิ์	กรรมการ
26.	[redacted]	กรรมการกิตติมศักดิ์	กรรมการ
27.	[redacted]	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1.	[redacted]	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	รองประธานกรรมการ
2.	[redacted]	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)	กรรมการ
3.	[redacted]	นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด	กรรมการ
4.	[redacted]	ประธานชุมชนอิสลาม	กรรมการ
5.	[redacted]	เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (ผู้ติดตาม)

1. [redacted] นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล</u>

1. [redacted] ผู้จัดการส่วน หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม
2. ผู้จัดการส่วน หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
3. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
4. ผู้จัดการส่วน SHE โรงงานโอเลฟินส์ 1 (Olefins Plant 1)
5. ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 2 (HDPE 2)
6. ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 2 (Olefins Plant 2)
7. ผู้จัดการส่วน ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ (BTF & Jetty)
8. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 3 (Olefins Plant 3)
9. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลแอลดีพีอี 1, 2
10. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลดีพีอี (LDPE)
11. ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 1 (HDPE 1)
12. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล (Ethylene Oxide/Ethylene Glycol) และโรงงานเอทานอลเอมีน (Ethanolamine)
13. รักษาการผู้จัดการฝ่าย โรงงานโพลีสไตรีน (GC Styrenics)
14. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานฟีนอล (Phenol)
15. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide)
16. ผู้จัดการส่วน โรงงานจีซี โพลีออลส์ (GC Polyols)
17. รักษาการผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี-เอ็ม พีทีเอ (GC-M PTA)
18. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
19. CSR & Administration Section Manager บริษัท คูราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) และบริษัท คูราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอล จำกัด (KAC)
20. [redacted] วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team</u> (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

1. [redacted]
2.
3.
4.
5.

<u>วาระที่ 1</u>: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
1.1	[redacted] - แจ้งเพื่อทราบ ฟรีคอนเสิร์ตใหญ่ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) จังหวัดระยอง เพื่อสังเสริมการท้องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง **Safety Share** โดย [redacted] - เรื่อง ไวรัสตับเสบเอ, บีและซี ป้องกันได้ [redacted] - อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เรื่อง ไวรัสตับเสบเอ, บีและซี ป้องกันได้ รวมทั้งการเดินทางเข้ามาของชาวต้างชาติในประเทศไทย 2. การพบ ผู้ป่วย 3 ราย พื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก้ บ้านค้าย, อำเภอนิคม และอำเภอปลวกแดง		เพื่อทราบ

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
1.1 (ต่อ)	[redacted] - แสดงความคิดเห็น เรื่อง การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว [redacted] - แสดงความคิดเห็น การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว และผลกระทบทางด้านสาธารณสุข [redacted] - กล่าวขอบคุณ [redacted] สำหรับข้อมูลดังกล่าว [redacted] - นำเรียนเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมายหลักที่ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย/ ด้านสาธารณสุข และการจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว		

<u>วาระที่ 2</u>: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / 2569

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
2.1	**มติที่ประชุม** - ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / 2569	ทุกท่าน	เพื่อทราบ

<u>วาระที่ 3</u>: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1 / 2569

หัวข้อ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา
3.1	- ไม่มี		

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2 / 2569
ณ ห้องประชุม 1 โรงงานโอเลฟินส์ 3 (GC 11) อาคารดับเพลิง ชั้น 2 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569

[redacted]

ภาคผนวก ข.21

Procedure เรื่อง การบริหารอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

PTT Global Chemical Public Company Limited
Technical Safety and PSM

P-(Q-TS)-008
Personal Protective Equipment

Internal Use Only

Prepared by: _____
(SHE - Olefins II –Division Manager)

Approved by: _____
(Vice President – Technical Safety and PSM)

Distribution List

Copy No.	Controller/Holder	Location
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]





[redacted]

[redacted]

[redacted]

PTT Global Chemical Public Company Limited | P-(Q-TS)-008: Personal Protective Equipment

[redacted]



ภาคผนวก ข.22

เอกสารการอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ระเบียบในการอบรม

สำหรับผู้เข้าอบรมผ่าน Microsoft Team

- **ปิดไมค์** ขณะมีการนำเสนอ
- **แชท** หากเสียงไม่ชัดเจน สามารถระบุสิ่งที่ต้องการสอบถามในช่อง Chat
- **เปิดกล้องตลอดเวลา** ในการอบรมและสอบ
- **หยุดพัก** 15 นาที
- **กรุณางดใช้**เครื่องมือสื่อสาร
- **ขออนุญาตบันทึกข้อมูลภาพเพื่อประกอบหลักฐานในการอบรมขณะทำงานอบรม**

ต้องกำหนดให้มีผู้ประสานงาน 1 ท่านเข้าร่วมการอบรมผ่านออนไลน์

GC

การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การควบคุมข้อมูลอ่อนไหว

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GC จึงได้ขอให้ทุกท่านลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ ดังนี้

1. ข้อมูลสุขภาพ
   - ✓ เพื่อการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของท่านในระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่ GC
2. ภาพจำลองใบหน้า
   - ✓ เพื่อการรักษาความปลอดภัย และ ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ GC

การควบคุมข้อมูลการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด

1. เพื่อควบคุมการเข้าอาคารสถานที่ ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ์ ป้องกัน และตรวจสอบการเข้าอาคารและสถานที่
2. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา คู่ค้า ผู้มาติดต่อ
3. เพื่อควบคุมการเข้าถึงและรักษาความปลอดภัยแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของบริษัทฯ
4. เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยและดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน

GC

พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- ให้*นายจ้าง*มีหน้าที่*จัดและดูแล*สถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

- *นายจ้าง*ต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และ*ลูกจ้าง*ต้องสวมใส่และดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว

โทษ จำคุก 1 ปี หรือปรับ 4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

GC

GC

หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยเบื้องต้น (Basic Safety Training)

B-CARES

ทำตามกฎ มีวินัย
ไม่ปลอดภัย...พวกเราไม่ทำ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16/07/2024

- **รู้อันตราย**และ**ตระหนัก** ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
- **วิธีการป้องกันอันตราย**
- เมื่อ**เกิดอุบัติเหตุ**ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- กรณี**เกิดเหตุฉุกเฉิน**จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- วัฒนธรรมความปลอดภัย **B-CAREs**

เพราะความปลอดภัย เป็นเรื่องของตัวเรา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว

GC

เพื่อป้องกันความสูญเสีย ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา

GC

สารเคมี อันตรายในพื้นที่ GC

1. ก๊าซ/ ของเหลวไวไฟ

น้ำมันดิบ, แก๊ส LPG

อันตราย: ไวไฟสูง, ระเบิด, ไฟไหม้
กระบบประสาทกลาง เข้าสู่ปอดได้ยาก

2.ก๊าซพิษ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์(ก๊าซไข่เน่า) คอมโมเนีย

อันตราย: สูดดมสอบ เสียชีวิตกันที

GC

สารเคมี อันตรายในพื้นที่ GC

3. สารกัดกร่อน

กรด ด่าง

อันตราย: กัดกร่อนต่อผิวหนังรุนแรง
ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา

4.โลหะหนัก

ปรอท, สารหนู

อันตราย: พิษสะสมในร่างกายระยะยาว
โรคทางระบบประสาทส่วนกลาง ,มะเร็ง

GC

สารเคมี อันตรายในพื้นที่ GC

5.สารก่อมะเร็ง

แบนซีน

อันตราย: อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

สัญลักษณ์ความรุนแรงจากอันตราย ของสารเคมีตามมาตรฐาน NFPA 704

GC

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เข้าใจ และ ปฏิบัติตามกฎ ข้อกำหนด ของ GC อยู่เสมอ
2. แจ้ง หัวหน้า เมื่อพบเห็น สิ่งที่ไม่ปลอดภัย

GC

วัตถุประสงค์ของการอบรม GC

- **รู้อันตราย**และ**ตระหนัก** ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
- **วิธีการป้องกันอันตราย**
- เมื่อ**เกิดอุบัติเหตุ**ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- กรณี**เกิดเหตุฉุกเฉิน**จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- วัฒนธรรมความปลอดภัย **B-CAREs**

เพราะความปลอดภัย เป็นเรื่องของตัวเรา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว

GC

เราจะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร GC

กฎระเบียบความปลอดภัย

1. กฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป
2. กฎชีวิตกษีวิต (Life Saving Rules)
3. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Safety Work Practice)

GC

1. ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยตามที่ GC กำหนด

บัตรประจำตัวผู้รับเหมา

แต่ละช่องบนบัตรบอกอะไรบ้าง

รูปถ่ายเจ้าของบัตร ①

กลุ่มงานที่อบรม และวันหมดอายุ ②

สัญญาจ้างงาน (PO)

③ อายุบัตรอ้างอิงตามอายุการอบรม Basic Safety 2 ปี

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

2. ระเบียบการใช้บัตร

- ✓ **ต้อง**พกบัตรตลอดเวลา
- ✓ **ห้าม**ใช้บัตรผู้อื่น หรือใช้แทนกัน
- ✓ **ห้าม**ปลอมแปลง เลียนแบบบัตร

*หมายเหตุ: หากฝ่าฝืนจะ **Blacklist** มิให้ทำงานภายใน GC Group ได้*

บัตรทักษะ Skill Assessment

- ☐ Soaffolding (นั่งร้าน)
- ☐ Welding & Cutting (เชื่อม ตัด)
- ☐ High Pressure Water Jet (น้ำแรงดันสูง)

3. ห้าม นำไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์จุดไฟเข้าพื้นที่หวงห้าม

- ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค
- ไฟฉาย
- โทรศัพท์มือถือ
- กล้องถ่ายรูป
- วิทยุ หรือเครื่องเล่นเทป
- วิทยุติดตามตัว

4. ห้าม นอนหลับในเขตพื้นที่หวงห้าม

5. ห้าม ผู้มีอายุต่ำกว่า18 ปีเข้ามาทำงานใน GC

6. ห้าม พกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่ GC

7. ห้าม เล่นการพนัน หยอกล้อ และกระเสาะวิวาทกัน

8. ห้ามนำสัตว์เข้ามา และ ห้ามให้อาหารสัตว์

แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเจอในพื้นที่ GC (หมา แมว ลิง **รวมไปถึงสัตว์มีพิษ** งู ผึ้ง ต่อ แตน เป็นต้น)

9. ห้าม นำอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยูทำลังเข้าพื้นที่หวงห้าม

10. สูบบุหรี่ ในพื้นที่ ที่กำหนดเท่านั้น

11. ห้าม นำหรือเสพ สารเสพติดทุกชนิด

รวมถึง**กัญชา** กัญชง และ**กระท่อม** ในพื้นที่ของ GC

โดยจะมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

12. การดำเนินการกรณีเหตุฉุกเฉิน

- เมื่อพบผู้กระทำผิดในพื้นที่ GC Group จะ**ดำเนินคดี**ทุกกรณี เป็นคดีอาญา

13. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันภัยจาก Drone

- **ห้าม**บินโดรนในพื้นที่ GC Group **ก่อนได้รับอนุญาต**

14.ข้อกำหนดการใช้ยานพาหนะ

1. ให้ความร่วมมือในการตรวจยานพาหนะหากมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ รปภ.

2. **ห้าม** ยานพาหนะเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง **เบนซิน(Gasoline) เครื่องยนต์เชื้อเพลิงก๊าซ NGV,LPG** และเชื้อเพลิงร่วม เข้าพื้นที่หวงห้าม
3. จำกัดความเร็วของยานพาหนะ
4. ปฏิบัติตามป้ายจราจรในพื้นที่

4. **ต้อง**คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถตลอดเวลา
5. **จอด**ยานพาหนะ**ห่าง**จากหัวจ่ายน้ำมันเพลิงหรืออุปกรณ์ดูดเติมอื่น ๆ **อย่างน้อย 5 เมตร**
6. ยานพาหนะ **ต้อง**ผ่านการตรวจสอบสภาพแล้วติดสติกเกอร์อนุญาตให้ใช้งานก่อน

***ห้ามบรรทุกคนนั่งท้ายกระบะ

15.ข้อกำหนดการใช้ยานพาหนะในพื้นที่กระบวนการผลิต

1. ต้องได้รับใบอนุญาต Hot Work Permit ทำงานจากฝ่ายผลิต
2. มีถังดับเพลิง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ (Fire Rating = 10A40B)
3. ต้องสวม Exhaust Spark Arrestor ที่ท่อไอเสียก่อนเข้าพื้นที่หวงห้าม (มีตะแกรงครอบท่อ)
4. การจอดรถยนต์ในเขตกระบวนการผลิต ไม่จอดในบริเวณที่ที่กีดขวางการจราจร
   - ดับเครื่องยนต์ ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ค้างไว้
   - ไม่ต้องล็อคประตู ไม่เปิดเครื่องเสียง วิทยุ
   - ไม่ต้องถอดกุญแจออกจากรถ

ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ตรงตามประเภทของยานพาหนะ ทุกกรณี

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

16. การนำวัสดุ สิ่งของเข้า-ออก GC

- นำวัสดุ สิ่งของเข้า - ออกใน GC ต้องเขียนใบคำขอนำของเข้า- ออก (Material Gate Pass) และได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน

ยกเว้น สิ่งของบางรายการ เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋าถือ, เครื่องมือประจำรถ, อุปกรณ์ทีทำ, อาหาร, สิ่งของรางวัล, โทรศัพท์มือถือ, และกล้องถ่ายรูป

17. การตรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ต้อง ส่งอุปกรณ์ให้หน่วยงานซ่อมบำรุง ตรวจรับรองก่อนนำไปใช้งาน
- อุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจจะ ต้อง ติดสติ๊กเกอร์รับรองจาก GC ตามอายุที่ระบุในสติ๊กเกอร์
- ผู้ปฏิบัติงาน ต้อง ตรวจสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน (Pre-Use Inspection)

ตัวอย่าง รูปแบบสติกเกอร์การตรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

18. ยานพาหนะ เช่น รถปั้นจั่น รถกระเช้า รถโฟร์คลิฟต์ และเครื่องจักรกลทุกชนิด

- ต้อง ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานซ่อมบำรุงติดสติ๊กเกอร์รับรอง
- ยานพาหนะที่ผ่านการตรวจจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์รับรองจาก GC
- ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ตัวอย่าง รูปแบบสติกเกอร์ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลทุกชนิด

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

19. การถ่ายภาพ **ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้อนุญาตเด็ดขาด**

- ต้อง ผ่านการอบรมจากหน่วยงาน SHE และขึ้นทะเบียนจาก GC
- ต้อง ขออนุญาตการถ่ายภาพ จาก GC Sponsor เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน Pass บัตร Competency
- ต้อง ได้รับอนุญาตและมีใบ Work permit ตามข้อกำหนดของ GC
- กล้องถ่ายภาพ ต้องผ่านการตรวจสภาพจากทาง GC และมี Sticker

- กรณีพบความผิดปกติ เช่น มีการรั่วไหลของสารไวไฟ ห้ามทำการถ่ายภาพ ณ เวลานั้นๆ
- ห้ามเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขณะใช้งานอยู่ในพื้นที่เขตหวงห้าม

ห้าม ถ่ายภาพภายในบริษัทและส่งออกทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทาง Social Media ขึ้นๆไป ยังบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกอย่างเด็ดขาด

หากไม่ปฏิบัติตาม กฎความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น จะต้องโทษทางวินัยตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และบทลงโทษ ตามที่กฎหมายกำหนด

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-024: การบริหารความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมา ข้อ 6.2 ข้อย่อยที่ 17

20. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE พื้นฐาน และตามความเสี่ยงของงาน

1. ชุดเสื้อแขนยาว และ กางเกงขายาว (เป็นชุด Uniform ของบริษัทนั้นๆ)
   ชนิดผ้าที่ใช้ผลิตชุดปฏิบัติงานต้องเป็นผ้าฝ้าย(Cotton),
   ผ้าทนไฟ (Fire Retardant), ผ้ายีนส์

ห้ามใช้ผ้ายีนส์ยืด,Polyester และ ผ้าร่ม

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

2. มาตรฐานของอุปกรณ์ PPE สำหรับพื้นที่โรงงาน

- ☐ PPE ที่มีจะต้องใช้มาตรฐานรับรอง เหมาะสมกับความเสี่ยง
- ☐ ต้องตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ และต้องไม่หมดอายุ

ตัวอย่าง PPE ที่ต้องสวมใส่ให้ถูกต้องตามความเสี่ยง และประเภทของงาน

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

21. ผู้ปฏิบัติงาน ต้อง สำรวจ ทางออกฉุกเฉินและจุดล้างตา ล้างตัวฉุกเฉิน ในบริเวณที่ทำงาน ก่อนเริ่มงาน

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

22. ห้าม ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่างๆของ GC ในเขตหวงห้าม ก่อนได้รับอนุญาต

(เช่น น้ำดับเพลิง ระบบสาธารณูปการ (ไนโตรเจน, น้ำ, ลม, ไอน้ำ) เป็นต้น)

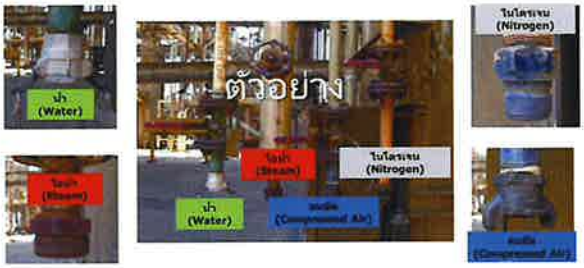

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-010: การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

23. พื้นที่บริเวณทำงานต้องมีการปิดกั้น และป่งบอกอันตรายหากมีงานด้านบนที่อาจมีเศษวัสดุ น้ำ หรือสิ่งใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่องานที่อยู่ด้านล่าง ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่การปฏิบัติงานให้

แถบพลาสติกสีขาวแดง

หมายถึง หยุด เป็นพื้นที่อันตราย ห้ามเข้าและห้ามมุดหรือลอด ผ่านแถบ ขาวแดง โดยเด็ดขาด

แถบพลาสติกสีเหลืองดำ

หมายถึง ระมัดระวัง เป็นพื้นที่อันตราย แถบ เหลืองดำ เตือนถึงสภาพที่อันตราย

ต้องจัดหาเสา, หลักสำหรับเกาะยึดเกี่ยวแถบพลาสติก ห้ามเกาะยึดเกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์การผลิตเด็ดขาด และกั้นให้ห่างจากจุดที่ต้องการปิดกั้น

24.ข้อกำหนดการใช้รถจักรยาน

รถจักรยานต้องขออนุญาตและผ่านการตรวจสภาพจาก Safety ประจำพื้นที่ก่อนนำมาใช้งาน

โดยติดต่อขอและส่งแบบฟอร์มที่ Safety ประจำพื้นที่

- ที่บังคับเลี้ยวไม่คลอน
- สภาพเบรคต้องพร้อมใช้งานทั้งหน้าและหลัง
- สายเบรคไม่มีรอยแข็ง
- สภาพก้อมยางเบรคไม่สึกหรอมาก
- โซ่ไม่แน่น /ไม่ฝืน สนิมและไม่คลอง
- จานคอมโซ่ (chain guard)อยู่ในสภาพดี
- ขาตั้งสภาพสมบูรณ์
- ขาดิบ/บันได ไม่หลุดหัก หรือชำรุด
- ยางไม่แบน,ไม่ฉีก
- สภาพดอกยางนอกไม่สึกมาก
- ยางลมต้องแข็งตัวเสมอ

อุบัติเหตุจากการปั่นจักรยาน

วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2557	1 กรกฎาคม 2557	9 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ	เลี้ยวขึ้นเป็นพื้นต่างระดับ ล้อหน้าได้พ้นพื้นต่างระดับแล้วแต่ล้อหลังยังติดพื้นต่างระดับ ทำให้สะดุดล้มแผลฉีกขาดที่บริเวณต้นขาเป็น11เข็ม	ขณะเลี้ยวได้ชนรถโดนเกิดเหตุจักรยานเสียหลัก เนื่องจากเป็นแอ่งลาดต่างระดับทำให้ล้มและตกลงไปในคูน้ำข้างทาง สะโพกกระแทกกำแพงปูนของคูน้ำ	ขณะนั้นมีรถบริเวณทางโค้งได้หันไปมองยอด Flare ทำให้รถจักรยานเสียหลักตกลงไปในรางระบายน้ำ
ความรุนแรง	Medical Treatment (อุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล)	Lost Time Accident (อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)	Lost Time Accident (อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)
สาเหตุ	ขับไม่พื้นที่ walkway	เลี้ยวโค้งชิดจักรยานโดยไม่ระมัดระวังรถบรรทุกน้ำมากเกินไปไม่สภาพหนวดล้อมพื้นที่ปั่นอันตราย	ไม่มีสติตลอดเวลาขณะปั่นจักรยาน

อุบัติเหตุจากการปั่นจักรยาน

วันที่	7 มกราคม 2563	5 มีนาคม 2563
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ	ขณะปั่นจักรยานข้ามแยกถูกรถกระบะชน	มือข้างหนึ่งพ่วงไปหยิบ Work permit ที่ตระกร้าหน้ารถ ล้อรถจักรยานได้ไปสะดุดกับร่องถนนที่ชำรุดอยู่ ทำให้เสียหลักล้ม
ความรุนแรง	Fatality Case (เสียชีวิต)	Medical Treatment (อุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล)
สาเหตุ	ไม่ได้สังเกตหยุดดูรถหางด้านซ้ายมือก่อนข้ามแยก	ปั่นมือเดียว สะดุดร่องคอนกรีต

ข้อกำหนดในการใช้จักรยาน

1. ต้องมีสมาธิมองไปข้างหน้า ไม่วอกแวกขณะปั่น
2. ต้องหยุดบริเวณทางร่วม ทางแยกเพื่อดูว่าปลอดภัยจึงปั่นผ่านไปได้
3. ต้องจอดรถจักรยานเฉพาะในช่องหรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
4. ต้องขี่จักรยานด้วย 2 มือตลอดเวลา
5. ห้าม ปั่นจักรยานอ้อนศร โดยเด็ดขาด
6. ห้าม ปั่นจักรยานสายไปสายมา
7. ห้าม ใช้จักรยานบรรทุกของหนักโดยเด็ดขาด
8. ห้าม ใช้โทรศัพท์และวิทยุสื่อสารขณะปั่นจักรยาน

กฎระเบียบความปลอดภัย

1. กฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป
2. กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)
3. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Safety Work Practice)

LIFE SAVING RULES (กฎพิทักษ์ชีวิต)

ห้ามฝ่าฝืน
ถ้าพลาดอันตรายถึงชีวิต

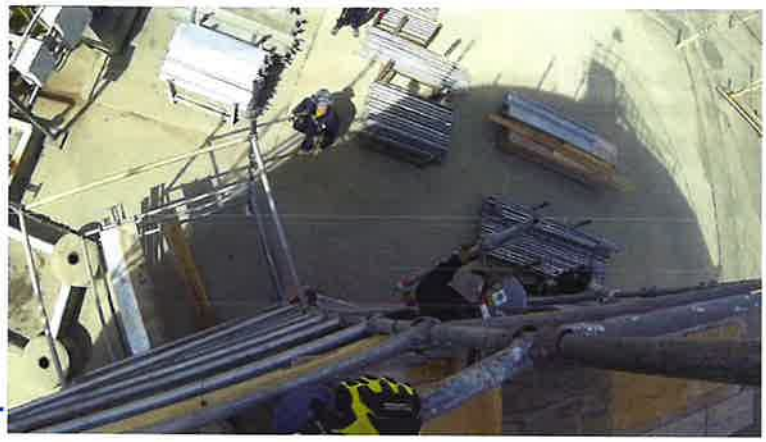

เราจะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

กฎระเบียบความปลอดภัย

1. กฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป
2. กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)
3. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Safety Work Practice)

ภาพจำลองอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากวิถีอันตราย (Line of Fire)

ป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

ให้ปฏิบัติตามป้ายและสัญญลักษณ์ความปลอดภัย ที่ติดหน้างาน

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Safety Work Practice)

มาตรฐาน
ความปลอดภัย GC



แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Safety Work Practice)

ใบอนุญาตทำงาน (Permit To Work)

ไม่มีใบอนุญาตทำงาน = ไม่ต้องทำงาน
No Permit = No Work

❖ เพื่อสื่อสารระหว่างเจ้าของพื้นที่ และเจ้าของงาน
- เตรียมระบบหน้างาน ให้ปลอดภัย
- อันตรายบริเวณทำงาน
- มาตรการป้องกันอันตราย

ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) ต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียน

ประเภทใบอนุญาตทำงาน มี 2 ประเภท

1) ใบอนุญาตหลัก (Main Work Permit)

Hot work permit

สำหรับงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น งานตัด เชื่อม เจียร งานที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า, งานนำรถเข้าพื้นที่หวงห้าม เป็นต้น

Cold work permit

สำหรับงานที่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

2) ใบอนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ (Specific Work Permit)

ต้องได้รับพิจารณาและอนุมัติโดยผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะงานเสี่ยงก่อน

1. งานในที่อับอากาศ
2. งานขุด
3. งานกับมันดริงฮี
4. งานติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน
5. งานไฟฟ้า
6. งานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น
7. งานBox up
8. งานประดาน้ำ
9. งานปิดถนน

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-OEMS-002 Permit to Work System

ข้อกำหนดงาน Hot Work

ความเป็นอันตราย

- ไฟไหม้ ไฟดับ แตกหรือหลุดมากระทบร่างกาย
- เกิดเพลิงไหม้ หากมีสารไวไฟ

1) เลือกใช้เครื่องมือ และ ใบเจียร ตัด ให้ถูกต้อง

2) ต้องตรวจวัดก๊าซไวไฟ ก่อนเริ่มงานและ%LEL = 0 เท่านั้น

3) สวมใส่ PPE ตามความเสี่ยง เช่น กระบังหน้า (Polycarbonate) แว่นตานิรภัย ถุงมือหนัง ที่อุดหู ฯลฯ ที่ได้มาตรฐาน

งานใช้งานนั่งร้าน

ความเป็นอันตราย

- ผู้ปฏิบัติงานพลัดตกจากที่สูง บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- อุปกรณ์นั่งร้านร่วงหล่นถูกผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บรุนแรง
- ถูกหนีบ กระแทก นั่งร้านสำรุด พังถล่ม

1) ห้ามวางของน้ำหนักเกิน ดูแท็คเขียว และตรวจสอบก่อน

2) ต้องตรวจสอบนั่งร้านก่อนการใช้งานทุกวัน

3) ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงแก้ไขนั่งร้าน หากไม่ใช่ผู้ประกอบนั่งร้านที่ได้รับอนุญาต

4) ต้องคล้องเกี่ยวเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว กับจุดที่มั่นคงแข็งแรง

ป้องกันของตกจากที่สูง

ความเป็นอันตราย

- ของร่วงหล่น กระแทกคนได้รับบาดเจ็บ ถึงขั้นเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย

1. ทำงานบน เกรทติ้ง ต้องมีผ้าใบปูรองพื้นกันวัสดุตกหล่น
2. การทำงานใกล้ราวกันตก ต้องมีตาข่ายป้องกัน ของตกหล่นด้านข้าง
3. Stud bolt / Nut จะต้องมีตะกร้า หรือถังสำหรับใส่ป้องกันการ ตก ร่วง หล่น
4. ปิดกั้นพื้นที่ด้านล่างและมีป้ายเตือน

งานติดตั้ง/ถอดประกอบ ท่อ/เครื่องจักร

ความเป็นอันตราย

- ถูกหนีบ กระแทก บดอัด หรือตีมือ

1) ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยก Special tool แทนมือ ช่วยถ่าง ช่วยจับยึด แทนการใช้แรงคน

2) ต้อง ไม่วางมือในจุดหนีบ และให้สัญญาณกัน

3) ต้องสวมถุงมือหนังเมื่อทำงานติดตั้ง/ถอด /ถ่าง ประกอบอุปกรณ์

งานถอดประกอบ ท่อ เครื่องจักร ที่มีสารเคมีหรือไอน้ำร้อน

ความเป็นอันตราย

- สารเคมี น้ำร้อน พุ่งใส่ร่างกายได้รับบาดเจ็บรุนแรง

1. มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดจุดดันไม่มีแรงดัน และ สารเคมีตกค้างในระบบ
2. การถอดหน้าแปลนครั้งแรก (First line breaking) ต้องขันน็อตจากจุดที่ไกลตัว หันลงพื้นดิน และมีภาชนะรองรับ
3. ต้องสวมใส่ PPE ตามความเสี่ยง กระบังหน้าและครองตา / ชุดป้องกันลำตัว / หน้ากากป้องกันทางเดินหายใจ / ถุงมือป้องกันสารเคมี

งานยกโดยปั้นจั่น

ความเป็นอันตราย

- ปั้นจั่นล้ม อุปกรณ์ช่วยยกขาด ทรัพย์สินเสียหาย
- ชิ้นงานร่วงหล่นเสียหายหรือร่วงหล่นทับผู้ปฏิบัติงาน

1) ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในงานยกเด็ดขาด

2) ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในแขวพื้นที่ปิดกั้นงานยก

3) ไม่อยู่ในวิถีอันตรายของงานยก (Line of fire)

งานยกโดยแรงงานคน

ความเป็นอันตราย

- อุปกรณ์หนีบ ทับ กระแทกร่างกายบาดเจ็บรุนแรง
- กล้ามเนื้อฉีกหรือฉีกขาด

1) ต้อง ประเมินน้ำหนัก และรูปร่าง ของสิ่งที่ต้องการยก

2) ต้อง เลือกใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงในการยก (Special- Tool)

3) ห้ามใช้มือประคองอุปกรณ์ในจุดที่อาจจะถูกหนีบ บด อัด กระแทก (Line of Fire)

งานฉีดล้างด้วยน้ำแรงดันสูง

ความเป็นอันตราย

- แรงดันน้ำฉีดถูกร่างกายได้รับบาดเจ็บรุนแรง
- อุปกรณ์ประกอบหลุดกระเด็นถูกร่างกาย
- สัมผัสสารเคมีจากน้ำที่ล้างอุปกรณ์

1) ให้พิจารณาใช้หุ่นยนต์ฉีด Automated Equipment เป็นอันดับแรก แทนการใช้ แส้ หรือ Jetting Gun
2) ตรวจสอบก่อนเริ่มงานด้วยแบบฟอร์มที่ GC กำหนด
3) ต้องปิดกั้นและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้า! ไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน

งานอับอากาศ

ความเป็นอันตราย

- ออกซิเจนต่ำ มีก๊าซพิษ จนขาดอากาศหายใจ
- ตก หล่น ดิด อยู่ในที่อับอากาศ

1. ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่อับอากาศ
2. ต้องประเมินอันตรายและ ตรวจวัดก๊าซ ก่อนเริ่มงานและระหว่างทำงาน
3. ต้องมีการควบคุมทางเข้าออก และลงชื่อ เข้าออก ทุกครั้ง

งานใกล้แหล่งรังสี

ความเป็นอันตราย

- สัมผัสรังสี อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

1) ให้สังเกตป้ายระวังอันตรายบริเวณรังสี
2) ผู้ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานทางรังสีเด็ดขาด
3) อุปกรณ์กัมมันตรังสีผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

งานกับสารเคมีอันตราย

ความเป็นอันตราย

- ผิวหนังสัมผัสสารเคมีเกิดการระคายเคือง แผลไหม้ พุพอง
- ดวงตาสัมผัสสารเคมีสูญเสียการมองเห็น
- สูดดมสารเคมีเป็นอันตรายสุขภาพ

1. ต้องรู้จักลักษณะสารเคมีที่ทำงาน
2. ต้อง ปิดกั้นพื้นที่แยกโซนที่มีการทำงานกับสารเคมีให้ชัดเจน ผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือสวมใส่อุปกรณ์ PPE ไม่ครบ ห้ามเข้า
3. ต้อง ไม่อยู่ใน Line of Fire ที่จะถูกสารเคมีกระเด็นหรือพุ่งใส่

สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ดังนี้

1. ทางการหายใจ

ป้องกันโดย : การสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี, กันฝุ่น

2. ทางปาก

ป้องกันโดย : ล้างมือเสมอก่อนทาน

3. ทางผิวหนัง และดวงตา

ป้องกันโดย : การสวมใส่ถุงมือ ชุดกันสารเคมี แว่นนิรภัย

เพราะฉะนั้น จึงต้องสวมใส่ PPE ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมี, กันฝุ่น ชุด/ถุงมือ/รองเท้าป้องกันสารเคมี และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัส	การปฏิบัติตัวเบื้องต้น
ทางการหายใจ	ทำให้สูดลมหายใจปกติ ให้ออกมาจากพื้นที่ ไปที่อากาศบริสุทธิ์ และแจ้งหัวหน้างาน
ทางตา	ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจากที่ล้างตาฉุกเฉินอย่างน้อย 15 นาที
ทางผิวหนัง	ล้างตัวด้วยน้ำเปล่าจากที่ล้างตัวฉุกเฉินอย่างน้อย 15 นาที

ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency eye washer)

ที่ล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency shower)

สำรวจหาจุด ล้างตัวและตาฉุกเฉิน ก่อนเริ่มงาน

งานขุด

ความเป็นอันตราย

- ขุดไปโดนหรือกระแทกทรัพย์สินเกิดความเสียหาย
- ดินถล่มทับร่างกายผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- ออกซิเจนต่ำ มีก๊าซพิษ จนขาดอากาศหายใจ

1) ต้องไม่อยู่ในวิถีอันตราย ของเครื่องมือที่ใช้ขุด
2) การขุดต้องมีมาตรการป้องกันดินพังทะลาย ตามระดับความลึก มีราวกั้นหรือรั้วกั้นตก และมีป้ายเตือน
3) ต้องมีทางขึ้นลง มีมาตรการงานที่อับอากาศ

งานไฟฟ้า

ความเป็นอันตราย

- ไฟฟ้าช็อต หมดสติ เสียชีวิต

1) ตรวจสอบการต่อลงดินให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มงานเสมอ
2) ห้ามยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือนำวัสดุอื่นใดเข้าใกล้ไฟฟ้า

Specific work (3 กลุ่มงาน)

กลุ่ม 1 Assembly

งานถอดประกอบติดตั้งเครื่องจักร

Pump valve Piping เชื่อมตัดเจียรระบบท่อ งานยกเคลื่อนย้ายด้วยเฮี๊ยบ เครน

กลุ่ม 2 High

งานขึ้นบนที่สูง

งานติดตั้ง ร้ื้อถอนนั่งร้าน งานหุ้ม Insulation งานก่อสร้างใช้นั่งร้าน

กลุ่ม 3 Conf

งานเข้าพื้นที่อับอากาศ

Tank Vessel เตา งานพ่นทราย งานสีภายในถัง

การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

- ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ และจัดเก็บให้เป็นระเบียบก่อนเลิกงาน
- แยกชนิดขยะหรือเศษวัสดุ ให้ถูกต้อง และนำไปทิ้งตามเวลาที่ทาง GC กำหนด
- กรณีพบน้ำมัน หรือสารเคมีหกรั่วไหลให้รีบทำความสะอาด และแจ้งผู้ควบคุมงานของ GC ทันที

การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

- ห้าม!! เทหรือเครนสิ่งใดลงในรางระบายน้ำและพื้นของโรงงานโดยเด็ดขาด
- หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจวิธีการทิ้งหรือคัดแยกของเสีย ให้ติดต่อที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมของ GC หรือที่อาคาร Safety
- ห้าม นำขยะทุกประเภทออกนอกบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด!!!!

วัตถุประสงค์ของการอบรม

- รู้อันตรายและระหนัก ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
- วิธีการป้องกันอันตราย
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- วัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs

เพราะความปลอดภัย เป็นเรื่องของตัวเรา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว

เมื่อพบเห็น หรือเกิดอุบัติเหตุต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ก่อน เกิดเหตุ | **หลัง เกิดเหตุ**

ตักเตือนกันและรายงานในแบบฟอร์ม SWO/Safety Now

แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน GC

เมื่อพบเห็น หรือเกิดอุบัติเหตุต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

เมื่อพบอุบัติเหตุ จะทำอย่างไรดี!!?

1. แจ้งผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของพื้นที่ทันที
2. กรณีเกิดการบาดเจ็บ ให้นำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลของบริษัทฯ เพื่อทำการรักษาเบื้องต้น

ห้าม นำผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ออกไปรักษาพยาบาลเอง โดยไปแจ้งให้พนักงานของ GC ทราบ

อ้างอิง Procedure : P-(Q-TS)-OEMS-004: Incident Investigation System

วัตถุประสงค์ของการอบรม

- รู้อันตรายและตระหนัก ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
- วิธีการป้องกันอันตราย
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- วัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs

เพราะความปลอดภัย
เป็นเรื่องของตัวเรา
เพื่อนร่วมงาน และ
ครอบครัว

GC

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

การทดสอบเสียงสัญญาณฉุกเฉิน

ทุกพื้นที่ทดสอบสัญญาณเตือนภัย
ทุกวันพุธ เวลา 11:30-12.00 น.
ให้ทุกคนฟังเสียงประกาศ และปฏิบัติตาม
ให้ทำงานตามปกติ

GC

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ก่อนเริ่มงานต้อง รู้ว่าจุดรวมพลอยู่ที่ไหนบ้าง

1. ตั้งสติ หยุดงาน ปิดสวิทช์เครื่องจักร
2. ฟังสัญญาณอพยพ และรอฟังประกาศเตือนภัย
3. หัวหน้านำทีมงาน อพยพมาที่จุดรวมพล โดยอพยพในเส้นทางเหนือลมหรือขวางทิศทางลม
4. รายงานตัวต่อหัวหน้างาน และผู้ควบคุมงานของ GC ที่จุดรวมพล
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ GC

* ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด*

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้, สายเคมีรั่วไหล

GC

วัตถุประสงค์ของการอบรม

- รู้อันตรายและตระหนัก ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
- วิธีการป้องกันอันตราย
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- วัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs

เพราะความปลอดภัย
เป็นเรื่องของตัวเรา
เพื่อนร่วมงาน และ
ครอบครัว

GC

สื่อความ B-CAREs จาก CEO

เรายอมรับการเกิดอุบัติเหตุได้เท่าไหร่?

GC

คุณเชื่อไหมว่าอุบัติเหตุป้องกันได้?

GC

แล้วถ้าผู้ปฏิบัติงานเป็นคนเหล่านี้ จะเข้าไปเตือนไหม?

GC

B-CAREs เป็นวัฒนธรรมที่พวกเรา*ห่วงใยกัน*

เพื่อให้ทุกคนทำงานและกลับบ้านปลอดภัยทุกๆ วัน

ด้วยการทำตามหลัก 3 ข้อ

ทำตามกฎ มีวินัย
ไม่ปลอดภัย...พวกเราไม่ทำ

ทำตามกฎ — ทำตาม**กฎระเบียบความปลอดภัย คู่มือการปฏิบัติงาน**อย่างเคร่งครัด เช่น กฎความปลอดภัยทั่วไป กฎพิทักษ์ชีวิต มาตรการใน JSEA มาตรการตามใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น *กฎเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปกป้องชีวิตของทุกคน*

มีวินัย — มีวินัยในการทำงาน ด้วยการ**ทำให้ถูกต้อง ทุกครั้ง ทุกเวลา** *แม้ว่าจะไม่มีคนเห็น หัวหน้างานไม่อยู่ หรือนอกเวลางานปกติ* ก็ยังคงทำตามกฎ **1.ตรวจสอบความพร้อมทั้งคน เครื่องมือ 2.ไม่ลัดขั้นตอน 3.ดูแลพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย**

ไม่ปลอดภัย พวกเราไม่ทำ — ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหยุดงานได้ ใครที่รู้ว่าไม่ปลอดภัย แต่ยังฝืนทำ ให้ช่วยกันเตือน

ตัวอย่างท่าทาง B-CAREs

B-CAREs
ทำตามกฎ มีวินัย
ไม่ปลอดภัย...พวกเราไม่ทำ

ขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัย

ภาคผนวก ข.23

คู่มือความปลอดภัย

A5 14.8 x 21 cm

ptt GLOBAL CHEMICAL

คู่มือความปลอดภัย

สำหรับงานบำรุงรักษาใหญ่

PTTGC2 (Oleflex) Shutdown 2015
Shutdown Booklet for Oleflex Plant

สารบัญ Content

สาส์นจากกลุ่มโอเลฟินส์	1
แผนงานหลัก	5
Premises สำหรับงานบำรุงรักษาใหญ่	6
สิ่งของต้องห้ามโดยเด็ดขาด สำหรับการทำงานในโรงงาน	7
B-CAREs คืออะไร	8
การอบรม	9
ความปลอดภัยพื้นฐานร่วมกัน	11
ใบอนุญาต (Work Permit)	14
ทีมงานควบคุมดูแลความปลอดภัย	16
งานที่ต้องทำ Safety stand down	17
กิจกรรมรายวัน	18
หากเกิดอุบัติเหตุ	19
การตรวจสมรรถภาพ (งานเสี่ยง)	20
ปลอดภัย ได้บุญ (รายวัน)	21
Safety Idol	22
Thank you Card	23
ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ	24
กิจกรรมสัมพันธการ	25
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	26
ธนาคารขยะ	27
Green Shutdown	28
SHE Target Achieve	29
ระบบความปลอดภัย – เฉพาะโรงโอเลฟินส์	30
ระบบความปลอดภัยของการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Restricted Area)	31
ระบบงานด้านภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan)	32
พื้นที่พักผ่อนภายในโรงงานสำหรับผู้รับเหมา	33
เส้นทางการเดินรถช่วงบำรุงรักษาใหญ่ (Traffic Route Plan)	34
Execution Task Force Organization	36
รายชื่อผู้ติดต่อของผู้รับเหมาแต่ละ Package	38
ช่องวิทยุสื่อสาร	39
รายชื่อผู้รับเหมาแต่ละ Package	40
เวลาทำงานประจำวัน	41

สาส์นจาก **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่**
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

งานซ่อมบำรุงใหญ่เป็นงานที่มีความสำคัญมาก ต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน ทั้งพนักงาน และเพื่อนผู้รับเหมา ขอให้พวกเรารวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ทำงานอย่างมืออาชีพรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลา เพื่อความสำเร็จของพวกเราทุกคน

คุณสุวิทย์ ทินนโชติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

สาส์นจาก
ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานผลิตโอเลฟินส์ 1

งานซ่อม บำรุงรักษาสำหรับโรงงานใหญ่นั้น มีความซับซ้อนและผู้ร่วมงานมากมาย

จึงต้องตระหนักในความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและเพื่อนๆ เป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเอง ต่องานจนกระทั่งต่อทรัพย์สิน

การผิดพลาดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องระมัดระวังและเอาใจใส่สูงสุดสำหรับความปลอดภัย

คุณพิเชษฐ์ วรรณชจีพิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานผลิตโอเลฟินส์ 1

สาส์นจาก ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงาน
Olefins Maintenance

งาน Shutdown โรงงานปิโตรเคมี เป็นงานใหญ่ที่มีหลายหน่วยงานหลายบริษัทฯ มาทำงานพร้อมๆ กัน โดยต่างมีแผนงานของตนเองที่จะต้องทำให้สำเร็จ จึงเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินเครื่องโรงงานในสภาวะปกติ

ดังนั้น การระมัดระวังอุบัติเหตุทั้งที่จะเกิดขึ้นทั้งจากการปฏิบัติงานของตนเอง หรือผู้อื่น จึงเป็นสิ่งสำคัญ การช่วยกันดูแลงานของตน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการแจ้งเตือนเพื่อนพนักงานหรือผู้รับเหมาที่มีการทำงานที่ไม่ปลอดภัยจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ผมหวังว่าการดำเนินการโครงการ Shutdown ในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงตามแผนงานด้วยความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรฐานที่ดีในอุตสาหกรรมนี้ของประเทศต่อไป

คุณสุรพงษ์ อนุครชัยสิริ
ผู้จัดการฝ่าย Olefins Maintenance

สาส์นจาก ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงาน
นโยบาย SHE องค์กร

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเป็นเพื่อนร่วมงานซ่อมบำรุงใหญ่ของ พีทีทีจีซี (PTTGC) งานซ่อมบำรุงใหญ่เป็นงานที่มีเวลาจำกัด จึงต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง แต่ทุกท่านมีคนในครอบครัวรอท่านกลับถึงบ้าน อย่างปลอดภัยทุกๆวัน ที่ พีทีทีจีซี ทุกท่านมีเวลามากพอเสมอที่จะทำงานให้ ถูกต้องตามกฎระเบียบความปลอดภัย ไม่ลัดขั้นตอน และถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยทุกท่านมีสิทธิ์หยุดงานเพื่อแก้ไขให้ปลอดภัยก่อนจะเริ่มลงมือทำใหม่

ขอฝากให้ทุกท่านสนทนาเรื่องความปลอดภัยก่อนเริ่มงานทุก เช้า บ่าย และ ค่ำ พิจารณาร่วมกันว่างานที่ทำมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรบ้าง พีทีทีจีซี เรามีวัฒนธรรมความปลอดภัย ชื่อ บี-แคร์ส (B-CAREs) โดยมีคำขวัญ "พฤติกรรมปลอดภัย ห่วงใยเอื้ออาทร หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย" พวกเราชาวพีทีทีจีซี ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยจากทุกท่าน

ขออวยพรทุกท่านมีความสุขในการทำงานที่ พีทีทีจีซี และกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันครับ

คุณเสฉสิริ ปิยะเวช
ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร

แผนงานหลัก (Master Plan)

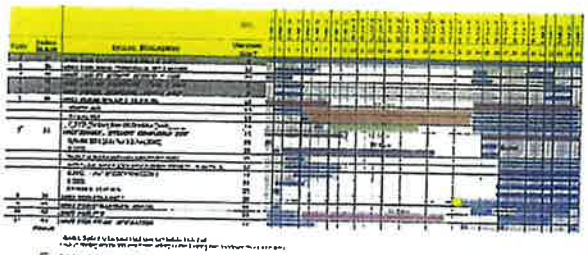

สำหรับ PTTGC2 (Oleex) S/D2015 นั้น
มีระยะเวลาในการหยุดบำรุงรักษาโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นระยะเวลา 35 วัน

Premises สำหรับงานบำรุงรักษาใหญ่

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม SHE
- ✓ Zero TRIR : No recordable injury case to Impact with Corporate – TRIR
- ✓ Environment Complain: Achieve on Validate Environment Complain (Max. 2 Validate cases)
- ✓ Zero Recordable Fire case
- ✓ Zero Recordable Spill case

ระยะเวลา : Schedule
- ระยะเวลาในการทำงาน Shutdown อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ดำเนินการ As-found Inspection

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของ Maintenance Time

คุณภาพ : Quality
- No repeated work
- ไม่ทำให้ทรัพย์สินบริษัทเสียหายเนื่องจากงาน Shutdown
- ไม่เกิดกรณี Leak ในระหว่าง Startup Plant
- ไม่มี Unplanned Shutdown ภายหลังจากการเริ่ม Startup 30 วัน

ค่าใช้จ่าย Cost
- ดำเนินงาน Shutdown

โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ

ห้ามนำอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้าในเขตหน่วยการผลิต โดยเด็ดขาด ได้แก่

- ✕ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค
- ✕ ไพ่ฉาย
- ✕ โทรศัพท์มือถือ
- ✕ กล้องถ่ายรูป
- ✕ วิทยุ/เครื่องเล่นเทป
- ✕ วิทยุติดตามตัว

พวกเราเข้าใจความหมายของความปลอดภัยกันแค่ไหน? "B-CAREs"

B-CAREs ย่อ ค่านิยมที่นำไปสู่ วัฒนธรรมความปลอดภัย
วัฒนธรรมที่ทุกคนมี ความห่วงใย
ในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองแล้วขยายไปสู่
เพื่อนร่วมงาน
ความห่วงใย ในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งกันและกัน
จะนำเราไปสู่ Zero Accident

B-CAREs เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากที่พวกเราปฏิบัติและทุกๆ คน รอบๆ ตัวเรา รับรู้ได้ถึงสิ่งที่สะท้อนออกมาเราอยากให้ทุกคนๆ คนที่ร่วมงานกับ PTTGC รับรู้ได้ว่าที่นี่.. วัฒนธรรมของพวกเรา คือ

- ✓ B = Behavior พฤติกรรมความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ✓ CARE [illegible]
- ✓ S = stop [illegible]

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – การอบรม

- ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทั่วไป ของแต่ละบริษัทก่อนเข้าวิบการอบรมของทาง PTTGC
- การอบรมจะต้องทำการจองล่วงหน้า (1 วัน) ผ่านผู้ประสานงาน ของ PTTGC
- ในวันอบรมจะต้องมีผู้ประสานงานของบริษัทมาที่สถานที่อบรมเพื่อคอย ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยก่อนเข้าอบรมและเมื่ออบรมเสร็จ

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ PTTGC ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขณะมีอายุไม่เกิน 60 ปี มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – การอบรม

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ความปลอดภัยพื้นฐาน

1) อนุญาตเข้าทำงานเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม มีบัตรเท่านั้น
2) การปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องมีใบอนุญาตทำงานทุกครั้ง จึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้
3) การขนส่งและการจราจร
   - ✓ ความเร็วในเขตกระบวนการผลิต ไม่เกิน 30 ก.ม./ชม. หรือตามป้ายกำหนด
   - ✓ ความเร็วในเขตสำนักงาน ไม่เกิน 40 ก.ม./ชม. หรือตามป้ายกำหนด
   - ✓ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือนั่งในรถยนต์
   - ✓ ไม่อนุญาตให้ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน เข้าเขตกระบวนการผลิต
   - ✓ ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลที่จะเข้าเขตกระบวนการผลิต ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานจากหน่วยผลิตกระบวนเท่านั้น
4) จักรยานจะต้องอยู่ในสภาพดี และการใช้จักรยานต้องขี่เฉพาะในพื้นที่ที่ได้โครงสร้าง ห้าม ลัดเลาะ และต้องจอดไว้ในที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น (ห้ามผู้รับเหมานำจักรยานเข้าใช้ในบริเวณกระบวนการ)
5) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรจะต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนการใช้งาน และมี Sticker ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น จึงจะอนุญาตให้นำเข้าใช้งาน
   5.1 เครื่องมือ ประเภท เจียร ขัด ขัด จะต้องมี Dead Man Switch ด้วย
   5.2 เครื่องมือ ประเภท ประแจ ต้องมีด้ามสำหรับจับ หรือมีสายคล้อง

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ความปลอดภัยพื้นฐานร่วมกัน

5.3 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและมีอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (Exhaust Spark Arrestor) ที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมจัดเตรียมเอกสารของเครื่องจักรกลที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

6) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ เช่น ไฟแสงสว่าง เครื่องเจียรวิทยุสื่อสาร เป็นต้น จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็น Low Voltage หากต้องใช้ในที่อับอากาศ ต้องใช้ไฟแสงสว่างไม่เกิน 50 Volts (DC)

7) Generator
   - ✓ ต้องมีถาดรองน้ำมันที่ได้ตามมาตรฐานของ PTT GC เพื่อป้องกันการหกกระจาย
   - ✓ ต้องมี Fire Watch พร้อมกับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง
   - ✓ การเติมน้ำมันอนุญาตให้เฉพาะช่วงเวลากลางวัน และต้องดับเครื่องที่จะเติมอย่างน้อย 5 นาที พร้อมกับดับเครื่องที่อยู่ใกล้เคียงด้วยทุกครั้ง
   - ✓ มีอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (Exhaust Spark Arrestor) ที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

8) ภาชนะบรรจุที่ชำรุดแรงดันสูง เช่น ถังก๊าซออกซิเจน เป็นต้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานบำรุงรักษา

9) หากมีจะได้ผ่านบนที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านดาง เช่น น้ำ, เศษวัสดุ อื่นๆ จะต้องมีการปิดกั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน และต้องมีการปิดกั้นบริเวณทำงานและให้มีทางเข้า – ออก ได้ หากต้องมีการปฏิบัติงานด้านใน [illegible]

10) นั่งร้าน (รายละเอียดเพิ่มเติมใน SHE Rules and Regulations for Olefins S/D2015)
   - ✓ ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงแก้ไขนั่งร้าน หากไม่ใช่ผู้ประกอบนั่งร้านที่ได้รับอนุญาต
   - ✓ ผู้รับเหมาที่ประกอบนั่งร้านและผู้ใช้งาน ขณะปีนป่ายจะต้องคาดใส่ Safety Harness แบบ Full Body และ Double Lanyard
   - ✓ การเคลื่อนย้ายนั่งร้านโดยใช้เครน หรือใช้ระดับในการยกจะต้องมีการรัดให้แน่นทุกครั้ง

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ความปลอดภัยพื้นฐานร่วมกัน

11) ต้องมีการจัดเตรียม Clamp รัดสาย Hose มันคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน และข้อต่อระหว่างสายและวัสดุต่อต้องมีสายผูกยึดกันสะบัดเสมอ
12) การทำงานในที่อับอากาศต้องมีหัวหน้างาน 4 ผู้ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน SHE Rules and Regulations for Olefins S/D2015)

13) PPE พื้นฐานสำหรับผู้รับเหมาทุกคน [illegible] ได้แก่ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน SHE Rules and Regulations for Olefins S/D2015)

13.1 [illegible]
13.2 [illegible]
13.3 [illegible]
13.4 [illegible] Digestive Vapor
13.5 PPE [illegible]

[illegible]

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ความปลอดภัยพื้นฐานร่วมกัน

14) ข้อกำหนดสำหรับงานที่มีประกายไฟหรือความร้อน (Hot Work)
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน SHE Rules and Regulations for Olefex S/D2015)

14.1 ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม Fire Watch Man ประจำงาน Hot Work อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 งาน โดยให้สำเนาใบรายชื่อที่ผ่านการอบรมแนบพร้อมกับ Work Permit เพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งจัดเตรียมปลอกแขนประจำ Fire watch และนกหวีดให้กับผู้ทำหน้าที่

✓ Fire watch 1 คน สามารถควบคุมงานได้ไม่เกิน 2 งาน ในรัศมี 15 เมตร (แนวราบ)

✓ Fire watch 1 คน สามารถควบคุมงานได้ไม่เกิน 2 งาน ในรัศมี 6 เมตร (แนวดิ่ง) ทั้งนี้ งานที่ 2 ต้องอยู่ในชั้นถัดไปจากงานแรกที่ควบคุมงาน

14.2 ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Standby เครื่องยนต์, Generator, Mobile Air Compressor อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 จุดติดตั้ง

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ใบอนุญาตทำงาน

การขอ Work Permit สำหรับงานช่วงซ่อมบำรุงใหญ่

1) ใบอนุญาตทำงานธรรมดา (Cold Work Permit) อายุใบอนุญาตจะสิ้นสุดเมื่อเสร็จงาน หรือประกาศยกเลิกช่วงผ่อนผัน
2) ใบอนุญาตทำงานที่ทำให้เกิดความร้อน (Hot Work Permit) หากเป็นงานต่อเนื่อง อนุญาตให้ใช้ Work permit ฉบับเดิมได้ต่อเนื่อง 7 วัน (โดยไม่ต้องเขียน Work Permit ใหม่) แต่ต้องยื่น Work Permit ให้กับผู้อนุญาตเพื่อตรวจสอบการ Check Gas (%LEL และ Toxic gas) ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 19.00-20.00 น.
3) ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (Conned Space) อายุใบอนุญาตจะสิ้นสุดเมื่อครบ 24 ชั่วโมง โดยใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงในเวลาไม่เกิน 08.00 น. ของวันถัดไปเสมอ แต่กำหนดระยะเวลาการทำงานในที่อับอากาศของผู้ปฏิบัติงาน ณ. วันหนึ่งหนึ่ง รวมกันจะต้องไม่เกิน 16 ชั่วโมง
4) การทำงานใน Heat Exchanger และ Reactor ที่เปิดทั้งหัวท้ายหมดแล้ว และทำความสะอาดจนตรวจวัดไม่พบบรรยากาศที่เป็นอันตราย ให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศได้ แต่ต้องขออนุญาตทำงานประเภทอื่นๆ อย่างเหมาะสมตามประเภทของงาน และต้องทำการตรวจวัดบรรยากาศที่เป็นอันตราย เหมือนการทำงานในที่อับอากาศ
5) Permit holder 1 คนควบคุมได้ 4 งานในระยะแนวราบ 30 เมตร และยกเว้นข้อกำหนดระยะห่างระหว่างงานในแนวดิ่ง 6 เมตร
6) งาน Instrument อนุญาตให้ Permit holder 1 คน ควบคุมได้ 1 block (ที่อยู่ใกล้ๆกัน แบ่งตามลักษณะพื้นที่ หรือ eld operator ที่รับผิดชอบแต่ละคน)
7) งาน Stationary อนุญาตให้ Permit holder 1 คนควบคุมงานได้ตลอดความสูงเฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น Reactor, Tower โดยให้เป็นงานในลักษณะเดียวกัน
8) การทำงานที่มีการกีดขวางถนนทำให้รถดับเพลิงและรถพยาบาลไม่สามารถผ่านได้

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ใบอนุญาตทำงาน

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามการอนุญาตทำงานปิดถนน (Road closure permit) แต่ต้องมี

การแจ้งหรือวางแผนร่วมกับ ERS Staff เพื่อให้ ERS Staff รับทราบและพิจารณาเรื่อง Emergency Response

9) ในส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาตั้งแต่ข้อ 1) ถึง ข้อ 8) ยังคงใช้ข้อกำหนดตาม Safety Procedure เดิมทุกประการ

หากยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน ห้าม เริ่มงานเด็ดขาด
หากไม่แน่ใจให้ติดต่อหัวหน้างานก่อนทุกครั้ง

[illegible]

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ทีมงานควบคุมดูแล

Contractor Executive Safety Committee CESC

ร่วมประชุมและเดิน Safety walk 2 สัปดาห์/ครั้ง
ประกอบด้วย
1. OLE
2. Shutdown Director
3. MD ของผู้รับเหมา
4. Q-SH-01 (เลยาฯ)

Contractor Safety Committee CSC

ร่วมประชุมและเดิน Site walk 1 สัปดาห์/ครั้ง
ประกอบด้วย
1. Shutdown Director
2. Site Manager ของผู้รับเหมา
3. Safety Ofcer ของผู้รับเหมา
4. Q-SH-01 (เลยาฯ)

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – งานที่ต้องทำ Safety Stand down

- ✓ งาน High Pressure Water Jetting
- ✓ งาน Decontamination
- ✓ งาน Confined Space
- ✓ งาน Radiation
- ✓ งาน Crane Lifting
- ✓ งาน Excavation
- ✓ งาน Scaffolding

Skill Assessment

บริษัทผู้รับเหมาต้องส่งบุคลากรที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงและต้องใช้ทักษะความชำนาญในงานเฉพาะด้าน เข้ารับการทดสอบทักษะความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Skill Assessment) โดยบุคลากรต้องผ่านการทดสอบทักษะ

- เจ้าหน้าที่ติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding Work)
- เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Water Jetting)
- ช่างเชื่อม (ประเมินทักษะช่างตัด เชียร ด้วย)
- ช่างตัด เชียร

ผลการทดสอบจะประเมินที่ 70 % ถือว่าผ่านการทดสอบ

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – กิจกรรมรายวัน

Management Safety Talk / Tool box Talk

Management Safety Talk จัดทุกวัน เวลา 07.45 -08.00 น. บริเวณเวทีเต็นท์ผู้รับเหมา โดยตัวแทนผู้บริหาร PTT GC และ Safety ผู้รับเหมาหมุนเวียนนำ Safety Talk และสวดมนต์ไหว้พระ และ Tool box Talk บริเวณหน้างานก่อนเริ่มงานทุกวัน หมายเหตุ : Package leader เข้าร่วมวันละ 1

Daily Safety Audit

เดินตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับ Safety ผู้รับเหมาแบ่งการเดินตรวจสอบเป็น 1 รอบคือ ช่วง 14.00-16.00 น.

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – หากเกิดอุบัติเหตุ

เหตุการณ์ผิดปกติ

กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานโดยตรงทันที โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

- ✓ แจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ✓ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
- ✓ เตรียมการสอบสวนอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรือการร้องเรียน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการร้องเรียน จากภายนอก
- ✓ กรณีได้รับบาดเจ็บต้องรีบแจ้งหัวหน้างานและนำคนเจ็บส่ง First Aid ทันที

เหตุการณ์ผิดปกติ

- ✓ ตรวจสมรรถภาพงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยง (Fit-to-work)
- ปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่ต้องใช้ SCBA (Self contain breathing apparatus) หรือ Air line
- ปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 15 เมตร ต้องผ่านการทำ Fit for work test
- โดยนักอาชีวอนามัยหรือพยาบาลประจำสถานพยาบาลของ PTT GC ก่อนเริ่มทำงานครั้งแรก
- ✓ สุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
- ✓ ตรวจรักษาฟรี ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
- ✓ จัดเตรียม Barrier Cream สำหรับการป้องกันสารเคมีก่อนลงมือปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่อาจมีอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนัง โดยสามารถมาเบิกได้ที่พยาบาลประจำสถานพยาบาล I-1
- ✓ เตรียมรถ [illegible]
- ✓ การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ จากการทำงาน จะต้องมีหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทมาด้วยทุกครั้ง
- ✓ หากจำเป็นต้องเรียกรถพยาบาลให้แจ้งสถานที่จุดรับผู้ที่รับบาดเจ็บให้ชัดเจน

กรณีจำเป็นที่ต้องเรียกรถพยาบาล เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉินระดับสูง เคลื่อน หรือผู้ป่วยหมดสติ ช็อก บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยขั้นรุนแรง

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – การตรวจสมรรถภาพ (งานเสี่ยง)

งานที่เหมาะที่ต้องตรวจ

1) งานที่อับอากาศที่ต้องใช้ SCBA (Self-contain breathing apparatus) หรือ Air line
2) งานบนที่สูงเกิน 15 เมตร

การแจ้งเพื่อขอตรวจ

1) ติดต่อที่ First Aid I-1
2) ตรวจเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
3) บริการฟรี
4) จะได้รับ Sticker หากการตรวจร่างกายผ่าน กรณีไม่มีสติ๊กเกอร์ผ่านการ Fit to work จะไม่อนุญาตให้ทำงาน

Work at Height Jan - Mar 2014

ให้บริการพยาบาลที่สถานพยาบาล I-1 ทุกวัน
เพื่อให้บริการตรวจรักษาฟรี ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.ทุกวัน
ไปเว้นวันหยุด พบแพทย์ วันจันทร์ และ พฤหัสบดี

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ปลอดภัย ได้บุญ (รายวัน)

รูปแบบและรหัสความปลอดภัยรายวันของแต่ละบริษัท

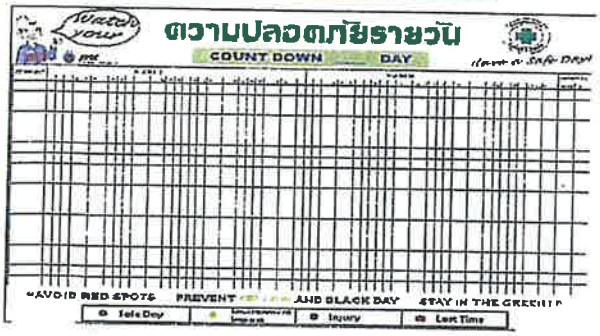

กิจกรรมปลอดภัย ได้บุญ

ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นรับการรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment Case) จะได้เงินสะสมร่วมกัน วันละ 1,000 บาท (35 วัน 35,000 บาท)

หมายเหตุ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาลขึ้นไป ถือว่าเริ่มสะสมเป็นใหม่ ห้องเริ่มสะสมใหม่

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – Safety idol

เหตุการณ์ผิดปกติ

ระดับบริษัท

1. ความถี่ในการจัดทำ Safety Talk
2. การจัดส่ง Man hours
3. ความถี่ของการเข้าร่วม Safety Inspection / Meeting (CSC)
4. การจัดเก็บทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดพื้นที่ Office อย่างเหมาะสม
5. อุบัติเหตุจากการทำงาน
6. การจัดทำ Pre use inspection
7. จำนวน Thank you card สะสม
8. ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งเสพย์ติด
9. จำนวน Unsafe
10. จำนวน SWO & Envt. Suggestion

ระดับปฏิบัติการ

1. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท :
   1. Site Manager
   2. Safety Ofcer
   3. Worker
2. เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจาก
   1. การเข้าร่วม Safety Talk
   2. การเข้าร่วม Inspection และ Meeting (CSC)
   3. การกำกับควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย การเกิด Nearmiss/Accident กลิ่น/ข้อร้องเรียน
   4. จำนวน Thank you card
   5. จำนวน SWO & Envt Suggestion

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – Thank you Card

1. เกณฑ์การแจกบัตรขอบคุณ
   1. รักตัวเอง ดูแลตัวเอง และ เพื่อนร่วมงาน
   2. ไม่ประมาทลัดขั้นตอน ไม่ทำงานแบบเสี่ยงๆ
      ไม่รู้ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจ ต้องถาม ? ยังไม่ทำ !
   3. ไม่ปล่อยให้เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่อยู่รอบข้างเราตกอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
      พบเห็นเพื่อนทำงานไม่ปลอดภัย อยู่ในที่ไม่ปลอดภัย
      ช่วยบอกจนกว่าจะให้เขาปลอดภัย
   4. ไม่เพิกเฉย ละเลยต่อความเสี่ยง เพราะยอมรับไม่ได้
      พบเห็นการละเลยต่อความเสี่ยง ช่วยกันไม่ให้เกิดขึ้น
      เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียใจ
2. ความถี่ที่ดำเนินการ ทุกวัน

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ

- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
  ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาและพนักงานในช่วงก่อน Shutdown พร้อมแจกของขวัญให้แก่ผู้รับเหมาที่เข้าร่วม

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – กิจกรรมส่งเสริมการ

Zero Accident &
Complaint Promotion

Safety Game
จัดกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล
ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
เวลา 12.30-13.00 น.

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – Safety idol

- ✓ คุณภาพอากาศ / กลิ่นรบกวน
- ✓ คุณภาพน้ำทิ้ง
- ✓ เสียง / แสงสว่าง
- ✓ การจัดการกากของเสีย
- ✓ การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
- ✓ ชุมชนสัมพันธ์ / โรงงานร้างเสียง



มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – ธนาคารขยะ

ขยะประจำวัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Waste ที่เกิดขึ้น (เช่น การจัดเก็บทุกวัน ถุงใส่และ sticker)

1) การรวบรวม คัดแยก และการจัดเก็บ Waste ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ผู้รับเหมา รวบรวม คัดแยก Waste ใส่ภาชนะหรือถุงใสแล้ว ปิดหรือมัดให้แน่นติด Sticker และกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน
2) รวบรวมและขนส่งมาจัดเก็บยังจุดที่กำหนดไว้
3) จัดเก็บ waste แล้วต้องปิดคลุมภาชนะทุกครั้ง

รับ Sticker ได้ที่ Safety cabin G-SH-01 โทร.6526 คุณมิตรัณน์

ธนาคารขยะ

เปิดรับซื้อขยะทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี และแยกของรางวัลทุกวันศุกร์

บริเวณเดินทำธนาคารขยะ

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – Green TA Project

Green TA Project

- นำเสนอโครงการ Green Shutdown
- ดำเนินการตามโครงการ
- ส่งผลการดำเนินการที่ G-SH-01
- รับรางวัลและใบประกาศนียบัตร

มาตรฐานงานด้านความปลอดภัย – เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

- Environment Corplain : Achieve on Validate Environment Complin (Max. 2 Valedate case)
- Green Turnaround : ดำเนินการตามนโยบาย Green T/A
- กิจกรรมขนถ่าย Waste ออกจากโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
- คัดแยกและลดการฝังกลบ Waste 100% ของ Waste ทั้งหมด
- Drain สารเคมีออกจากอุปกรณ์ ลงในภาชนะมารองรับอย่างเหมาะสม
- Zero Recordable Spill case

รายละเอียดข้อมูลเงื่อนไขด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสาร SHE Rules and Regulations for Oleflex S/D2015

ระบบความปลอดภัย

[illegible]

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE ที่เป็นข้อกำหนดเฉพาะได้แก่

1) ห้ามใช้แว่นตานิรภัย เลนส์สีดำ
2) รองเท้านิรภัย ต้องมีพื้นเป็นพื้นเหล็ก (Steel Plate)
3) หน้ากากป้องกันสารเคมีพร้อมตลับกรองสารเคมีชนิดป้องกันไอสารอินทรีย์ (Organic Vapor)

ระบบความปลอดภัยของการเข้า – ออก พื้นที่หวงห้าม

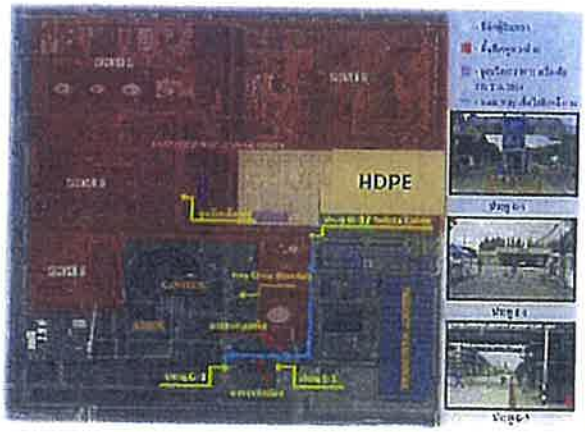

ระบบงานด้านภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan)

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

- ✓ เบอร์โทรศัพท์ PTTGC2 038-975149
- ✓ เบอร์คลื่นวิทยุฉุกเฉิน วิทยุสื่อสารช่อง 3
- ✓ เบอร์ห้องควบคุมกรณีฉุกเฉิน วิทยุสื่อสาร ของ 3 หรือ 5008
- ✓ เบอร์สำหรับประสานงานกรณีฉุกเฉิน วิทยุสื่อสารช่อง 3

หมายเหตุ: Group วิทยุสื่อสาร คือ Group Oleflex 11

จุดรวมพลสำหรับ [illegible] ในกรณีเกิดเหตุ

อุปกรณ์ดับเพลิง

- ✓ ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมก่อนเริ่มงาน
- ✓ อุปกรณ์ดับเพลิงต้องตรวจสอบที่สถานีดับเพลิง (Fire Station) ก่อนเริ่มงาน
- ✓ ถังดับเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมีค่าระดับการดับไฟไม่น้อยกว่า 10A20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์

พื้นที่ผู้รับเหมาและพื้นที่พักผ่อนภายในโรงงาน สำหรับผู้รับเหมา

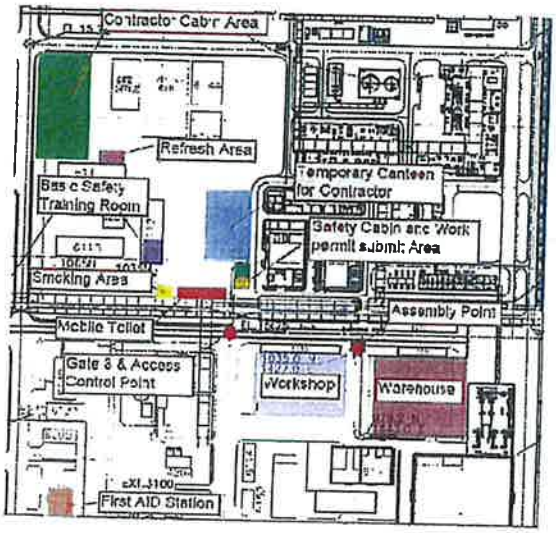

เส้นทางการเดินรถรับส่งผู้รับเหมาภายนอกโรงงาน

Shuttle Bus Schedule

เส้นทางการเดินรถช่วงซ่อมบำรุง (Traffic Route Plan)

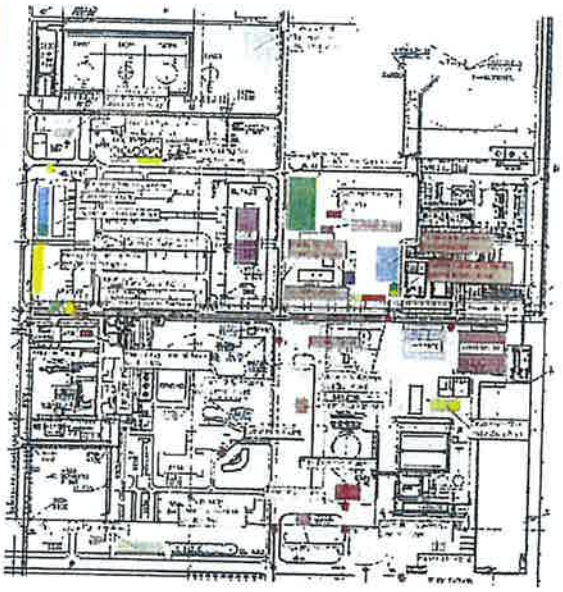

กำหนดเวลาการทำงานประจำวัน

กำหนดการทำงานประจำวัน	
งานทั่วไป	
วันทำงาน	: จันทร์ – อาทิตย์ (7 วัน / สัปดาห์)
เวลาทำงาน	8.00 – 22.00 น. (ปกติ 12 ชั่วโมง)
งานสำคัญ** (งาน conned space, Hot work)	
วันทำงาน	: จันทร์ – อาทิตย์ (7 วัน / สัปดาห์)
เวลาทำงาน	: แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 12 ชั่วโมง
	ชุดแรก 08.00 – 20.00 น.
	ชุดที่สอง 20.00 – 8.00 น. (ของวันถัดไป)

Execution Task Force Organization

PTTGC#2 Oleflex Shutdown 2015 Execution Task Force

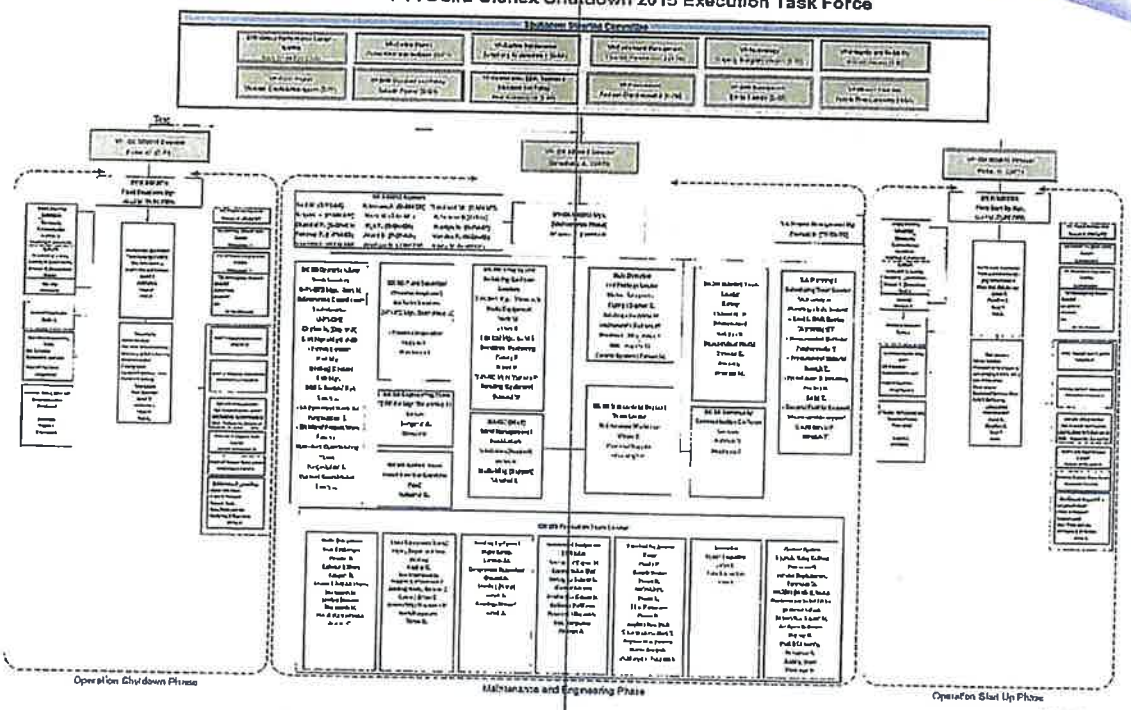

โทรศัพท์ภายในและช่องวิทยุสื่อสารแต่ละ Package

Package No.	Package Name	Discipline	Package Leader	Ext.	Package Controller	Ext.	Walkies Ch.	Walkies Group
E.01	Major Overhaul and Inspection	Electrical	Sakphanna P.	5221	Thada R.	1554	14	1,3,18
E.02	Management support for Electrical Work	Electrical	Sakphanna P.	5221	Thada R.	1554	14	1,3,18
I.01	Control Valve overhaul after CDR Unit	Instrument	Pakorn W.	5242	Nawat T.	5047	13	1,3,18
I.02	Control Valve Overhaul	Instrument	Pakorn W.	5242	Nawat T.	5047	13	1,3,18
I.03	Calibrate Furnace Level	Instrument	Pakorn W.	5242	Phichet R.	5047	13	1,3,18
I.04	Calibrate Field Instrument	Instrument	Pakorn W.	5242	Siriwan M.	1845	13	1,3,18
I.05	Replacement cable for Furnace and Wires	Instrument	Pakorn W.	5242	Pakorn W.	1845	13	1,3,18
R.01	Overhead Conveyor	Rotating	Sarachart P.	5271	Somchai Jo.	1877	12	1,3,18
R.02	R-Pipe Overhaul	Rotating	Sarachart P.	5271	Somchai Jo.	1877	12	1,3,18
R.03	Blower Overhaul	Rotating	Sarachart P.	5271	Somsak A.	1877	12	1,3,18
R.04	Compressor O-R for service	Rotating	Rungsarit F.	5231	Chanudit A.	5242	12	1,3,18
S.01	Reactor & Heater	Stationary	Tanapon S.	5241	Thiraseth H.	5065	11	1,3,18
S.02	Oleflex Heat Exchanger	Stationary	Tanapon S.	5241	Kiatpon R.	5065	11	1,3,18
S.03	Oleflex Vessel	Stationary	Tanapon S.	5241	Thiraseth H.	5065	11	1,3,18
S.04	Steam System	Stationary	Tanapon S.	5241	Thiraseth H.	1565	11	1,3,18
S.05	HSV and Manual Valve	Stationary	Siriphon S.	5242	Anirut L.	1435	8	18
S.06	Piping Repair and Seal Weld	Stationary	Siriphon S.	5242	Ratcha C.	1435	8	18
S.07	Electrical Manpower	Stationary	Wirote S.	5274	Wirote S.	1874	6	18
S.07a	Crane for support Oleflex ED	Stationary	Wirote S.	5274	Wirote S.	1874	6	18
S.07b	Crane for Oleflex Reactor	Stationary	Tanapon S.	5241	Thiraseth H.	1565	11	1,3,18
S.07c	Crane for HA Catalyst Feed	Stationary	Tanapon S.	5241	Kiatpon R.	1565	11	1,3,18
S.08	Insulation	Stationary	Wirote S.	5274	Vanchai S.	5273	6	18
S.10	Scaffolding	Stationary	Wirote S.	5274	Vanchai S.	5273	6	18
S.11	Civil Maintenance	Stationary	Wirote S.	5274	Wirote S.	1874	6	18
S.12	Telephone Communication	Stationary	Tanapon S.	5241	Tiwaporn L.	5239	9	5
S.13	Crane	Stationary	Tanapon S.	5241	Kiatpon R.	1565	11	1,3,18
S.14	Replace Leak Hot Condition Pipe	Stationary	Tanapon S.	5241	Kiatpon R.	1565	11	1,3,18
N.01	Vessel Inspection	Stationary	Jarun S.	5243	Jarun S.	1843	16	1,3

ช่องวิทยุสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน

O-[illegible]	[illegible]	7	1,3
[illegible]	[illegible]		1,3
O-P1-OP2	[illegible]	4,5,6,7	
O-[illegible]	[illegible]	1	
O-[illegible]	[illegible]	10	
	[illegible]	12	5-8
	[illegible]	12	5-8
O-LIN-CS	[illegible]	14	5-8
	[illegible]	8	18
	[illegible]	8	18
C-LIN-CS	[illegible]	8	5-8
-LIN-CS	[illegible]		
-LIN-CS	[illegible]		
O-LIN-CS	[illegible]	8	18
O-LIN-CS	[illegible]		
LIN-CS	[illegible]		
R-SE	[illegible]	10	1,3
[illegible]	[illegible]	16	18
[illegible]	[illegible]	11	1,3
[illegible]	[illegible]	16	18

รายชื่อผู้รับเหมาแต่ละ Package



Note

ภาคผนวก ข.24

เอกสารการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ประจำปี พ.ศ.2569

แผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.2569

แผนการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ประจำปี 2569

หน่วยงาน Crisis and Security Management, SHE Management

ลำดับ	หน่วยงาน (GPC/BU)	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	กำหนดการซ้อม	ความก้าวหน้า
1	**GC2(UT)** : ระดับ 2	คุณชัชวาล													วันที่ 25 สิงหาคม 2569 Shift C	
2	**GC7(BTF)** :ระดับ 2														วันที่ 13 มีนาคม 2569 Shift D	
3	**GC7(Jetty2)** :ระดับ 2														วันที่ 4 กันยายน 2569 Shift A	
4	**GC8(ATF1)** : ระดับ 2														วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 Shift B	
5	**GC5(ATF2)** : ระดับ 2														วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 Shift C	
6	**Interconnecting pipeline** : ระดับ														วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 Shift A	

จัดทำโดย [redacted]
Q-SH-CM
12 / 1 / 2026

ลงชื่อ [redacted]
U-P1-OP
16 / 1 / 2026

ลงชื่อ [redacted]
U-CM-OP
15 / 1 / 2026

ลงชื่อ [redacted]
Q-SH
15 / 01 / 2026

ลงชื่อ [redacted]
U-P1
16 / 01 / 26

ลงชื่อ [redacted]
U-CM
15 / 1 / 2026

ลงชื่อ [redacted]
QSE
/ /

ลงชื่อ [redacted]
UTY
22 / 1 / 69

ผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับที่ 1

☐ Tabletop ☑ EM 1 ☐ EM 2 ☐ EM 3

บริษัท/สาขา	PTTGC2	**Unit Name**	T-3801	**วันที่ (Date)**	20/01/2026	
Shift (A/B/C/D)	A	**ผู้ประเมิน**		**ตำแหน่ง**	ERS Supervisor	

Scenario	ระหว่างใช้งาน Ammonium hydroxide จาก tank (T-3801) เกิด PSV Failure (Vacuum Release Valve) มีผลทำให้เกิด Vacuum ภายใน tank (T-3801) และ เกิดการยุบตัวเล็กน้อยทำให้รอยเชื่อมปริแตกเสียหายจนเกิด Ammonium hydroxide leak ออกมาเป็น Liquid และเป็นไอฟุ้งกระจาย

Rating: Yes = Emergency response need met (การปฏิบัติดีเป็นไปตามที่ต้องการ) ผลการประเมิน = 1

No = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) ผลการประเมิน = 0

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
ความสอดคล้องของ PIP					
1. Incident (Title), Information (Process / Applicable Data)	Y				1
2. Operation Actions (Control Room / Field Operator)	Y				1
3. Fire Fighting Resource & Response	Y				1
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Central Control Room): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
4. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	Y				1
5. Boardman ทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action	Y				1
6. - สั่งการศูนย์สื่อสารให้ส่ง SMS / แฟกซ์ - สั่งการ OC ประเมินจุดเกิดเหตุ	Y				1
7. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ และเอกสาร P&ID, PIP พร้อมใช้งาน	Y				1
8. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสายจาก Control Room	Y				1
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
9. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM และทำตามได้ครบถ้วน	Y				1
10. การส่ง Fax ให้ กนอ. ต้นสังกัด (ภายใน 10 นาที) / การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน และโทรติดต่อแจ้งนิคมต้นสังกัด หรือ สทร.			NA		-
11. ศูนย์บูรพาส่ง Fax ให้ กนอ. (EMCC) และศูนย์สื่อสาร ปตท.			NA		-
12. ติดต่อร้องขอการสนับสนุนจาก GC1, GC2 หรือ G11 - FIT B, CM Team			NA		-
13. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	Y				1
14. โทรแจ้งหน่วยงานราชการท้องที่ ปภ.เทศบาลฯ, ปภ.จังหวัด			NA		-
15. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงตามสายจากศูนย์สื่อสาร	Y				1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
16. แผนการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ ใช้งานได้ดี	Y				1
จุดเกิดเหตุ และจุดสั่งการที่เกิดเหตุ (Command Post): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
17. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Y				1
18. มีการ ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS หรือ Boardman ในขั้นแรก	Y				1
19. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าระงับเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ - FIT A Mixed Plant	Y				1
20. ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสมนับจากมีการร้องขอจากศูนย์สื่อสาร - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ ใช้เวลา .....5.....นาที - FIT A Mixed Plant ใช้เวลา .....นาที	Y				1
21. ทีมดับเพลิงที่มาสนับสนุน ถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม - FIT B GC1 ใช้เวลา .....นาที - FIT B GC2 หรือ GC11 ใช้เวลา .....นาที - FIT B NPC S&E ใช้เวลา .....นาที - ทีมสนับสนุนเพิ่มเติม FIT B GC3 (ตามการร้องขอ) ใช้เวลา .....นาที			NA		-
22. OC และทีมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุ			NA		-
23. มีการใช้น้ำป้องกันการลุกลามหรือป้องกันการติดไฟ - มีการเลือกใช้โฟม หรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	Y				1
24. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิง สวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน	Y				1
25. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง, SCBA, รถดับเพลิง, Drone Thermal Camera ฯลฯ	Y				1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
26. มีประเมินสถานการณ์ เพื่อขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย	Y				1
การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response และ TRIAGE AREA)					
27. Fit Team/Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ภายใน 4 นาที ปฐมพยาบาล/ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม (หลังจาก OC สั่งการ)			NA		-
28. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนทีจะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ			NA		-
29. OC มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
30. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
31. กรณีสารเคมี / รังสี มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง รพ.พร้อมข้อมูล SDS			NA		-
32. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่ง รพ.ได้ภายใน 1 ชม.			NA		-
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Command Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
33. มีการตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าทีมารายงานตัวครบภายในเวลา 60 นาที			NA		-
34. EM สรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ทีเกิดขึ้น ให้ ED Duty และ Emergency Duty Team ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพือให้แต่ละส่วนงานกำหนดแผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน			NA		-
35. Emergency Duty Team มีการปฏิบัติหน้าทีตามแผนฉุกเฉินรวมถึงจัดการกับผู้ทีได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			NA		-
36. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลทีสำคัญบน Incident Board ถูกต้องและครบถ้วน			NA		-
37. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสือสาร, โทรศัพท์, โทรสาร, CCTV, P&ID, SDS, PIP และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานทีสำคัญ มีพร้อมใช้งาน	Y				1
ศูนย์อำนวยการภาวะวิกฤต (Crisis Management Center)					
38. มีการจัดตั้งศูนย์ CMC, CBC ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (RO ชั้น 5 ห้องดารารัตน์, ENCO ชั้น18)			NA		-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
39. ระบบการติดต่อสือสารของศูนย์ CMC, CBC เช่น VDO Conference, CCTV, Drone, ชุดควบคุมระบบสือสาร			NA		-
40. ERS Chief GC1 ทำหน้าทีผู้ควบคุมห้อง CMC, CBC ทำได้ถูกต้อง			NA		-
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสือสาร					
41. อพยพมาทีจุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและตรวจนับจำนวนทีจุดรวมพลเป็นไปตามแผน และรายงานให้ศูนย์ ECC ทราบ			NA		-
42. Assembly Controller และArea Warden ปฏิบัติหน้าทีได้ถูกต้อง มีการสวมเสือ Area Warden และใช้ใบตรวจสอบรายชือที่ Update			NA		-
จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก: ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสือสาร					
43. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลทีประตู Main gate การจราจร			NA		-
44. MC2 ทำหน้าทีประสานงานกับผู้ทีมาสนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
45. Fire Runner ทำหน้าทีนำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
				Sum of Rating	21/21
				Effectiveness Score	100%

Calculation of Effectiveness Score % = Sum of Total Rating Points x 100
No. of rated items

Effectiveness Scoring

>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80%	=	Fair
>80% - 90%	=	Good	<70%	=	Review Required

Positive Observations: ข้อดี

1.ทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2.FIT-A สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน และดำเนินการตามกลยุทธ์

Improvement Observations: ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข

Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1				
2				
3				
4				
5				

ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน

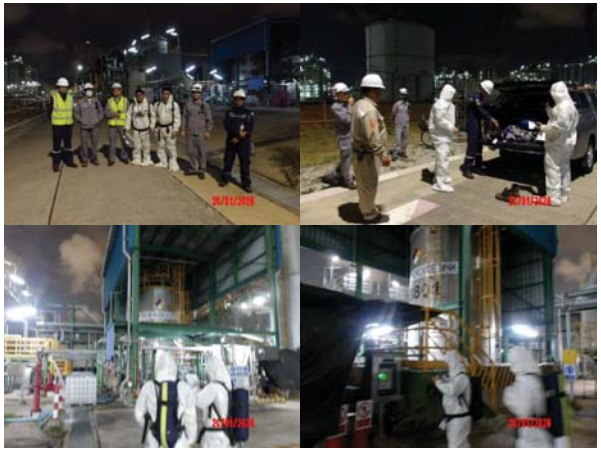

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

☐ Tabletop ☑ EM 1 ☐ EM 2 ☐ EM 3

บริษัท/สาขา	PTTGC2	Unit Name	T-3801	วันที่ (Date)	3/02/2026	
Shift (A/B/C/D)	B	ผู้ประเมิน		ตำแหน่ง	ERS Supervisor	

Scenario	ระหว่างใช้งาน Ammonium hydroxide จาก tank (T-3801) เกิด PSV Failure (Vacuum Release Valve) มีผลทำให้เกิด Vacuum ภายใน tank (T-3801) และ เกิดการยุบตัวเล็กน้อยทำให้รอยเชื่อมปริแตกเสียหายจนเกิด Ammonium hydroxide leak ออกมาเป็น Liquid และเป็นไอฟุ้งกระจาย

Rating: Yes = Emergency response need met (การปฏิบัติดีเป็นไปตามที่ต้องการ) ผลการประเมิน = 1

No = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) ผลการประเมิน = 0

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
ความสอดคล้องของ PIP					
1. Incident (Title), Information (Process / Applicable Data)	Y				1
2. Operation Actions (Control Room / Field Operator)	Y				1
3. Fire Fighting Resource & Response	Y				1
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Central Control Room): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
4. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	Y				1
5. Boardman ทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action	Y				1
6. - สั่งการศูนย์สื่อสารให้ส่ง SMS / แฟกซ์ - สั่งการ OC ประเมินจุดเกิดเหตุ	Y				1
7. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ และเอกสาร P&ID, PIP พร้อมใช้งาน	Y				1
8. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสายจาก Control Room	Y				1
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
9. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM และทำตามได้ครบถ้วน	Y				1
10. การส่ง Fax ให้ กนอ. ต้นสังกัด (ภายใน 10 นาที) / การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน และโทรติดต่อแจ้งนิคมต้นสังกัด หรือ สทร.			NA		-
11. ศูนย์บูรพาส่ง Fax ให้ กนอ. (EMCC) และศูนย์สื่อสาร ปตท.			NA		-
12. ติดต่อร้องขอการสนับสนุนจาก GC1, GC2 หรือ G11 - FIT B, CM Team			NA		-
13. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	Y				1
14. โทรแจ้งหน่วยงานราชการท้องที่ ปภ.เทศบาลฯ, ปภ.จังหวัด			NA		-
15. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงตามสายจากศูนย์สื่อสาร	Y				1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
16. แผนการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ ใช้งานได้ดี	Y				1
จุดเกิดเหตุ และจุดสั่งการที่เกิดเหตุ (Command Post): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
17. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Y				1
18. มีการ ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS หรือ Boardman ในขั้นแรก	Y				1
19. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าระงับเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ - FIT A Mixed Plant	Y				1
20. ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสมนับจากมีการร้องขอจากศูนย์สื่อสาร - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ ใช้เวลา .....5.....นาที - FIT A Mixed Plant ใช้เวลา .....นาที	Y				1
21. ทีมดับเพลิงที่มาสนับสนุน ถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม - FIT B GC1 ใช้เวลา .....นาที - FIT B GC2 หรือ GC11 ใช้เวลา .....นาที - FIT B NPC S&E ใช้เวลา .....นาที - ทีมสนับสนุนเพิ่มเติม FIT B GC3 (ตามการร้องขอ) ใช้เวลา .....นาที			NA		-
22. OC และทีมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าทำการระงับแหตุ			NA		-
23. มีการใช้น้ำป้องกันการลุกลามหรือป้องกันการติดไฟ - มีการเลือกใช้โฟม หรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	Y				1
24. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิง สวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน	Y				1
25. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง, SCBA, รถดับเพลิง, Drone Thermal Camera ฯลฯ	Y				1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
26. มีประเมินสถานการณ์ เพื่อขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย	Y				1
การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response และ TRIAGE AREA)					
27. Fit Team/Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ภายใน 4 นาที ปฐมพยาบาล/ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม (หลังจาก OC สั่งการ)			NA		-
28. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ			NA		-
29. OC มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
30. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
31. กรณีสารเคมี / รังสี มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง รพ.พร้อมข้อมูล SDS			NA		-
32. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่ง รพ.ได้ภายใน 1 ชม.			NA		-
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Command Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
33. มีการตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าที่มารายงานตัวครบภายในเวลา 60 นาที			NA		-
34. EM สรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ ED Duty และ Emergency Duty Team ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานกำหนดแผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน			NA		-
35. Emergency Duty Team มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินรวมถึงจัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			NA		-
36. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลที่สำคัญบน Incident Board ถูกต้องและครบถ้วน			NA		-
37. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์, โทรสาร, CCTV, P&ID, SDS, PIP และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ มีพร้อมใช้งาน	Y				1
ศูนย์อำนวยการภาวะวิกฤต (Crisis Management Center)					
38. มีการจัดตั้งศูนย์ CMC, CBC ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (ROชั้น 5 ห้องดารารัตน์, ENCO ชั้น18)			NA		-

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
39. ระบบการติดต่อสื่อสารของศูนย์ CMC, CBC เช่น VDO Conference, CCTV, Drone, ชุดควบคุมระบบสื่อสาร			NA		-
40. ERS Chief GC1 ทำหน้าที่ผู้ควบคุมห้อง CMC, CBC ทำได้ถูกต้อง			NA		-
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล่ อุปกรณ์และการสื่อสาร					
41. อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว่ ครบถ้วนและตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผน และรายงานให้ศูนย์ ECC ทราบ			NA		-
42. Assembly Controller และ Area Warden ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง่ มีการสวมเสื้อ Area Warden และใช้ใบตรวจสอบรายชื่อที่ Update			NA		-
จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก: ประเมินบุคคล่ อุปกรณ์ การสื่อสาร					
43. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู Main gate การจราจร			NA		-
44. MC2 ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่มาสนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
45. Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
				Sum of Rating	21/21
				Effectiveness Score	100%

Calculation of Effectiveness Score % = Sum of Total Rating Points x 100

No. of rated items

Effectiveness Scoring

>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80%	=	Fair
>80% - 90%	=	Good	<70%	=	Review Required

Positive Observations: ข้อดี

1.ทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2.FIT-A สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน่ และดำเนินการตามกลยุทธ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

Improvement Observations: ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข

Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1				
2				
3				
4				
5				

ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน

☐ Tabletop ☑ EM 1 ☐ EM 2 ☐ EM 3

บริษัท/สาขา	PTTGC2	**Unit Name**	T-3801	**วันที่ (Date)**	24/02/2026	
Shift (A/B/C/D)	C	**ผู้ประเมิน**		**ตำแหน่ง**	ERS Supervisor	

Scenario	ระหว่างใช้งาน Ammonium hydroxide จาก tank (T-3801) เกิด PSV Failure (Vacuum Release Valve) มีผลทำให้เกิด Vacuum ภายใน tank (T-3801) และ เกิดการยุบตัวเล็กน้อยทำให้รอยเชื่อมปริแตกเสียหายจนเกิด Ammonium hydroxide leak ออกมาเป็น Liquid และเป็นไอฟุ้งกระจาย

Rating: Yes = Emergency response need met (การปฏิบัติดีเป็นไปตามที่ต้องการ) ผลการประเมิน = 1

No = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) ผลการประเมิน = 0

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
ความสอดคล้องของ PIP					
1. Incident (Title), Information (Process / Applicable Data)	Y				1
2. Operation Actions (Control Room / Field Operator)	Y				1
3. Fire Fighting Resource & Response	Y				1
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Central Control Room): ประเมินบุคคลอุปกรณ์และการสื่อสาร					
4. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	Y				1
5. Boardman ทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action	Y				1
6. - สั่งการศูนย์สื่อสารให้ส่ง SMS / แฟกซ์ - สั่งการ OC ประเมินจุดเกิดเหตุ	Y				1
7. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ และเอกสาร P&ID, PIP พร้อมใช้งาน	Y				1
8. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสายจาก Control Room	Y				1
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคลอุปกรณ์และการสื่อสาร					
9. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM และทำตามได้ครบถ้วน	Y				1
10. การส่ง Fax ให้ รน.อ. ต้นสังกัด (ภายใน 10 นาที) 3 การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน และโทรติดต่อแจ้งนิคมต้นสังกัด หรือ สทร.			NA		-
11. ศูนย์บูรพาส่ง Fax ให้ รน.อ. (EMCC) และศูนย์สื่อสาร ปตท.			NA		-
12. ติดต่อร้องขอการสนับสนุนจาก GC1, GC2 หรือ G11 - FIT B, CM Team			NA		-
13. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	Y				1
14. โทรแจ้งหน่วยงานราชการท้องที่ ปภ.เทศบาลฯ, ปภ.จังหวัด			NA		-
15. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงตามสายจากศูนย์สื่อสาร	Y				1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
16. แผนการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ ใช้งานได้ดี	Y				1
จุดเกิดเหตุ และจุดสั่งการที่เกิดเหตุ (Command Post): ประเมินบุคคลอุปกรณ์การสื่อสาร					
17. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Y				1
18. มีการประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS หรือ Boardman ในขั้นแรก	Y				1
19. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าระงับเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ - FIT A Mixed Plant	Y				1
20. ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสมนับจากมีการร้องขอจากศูนย์สื่อสาร - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ ใช้เวลา.....5.....นาที - FIT A Mixed Plant ใช้เวลา.....นาที	Y				1
21. ทีมดับเพลิงที่มาสนับสนุน ถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม - FIT B GC13 ใช้เวลา.....นาที - FIT B GC2 หรือ GC11 ใช้เวลา.....นาที - FIT B NPC S&E ใช้เวลา.....นาที - ทีมสนับสนุนเพิ่มเติม FIT B GC3 (ตามการร้องขอ) ใช้เวลา.....นาที			NA		-
22. OC และทีมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกันในจุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุ			NA		-
23. มีการใช้น้ำป้องกันการลุกลามหรือป้องกันการติดไฟ - มีการเลือกใช้โฟมหรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	Y				1
24. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิง สวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน	Y				1
25. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง, SCBA, รถดับเพลิง, Drone Thermal Camera ฯลฯ	Y				1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
26. มีประเมินสถานการณ์ เพื่อขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย	Y				1
การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response และ TRIAGE AREA)					
27. Fit Team/Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ภายใน 4 นาที ปฐมพยาบาล/ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม (หลังจาก OC สั่งการ)			NA		-
28. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ			NA		-
29. OC มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
30. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
31. กรณีสารเคมี / รังสี มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง รพ.พร้อมข้อมูล SDS			NA		-
32. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่ง รพ.ได้ภายใน 1 ชม.			NA		-
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Command Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
33. มีการตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าที่มารายงานตัวครบภายในเวลา 60 นาที			NA		-
34. EM สรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ ED Duty และ Emergency Duty Team ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานกำหนดแผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน			NA		-
35. Emergency Duty Team มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินรวมถึงจัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			NA		-
36. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลที่สำคัญบน Incident Board ถูกต้องและครบถ้วน			NA		-
37. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์, โทรสาร, CCTV, P&ID, SDS, PIP และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ มีพร้อมใช้งาน	Y				1
ศูนย์อำนวยการภาวะวิกฤต (Crisis Management Center)					
38. มีการจัดตั้งศูนย์ CMC, CBC ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (ROชัน 5 ห้องดารารัตน์, ENCO ชัน18)			NA		-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
39. ระบบการติดต่อสื่อสารของศูนย์ CMC, CBC เช่น VDO Conference, CCTV, Drone, ชุดควบคุมระบบสื่อสาร			NA		-
40. ERS Chief GC1 ทำหน้าที่ผู้ควบคุมห้อง CMC, CBC ทำได้ถูกต้อง			NA		-
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
41. อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผน และรายงานให้ศูนย์ ECC ทราบ			NA		-
42. Assembly Controller และArea Warden ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง มีการสวมเสื้อ Area Warden และใช้ใบตรวจสอบรายชื่อที่ Update			NA		-
จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก: ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
43. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู Main gate การจราจร			NA		-
44. MC2 ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่มาสนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
45. Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
				Sum of Rating	21/21
				Effectiveness Score	100%

Calculation of Effectiveness Score % = Sum of Total Rating Points x 100
No. of rated items

Effectiveness Scoring

>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80%	=	Fair
>80% - 90%	=	Good	<70%	=	Review Required

Positive Observations: ข้อดี

1.ทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2.FIT-A สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน และดำเนินการตามกลยุทธ์

Improvement Observations: ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข

Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1				
2				
3				
4				
5				

ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน

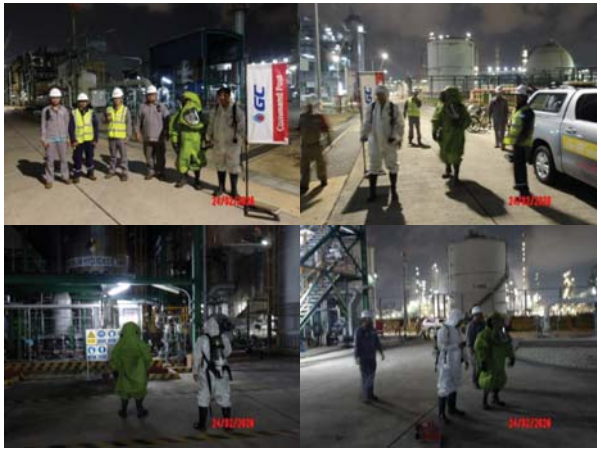

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

☐ Tabletop ☑ EM 1 ☐ EM 2 ☐ EM 3

บริษัท/สาขา	PTTGC2	**Unit Name**	T-3801	**วันที่ (Date)**	10/03/2026	
Shift (A/B/C/D)	D	**ผู้ประเมิน**		**ตำแหน่ง**	ERS Supervisor	

Scenario	ระหว่างใช้งาน Ammonium hydroxide จาก tank (T-3801) เกิด PSV Failure (Vacuum Release Valve) มีผลทำให้เกิด Vacuum ภายใน tank (T-3801) และ เกิดการยุบตัวเล็กน้อยทำให้รอยเชื่อมปริแตกเสียหายจนเกิด Ammonium hydroxide leak ออกมาเป็น Liquid และเป็นไอฟุ้งกระจาย

Rating: Yes = Emergency response need met (การปฏิบัติดีเป็นไปตามที่ต้องการ) ผลการประเมิน = 1

No = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) ผลการประเมิน = 0

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
ความสอดคล้องของ PIP					
1. Incident (Title), Information (Process / Applicable Data)	Y				1
2. Operation Actions (Control Room / Field Operator)	Y				1
3. Fire Fighting Resource & Response	Y				1
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Central Control Room): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
4. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	Y				1
5. Boardman ทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action	Y				1
6. - สั่งการศูนย์สื่อสารให้ส่ง SMS / แฟกซ์ - สั่งการ OC ประเมินจุดเกิดเหตุ	Y				1
7. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ และเอกสาร P&ID, PIP พร้อมใช้งาน	Y				1
8. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสายจาก Control Room	Y				1
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
9. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM และทำตามได้ครบถ้วน	Y				1
10. การส่ง Fax ให้ กนอ. ต้นสังกัด (ภายใน 10 นาที) / การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน และโทรติดต่อแจ้งนิคมต้นสังกัด หรือ สทร.			NA		-
11. ศูนย์บูรพาส่ง Fax ให้ กนอ. (EMCC) และศูนย์สื่อสาร ปตท.			NA		-
12. ติดต่อร้องขอการสนับสนุนจาก GC1, GC2 หรือ G11 - FIT B, CM Team			NA		-
13. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	Y				1
14. โทรแจ้งหน่วยงานราชการท้องที่ ปภ.เทศบาลฯ, ปภ.จังหวัด			NA		-
15. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงตามสายจากศูนย์สื่อสาร	Y				1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
16. แผนการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ ใช้งานได้ดี	Y				1
จุดเกิดเหตุ และจุดสั่งการที่เกิดเหตุ (Command Post): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
17. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Y				1
18. มีการ ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS หรือ Boardman ในขั้นแรก	Y				1
19. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าระงับเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ - FIT A Mixed Plant	Y				1
20. ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสมนับจากมีการร้องขอจากศูนย์สื่อสาร - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ ใช้เวลา .....5.....นาที - FIT A Mixed Plant ใช้เวลา .....นาที	Y				1
21. ทีมดับเพลิงที่มาสนับสนุน ถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม - FIT B GC1 ใช้เวลา .....นาที - FIT B GC2 หรือ GC11 ใช้เวลา .....นาที - FIT B NPC S&E ใช้เวลา .....นาที - ทีมสนับสนุนเพิ่มเติม FIT B GC3 (ตามการร้องขอ) ใช้เวลา .....นาที			NA		-
22. OC และทีมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าทำการระงับแหตุ			NA		-
23. มีการใช้น้ำป้องกันการลุกลามหรือป้องกันการติดไฟ - มีการเลือกใช้โฟม หรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	Y				1
24. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิง สวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน	Y				1
25. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง, SCBA, รถดับเพลิง, Drone Thermal Camera ฯลฯ	Y				1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
26. มีประเมินสถานการณ์ เพื่อขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย	Y				1
การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response และ TRIAGE AREA)					
27. Fit Team/Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ภายใน 4 นาที ปฐมพยาบาล/ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม (หลังจาก OC สั่งการ)			NA		-
28. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ			NA		-
29. OC มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
30. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		-
31. กรณีสารเคมี / รังสี มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง รพ.พร้อมข้อมูล SDS			NA		-
32. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่ง รพ.ได้ภายใน 1 ชม.			NA		-
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Command Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
33. มีการตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าที่มารายงานตัวครบภายในเวลา 60 นาที			NA		-
34. EM สรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ ED Duty และ Emergency Duty Team ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานกำหนดแผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน			NA		-
35. Emergency Duty Team มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินรวมถึงจัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			NA		-
36. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลที่สำคัญบน Incident Board ถูกต้องและครบถ้วน			NA		-
37. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์, โทรสาร, CCTV, P&ID, SDS, PIP และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ มีพร้อมใช้งาน	Y				1
ศูนย์อำนวยการภาวะวิกฤต (Crisis Management Center)					
38. มีการจัดตั้งศูนย์ CMC, CBC ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (ROชั้น 5 ห้องดารารัตน์, ENCO ชั้น18)			NA		-

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน Yes	No	NA	ข้อสังเกตที่พบ	RATING
39. ระบบการติดต่อสื่อสารของศูนย์ CMC, CBC เช่น VDO Conference, CCTV, Drone, ชุดควบคุมระบบสื่อสาร			NA		-
40. ERS Chief GC1 ทำหน้าที่ผู้ควบคุมห้อง CMC, CBC ทำได้ถูกต้อง			NA		-
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล่ อุปกรณ์และการสื่อสาร					
41. อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว่ ครบถ้วนและตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผน และรายงานให้ศูนย์ ECC ทราบ			NA		-
42. Assembly Controller และ Area Warden ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง่ มีการสวมเสื้อ Area Warden และใช้ใบตรวจสอบรายชื่อที่ Update			NA		-
จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก: ประเมินบุคคล่ อุปกรณ์ การสื่อสาร					
43. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู่ Main gate การจราจร			NA		-
44. MC2 ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่มาสนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
45. Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		-
				Sum of Rating	21/21
				Effectiveness Score	100%

Calculation of Effectiveness Score % = Sum of Total Rating Points x 100

No. of rated items

Effectiveness Scoring

>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80%	=	Fair
>80% - 90%	=	Good	<70%	=	Review Required

Positive Observations: ข้อดี

1.ทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2.FIT-A สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน่ และดำเนินการตามกลยุทธ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

Improvement Observations: ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข

Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1				
2				
3				
4				
5				

ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน

ผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับที่ 3

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ร่วมกับ เทศบาลนครมาบตาพุด และ บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)

ซ้อมแผนฉุกเฉินแนวท่อ ระดับ 3 โรงงาน (ระดับ 1 จังหวัด)

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ บริเวณ ถนนทางหลวง 363 หลักกิโลเมตรที่ 2 + 300
ตรงข้าม GC สำนักงานระยอง (Rayong Office /RO)

สรุปการประเมินผล

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแนวท่อ ระดับ 3 โรงงาน (ระดับ 1 จังหวัด)

กลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี
(EMAG ; Emergency Mutual Aid Group) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการประเมิน

- การบริหารจัดการ ศูนย์ปัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว (EIC)
- การรักษาอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ
- การบริหารจัดการ ศูนย์ปัญชาการเหตุฉุกเฉินโรงงาน (ECC)
- การคัดกรองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (Triage Area)
- การควบคุมสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Commander)
- การรับทรัพยากรในการระงับเหตุ (Staging Area)
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน (ชุมชนเขาไผ่)
- ภาพรวมทั่วๆไป

การบริหารจัดการศูนย์ปัญชาการเหตุการณ์ จังหวัด (EIC)

ข้อดี

- ผู้บริหารเหตุการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมซ้อมครบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์ปัญชาการณ์ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว (EIC) มีความพร้อมด้านข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัย
- การบัญชาการภายในห้องเป็นไปตามโครงสร้างการบัญชาการ/กรอบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการศูนย์ปัญชาการเหตุการณ์ จังหวัด (EIC)

ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา

- ผู้ที่บทบาทหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการซ้อมแผนฯต้องแสดงสัญลักษณ์หรือติดบัตรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเข้าไปภายในห้องศูนย์บัญชาการฯและห้องแถลงข่าว
- เนื่องจากพื้นที่การซ้อมฯอยู่ภายนอกพื้นที่การนิคมฯมาบตาพุดเลขาศูนย์ฯต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ ปภ.จังหวัดทราบ
- สัญญาณวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ ปภ.เทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ จุดเกิดเหตุ กับ ศูนย์ฯ EIC ไม่ชัดเจน การรายงานเหตุการณ์มายังศูนย์ฯขาดความต่อเนื่องทำให้ศูนย์ฯได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรงงาน (ECC)

ข้อดี

- มีการแยกศูนย์ฯหรือห้อง ECC ออกมาจาก Process Plant ซึ่งใช้กรณีเกิดเหตุกับแนวท่อของโรงงาน
- มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินโรงงานของ Duty Teams และ Plant ERT ได้ครบถ้วน
- มีการบันทึกเหตุการณ์ด้วยระบบ EIMS (Emergency Incident Management Systems)

การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โรงงาน (ECC)

ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา

- การบันทึกเหตุการณ์ด้วยระบบ EIMS สามารถเข้าดูได้ทั้ง Computer และ โทรศัพท์มือถือส่วนตัว ที่โหลด Application แล้วเท่านั้น บุคคลภายนอกดูได้จาก Computer ซึ่งเลขาศูนย์ควรเปิดให้เข้าดูได้
- การแจ้งอาการผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ปานกลาง และบาดเจ็บรุนแรง ที่นำส่ง รพ.รายงานมายังศูนย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงงาน สามารถรายงานตามข้อจำกัดได้ปกติ แต่กรณีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ต้องได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดจากแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบก่อนซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
- การแจ้ง 1669 เพื่อทราบและขอสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารโรงงานต้องให้ข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและผู้บัญชาการเหตุโรงงานต้องติดตามการแจ้งด้วย

การรักษาอาการผู้บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้อดี

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปฏิบัติได้ตามแผนฯเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงเป็นผลดีต่อ รพ.เพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรทีมฉุกเฉิน
- มีการประสานงานกันด้วยดีระหว่างเจ้าหน้าที่ รพ.กับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงงานเกี่ยวกับการนำส่งผู้บาดเจ็บจากจุดคัดกรองของโรงงานที่เกิดเหตุ
- โรงพยาบาลมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สามารถรองรับผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้แต่ถ้าผู้บาดเจ็บมีอาการรุนแรงมาก โรงพยาบาลสามารถส่งต่อไปยัง รพ.จังหวัดได้

การรักษาอาการผู้บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา

- การประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฯภายใน รพ.ขณะทำการซ้อมแผนฯอาจจะไม่ทั่วถึงทำให้ผู้ที่มาใช้บริการภายใน รพ.ไม่ทราบว่าซ้อมแผนฯหรือเกิดเหตุจริง
- การแจ้งเหตุจากการเกิดเหตุซ้ำซ้อนทาง รพ.ไม่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ของโรงงานที่เกิดเหตุ ซึ่งโรงงานรับพิจารณานำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) โรงงานที่เกิดเหตุต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนระดับ 1 จังหวัดมาให้ครบถ้วน

การควบคุมสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Commander)

ข้อดี

- มีการทำหน้าที่ (On Scene Commander) ครบทั้ง 3 หน่วยงานตามแผน คือ ปภ.เทศบาลนครมาบตาพุด โรงงานต้นทางของท่อส่งผลิตภัณฑ์ IRPC และโรงงานที่รับผิดชอบแนวท่อ GC
- ได้รับการสนับสนุนรถ Command จากสมาชิกกลุ่ม EMAG บริษัท SPRC ใช้งานได้จริง มีประโยชน์อย่างมาก สามารถเคลื่อนย้ายได้และรองรับกรณีฉุกเฉิน
- มีการพัฒนาพื้นที่ กำหนดจุด On Scene Commander ได้อย่างเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ 360 องศา ซึ่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับแนวท่อนอกพื้นที่โรงงานส่วนใหญ่พบอุปสรรคเรื่องพื้นที่สำหรับการสั่งการ

การควบคุมสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Commander)

ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา

- ไม่มีผู้นำรถสนับสนุนการระงับเหตุเข้าพื้นที่ เช่น รถ Fire Truck รถกู้ภัยสารเคมีและ รถ Decon อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากพื้นที่คับแคบ
- การรายงานเหตุการณ์เมื่อปรับระดับ 1 จังหวัดโดย OC ของเทศบาลไปยังศูนย์ EIC ข้อมูลไม่ต่อเนื่องสาเหตุมาจากสัญญาณวิทยุไม่ชัดเจนเพราะระยะทางไกลประมาณ 16 กิโลเมตร
- ทีมระงับเหตุเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่จุดเกิดเหตุใช้เวลานานกว่าจะนำคนเจ็บออกมายังจุดคัดกรอง (Triage Area) เพื่อทำการ Decon

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน (เขาไฝ่)

ข้อดี

- เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานลงพื้นที่ตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองพร้อมกับให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยกับตัวแทนชุมชนรับทราบ
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการเพื่อสังคมโรงงาน (CSR) นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำชุมชน

ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา

- ทิศทางลมใน Scenario ไม่สอดคล้องกับทิศทางลมจริงที่หน้างานขณะทำการซ้อมฯ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการซ้อมฯ
- อุปกรณ์เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศถ้าขาดการตรวจสอบการใช้งานค่าที่วัดได้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง

ภาพรวมทั่วไป

ข้อดี

- เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (KPI) ที่ตั้งไว้
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมแผนแนวท่อระดับ 1 จังหวัด เข้าร่วมซ้อมครบตามแผน
- ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและเจ้าของโครงการใกล้จุดเกิดเหตุให้ความร่วมมือดี
- พื้นที่บริเวณที่ซ้อมแผนฯได้มีการพัฒนาโดยการกำจัดวัชพืชและปรับพื้นที่ให้สะอาดขึ้น
- ทำให้ชาวบ้านทั่วไปรับทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีท่อน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ใต้ดินจะได้ช่วยกันระมัดระวัง

สรุปภาพรวมทั่วไปการซ้อมแผนแนวท่อระดับ 1 จังหวัด

สื่อสาร กนอ.

สื่อสาร เทศบาลฯ

สื่อสาร รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

สำรวจพื้นที่ฯ

เตรียมพื้นที่

Tabletop Exercise

Dry Run

ฝึกซ้อมฯจริง

การฝึกซ้อมฯเสร็จสิ้น

ศูนย์ฯ EIC แถลงข่าว

รพ.รับผู้บาดเจ็บ

ชำระการปนเปื้อน

ขอบคุณทุกท่าน

ภาคผนวก ข.25

เอกสาร Pre-Fire Plan

EQUIPMENT NO.	V - 4308
UNIT NO.	4300

N

HEAT FLUX LEVEL (DOW WIND)		
2 kW/m2	xx	m.
5 kW/m2	xx	m.
10 kW/m2	12	m.

Double click to enlarge side view contour



INCIDENT

1	Title (**ชื่อเหตุการณ์**)	Fuel Gas **รั่วจากอุปกรณ์ V-4308 และลุกติดไฟ**		
	Possible cause & effects (**สาเหตุ / เหตุการณ์และผลกระทบ**)	หน้าแปลนขนาด 14" (Gasket) Line Outlet Failure แตกฉีดขาด ทำให้มี Fuel Gas รั่วไหลออกมาเป็น Vapor Cloud และ จุดติดไฟจากแหล่งความร้อน จาก Aux. Boiler ที่เดินเครื่องอยู่ใกล้ๆบริเวณเดียวกัน		
	Exact location (**ระบุจุดที่เกิดเหตุของอุปกรณ์**)	หน้าแปลนขนาด 14" (Gasket) Line Outlet Failure แตกฉีดขาด	Equivalent pin hole (**ขนาดของรูรั่วโดยประมาณ**)	50 มม.

INFORMATION

2	**Type of incident**			
	PROCESS CONDITION / APLICABLE DATA (กรอกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)			
	Tank number / Location	V-4308 / ZONE 1	Name of unit Fuel Gas Mixing Drum	ZONE 1 EPS
	Roof type	-	Unit No	4300
	Diameter of tank	1.0668 m Height 2.9 m	Equipment /Tag No	V-4308
	Full surface area **	m²	Product, Fluid / Component	NG Back Up From I-4 & Olefin Gas + Tail Gas From I-4 & I-1
	Height of point of leak	1.5	Percent (%)	-
	Volume / Inventory	2.9 m³	Boiling point	- °C
	Fire detection	On - Site people	Flash point	- °C
	Isolation	Manual operations	Auto ignition temperature	C
	Fire protection	fixed monitor	LEL (%vol.)	%
	Pump out rate	-	UEL (%vol.)	%
	Type of vent	n/a	Vapor density (to air)	
	Design temperature	-10/+105 °C	Specific gravity (to water)	
	Tank dike dimension	-	Physical property	Gas
	Internal dike dimension	-	Water soluble?	-
	Health hazard	-	Operating pressure	5.0 kg·cm² (Actual Setting 5.8 kg/cm²)
	TLV-TWA / TLV-STEL	-	Operating temperature	15.5 – 30 ° C (Actual 71 ° C)
	Flammability	-	Flow rate	12000 – 15000 $N_{m3/hr}$
	Respirator type /Filter type / No	SCBA	.....	-
	Other information	-		

รูปที่เกิดเหตุ (Double click เพื่อขยาย)

INCIDENT CONTROL PLAN

3

1) Objectives (**เป้าหมายการระงับเหตุ**)
1. ป้องกันโครงสร้าง อุปกรณ์ข้างเคียงไม่ให้เสียหาย-ไม่ให้ไฟไหม้ลุกลาม
2. ลดการรั่วไหล - หยุดการรั่วไหล
3. ควบคุมการรั่วไหลให้จำกัดอยู่ในที่กั้น

2) Strategies (**แผนกลยุทธ์**)
1. ปิดกั้นแยกบริเวณ 1,600 เมตร หรือพิจารณาอพยพออกจากจุดเกิดเหตุ
2. ดับเพลิงระยะไกลโดยใช้อุปกรณ์ฉีดชนิดที่ไม่ต้องใช้คนถือ หรือใช้อุปกรณ์ประจำที่
3. Cooling ภาชนะบรรจุด้วยน้ำปริมาณมากจนกว่าเพลิงไหม้จะดับลง
4. ถอนกำลังเจ้าหน้าที่ทันที กรณีมีเสียงผิดปกติ หรือภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี

3) Tactics (**เทคนิคการปฏิบัติ / แผนปฏิบัติของ** OC)
1. OC ให้ FO ควบคุมเพลิงเบื้องต้น โดยใช้ Dry Chemical ฉีด V-4308
2. Cooling อุปกรณ์ที่มีผลกระทบข้างเคียง
3. OC ขอกำลังสนับสนุนจาก Fit Team / I-4 / NPC S&E
4. OC Set team (ดับเพลิง+FO)เข้าควบคุมสถานการณ์

4) ทรัพยากรที่ต้องใช้

		คน / FIT / Fire Man	อุปกรณ์ / Fire Truck	Monitor Flow Rate (lpm)	Foam Con (lire)
1	พนักงานดับเพลิง	6	2	1250 / 1250	4900 / 3755
2	Operator	3	-	-	-
3	Fit Team	4	-	-	-
4	กำลังสนับสนุน / I-4	4	1	1250	3795
5	NPC S&E	7	1	2000	3785
	รวม (sum above)	22	4	-	16,235

OPERATION ACTIONS

4

Control Room
1. Close Control Valve 43-PV-3024A & 43-PV-3024B
2.Shut Down Duct Burner H-3708,H-3709,H-3710
3.Open 43-PV-3028 De-pressure V-4308 To Flare
4.ประสานงานกับ Operator ทำการ Isolate อุปกรณ์

Field Operator
1.Operator พบเหตุการณ์แจ้งเหตุการณ์ให้ SS ทราบ
2.Operation ควบคุมเพลิงเบื้องต้น โดยใช้ Dry Chemical ฉีด
3.Operator ร่วมกับทีมดับเพลิงเข้าทำการ Cooling อุปกรณ์ข้างเคียง
4.Operator + ทีมดับเพลิงเข้าทำการ Isolate

FIRE FIGHTING

5

1.Fire Fighting Response (**แผนการระงับเหตุ**)

4.1) First Response (ดำเนินการโดย field operator ที่อยู่ในพื้นที่)

1. Operator พบเหตุการณ์แจ้งเหตุการณ์ให้ SS ทราบ+ควบคุมเพลิงเบื้องต้น โดยใช้ Dry Chemical ฉีด

4.2) Second Response (ดำเนินการโดย FIT Team /กำลังเสริมใน Plant)

1. ทำการ Cooling V-4307 Piping และโครงสร้างอุปกรณ์ข้างเคียง
2. นำรถดับเพลิงคันที่ 1 เข้าทางประตู G-3 ใช้ถนน R-13 และ R-1394 ต่อน้ำจาก HT-03 เพื่อฉีดเปลี่ยนทิศทางเปลวเพลิง และเข้าปิด Valve
3. นำรถดับเพลิงคันที่ 2 เข้าทางประตู G-3 ใช้ถนน R-13 และ R-1394 ต่อน้ำจาก HT-02 เพื่อ Cooling โครงสร้างอุปกรณ์ข้างเคียงและแนว Pipe Rack
4. Fit Team จาก NPC-SE/I-4 สนับสนุนพนักงานดับเพลิง
5. ประสานงานกับ EM เพื่อทำการ Isolate ระบบ

4.3) Third Response (การ set team เข้า manual isolate / fire attack)

1. Close Block Valve Inlet Valve 43-PV-3024A & 43-PV-3024B
2. Open 43-PV-3028 De-pressure V-4308 To Flare De-Pressure to 0 kg/cm²

2.Foam Discharge Equipment (ชนิดของอุปกรณ์ฉีดโฟมที่ใช้)

2.1) n/a 2.2) n/a 3.3) Flow rate *: - lpm

3.Foam Calculation (คำนวณโฟม) สำหรับ ฉีดคลุมเพื่อป้องกันการลุกไหม้ และการระเหย

Burning Dia (m.)	0.0	m.
พื้นที่ผิวผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้	0.0	m^2
อัตราการใช้โฟม solution	0.0	lpm/m^2
Foam solution rate ที่คำนวนได้	0.0	lpm.
Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง*	0.0	lpm
Foam solution % *	0.0	%
Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที	0.0	lpm
Application time *	0.0	นาที
ต้องใช้ foam concentrate รวม	0.0	ลิตร

4.Fire Water Application Calculation (คำนวนการใช้น้ำ)

อุปกรณ์	จำนวน	Flow rate(LPM)	รวม (LPM)	อุปกรณ์ที่ต้อง Cooling
Ground monitor	1	1805	1895	ทำม่านน้ำป้องกันการฟุ้งกระจายของ Hcl
2. Nozzle	4	473	1892	ฉีดน้ำลดความเข้มข้นป้องกันการฟุ้งกระจาย
รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้			3787	
รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ใน .รม 1(M³)				

Max. water supply 21,000 lpm | Drainage capacity ... lpm | **รวมปริมาณน้ำดับเพลิงที่ต้องใช้** 3,787 lpm

OTHER RECOMMENDATIONS / CONCERNS

6

Drainage : รางระบายน้ำผ่านหน้า CCB ออกคลองระบายน้ำหน้าโรงงาน
Environmental Issue: จะเกิดระเบิดเมื่อโดนความร้อน และเมื่ออยู่ในรูของไอ / อยู่เหนือลมห่างจากด้านหน้าหัวท้ายของถังบรรจุให้ฉีดน้ำเป็นฝอย
Others: สารเคมีที่ถูก Scrub จะถูกระบายออกทางรางระบายน้ำข้างถนน R-1394 การป้องกัน ปิดรางระบายน้ำข้างอาคารดับเพลิงเพื่อสูบมาบำบัดที่ U-5600

รูปจุดปิดกั้นรางระบายน้ำ (Sluice Gate 3 จุด)

Sluice Gate 1 (R-139 ติด TPE)

Sluice Gate 2 (ข้างอาคารดับเพลิง)

Sluice Gate 3 (Unit 5600)

Prepared by (ผู้ร่วมจัดทำ)	Operation:	นาย	Reviewed By (SM /SS / Shift Team)	นาย สมเกียรติ จัตรศรี	Final reviewed by Plant Manager
	Q-SH-CM staff:	นายธิเบติ สว่างศรี	ERS Supervisor	นายชัชวาล ควงประเสริฐ	Date: 31 Jan 2022

สำเนา Hard Copy: เก็บที่ ECC ของพื้นที่, Shift Manager ของ Plant, **ควบคุม Electronic File โดย** Q-SH-CM

ภาคผนวก ข.26

Procedure เรื่อง ระบบการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่หวงห้าม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Technical Safety and PSM

P-(Q-TS)-OEMS-002

Permit to Work System

Created by : [redacted]

Vice President

Approved by : [redacted]

Senior Vice President

Reviewer list

Reviewer	Position	Unit Code

Edition records

[redacted]

[redacted]

PTT Global Chemical Public Company Limited	**Error! Unknown document property name.:** Permit to Work System

[redacted]

[redacted]

[redacted]







[redacted]

[redacted]

[redacted]

PTT Global Chemical Public Company Limited

Error! Unknown document property name.: Permit to Work System

[redacted]

Revision No.: 1
Date: 11/12/2018

Page 1 of 11





[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ภาคผนวก ข.27

เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงาน

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำ

[redacted]

รายละเอียด: งานตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง

[redacted]

















รายละเอียด: งานตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง









Procedure เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพนักงาน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Occupational Health Management

P-(Q-EH-OH)-001

โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

Internal Use Only

จัดทำโดย : [redacted]

Division Manager

อนุมัติโดย : [redacted]

Vice President

รายชื่อผู้ทบทวน

ผู้ทบทวน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
น.ส. วลัยพร บุญยะโพธิ์	Division Manager	Q-EH-OH

รายการแก้ไข

[redacted]

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร
	ความเหมาะสมในการจ้างงาน
F-(Q-EH-OH)-003	ใบแจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล์ เคมิคอล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

[redacted]

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

[redacted]

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-EH-OH)-001: โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน

ประกาศใช้ครั้งที่ 1 หน้า 29 จาก 31 วันที่มีผลบังคับใช้: 05/07/2021

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติ
จากผลการตรวจสุขภาพ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Occupational Health Management

W-(Q-EH-OH)-002

ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ

Internal Use Only

จัดทำโดย : [redacted]

Occupational Health Analyst

อนุมัติโดย : [redacted]

Division Manager

รายชื่อผู้ทบทวน

ผู้ทบทวน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน

รายการแก้ไข

[redacted]

เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน,	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



eGFR Estimated glomerular filtration rate อัตราการกรองของไต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(Q-EH-OH)-002: ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2569

Health Checkup Schedule

ตรวจสุขภาพ วันที่ 2 มี.ค. - 15 พ.ค. 69

Group1 : รพ.ระยอง

GC4, GC7, GC8	กะ A 11 มี.ค. กะ D 13 มี.ค. กะ B 16 มี.ค. กะ C 18 มี.ค.	07.00-14.00 น.	อาคาร Admin GC4
GC5	กะ C 19 มี.ค. กะ A 20 มี.ค. กะ D 23 มี.ค. กะ B 25 มี.ค.	07.00-12.00 น.	อาคาร Canteen
GC6	DAY 26 มี.ค. กะ A 30 มี.ค. กะ D 1 เม.ย. กะ B 3 เม.ย. กะ C 7 เม.ย.	07.00-14.00 น.	อาคาร Canteen

Group2 : รพ.กรุงเทพระยอง

GC11	กะ A 2 มี.ค. กะ D 5 มี.ค. กะ B 6 มี.ค. กะ C 10 มี.ค.	06.00-14.30 น.	สถานพยาบาล
GC12, GC17	กะ A 11 มี.ค. กะ D 13 มี.ค. กะ B 17 มี.ค. กะ C 18 มี.ค.	06.00-14.30 น.	อาคาร Admin
GC18	กะ A 20 มี.ค. กะ D 24 มี.ค. กะ B 25 มี.ค. กะ C 27 มี.ค.	06.00-14.30 น.	อาคาร Admin
GC9, GC16, GC19, GCP, GGC	กะ A 30 มี.ค. กะ D 2 เม.ย. กะ B 3 เม.ย. กะ C 7 เม.ย. DAY 8 เม.ย.	06.00-14.30 น.	อาคาร Work Shop Glycol

Group3 : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

GC2	กะ B 3 เม.ย. กะ C 7 เม.ย. กะ A 8 เม.ย. DAY 9 เม.ย. กะ D 10 เม.ย.	06.30-14.30 น.	อาคาร Work Shop
GC3	กะ C 5 พ.ค. กะ A 6 พ.ค. กะ D 8 พ.ค. กะ B 12 พ.ค.	06.30-14.30 น.	อาคาร Maintenance
GC1, GC13	DAY 13 พ.ค. 14 พ.ค. 15 พ.ค.	06.30-14.30 น.	ห้อง Recreation room

ช่วงเวลา 06.30-08.00 น. ขอความกรุณาให้ทีม Operation เข้ารับการเจาะเลือด และตรวจการได้ยิน เพื่อลดการสัมผัสเสียงในพื้นที่การผลิต

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตัวเราเอง...ครอบครัว GC สุขภาพดีไปด้วยกันนะคร้าบ

- ตรวจครบจบที่เดียว
- ไม่เสียเวลารอนาน

Health Checkup Schedule

พบแพทย์ วันที่ 30 มี.ค. - 3 ก.ค. 69

Group1 : รพ.ระยอง

GC4, GC7, GC8	กะ D กะ B กะ C กะ A	21 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย. 28 เม.ย.	08.30-15.00 น. อาคาร Admin GC4 (GC7&GC8 พบแพทย์ 13.00-14.30 น. ในแต่ละพื้นที่)
GC5	กะ C กะ A กะ D กะ B	5 พ.ค. 7 พ.ค. 8 พ.ค. 11 พ.ค.	08.30-12.00 น. อาคาร Canteen
GC6	กะ B กะ C กะ A DAY กะ D	12 พ.ค. 14 พ.ค. 15 พ.ค. 18 พ.ค. 19 พ.ค.	08.30-14.00 น. อาคาร Canteen

Group2 : รพ.กรุงเทพระยอง

GC11	กะ A กะ D กะ B กะ C	30 มี.ค. 1 เม.ย. 3 เม.ย. 7 เม.ย.	08.30-16.00 น. สถานพยาบาล
GC12, GC17	กะ A กะ D กะ C กะ B	8 เม.ย. 10 เม.ย. 16 เม.ย. 22 เม.ย.	08.30-16.00 น. อาคาร Admin
GC18	กะ A กะ D กะ B กะ C	17 เม.ย. 20 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.	08.30-16.00 น. อาคาร Admin
GC9, GC16, GC19, GCP, GGC	กะ A กะ D กะ B กะ C DAY	27 เม.ย. 29 เม.ย. 11 พ.ค. 13 พ.ค. 15 พ.ค.	08.30-16.00 น. อาคาร Work Shop Glycol

Group3 : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

GC2	กะ D กะ B DAY กะ C กะ A	19 พ.ค. 20 พ.ค. 21 พ.ค. 22 พ.ค. 25 พ.ค.	08.00-15.00 น. อาคาร Work Shop
GC3	กะ A กะ D กะ B กะ C	23 มิ.ย. 25 มิ.ย. 26 มิ.ย. 29 มิ.ย.	08.00-15.00 น. อาคาร Maintenance
GC1, GC13	DAY	1 ก.ค. 2 ก.ค. 3 ก.ค.	08.00-15.00 น. ห้อง Recreation room

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตัวเราเอง...ครอบครัว GC สุขภาพดีไปด้วยกันนะคร้าบ

- ตรวจครบจบที่เดียว
- ไม่เสียเวลารอนาน

ภาคผนวก ข.28

คู่มือการจัดทำ E-Health Book

รู้หรือไม่?
พนักงาน GC สามารถเข้าดูผลตรวจสุขภาพ จากระบบ Health Book ได้แล้วนะ!!
Chemistry for Better Living
1.เข้า Application :
H: Health system
igital Healthcare System (DHCS)
2. เลือก Health Book
3.ค้นหาโดยใช้ "รหัสพนักงาน" หรือ "ชื่อ-นามสกุล"
4.สามารถเข้าดูข้อมูลผลตรวจสุขภาพของตัวเองได้

การเข้าระบบ Health System
01
เข้าลิงค์ ผ่าน Mobile หรือ Web
https://outsystems.pttgcgroup.com/GCHealthSystem
SCAN ME
02
เข้าผ่านระบบ Intranet
https://pttgcgroup.sharepoint.com/sites/intranet
H
Health System
HealthObject (Internet Explorer Only)
Hook E-Learning
HR Employee update location & communication data
HR Portal
HRA (Old Version)
https://askmegc.pttgcgroup.com
https://askmegc.pttgcgroup.com

การเข้าระบบ Health System
Search This Site
ABOUT PTTGC
ANNOUNCEMENT
PR NEWS
DOCUMENT CENTER
APPLICATION
DEPARTMENT WEBS
GRC
APPLICATION
Application
Health System
SEARCH
APPLICATION NAME
Health System

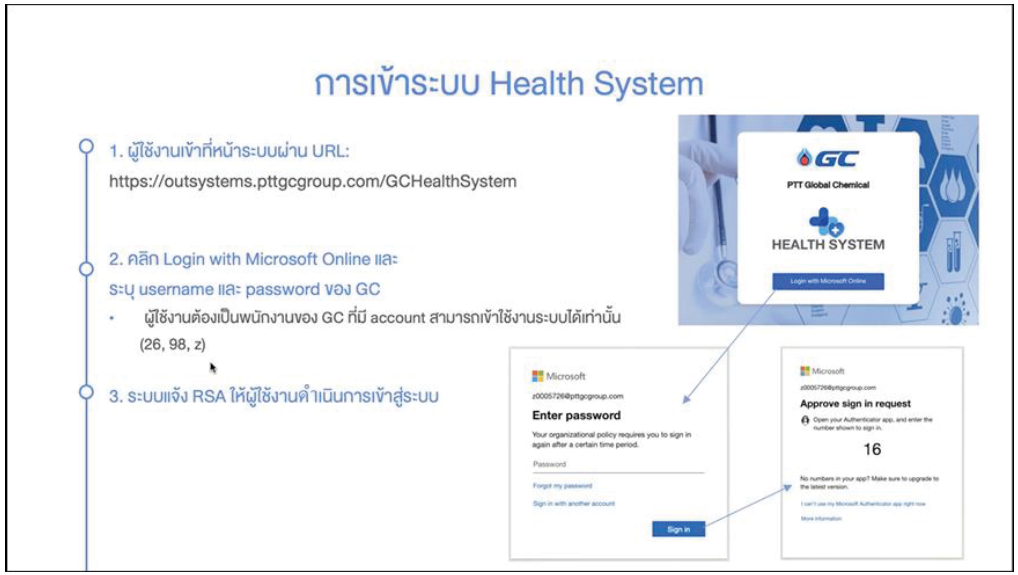
การเข้าระบบ Health System
1. ผู้ใช้งานเข้าที่หน้าระบบผ่าน URL:
https://outsystems.pttgcgroup.com/GCHealthSystem
2. คลิก Login with Microsoft Online และ
ระบุ username และ password ของ GC
ผู้ใช้งานต้องเป็นพนักงานของ GC ที่มี account สามารถเข้าใช้งานระบบได้เท่านั้น (26, 98, z)
3. ระบบแจ้ง RSA ให้ผู้ใช้งานดำเนินการเข้าสู่ระบบ
PTT Global Chemical
HEALTH SYSTEM
Login with Microsoft Online
Enter password
Sign in
Approve sign in request
16

การเข้าระบบ Health System (PDPA)

4. เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกระบบแสดงข้อความให้กดยอมรับหนังสือให้ความยินยอม คลิก ☑

5. คลิก “ยินยอม”

Noted: กรณีมีการปรับเปลี่ยนหนังสือให้ความยินยอม ระบบแสดงข้อความให้กดยอมรับหนังสือให้ความยินยอม ใหม่อีกครั้ง

6. กรณีคลิกเลือก “ไม่ยอมรับ” หนังสือให้ความยินยอม ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

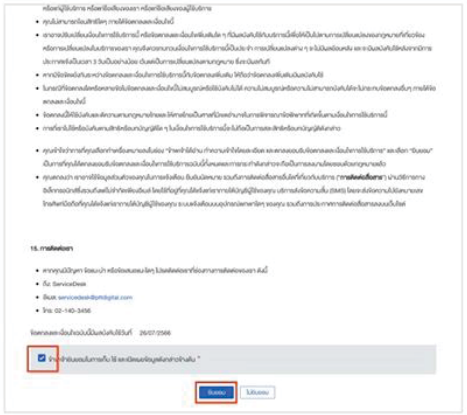

หน้าหลัก Health System (Home)

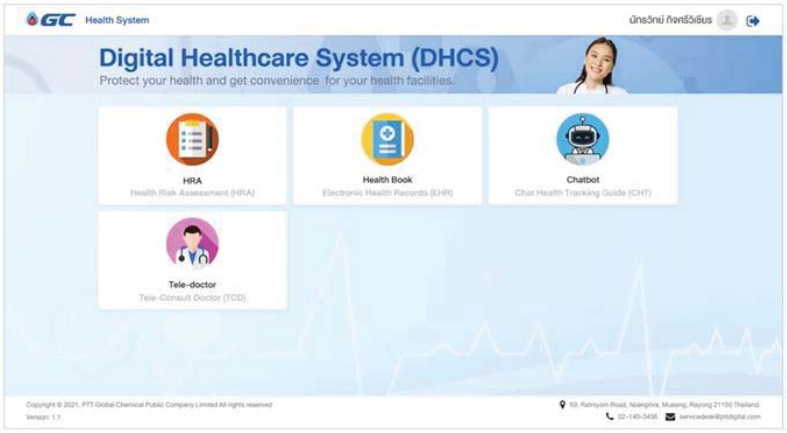

หน้าหลัก Health System (Home)

Logout — กดที่ เพื่อออกจากระบบ

Consent — กดที่ “หนังสือให้ความยินยอม” เพื่อเข้าดูหรือยกเลิกการยินยอม

Manual — กดที่ “คู่มือ” เพื่อเข้าดูคู่มือของทุกระบบ

Modules — ระบบแสดงรายการ Module ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด

HEALTH SYSTEM

การเข้าสู่ Health Book ผ่านเมนูหลัก



ประวัติส่วนตัว

ระบบแสดงหน้าประวัติส่วนตัวของพนักงาน โดยข้อมูลได้รับมาจากระบบ HR

- กดที่ปุ่ม พิมพ์สมุดสุขภาพ เพื่อนำออกข้อมูลสมุดสุขภาพของตนเองออกมา
  - รหัสการเข้าไฟล์ คือรหัสพนักงานของผู้ดาวน์โหลด



ประวัติการทำงาน

ระบบแสดงหน้าประวัติการทำงานของพนักงาน โดยข้อมูลได้รับมาจากระบบ HR

- กดที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูล เพื่อเข้าแก้ไขข้อมูล
  - ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  - อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

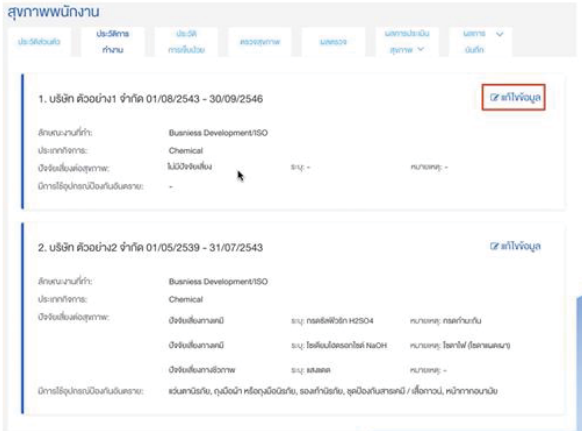

ประวัติการเจ็บป่วย

ระบบแสดงหน้าประวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยข้อมูลได้รับมาจากโรงพยาบาล และ HR (เคยป่วยเป็นโรคหรือมีอาการบาดเจ็บ)

- กดที่รายการที่ต้องการเข้าดูข้อมูล



ประวัติการเจ็บป่วย

การดูข้อมูลจาก HR - เคยป่วยเป็นโรคหรือมีอาการบาดเจ็บ

- ระบบแสดงข้อมูล 3 รายการล่าสุดที่ได้รับจาก HR
- กรณีต้องการดูข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับ กดที่ปุ่ม ดูข้อประวัติข้อมูลโรคหรือการบาดเจ็บเพิ่มเติม

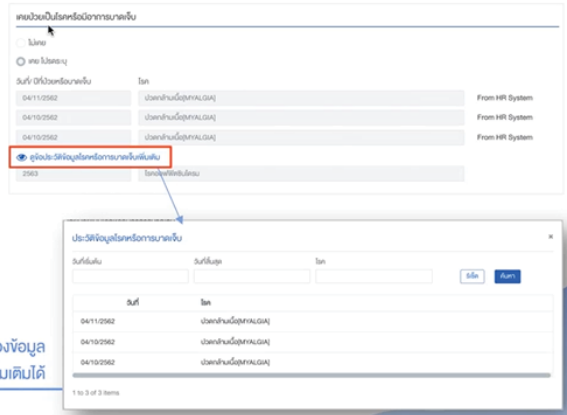

ตรวจสุขภาพ

ระแสดงรายการประเภทการตรวจทั้งหมดที่พนักงานมีผลการตรวจ

- ประเภทผลการตรวจทั้งหมดที่มีได้แก่
  - ตรวจก่อนเข้างาน
  - ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
  - ตรวจประจำปี
  - ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น
  - ตรวจตามลักษณะงาน
  - ตรวจเมื่อลาออก

- เลือกรายการ เพื่อเข้าดูผลการตรวจ
- กดที่ปุ่ม ไฟล์รวมผลตรวจสุขภาพ เพื่อดูไฟล์ผลตรวจสุขภาพทั้งหมด
  - กดที่ปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

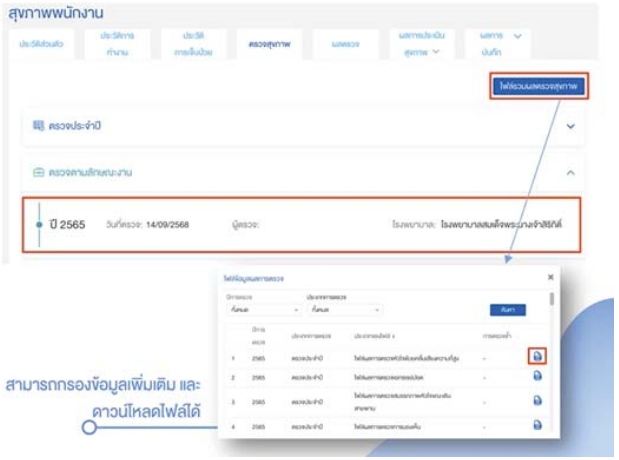

ตรวจสุขภาพ

ระบบแสดงข้อมูล โดยแยกออกตามผลการตรวจร่างกาย ดังนี้

- ข้อมูลทั่วไป
- ผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
- ผลการตรวจร่างกายตามระบบ
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

- กดที่แท็บการตรวจที่ต้องการ เพื่อเข้าดูข้อมูลในส่วนอื่นๆ

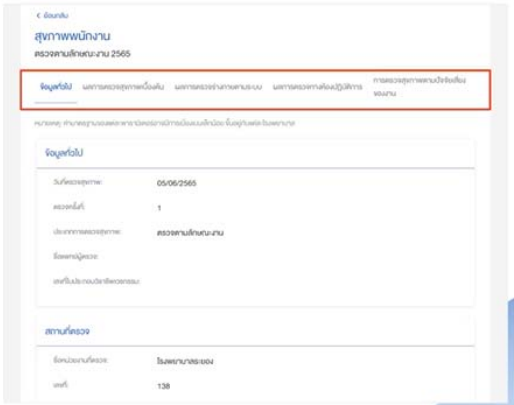

ผลตรวจ

ระบบแสดงหน้าสำหรับการค้นหาผลตรวจสุขภาพของพนักงาน

- เลือกปีการตรวจ
- เลือกพารามิเตอร์
- เลือกประเภทการแสดงผล
  - กด แสดงตาราง เพื่อแสดงรูปแบบตาราง
  - กด แสดงกราฟ เพื่อแสดงรูปแบบกราฟ

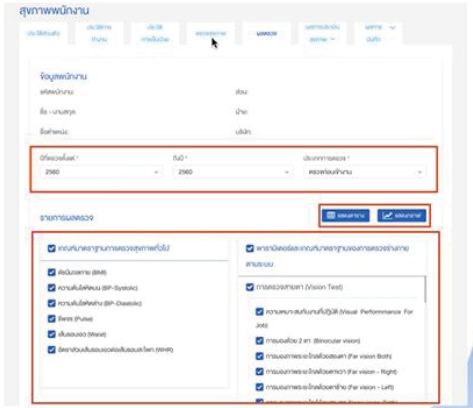

ผลการประเมิน HRA

ไปที่เมนู "ผลการประเมินสุขภาพ" เลือก "ผลการประเมิน HRA"

ระบบแสดงหน้าสำหรับการดูรายการแบบประเมิน HRA ของพนักงาน ที่ถูกดึงมาจาก Module HRA

- แสดงใบงานล่าสุดในรอบ 5 ปีเท่านั้น
- สามารถดูได้อย่างเดียว



ผลการวิเคราะห์สมรรถภาพ

ไปที่เมนู "ผลการประเมินสุขภาพ" เลือก "ผลการวิเคราะห์สมรรถภาพ"

ระบบแสดงหน้าสำหรับการดูรายการมาตรการทางด้านอาชีวอนามัย ที่ถูกดึงมาจากระบบการวิเคราะห์สมรรถภาพ

- สามารถดูได้อย่างเดียว



บันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ไปที่ "ผลการบันทึก" เลือก "บันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย"

ระบบแสดงรายการบันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย โดยข้อมูลมีทั้งหมด 2 แบบ

- พนักงานเพิ่มประวัติเอง
  - สามารถแก้ไขได้
- ระบบดึงข้อมูลจาก GC Clinic
  - ไม่สามารถแก้ไขได้





- กดที่ปุ่ม เพิ่มประวัติ เพื่อเพิ่มข้อมูล
- กดปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูล
- กดปุ่ม เพื่อลบข้อมูล
- กดปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

บันทึกการออกกำลังกาย

ไปที่ "ผลการบันทึก" เลือก "บันทึกการออกกำลังกาย"

ระบบแสดงหน้าสำหรับการดูบันทึกการออกกำลังกาย โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

- สถิติการออกกำลังกาย
- กราฟต่างๆ
- รายการบันทึก

- กดที่ปุ่ม เพิ่มประวัติ เพื่อเพิ่มข้อมูล
- กดปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูล
- กดปุ่ม เพื่อลบข้อมูล

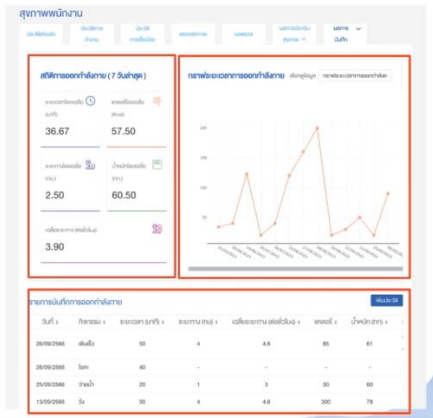

แผนการทานอาหาร

ไปที่ "ผลการบันทึก" เลือก "แผนการทานอาหาร"

ระบบแสดงหน้าสำหรับการดูแผนการทานอาหาร โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

- น้ำหนักที่ควรจะเป็น
- จำนวนแคลอรี่ ที่ควรบริโภค / วัน จากกิจกรรม
- คำนวณแคลอรี่ จากตารางอาหาร

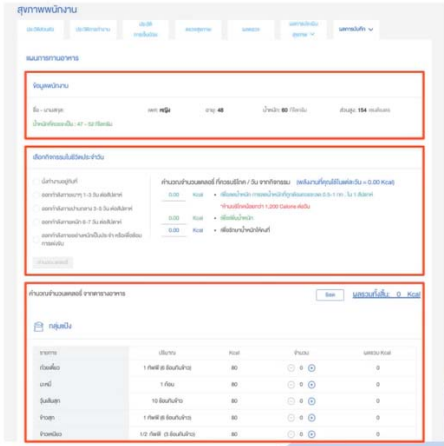

แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุข

ไปที่ “ผลการบันทึก” เลือก “แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุข ”

ระบบแสดงหน้าแบบประเมิน โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่

- หน้าเพิ่มแบบประเมิน
- หน้าดูรายการบันทึกแบบประเมิน



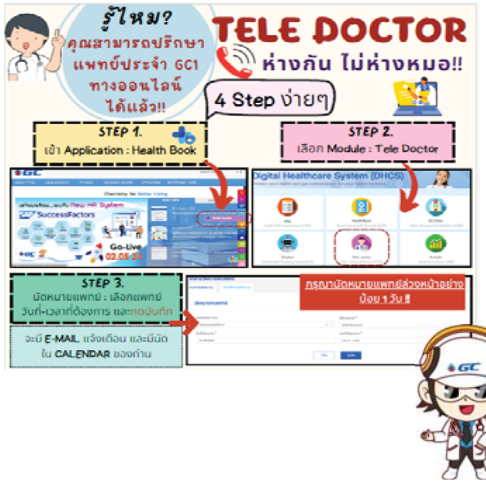

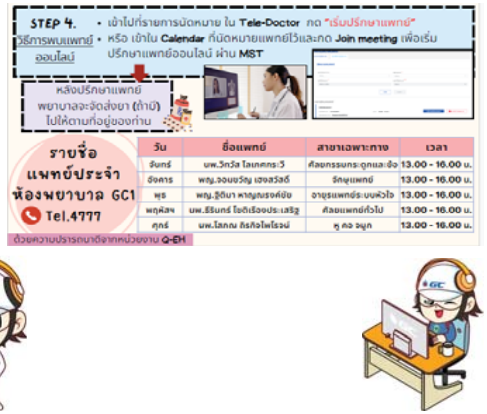

วัน	ชื่อแพทย์	สาขาเฉพาะทาง	เวลา
จันทร์	พญ.วีกวัส โอเภกฤษ์	ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	13.00 - 16.00 น.
อังคาร	พญ.จอมขวัญ เฮงสวัสดิ์	จักษุแพทย์	13.00 - 16.00 น.
พุธ	พญ.ฐิติมา หาญมณรงค์ชัย	อายุรแพทย์ระบบหัวใจ	13.00 - 16.00 น.
พฤหัสฯ	นพ.ธีรินทร์ โอติเรืองประเสริฐ	ศัลยแพทย์ทั่วไป	13.00 - 16.00 น.
ศุกร์	พ.โสภณ ธิรกิจโพโรจน์	ทู คอ จมูก	13.00 - 16.00 น.

ภาคผนวก ข.29

Drawing แสดงระบบ ESD แบบ 2 of 3 Voting System

NOTES:

1. TSHN ARE INCLUDED IN HEATERS ITO PICEL

[redacted]

ภาคผนวก ข.30

Procedure เรื่อง การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Crisis and Security Management

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001

การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน

Internal Use Only

จัดทำโดย : [redacted]

Division Manager

อนุมัติโดย : [redacted]

Vice President

รายชื่อผู้ทบทวน

ผู้ทบทวน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นาย เกรียงไกร คาระวุคห์	Division Manager	Q-SH-CM

รายการแก้ไข

[redacted]



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



รูปที่ 3 ผังการจัดสำรองเหตุฉุกเฉินภายใน PTTGC GROUP

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล์ เคมิคอล์ จำกัด (มหาชน์) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง์ ส่งต่อ ถ่ายทอด์ เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

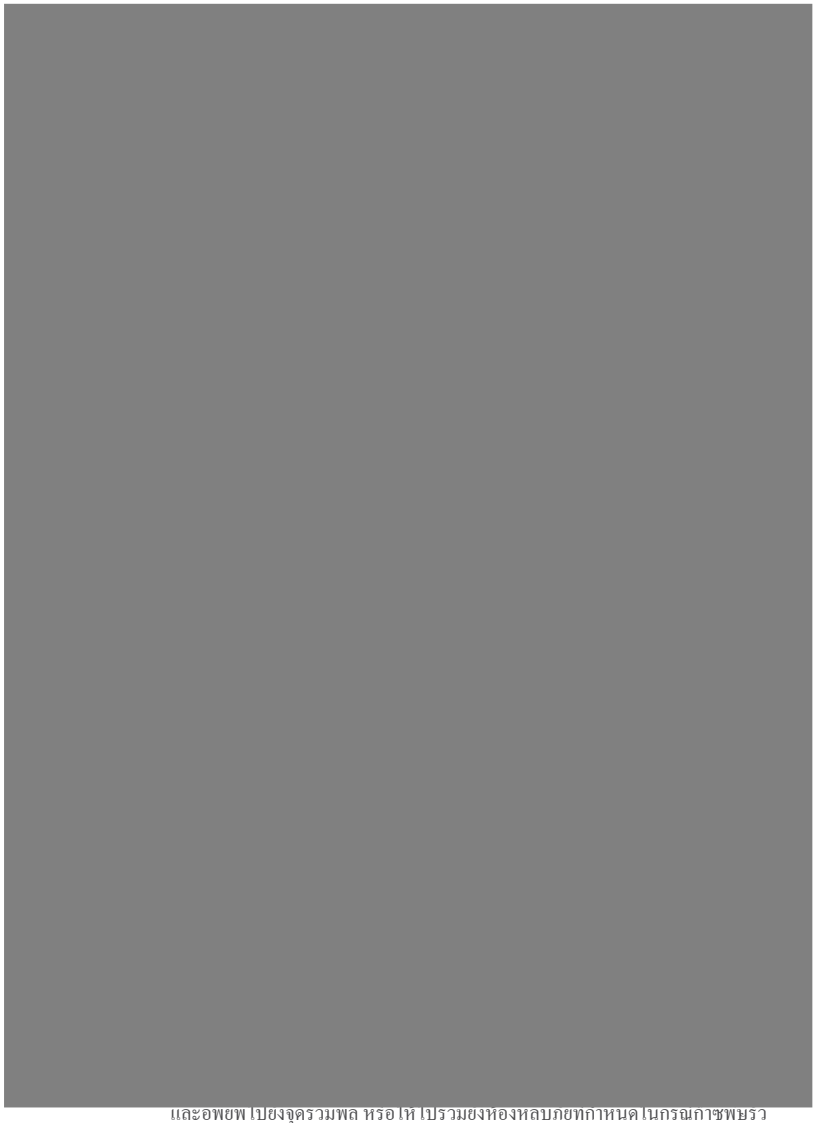

และอพยพไปยังจุดรวมพล หรือให้ไปรวมยังห้องหลบภัยที่กำหนดในกรณีภาชพิษรว

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



1) รหัสอุปกรณ์

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

ภาคผนวก ข.31

พื้นที่สีเขียว

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

พื้นที่สีเขียวที่รับผิดชอบโดยโรงผลิตโอเลฟินส์

พื้นที่สีเขียวที่รับผิดชอบโดยหน่วยผลิตไฟฟ้า (ภายหลังขยายฯ)

ชนิดต้นไม้ที่หน่วยผลิตไฟฟ้าดูแล

- ต้นตีนเป็ดน้ำ
- ต้นสะเดา
- ต้นจามจุรี
- ต้นหางนกยูง

ภาคผนวก ข.32

ข้อกำหนดการว่าจ้างหน่วยงานกลางที่ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนด
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Report)
ประจำปี 2569 - 2571

สารบัญ

		หน้า
1.	วัตถุประสงค์	3
2.	ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเสนอบริการ	4
3.	การจัดเตรียมข้อเสนอบริการ	6
4.	เงื่อนไขการพิจารณาจ้าง	6
5.	ระยะเวลาการดำเนินงาน	7
6.	หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการของผู้เสนอบริการ	7
7.	ขอบเขตของงาน	10
8.	ข้อเสนอด้านราคา	13

ข้อกำหนด



2. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเสนอบริการ:



3. การจัดเตรียมข้อเสนอบริการ:

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน:



ตารางที่ 1 กำหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงาน



7. ขอบเขตของงาน:

ตารางที่ 2 โครงการที่ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.2 การดำเนินงานตามมรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 สรุปรายงานที่ต้องจัดทำแต่ละโครงการ จำนวน 22 โครงการ



9. การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ภาคผนวก ข.33

เอกสารแจ้งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทราบก่อนการหยุดการผลิต เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround)

PTT Global Chemical Public Company Limited
Head Office : 555/1 Energy Complex, Building A, 14th-18th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand. Tel : +66(0)2265-8400 Fax : +66(0)2265-8500
Rayong Office : 59 Ratniyom Road, Noenphra, Muaang Rayong, Rayong 21150 Thailand. Tel : +66(0)3899-4000 Fax : +66(0)3899-4111
Registration No. 0107554000267

ที่ 25-U-P1 002/2566

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งการดำเนินการหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี 2566 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หรือชุมชน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1 ใคร่ขอแจ้งการหยุดเดินเครื่องการผลิตเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่เครื่องจักร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านสุขอนามัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการในช่วงดังกล่าวแล้ว โดยเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ แผนการดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยเร็วหากมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1

RECEIVED
11 OCT 2023

หน่วยงาน SHE-Utilities
โทร. (038) 972074

(กนอ. ๐๑)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัทฯ : พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2
นิคมอุตสาหกรรม : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ทะเบียนโรงงาน : 72070002725352 (น.42(1)-27/2535-ญนพ.)
หน่วยผลิต : โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1
วันที่ : 5-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
( ) **การซ่อมบำรุง** (✓) **การซ่อมบำรุงใหญ่** ( ) **การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน**
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน : โรงงานหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่โรงงานหรือกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงงาน วันที่ 5-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อทำการตรวจสอบ ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้โรงงานสามารถกลับมาเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลาเวลาดังกล่าวอาจจะมีเสียงดังจากกิจกรรมซ่อมบำรุงเป็นบางครั้ง ทั้งนี้ทางโรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1 ได้มีการวางแผนการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมาไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกิจกรรม
หมายเหตุ N/A = ไม่เกี่ยวข้อง Y = ได้ดำเนินการแล้ว N = ไม่สามารถดำเนินการได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..... [redacted] .... ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

(กนอ. ๐๒)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
	✓		2. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง
	✓		3. มีแผนการดำเนินการ (Shut Down Procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
	✓		4. มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
	✓		5. มีวิธีการจัดการจัดการน้ำเสีย
	✓		6. มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
	✓		7. มีมาตรการในการควบคุมหอเผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
	✓		8. มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
	✓		9. มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้น้ำแรงดันสูง
	✓		10. แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
	✓		11. มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
	✓		12. มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13. มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
	✓		14. มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ (3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
			(4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรม งบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุดรวมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 1

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

(กนอ. ๐๒)

(เอกสารแนบ)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน

ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน	หมายเหตุ
1. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง	Turnaround master plan
2. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง	ไม่มีสารเคมีที่คงค้างเหลืออยู่ในอุปกรณ์หลักที่ทำการซ่อมบำรุง เนื่องจากมีการไล่สารเคมีส่งไปที่หอเผาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
3. มีแผนการดำเนินการ (Shut Down Procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง	ขั้นตอน Shut down /Start up ขั้นตอนการตัดแยกระบบ Lock out Tag out (LOTO) (P-(Q-TS)-OEMS-001_R0)
4. มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย	ขั้นตอนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (P-(Q-TS)-026_R0)
5. มีวิธีการจัดการน้ำเสีย	ขั้นตอนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (P-(Q-TS)-026_R0)
6. มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน	ขั้นตอนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (P-(Q-TS)-026_R0)
7. มีมาตรการในการควบคุมหอเผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา	มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และโรงงานข้างเคียง
8. มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน	-การหยุดซ่อมบำรุงรักษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (P-(Q-TS)-026)
9. มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้น้ำแรงดันสูง	P-(Q-TS)-024_R1 การบริหารความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาในงาน Turn Around-Shutdown
10. แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001_R1 การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
11. มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	Turnaround Organization (Utilities plant)
12. มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการ Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints (P-(Q-TS)-004_R0)
13. มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ	Turnaround Organization (Utilities plant)
14. มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ (3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรม งบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุดรวมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.	- การฝึกอบรมความปลอดภัยผู้รับเหมา (P-(Q-TS)-045_R0) - Contractor Training (One Stop Center) - การทำงานในที่อับอากาศ (P-(Q-TS)-OEMS-011_R1) -ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Permit to Work System (P-(Q-TS)-OEMS-002_R3) - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน High Pressure Water Jet (P-(Q-TS)-OEMS-029_R0) - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Mobile Crane Lifting Work Permit (P-(Q-TS)-OEMS-014_R0) - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Pre-Start up Safety Review (P-(Q-TS)-OEMS-003_R1) - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Box-up Permit (P-(Q-TS)-OEMS-020_R0) - ปริมาณผู้รับเหมา (เอกสารแนบ 1)

ปริมาณผู้รับเหมา (เอกสารแนบ 1)

ลำดับที่	ชื่อบริษัท ผู้รับเหมา	ลักษณะงานที่ทำ	จำนวน
1	AFR	ติดตั้งอุปกรณ์ Tempo Cooling Tower	10
2	KEC	ตัด เชื่อม เจียร์ Piping Work	45
3	TNK	ถอด-ประกอบ-ติดตั้ง Manual Valve	10
4	GCME	ยก-ถอด-ประกอบ-ติดตั้ง Overhaul control valve and calibration	10
5	Sunny valve	ยก-ถอด-ประกอบ-ติดตั้ง Install damper และ Seal air valve MOV	10
6	ABBOX	ยก-ถอด-ประกอบ-ติดตั้ง Install WALCO Box	10
7	ABBOX/Hitachi	ตัดแยกระบบไฟฟ้า ตัดแยกระบบไอน้ำ Shutdown Sub 4100,4202,4204	70
8	TSK	ยกโดยปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ Mobile Crane & HIAB	4
9	PICO	เปิดตู้ MCC ตัดแยกระบบไฟฟ้าและอัปเดตโปรแกรม Replace PLC S-4402	5
10	Hitachi	เปิดตู้ MCC ตัดแยกระบบไฟฟ้าและอัปเดตโปรแกรม Replace relay SPAJ to REF	6
11	CSN	เปิดตู้ MCC ตัดแยกระบบไฟฟ้าและอัปเดตโปรแกรม 4100-SW-009.2 & 15.2 87L Replace HMI and upgrade firmware	3
รวม			183

ภาคผนวก ข.34

เอกสารการตรวจประเมินโรงงานตามแผนลดและขจัดมลพิษ

กนอ. แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2568

บริษัท ที่ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ ร.ง.42(1)-21/2535 - มาบ แปลงที่ดิน I-12

มิติที่ 1 กายภาพ

1. *การจัดการพื้นที่สีเขียว การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว (31.73%)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

2. *ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำฝนและระบบน้ำเสียแยกจากกันโดยเด็ดขาด

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☐ 3. ดีเยี่ยม

มิติที่ 2 เศรษฐกิจ

3. การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน

การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน (ในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

มิติที่ 3 สิ่งแวดล้อม

4. การจัดการน้ำ/การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ/การลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก

*4.1 การจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

4.2 การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก 3 R

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

4.3 การลดปริมาณการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

5. การจัดการกากอุตสาหกรรม/ปฏิกูล/ขยะมูลฝอย และการดูแล ถังบรรจุภัณฑ์ (วัตถุดิบ /ผลิตภัณฑ์)

*5.1 มีข้อมูลและมีการขออนุญาตในการดำเนินการอย่างถูกต้อง (ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) หลังจากที่ได้รับอนุญาต กอ.1 ก่อนจะมีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานต้องแจ้งรายละเอียดการจัดการ (กอ.2) รวมทั้งมีการรายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงานภายในวันที่ 30 เม.ย. ของปีถัดไป)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*5.2 การให้ความสำคัญในการจัดการและลดปริมาณกากของเสีย

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*5.3 การให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการขนส่งกากของเสีย

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*5.4 การดูแลถังบรรจุภัณฑ์ (วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์) เฉพาะโรงงานที่เข้าข่าย

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

6. การจัดการคุณภาพอากาศ

*6.1 มีข้อมูลและมีผลการตรวจคุณภาพอากาศ และการดูแลรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (เฉพาะโรงงานที่เข้าข่าย)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

6.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

7. การจัดการไอระเหยของสารเคมี/การบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM

*7.1 การบริหารจัดการไอระเหยของสารเคมี (เฉพาะโรงงานที่มีการใช้หรือกักเก็บ VOCs)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*7.2 การบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM (เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่าย)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

8. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

*8.1 สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน แสง เสียง และความร้อน

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*8.2 การจัดการสภาพพื้นที่ทำงาน

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*8.3 การดูแลสุขภาพพนักงานด้านอาชีวอนามัย

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการ (เฉพาะโรงงานที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

9. การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

*9.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

*9.2 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี [3. ดีเยี่ยม

10. *เรื่องร้องเรียน

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☐ 3. ดีเยี่ยม

มิติที่ 4 สังคม

11. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงาน

การกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นที่ทำงานมีสุข (Happy Workplace) ตามหลักความสุข 8 ด้านของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

คู่มือการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว (Green Star Award)
นิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 1, 2 และ 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2566)

12.1 คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ

การดำเนินงานด้าน CSR ของโรงงาน และการให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของ กนอ.

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

12.2 โครงการรณรงค์ การย้ายทะเบียนบ้าน และ การโอนย้ายทะเบียนรถ

การดำเนินงานด้าน CSR ของโรงงาน และการให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของ กนอ.

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

<u>มิติที่ 5 การบริหารจัดการ</u>

13. การบริหารจัดการโรงงาน

13.1 การจัดเตรียมและการนำเสนอ

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

13.2 ระบบการบริหารจัดการ ISO 14001, 45001, 50001, GIS, Eco factory

☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☑ 3. ดีเยี่ยม

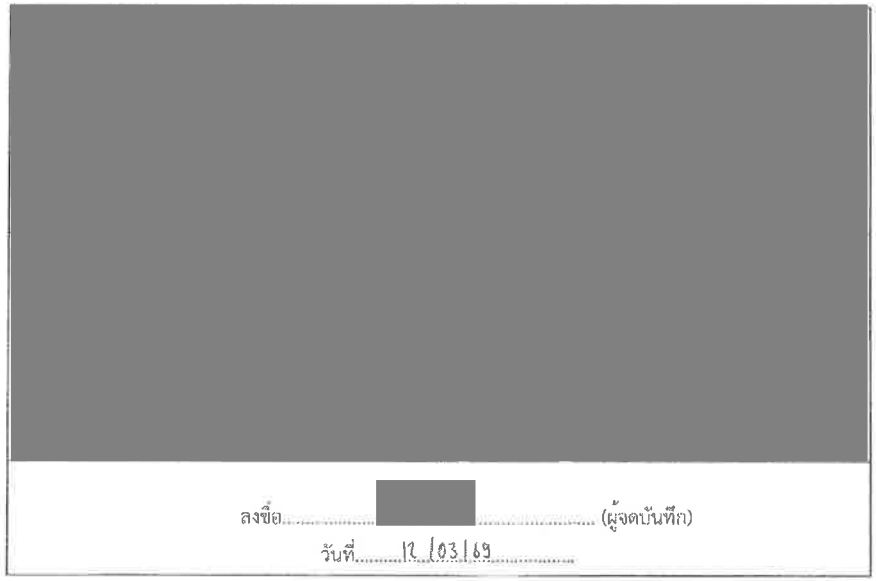

ลงชื่อ..... (ผู้จดบันทึก)

วันที่ 12/03/69

ภาคผนวก ข.35

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจ้างด้านการขนส่งสารเคมี

รายละเอียดเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นๆ
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม











ภาคผนวก ข.36

จำนวนพนักงานท้องถิ่น

จำนวนพนักงานโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

จำนวนพนักงาน (คน)				
พนักงานสังกัด	**ชาย**	**หญิง**	**ทะเบียนบ้านระยอง**	**อื่นๆ**
U-P1	63	3	44	22
รวม	**66**		**44**	**22**
ร้อยละ	**100**		**66.67**	**33.33**

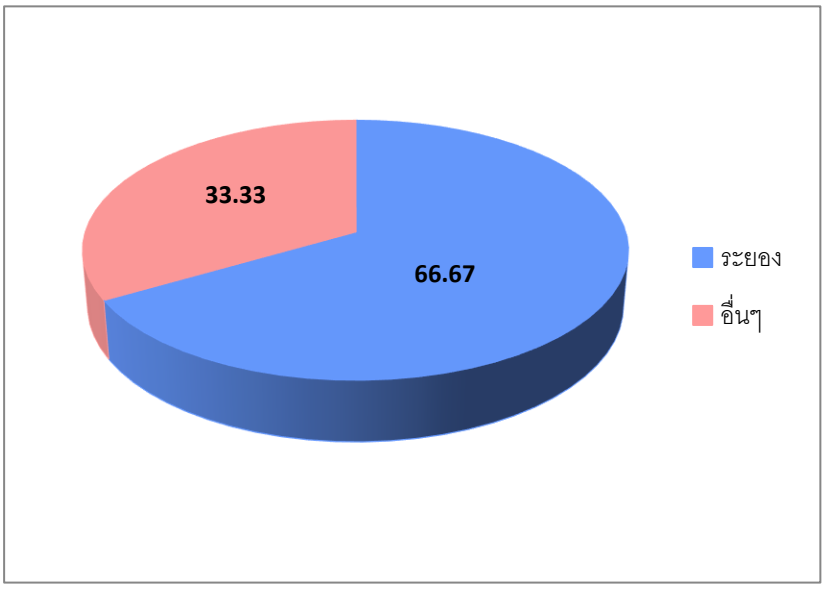

ภาคผนวก ข.37

ตัวอย่างใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟ (Hot Work Permit)

GC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ใบสั่งงานเลขที่ / MOC No. | ใบอนุญาตเลขที่ 24730

Permit Request

ผู้ขอใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ-สกุล): [redacted] ใบอนุญาตทำงานนี้สำหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา): EBE โทรศัพท์ที่ [redacted]

วันที่ขอเริ่มทำงาน วันที่ 24 / 6 / 69 เวลาเริ่มต้นโดยประมาณ 08.00 ถึง 1900 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 20 คน

พื้นที่ทำงาน (GPC/BU/Plant) PTTGCL สถานที่ทำงาน (ชื่อหน่วยการผลิต) Utility Plant

ชื่ออุปกรณ์ที่จะทำ H3704, H3705 อุปกรณ์หมายเลข

งานและลักษณะของงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งาน ติดตั้ง Cable conduit and Support เดินสาย Cable Duck สายไฟ 400V 3เฟส 4สาย ใช้ สว่านมือ ถังดับเพลิง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมต่อด้วยมือ Hand tools

หน่วยงาน GC ที่ควบคุมงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) O-MN1-RA/ICE ลงชื่อ GC Job Owner [redacted] (พิมพ์ชื่อ ประทีป ไม่ลืม) วันที่ 24/06/69

ใบอนุญาตทำงานเฉพาะ (Specific work permit)

- ☐ มีงานไฟที่อับอากาศ ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานขุด ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานใช้สารกัมมันตรังสี ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานเคลื่อน / รื้อถอนโครงสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานไฟฟ้า ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานยกอุปกรณ์ด้วยรถปั้นจั่น ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานบิดอุปกรณ์ (Box up) ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานประดำน้ำ ตามใบอนุญาตเลขที่ _____
- ☐ มีงานปิดกั้นถนน ตามใบอนุญาตเลขที่ _____

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ☐ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA)
- ☐ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (ระบุสารเคมี) _____
- ☐ P&ID, แปลนต่างๆ
- ☐ อื่นๆ _____

แจ้ง FO/CO ก่อนปฏิบัติงาน

สภาพกระบวนการผลิตและการตัดแยกอุปกรณ์

สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานครั้งสุดท้ายของ _____

1. ☐ ตัดแยกอุปกรณ์ ตาม TAG หมายเลข _____
   รายละเอียดการตัดแยก _____
   ☐ แนบ Isolation plan / EIC No. _____
2. เตรียมระบบสำหรับงาน First Line Breaking / Equipment Opening
   ☐ แนบ P&ID / PEFS / EFD พร้อมทั้งระบุจุด Vent / Drain / Purge / Flush / Verify
3. ตัดแยกระบบไฟฟ้า (ระบุ TAG หมายเลข)
   ☐ Local switch _____ ☐ Breaker _____
   อื่นๆ _____
   รายละเอียดการตัดแยก _____
   ☐ เฉพาะแบบแม่พิมพ์ไฟฟ้า ☐ ไม่จำเป็นต้องแยกไฟฟ้า
4. ตัดแยกระบบเครื่องมือวัด เครื่องมือควบคุม
   ☐ Defeat _____ ☐ By pass _____
   ☐ แนบ Logic Control Diagram ☐ ไม่แนบ Logic Control Diagram

5. สภาพอุปกรณ์

ใช่	ไม่ใช่ ✓	สภาพของอุปกรณ์	ใช่	ไม่ใช่ ✓	สภาพของอุปกรณ์
☐	☑	หยุดอุปกรณ์แล้ว	☐	☐	อุปกรณ์ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
☐	☐	ปล่อยความดันออกหมดแล้ว	☐	☐	ถอดท่อ หรือข้อต่อออกแล้ว
☐	☐	ปล่อยของเหลวออกหมดแล้ว	☐	☐	ผ่านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแล้ว
☐	☐	อากาศของเหลวตกค้าง	☐	☐	ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำแล้ว
☐	☐	อากาศความดันตกค้าง	☐	☐	ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาแล้ว
☐	☐	อากาศอุณหภูมิสูง	☐	☐	อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทำการตัดและกรอบล้อมแล้ว
☐	☐	อากาศอุณหภูมิต่ำ / ติดลบ	☐	☐	ท่ออุปกรณ์ได้ตัดแยกแล้ว
☐	☐	อื่นๆ			
☑	☐	ให้ On - site verifier ตรวจสอบและลงนามก่อนเริ่มงาน			

ติดต่อ/แจ้ง On-Site Verifier ก่อนเริ่มงาน (ระบุชื่อ) PO-03 [redacted]

ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง: _____

Permit Preparation

ข้อกำหนดความปลอดภัย

- ☐ ปิดพื้นบริเวณทำงาน
- ☐ ปิดกรวยจราจรระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร
- ☐ เตรียมเครื่องระบายอากาศ (งานในที่อับอากาศ)
- ☐ ขีดน้ำในกรณีที่มีการรองอยู่เต็มพื้นที่
- ☐ ปิดพื้นประกายไฟ / ล้อมผ้าก้นไฟ
- ☑ มีถังดับเพลิงที่บริเวณทำงาน
- ☐ เตรียม Stand-by Person with PPE (First Line Breaking)
- ☐ จัดหาเครื่องหมาย Standby
- ☐ จัดการสอบ Eye washer ให้พร้อมใช้งาน
- ☐ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดก๊าซ
- ☐ มีอุปกรณ์วัดก๊าซส่วนบุคคล (ระบุ) _____
- ☐ ต่อสายดินหม้อไอน้ำพร้อมใช้งาน
- ☐ จัดป้ายเตือนภัย / ไฟเตือนภัย
- ☑ หยุดทำงานเมื่อตรวจพบสารไวไฟระหว่างทำงาน
- ☐ ไม่ปล่อยของเหลวไม่ระบายความดัน หรือเก็บตัวอย่างในพื้นที่กำลังทำงาน
- ☑ ยื่นขอการ ทำความเข้าใจรายละเอียด Work permit ก่อนทีมงานเริ่มงาน
- ☐ มีสารที่อุดติดไฟได้เอง (Pyrophoric) ต้องแช่หรือฉีดน้ำ
- ☑ ระวังกระแทกวาล์วหรืออุปกรณ์ข้างเคียง เช่น Protection wire, Latch valve
- ☐ อื่นๆ _____

ข้อควรระวังเพิ่มเติม: _____

ผลของการตรวจวัดก๊าซ (ทำเครื่องหมาย ✓ สำหรับก๊าซที่ต้องทำการตรวจวัด)

วันที่	เวลา	☑ %LEL ความถี่ทุก 4 ชม.	☐ %O2 ความถี่ทุก ___ ชม.	☐ H2S ความถี่ทุก ___ ชม.	☐ CO ความถี่ทุก ___ ชม.	☐ อื่นๆ _____	AGI (ชื่อผู้ตรวจ)
24/6/69	8.00	0					[redacted]
24/6/69	09.40	0					
24/6/69	14.00	0					
/ /							
มาตรฐาน		0 % LEL	19.5-23.5 %	5 ppm	25 ppm		

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชนิด ✓ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องการใช้

- ☑ อุปกรณ์ PPE มาตรฐาน (หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย)
- ☑ ถุงมือผ้า / หนัง / กันสารเคมี, กรด, ด่าง / ความร้อน
- ☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กรด, ด่าง / ความร้อน
- ☐ หน้ากากกรองสารเคมี
- ☐ ชุดป้องกันฝุ่นละออง
- ☐ รองเท้าหุ้มสารเคมี
- ☐ Ear plug / muff
- ☑ Full Body Safety Harness
- ☐ แว่นครอบเคมีนิรภัย (Goggle) / Face Shield
- ☐ Ears plug / muff
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

☐ อุปกรณ์ PPE พิเศษสำหรับ First Line Breaking (ระบุเมื่อเกี่ยวข้องกับงาน First Line Breaking)
☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กรด, ด่าง / ความร้อน/ฝุ่นละออง ☐ Goggle / Face Shield ☐ รองเท้ากันสารเคมี ☐ ถุงมือผ้า/หนัง/กันสารเคมี,กรด,ด่าง/ความร้อน ☐ หน้ากากกรองสารเคมี/ฝุ่น

Permit Approval

ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted]

ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) _____ (ลายมือชื่อ) _____

ผู้ร่วมออก / อนุมัติใบอนุญาต (ชื่อ Countersign/Cosigner) _____ (ลายมือชื่อ) _____

(Countersign กรณีเป็นงานที่มีผลกระทบหน่วยงานอื่นหรือพื้นที่อื่นๆ / Cosigner กรณีเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง)

ใบอนุญาตทำงานมีผลตั้งแต่วันที่ 24/6/69 เวลา 09:10 (ใบอนุญาตทำงานสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละวันของหน่วยงานให้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

หัวหน้างาน (Supervisor, Foreman, Lead man) ได้รับทราบข้อปฏิบัติสิ่งที่ต้องระวังในการปฏิบัติงานครั้งนี้ และได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานทราบก่อนเริ่มงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ชื่อหัวหน้างาน [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted] วันที่ 24/6/69 เวลา 8.00

On-site verifier ได้ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว และยืนยันผลการตรวจวัดก๊าซ (Gas test) ร่วมกับ Authorized gas tester เรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบหน้างาน (ชื่อ On-site verifier) [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted] (เป็นผู้ตรวจสอบหน้างานและลงนามคนสุดท้ายก่อนให้เริ่มทำงาน)

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงไม่เกิน 12 ชั่วโมง สามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณี Turnaround)

ผู้อนุมัติใบอนุญาต ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่หน้างานแล้วว่าความปลอดภัยเพียงพอ และได้รับการตรวจวัดก๊าซพร้อมทั้งได้บันทึกผลการตรวจสอบไว้แล้ว

☐ ขยายต่ออายุใบอนุญาตทำงาน วันที่ ___/___/___ เวลา _____

ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) _____ (_____) วันที่ ___/___/___

หัวหน้างาน รับทราบการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) _____ (_____) วันที่ ___/___/___

Finished

การปิดใบอนุญาตทำงาน

กุญแจ / ป้าย Lock อุปกรณ์, เครื่องมือ และป้ายเตือนปลดออกเรียบร้อยแล้ว ☐ N/A ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ระบุเหตุผล _____

การปิดใบอนุญาต ☐ งานเสร็จสมบูรณ์ ☑ งานยังไม่เสร็จ ระบุเหตุผล ต่อวันพรุ่งนี้

ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) [redacted] วันที่ 24/6/69 เวลา 16.10

ผลการตรวจพื้นที่ทำงาน ☐ ผ่านแล้ว ☐ ไม่ผ่าน ระบุเหตุผล _____

ผู้ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน (ชื่อ On-site verifier) [redacted] (_____) วันที่ 24/6/69 เวลา 16:10

ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) [redacted] (_____) วันที่ 24/6/69 เวลา 16:15

ใบอนุญาตทำงานทั่วไป (Cold Work Permit)

GC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ใบสั่งงานเลขที่ / MOC No. | ใบอนุญาตเลขที่ 103536

Permit Request

ผู้ขอใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ-สกุล) : [redacted] ใบอนุญาตทำงานนี้สำหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา) CE โทรศัพท์ 5564

วันที่ขอเริ่มทำงาน วันที่ 30/6/26 เวลาเริ่มต้นโดยประมาณ 8:00 ถึง 14:00 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 2 คน

พื้นที่ทำงาน (GPC/BU/Plant) GC2 สถานที่ทำงาน (ชื่อหน่วยการผลิต) 45

ชื่ออุปกรณ์ที่จะทำ 36-PSV-705 A อุปกรณ์หมายเลข 36-PSV-705 A

รายละเอียดของงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน INSTALL PSV AND CHECK LEAK

หน่วยงาน GC ที่ควบคุมงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) U-ST-MM อ้างชื่อ GC Job Owner [redacted] วันที่ 30.6.26

ใบอนุญาตทำงานเฉพาะ (Specific work permit)

- ☐ มีงานในที่อับอากาศ ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานยกอุปกรณ์ด้วยเครื่องจักร ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานชุด ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานปิดอุปกรณ์ (Box up) ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานใช้สารกัมมันตรังสี ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานประดาน้ำ ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานติดตั้ง / รื้อถอนนั่งร้าน ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานปิดกั้นถนน ตามใบอนุญาตเลขที่ ____
- ☐ มีงานไฟฟ้า ตามใบอนุญาต เลขที่ ____

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ☑ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA) GC2-U-ST-MM-[redacted]
- ☐ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (ระบุสารเคมี) ____
- ☐ แผนผังเส้นทางหนีภัย ____
- ☐ อื่นๆ ____

Permit Preparation

สภาพระบบการผลิตและการตัดแยกอุปกรณ์

สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานครั้งสุดท้ายบรรจุด้วย ____

1. ☑ ตัดแยกอุปกรณ์ ตาม TAG หมายเลข 01,02
   รายละเอียดการตัดแยก Close DN Suction and Discharge
   ☑ แนบ Isolation plan / EIC No. UT01 - 18218
2. เตรียมระบบก่อนทำงาน First Line Breaking / Equipment Opening
   ☐ แนบ P&ID / PEFS / EFD พร้อมทั้งระบุจุด Vent / Drain / Purge / Flush / Verify
3. ตัดแยกระบบไฟฟ้า (ระบุ TAG หมายเลข)
   ☐ Local switch ____ ☐ Breaker ____
   อื่นๆ ____
   รายละเอียดการตัดแยก ____
   ☐ แนบแบบแปลนไฟฟ้า ☐ ไม่แนบแบบแปลนไฟฟ้า
4. ตัดแยกระบบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) ที่อาจมีผลกระทบต่อการปิดใบอนุญาตทำงาน
   ☐ Defeat ____ ☐ By pass ____
   ☐ แนบ Logic Control Diagram ☐ ไม่แนบ Logic Control Diagram

5. สภาพอุปกรณ์

ใช่	ไม่ใช่	✓ สภาพของอุปกรณ์	ใช่	ไม่ใช่	✓ สภาพของอุปกรณ์
☐	☐	หยุดอุปกรณ์แล้ว	☐	☐	อุปกรณ์ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
☐	☐	ปล่อยความดันออกหมดแล้ว	☐	☐	ถอดท่อ หรือข้อต่อออกแล้ว
☐	☐	ปล่อยของเหลวออกหมดแล้ว	☐	☐	ผ่านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแล้ว
☐	☐	อายมีของเหลวตกค้าง	☐	☐	ผ่านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแล้ว
☐	☐	อายมีของเหลวตกค้าง	☐	☐	ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำแล้ว
☐	☐	อายมีอุณหภูมิสูง	☐	☐	อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทำการตัดแยกครบถ้วนแล้ว
☐	☐	อายมีอุณหภูมิต่ำ / ติดลบ	☐	☐	ท่ออุปกรณ์ได้ตัดแยกแล้ว
☐	☐	อื่นๆ ____			
☑	☐	ให้ On - site verifier ตรวจสอบและลงนามก่อนเริ่มงาน			

ที่ตอง / แจ้ง On-Site Verifier ก่อนเริ่มงาน (ระบุชื่อ) FO 01

ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ทำงานตามขอบเขตงานที่ระบุเท่านั้น

ข้อกำหนดความปลอดภัย

- ☐ ปิดกั้นบริเวณทำงาน
- ☐ ปิดครอบรางระบายในระยะ 15 เมตร
- ☐ เตรียมเครื่องระบายอากาศ (งานในที่อับอากาศ)
- ☐ ติดป้ายเตือนที่มีการตกแต่งกันและของ
- ☐ ปิดกั้นประกายไฟ / ล้อมผ้ากันไฟ
- ☐ มีถังดับเพลิงที่บริเวณทำงาน
- ☐ เตรียม Stand-by Person with PPE (First Line Breaking)
- ☐ ต่อสายดับเพลิง Standby
- ☐ ตรวจสอบ Eye washer ให้พร้อมใช้งาน
- ☐ เจาะท่อเพื่อตรวจวัดก๊าซ
- ☐ มีอุปกรณ์วัดก๊าซส่วนบุคคล (ระบุ) ____
- ☐ ท่อสายดับเพลิงพร้อมใช้งาน
- ☐ จัดป้ายเตือนภัย / ไฟเตือนภัย
- ☐ ข้อควรระวังเพิ่มเติม : ____
- ☑ หยุดทำงานเมื่อตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนรั่ว
- ☐ ไม่ปล่อยของเหลวไม่ระบายความดัน หรือเก็บตัวอย่างในพื้นที่กำลังทำงาน
- ☑ ยืนยันการทำความเข้าใจรายละเอียด Work permit ให้กับทีมงานก่อนเริ่มงาน
- ☐ มีสารที่ลุกติดไฟได้เอง (Pyrophoric) ต้องแช่หรือฉีดน้ำ
- ☑ ระวังกระแทกวาล์วหรืออุปกรณ์ข้างเคียง เช่น Protection wire, Latch valve
- ☐ อื่นๆ ____

ผลของการตรวจวัดก๊าซ (ทำเครื่องหมาย ✓ สำหรับก๊าซที่ต้องทำการตรวจวัด)

วันที่	เวลา	%LEL ความถี่ทุก___ชม.	% O_2 ความถี่ทุก___ชม.	H_2S ความถี่ทุก___ชม.	CO ความถี่ทุก___ชม.	อื่นๆ ____	ACGIH (ชื่อตัวบรรจง)
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
มาตรฐาน		0 % LEL	19.5-23.5 %	5 ppm	25 ppm		

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชีด ✓ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องการใช้

- ☑ อุปกรณ์ PPE มาตรฐาน (หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย)
- ☑ ถุงมือผ้า / หนัง / กันสารเคมี, กรด, ด่าง / ความร้อน
- ☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กรด, ด่าง / ความร้อน
- ☑ หน้ากากกรองสารเคมี
- ☐ ชุดป้องกันฝุ่นละออง
- ☐ รองเท้ากันสารเคมี
- ☐ Ear plug / muff
- ☐ Full Body Safety Harness
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) ____
- ☐ แว่นตานิรภัย (Goggle) / Face Shield
- ☐ Ears plug / muff

☐ อุปกรณ์ PPE พิเศษสำหรับ First Line Breaking (ระบุเมื่อเกี่ยวข้องกับงาน First Line Breaking)
☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กรด, ด่าง/ความร้อน/ฝุ่นละออง ☐ Goggle/Face Shield ☐ รองเท้านิรภัยสารเคมี ☐ ถุงมือผ้า/หนัง/กันสารเคมี,กรด,ด่าง/ความร้อน ☐ หน้ากากกรองสารเคมี/ฝุ่น

Permit Approval

ผู้อนุมัติ

ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted]

ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted]

ผู้ร่วมลงนาม / อนุมัติใบอนุญาต (ชื่อ Countersign/Cosigner) [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted]

(Countersign กรณีเป็นงานที่มีผลกระทบกับหน่วยงานอื่น หรือพื้นที่ที่ใกล้เคียง / Cosigner กรณีเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง)

ใบอนุญาตทำงานออกเมื่อวันที่ 30/06/69 เวลา 09:50 น. (ใบอนุญาตทำงานสามารถใช้งานได้ตลอดกะ หรือเวลาการปฏิบัติงานเท่านั้น และสามารถขยายต่ออายุใช้งานได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

หัวหน้างาน (Supervisor, Foreman) ได้ตรวจสอบความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องระวังในการปฏิบัติงานครั้งนี้ และได้รับทราบให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบก่อนเริ่มงานและยืนปฏิบัติอย่างรัดกุม

ชื่อหัวหน้างาน [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted] วันที่ 30.6.26 เวลา 8:30

On-site verifier ได้ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานความพร้อมของงาน และยืนยันผลการตรวจวัดก๊าซ (Gas test) ร่วมกับ Authorized gas tester เรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบหน้างาน (ชื่อ On-site verifier) [redacted] (ลายมือชื่อ) [redacted] (เป็นผู้ตรวจสอบหน้างานและลงนามคนสุดท้ายก่อนให้เริ่มทำงาน)

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน อายุใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงไม่เกิน 12 ชั่วโมง สามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณี Terminated)

ผู้อนุมัติใบอนุญาต ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่หน้างานแล้วว่าความปลอดภัยเพียงพอ และได้รับการตรวจวัดก๊าซพร้อมทั้งได้บันทึกผลการตรวจสอบไว้แล้ว

☐ ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน วันที่ ____/____/____ เวลา ____

ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) ____ (____) วันที่ ____/____/____

หัวหน้างาน รับทราบการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) ____ (____) วันที่ ____/____/____

Finished

การปิดใบอนุญาตทำงาน

กุญแจ / ป้าย Lock อุปกรณ์, เครื่องมือ และป้ายเตือนปลดออกเรียบร้อยแล้ว ☐ N/A ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุ ____

การปิดใบอนุญาต ☑ งานเสร็จสมบูรณ์ ☐ งานยังไม่

ผู้คืนใบอนุญาตการทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) [redacted] (____) วันที่ 30.6.26 เวลา 10:30

ผลการตรวจพื้นที่ทำงาน ☑ ยอมรับ ☐ ไม่ยอมรับ ระบุเหตุผล ____

ผู้ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน (ชื่อ On-site verifier) [redacted] (____) วันที่ 30.6.69 เวลา 10:30

ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) [redacted] (____) วันที่ 30.6.69 เวลา 10:30

ภาคผนวก ข.38

เอกสารตารางกะการทำงานของพนักงาน

GC Group : Operation Shift Schedule 2026

Date :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
January	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Day	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C
Night	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D
February	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat			
Day	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C			
Night	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D			
March	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue
Day	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A
Night	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B
Date :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
April	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	
Day	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	
Night	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	
May	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Day	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B
Night	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A
June	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	
Day	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	
Night	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	

GC Group : Operation Shift Schedule 2026

Date :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
July	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
Day	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D
Night	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C
August	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon
Day	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B
Night	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A
September	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	
Day	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	
Night	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	
Date :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
October	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Day	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A
Night	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B
November	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	
Day	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	
Night	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	
December	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
Day	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B
Night	C	A	A	D	D	D	B	B	C	C	A	A	A	D	D	B	B	C	C	C	A	A	D	D	B	B	B	C	C	A	A

ภาคผนวก ข.39

รายงานการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการ

(Pre-Startup Safety Review : PSSR)

PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR) CHECKLIST: MAJOR PROJECT

ชื่อโครงการ/โรงงาน: EPS Expansion Phase 3 Project	หมายเลขโครงการ: MoC Number : U-PI-2019/050 Project No.:
พื้นที่กระบวนการผลิต/อุปกรณ์เครื่องจักร: HRSG Package, HRSG Auxiliary & HRSG Utility system	
รายละเอียดของโครงการ: Install new Gas Turbine and HRSG (GTG-J&HRSG)	

ส่วนที่ 1: รายการตรวจสอบทั่วไป (PART 1: GENERAL CHECKLIST)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 26/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 15/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		GE1	1. ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานและรายละเอียดของการออกแบบในการก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแล้ว หรือไม่ (Are the construction and equipment checked for conformed to design specifications, technical codes and applicable standards?)	
	✓		GE2	2. ได้มีการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ ,ประเมินความเสี่ยงการทำงาน ,P&ID, Electrical-Instrument diagrams, As-built drawing, MSDS, Pre-incident plan เป็นต้น หรือไม่ (Are applicable process safety information developed or updated as necessary to reflect the new or modified process e.g, Process Hazard Analysis, Risk assessment, P&ID, Electrical-Instrument diagrams, As-built drawing, MSDS, Pre-incident plan, etc.?)	P&ID updated and mark up will be provide
	✓		GE3	3. ขั้นตอนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานนั้น มีครอบคลุมและเพียงพอต่อกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น หรือไม่ (Are safety procedures adequate according with the new or modified process conditions?)	
	✓		GE4	4. ได้มีการจัดทำหรือปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติการที่ฉุกเฉิน โดยต้องแน่ใจว่าครอบคลุมกับกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น หรือไม่ (Are operating procedures and emergency procedures developed or updated as needed to ensure safe operation of the new or modified process?)	
	✓		GE5	5. ได้มีการจัดทำหรือปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักรและแผนในการบำรุงรักษาครอบคลุมกับกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น หรือไม่ (Are maintenance procedures and preventive maintenance schedules developed or updated as needed to ensure safe operation of the new or modified process?)	
	✓		GE6	6. ได้มีการทบทวนตามวิธีปฏิบัติเรื่องบริหารความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์ข้อตกลงการแก้ไขป้องกันต่างๆ เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้ว , หรือไม่ (Is the new or modified process subjected to management of change (MOC) review and all recommendations that were resolved or implemented before startup?)	
	✓		GE7	7. ได้มีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ์/เครื่องจักรหรือกระบวนการ รวมถึงผู้ทำบำรุงรักษาอุปกรณ์ เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้ว หรือไม่ (Are employees involved in operation and maintenance trained completely?)	

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-047: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR) CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT

ส่วนที่ 2: รายการตรวจสอบโดยละเอียด (PART 2: DETAIL CHECK LIST)

2.1 Operation and Personal Readiness

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 26/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 15/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเทคนิค (Plant Technical) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Plant Technical) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

2.1.1 รายการตรวจสอบตามมาตรการในการประเมินความเสี่ยง (Process Hazard Analysis)

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		PH1	1. มีการประเมินความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต/กระบวนการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น HAZOP หรือ Checklist หรือไม่ (Is a Process Hazards Analysis performed on the new or modified process?)	HAZOP Report
	✓		PH2	2. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินความเสี่ยงไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือไม่ (Are all recommendations from Process Hazard Analysis addressed?)	
	✓		PH3	3. มีการสำรวจบริเวณกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง/กระบวนผลิตใหม่ โดยทีม PSSR ที่หน้างานจริง หรือไม่ (Is a field inspection conducted by the PSSR team?)	PSSR walkthrough
	✓		PH4	4. มีการจัดเตรียมบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนในขณะเริ่มต้นดำเนินการผลิต หรือไม่ (Are provisions made for technical or supervisory support during startup?)	Vendor supervisor will support

2.1.2 รายการตรวจสอบความพร้อมของขั้นตอนดำเนินงานและวิธีปฏิบัติ (Operating Procedure and Work instruction)

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		WI1	1. มีการทบทวน ปรับปรุงข้อมูลของขั้นตอนการดำเนินงานและคู่มือการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉินให้มีความสอดคล้องกับสภาพหน้างานอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่ (Are operating procedures and emergency procedures up-to-date?)	
	✓		WI2	2. มีขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานที่เสมต่างๆ เช่น งาน Commissioning/ decommissioning หรือการเริ่มกระบวนการผลิตครั้งแรก หรือไม่ (Are special procedures for commissioning/decommissioning or first time startup provided?)	Pre Commissioning & Commissioning procedure
	✓		WI3	1. มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานกับอุปกรณ์ เครื่องจักร ในขณะเริ่มเดินเครื่องและในช่วงเดินเครื่อง หรือไม่ (Are there any operating procedures to instruct how to startup and operate safely?)	Pre Commissioning & Commissioning procedure

2.1.3 รายการตรวจสอบความพร้อมของพนักงาน

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		TN1	1. มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับอันตรายและวิธีการป้องกันตนเองจากการทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น อันตรายจากสารเคมี หรือไม่ (Are employees trained in the hazards and protection such as the hazardous chemicals?)	
	✓		TN2	2. เอกสารการอบรมมีการทบทวน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ หรือไม่ (Are training materials up-to-date?)	
	✓		TN3	3. มีการฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการและมีการบันทึกการฝึกอบรมเป็นหลักฐาน หรือไม่ (Are operators properly trained on their jobs with documented record?)	
	✓		TN4	4. มีการฝึกอบรมพนักงานซ่อมบำรุงและมีการบันทึกการฝึกอบรมเป็นหลักฐาน หรือไม่ (Are maintenance teams properly trained on their jobs with documented record?)	

2.2 Instrumentation and Electrical

2.2.1 รายการตรวจสอบความพร้อมของระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrument)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 22/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date) _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Engineering (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 8/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Engineering) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

เจ้าหน้าที่จากโครงการ/ก่อสร้าง (Project/Construction) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 8/7/64

ผู้จัดการส่วน (Project/Construction Manager) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		CO1	1. มีการทดสอบสถานะการทำงานของวาล์วมืออยู่ในสถานะ fail-safe ว่าเปิดหรือปิด หรือไม่ (Is the fail-safe position of valves tested on a function?)	
	✓		CO2	2. มีการทดสอบอุปกรณ์ อ่านค่า วิเคราะห์/ตรวจวัดค่าของเครื่องมือวัด (instrument/analyzer) หรือไม่ (Are instruments and analyzers tested on a function?)	
	✓		CO3	3. มีการทดสอบการทำงานจริงของอุปกรณ์ อ่านวิเคราะห์/ตรวจวัดค่า เครื่องมือวัดที่สำคัญ (Critical instrument/analyze) หรือไม่ (Are new critical instruments and analyzers functionally tested on a function?)	
	✓		CO4	4. มีการนำอุปกรณ์ อ่านวิเคราะห์/ตรวจวัดค่า เครื่องมือวัด (instrument/analyze) ใหม่ที่สำคัญเชื่อมต่อและเก็บข้อมูลกับระบบ DCS หรือระบบควบคุมอื่นๆ หรือไม่ (Are all critical instrument and analyzer connected to DCS or other control system to record information?)	
	✓		CO5	5. มีการติดตั้งการ์ดเพื่อป้องกันความผิดพลาดการ ไปสัมผัสกับสวิตช์โดยไม่ตั้งใจ หรือไม่ (Are guards installed to prevent accidental tripping of switches?)	
	✓		CO6	6. มีการทบทวน ปรับปรุง สัญญาณเตือนต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว หรือไม่ (Is the unit alarm list up-to-date?)	
	✓		CO7	7. มีแผนผังวงจรเครื่องมือวัด/วิเคราะห์ที่พร้อมใช้งานแล้ว หรือไม่ (Are as-built loop drawing /analyzer functional diagrams available?)	
	✓		CO8	8. ได้ทวนสอบการ Bypass สัญญาณของระบบควบคุมการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินและวาล์วควบคุมต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว หรือไม่ (Are all ESD or control valve bypasses verified in their proper positions for start-up?)	
	✓		CO9	9. ได้บันทึกรายการดัดแปลง แก้ไข ของอุปกรณ์เครื่องมือวัดแล้ว หรือไม่ (Are any modifications of instrument equipment recorder?)	
	✓		C10	10. ระบบ Interlock พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว หรือไม่ (Are all interlock systems ready to fully operate?)	

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-047: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR) CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT

2.2.2 รายการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewe

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 22/7/2021

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Engineering (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Engineering) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

เจ้าหน้าที่จากโครงการ/ก่อสร้าง (Project/Construction) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

ผู้จัดการส่วน (Project/Construction Manager) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		EL1	1. มีการระบุหมายเลข ของ สวิตช์ เปิด/ปิด และ สวิตช์ตัดระบบไฟฟ้า (electrical switchgear) ที่ตัวของสวิตช์เรียบร้อยแล้ว หรือไม่ (Do all start/stop switches and electrical switchgears have numbering tags?)	
	✓		EL2	2. มีระบบรองรับสำหรับการแขวนป้ายและล็อคกุญแจ (Lock out /Tag out) หรือไม่ (Are lock out/tag out systems provided?)	
	✓		EL3	3. ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมและถูกต้องกับพื้นที่ที่ทำการติดตั้ง หรือไม่ (Is electrical equipment appropriately installed for the Hazardous Area Classification?)	
	✓		EL4	4. ท่อร้อยสายไฟมีการหุ้มปิดผนึกอย่างแน่นหนา หรือไม่ (Are conduit fittings sealed?)	
	✓		EL5	5. ไฟแจ้งสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานอย่างถูกต้องแล้ว หรือไม่ (Are indicating lights able to be operated on a function?)	
	✓		EL6	6. มีการตรวจเช็คระบบสายดิน (grounding) ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญหรือไม่ (Is grounding for critical electrical equipment tested on a function?)	
	✓		EL7	7. มีการตรวจเช็คทิศทางการหมุนของอุปกรณ์เช่นพวก มอเตอร์ blower เรียบร้อยแล้ว หรือไม่ (Is the direction of rotation of rotating equipment tested on a function?)	
	✓		EL8	8. มีการทดสอบระบบ Interlock ของระบบไฟฟ้า หรือไม่ (Are electrical interlocks tested on a function?)	
	✓		EL9	9. มีผลการทดสอบทางไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและรับรองโดยผู้รับผิดชอบแล้ว หรือไม่ (Are electrical tests such as Insulation Resistance Test, Hi Pot, etc., performed as standard specification?)	
	✓		EL10	10. มีการปรับตั้งค่าหรือสอบเทียบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น Relay หรือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ หรือไม่ (Are electrical protective relays and safety devices calibrated?)	
	✓		EL11	11. มีแบบวงจรไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานแล้ว หรือไม่ (Are as built electrical diagrams available?)	
	✓		EL12	12. ระบบไฟแสงสว่างต้องทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ (Is lighting system able to be operated on a function?)	
	✓		EL13	14. มีการติดตั้งระบบ electrical continuity, grounding, cathodic protection หรือไม่ (Are electrical continuity, grounding, and cathodic protection provided?)	

2.3 Safety Occupational Health and Environment

2.3.1 รายการตรวจสอบความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน SHE (Environment) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 10/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-SHE) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		EN1	1. เอกสารขั้นตอนการดำเนินงานได้ให้ข้อมูลและการกำหนดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทำงานหรือไม่ (Are operating procedures provided information and direction regarding environmental concerns during all phases of operation?)	
	✓		EN2	2. อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ (Are emission control devices able to be operated on a function?)	
	✓		EN3	3. คันกัน เขื่อนกัน และรางระบายเพียงพอต่อการรองรับถังหกรั่วไหลหรือน้ำฝนปนเปื้อนหรือไม่ (Are dike, draining, and curbing adequate used to contain spills and contaminated rainwater?)	
	✓		EN4	4. ผังระบบระบายน้ำมีการปรับปรุงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (Are sewer maps revised to reflect the change?)	
	✓		EN5	5. รางระบายได้มีการชี้บ่งเพื่อแยกว่าเป็นรางระบายน้ำฝน หรือรางระบายน้ำปนเปื้อนหรือไม่ (Are sewers identified as "Storm"/"Process chemical"?)	
	✓		EN6	6. วาล์วในคันกันถูกปิดอยู่หรือไม่ (Are dike isolation valves closed?)	
	✓		EN7	7. ข้อกำหนดการจัดการของเสียตลอดจนถึงของเสียจากการเริ่มเดินเครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด (Off spec) หรือไม่ (Is waste management identified during startup?)	

2.3.2 รายการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารและการสื่อความ MSDS (MSDS Communication)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน SHE (Safety and Health) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 10/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-SHE) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		MS1	1. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน (Are MSDSs up-to-date and available?)	
	✓		MS2	2. มีระบบการสื่อสารความเป็นอันตราย (Hazard communication) ที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ (Is HAZCOM program or Hazard communication up-to-date?)	

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-047: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR) CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT

2.3.3 รายการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยและสุขภาพ (Personal Safety and Health)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน SHE (Safety and Health) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 10/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-SHE) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		SH1	1. อุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงพอและสามารถเข้าถึงใช้งานได้หรือไม่ (Is safety equipment adequate and accessible?)	
	✓		SH2	2. มีข้อกำหนดสำหรับการติดตามตรวจสอบเสียงในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง หรือไม่ (Are there procedures for monitoring noise in the areas?)	
	✓		SH3	3. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่ (Are lighting levels adequate?)	
	✓		SH4	4. ทางเดินและบันไดสามารถเข้าออกได้สะดวกในทุกระดับ หรือไม่ (Are walkways and ladders provided for safe access at all levels?)	
	✓		SH5	5. พื้นทางเดินและบริเวณทำงานได้ระดับในแนวราบ มั่นคง และไม่ลื่น หรือไม่ (Are walkways and working areas on horizontal level, secured, and non-slippery?)	
	✓		SH6	6. มีการกั้นเขตและมีป้ายสัญญาณในบริเวณทำงานที่อาจเป็นอันตราย และมีการแสดงข้อควรปฏิบัติในการทำงานไว้หรือไม่ (Are signs and barricades identified hazard area and work instruction?)	
	✓		SH7	7. มีการชี้บ่งทางออกจากบริเวณทำงานชัดเจนหรือไม่ (Are exits or egress routes identified?)	
	✓		SH8	8. มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีอันตรายและชี้บ่งอย่างชัดเจน และมีขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือไม่ (Are locations and procedures for hazardous chemicals storage provided?)	follow hazardous chemical info

2.3.4 รายการตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire Protection)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริหารความมั่นคง (Fire Fighting) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 8/7/64
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Crisis Management) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____
หรือ ผู้จัดการส่วน (Division Manager-SHE) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		FI1	1. ถังดับเพลิงได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ (Are fire extinguishers provided at proper locations?)	
	✓		FI2	2. หน่วยงานบริหารความมั่นคงและกาวะฉุกเฉินรับทราบว่า อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุ เช่น ระบบฉีดน้ำ, ถังดับเพลิง, สายดับเพลิง มีจำนวนเท่าไหร่ และติดตั้งอยู่บริเวณใดบ้าง หรือไม่ (Is the Crisis and Security Management Division informed about the number/location of fire protection equipment, such as spray systems, extinguishers, fire hoses, etc.?)	
	✓		FI3	3. ระบบฉีดน้ำและหัวดับเพลิง ระบบสารสะอาด (Clean Agent) มีการทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ (Are the spray, sprinkler and clean agent systems tested on a function?)	
	✓		FI4	4. แบบระบบน้ำดับเพลิงมีการทบทวน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ (Are fire water system drawings up-to-date?)	

2.3.5 รายการตรวจสอบความพร้อมของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการอพยพ *(Emergency Response and Evacuation)*

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริหารความมั่นคง (Emergency) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 8/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Crisis Management) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

หรือ ผู้จัดการส่วน (Division Manager-SHE) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 26/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		ER1	1. มีการทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและแผนควบคุมเหตุฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วหรือไม่ (Are operating procedures and emergency procedures reviewed up-to-date?)	
	✓		ER2	2. พนักงานกะและบุคคลที่มีหน้าที่ช่วยเหลือยามภาวะฉุกเฉินได้รับคำแนะนำ ตามคู่มือเรื่องการสนับสนุนและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินหรือไม่ (Are shift operators and emergency personnel instructed to support and respond as emergency procedure?)	
	✓		ER3	3. มีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับแผนการ Start Up Plant หรือ สิ่งที่อาจสร้างผลกระทบต่อบริษัทข้างเคียงและชุมชน หรือไม่ (Are the start-up plans communicated to neighbor factories and communities?)	
	✓		ER4	4. มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และอพยพพนักงานและผู้รับเหมาในโรงงาน รวมทั้งฝึกซ้อมระบบการสื่อสารแจ้งเหตุกับโรงงาน และชุมชนข้างเคียง หรือไม่ (Are there emergency response exercise, evacuation of staffs and contractors and communication systems with surrounding plants and communities?)	
	✓		ER5	5. พนักงานกะและทีมระงับเหตุฉุกเฉินได้รับการอบรม ชี้แจงเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ (Are shift operations and emergency personnel instructed to support and respond emergency which may occur?)	

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-047: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR) CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT

2.4 Mechanical

2.4.1 รายการตรวจสอบความพร้อมของระบบความดันและระบบสุญญากาศ *(Pressure and Vacuum System)*

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 15/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Engineering (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Engineering) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

เจ้าหน้าที่จากโครงการ/ก่อสร้าง (Project/Construction) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Project/Construction Manager) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		PV1	1. มีการกำหนดทิศทางการปล่อยความดันยังพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือไม่ (Is the direction of pressure release identified at a safe location?)	
	✓		PV2	2. อุปกรณ์ปลดปล่อยความดัน ด้านที่ถูกปล่อยออกต้องมีการยึดอย่างแข็งแรงและเหมาะสม หรือไม่ (Is pressure release device adequately braced?)	
	✓		PV3	3. มีการทดสอบระบบปล่อยความดัน (Pressure safety relief valve) หรือไม่ (Are all PSV / RV valves tested on a function?)	

2.4.2 รายการตรวจสอบความพร้อมของระบบเครื่องจักรกล *(Mechanical System)*

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 15/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Engineering (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Engineering) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

เจ้าหน้าที่จากโครงการ/ก่อสร้าง (Project/Construction) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Project/Construction Manager) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		RO1	1. มีการจัดทำการ์ดเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ (Are equipment guards installed as the design specification?)	Project specification ,HAZOP report
	✓		RO2	2. เครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานยกต่าง เช่น เครน, hoists มีการระบุน้ำหนักที่สามารถรับได้ และติดตั้งอย่างชัดเจนที่เครื่องจักร หรือไม่ (Are loading capacities of floor/deck loading, monorails, cranes, and hoists identified and visualized?)	
	✓		RO3	3. อุปกรณ์ เครื่องจักรสามารถตัดแยกระบบการทำงานออกเพื่อการซ่อมบำรุงได้ หรือไม่ (Is equipment able to be cleaned, isolated, and locked out for maintenance?)	P&ID
	✓		RO4	4. เครื่องจักร ท่อต่างๆ มีการจัดวางอย่างถูกต้องตามแบบ เพื่อให้สามารถยก เคลื่อนย้ายไปเพื่อการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ (Are equipment, tubing/piping installed as design specification and able to lift or move for maintenance?)	

2.4.3 รายการตรวจสอบความพร้อมของระบบวาล์วและท่อ (Valve and Piping System)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 15/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Engineering (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Engineering) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

เจ้าหน้าที่จากโครงการ/ก่อสร้าง (Project/Construction _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Project/Construction Manager) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		VP1	1. บริเวณท่อที่มีการต่อหรือจุด Tie-in มีการทบทวนและถูกต้องตามที่ออกแบบ หรือไม่ (Are pipes or tie-in points reviewed to ensure the installation as the design specification?)	
	✓		VP2	2. มีการทบทวนและบันทึก master blind list อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะเริ่มเดินเครื่อง หรือไม่ (Are master blind list up-to-date with all blinds in their correct position for start-up?)	
	✓		VP3	3. มีการตรวจเช็คแนวเชื่อมหรือการต่อท่อแต่ละท่อ เพื่อยืนยันการติดตั้ง หรือไม่ (Are connecting and welding points of pipes inspected to ensure the installation of piping as the design specification?)	
	✓		VP4	4. มีการตัดแยกระบบท่อที่ไม่ใช้งานออกไป หรือไม่ (Are unused piping branches isolated or eliminated?)	
	✓		VP5	5. จุด Vent หรือจุด Drain เข้าถึงง่าย และเป็นจุดที่ปลอดภัย หรือไม่ (Are vents and drains visible, easily accessible and safely located?)	
	✓		VP6	6. จุดเก็บตัวอย่าง มีการออกแบบอย่างปลอดภัย และมีป้ายบ่งชี้ชัดเจนบริเวณหน้างาน หรือไม่ (Are sampling points configured safely and visualized distinctly?)	
	✓		VP7	7. การเปิด/ปิดวาล์ว เข้าถึงง่ายและมีความปลอดภัย หรือไม่ (Is valve able to be operated easily and safely?)	
	✓		VP8	8. การติดตั้งโครงสร้างรองรับท่อ เป็นไปตามการออกแบบและมาตรฐาน หรือไม่ (Are pipe supports installed as the design specification and standard?)	
	✓		VP9	9. มีการคำนวณค่าการขยายตัวของแนวท่อไว้เพื่อความปลอดภัย หรือไม่ (Is piping thermal expansion calculated?)	
	✓		VP10	10. Hoses and fitting สามารถถอดได้ง่ายเพื่อสะดวกต่อการเปิดใช้งาน หรือไม่ (Are hoses and fittings easily accessed for the service?)	
	✓		VP11	11. วาล์วสามารถเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน หรือไม่ (Is valve able to be easily changed?)	
	✓		VP12	12. มีการป้องกันการไหลย้อนกลับของสารเคมี หรือไม่ (Is flowing backward protection provided?)	
	✓		VP13	13. ได้ตรวจสอบการติดตั้งวาล์วกันไหลย้อนกลับว่าได้ติดตั้งถูกทิศทางแล้ว หรือไม่ (Are check valves installed in the correct orientation and direction?)	
	✓		VP14	14. มีการทำ Pressure test และการทำ Flush line เพื่อทำความสะอาดท่อ หรือไม่ (Are pressure test and flush line for cleaning pipe done?)	
	✓		VP15	15. เครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้าง สามารถทนต่อ compatibility/corrosion หรือไม่ (Can materials of machine equipment and structures withstand compatibility/corrosion?)	
	✓		VP16	16. ตำแหน่งของวาล์ว Lock Open/Lock Close ถูกติดตั้งไว้อย่างถูกต้องและมีการล็อค ติด Tag อย่างถูกต้อง (Are lock open and lock close valves installed the correct positions and properly locked and tagged?)	

	✓		VP17	17. เกจวัดความดันที่ถูกติดตั้งถาวร เช่น จากการทำ Nitrogen Blanket ของเครื่องจักรต่างๆ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นเกจความดันปกติที่ใช้งานเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ (Are all low pressure gauges used for nitrogen blanketing etc. of equipment removed and replaced by a pressure gauge of the correct range?)	
✓			VP18	18. แผ่นกันท่อ (Blind) ที่ใช้งานระหว่างงาน Shutdown หรือ Turnaround ได้ถูกถอดออกให้พร้อมจะเริ่มเดินเครื่อง หรือไม่ (Are all isolation blinds (spades) such as a Master Blind List for positive isolation of a confined space entry, equipment or lines for hot work, etc. for positive isolation during the shutdown or TA, returned to their proper start-up positions?) Note: all blinds will not be returned to the normal run position while the unit is starting up and operating i.e. Steam-out blinds, Vessel drain line blinds, Nitrogen purge lines and vessel vents to atmosphere.	
	✓		VP19	19. ได้มีการทดสอบแรงดันด้วยน้ำและตรวจสอบเอกสารรับรองต่างๆ ว่าได้มีการลงนามรับรองโดยผู้รับผิดชอบแล้ว หรือไม่ (Are the document of verification for all hydro-test of line and equipment, signed off by Integrity or other authorized and delegated personnel?)	
	✓		VP20	20. แผ่นกันที่ได้ถูกติดตั้งเพื่อทดสอบแรงดันน้ำได้มีการตรวจสอบและ ได้ถูกถอดออกและอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเริ่มเดินเครื่อง หรือไม่ (Are all Hydro-test blinds, listed on the hydro-test Blind (Spade) List verified as signed off and either removed or if a spectacle blind returned to the proper position for start-up of the unit?)	
	✓		VP21	21. ได้มีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค เช่น ลม น้ำ ไนโตรเจน ตามแบบและได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ (Are the proper Utility systems such as plant and instrument air, water and nitrogen for purging or flushing, installed as the design specification?)	

2.4.4 รายการตรวจสอบความพร้อมของการประกอบประเก็น (Gasket Installation)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 15/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Engineering (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Engineering) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

เจ้าหน้าที่จากโครงการ/ก่อสร้าง (Project/Construction _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Project/Construction Manager) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		GK1	1. ได้ใช้ประเก็นที่ถูกต้องเหมาะสมกับของไหล กระบวนการผลิต อุณหภูมิ และแรงดันแล้ว หรือไม่ (Are gaskets compatible with process fluids, temperatures and pressure?)	
	✓		GK2	2. ได้ใช้ประเก็นที่เหมาะสมกับหน้าแปลนและถูกต้องตามคุณสมบัติของท่อแล้ว หรือไม่ (Are gaskets used as the applicable valve and piping specification?)	
	✓		GK3	3. จุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ได้รับการปรับระดับอย่างเหมาะสมแล้ว หรือไม่ (Are equipment joints properly aligned?)	
	✓		GK4	4. มีการทดสอบการรั่วไหลของรอยต่อ ข้อต่อต่างๆ เรียบร้อยแล้ว หรือไม่ (Are Leak Testing of lines, joints and equipment done?)	
	✓		GK5	5. มีระยะเกลียวของน็อตเกลืออย่างน้อย 1 เกลียวหลังจากขันน็อตที่หน้าแปลนแล้ว หรือไม่ (Are all nuts tightened until at least 1 threaded of pitch remains on all flanges?)	
	✓		GK6	6. หน้าแปลนที่จะต้องใช้ประเภทแรงดันขันอัดได้ถูกตรวจสอบว่าได้ตามแรงดันขันอัดที่ได้ถูกสั่งเอาไว้ หรือไม่ (Are all nuts and bolts of flanges tightened with correct and specific torques?)	

2.5 รายการตรวจสอบความพร้อมอื่นๆ (Others)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 26/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Operation) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): _____

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Engineering หรือ Maintenance (_____) (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Engineering or Maintc_____) (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

เจ้าหน้าที่จากโครงการ/ก่อสร้าง (Project/Construction) (_____) (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 14/7/64

ผู้จัดการส่วน (Project/Construction Manager) (ชื่อ) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ (date): 9/7/64

N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		OT1	1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสำหรับการทดสอบการเดินเครื่อง หรือเริ่มการเดินเครื่องหรือไม่ (Are special procedures for commissioning/decommissioning or a first time startup provided?)	Pre Commissioning & Commissioning procedure
	✓		OT2	2. มีการทบทวน ปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย หรือไม่ (Are Operational Safety Procedures reviewed and revised?)	
	✓		OT3	3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ระบบเครื่องกล, ไฟฟ้า และ Instrument มีการจัดเก็บที่ส่วนซ่อมบำรุงและส่วนการผลิต หรือไม่ (Are all operating and maintenance manuals/guides for equipment and instrument kept in the department of maintenance and operation?)	
	✓		OT4	4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง P&IDs / PEFSs ได้ถูกจัดเก็บและสำเนาเพื่อพร้อมที่จะใช้งาน หรือไม่ (Are the updated documents of P&IDs and PEFSs copied and kept in the easily accessible place?)	
	✓		OT5	5. มีการ Update Drawing ท่อใต้ดิน ให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ (Are underground piping drawings up-to-date?)	
	✓		OT6	6. มี as-built loop diagrams/electrical diagrams/support diagrams สำหรับการดำเนินการอย่างปลอดภัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือไม่ (Are as-built loop diagrams/electrical diagrams/support diagrams for all equipment necessary for safe operations available?)	
	✓		OT7	7. มีการปรับข้อมูลเกี่ยวกับ flow and process diagrams ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน หรือไม่ (Are flow and process diagrams up-to-date?)	
	✓		OT8	8. มีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใดๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ (Are new or modified process communicated with concerned parties?)	
	✓		OT9	9. การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือไม่ (Is the equipment placed in a safe and easily accessible location?)	
	✓		OT10	10. ขั้นตอนการสำหรับด้านเทคนิคหรือควบคุมดูแลระหว่างการเริ่มต้นการดำเนินการ หรือไม่ (Are procedures written for technical and supervisory supports during startup?)	
	✓		OT11	11. PSSR Team ได้ Review เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะ Project Startup แล้วหรือยัง รวมถึงวิธีการแก้ไข หรือไม่ (Does the PSSR Review Team give the recommendations and solution of events that may occur during startup?)	

ส่วนที่ 3: สรุปรายการข้อบกพร่องที่ตรวจพบและผลของการแก้ไข
(PART 3: NON-COMPLIANCE ITEMS AND CORRECTION)

3.1 รายการที่ต้องทำให้เสร็จก่อน Start –Up (Non-compliance items which must be completed before Start-Up)

รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าแล้วเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked) by	ตรวจสอบโดย (Completion checked) date
	Punch list A, B					
	ตามเอกสารแนบ					

Note: PSR Coordinator inform the PSSR Approver in case of having impact the startup schedule.

3.2 รายการที่ต้องติดตามให้เสร็จหลัง Start –Up (Non-compliance items which can be completed after Start-Up)

รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าแล้วเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked) by	ตรวจสอบโดย (Completion checked) date
	Punch list C					
	ตามเอกสารแนบ					

รายงานโดย PSSR Coordinator : _____ (___วีรพล แพงแก้ว___) วันที่ 9/7/64

ส่วนที่ 4: ผู้อนุมัติ PSSR (PART 4: PSSR APPROVER)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ Pre-Start up Safety Review (PSSR) Checklist ของงานนี้ครบถ้วนแล้ว และอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการ Start Up ได้

(I here by certified Pre-Start up Safety Review (PSSR) Checklist and approve for startup activities.)

ผู้อนุมัติ PSSR (PSSR Approvers)	ชื่อ นามสกุล (Name & Family Name)	ลายเซ็น (Signature)	วันที่ (DD-MM-YY)
PTTGC Commissioning Manager			
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานผลิต (PU Head)			
