ภาคผนวก 4ข

เอกสารบันทึกการเจาะหลุมระเบิด

รายงานการระเบิดหิน (Blasting Report)

BENCH ที่ A30

รายงานการสังเจาะรูระเบิด

1 วันที่ 6/6/69

2 ☑ เจาะรูดิ่ง ☐ เจาะรูนอน

3 เครื่องจักรที่เจาะ HCR 12

4 ระยะแถว (Burden) 3.2 m.

5 ระยะรู (Spacing) 3.8 m.

6 จำนวนรูที่เจาะ 18 รู


7 ความลึกเฉลี่ย (Deep) 7 m.

8 หน้าผาสูงเฉลี่ย (Bench Height) 6 m.

ลงชื่อ ผู้สั่งเจาะ.....

ลงชื่อ ผู้วางผังเจาะ.....

หน้าระเบิด (Free face) และ Pattern การเจาะ



รายงานการสังระเบิดหิน

1 วันที่ 18/6/69

2 จำนวนหลุมเจาะที่ระเบิด 18 รู

3 ดินระเบิดขนาด 25 มม. จำนวน.....นัด/รู

55 มม. จำนวน.....นัด/รู

75 มม. จำนวน 1 นัด/รู

4 ปุ๋ย (NH_4NO_3) จำนวน 25 กก/รู ทั้งหมด 21 ถุง

5 สายชนวนระเบิด เบอร์.....grain จำนวน..... ม./รู

6 แก๊ป ไฟฟ้า เบอร์.....จำนวน.....นัด

Non elec.Down line ขนาด.....ม.จำนวน 18 นัด

Non elec.trunk line ขนาด 6 ม.จำนวน 10 นัด

7 ระยะอัดปากหลุม (Stemming) 3.0 เมตร

8 ปริมาณหินที่ได้ 3414.53 ตัน

Powder Factor

109.82 กรัม/ตัน

9 ผลการระเบิด ☑ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

10 ระยะหินปลิวไกลสุด 20 ม. ขนาด 300 มม.

ลงชื่อ ผู้สั่งระเบิด.....

รายงานการเจาะรูเจาะระเบิดของพนักงานเจาะหิน

/ หินแน่น O ถ้ำ หรือ โพรง X ดิน

หลุมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ระยะความลึก (m.) 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/														
2	/	/	/	X	/	X	X	⊗	X	/	/	/	/	/	/	X	X	⊗														
3	X	X	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	⊗	/	X	X	⊗	/														
4	⊗	/	⊗	X	/	⊗	/	/	/	/	⊗	⊗	/	X	/	/	⊗	/														
5	/	/	⊗	/	/	X	X	/	⊗	⊗	/	X	/	/	/	⊗	/	/														
6	X	⊗	/	⊗	⊗	/	/	/	⊗	/	X	/	/	⊗	X	X	⊗	⊗														
7	/	/	/	X	/	X	⊗	/	/	/	X	/	X	/	/	X	/	/														
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																

หมายเหตุ : STEMMING AN/FO EXPLOSIVE

ลงชื่อ พนักงานเจาะ.....

ลงชื่อผู้ตรวจรับงาน.....

F/09-52-03-01/QR

00/01-12-2548

หินชุดนี้ 22,876.64 x 3.82 = 1,355.68 tons

รวม = 4,770.21 tons

ภาคผนวก 5ข

แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และการซ่อมบำรุง

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

| Item | Description | Plan No. in SAP | Period | Year Planning 2026 — Weeks | | |

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

Item	Description	Plan No. in SAP	Period	Year Planning 2026 — Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
23	Bag filter 01.BF.01 (Secondary Crusher)	1124	2M	x x x x x x
24	Bag filter 01.BF.02 (Primary Crusher)	1126	2M	x x x x x x
25	Vibration feeder 01.FE.03	1132	6M	x x
	Section : Cement Mills plant			
1	Bag filter Unloading #60.DC.01	1721	6M	x x
2	Bag filter Pivoting #60.DC.02	1771	6M	x x
	Sluice for Bag filter Pivoting #60.SL.02	1771	6M	x
	Fan Bag filter Pivoting #60.FA.02	1771	6M	x
3	Pan conveyor under clinker silo #60.PC.01	1133	6M	x
4	Belt conveyor 60.BC.01	1741	6M	x x
5	Belt conveyor 60.BC.02	1742	6M	x x
6	Belt conveyor 60.BC.03	1743	6M	x x
7	Belt conveyor 60.BC.04	1744	6M	x x
8	Belt conveyor 60.BC.05	1745	6M	x x
9	Belt conveyor 60.BC.06	1746	6M	x x
10	Belt conveyor 60.BC.07	1747	6M	x x
11	Belt conveyor 60.BC.08	1748	6M	x x
12	Clinker bucket elevator #1 #60.BE.01	1134	3M	x x x x
13	Clinker bucket elevator #2 #60.BE.02	1135	3M	x x x x
14	Pivoting pan convetor #60.PC.02	1136	1M	x x x x x x x x x x x x
15	Gypsum bucket elevator 60.BE.03	1137	3M	x x x x
16	Storage crane	1138	2M	x x x x x x

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

Item	Description	Plan No. in SAP	Period	Year Planning 2026 — Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
17	Cement mill 1	1139	6M	5: x; 31: x
18	Gearbox and trasmission drive CM1	1009	1Y	48: x
19	Separator cement mill 1	1140	6M	5: x; 31: x
20	Bucket cement mill 1	1141	4M	5: x; 23: x; 39: x
21	Fuller pump cment mill 1	1142	4M	5: x; 23: x; 40: x
22	Compressor cement mill 1	1143	6M	5: x; 31: x
23	Bag filter Cement mill 1	1144	4M	5: x; 23: x; 40: x
24	Cleaning Gear box cooling FM1	1299	6M	5: x; 31: x
25	Cement mill 2	1145	6M	10: x; 36: x
26	Separator cement mill 2	1255	6M	10: x; 36: x
27	Bucket cement mill 2 #62.BE.01	1256	4M	11: x; 28: x; 45: x
28	Fuller pump cment mill 2 #62.FP.01	1257	4M	11: x; 28: x; 45: x
29	Compressor cement mill 2 #62.AC.01	1258	6M	10: x; 36: x
30	Bag filter Cement mill 2 #62.DC.01	1259	4M	11: x; 28: x; 45: x
31	Cleaning Gear box cooling FM2	1298	6M	10: x; 36: x
32	Cement mill 3	1151	6M	7: x; 14: SD; 15: SD; 33: x
33	Separator cement mill 3	1260	6M	3: x; 14: SD; 15: SD; 29: x
34	Bucket cement mill 3 #63.BE.01	1261	4M	4: x; 14: SD; 15: SD; 21: x; 39: x
35	Fuller pump cment mill 3 #63.FP.01	1262	4M	4: x; 14: SD; 15: SD; 21: x; 39: x
36	Compressor cement mill 3 #63.AC.01	1263	6M	3: x; 14: SD; 15: SD; 29: x
37	Bag filter Cement mill 3 #63.DC.01	1264	4M	4: x; 14: SD; 15: SD; 21: x; 39: x

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

Item	Description	Plan No. in SAP	Period	Year Planning 2026 — Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
38	Bag filter Cement mill 3 no.2 #63.DC.02	1491	4M	4 x; 14 SD; 15 SD; 21 x; 39 x
39	Cleaning Gear box cooling FM3	1297	6M	3 x; 14 SD; 15 SD; 29 x
40	Cement mill 4	1265	6M	11 x; 34 SD; 35 SD; 37 x
41	Check Pinion and girth gear drive CM4	1761	1Y	34 SD; 35 SD; 37 x
42	Separator cement mill 4 NO.1	1266	6M	11 x; 34 SD; 35 SD; 37 x
43	Separator cement mill 4 NO.2	1267	6M	11 x; 34 SD; 35 SD; 37 x
44	Bucket cement mill 4	1268	4M	12 x; 29 x; 34 SD; 35 SD; 48 x
45	Fuller pump cment mill 4	1269	4M	12 x; 29 x; 34 SD; 35 SD; 48 x
46	Compressor cement mill 4	1270	6M	11 x; 34 SD; 35 SD; 37 x
47	Bag filter Cement mill 4	1271	4M	12 x; 29 x; 34 SD; 35 SD; 47 x
48	Cleaning Gear box cooling FM4	1296	6M	11 x; 34 SD; 35 SD; 37 x
49	Cement mill 5	1272	6M	8 x; 34 x; 42 SD; 43 SD
50	Check Pinion and girth gear drive CM5	1762	1Y	41 x; 42 SD; 43 SD
51	Separator cement mill 5	1273	6M	8 x; 38 x; 42 SD; 43 SD
52	Bucket cement mill 5	1274	4M	8 x; 26 x; 42 SD; 43 SD; 44 x
53	Fuller pump cment mill 5	1275	4M	8 x; 26 x; 42 SD; 43 SD; 44 x
54	Compressor cement mill 5	1276	6M	8 x; 34 x; 42 SD; 43 SD
55	Bag filter Cement mill 5	1277	4M	8 x; 26 x; 42 SD; 43 SD; 44 x
56	Cleaning Gear box cooling FM5	1166	6M	8 x; 34 x; 42 SD; 43 SD
	Section : Packing plant			
1	Blower silo #1 70AC01	1736	1 Y	1 SD; 15 SD; 35 x
2	Blower silo #2 70AC02	1737	1 Y	1 SD; 15 SD; 35 x

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

| Item | Description | Plan No. in SAP | Period | Year Planning 2026 | | |

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

| Item | Description | Plan No. in SAP | Period | Year Planning 2026 | | |

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

Item	Description	Plan No. in SAP	Period	Year Planning 2026 — Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
	Bag filter for packing 2.no.3 #72.DC.03		4M	SD ... SD x ... x ...
	Sluice under BF 4 #71.SL.4		4M	SD ... SD x ... x ...
42	Screw conveyor 71.SC.04	1233	1Y	SD ... SD ... x ...
43	Screw conveyor 71.SC.05	1234	1Y	SD ... SD ... x ...
44	Screw conveyor 71.SC.06	1235	1Y	SD ... SD ... x ...
45	Screw conveyor 71.SC.08	1236	1Y	SD ... SD ... x ...
46	Screw conveyor 71.SC.09	1237	1Y	SD ... SD ... x ...
47	Screw conveyor 72.CC.01	1238	1Y	SD ... SD ... x ...
48	Screw conveyor 72.SC.05	1239	1Y	SD ... SD ... x ...
49	Screw conveyor 72.SC.06	1240	1Y	SD ... SD ... x ...
50	Screw conveyor 72.SC.07	1241	1Y	SD ... SD ... x ...
51	Screw conveyor 72.SC.08	1242	1Y	SD ... SD ... x ...
52	Screw conveyor 72.SC.09	1243	1Y	SD ... SD ... x ...
53	Screw conveyor 72.SC.10	1244	1Y	SD ... SD ... x ...
	Screw conveyor 72.SC.11		4M	SD ... SD x ... x ...
54	Vibration screen #1 , PK1 #71.VS.01	1245	6M	SD ... x ... SD ... x ...
55	Vibration screen #2 , PK1 #71.VS.02	1246	6M	SD ... x ... SD ... x ...
56	Vibration screen #1 , PK2 #72.VS.01	1247	6M	SD ... x ... SD ... x ...
57	Vibration screen #2 , PK2 #72.VS.02	1248	6M	SD ... x ... SD ... x ...
	Section : Heavy equipment			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1	Wheel loader 920	1683	2M	x ... x ... x ... x ... x ... x ... x ... x ... x
2	Wheel loader 950	1698	2M	x ... x ... x ... x ... x ... x ... x
3	Wheel loader 966#1	1699	2M	x ... x ... x ... x ... x ... x ... x
4	Wheel loader 966#2	1700	2M	x ... x ... x ... x ... x ... x ... x

แผนงานประจำปี (Yearly Plan)

Section : All Equipments

| Item | Description | Plan No. in SAP | Period | Year Planning 2026 — Weeks | | |

ภาคผนวก 6ข

ตัวอย่างเอกสารรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท.....

แบบฟอร์มสื่อสาร

เรียน .....ฝ่าย.....ส่วน.....EMR. ☐ : ภายใน ☐ : ภายนอก

1. ประเภทการสื่อสาร ☐ สื่อสารข้อมูล ☐ ขอร้องเรียน ☐ ข้อแนะนำ ☐ อื่น ๆ

2. ข้อความ/เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร

ลงชื่อโดย.....

วันที่.....

3. วัตถุประสงค์

4. การพิจารณาอนุมัติ :

☐ 1.อนุมัติให้..... ดำเนินการ และ ☐ 1.1 รายงานผลการปฏิบัติ ☐ ไม่ต้องรายงานผล

☐ 2.ไม่อนุมัติ.....

☐ 3. อนุมัติให้.....ดำเนินการแก้ไข และมีข้อสังเกต .....

ผู้มีอำนาจ

5. เรียน.....เพื่อทราบผลการปฏิบัติ

.....

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

6. ทบทวนผล

.....

ผู้มีอำนาจ

หมายเลข ISO CAR ..... หมายเลข ISO PAR .....

หมายเหตุ : ผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อที่	กรณีสื่อสารภายใน	กรณีสื่อสารภายนอก
2. ข้อความ	หัวหน้างาน/ผจก.แผนกขึ้นไป	หัวหน้างาน/ผจก.แผนกขึ้นไป
4. พิจารณาอนุมัติ/มอบหมาย	ผจ.ฝ่าย/ฝ่ายขึ้นไป	ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการโรงงานขึ้นไป
5. รายงานผลการปฏิบัติ	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
6. ทบทวนผล	ผจ.ฝ่าย/ฝ่ายขึ้นไป	ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการโรงงานขึ้นไป

[illegible]

ภาคผนวก 7ข

เอกสารการตรวจสอบสภาพรถบรรทุก

safe work healthy life

CEMENT TRUCK PRE-START CHECKLIST

เอกสารตรวจรถขนส่งปูนถุงหรือวัตถุดิบ

ปูนดอกบัว ENHANCING YOUR SUCCESS

โปรดนำฟอร์มตรวจรถขนส่งประจำวันส่งคืนกลับให้หัวหน้างานเพื่อรับทราบทุกสัปดาห์และส่งคืนทุกสิ้นเดือนเพื่อรับใบใหม่

กรอกข้อมูลตามจริง! ใส่เครื่องหมาย √ สภาพปกติ หรือ X สภาพชำรุด ต้องปรับปรุง



รายการตรวจเช็ครายสัปดาห์	สัปดาห์ที่1	สัปดาห์ที่2	สัปดาห์ที่3	สัปดาห์ที่4	สัปดาห์ที่5
ภายนอกรถขนส่งปูน					
ดอกยางสมบูรณ์ไม่มีรอยบาดหรือปริ (2)	✓	✓		✓	✓
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันเครื่อง/น้ำ (1)	✓	✓		✓	✓
ถังดับเพลิงมีความดันปกติ2 ถัง @10lbs หรือ 1 ถัง 15 lbs.(1)	✓	✓	✓	✓	✓
กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉพาะชุดทำแผลเบื้องต้น (1)	✓	✓	✓	✓	✓
กรวยยางจราจรจำนวน2 อัน (1)	✓	✓	✓	✓	✓
ไฟฉาย หรือ ไฟฉายจากมือถือ (1)	✓	✓	✓	✓	✓
หมอนหนุนล้อรถจำนวน2 อัน (1)	✓	✓	✓	✓	✓

รายการตรวจเช็ครายเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง)

น้ำมันเบรค/ครัช/น้ำมันเครื่อง/น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ (1) ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐

ระบบติดตามสัญญาณดาวเทียม (GPS) ทำงานปกติ (ถ้ามี) (1) ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐

* หมายเหตุ สัปดาห์ที่1 คือวันที่ 1-7 ของเดือน, สัปดาห์ที่2 คือวันที่ 8-14 ของเดือน , สัปดาห์ที่ 3 คือ วันที่ 15-21 ของเดือน , สัปดาห์ที่ 4 คือ วันที่ 22-28 ของเดือน , สัปดาห์ที่ 5 คือ วันที่ 29 - วันสิ้นเดือน

(1) หมายถึง ถ้าตรวจพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขภายใน 7 วัน , (2) หมายถึง ถ้าตรวจพบข้อบกพร่องต้องสั่งให้หยุดวิ่งรถและแก้ไขทันที

การตรวจเช็คสภาพของรถขนส่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถทุกคนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานขับรถและผู้ใช้ยานพาหนะอื่นบนท้องถนน


---

safe work healthy life

CEMENT TRUCK PRE-START CHECKLIST (HV. - > 3.5 ton)

เอกสารตรวจรถขนส่งปูนถุงหรือวัตถุดิบ

ปูนดอกบัว ENHANCING YOUR SUCCESS

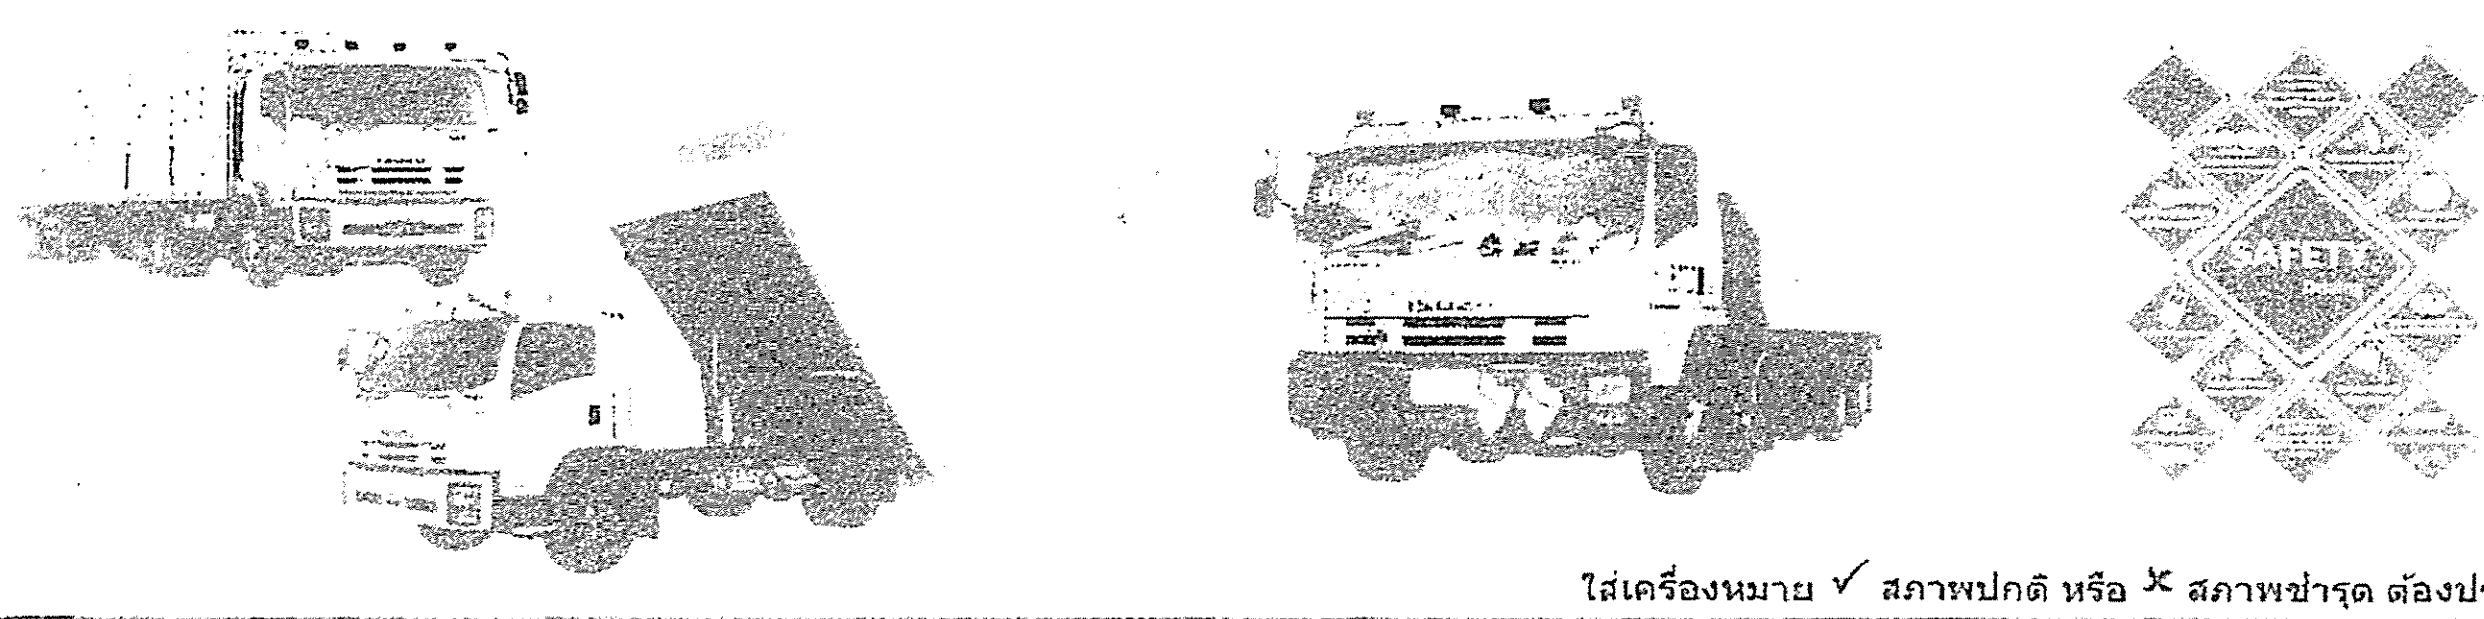

ใส่เครื่องหมาย ✓ สภาพปกติ หรือ ✗ สภาพชำรุด ต้องปรับปรุง

รายการตรวจเช็ครายวัน									
1.ไฟหน้า ไฟสูง/ต่ำ ทำงานปกติและมองเห็นสว่างชัดเจน (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
2.ไฟเลี้ยวซ้าย/ขวาทำงานปกติและมองเห็นสว่างชัดเจน (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
3.ไฟเบรคทำงานครบทุกดวง (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
4.ไฟถอยหลังและมีสัญญาณเสียง (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
5.เสียงแตรดัง (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
6.การทำงานเบรคมือและเบรคเท้าปกติหรือไม่ (2)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
7.มีแผ่นยางกันลื่นที่แป้นเบรคและแป้นคันเร่ง (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
8.กระจกหน้าและข้างไม่มีสิ่งบดบังและสะอาด (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
9.เข็มขัดนิรภัย (2)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
10.ชุดยกไฮโดรลิก (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
11. กล้องหน้ารถ บันทึกและทำงานได้ปกติ (1)	✓	✓		✓		✓		✓	✓
12. กล้องอื่นๆ โปรดระบุ................................									

ในกรณีพบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องหยุดใช้รถขนส่งดังกล่าวและนำเข้าซ่อมปรับปรุงทันที

** กรณีรถเสียหรือเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการทำงานให้รีบแจ้งหัวหน้างานที่รับผิดชอบทันทีที่เกิดเหตุ **

safe work healthy life

หมายเหตุ : (1) หมายถึง ถ้าตรวจพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขภายใน 7 วัน

(2) หมายถึง ถ้าตรวจพบข้อบกพร่องต้องสั่งให้หยุดวิ่งรถและแก้ไขทันที

BUA CONCRETE


แบบฟอร์มตรวจสอบยานพาหนะเคลื่อนที่ทุกชนิด
Heavy Mobile Equipment check sheet form

บุนดอกบัว

ประเภท ..... เลขควบคุม ..... วันที่ 1/12/62

ผู้รับผิดชอบ ..... แผนก ..... ผู้ตรวจ .....

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจ			ข้อกำหนด			ข้อเสนอแนะ
		มี	ไม่มี	ไม่เกี่ยว	กฎหมาย	มาตรฐาน	เพิ่มเติม	
1	**ข้อกำหนดตามกฎหมาย**							
	พรบ. ประจำปี	✓						
	ใบขับขี่ (ตามประเภทรถ)	✓						
	GPS	✓						
2	**มาตรฐานความปลอดภัย (Driving safety Std.)**							
	กล้องหน้า	✓						
	กล้องถอยหลัง	✓						
	แถบสะท้อนแสงรอบตัวรถ	✓						
	ID card	✓						
	พื้นที่พร้อมราวกันตกด้านบนรถ (เฉพาะรถบรรจุผงซีเมนต์)							
3	**ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย**							
	ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์อย่างน้อย 1 ถัง	✓						
	กรวยจราจรความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร	✓						
	ชุดปฐมพยาบาล (ไม่ต้องมียารับประทาน)	✓						
	ที่ห้ามล้ออย่างน้อย 2 อัน (ความสูงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของล้อ)							
4	**การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์**							
	ระบบไฟหน้า	✓						
	ระบบไฟเลี้ยว	✓						
	ระบบไฟถอยหลัง	✓						
	ระบบฉุกเฉิน	✓						
	ระบบเบรก	✓						
5	**ความเรียบร้อยในและนอกตัวรถ**							
	ห้องโดยสารไม่พบขวดก็ดบางฝังคนขับ	✓						
	ไม่พบสิ่งเสพติดหรือมีนเมาในตัวรถ	✓						
	กระจกหน้ารถไม่มีสิ่งบดบัง เช่น ผ้าม่าน	✓						
	กระจกหน้า ข้าง สะอาดมองเห็นชัดเจน	✓						
	กระจกส่องหลังสะอาดชัดเจน	✓						
6	**แผนการซ่อมบำรุง**							
	มีแผนการซ่อมบำรุง หรือสมุดประจำรถ	✓						
	รายงานสภาพการซ่อมบำรุง							

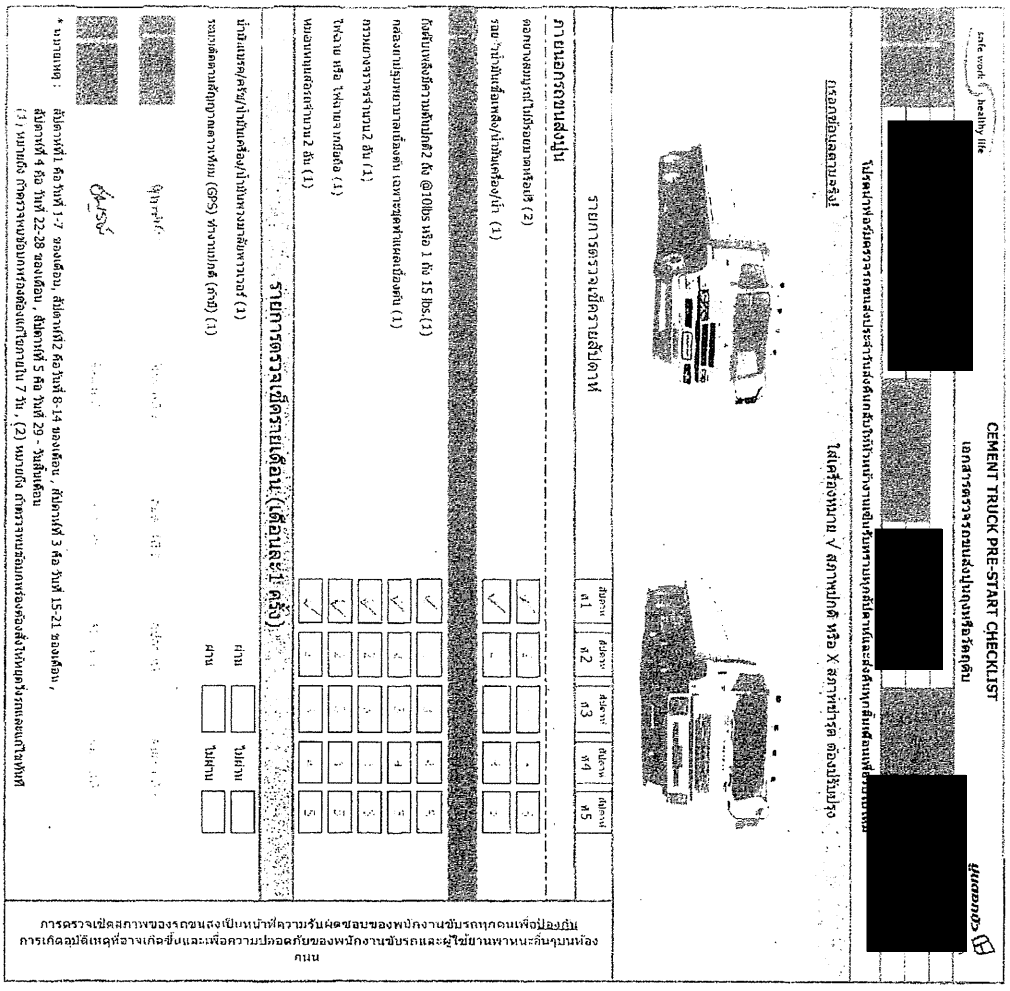

CEMENT TRUCK PRE-START CHECKLIST

เอกสารตรวจรถผสมปูนก่อนเริ่มงาน

บุนดอกบัว

ใส่เครื่องหมาย √ สภาพปกติ หรือ X สภาพผิดปกติ พร้อมรายละเอียด


ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน


ภาพตัวอย่างรถผสมปูน

ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (ต่อ)

ตรวจสอบหลังเสร็จงาน

การตรวจเช็คสภาพของรถขนส่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถทุกคนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานขับรถและผู้ใช้ยานพาหนะบนท้องถนน

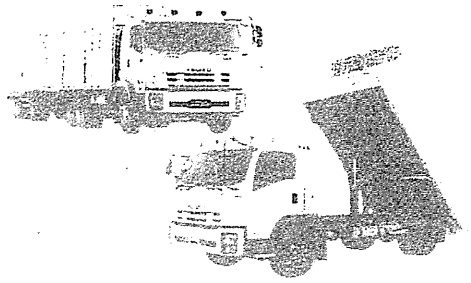



ใส่เครื่องหมาย ✓ สภาพปกติ หรือ ✕ สภาพชำรุด ต้องปรับปรุ

| รายการตรวจเช็ครายวัน | | |

ภาคผนวก 8ข

เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ

10. Good Practice or Any 5S activity done at Field

Location	Jalaprathan Cement Plc.
Date created	June 2026
Plant	Takli Safety Event _Driving Safety
H&S Topic	13ข เอกสารแสดงการอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับกฎจราจร
Description & Pictures	    
Proposed Sharing	H

ภาคผนวก 9ข

ตัวอย่างเอกสารบันทึกน้ำหนักรถ

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 166370
JALAPRATHAN CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
โรงงานตาคลี นครสวรรค์
โทร. 098-2575056
แฟกซ์. 056-373791-2

หน่วยงาน ตาคลี สะพานที่ 2

ใบบันทึกการชั่งเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่

เลขที่ OTD000138329 Ref: วัน/เวลาชั่งเข้า น้ำหนักรถ 14,190 Kg

ทะเบียนรถ [redacted] วัน/เวลาชั่งออก น้ำหนักรถ 37,030 Kg

รหัสลูกค้า นามลูกค้า น้ำหนักสุทธิ 22,840 Kg

รหัสสินค้า 9000001 ประเภทสินค้า หินดี รับสินค้าเข้า ☐ จ่ายสินค้าออก ☐

User: u8cailc
ชั่งซ้ำโดย [redacted]

ได้รับสินค้าจำนวนถูกต้องและสภาพเรียบร้อย ผู้ชั่งรถ

WB_Application V1.0.2

ผู้รับสินค้า วันที่ ผู้รับมอบอำนาจ

ลูกค้า

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 166368
JALAPRATHAN CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
โรงงานตาคลี นครสวรรค์
โทร. 098-2575056
แฟกซ์. 056-373791-2

หน่วยงาน ตาคลี สะพานที่ 2

ใบบันทึกการชั่งเครื่องชั่งรถยนต์ วัน

เลขที่ OTD000138328 Ref: วัน/เวลาชั่งเข้า 1 น้ำหนักรถ 15,120 Kg

ทะเบียนรถ [redacted] วัน/เวลาชั่งออก น้ำหนักรถ 37,210 Kg

รหัสลูกค้า นามลูกค้า น้ำหนักสุทธิ 22,090 Kg

รหัสสินค้า 9000001 ประเภทสินค้า หินดี รับสินค้าเข้า ☐ จ่ายสินค้าออก ☐

User: [redacted]
ชั่งซ้ำ

ได้รับสินค้าจำนวนถูกต้องและสภาพเรียบร้อย ผู้ชั่งรถ

WB_Application V1.0.2

ผู้รับสินค้า วันที่ ผู้รับมอบอำนาจ

ลูกค้า
