บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพโครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง) ดำเนินการโดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ความเร็วลมและทิศทางลม ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำประปา และคุณภาพน้ำผิวดิน ทั้งนี้เจ้าของโครงการดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง **ตารางที่ 4-1**

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด
พื้นที่โครงการ	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน	- ทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดการก่อสร้างงานรื้อถอน - ทำการตรวจวัดทุกวันต่อเนื่องที่มีการก่อสร้างช่วงงานเสาเข็มและฐานราก - หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน	เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ความเร็วและทิศทางลม	เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง
	ระดับเสียงทั่วไป และระดับเสียงรบกวน	ทุกวันที่มีการก่อสร้างงานเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ความสั่นสะเทือน	ทุกวันที่มีการก่อสร้างงานเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	คุณภาพน้ำทิ้ง	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด
พื้นที่อ่อนไหว	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน	- ทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดการก่อสร้างงานรื้อถอน - ทำการตรวจวัดทุกวันต่อเนื่องที่มีการก่อสร้างช่วงงานเสาเข็มและฐานราก - หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน	เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ระดับเสียงทั่วไป และระดับเสียงรบกวน	ทุกวันที่มีการก่อสร้างงานเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ**				
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการพบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง และให้ชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ และวิศวกรควบคุมงานของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง) ซึ่งสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัย โดยรอบพื้นที่เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่ภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการพบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง และให้ชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการและวิศวกรควบคุมงานของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง) ซึ่งสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)**				
- ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในโครงการเสมอ	-
- ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่ภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง	-
- รั้วโดยรอบโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ล้อมรอบโครงการ	-
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย				
- เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง	- ถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการคลุมเศษวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง	-
- การเคลื่อนตัวของดิน	- บริเวณ Sheet Pile จำนวน 2 จุด ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการทำฐานรากเสาเข็ม	โครงการจัดให้มี Sheet Pile จำนวน 2 จุด ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)				
- ดิน และโคลนเบนโทไนท์	- บริเวณพื้นที่โครงการและสถานที่ทิ้งดิน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง	-
- การฉีดล้างล้อรถ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
1.3 คุณภาพอากาศ				
- ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคารสูงกว่าอาคาร ณ ขณะก่อสร้างอย่างน้อย 2 เมตร	- ตัวอาคารขณะก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคารสูงกว่าอาคาร ณ ขณะก่อสร้างอย่างน้อย 2 เมตร และจัดให้มีพนักงานฉีดพรมน้ำบริเวณก่อสร้างอยู่เสมอ	-
- การฉีดพรมน้ำ	- พื้นที่โครงการและสถานที่ทิ้งดิน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
- การทำงานของเครื่องจักร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
- ควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรดีเซล	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตรวจวัดควันดำก่อนการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างตรวจวัดทุก 6 เดือน		

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
- เขม่าและควันที่จะก่อให้เกิด $PM_{2.5}$	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้ติดตั้งสเปรย์ละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet รั้วรอบโครงการ	-
- การตรวจวัด $PM_{2.5}$ และ PM_{10} แบบ Real Time พร้อมป้ายแสดงผลดิจิตอล ที่สามารถแสดงรายงานผลทันที	- บริเวณรั้วด้านหน้าโครงการด้านติดกับถนนเจริญนคร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการติดตั้งเครื่องตรวจวัด $PM_{2.5}$ และ PM_{10} แบบ Real Time พร้อมป้ายแสดงผลดิจิตอลที่สามารถแสดงรายงานผลทันที	-
- สถานการณ์คุณภาพอากาศค่า $PM_{2.5}$ จากกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการติดตั้งเครื่องตรวจวัด $PM_{2.5}$ และ PM_{10} แบบ Real Time พร้อมป้ายแสดงผลดิจิตอลที่สามารถแสดงรายงานผลทันที	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) **- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 จุด** **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็ม** - ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกสัปดาห์	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกสัปดาห์	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- CO 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือน	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) **- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 จุด** **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็ม** - NOx 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือน	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- HC 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือน	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- SOx 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือน	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) **- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 จุด** **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็ม** จุดที่ 2 ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก - ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 ชม. - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 24 ชม.	- จุดที่ 2 ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็มแล้วเสร็จ** - TSP 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสานทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- PM_{10} 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสานทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- CO 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสานทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็มแล้วเสร็จ** - Nox 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสานทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- HC 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสานทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- Sox 24 ชม.	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสานทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็มแล้วเสร็จ** - ความเร็วและทิศทางลม	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องรวมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
จุดที่ 2 ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก - ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 ชม. - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 24 ชม.	- จุดที่ 2 ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก		ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
1.4 เสียง - การตรวจวัดระดับเสียง 2 จุด **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็ม** - Leq 24 hr, Lmax, L90 และเสียงรบกวน	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกสัปดาห์	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.4 เสียง - Leq 24 hr, Lmax, L90 และเสียงรบกวน	- จุดที่ 2 ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกสัปดาห์	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
2) ช่วงฐานรากเสาเข็มแล้วเสร็จ - Leq 24 hr, Lmax, L90 และเสียงรบกวน	- จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 1 วันต่อเนื่อง โดยการสุ่มตรวจในวันทำงาน และรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- Leq 24 hr, Lmax, L90 และเสียงรบกวน	- จุดที่ 2 ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 1 วันต่อเนื่อง โดยการสุ่มตรวจในวันทำงาน และรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1.5 ความสั่นสะเทือน **1) ช่วงงานฐานรากเสาเข็ม** - ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง	- จุดที่ 1 ภายในโครงการด้านทิศตะวันออก (กรณีมีผลกระทบจากการทำเสาเข็มหรือร้องเรียนจากอาคารข้างเคียง โครงการต้องเพิ่มจุดตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม โดยรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกสัปดาห์	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
2) ช่วงฐานรากเสาเข็มแล้วเสร็จ - ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง	- จุดที่ 1 ภายในโครงการด้านทิศตะวันออก	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 1 วันต่อเนื่อง โดยการสุ่มตรวจในวันทำงาน และรายงานผลต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ออกแบบ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ **2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก** - สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการหากพบสัตว์ในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับเพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการได้กำชับคนงานก่อสร้างหากพบสัตว์ดังกล่าวในพื้นที่โครงการ ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับเพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - การระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- การทิ้งขยะ/เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการกำชับไม่ให้คนงานก่อสร้างทิ้งขยะและเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่ท่อสาธารณะ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้น้ำ**				
- สภาพการใช้งานของถังสำรองน้ำใช้	- ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำภายในพื้นที่โครงการ ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของคนงาน	-
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล - ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	-
- pH, BOD - SS, Settleable Solids, TDS - Sulfide -TKN - Fat Oil & Grease	- ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ทางโครงการจัดจ้างให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังแสดงใน**บทที่ 4**	-
- ความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม ต้องไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีน้ำขังและไหลออกสู่ภายนอก	- ห้องน้ำ ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมอยู่เสมอ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.3 การระบายน้ำ**				
- ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและบ่อดักขยะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและบ่อดักขยะ	-
3.4 การจัดการมูลฝอย - สภาพถังมูลฝอยไม่ชำรุดพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดเตรียมให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อการใช้งาน	-
- ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้างส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุชและ/หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้รับกำจัดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้างส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุชและ/หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้รับกำจัดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ	-
- บันทึกข้อมูลปริมาณเศษวัสดุก่อสร้าง สถานที่ที่นำไปกำจัด และใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชฯ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการบันทึกข้อมูลปริมาณเศษวัสดุก่อสร้าง สถานที่ที่นำไปกำจัด และใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชฯ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.5 พลังงานและไฟฟ้า** - สภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	-
3.6 การจราจร - ช่วงเวลาการขนส่งวัสดุให้อยู่ในช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด	- พนักงานขับรถขนส่ง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุให้อยู่ในช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน	-
- สภาพยานพาหนะให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงมีการมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
- พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน	- พนักงานขับรถ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการกำชับพนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน	-
- ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นและกรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุกจะต้องติดสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองให้เห็นชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก	- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง/ดินของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการกำชับให้ปิดคุลมด้วยผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นและกรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุกจะต้องติดสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองให้เห็นชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.6 การจราจร (ต่อ)** - ป้ายสัญญาณจราจร และไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกในช่วงเวลากลางคืน	- บริเวณทางเข้าออกด้านหน้าพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดในช่วงเวลากลางคืน	-
- ประกันอุบัติเหตุของรถบรรทุก	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยโดยครอบคลุมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้าออก	- บริเวณทางเข้าออกด้านหน้าพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้าออก	-
- พื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดพื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอ	-
- ห้ามจอดรถบรรทุก การกองวัสดุก่อสร้าง	- บริเวณไหล่ทางถนนราชพฤกษ์และถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการกำชับไม่ให้พนักงานทุกคนจอดรถบริเวณไหล่ทางถนนราชพฤกษ์และถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.7 การสื่อสาร และการโทรคมนาคม** - การประชาสัมพันธ์การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุจากตัวอาคารโครงการกับบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม** - การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนผลกระทบความต้องการการรับรู้และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ	- บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหว /สถานที่สำคัญ ระยะติดโครงการ และระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ - พื้นที่อ่อนไหว และสถานที่สำคัญและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระยะรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร	โครงการจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนผลกระทบความต้องการการรับรู้และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน** **1) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์** - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหวเป็นประจำ	- พื้นที่บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานที่สำคัญระยะติดโครงการ - พื้นที่บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สำคัญระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหวเป็นประจำ	-
- ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ	-
- การสำรวจความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ	- บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหว /สถานที่สำคัญ ระยะติดโครงการ และระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ - พื้นที่อ่อนไหว และสถานที่สำคัญ และ	- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อนขออนุญาตเปิดใช้อาคาร	โครงการจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)** - การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของโครงการโดยประสานงานกับสำนักงานเขต คลองสาน และภาคส่วนต่างๆ เช่น 1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด 2) ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 3) ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม 4) ด้านการศึกษา 5) ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน 6) ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน	พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระยะรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ - บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหว /สถานที่สำคัญ ระยะติดโครงการ และระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ - พื้นที่อ่อนไหว และสถานที่สำคัญและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระยะรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ปีละอย่างน้อย 3 กิจกรรม/โครงการ - ทุก 6 เดือน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนสัมพันธ์และความรับชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการพบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหว เป็นประจำ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน** **2) การดำเนินการเรื่องร้องเรียน** - จำนวนครั้งการร้องเรียน ประเภทปัญหาการร้องเรียน ประเด็นปัญหาการร้องเรียนซ้ำเดิมและระยะเวลาแก้ไข ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	- กล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ - สำนักงานควบคุมการก่อสร้างของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ	-
- ประเด็นปัญหาการร้องเรียนจากระยะติดโครงการ และระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหว/สถานที่สำคัญ ระยะติดโครงการ และระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ทุกสัปดาห์กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดซ้ำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่เสมอ	-
- รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน	- บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหว/สถานที่สำคัญ ระยะติดโครงการ และระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ - พื้นที่อ่อนไหว และสถานที่สำคัญและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง		โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่เสมอ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.3 การสาธารณสุข** - ความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของเจ้าของอาคารหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียงจากการก่อสร้าง	- อาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่เสมอ	-
- โรคติดต่อ หรือพาหะนำโรคติดต่อร้ายแรง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ก่อนรับเข้าทำงาน 1 ครั้ง และหลังเข้าทำงานแล้ว ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มงาน	-
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง	-
- รถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้างพร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้าง	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** - ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั้นจั่น ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้าแขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั้นจั่น ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้าแขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิง อยู่เสมอ	-
- ป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายเตือนให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอยู่ประจำในพื้นที่ก่อสร้าง	-
- การอบรมหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับคนงานก่อสร้าง	-
- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)** - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกจากที่สูงและการพังทลาย	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกจากที่สูงและการพังทลาย บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกจากที่สูงและการพังทลาย	-
- ความสะอาดและการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดวางวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	-
- แสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-
- คู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ	-
- ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและภาชนะรองรับขยะ	- ถังน้ำดื่ม ถังสำรองน้ำใช้และภาชนะรองรับขยะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และน้ำดื่มสะอาดไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)** - ประกันอุบัติเหตุของโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที่ข้างเคียง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีประกันอุบัติเหตุของโครงการ โดยครอบคลุมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของคนงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของคนงาน	-
- ปั้นจั่นอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกใช้งาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการตรวจเช็คปั้นจั่นอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกใช้งาน	-
- การใช้งานของเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-
4.5 ความปลอดภัยสาธารณะ - ทะเบียนข้อมูลการทำงานและประวัติคนงาน	- สำนักงานก่อสร้างของโครงการ	- ทุกครั้ง ที่รับคนงานเข้าทำงานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดทำทะเบียนข้อมูลการทำงานและประวัติคนงาน โดยจัดเก็บไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง	-
- ตรวจปัสสาวะคนงาน เพื่อหาสารเสพติด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างอยู่เสมอ	-
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ในพื้นที่โครงการ	-
- การลงชื่อปฏิบัติงานหรือมีบัตรประจำตัว	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการลงชื่อปฏิบัติงาน	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.6 การป้องกันอัคคีภัย** - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า	- อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
- จุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำไว้ในพื้นที่โครงการในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้	-
- ถังดับเพลิงเคมี บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		-
4.7 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - สภาพรั้วที่ดี	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการหมั่นสอบรั้วรอบโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การบดบังทัศนียภาพจากโครงการและการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร	
- การประชาสัมพันธ์การบดบังทัศนียภาพจากโครงการและการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง		-
- คุณภาพของดิน	- บริเวณที่จัดเป็นพื้นที่สีเขียว	- ก่อนจัดพื้นที่สวนของโครงการ		-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.8 การเปลี่ยนแปลงของลม** - การประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงของลมจากโครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเข้าพบปะประชาสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงอยู่เสมอ	-
4.9 การบดบังแสงอาทิตย์ - การประชาสัมพันธ์ การบดบังแสงแดดจากโครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเข้าพบปะประชาสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงอยู่เสมอ	-

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

(1) ปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP)

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) และบริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2569 ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน มาตรฐาน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดัง **ตารางที่ 4.1-1** และ **ตารางที่ 4.1-2**

(2) ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) และบริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2569 ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับมาตรฐาน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดัง **ตารางที่ 4.1-1** และ **ตารางที่ 4.1-2**

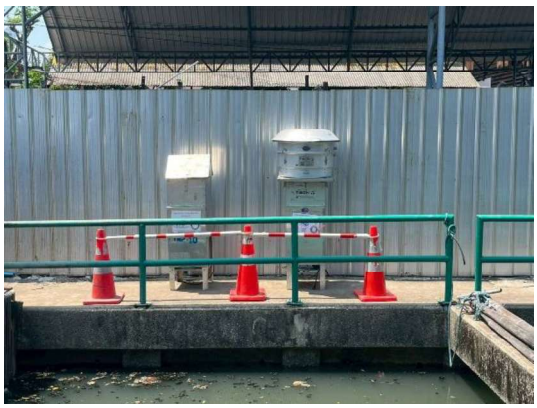	
บริเวณพื้นที่โครงการ	บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ	

ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
01-02/01/2569	*	*
02-03/01/2569	*	*
03-04/01/2569	*	*
04-05/01/2569	*	*
05-06/01/2569	0.0522	0.0258
06-07/01/2569	0.0503	0.0250
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 01 - 04 มกราคม พ.ศ.2569 เนื่องจากเป็นวันหยุดปีใหม่

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
07-08/01/2569	0.0570	0.0282
08-09/01/2569	0.0494	0.0234
09-10/01/2569	0.0530	0.0262
10-11/01/2569	0.0518	0.0253
11-12/01/2569	0.0564	0.0272
12-13/01/2569	0.0524	0.0261
13-14/01/2569	0.0488	0.0242
14-15/01/2569	0.0543	0.0265
15-16/01/2569	0.0592	0.0301
16-17/01/2569	0.0530	0.0266
17-18/01/2569	0.0523	0.0263
18-19/01/2569	0.0518	0.0268
19-20/01/2569	0.0494	0.0242
20-21/01/2569	0.0469	0.0238
21-22/01/2569	0.0556	0.0276
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
22-23/01/2569	52.9572	26.1295
23-24/01/2569	55.3146	27.2557
24-25/01/2569	53.6553	26.4786
25-26/01/2569	53.1060	26.2016
26-27/01/2569	56.3481	27.0770
27-28/01/2569	59.8659	28.8747
28-29/01/2569	58.5422	28.7226
29-30/01/2569	56.6841	27.0663
30-31/01/2569	57.7443	27.2765
31/01/-01/02/2569	58.3764	28.4102
01-02/02/2569	74.1501	36.8506
02-03/02/2569	72.4166	35.1508
03-04/02/2569	68.3107	33.7838
04-05/02/2569	82.9763	41.0393
05-06/02/2569	78.1971	38.9585
06-07/02/2569	68.1126	33.8829
07-08/02/2569	62.3319	30.5177
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
08-09/02/2569	86.4669	42.6350
09-10/02/2569	67.3483	31.5269
10-11/02/2569	71.0085	33.9584
11-12/02/2569	53.4822	29.9180
12-13/02/2569	54.4612	25.1977
13-14/02/2569	58.6274	30.7693
14-15/02/2569	60.4869	29.7199
15-16/02/2569	55.0930	28.2012
16-17/02/2569	64.1073	34.6472
17-18/02/2569	60.4364	31.2688
18-19/02/2569	57.9936	27.6754
19-20/02/2569	59.1534	26.2059
20-21/02/2569	57.1765	28.8417
21-22/02/2569	56.4669	25.5976
22-23/02/2569	52.5583	24.9826
23-24/02/2569	56.6196	26.5530
24-25/02/2569	56.1985	27.8250
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
25-26/02/2569	55.9337	27.3665
26-27/02/2569	54.5328	27.4665
27-28/02/2569	61.1868	29.4177
28/02-01/03/2569	74.8990	37.1523
01-02/03/2569	53.8548	25.4314
02-03/03/2569	66.8267	31.9278
03-04/03/2569	*	*
04-05/03/2569	64.7540	30.0337
05-06/03/2569	70.8361	33.7802
06-07/03/2569	75.4382	36.6615
07-08/03/2569	73.7143	34.4573
08-09/03/2569	66.2713	32.2131
09-10/03/2569	74.5227	35.8719
10-11/03/2569	83.5292	40.3827
11-12/03/2569	59.2946	29.6981
12-13/03/2569	69.4650	34.8842
13-14/03/2569	80.5439	39.7904
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
14-15/03/2569	73.2441	36.1718
15-16/03/2569	66.4018	32.5420
16-17/03/2569	65.0747	32.0321
17-18/03/2569	61.5380	30.0617
18-19/03/2569	69.6686	35.4445
19-20/03/2569	80.2460	40.8349
20-21/03/2569	80.7371	40.9243
21-22/03/2569	77.9970	39.1736
22-23/03/2569	78.2122	39.6890
23-24/03/2569	73.3633	35.4062
24-25/03/2569	68.3281	34.3432
25-26/03/2569	81.9938	41.9182
26-27/03/2569	83.9570	41.9019
27-28/03/2569	73.4111	36.9835
28-29/03/2569	67.6908	33.8204
29-30/03/2569	71.0255	35.0861
30-31/03/2569	68.4481	34.0715
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
31/03-01/04/2569	59.9779	30.2156
01-02/04/2569	81.2927	40.1370
02-03/04/2569	76.4320	38.4957
03-04/04/2569	78.6684	39.3342
06-07/04/2569	67.8130	33.7308
07-08/04/2569	69.5698	34.4838
08-09/04/2569	69.1683	34.3332
27-28/05/2569	79.0566	40.0052
28-29/05/2569	77.7516	37.5958
29-30/05/2569	75.8944	38.8005
05-06/06/2569	57.8358	27.2289
06-07/06/2569	69.5565	35.1621
07-08/06/2569	64.8751	32.8614
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-2 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)

พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
06-07/01/2569	0.0279	0.0133
07-08/01/2569	0.0291	0.0140
08-09/01/2569	0.0242	0.0119
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)

พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
03-04/02/2569	37.1981	18.7997
04-05/02/2569	31.5700	16.0438
05-06/02/2569	36.5729	18.1715
13-14/03/2569	38.3731	18.5111
14-15/03/2569	30.2172	14.3557
15-16/03/2569	34.5841	16.7148
06-07/04/2569	31.2211	15.4098
07-08/04/2569	32.2752	16.4137
08-09/04/2569	33.5301	16.6144
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)

พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
27-28/05/2569	63.4461	32.4258
28-29/05/2569	65.8554	32.8273
29-30/05/2569	72.1800	35.7888
05-06/06/2569	61.8333	31.1660
06-07/06/2569	66.2713	33.6094
07-08/06/2569	59.3400	28.1740
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

(3) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4.1-3**

ตารางที่ 4.1-3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	**วันที่ตรวจวัด**	**ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)**
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	06-07/01/2569	0.0238
	07-08/01/2569	0.0238
	08-09/01/2569	0.0236
มาตรฐาน		**0.17**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	03-04/02/2569	23.1
	04-05/02/2569	23.7
	05-06/02/2569	23.5
	10-11/03/2569	25.3
	11-12/03/2569	25.0
	12-13/03/2569	25.6
	06-07/04/2569	24.6
	07-08/04/2569	25.1
	08-09/04/2569	25.0
	27-28/05/2569	24.0
	28-29/05/2569	24.8
	29-30/05/2569	24.2
	05-06/06/2569	18.6
	06-07/06/2569	18.0
	07-08/06/2569	18.2
มาตรฐาน		**≤ 120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

(4) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4.1-4**

ตารางที่ 4.1-4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	06-07/01/2569	0.0028	0.0035
	07-08/01/2569	0.0027	0.0036
	08-09/01/2569	0.0028	0.0037
มาตรฐาน		**0.12**[(1)]	**0.30**[(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.1-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	03-04/02/2569	2.7	3.3
	04-05/02/2569	2.6	3.6
	05-06/02/2569	2.5	3.4
	10-11/03/2569	2.4	3.2
	11-12/03/2569	2.2	3.4
	12-13/03/2569	2.3	3.4
	06-07/04/2569	2.5	3.3
	07-08/04/2569	2.4	3.5
	08-09/04/2569	2.3	3.4
มาตรฐาน		**≤ 50**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.1-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	27-28/05/2569	2.0	3.4
	28-29/05/2569	2.1	3.5
	29-30/05/2569	2.2	3.5
	05-06/06/2569	2.2	3.5
	06-07/06/2569	2.3	3.4
	07-08/06/2569	2.1	3.3
มาตรฐาน		**≤ 50**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

(5) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4.1-5**

ตารางที่ 4.1-5 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	06-07/01/2569	3.0850	3.2781
	07-08/01/2569	3.0595	3.3017
	08-09/01/2569	3.1088	3.3015
มาตรฐาน		**9**	**30**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.1-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	03-04/02/2569	3.15	3.36
	04-05/02/2569	3.17	3.40
	05-06/02/2569	3.16	3.31
	10-11/03/2569	2.93	3.13
	11-12/03/2569	3.02	3.24
	12-13/03/2569	3.07	3.36
	06-07/04/2569	3.02	3.13
	07-08/04/2569	3.08	3.24
	08-09/04/2569	3.07	3.30
	27-28/05/2569	3.05	3.24
	28-29/05/2569	3.09	3.24
	29-30/05/2569	3.07	3.26
	05-06/06/2569	2.91	3.36
	06-07/06/2569	2.98	3.30
	07-08/06/2569	2.92	3.30
มาตรฐาน		**≤ 9**	**≤ 30**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569


(6) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4.1-6**


ตารางที่ 4.1-6 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด THC (หน่วย ppm)
พื้นที่โครงการ	07/01/2569	2.071
	08/01/2569	2.082
	09/01/2569	2.067
	03/02/2569	2.106
	04/02/2569	1.990
	05/02/2569	2.117
	10/03/2569	2.033
	11/03/2569	1.986
	12/03/2569	2.093
	06/04/2569	2.100
	07/04/2569	2.059
	08/04/2569	1.953
	27/05/2569	2.191
	28/05/2569	2.172
	29/05/2569	2.148
	05/06/2569	2.067
	06/06/2569	2.015
	07/06/2569	2.083
มาตรฐาน		-


หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

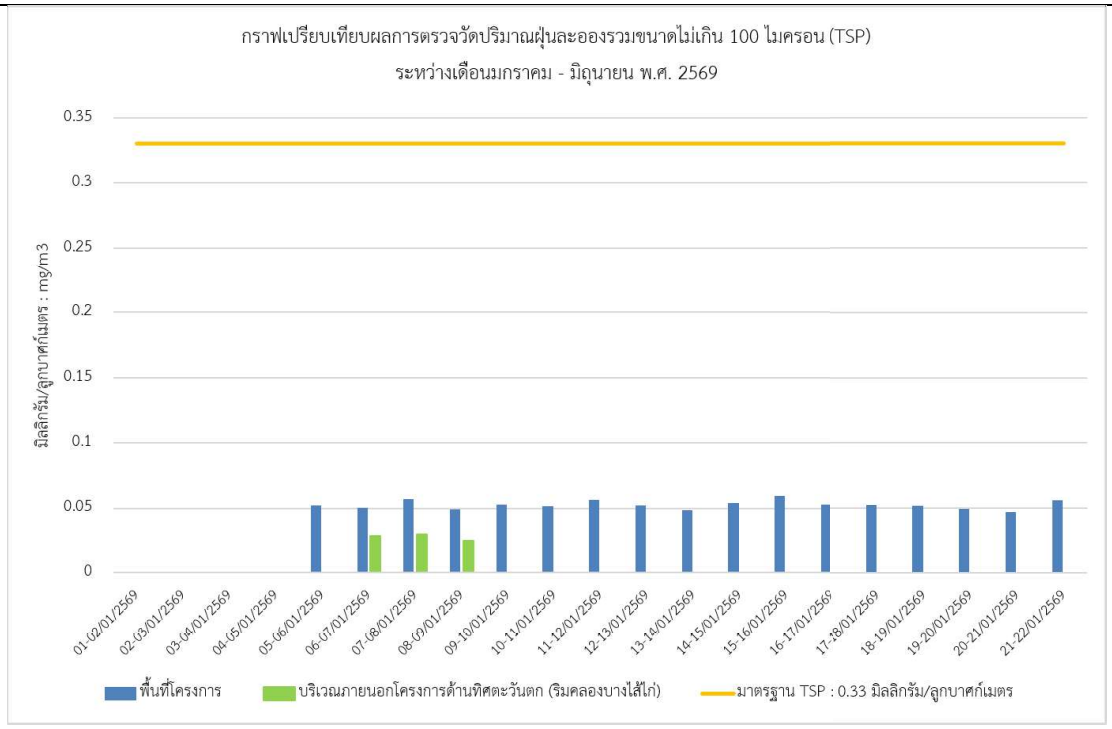


รูปที่ 4-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

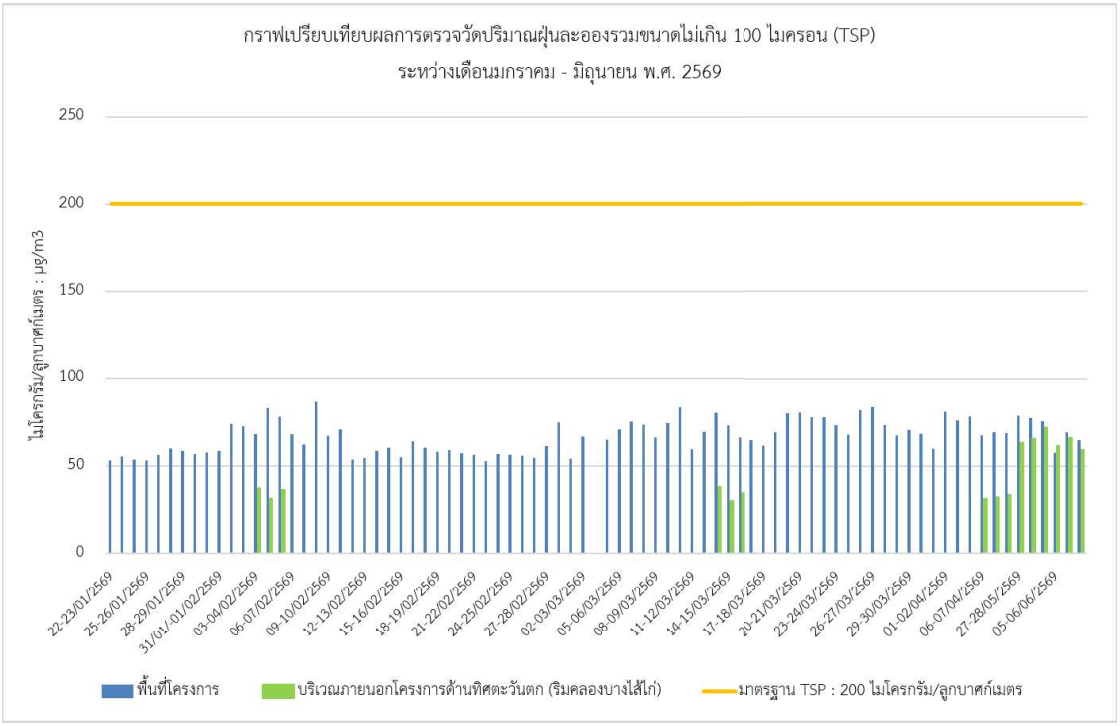


รูปที่ 4-1 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

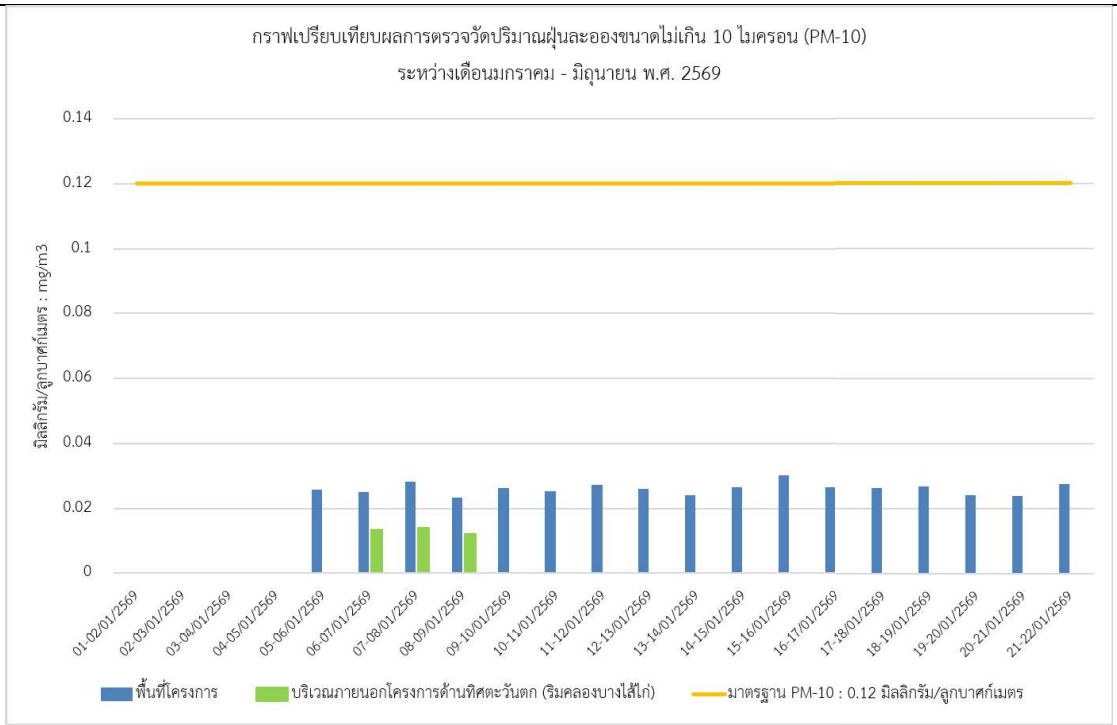


รูปที่ 4-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

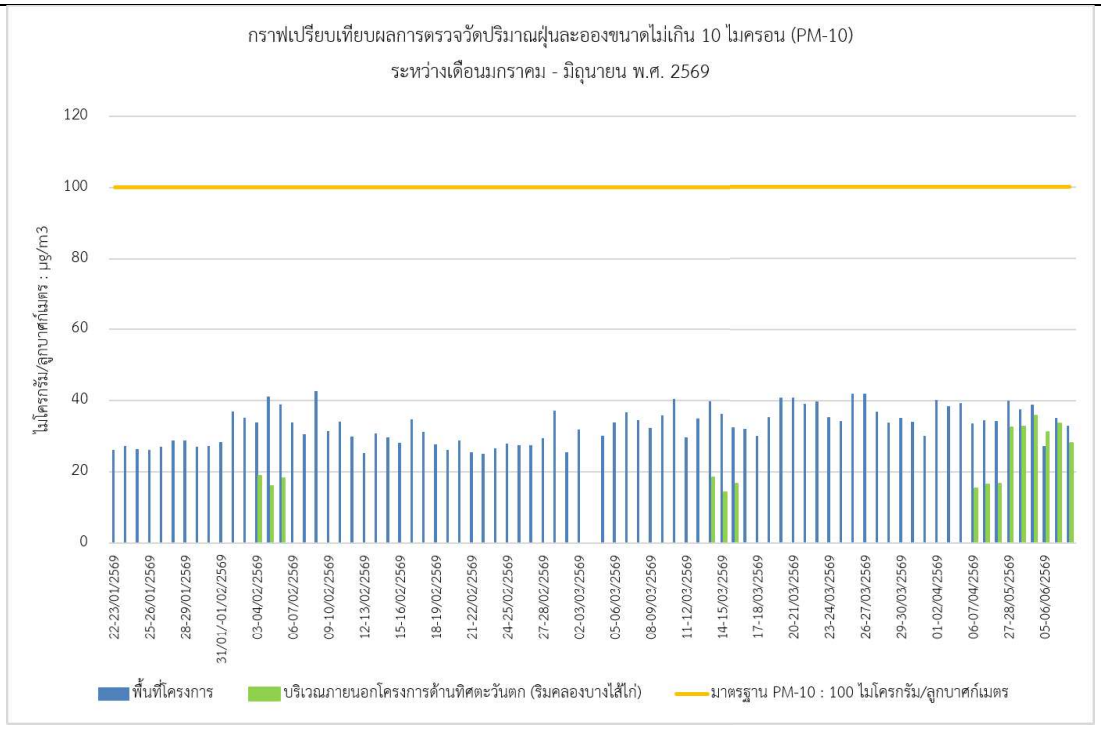


รูปที่ 4-2 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

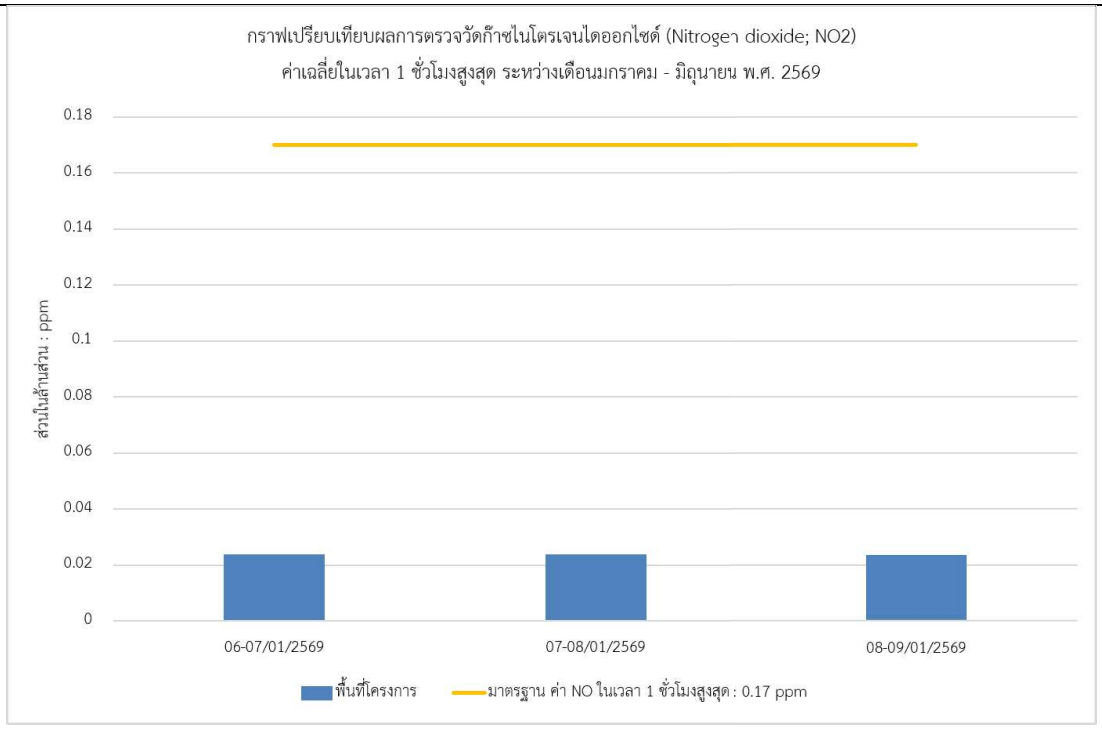


รูปที่ 4-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด

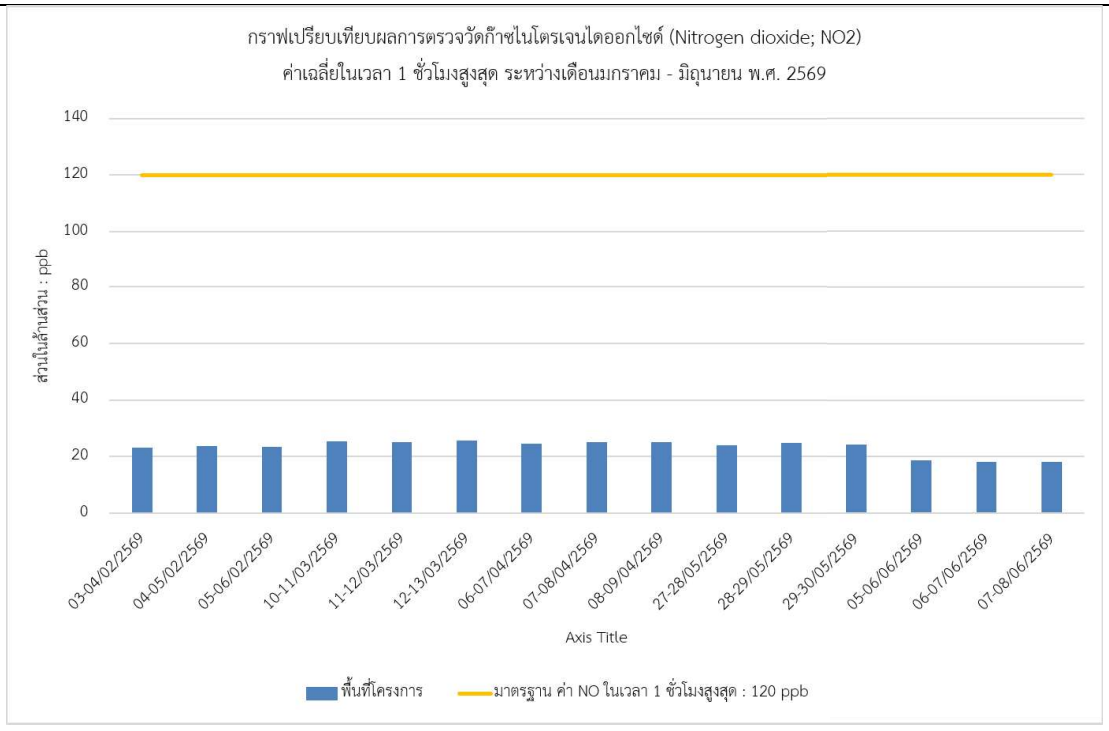


รูปที่ 4-3 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด

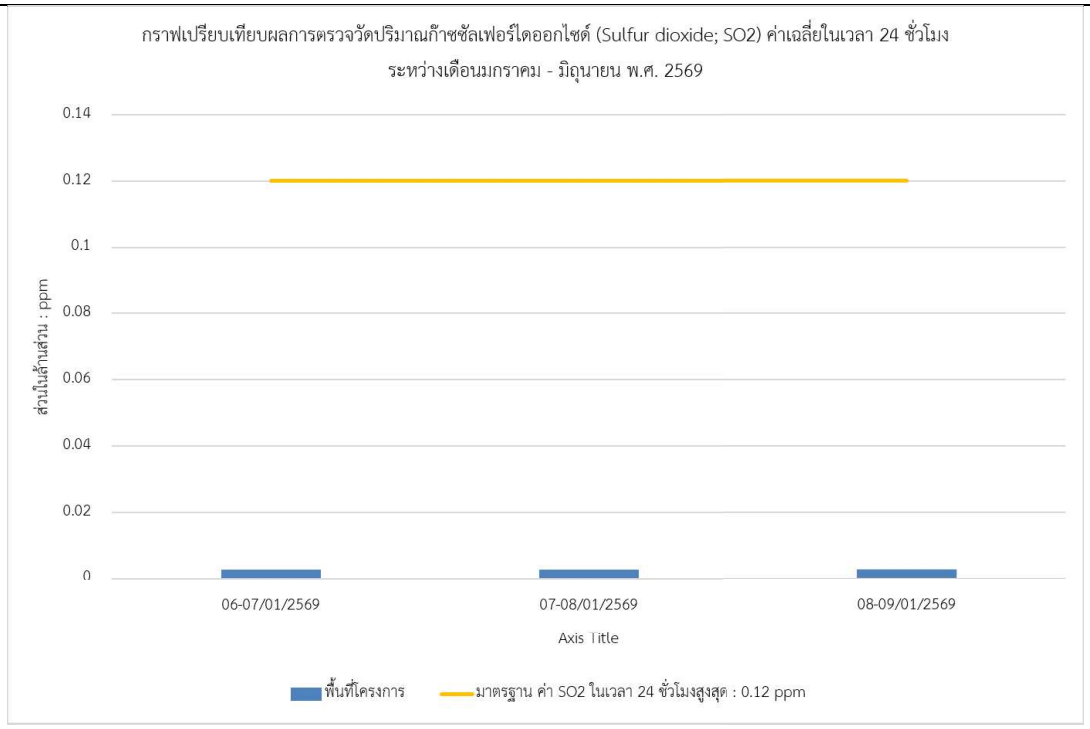


รูปที่ 4-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 24 ชั่วโมงสูงสุด

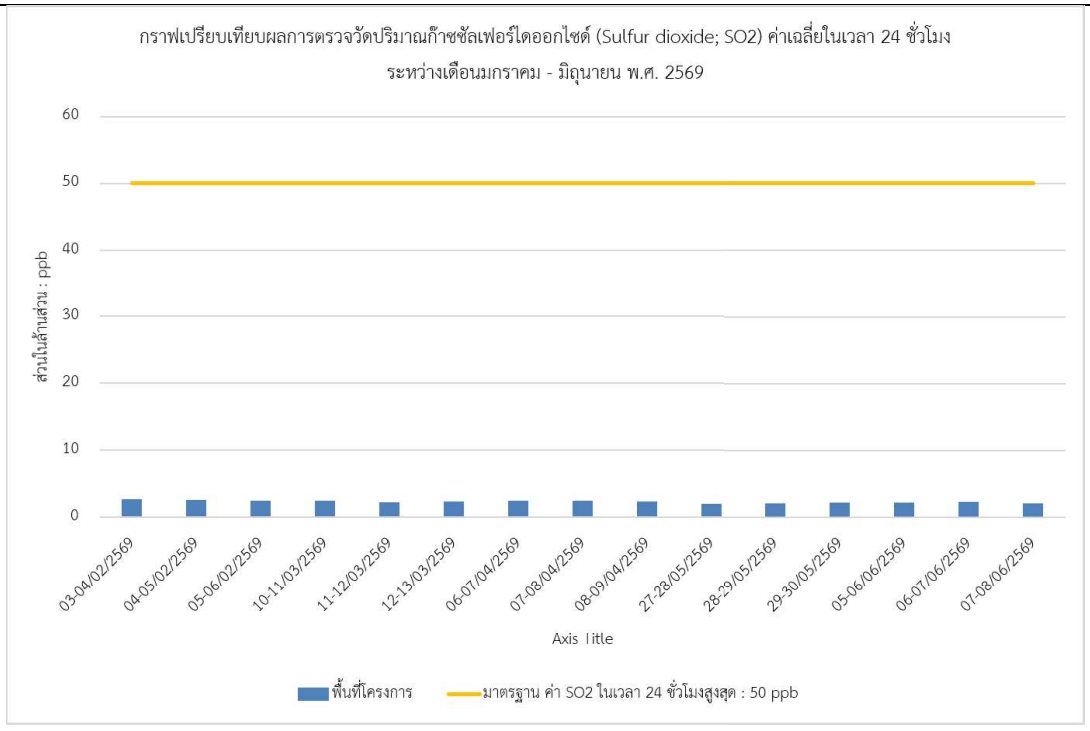


รูปที่ 4-4 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 24 ชั่วโมงสูงสุด

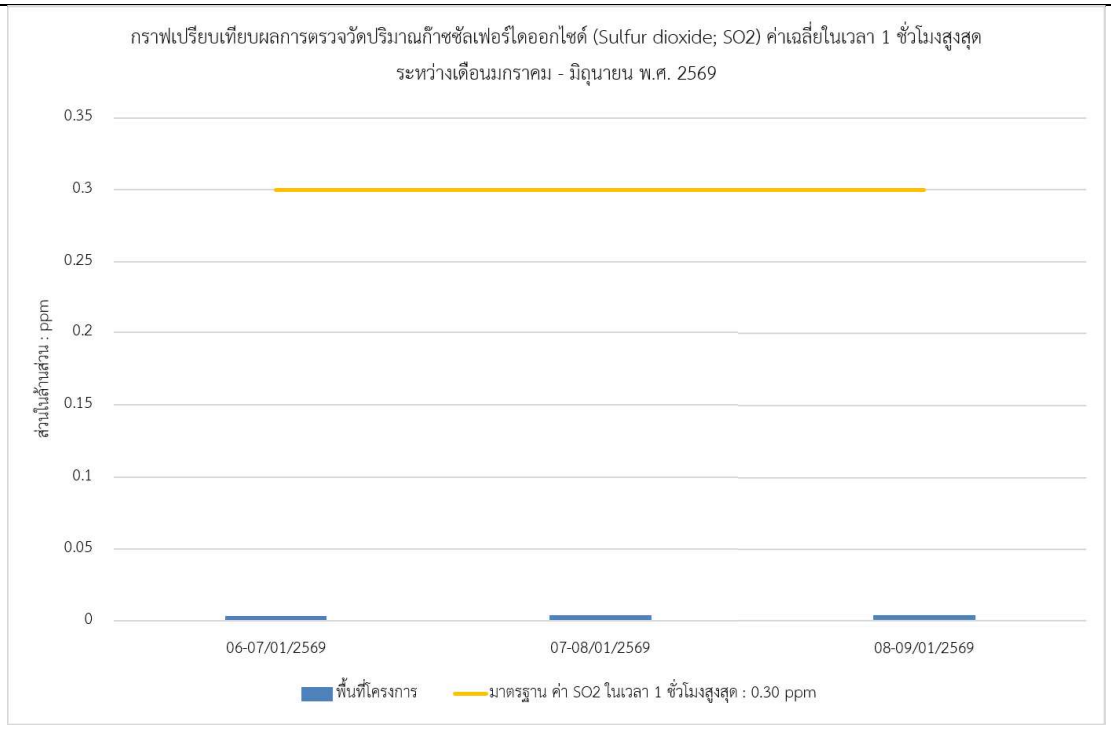


รูปที่ 4-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด

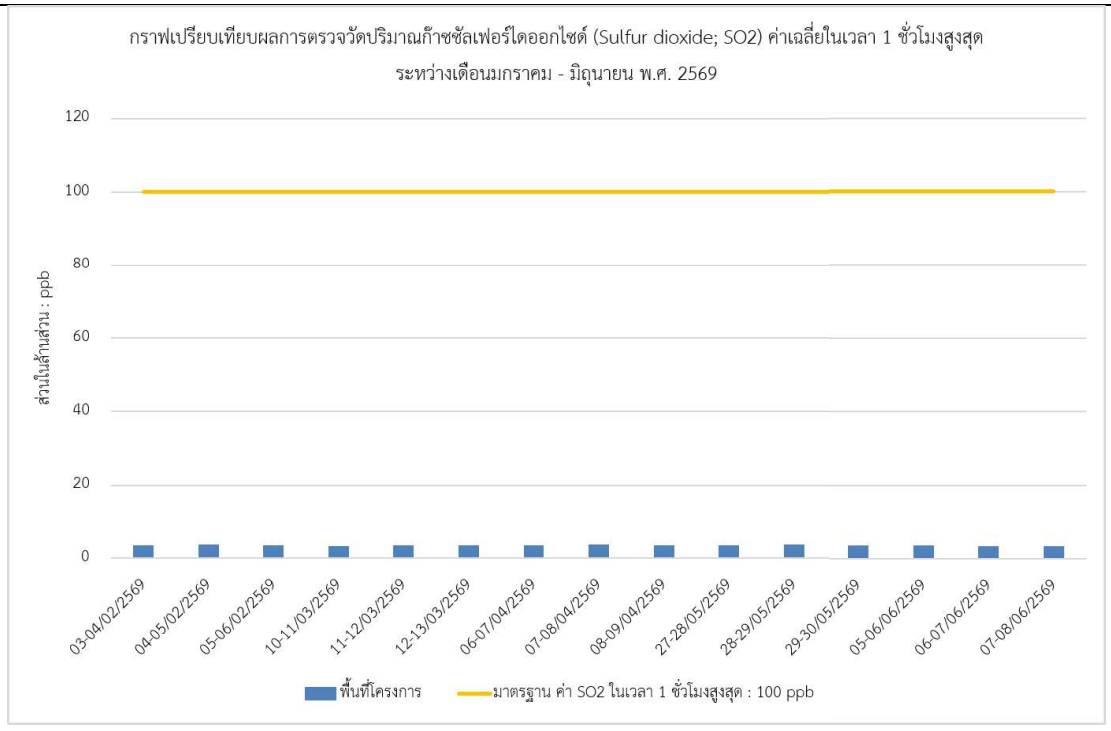


รูปที่ 4-5 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด

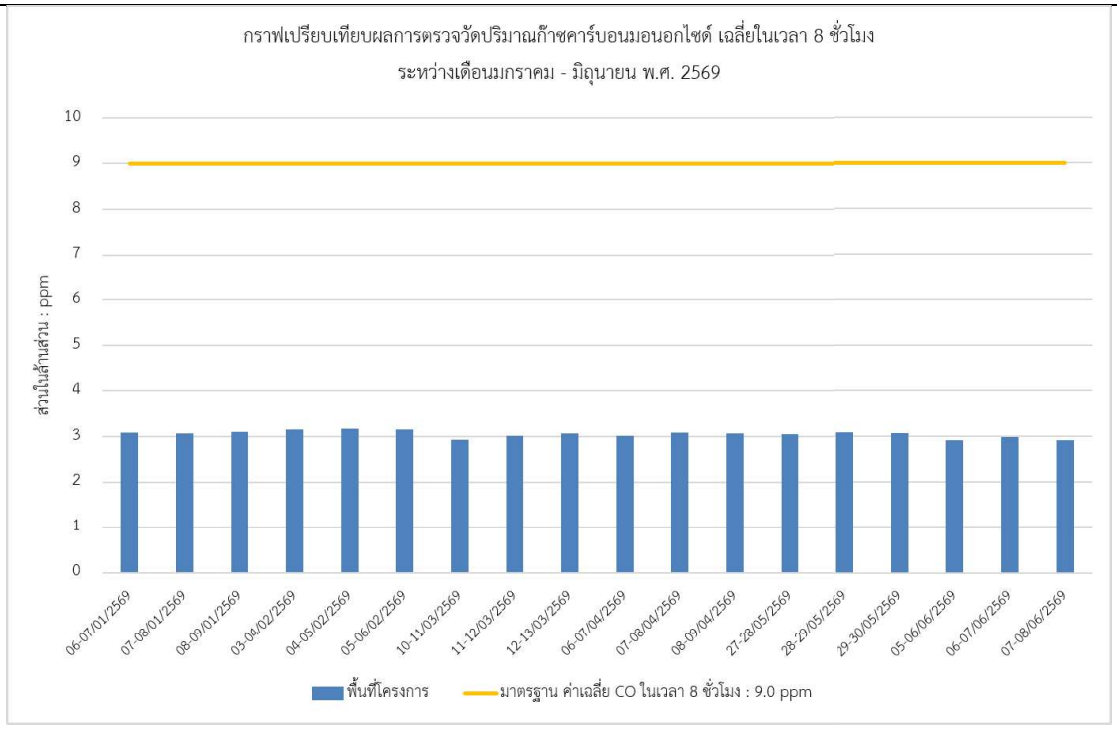

รูปที่ 4-6 กราฟแสดงผลดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ในเวลา 8 ชั่วโมงสูงสุด

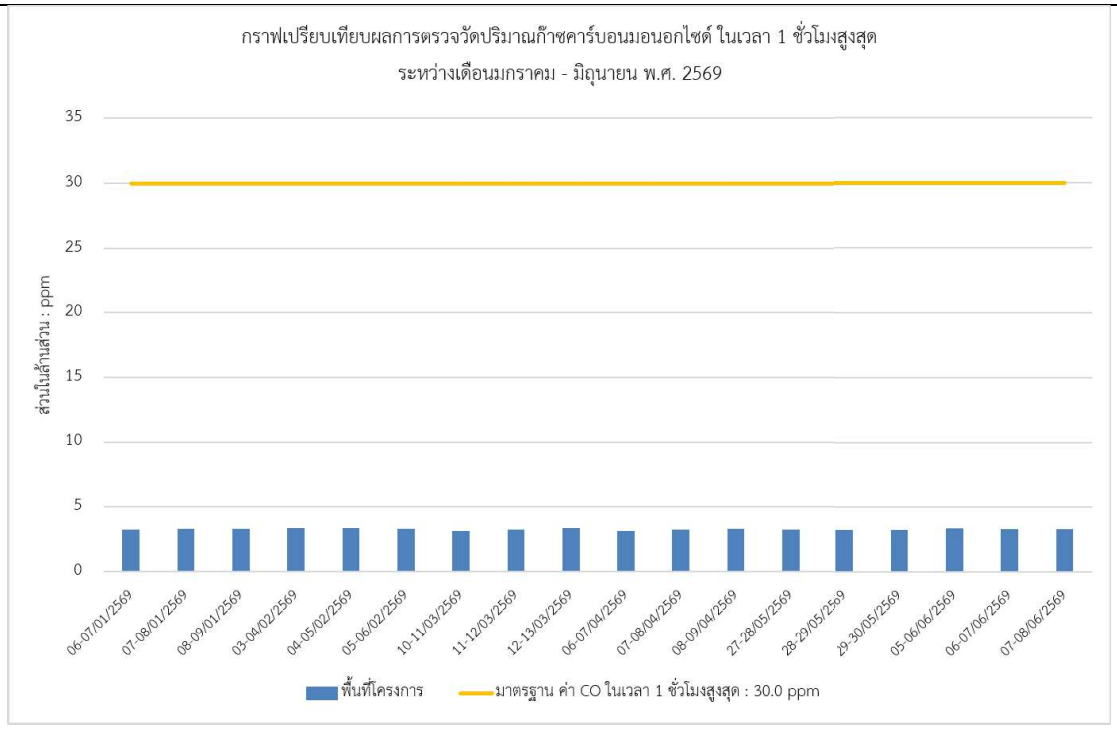

รูปที่ 4-7 กราฟแสดงผลดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด

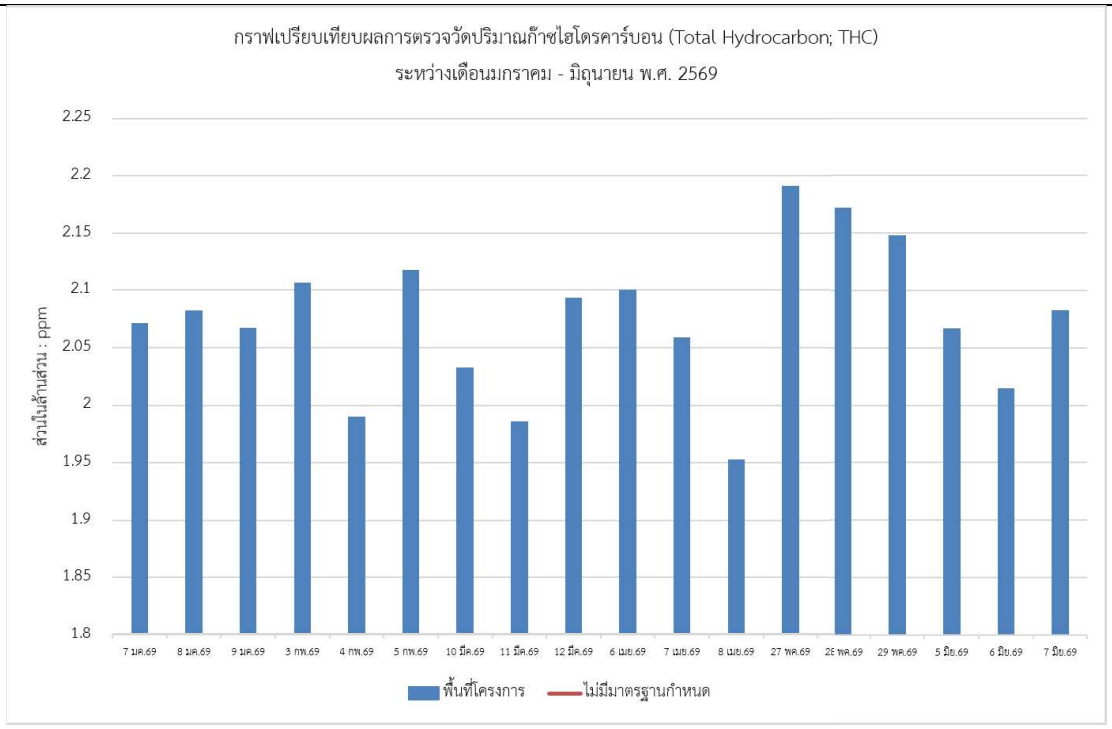

รูปที่ 4-8 กราฟแสดงผลดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

4.2 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direction)

ดำเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction) ของโครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4.2-1** และผังการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม **รูปภาพที่ 4.2-1**



ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direction)

ตารางที่ 4.2-1 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direction) บริเวณภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก


Interval Time	06-07/04/2569		07-08/04/2569		08-09/04/2569	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
10.00 น.-11.00 น.	2.3	WSW	2.6	WSW	1.8	WSW
11.00 น.-12.00 น.	2.0	WSW	2.4	WSW	1.4	SW
12.00 น.-13.00 น.	2.0	W	2.0	W	1.5	SW
13.00 น.-14.00 น.	2.4	WSW	2.1	W	1.2	SW
14.00 น.-15.00 น.	1.8	WSW	2.2	SW	1.3	WSW
15.00 น.-16.00 น.	2.2	SSW	2.2	SW	1.5	W
16.00 น.-17.00 น.	1.7	SSW	2.0	SW	2.0	WNW
17.00 น.-18.00 น.	1.8	SSW	1.8	W	1.6	NW
18.00 น.-19.00 น.	1.9	WSW	1.7	NW	1.8	NW
19.00 น.-20.00 น.	1.5	WSW	1.5	NW	1.7	W
20.00 น.-21.00 น.	1.2	WSW	2.4	W	2.0	SW
21.00 น.-22.00 น.	1.0	WSW	2.0	WSW	2.1	NW
22.00 น.-23.00 น.	0.8	WSW	2.1	SW	2.2	WNW
23.00 น.-00.00 น.	1.0	WSW	1.5	SW	2.3	WSW
00.00 น.-01.00 น.	1.2	W	0.8	SW	1.4	SW
01.00 น.-02.00 น.	1.6	W	1.9	WSW	2.0	SW
02.00 น.-03.00 น.	1.4	WSW	2.3	W	1.6	SW
03.00 น.-04.00 น.	1.5	WSW	1.3	W	1.8	SW
04.00 น.-05.00 น.	1.6	W	2.0	WSW	2.0	WSW
05.00 น.-06.00 น.	2.0	NW	1.1	W	2.1	W
06.00 น.-07.00 น.	1.6	NW	2.3	WNW	2.3	WSW
07.00 น.-08.00 น.	1.7	W	2.2	WNW	2.0	NW
08.00 น.-09.00 น.	2.1	WNW	2.4	W	1.8	NW
09.00 น.-10.00 น.	2.2	W	2.0	W	1.6	W

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direction) บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก


Interval Time	27-28/05/2569		28-29/05/2569		29-30/05/2569	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
10.00 น.-11.00 น.	1.6	SW	1.0	W	0.7	SSW
11.00 น.-12.00 น.	1.8	SW	2.2	WSW	1.1	SW
12.00 น.-13.00 น.	2.0	W	0.7	WNW	0.9	SW
13.00 น.-14.00 น.	0.6	SW	1.3	W	0.7	SW
14.00 น.-15.00 น.	1.1	SW	1.2	SW	0.5	WSW
15.00 น.-16.00 น.	1.6	WNW	1.8	SW	0.6	W
16.00 น.-17.00 น.	0.7	SSW	0.4	SW	1.3	NW
17.00 น.-18.00 น.	2.1	SW	1.8	WNW	1.1	NW
18.00 น.-19.00 น.	1.3	SW	2.3	W	1.2	NW
19.00 น.-20.00 น.	1.2	SW	1.7	NW	1.0	W
20.00 น.-21.00 น.	1.9	SSW	1.1	WNW	1.6	SW
21.00 น.-22.00 น.	1.1	SW	1.2	SW	2.4	WNW
22.00 น.-23.00 น.	2.3	SW	1.3	SW	2.0	SSW
23.00 น.-00.00 น.	0.8	SSW	1.0	SW	1.5	SW
00.00 น.-01.00 น.	1.6	SW	1.3	SW	1.3	SSW
01.00 น.-02.00 น.	1.1	SW	1.2	WSW	1.1	SSW
02.00 น.-03.00 น.	1.5	W	1.6	WSW	0.8	SW
03.00 น.-04.00 น.	2.0	SW	1.1	SW	1.2	SW
04.00 น.-05.00 น.	1.6	SSW	1.5	SSW	0.6	W
05.00 น.-06.00 น.	1.2	W	2.0	W	0.7	WSW
06.00 น.-07.00 น.	0.8	SW	0.5	W	1.7	SW
07.00 น.-08.00 น.	1.1	SW	0.6	W	1.5	SW
08.00 น.-09.00 น.	1.6	WSW	0.8	SW	1.6	SW
09.00 น.-10.00 น.	1.2	W	1.2	SW	1.4	SW

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direction) บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก


Interval Time	05-06/06/2569		06-07/06/2569		07-08/06/2569	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
16.00 น.-17.00 น.	0.7	S	1.0	S	0.7	SE
17.00 น.-18.00 น.	0.5	S	2.2	S	1.1	S
18.00 น.-19.00 น.	1.6	SSE	0.7	SSE	1.5	SE
19.00 น.-20.00 น.	1.8	SE	1.3	SE	1.2	SSE
20.00 น.-21.00 น.	2.3	S	1.2	SSE	0.5	S
21.00 น.-22.00 น.	1.6	SSE	1.8	WNW	0.6	WSW
22.00 น.-23.00 น.	0.7	S	0.4	WSW	1.3	S
23.00 น.-00.00 น.	0.4	SW	1.8	SSW	1.1	NW
00.00 น.-01.00 น.	0.8	SW	2.3	SSE	1.2	SSE
01.00 น.-02.00 น.	1.3	SW	2.1	WSW	2.0	SE
02.00 น.-03.00 น.	1.9	S	1.4	S	1.6	SE
03.00 น.-04.00 น.	1.1	SSW	2.0	SW	2.4	WSW
04.00 น.-05.00 น.	2.3	S	1.3	SE	2.0	WNW
05.00 น.-06.00 น.	0.7	S	1.0	SE	1.5	SW
06.00 น.-07.00 น.	0.8	SSE	1.3	SSE	1.3	S
07.00 น.-08.00 น.	1.1	SW	1.2	S	1.1	SSE
08.00 น.-09.00 น.	1.5	SW	1.6	NW	0.8	S
09.00 น.-10.00 น.	2.0	SW	1.1	SSE	1.2	W
10.00 น.-11.00 น.	1.6	W	1.5	SW	0.6	WSW
11.00 น.-12.00 น.	1.2	W	2.0	WSW	0.7	WSW
12.00 น.-13.00 น.	0.8	NW	0.5	W	1.7	SE
13.00 น.-14.00 น.	0.6	W	0.6	WSW	1.5	SSE
14.00 น.-15.00 น.	0.7	W	0.8	SSW	1.6	S
15.00 น.-16.00 น.	1.2	SSE	1.2	SSE	1.4	S

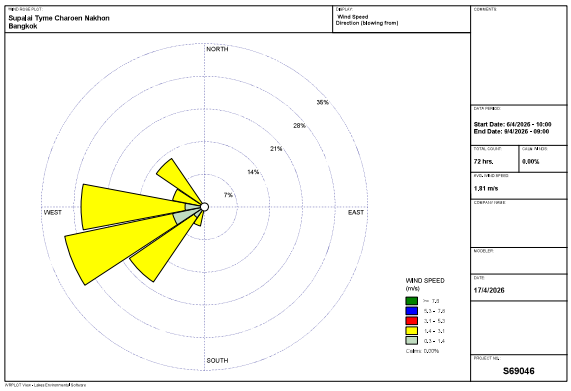

ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกเดือนเมษายน พ.ศ. 2569

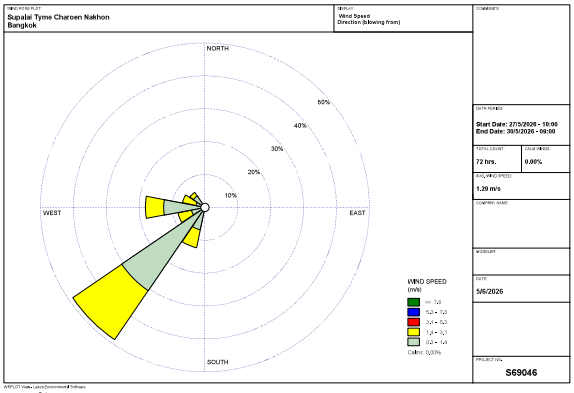

ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

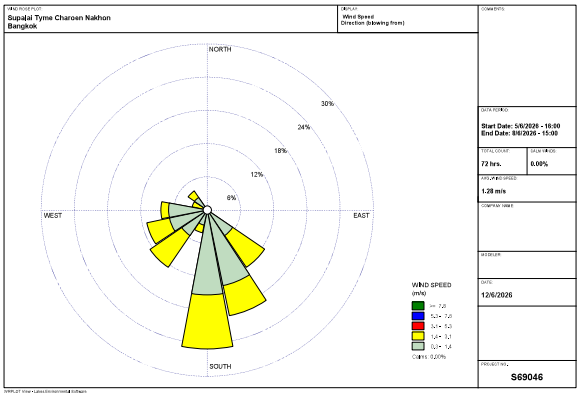

ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

รูปภาพที่ 4.2-1 ผังแสดงการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direct)

4.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร และบริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้เท่ากับ 70.0 (dB(A)) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 115.0 (dB(A)) ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ที่กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้เท่ากับ 10 (dB(A)) รายละเอียดแสดงดัง **ตารางที่ 4.3-1** และ **ตารางที่ 4.3-2**

	
บริเวณพื้นที่โครงการ	บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง	

ตารางที่ 4.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/01/2569	*	*	*
02-03/01/2569	*	*	*
03-04/01/2569	*	*	*
04-05/01/2569	*	*	*
05-06/01/2569	69.1	108.6	9.5
06-07/01/2569	69.0	102.2	9.7
07-08/01/2569	68.9	96.0	9.4
08-09/01/2569	69.0	95.3	9.4
09-10/01/2569	69.3	105.4	9.4
10-11/01/2569	68.6	105.4	9.6
11-12/01/2569	67.8	95.3	8.9
12-13/01/2569	68.9	96.0	8.9
13-14/01/2569	69.2	104.3	9.6
14-15/01/2569	69.6	102.4	9.1
15-16/01/2569	69.5	112.3	9.3
16-17/01/2568	69.0	110.4	9.7
17-18/01/2568	68.6	103.5	8.9
18-19/01/2568	69.5	97.3	9.5
19-20/01/2568	69.4	99.6	9.4
20-21/01/2568	69.7	113.6	9.6
21-22/01/2568	69.5	110.8	10.0
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 01 - 04 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นวันหยุดปีใหม่

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
22-23/01/2568	68.5	112.4	9.6
23-24/01/2568	68.7	105.6	9.5
24-25/01/2568	67.8	105.7	9.5
25-26/01/2568	67.9	104.5	9.7
26-27/01/2568	69.2	110.6	9.8
27-28/01/2568	69.4	114.2	9.9
28-29/01/2568	69.4	113.8	9.7
29-30/01/2568	69.1	106.0	9.6
30-31/01/2568	69.0	97.6	9.4
31/01-01/02/2569	68.8	105.3	9.4
01-02/02/2569	68.5	100.3	8.8
02-03/02/2569	69.1	113.5	9.6
03-04/02/2569	68.9	102.3	9.8
04-05/02/2569	68.8	110.6	9.5
05-06/02/2569	68.6	106.4	9.6
06-07/02/2569	68.7	112.4	9.9
07-08/02/2569	68.4	105.7	8.4
08-09/02/2569	68.1	100.5	9.4
09-10/02/2569	68.0	102.3	9.0
10-11/02/2569	67.8	98.5	9.8
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
11-12/02/2569	68.0	97.1	9.6
12-13/02/2569	67.8	95.2	9.4
13-14/02/2569	68.0	110.8	8.7
14-15/02/2569	68.3	97.2	9.5
15-16/02/2569	69.1	104.3	9.5
16-17/02/2569	69.0	102.3	9.3
17-18/02/2569	68.1	102.3	9.5
18-19/02/2569	68.9	96.3	9.5
19-20/02/2569	68.8	100.6	9.7
20-21/02/2569	69.0	110.4	9.5
21-22/02/2569	68.2	98.0	9.2
22-23/02/2569	68.6	95.3	9.5
23-24/02/2569	68.1	107.3	9.4
24-25/02/2569	68.5	101.2	9.3
25-26/02/2569	68.4	98.6	9.8
26-27/02/2569	68.7	99.8	9.2
27-28/02/2569	69.0	103.8	9.5
28/02-01/03/2569	68.5	105.0	9.6
01-02/03/2569	67.9	105.5	7.6
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
02-03/03/2569	67.6	108.1	8.7
03-04/03/2569	*	*	*
04-05/03/2569	68.9	110.0	9.3
05-06/03/2569	68.9	102.1	9.8
06-07/03/2569	67.2	96.8	9.2
07-08/03/2569	67.8	97.8	9.1
08-09/03/2569	66.7	99.1	8.7
09-10/03/2569	67.2	100.8	9.2
10-11/03/2569	67.9	100.1	8.8
11-12/03/2569	69.1	112.4	9.3
12-13/03/2569	68.8	113.2	9.5
13-14/03/2569	68.0	95.7	9.7
14-15/03/2569	67.5	96.3	8.9
15-16/03/2569	67.4	93.6	9.8
16-17/03/2569	68.4	105.0	9.6
17-18/03/2569	68.2	95.8	9.0
18-19/03/2569	68.3	94.2	9.9
19-20/03/2569	68.1	103.3	9.7
20-21/03/2569	68.5	94.5	9.7
21-22/03/2569	67.4	98.2	9.0
22-23/03/2569	68.3	101.3	9.2
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
23-24/03/2569	68.6	103.2	9.4
24-25/03/2569	67.8	94.9	8.5
25-26/03/2569	68.1	97.7	9.2
26-27/03/2569	67.8	102.8	9.4
27-28/03/2569	67.6	101.4	9.6
28-29/03/2569	68.2	102.4	8.7
29-30/03/2569	67.8	99.6	9.4
30-31/03/2569	68.4	96.6	8.8
31/03-01/04/2569	67.3	106.2	9.9
01-02/04/2569	68.6	94.1	8.3
02-03/04/2569	67.9	100.8	9.4
03-04/04/2569	67.7	101.3	9.2
06-07/04/2569	68.2	102.3	7.1
16-17/04/2569	68.6	103.0	6.7
20-21/04/2569	68.3	102.8	7.2
27-28/04/2569	68.7	101.4	6.8
07-08/05/2569	67.1	103.5	8.0
14-15/05/2569	67.9	100.6	7.8
21-22/05/2569	67.6	101.7	6.7
26-27/05/2569	67.0	102.8	8.4
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
05-06/06/2569	67.9	97.4	7.3
08-09/06/2569	69.3	98.8	7.7
15-16/06/2569	68.1	100.1	6.7
23-24/06/2569	69.3	98.8	7.8
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/01/2569	*	*	*
02-03/01/2569	*	*	*
03-04/01/2569	*	*	*
04-05/01/2569	*	*	*
05-06/01/2569	62.3	90.5	7.0
06-07/01/2569	62.5	97.8	7.7
07-08/01/2569	62.9	101.2	5.4
08-09/01/2569	63.3	91.3	7.3
09-10/01/2569	63.7	94.7	6.5
10-11/01/2569	62.2	92.6	6.3
11-12/01/2569	61.3	90.6	4.7
12-13/01/2569	64.1	95.3	5.5
13-14/01/2569	64.0	95.6	5.0
14-15/01/2569	64.8	97.0	6.1
15-16/01/2569	65.4	93.2	6.3
16-17/01/2568	66.7	102.3	6.2
17-18/01/2568	65.8	101.5	6.0
18-19/01/2568	64.0	103.7	5.0
19-20/01/2568	66.1	96.3	5.3
20-21/01/2568	66.2	100.4	5.3
21-22/01/2568	66.3	96.3	5.8
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 01 - 04 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นวันหยุดปีใหม่

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
22-23/01/2568	64.0	99.6	6.0
23-24/01/2568	63.9	97.9	6.3
24-25/01/2568	62.7	94.5	4.9
25-26/01/2568	62.8	90.4	5.2
26-27/01/2568	63.4	93.6	5.3
27-28/01/2568	64.3	96.9	5.1
28-29/01/2568	64.2	97.3	6.0
29-30/01/2568	63.9	88.7	6.4
30-31/01/2568	63.7	88.7	6.4
31/01-01/02/2569	63.1	92.2	6.5
01-02/02/2569	62.4	89.6	5.5
02-03/02/2569	63.7	94.7	6.5
03-04/02/2569	63.9	99.5	6.8
04-05/02/2569	64.0	91.3	6.6
05-06/02/2569	64.7	93.6	5.6
06-07/02/2569	63.9	96.2	6.2
07-08/02/2569	64.5	96.2	6.1
08-09/02/2569	64.6	97.0	6.7
09-10/02/2569	64.1	97.4	7.2
10-11/02/2569	65.5	93.3	6.9
11-12/02/2569	65.0	93.1	7.6
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
12-13/02/2569	64.8	93.6	5.3
13-14/02/2569	65.0	96.7	6.4
14-15/02/2569	65.6	89.8	6.8
15-16/02/2569	64.2	88.0	5.3
16-17/02/2569	63.4	94.1	5.4
17-18/02/2569	64.7	92.3	5.5
18-19/02/2569	63.5	93.4	6.1
19-20/02/2569	64.9	94.5	6.4
20-21/02/2569	64.8	97.1	5.0
21-22/02/2569	64.9	96.1	5.4
22-23/02/2569	64.4	90.3	5.7
23-24/02/2569	63.9	97.4	6.9
24-25/02/2569	64.2	96.4	6.7
25-26/02/2569	64.5	94.4	5.7
26-27/02/2569	64.4	97.5	6.8
27-28/02/2569	64.7	89.0	5.2
28/02-01/03/2569	64.9	92.5	5.5
01-02/03/2569	64.6	87.3	7.5
02-03/03/2569	63.9	88.7	6.2
03-04/03/2569	*	*	*
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
04-05/03/2569	64.1	90.1	5.7
05-06/03/2569	64.2	86.1	4.3
06-07/03/2569	63.3	86.3	6.9
07-08/03/2569	63.4	84.5	7.1
08-09/03/2569	63.2	87.1	5.8
09-10/03/2569	64.7	86.9	5.9
10-11/03/2569	64.7	86.3	6.7
11-12/03/2569	64.6	86.9	6.5
12-13/03/2569	64.7	91.5	5.7
13-14/03/2569	63.8	87.5	6.3
14-15/03/2569	63.7	92.0	7.1
15-16/03/2569	62.8	87.0	4.9
16-17/03/2569	63.6	93.6	4.0
17-18/03/2569	63.4	84.5	6.3
18-19/03/2569	64.5	86.3	4.1
19-20/03/2569	64.0	85.6	5.1
20-21/03/2569	63.5	92.3	5.0
21-22/03/2569	65.4	94.4	4.6
22-23/03/2569	64.8	90.0	3.9
23-24/03/2569	64.4	89.9	4.2
24-25/03/2569	64.0	91.8	6.4
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน


หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
25-26/03/2569	63.5	89.2	6.8
26-27/03/2569	64.3	89.6	4.8
27-28/03/2569	64.1	95.3	5.8
28-29/03/2569	65.7	89.5	4.4
29-30/03/2569	65.1	86.3	4.3
30-31/03/2569	64.3	89.2	6.1
31/03-01/04/2569	64.5	89.3	6.0
01-02/04/2569	64.1	91.4	5.2
02-03/04/2569	64.2	92.0	5.4
03-04/04/2569	63.9	89.8	4.7
06-07/04/2569	61.5	91.4	4.2
16-17/04/2569	61.9	85.6	6.2
20-21/04/2569	62.1	90.1	6.1
27-28/04/2569	62.3	91.2	5.0
07-08/05/2569	62.4	86.9	6.6
14-15/05/2569	63.0	87.2	4.5
21-22/05/2569	62.2	85.9	4.7
26-27/05/2569	61.6	86.9	5.2
05-06/06/2569	62.5	90.1	5.1
08-09/06/2569	62.8	86.9	5.3
15-16/06/2569	62.4	89.1	4.8
23-24/06/2569	63.3	91.1	6.1
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน


หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

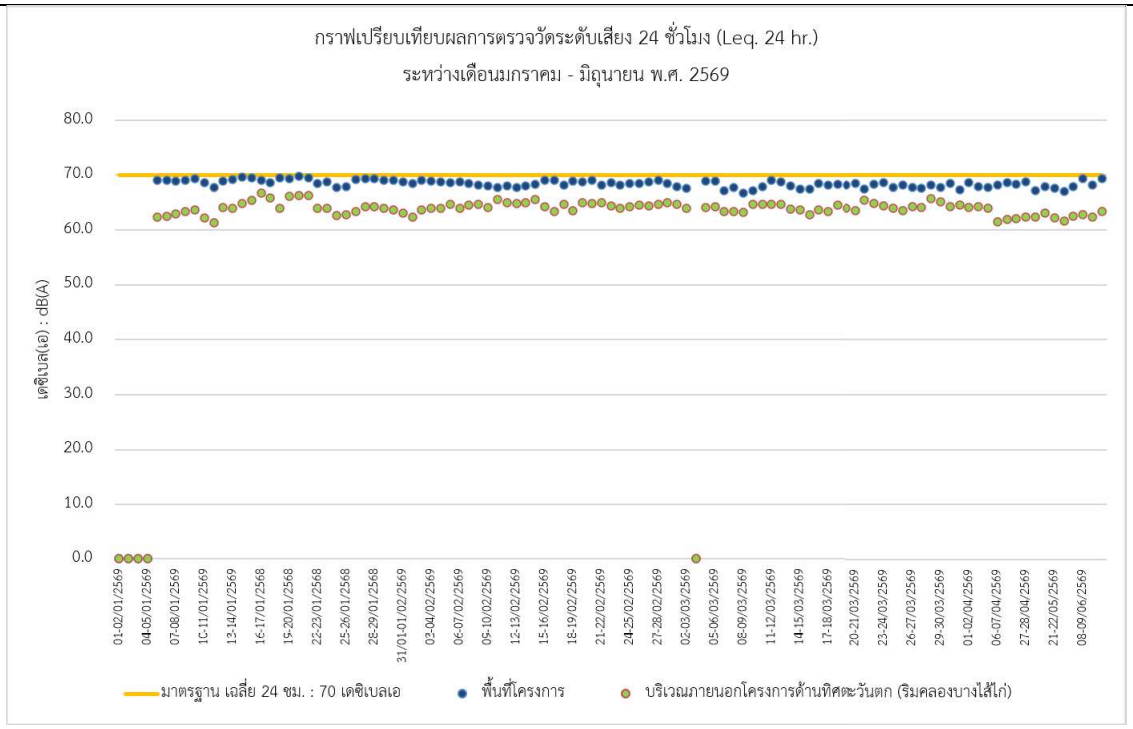

รูปที่ 4-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

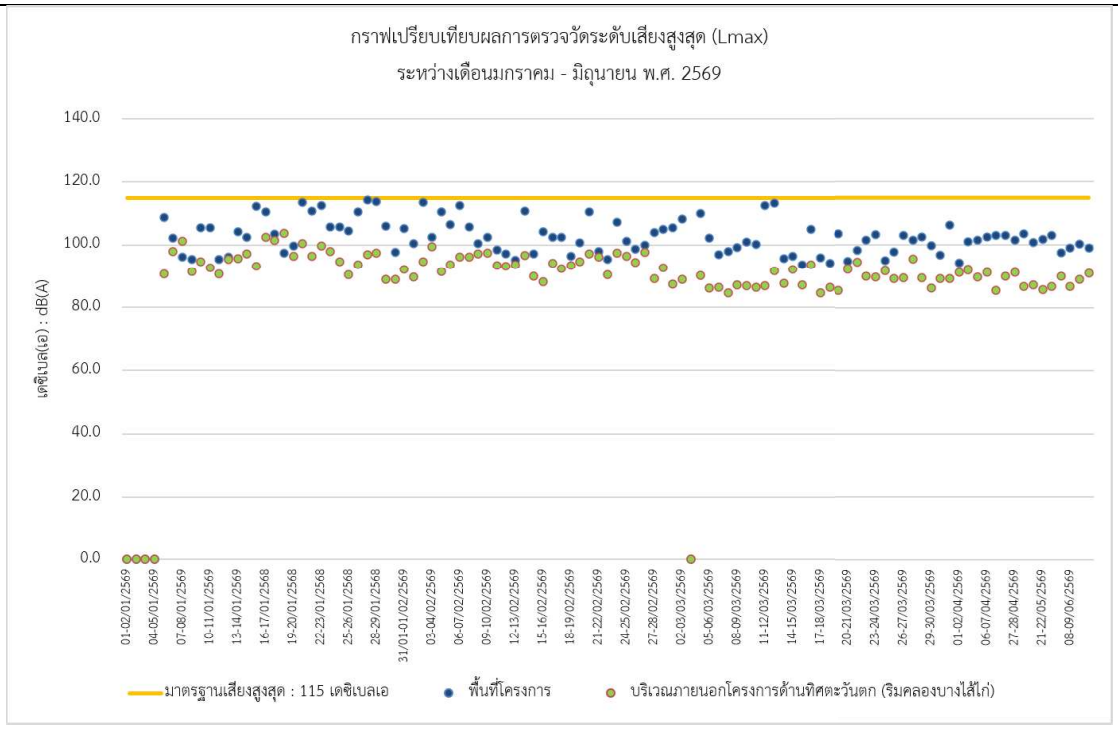

รูปที่ 4-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)
ระดับเสียงดังสูงสุดของ (Lmax)

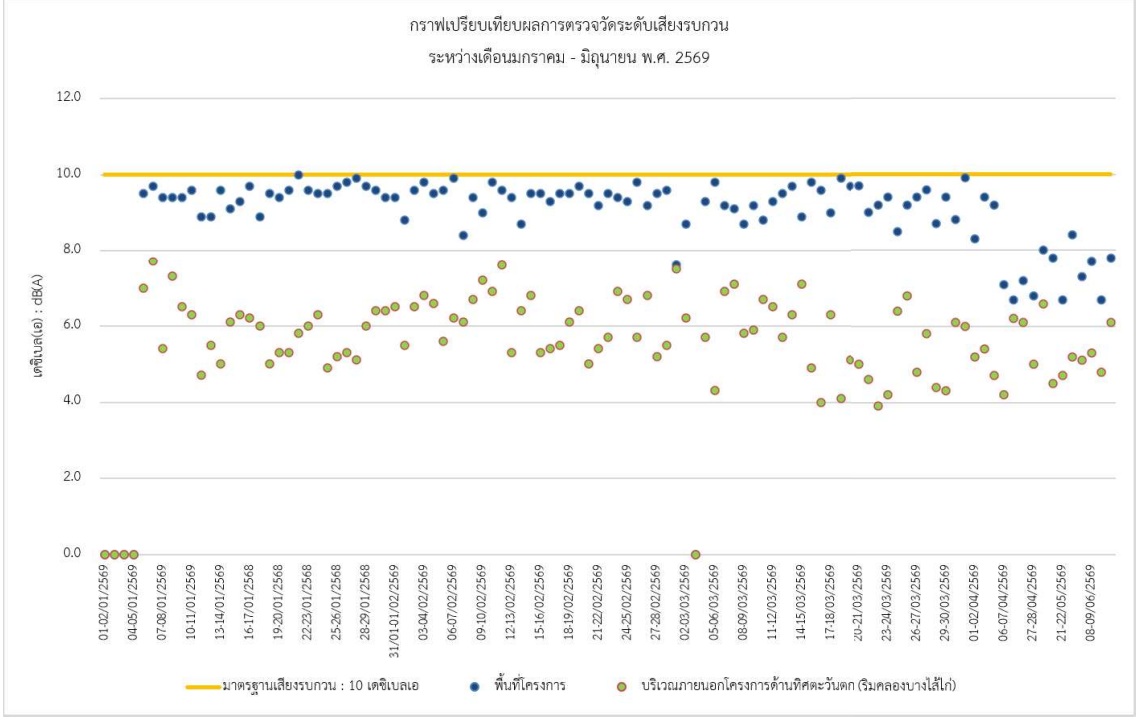

รูปที่ 4-11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

4.4 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รายละเอียดรายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.4-1**



บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
01-02/01/2569	-	*	*	-
02-03/01/2569	-	*	*	-
03-04/01/2569	-	*	*	-
04-05/01/2569	-	*	*	-
05-06/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.125	8.7	5.000
06-07/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.236	6.3	5.000
07-08/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.526	4.1	5.000
08-09/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.151	6.5	5.000
09-10/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.120	8.9	5.000
10-11/01/2569	แนวแกนดิ่ง	1.898	5.6	5.000
11-12/01/2569	แนวแกนดิ่ง	1.856	5.6	5.000
12-13/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.102	7.9	5.000
13-14/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.236	8.9	5.000
14-15/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.141	8.6	5.000
15-16/01/2569	แนวแกนดิ่ง	1.598	5.1	5.000
16-17/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.874	7.8	5.000
17-18/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.536	6.3	5.000
18-19/01/2568	แนวแกนดิ่ง	2.201	8.7	5.000
19-20/01/2568	แนวแกนดิ่ง	2.044	5.8	5.000
20-21/01/2568	แนวแกนดิ่ง	2.541	8.9	5.000
21-22/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.895	5.4	5.000
22-23/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.623	7.0	5.000
23-24/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.126	4.8	5.000
24-25/01/2568	แนวแกนดิ่ง	4.225	43.0	13.250
25-26/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.701	5.3	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 01 - 04 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นวันหยุดปีใหม่

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
26-27/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.954	6.4	5.000
27-28/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.316	> 100	20.000
28-29/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.237	4.1	5.000
29-30/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.080	4.3	5.000
30-31/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.403	3.3	5.000
31/01-01/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.765	5.8	5.000
01-02/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.389	7.9	5.000
02-03/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.056	3.3	5.000
03-04/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.036	5.8	5.000
04-05/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.569	7.6	5.000
05-06/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.174	4.1	5.000
06-07/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.773	51.0	15.100
07-08/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.041	7.9	5.000
08-09/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.560	8.7	5.000
09-10/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.889	8.7	5.000
10-11/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.977	6.9	5.000
11-12/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.009	7.8	5.000
12-13/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.190	6.7	5.000
13-14/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.899	5.8	5.000
14-15/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.520	8.0	5.000
15-16/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.591	3.8	5.000
16-17/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.245	24.0	8.500
17-18/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.357	3.6	5.000
18-19/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.725	9.4	5.000
19-20/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.600	3.6	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
20-21/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.505	3.8	5.000
21-22/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.158	9.7	5.000
22-23/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.096	7.8	5.000
23-24/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.011	6.4	5.000
24-25/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.144	> 100	20.000
25-26/02/2569	แนวแกนยาว	3.050	1.3	5.000
26-27/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.565	5.2	5.000
27-28/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.380	4.8	5.000
28/02-01/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.026	8.4	5.000
01-02/03/2569	แนวแกนยาว	4.650	1.7	5.000
02-03/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.678	5.6	5.000
03-04/03/2569	-	*	*	-
04-05/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.324	6.8	5.000
05-06/03/2569	แนวแกนยาว	0.938	51.0	15.100
06-07/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.624	4.5	5.000
07-08/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.647	3.4	5.000
08-09/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.600	> 100	20.000
09-10/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.316	4.1	5.000
10-11/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.088	4.5	5.000
11-12/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.230	3.3	5.000
12-13/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.868	64.0	16.400
13-14/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.836	3.7	5.000
14-15/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.434	3.8	5.000
15-16/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.325	5.6	5.000
16-17/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.268	5.2	5.000
17-18/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.025	3.2	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
18-19/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.301	3.1	5.000
19-20/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.237	3.6	5.000
20-21/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.261	3.1	5.000
21-22/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.655	4.2	5.000
22-23/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.241	8.6	5.000
23-24/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.033	57.0	15.700
24-25/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.250	6.9	5.000
25-26/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.252	6.5	5.000
26-27/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.200	4.1	5.000
27-28/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.253	6.8	5.000
28-29/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.610	6.7	5.000
29-30/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.205	6.2	5.000
30-31/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.302	3.6	5.000
31/03-01/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.204	6.8	5.000
01-02/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.041	7.8	5.000
02-03/04/2569	แนวแกนดิ่ง	1.205	5.8	5.000
03-04/04/2569	แนวแกนดิ่ง	1.223	5.6	5.000
06-07/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.014	6.8	5.000
16-17/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.201	6.2	5.000
20-21/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.085	7.7	5.000
27-28/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.155	8.4	5.000
07-08/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.696	4.8	5.000
14-15/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.357	4.1	5.000
21-22/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.948	4.4	5.000
26-27/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.522	5.0	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
05-06/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.044	7.5	5.000
08-09/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.156	6.7	5.000
15-16/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.073	7.4	5.000
23-24/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.038	6.8	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

4.5 คุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) (ระยะก่อสร้าง) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4.5-1**




บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง


ตารางที่ 4.5-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน
		มกราคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569	เมษายน 2569	พฤษภาคม 2569	มิถุนายน 2569	
pH at 24.8 °C	-	7.4	7.8	10.4	7.8	7.4	8.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	< 5.0	< 5.0	83.4	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	127	218	278	108	133	114	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	< 2.0	< 2.0	52.8	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 30
Sulfide	mg/L	< 0.60	< 0.60	2.74	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease	mg/L	< 2.0	< 2.0	2.1	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20
Settleable Solids	mL/L	< 0.1	< 0.1	0.9	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	< 0.28	< 0.28	13	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35


มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคารประเภท ข

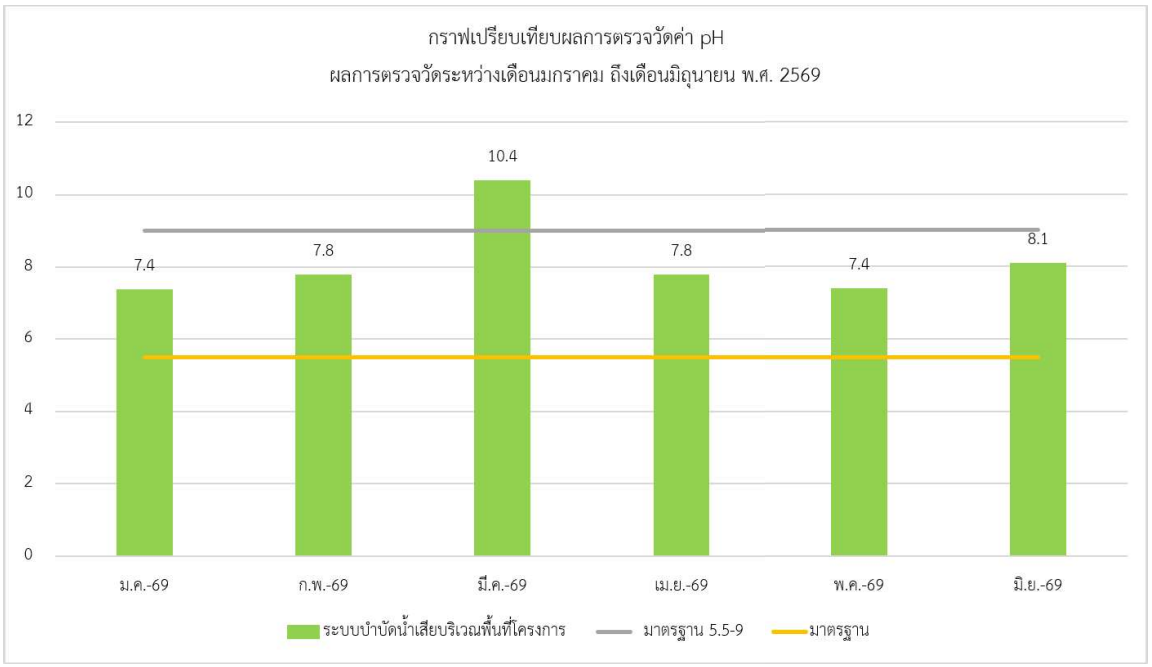


รูปที่ 4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า pH บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

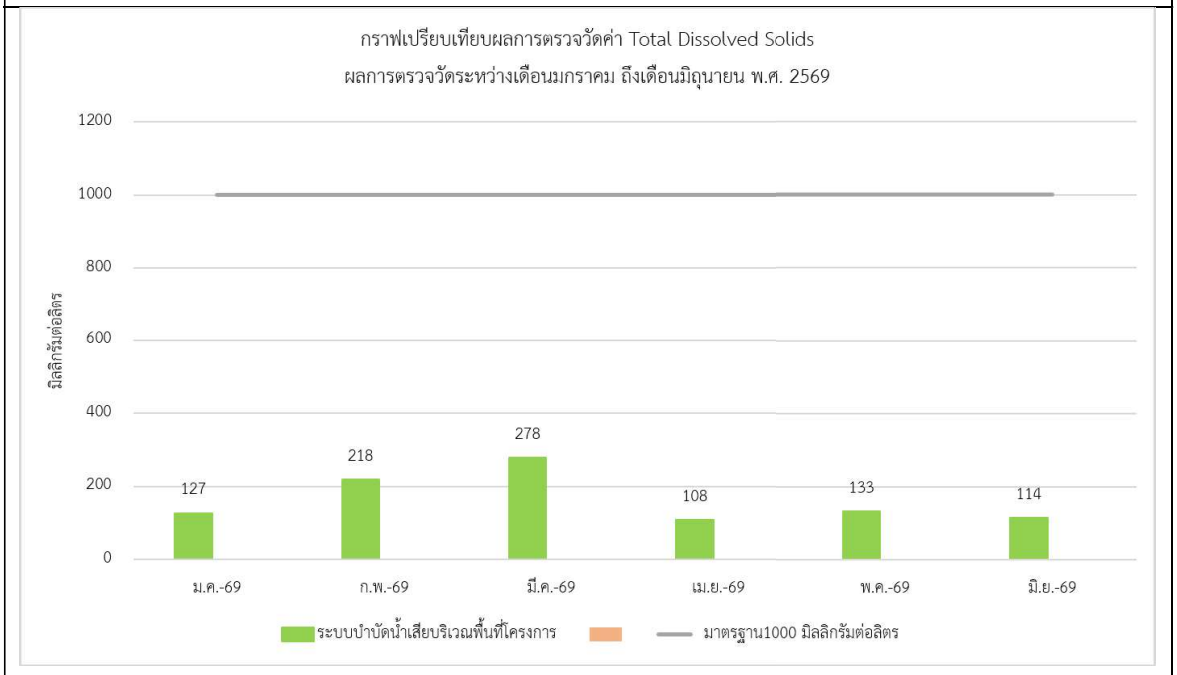


รูปที่ 4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Total Dissolved Solids** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

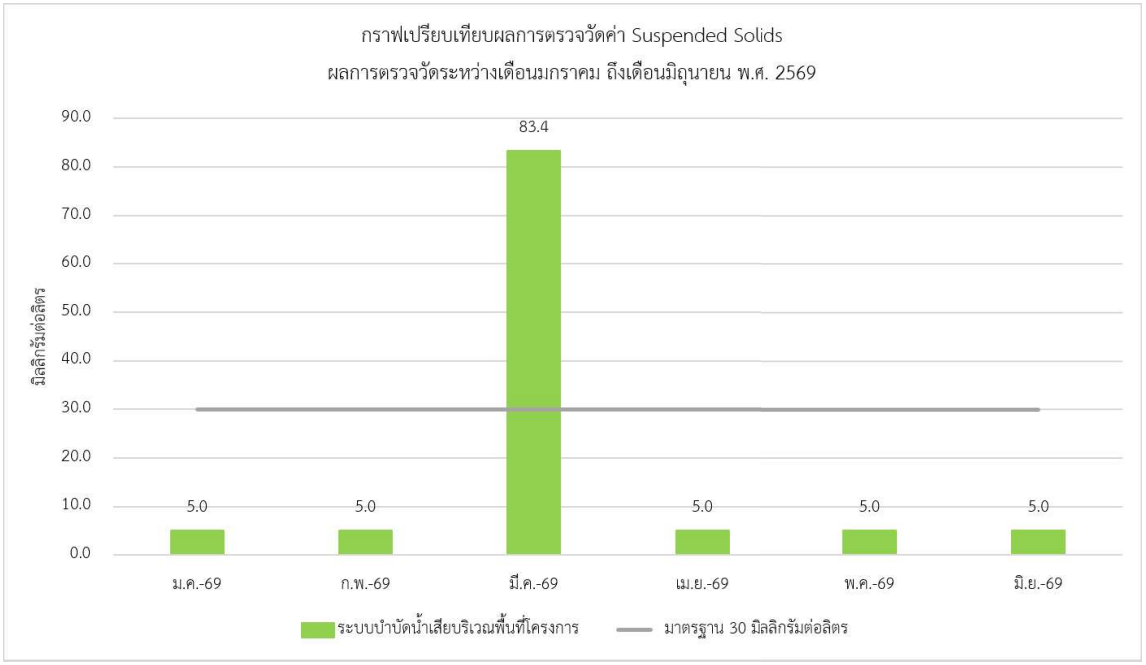


รูปที่ 4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Suspended Solids** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

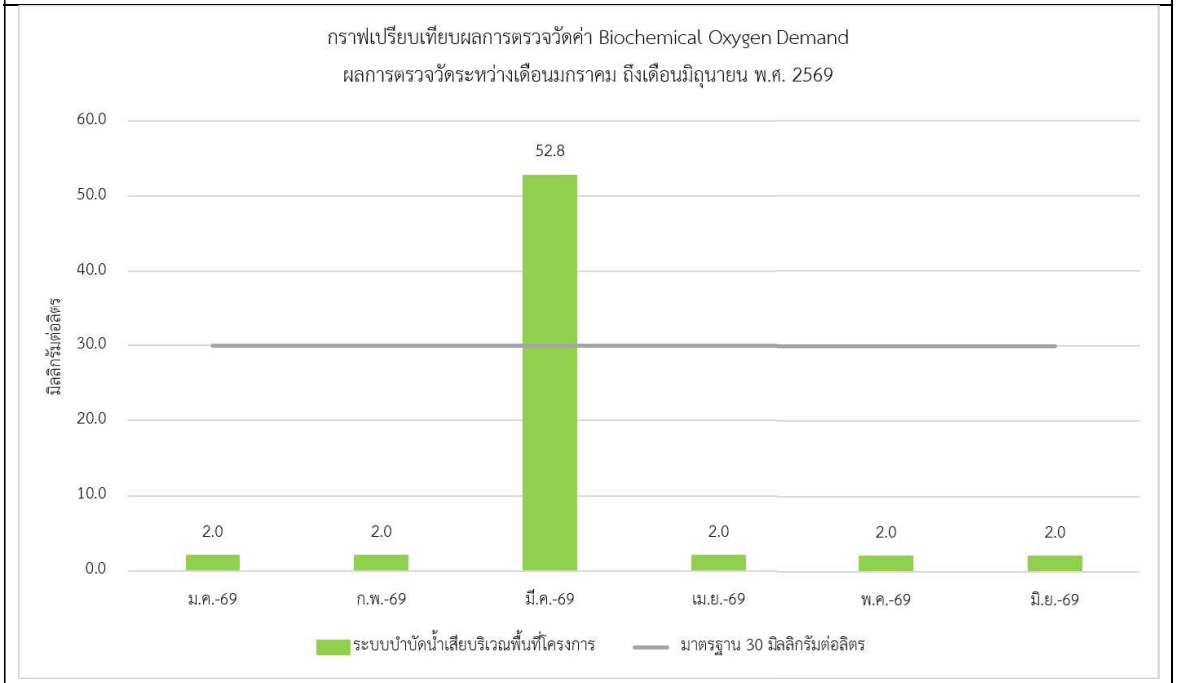


รูปที่ 4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Biochemical Oxygen Demand** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

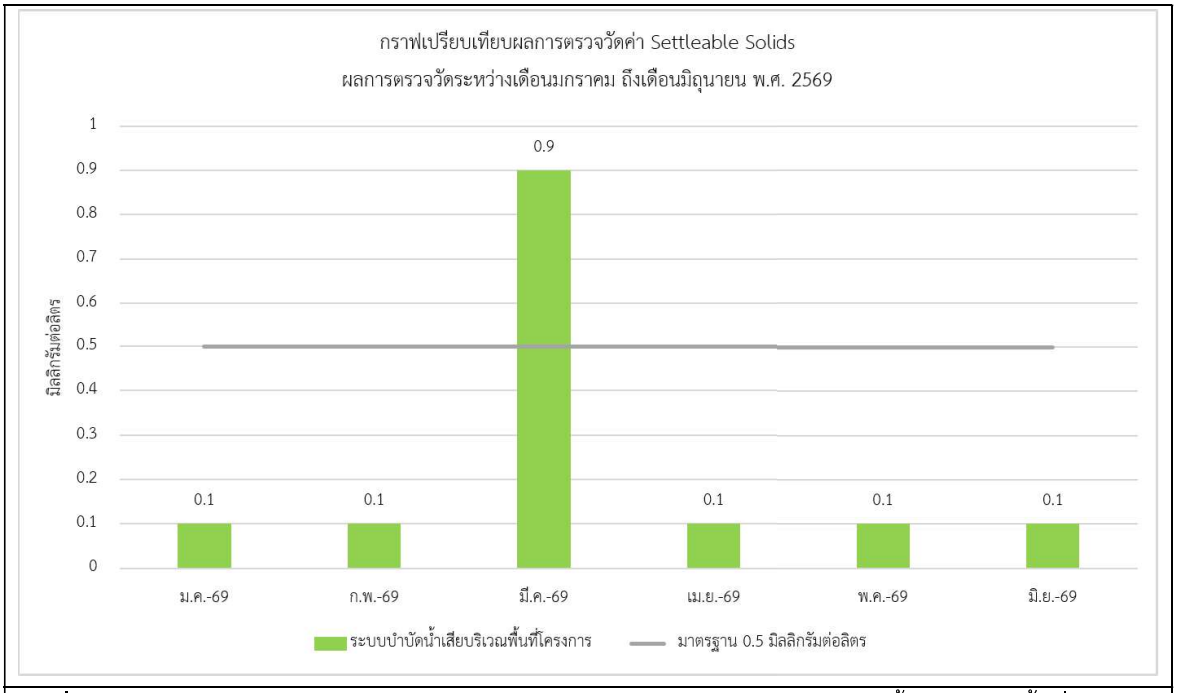


รูปที่ 4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Settleable Solids** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

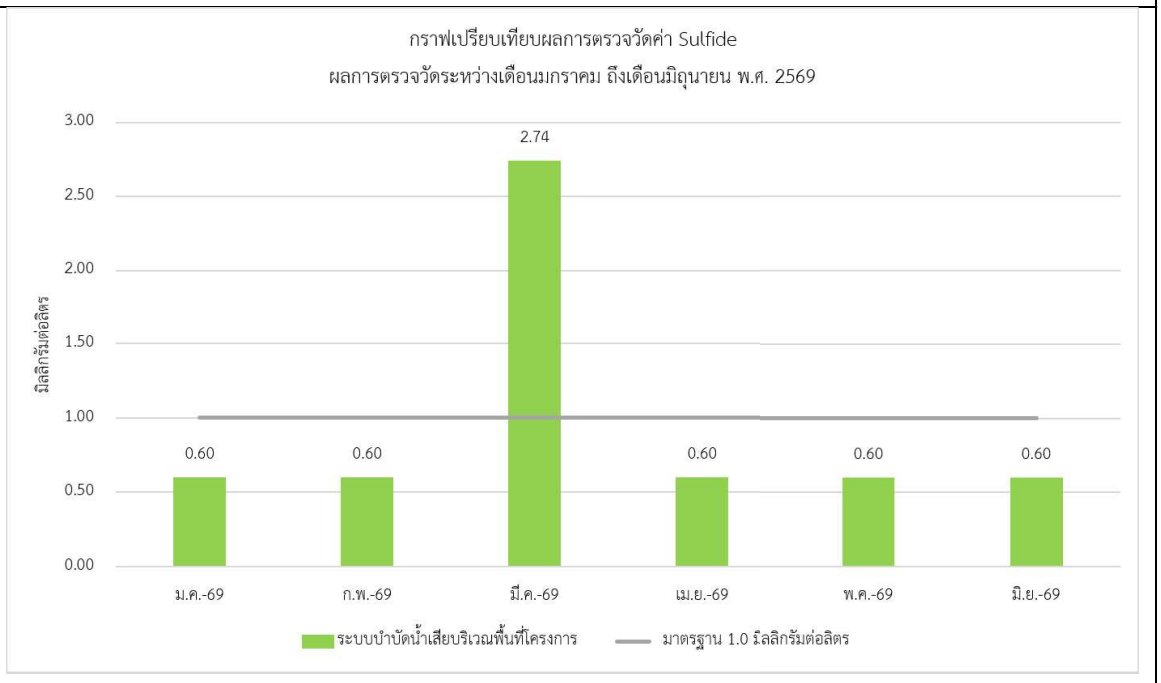

รูปที่ 4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Sulfide** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

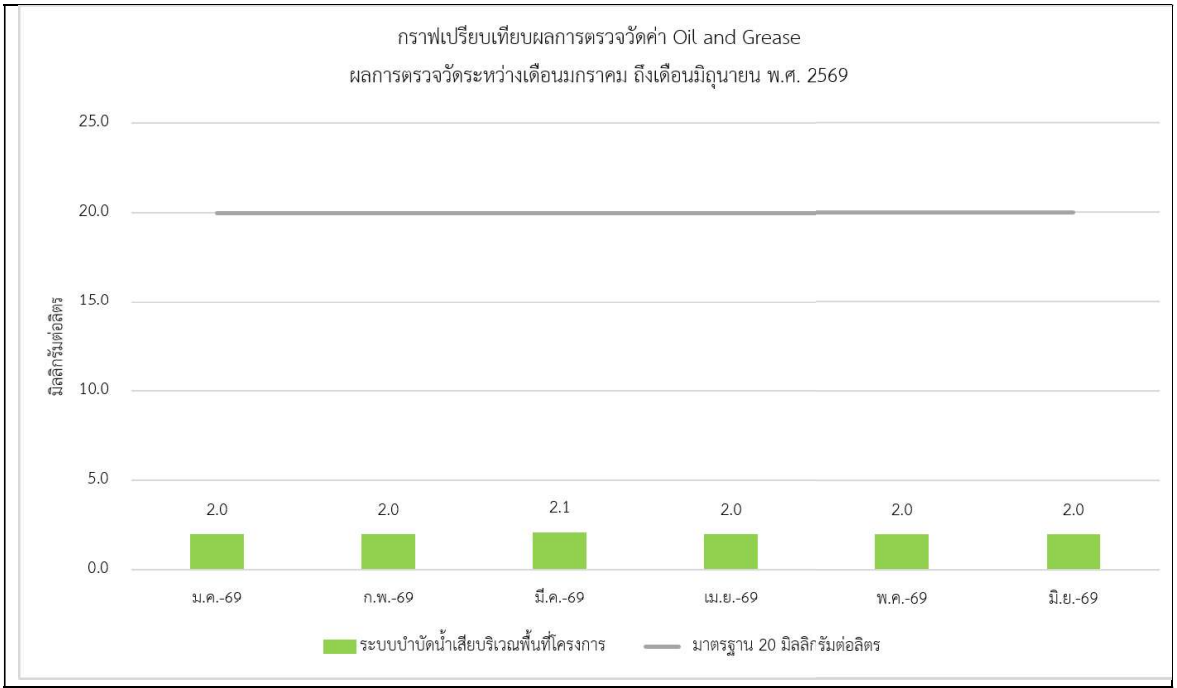

รูปที่ 4-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Oil and Grease** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

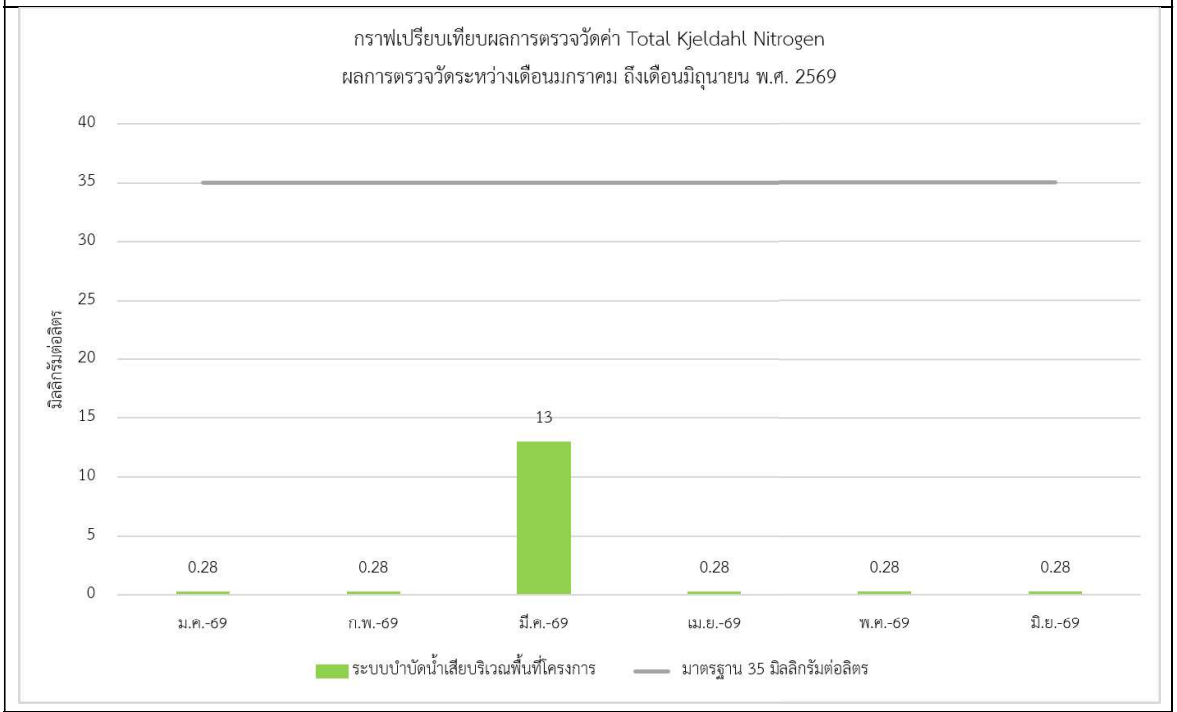

รูปที่ 4-19 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Total Kjeldahl Nitrogen** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

4.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

4.6.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

1) เปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP)

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) และบริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2569 ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน มาตรฐาน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.6.1-1** และ **ตารางที่ 4.6.1-2**

2) เปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) และบริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2569 ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับมาตรฐาน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.6.1-1** และ **ตารางที่ 4.6.1-2**

ตารางที่ 4.6.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
02-03/05/2568	0.0655	0.0324
03-04/05/2568	0.0673	0.0335
04-05/05/2568	0.0758	0.0376
13-14/06/2568	0.1013	0.0504
14-15/06/2568	0.0638	0.0317
15-16/06/2568	0.0661	0.0328
21-22/07/2568	0.1121	0.0552
22-23/07/2568	0.0969	0.0481
23-24/07/2568	0.0927	0.0460
01-02/08/2568	0.0771	0.0407
02-03/08/2568	0.0716	0.0325
03-04/08/2568	0.0878	0.0486
04-05/08/2568	0.0835	0.0420
05-06/08/2568	0.0975	0.0509
06-07/08/2568	0.0783	0.0446
07-08/08/2568	0.0804	0.0418
08-09/08/2568	0.0827	0.0436
09-10/08/2568	0.0786	0.0388
10-11/08/2568	0.0830	0.0420
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
11-12/08/2568	0.0718	0.0399
12-13/08/2568	*	*
13-14/08/2568	0.0848	0.0429
14-15/08/2568	0.0875	0.0347
15-16/08/2568	0.0927	0.0449
16-17/08/2568	0.0743	0.0335
17-18/08/2568	0.0666	0.0330
18-19/08/2568	0.0707	0.0338
19-20/08/2568	0.0613	0.0301
20-21/08/2568	0.0679	0.0333
21-22/08/2568	0.0610	0.0286
22-23/08/2568	0.0660	0.0316
23-24/08/2568	0.0545	0.0241
24-25/08/2568	0.0524	0.0226
25-26/08/2568	0.0582	0.0275
26-27/08/2568	0.0646	0.0312
27-28/08/2568	0.0559	0.0261
28-29/08/2568	0.0452	0.0270
29-30/08/2568	0.0517	0.0242
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เนื่องจากเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติ

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
30-31/08/2568	0.0534	0.0316
31/08-01/09/2568	0.0324	0.0139
01-02/09/2568	0.0279	0.0128
02-03/09/2568	0.0292	0.0147
03-04/09/2568	0.0422	0.0199
04-05/09/2568	0.0453	0.0209
05-06/09/2568	0.0481	0.0220
06-07/09/2568	0.0501	0.0244
07-08/09/2568	0.0411	0.0204
08-09/09/2568	0.0436	0.0216
09-10/09/2568	0.0438	0.0213
10-11/09/2568	0.0461	0.0223
11-12/09/2568	0.0405	0.0194
12-13/09/2568	0.0448	0.0223
13-14/09/2568	0.0418	0.0187
14-15/09/2568	0.0349	0.0158
15-16/09/2568	0.0493	0.0234
16-17/09/2568	0.0504	0.0225
17-18/09/2568	0.0597	0.0271
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
18-19/09/2568	0.0505	0.0244
19-20/09/2568	0.0544	0.0278
20-21/09/2568	0.0566	0.0251
21-22/09/2568	0.0579	0.0246
22-23/09/2568	0.0538	0.0261
23-24/09/2568	0.0582	0.0283
24-25/09/2568	0.0591	0.0292
25-26/09/2568	0.0416	0.0210
26-27/09/2568	0.0452	0.0226
27-28/09/2568	0.0545	0.0267
28-29/09/2568	0.0486	0.0239
29-30/09/2568	0.0435	0.0232
30/09-01/10/2568	0.0447	0.0225
01-02/10/2568	0.0493	0.0258
02-03/10/2568	0.0502	0.0220
03-04/10/2568	0.0484	0.0241
04-05/10/2568	0.0447	0.0219
05-06/10/2568	0.0410	0.0202
06-07/10/2568	0.0585	0.0244
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
07-08/10/2568	0.0536	0.0215
08-09/10/2568	0.0613	0.0309
09-10/10/2568	0.0549	0.0220
10-11/10/2568	0.0565	0.0269
11-12/10/2568	0.0441	0.0219
12-13/10/2568	0.0474	0.0213
13-14/10/2568	*	*
14-15/10/2568	0.0407	0.0195
15-16/10/2568	0.0485	0.0222
16-17/10/2568	0.0428	0.0243
17-18/10/2568	0.0526	0.0257
18-19/10/2568	0.0438	0.0232
19-20/10/2568	0.0491	0.0214
20-21/10/2568	0.0501	0.0248
21-22/10/2568	0.0450	0.0215
22-23/10/2568	0.0477	0.0223
23-24/10/2568	*	*
24-25/10/2568	0.0414	0.0205
25-26/10/2568	0.0423	0.0217
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
26-27/10/2568	0.0389	0.0140
27-28/10/2568	0.0477	0.0241
28-29/10/2568	0.0385	0.0195
29-30/10/2568	0.0432	0.0237
30-31/10/2568	0.0411	0.0206
31/10-01/11/2568	0.0492	0.0243
01-02/11/2568	0.0402	0.0212
02-03/11/2568	0.0306	0.0178
03-04/11/2568	0.0467	0.0235
04-05/11/2568	0.0435	0.0221
05-06/11/2568	0.0478	0.0240
06-07/11/2568	0.0546	0.0279
07-08/11/2568	0.0498	0.0247
08-09/11/2568	0.0420	0.0205
09-10/11/2568	0.0376	0.0187
10-11/11/2568	0.0443	0.0218
11-12/11/2568	0.0487	0.0261
12-13/11/2568	0.0415	0.0234
13-14/11/2568	0.0379	0.0188
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
14-15/11/2568	0.0403	0.0216
15-16/11/2568	0.0396	0.0197
16-17/11/2568	0.0488	0.0242
17-18/11/2568	0.0434	0.0205
18-19/11/2568	0.0519	0.0234
19-20/11/2568	0.0536	0.0264
20-21/11/2568	0.0450	0.0219
21-22/11/2568	0.0506	0.0238
22-23/11/2568	0.0367	0.0181
23-24/11/2568	0.0336	0.0163
24-25/11/2568	0.0354	0.0171
25-26/11/2568	0.0380	0.0185
26-27/11/2568	0.0337	0.0163
27-28/11/2568	0.0405	0.0197
28-29/11/2568	0.0366	0.0160
29-30/11/2568	0.0393	0.0194
30/11-01/12/2568	0.0381	0.0179
01-02/12/2568	0.0746	0.0368
02-03/12/2568	0.0711	0.0345
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
03-04/12/2568	0.0826	0.0407
04-05/12/2568	0.0782	0.0374
05-06/12/2568	*	*
06-07/12/2568	0.0812	0.0393
07-08/12/2568	0.0790	0.0388
08-09/12/2568	0.0778	0.0344
09-10/12/2568	0.0605	0.0320
10-11/12/2568	*	*
11-12/12/2568	0.0573	0.0278
12-13/12/2568	0.0668	0.0311
13-14/12/2568	0.0542	0.0280
14-15/12/2568	0.0458	0.0206
15-16/12/2568	0.0539	0.0275
16-17/12/2568	0.0555	0.0284
17-18/12/2568	0.0562	0.0286
18-19/12/2568	0.0520	0.0257
19-20/12/2568	0.0510	0.0258
20-21/12/2568	0.0524	0.0261
21-22/12/2568	0.0425	0.0220
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 05 และ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
22-23/12/2568	0.0539	0.0263
23-24/12/2568	0.0625	0.0316
24-25/12/2568	0.0640	0.0325
25-26/12/2568	0.0573	0.0273
26-27/12/2568	0.0630	0.0311
27-28/12/2568	0.0606	0.0297
28-29/12/2568	0.0568	0.0264
29-30/12/2568	0.0583	0.0290
30-31/12/2568	*	*
31/12/2568-01/01/2569	*	*
01-02/01/2569	*	*
02-03/01/2569	*	*
03-04/01/2569	*	*
04-05/01/2569	*	*
05-06/01/2569	0.0522	0.0258
06-07/01/2569	0.0503	0.0250
07-08/01/2569	0.0570	0.0282
08-09/01/2569	0.0494	0.0234
09-10/01/2569	0.0530	0.0262
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นวันหยุดปีใหม่

ตารางที่ 4.6.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
10-11/01/2569	0.0518	0.0253
11-12/01/2569	0.0564	0.0272
12-13/01/2569	0.0524	0.0261
13-14/01/2569	0.0488	0.0242
14-15/01/2569	0.0543	0.0265
15-16/01/2569	0.0592	0.0301
16-17/01/2569	0.0530	0.0266
17-18/01/2569	0.0523	0.0263
18-19/01/2569	0.0518	0.0268
19-20/01/2569	0.0494	0.0242
20-21/01/2569	0.0469	0.0238
21-22/01/2569	0.0556	0.0276
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
22-23/01/2569	52.9572	26.1295
23-24/01/2569	55.3146	27.2557
24-25/01/2569	53.6553	26.4786
25-26/01/2569	53.1060	26.2016
26-27/01/2569	56.3481	27.0770
27-28/01/2569	59.8659	28.8747
28-29/01/2569	58.5422	28.7226
29-30/01/2569	56.6841	27.0663
30-31/01/2569	57.7443	27.2765
31/01/-01/02/2569	58.3764	28.4102
01-02/02/2569	74.1501	36.8506
02-03/02/2569	72.4166	35.1508
03-04/02/2569	68.3107	33.7838
04-05/02/2569	82.9763	41.0393
05-06/02/2569	78.1971	38.9585
06-07/02/2569	68.1126	33.8829
07-08/02/2569	62.3319	30.5177
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
08-09/02/2569	86.4669	42.6350
09-10/02/2569	67.3483	31.5269
10-11/02/2569	71.0085	33.9584
11-12/02/2569	53.4822	29.9180
12-13/02/2569	54.4612	25.1977
13-14/02/2569	58.6274	30.7693
14-15/02/2569	60.4869	29.7199
15-16/02/2569	55.0930	28.2012
16-17/02/2569	64.1073	34.6472
17-18/02/2569	60.4364	31.2688
18-19/02/2569	57.9936	27.6754
19-20/02/2569	59.1534	26.2059
20-21/02/2569	57.1765	28.8417
21-22/02/2569	56.4669	25.5976
22-23/02/2569	52.5583	24.9826
23-24/02/2569	56.6196	26.5530
24-25/02/2569	56.1985	27.8250
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
25-26/02/2569	55.9337	27.3665
26-27/02/2569	54.5328	27.4665
27-28/02/2569	61.1868	29.4177
28/02-01/03/2569	74.8990	37.1523
01-02/03/2569	53.8548	25.4314
02-03/03/2569	66.8267	31.9278
03-04/03/2569	*	*
04-05/03/2569	64.7540	30.0337
05-06/03/2569	70.8361	33.7802
06-07/03/2569	75.4382	36.6615
07-08/03/2569	73.7143	34.4573
08-09/03/2569	66.2713	32.2131
09-10/03/2569	74.5227	35.8719
10-11/03/2569	83.5292	40.3827
11-12/03/2569	59.2946	29.6981
12-13/03/2569	69.4650	34.8842
13-14/03/2569	80.5439	39.7904
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
14-15/03/2569	73.2441	36.1718
15-16/03/2569	66.4018	32.5420
16-17/03/2569	65.0747	32.0321
17-18/03/2569	61.5380	30.0617
18-19/03/2569	69.6686	35.4445
19-20/03/2569	80.2460	40.8349
20-21/03/2569	80.7371	40.9243
21-22/03/2569	77.9970	39.1736
22-23/03/2569	78.2122	39.6890
23-24/03/2569	73.3633	35.4062
24-25/03/2569	68.3281	34.3432
25-26/03/2569	81.9938	41.9182
26-27/03/2569	83.9570	41.9019
27-28/03/2569	73.4111	36.9835
28-29/03/2569	67.6908	33.8204
29-30/03/2569	71.0255	35.0861
30-31/03/2569	68.4481	34.0715
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
31/03-01/04/2569	59.9779	30.2156
01-02/04/2569	81.2927	40.1370
02-03/04/2569	76.4320	38.4957
03-04/04/2569	78.6684	39.3342
06-07/04/2569	67.8130	33.7308
07-08/04/2569	69.5698	34.4838
08-09/04/2569	69.1683	34.3332
27-28/05/2569	79.0566	40.0052
28-29/05/2569	77.7516	37.5958
29-30/05/2569	75.8944	38.8005
05-06/06/2569	57.8358	27.2289
06-07/06/2569	69.5565	35.1621
07-08/06/2569	64.8751	32.8614
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

ตารางที่ 4.6.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
21-22/07/2568	0.0664	0.0329
22-23/07/2568	0.0640	0.0315
23-24/07/2568	0.0623	0.0309
22-23/08/2568	0.0332	0.0171
23-24/08/2568	0.0306	0.0146
24-25/08/2568	0.0352	0.0183
23-24/09/2568	0.0295	0.0141
24-25/09/2568	0.0333	0.0161
25-26/09/2568	0.0319	0.0116
04-05/10/2568	0.0299	0.0130
05-06/10/2568	0.0252	0.0124
06-07/10/2568	0.0267	0.0138
07-08/11/2568	0.0253	0.0120
08-09/11/2568	0.0278	0.0142
09-10/11/2568	0.0226	0.0137
15-16/12/2025	0.0349	0.0143
16-17/12/2025	0.0376	0.0163
17-18/12/2025	0.0353	0.0148
06-07/01/2569	0.0279	0.0133
07-08/01/2569	0.0291	0.0140
08-09/01/2569	0.0242	0.0119
มาตรฐาน	**0.330**	**0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m^3)

ตารางที่ 4.6.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

พื้นที่อ่อนไหว บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)		
วันที่ตรวจวัด	**ฝุ่นละอองรวม (TSP)**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)**
03-04/02/2569	37.1981	18.7997
04-05/02/2569	31.5700	16.0438
05-06/02/2569	36.5729	18.1715
13-14/03/2569	38.3731	18.5111
14-15/03/2569	30.2172	14.3557
15-16/03/2569	34.5841	16.7148
06-07/04/2569	31.2211	15.4098
07-08/04/2569	32.2752	16.4137
08-09/04/2569	33.5301	16.6144
27-28/05/2569	63.4461	32.4258
28-29/05/2569	65.8554	32.8273
29-30/05/2569	72.1800	35.7888
05-06/06/2569	61.8333	31.1660
06-07/06/2569	66.2713	33.6094
07-08/06/2569	59.3400	28.1740
มาตรฐาน	**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ($\mu g/m^3$)

(3) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง**ตารางที่ 4.6.1-3**

ตารางที่ 4.6.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	22-23/08/2568	0.0235
	23-24/08/2568	0.0234
	24-25/08/2568	0.0234
	23-24/09/2568	0.0246
	24-25/09/2568	0.0241
	25-26/09/2568	0.0245
	04-05/10/2568	0.0245
	05-06/10/2568	0.0253
	06-07/10/2568	0.0248
	07-08/11/2568	0.0253
	08-09/11/2568	0.0254
	09-10/11/2568	0.0251
	22-23/12/2568	0.0241
	23-24/12/2568	0.0239
	24-25/12/2568	0.0242
	06-07/01/2569	0.0238
	07-08/01/2569	0.0238
	08-09/01/2569	0.0236
มาตรฐาน		**0.17**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.6.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	03-04/02/2569	23.1
	04-05/02/2569	23.7
	05-06/02/2569	23.5
	10-11/03/2569	25.3
	11-12/03/2569	25.0
	12-13/03/2569	25.6
	06-07/04/2569	24.6
	07-08/04/2569	25.1
	08-09/04/2569	25.0
	27-28/05/2569	24.0
	28-29/05/2569	24.8
	29-30/05/2569	24.2
	05-06/06/2569	18.6
	06-07/06/2569	18.0
	07-08/06/2569	18.2
มาตรฐาน		**≤ 120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

(4) เปรียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง**ตารางที่ 4.6.1-4**

ตารางที่ 4.6.1-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	22-23/08/2568	0.0031	0.0041
	23-24/08/2568	0.0031	0.0042
	24-25/08/2568	0.0030	0.0036
	23-24/09/2568	0.0027	0.0038
	24-25/09/2568	0.0027	0.0041
	25-26/09/2568	0.0027	0.0039
	04-05/10/2568	0.0030	0.0041
	05-06/10/2568	0.0032	0.0042
	06-07/10/2568	0.0030	0.0040
	07-08/11/2568	0.0029	0.0042
	08-09/11/2568	0.0028	0.0042
	09-10/11/2568	0.0028	0.0042
	22-23/12/2568	0.0029	0.0043
	23-24/12/2568	0.0030	0.0044
	24-25/12/2568	0.0030	0.0042
	06-07/01/2569	0.0028	0.0035
	07-08/01/2569	0.0027	0.0036
	08-09/01/2569	0.0028	0.0037
มาตรฐาน		**0.12**[(1)]	**0.30**[(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.6.1-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย SO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	03-04/02/2569	2.7	3.3
	04-05/02/2569	2.6	3.6
	05-06/02/2569	2.5	3.4
	10-11/03/2569	2.4	3.2
	11-12/03/2569	2.2	3.4
	12-13/03/2569	2.3	3.4
	06-07/04/2569	2.5	3.3
	07-08/04/2569	2.4	3.5
	08-09/04/2569	2.3	3.4
	27-28/05/2569	2.0	3.4
	28-29/05/2569	2.1	3.5
	29-30/05/2569	2.2	3.5
	05-06/06/2569	2.2	3.5
	06-07/06/2569	2.3	3.4
	07-08/06/2569	2.1	3.3
มาตรฐาน		**≤ 50**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

(5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง**ตารางที่ 4.6.1-5**

ตารางที่ 4.6.1-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	22-23/08/2568	3.0781	3.2668
	23-24/08/2568	3.0537	3.2046
	24-25/08/2568	3.0649	3.2069
	23-24/09/2568	3.1223	3.2300
	24-25/09/2568	3.0859	3.2411
	25-26/09/2568	3.0874	3.2362
	04-05/10/2568	3.2707	3.4512
	05-06/10/2568	3.2529	3.4256
	06-07/10/2568	3.2350	3.4659
	07-08/11/2568	3.2011	3.4636
	08-09/11/2568	3.1997	3.4236
	09-10/11/2568	3.1957	3.4156
	22-23/12/2568	3.1513	3.4015
	23-24/12/2568	3.1408	3.5015
	24-25/12/2568	3.1597	3.4521
	06-07/01/2569	3.0850	3.2781
	07-08/01/2569	3.0595	3.3017
	08-09/01/2569	3.1088	3.3015
มาตรฐาน		**9**	**30**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.6.1-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	03-04/02/2569	3.15	3.36
	04-05/02/2569	3.17	3.40
	05-06/02/2569	3.16	3.31
	10-11/03/2569	2.93	3.13
	11-12/03/2569	3.02	3.24
	12-13/03/2569	3.07	3.36
	06-07/04/2569	3.02	3.13
	07-08/04/2569	3.08	3.24
	08-09/04/2569	3.07	3.30
	27-28/05/2569	3.05	3.24
	28-29/05/2569	3.09	3.24
	29-30/05/2569	3.07	3.26
	05-06/06/2569	2.91	3.36
	06-07/06/2569	2.98	3.30
	07-08/06/2569	2.92	3.30
มาตรฐาน		**≤ 9**	**≤ 30**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

(6) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4.6.1-6**

ตารางที่ 4.6.1-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569


สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด THC (หน่วย ppm)
พื้นที่โครงการ	23/08/2568	2.124
	24/08/2568	2.130
	25/08/2568	2.155
	23/09/2568	1.963
	24/09/2568	1.937
	25/09/2568	1.920
	04/10/2568	2.041
	05/10/2568	2.034
	06/10/2568	2.056
	07/11/2568	2.086
	08/11/2568	2.110
	09/11/2568	1.989
	15/12/2025	2.137
	16/12/2025	2.069
	17/12/2025	2.060
	07/01/2569	2.071
	08/01/2569	2.082
	09/01/2569	2.067
	03/02/2569	2.106
	04/02/2569	1.990
	05/02/2569	2.117
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm


ตารางที่ 4.6.1-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด THC (หน่วย ppm)
พื้นที่โครงการ	10/03/2569	2.033
	11/03/2569	1.986
	12/03/2569	2.093
	06/04/2569	2.100
	07/04/2569	2.059
	08/04/2569	1.953
	27/05/2569	2.191
	28/05/2569	2.172
	29/05/2569	2.148
	05/06/2569	2.067
	06/06/2569	2.015
	07/06/2569	2.083
มาตรฐาน		-


หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

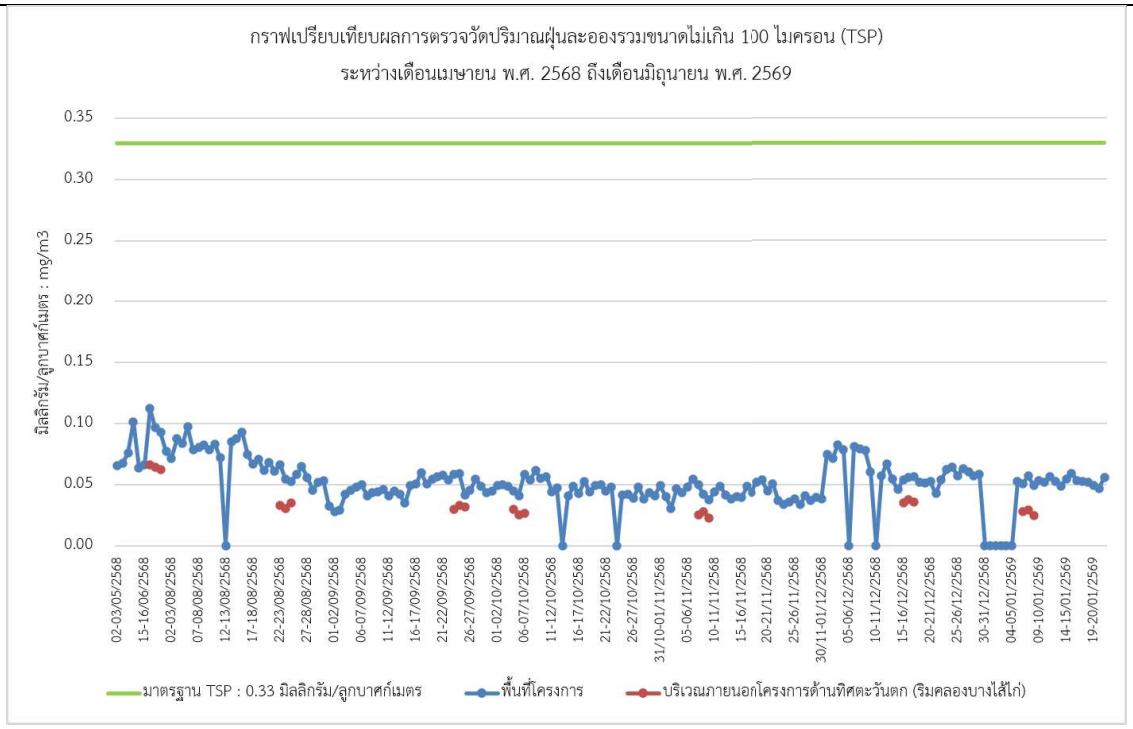


รูปที่ 4-20 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

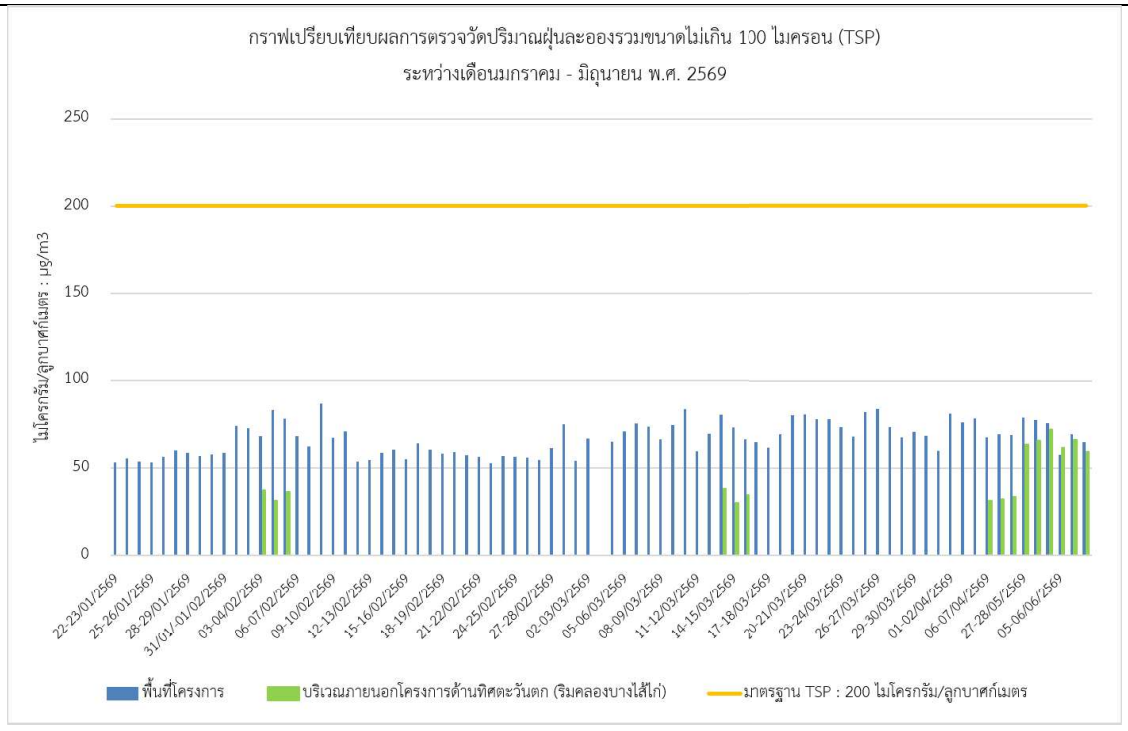


รูปที่ 4-20 (ต่อ) กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

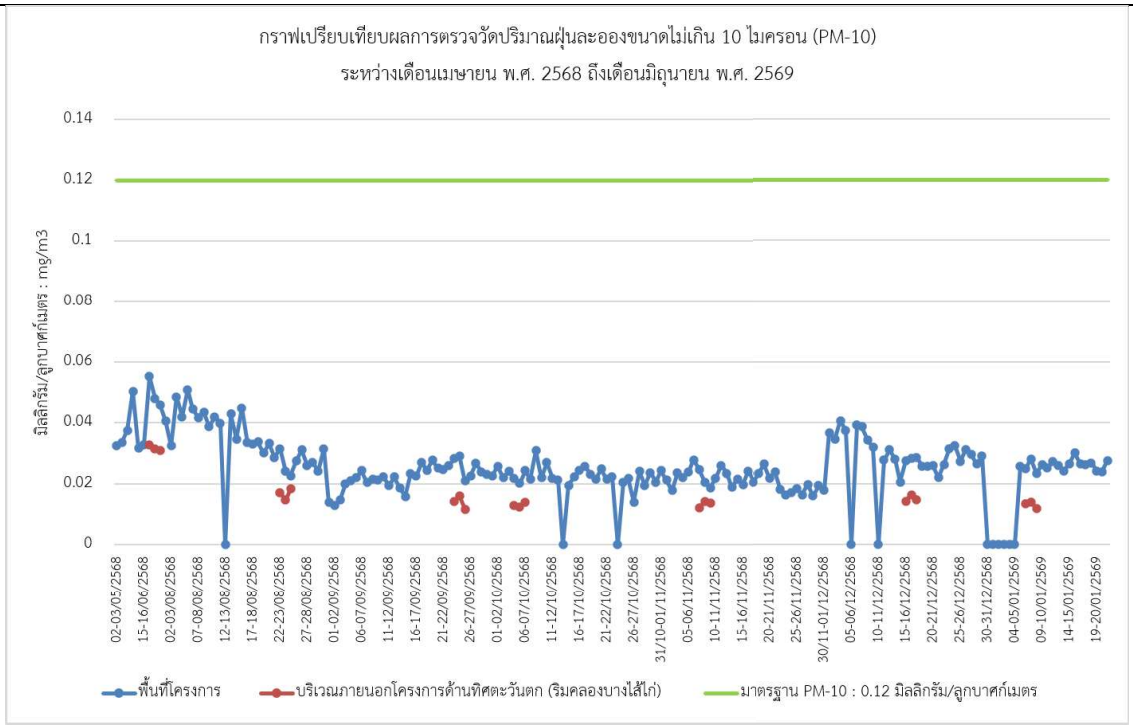


รูปที่ 4-21 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

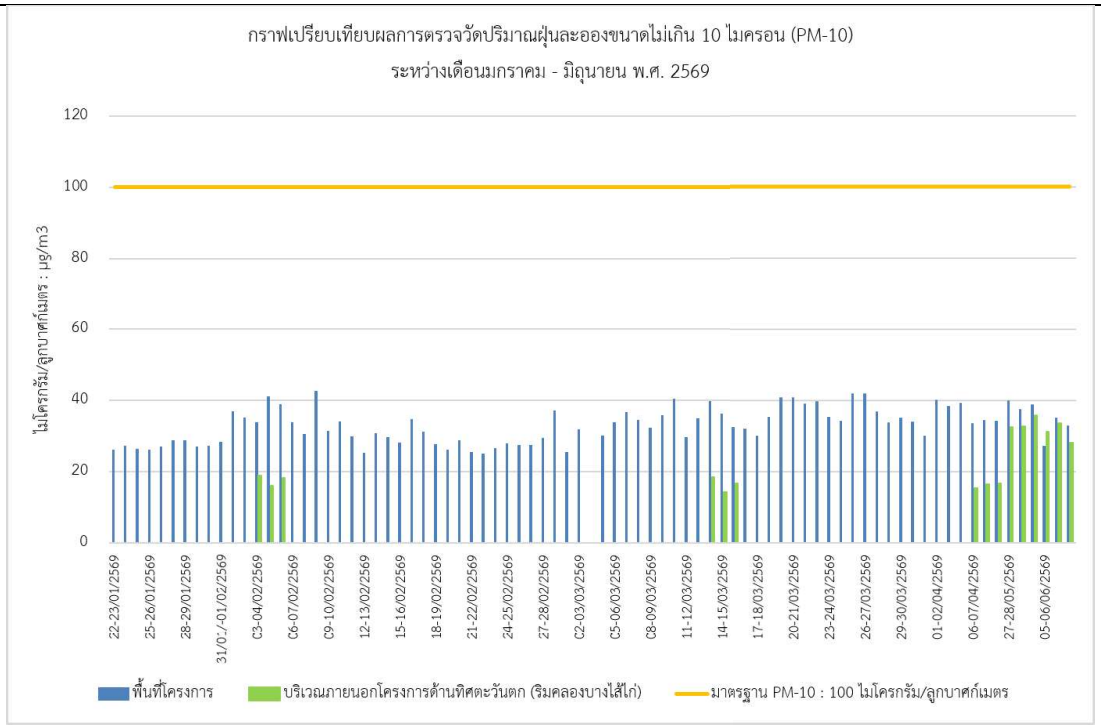


รูปที่ 4-21 (ต่อ) กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

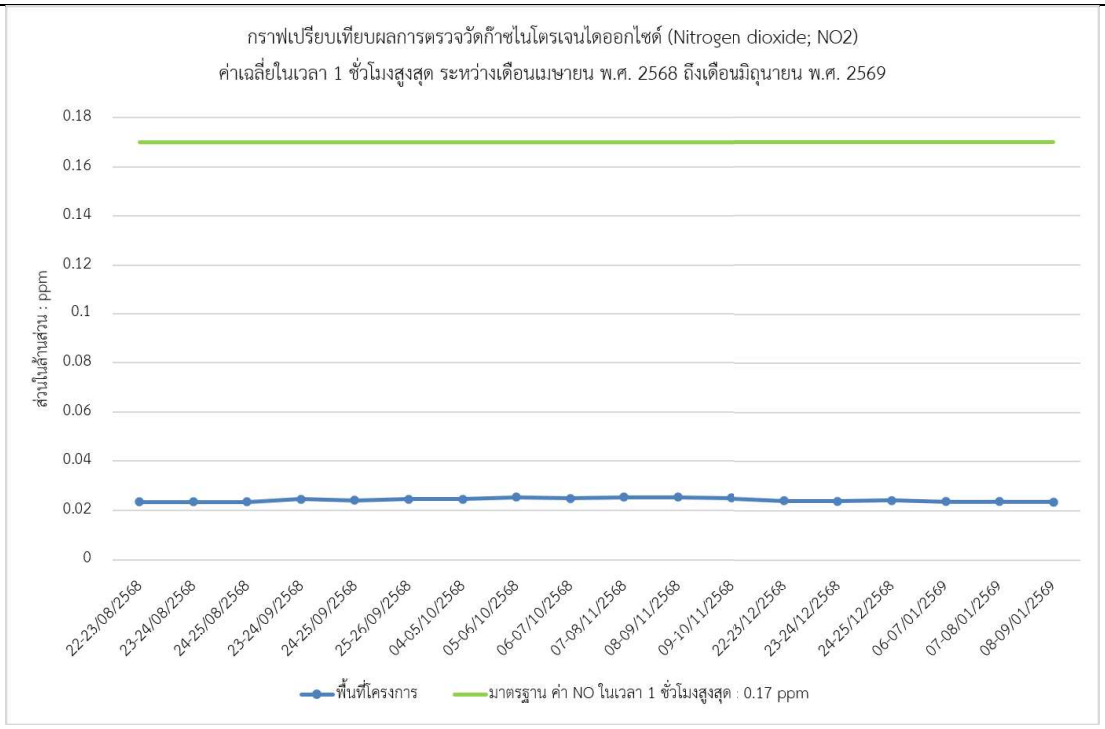


รูปที่ 4-22 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

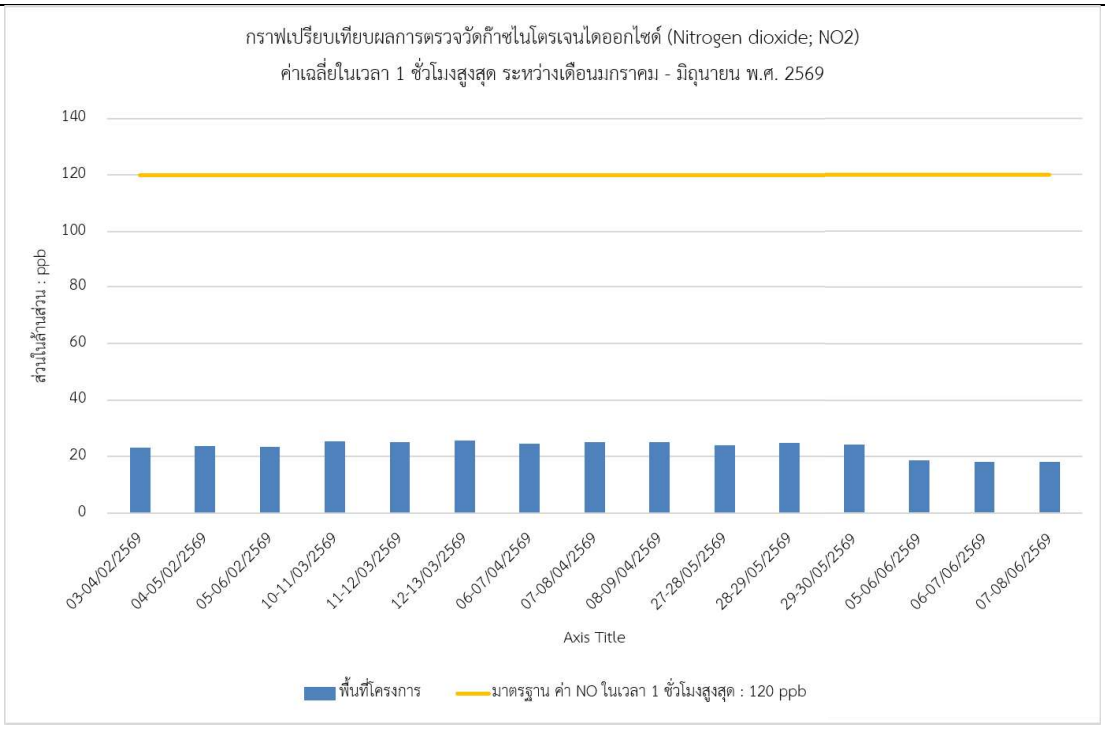


รูปที่ 4-22 (ต่อ) กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

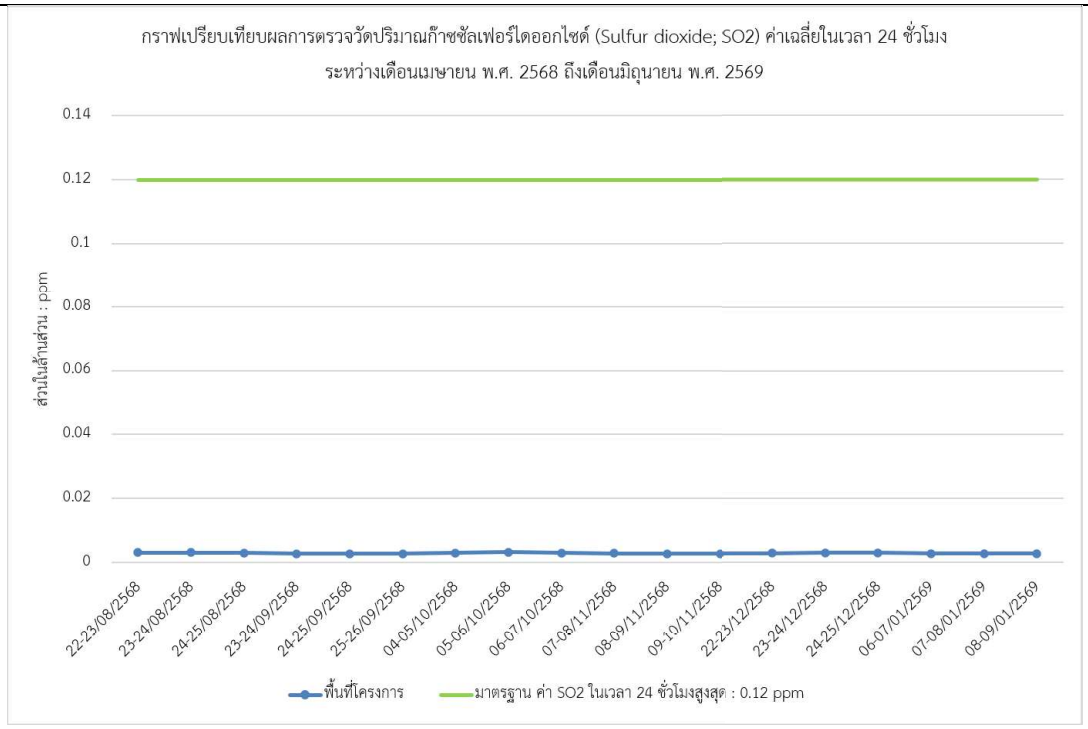


รูปที่ 4-23 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 24 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

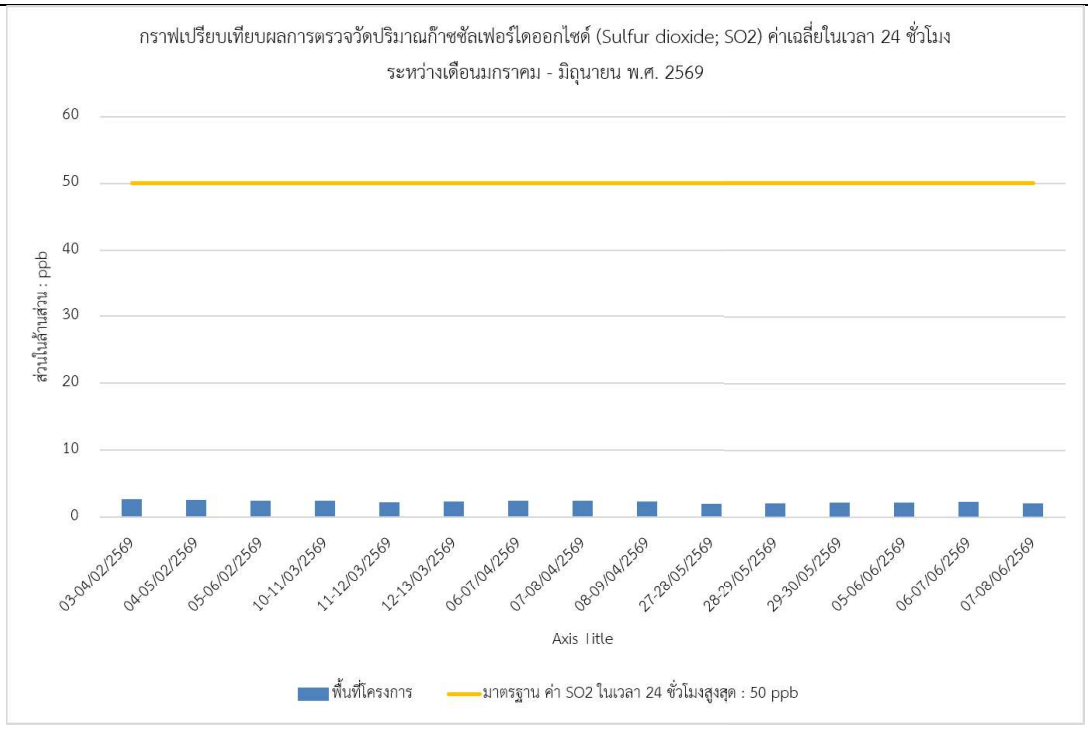


รูปที่ 4-23 (ต่อ) กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 24 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

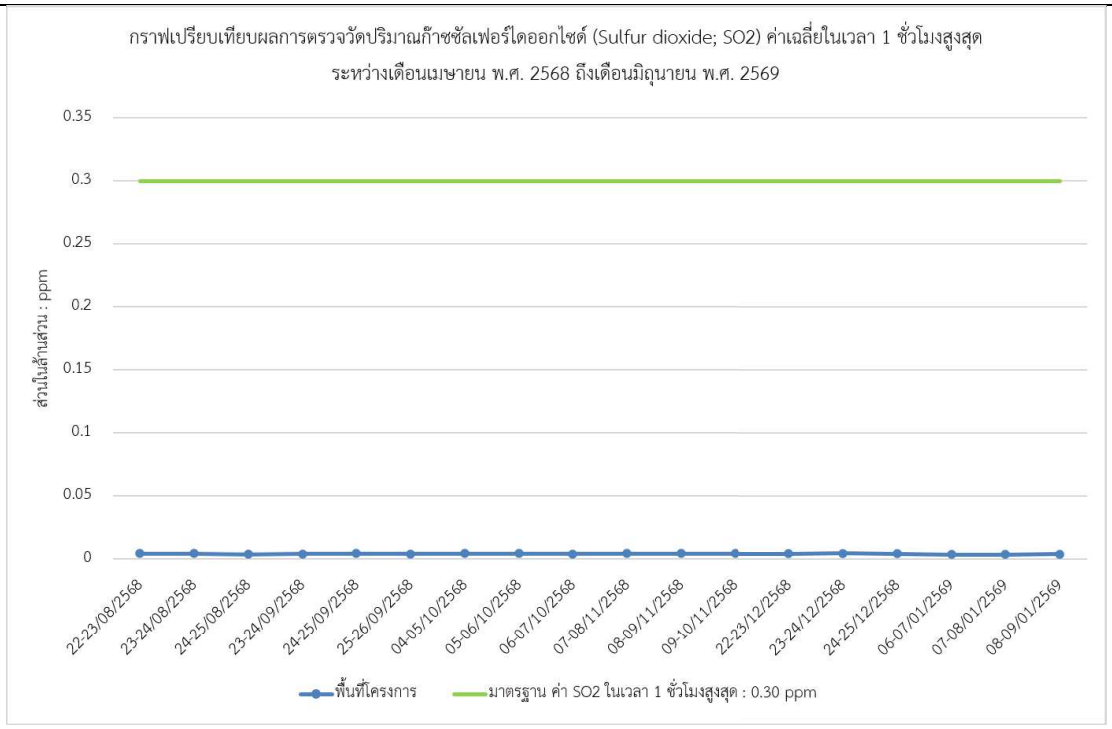


รูปที่ 4-24 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

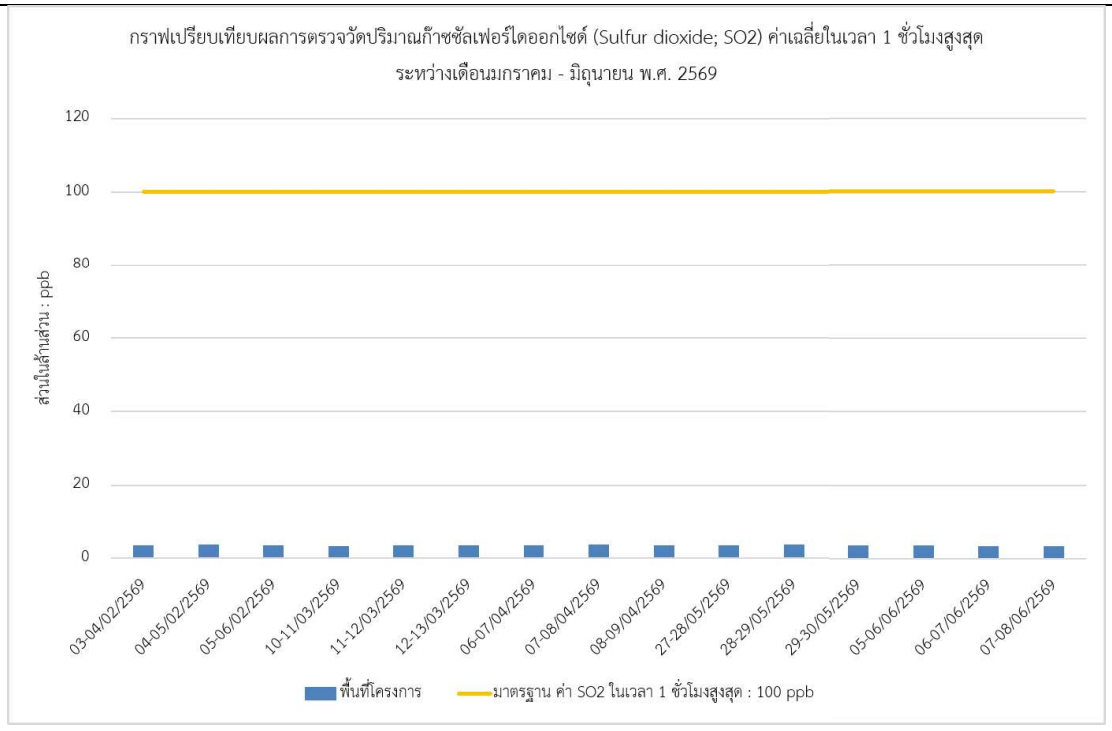


รูปที่ 4-24 (ต่อ) กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

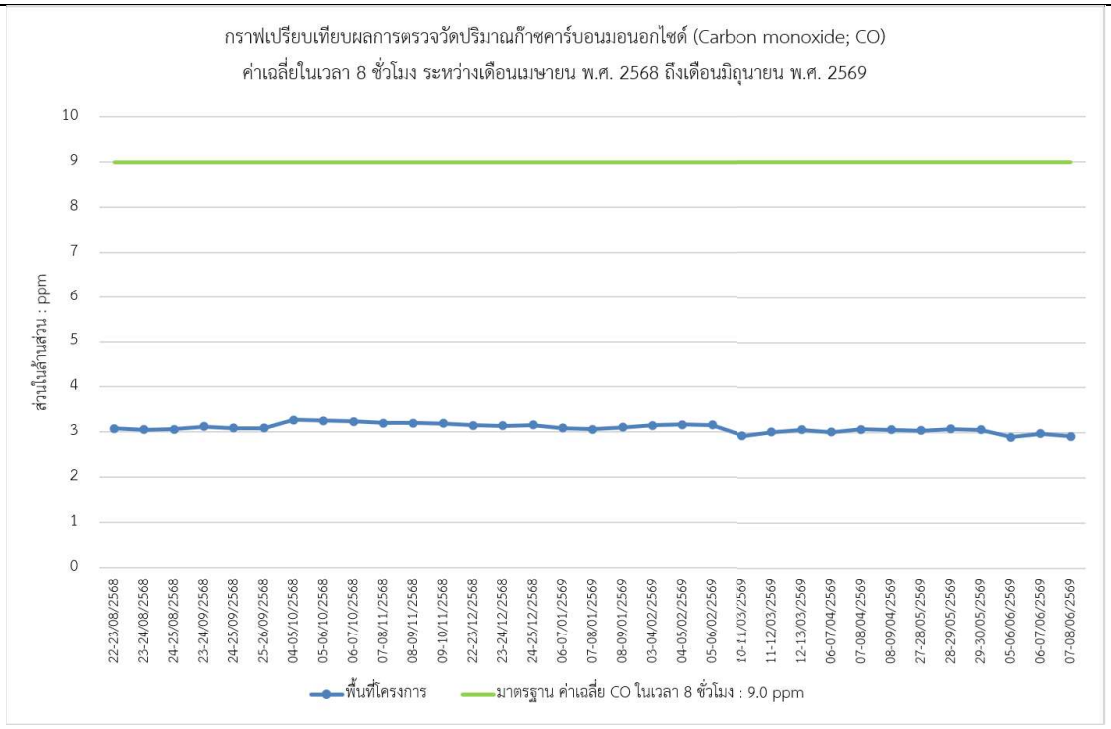

รูปที่ 4-25 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ในเวลา 8 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

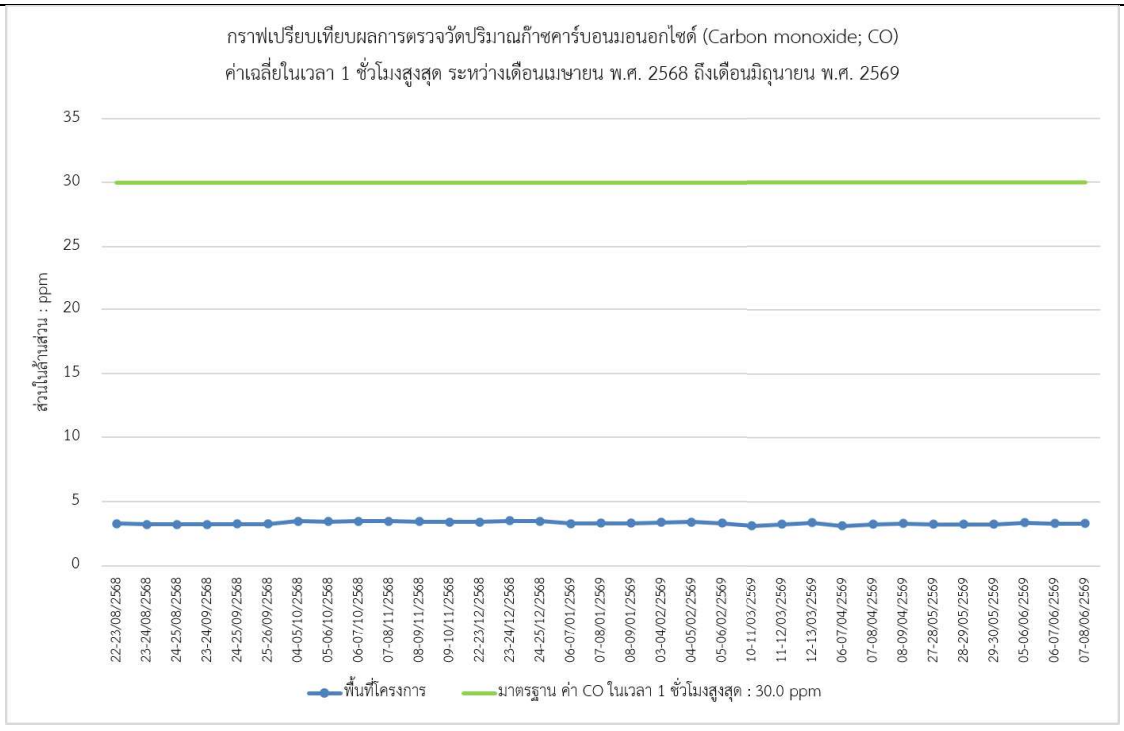

รูปที่ 4-26 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

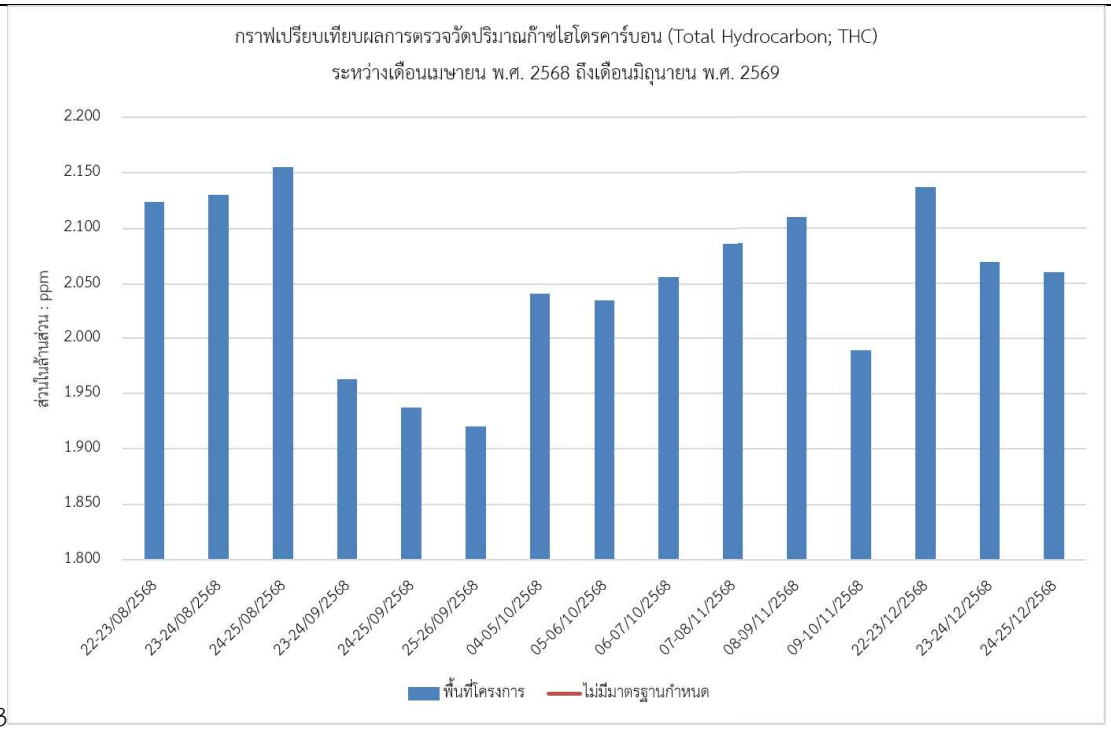

รูปที่ 4-27 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

4.6.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร และบริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้เท่ากับ 70.0 (dB(A)) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 115.0 (dB(A)) ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ที่กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้เท่ากับ 10 (dB(A)) รายละเอียดแสดงดัง **ตารางที่ 4.6.2-1** และ **ตารางที่ 4.6.2-2**

ตารางที่ 4.6.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
23-24/04/2568	61.1	85.8	9.8
24-25/04/2568	60.4	86.1	9.9
25-26/04/2568	56.9	88.9	9.6
26-27/04/2568	58.2	89.9	9.8
27-28/04/2568	56.4	84.4	9.9
28-29/04/2568	56.2	78.8	9.2
29-30/04/2568	56.3	86.2	9.5
30/04-01/05/2568	57.0	86.8	9.8
01-02/05/2568	*	*	*
02-03/05/2568	58.1	98.4	9.6
03-04/05/2568	56.2	98.4	10.0
04-05/05/2568	55.6	96.3	9.1
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2568 เป็นวันหยุดวันแรงงาน

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
05-06/05/2568	56.4	104.5	8.3
06-07/05/2568	57.7	98.2	8.7
07-08/05/2568	58.1	97.3	9.7
08-09/05/2568	58.3	90.1	9.9
09-10/05/2568	60.4	97.8	9.1
10-11/05/2568	58.9	83.2	9.4
11-12/05/2568	57.0	97.8	9.7
12-13/05/2568	58.5	93.1	9.9
13-14/05/2568	59.6	92.8	8.9
14-15/05/2568	65.1	99.2	9.9
15-16/05/2568	67.8	98.9	9.3
16-17/05/2568	66.3	95.7	10.0
17-18/05/2568	63.2	88.9	9.7
18-19/05/2568	58.4	90.8	9.2
19-20/05/2568	62.4	98.1	9.6
20-21/05/2568	68.8	98.5	9.4
21-22/05/2568	63.7	96.8	9.7
22-23/05/2568	61.9	96.9	9.4
23-24/05/2568	61.8	95.4	9.1
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
24-25/05/2568	60.5	96.3	9.4
25-26/05/2568	57.7	93.0	9.2
26-27/05/2568	54.9	87.6	9.3
27-28/05/2568	59.9	96.4	9.9
28-29/05/2568	64.5	96.3	9.5
29-30/05/2568	66.4	93.6	9.1
30-31/05/2568	67.1	96.7	10.0
31/05-01/06/2568	66.2	93.3	9.6
01-02/06/2568	66.2	98.0	9.9
02-03/06/2568	64.6	95.9	8.5
03-04/06/2568	66.6	98.2	9.8
04-05/06/2568	66.0	97.4	9.6
05-06/06/2568	66.7	94.2	9.3
06-07/06/2568	67.0	93.8	8.8
07-08/06/2568	64.6	91.1	9.0
08-09/06/2568	67.4	93.5	9.6
09-10/06/2568	67.0	92.3	9.1
10-11/06/2568	66.0	94.2	9.7
11-12/06/2568	66.5	92.9	9.9
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
12-13/06/2568	67.7	99.1	9.2
13-14/06/2568	67.9	106.2	9.2
14-15/06/2568	66.2	103.5	9.2
15-16/06/2568	67.2	99.4	9.8
16-17/06/2568	67.6	97.1	9.6
17-18/06/2568	68.0	99.1	9.8
18-19/06/2568	67.0	95.1	7.5
19-20/06/2568	67.2	100.1	7.5
20-21/06/2568	65.5	99.4	10.0
21-22/06/2568	68.7	103.8	9.5
22-23/06/2568	66.2	93.4	9.7
23-24/06/2568	65.3	94.2	9.9
24-25/06/2568	67.0	95.9	9.1
25-26/06/2568	66.6	93.1	8.8
26-27/06/2568	66.8	94.5	8.3
27-28/06/2568	67.0	94.7	8.3
28-29/06/2568	67.1	98.3	8.7
29-30/06/2568	67.5	98.7	9.7
30/06-01/07/2568	65.2	98.1	10.0
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/07/2568	67.5	98.1	9.8
02-03/07/2568	66.0	95.9	10.0
03-04/07/2568	66.4	94.5	9.9
04-05/07/2568	66.8	96.8	9.6
05-06/07/2568	68.1	95.6	9.9
06-07/07/2568	67.3	92.4	9.7
07-08/07/2568	68.5	99.6	9.4
08-09/07/2568	68.1	100.2	10.0
09-10/07/2568	66.2	99.5	9.7
10-11/07/2568	66.9	94.8	9.8
11-12/07/2568	67.7	103.3	9.8
12-13/07/2568	67.5	95.3	9.6
13-14/07/2568	67.0	96.4	9.9
14-15/07/2568	68.0	99.1	9.5
15-16/07/2568	68.4	99.4	9.8
16-17/07/2568	69.1	99.5	10.0
17-18/07/2568	69.4	99.3	9.6
18-19/07/2568	68.3	103.6	9.8
19-20/07/2568	66.7	98.9	9.2
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
20-21/07/2568	64.2	102.3	9.6
21-22/07/2568	67.5	96.3	9.7
22-23/07/2568	66.9	99.1	9.3
23-24/07/2568	68.4	98.3	10.0
24-25/07/2568	67.6	101.6	9.9
25-26/07/2568	67.2	99.1	9.2
26-27/07/2568	66.7	100.7	9.9
27-28/07/2568	65.1	90.1	9.6
28-29/07/2568	*	*	*
29-30/07/2568	66.8	109.0	9.9
30-31/07/2568	68.0	106.5	10.0
31/07-01/08/2568	67.4	95.6	9.0
01-02/08/2568	67.6	100.7	9.1
02-03/08/2568	66.5	98.1	9.2
03-04/08/2568	68.7	97.7	9.6
04-05/08/2568	69.2	101.0	9.8
05-06/08/2568	69.7	97.9	9.5
06-07/08/2568	69.9	110.3	9.8
07-08/08/2568	69.3	102.7	9.7
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
08-09/08/2568	69.0	109.6	9.9
09-10/08/2568	68.3	100.3	9.4
10-11/08/2568	68.5	101.1	9.7
11-12/08/2568	67.6	102.3	9.0
12-13/08/2568	*	*	*
13-14/08/2568	69.8	103.8	9.6
14-15/08/2568	69.1	98.4	9.2
15-16/08/2568	68.9	103.4	9.6
16-17/08/2568	68.6	100.1	9.6
17-18/08/2568	68.2	100.2	9.9
18-19/08/2568	67.7	101.2	9.5
19-20/08/2568	68.6	105.0	9.4
20-21/08/2568	68.4	100.6	9.8
21-22/08/2568	68.4	100.3	9.2
22-23/08/2568	69.3	109.0	9.8
23-24/08/2568	67.8	104.3	9.0
24-25/08/2568	67.4	97.9	9.1
25-26/08/2568	68.5	98.8	9.8
26-27/08/2568	68.2	104.7	9.9
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
27-28/08/2568	68.9	100.3	9.4
28-29/08/2568	68.4	96.7	9.5
29-30/08/2568	68.9	101.3	9.8
30-31/08/2568	67.3	98.2	9.3
31/08-01/09/2568	67.9	101.0	9.5
01-02/09/2568	68.3	103.2	10.0
02-03/09/2568	69.7	100.9	9.9
03-04/09/2568	69.7	101.8	9.9
04-05/09/2568	69.2	98.0	10.0
05-06/09/2568	69.0	99.6	9.8
06-07/09/2568	67.6	97.9	9.5
07-08/09/2568	68.1	96.8	9.8
08-09/09/2568	68.8	102.9	10.0
09-10/09/2568	68.9	107.5	9.9
10-11/09/2568	67.4	100.7	9.9
11-12/09/2568	68.1	100.1	9.8
12-13/09/2568	69.3	100.6	9.5
13-14/09/2568	68.5	101.3	9.6
14-15/09/2568	67.7	93.1	9.4
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
15-16/09/2568	68.6	96.3	9.9
16-17/09/2568	68.4	95.7	9.4
17-18/09/2568	68.3	97.5	9.9
18-19/09/2568	68.6	97.8	9.8
19-20/09/2568	67.8	98.6	10.0
20-21/09/2568	67.3	96.6	9.3
21-22/09/2568	68.4	99.0	9.8
22-23/09/2568	67.4	95.0	9.9
23-24/09/2568	68.7	100.0	9.8
24-25/09/2568	67.9	99.3	9.4
25-26/09/2568	69.4	102.6	9.8
26-27/09/2568	68.3	100.3	9.8
27-28/09/2568	67.4	95.3	9.7
28-29/09/2568	68.3	101.3	9.8
29-30/09/2568	67.4	96.8	9.7
30/09-01/10/2568	68.8	108.7	10.0
01-02/10/2568	68.7	100.4	9.3
02-03/10/2568	69.1	105.0	9.9
03-04/10/2568	69.3	110.3	9.6
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
04-05/10/2568	69.2	112.3	10.0
05-06/10/2568	69.3	105.0	9.7
06-07/10/2568	69.2	101.9	9.7
07-08/10/2568	69.1	110.2	9.6
08-09/10/2568	69.5	103.6	9.8
09-10/10/2568	69.2	100.5	9.7
10-11/10/2568	69.5	109.1	10.0
11-12/10/2568	68.1	102.3	9.4
12-13/10/2568	69.6	110.6	10.0
13-14/10/2568	*	*	*
14-15/10/2568	69.4	110.3	10.0
15-16/10/2568	69.0	106.7	9.9
16-17/10/2568	69.2	96.0	10.0
17-18/10/2568	68.5	100.3	9.6
18-19/10/2568	67.5	110.1	9.7
19-20/10/2568	69.0	112.8	9.8
20-21/10/2568	69.2	114.7	9.8
21-22/10/2568	69.1	110.6	9.5
22-23/10/2568	69.7	108.8	10.0
23-24/10/2568	*	*	*
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เนื่องจากเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
24-25/10/2568	69.5	108.1	9.7
25-26/10/2568	68.2	109.5	9.8
26-27/10/2568	67.5	99.8	9.6
27-28/10/2568	68.4	113.8	10.0
28-29/10/2568	69.5	104.1	9.8
29-30/10/2568	69.8	99.2	9.7
30-31/10/2568	69.5	110.1	9.8
31/10-01/11/2568	69.8	103.6	9.8
01-02/11/2568	69.3	113.6	10.0
02-03/11/2568	69.5	107.9	9.9
03-04/11/2568	69.6	114.8	9.8
04-05/11/2568	69.6	106.8	9.7
05-06/11/2568	69.8	106.3	9.5
06-07/11/2568	69.5	107.6	9.3
07-08/11/2568	69.4	111.2	10.0
08-09/11/2568	69.8	112.6	9.9
09-10/11/2568	69.6	111.2	10.0
10-11/11/2568	69.7	110.4	10.0
11-12/11/2568	69.9	113.6	9.8
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
12-13/11/2568	69.7	114.1	9.9
13-14/11/2568	69.9	106.3	9.8
14-15/11/2568	68.8	98.6	9.4
15-16/11/2568	69.2	109.1	9.9
16-17/11/2568	69.5	111.3	9.7
17-18/11/2568	69.9	105.1	9.7
18-19/11/2568	69.7	110.6	9.8
19-20/11/2568	69.9	106.8	9.6
20-21/11/2568	69.8	103.7	10.0
21-22/11/2568	69.9	100.0	9.6
22-23/11/2568	68.7	100.2	9.4
23-24/11/2568	68.6	100.8	9.3
24-25/11/2568	69.5	100.4	9.5
25-26/11/2568	69.4	100.5	9.9
26-27/11/2568	69.6	100.7	9.9
27-28/11/2568	69.7	114.2	9.7
28-29/11/2568	68.0	103.0	9.9
29-30/11/2568	68.0	108.4	9.5
30/11-01/12/2568	68.9	104.1	9.9
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/12/2568	69.4	106.3	9.9
02-03/12/2568	69.5	111.1	9.8
03-04/12/2568	69.3	103.3	10.0
04-05/12/2568	69.2	100.3	9.8
05-06/12/2568	*	*	*
06-07/12/2568	68.8	105.0	9.5
07-08/12/2568	69.6	102.1	9.8
08-09/12/2568	69.4	100.5	9.9
09-10/12/2568	69.2	102.3	9.7
10-11/12/2568	*	*	*
11-12/12/2568	69.0	104.5	9.7
12-13/12/2568	69.3	101.8	9.8
13-14/12/2568	68.8	107.9	9.6
14-15/12/2568	69.4	108.6	9.7
15-16/12/2568	69.7	104.3	9.8
16-17/12/2568	69.7	109.6	9.7
17-18/12/2568	69.8	109.2	9.9
18-19/12/2568	69.7	111.3	10.0
19-20/12/2568	69.6	113.2	9.6
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 5 และ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
20-21/12/2568	68.7	102.6	9.2
21-22/12/2568	68.7	100.3	9.6
22-23/12/2568	68.7	108.2	9.7
23-24/12/2568	69.3	108.6	10.0
24-25/12/2568	69.4	103.4	9.9
25-26/12/2568	69.1	104.5	9.7
26-27/12/2568	68.9	112.0	9.7
27-28/12/2568	68.3	96.5	8.8
28-29/12/2568	68.2	95.8	10.0
29-30/12/2568	67.7	100.0	9.3
30-31/12/2568	*	*	*
31/12/2568-01/01/2569	*	*	*
01-02/01/2569	*	*	*
02-03/01/2569	*	*	*
03-04/01/2569	*	*	*
04-05/01/2569	*	*	*
05-06/01/2569	69.1	108.6	9.5
06-07/01/2569	69.0	102.2	9.7
07-08/01/2569	68.9	96.0	9.4
08-09/01/2569	69.0	95.3	9.4
09-10/01/2569	69.3	105.4	9.4
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นวันหยุดปีใหม่

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
10-11/01/2569	68.6	105.4	9.6
11-12/01/2569	67.8	95.3	8.9
12-13/01/2569	68.9	96.0	8.9
13-14/01/2569	69.2	104.3	9.6
14-15/01/2569	69.6	102.4	9.1
15-16/01/2569	69.5	112.3	9.3
16-17/01/2568	69.0	110.4	9.7
17-18/01/2568	68.6	103.5	8.9
18-19/01/2568	69.5	97.3	9.5
19-20/01/2568	69.4	99.6	9.4
20-21/01/2568	69.7	113.6	9.6
21-22/01/2568	69.5	110.8	10.0
22-23/01/2568	68.5	112.4	9.6
23-24/01/2568	68.7	105.6	9.5
24-25/01/2568	67.8	105.7	9.5
25-26/01/2568	67.9	104.5	9.7
26-27/01/2568	69.2	110.6	9.8
27-28/01/2568	69.4	114.2	9.9
28-29/01/2568	69.4	113.8	9.7
29-30/01/2568	69.1	106.0	9.6
30-31/01/2568	69.0	97.6	9.4
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
31/01-01/02/2569	68.8	105.3	9.4
01-02/02/2569	68.5	100.3	8.8
02-03/02/2569	69.1	113.5	9.6
03-04/02/2569	68.9	102.3	9.8
04-05/02/2569	68.8	110.6	9.5
05-06/02/2569	68.6	106.4	9.6
06-07/02/2569	68.7	112.4	9.9
07-08/02/2569	68.4	105.7	8.4
08-09/02/2569	68.1	100.5	9.4
09-10/02/2569	68.0	102.3	9.0
10-11/02/2569	67.8	98.5	9.8
11-12/02/2569	68.0	97.1	9.6
12-13/02/2569	67.8	95.2	9.4
13-14/02/2569	68.0	110.8	8.7
14-15/02/2569	68.3	97.2	9.5
15-16/02/2569	69.1	104.3	9.5
16-17/02/2569	69.0	102.3	9.3
17-18/02/2569	68.1	102.3	9.5
18-19/02/2569	68.9	96.3	9.5
19-20/02/2569	68.8	100.6	9.7
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
20-21/02/2569	69.0	110.4	9.5
21-22/02/2569	68.2	98.0	9.2
22-23/02/2569	68.6	95.3	9.5
23-24/02/2569	68.1	107.3	9.4
24-25/02/2569	68.5	101.2	9.3
25-26/02/2569	68.4	98.6	9.8
26-27/02/2569	68.7	99.8	9.2
27-28/02/2569	69.0	103.8	9.5
28/02-01/03/2569	68.5	105.0	9.6
01-02/03/2569	67.9	105.5	7.6
02-03/03/2569	67.6	108.1	8.7
03-04/03/2569	*	*	*
04-05/03/2569	68.9	110.0	9.3
05-06/03/2569	68.9	102.1	9.8
06-07/03/2569	67.2	96.8	9.2
07-08/03/2569	67.8	97.8	9.1
08-09/03/2569	66.7	99.1	8.7
09-10/03/2569	67.2	100.8	9.2
10-11/03/2569	67.9	100.1	8.8
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
11-12/03/2569	69.1	112.4	9.3
12-13/03/2569	68.8	113.2	9.5
13-14/03/2569	68.0	95.7	9.7
14-15/03/2569	67.5	96.3	8.9
15-16/03/2569	67.4	93.6	9.8
16-17/03/2569	68.4	105.0	9.6
17-18/03/2569	68.2	95.8	9.0
18-19/03/2569	68.3	94.2	9.9
19-20/03/2569	68.1	103.3	9.7
20-21/03/2569	68.5	94.5	9.7
21-22/03/2569	67.4	98.2	9.0
22-23/03/2569	68.3	101.3	9.2
23-24/03/2569	68.6	103.2	9.4
24-25/03/2569	67.8	94.9	8.5
25-26/03/2569	68.1	97.7	9.2
26-27/03/2569	67.8	102.8	9.4
27-28/03/2569	67.6	101.4	9.6
28-29/03/2569	68.2	102.4	8.7
29-30/03/2569	67.8	99.6	9.4
30-31/03/2569	68.4	96.6	8.8
31/03-01/04/2569	67.3	106.2	9.9
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/04/2569	68.6	94.1	8.3
02-03/04/2569	67.9	100.8	9.4
03-04/04/2569	67.7	101.3	9.2
06-07/04/2569	68.2	102.3	7.1
16-17/04/2569	68.6	103.0	6.7
20-21/04/2569	68.3	102.8	7.2
27-28/04/2569	68.7	101.4	6.8
07-08/05/2569	67.1	103.5	8.0
14-15/05/2569	67.9	100.6	7.8
21-22/05/2569	67.6	101.7	6.7
26-27/05/2569	67.0	102.8	8.4
05-06/06/2569	67.9	97.4	7.3
08-09/06/2569	69.3	98.8	7.7
15-16/06/2569	68.1	100.1	6.7
23-24/06/2569	69.3	98.8	7.8
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
23-24/04/2568	**	**	**
24-25/04/2568	66.7	98.1	7.9
25-26/04/2568	64.6	92.4	6.9
26-27/04/2568	60.8	89.8	6.8
27-28/04/2568	61.4	95.7	7.3
28-29/04/2568	64.1	88.2	7.8
29-30/04/2568	59.8	94.2	6.7
30/04-01/05/2568	62.8	99.3	6.3
01-02/05/2568	*	*	*
02-03/05/2568	55.7	101.9	9.1
03-04/05/2568	56.6	91.1	8.3
04-05/05/2568	53.3	96.9	9.7
05-06/05/2568	53.5	91.9	4.5
06-07/05/2568	54.5	93.1	8.0
07-08/05/2568	54.9	81.2	7.6
08-09/05/2568	55.2	80.8	6.2
09-10/05/2568	54.2	82.6	6.6
10-11/05/2568	53.8	80.1	6.4
11-12/05/2568	55.3	98.5	6.8
12-13/05/2568	55.7	96.7	6.9
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2568 เป็นวันหยุดวันแรงงาน
** อยู่ระหว่างประสานงานขอติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
13-14/05/2568	54.0	82.5	8.3
14-15/05/2568	52.1	83.9	3.0
15-16/05/2568	53.3	87.1	4.3
16-17/05/2568	55.1	80.4	4.7
17-18/05/2568	54.1	89.4	3.7
18-19/05/2568	57.8	88.7	6.0
19-20/05/2568	53.1	85.7	4.6
20-21/05/2568	52.6	81.6	6.1
21-22/05/2568	57.5	84.9	4.7
22-23/05/2568	57.3	92.4	5.8
23-24/05/2568	54.3	95.7	6.1
24-25/05/2568	57.2	90.6	5.3
25-26/05/2568	57.8	89.8	3.1
26-27/05/2568	56.3	89.6	4.2
27-28/05/2568	57.8	91.1	5.5
28-29/05/2568	59.8	91.9	4.4
29-30/05/2568	59.6	84.9	6.6
30-31/05/2568	59.1	89.4	5.7
31/05-01/06/2568	59.4	99.6	5.8
01-02/06/2568	58.4	98.6	6.3
02-03/06/2568	59.4	99.1	6.5
03-04/06/2568	58.0	90.7	6.8
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
04-05/06/2568	59.6	97.8	6.9
05-06/06/2568	59.6	89.3	3.9
06-07/06/2568	59.1	89.3	6.7
07-08/06/2568	57.2	92.3	4.3
08-09/06/2568	59.5	89.2	5.2
09-10/06/2568	56.8	86.1	4.6
10-11/06/2568	57.4	86.5	4.8
11-12/06/2568	61.6	95.3	7.8
12-13/06/2568	61.6	90.9	7.7
13-14/06/2568	60.7	87.1	8.8
14-15/06/2568	57.8	90.4	7.7
15-16/06/2568	58.5	82.7	4.5
16-17/06/2568	59.4	86.1	7.6
17-18/06/2568	59.2	91.2	8.1
18-19/06/2568	57.6	92.4	6.7
19-20/06/2568	59.0	91.0	7.7
20-21/06/2568	58.9	95.5	6.6
21-22/06/2568	59.0	90.5	7.6
22-23/06/2568	57.2	88.2	6.4
23-24/06/2568	57.8	88.9	7.8
24-25/06/2568	58.9	92.4	7.0
25-26/06/2568	56.3	87.0	6.3
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
26-27/06/2568	59.2	87.3	4.4
27-28/06/2568	58.0	91.8	6.2
28-29/06/2568	58.3	87.2	6.5
29-30/06/2568	59.4	90.2	6.6
30/06-01/07/2568	58.3	87.5	6.9
01-02/07/2568	59.4	89.8	7.4
02-03/07/2568	60.2	92.1	6.1
03-04/07/2568	59.9	88.3	6.6
04-05/07/2568	61.3	91.6	8.6
05-06/07/2568	58.9	92.6	7.9
06-07/07/2568	58.9	91.4	8.9
07-08/07/2568	61.9	90.3	8.6
08-09/07/2568	59.6	90.3	6.9
09-10/07/2568	59.2	86.7	7.6
10-11/07/2568	59.8	94.1	9.2
11-12/07/2568	60.9	84.4	5.7
12-13/07/2568	59.2	87.6	8.2
13-14/07/2568	58.9	89.5	8.7
14-15/07/2568	60.6	89.8	7.0
15-16/07/2568	60.2	99.4	7.7
16-17/07/2568	59.7	94.0	7.1
17-18/07/2568	64.8	91.3	4.4
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
18-19/07/2568	64.3	92.4	4.6
19-20/07/2568	62.3	86.7	4.5
20-21/07/2568	63.9	95.5	4.2
21-22/07/2568	63.6	92.2	4.6
22-23/07/2568	64.7	95.0	4.6
23-24/07/2568	64.1	92.2	4.6
24-25/07/2568	63.7	96.6	7.3
25-26/07/2568	61.1	88.4	6.8
26-27/07/2568	60.4	89.4	5.4
27-28/07/2568	57.2	94.2	5.1
28-29/07/2568	*	*	*
29-30/07/2568	62.9	93.5	7.1
30-31/07/2568	63.2	95.7	9.7
31/07-01/08/2568	60.6	91.0	8.8
01-02/08/2568	61.9	90.1	7.6
02-03/08/2568	60.1	95.3	7.0
03-04/08/2568	61.2	90.3	6.3
04-05/08/2568	61.5	92.3	5.9
05-06/08/2568	61.1	91.5	8.1
06-07/08/2568	63.9	95.1	8.3
07-08/08/2568	65.9	96.8	7.0
08-09/08/2568	65.2	99.4	6.8
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
09-10/08/2568	64.7	96.3	7.1
10-11/08/2568	60.1	83.2	8.6
11-12/08/2568	62.5	92.4	6.5
12-13/08/2568	*	*	*
13-14/08/2568	64.3	94.5	7.9
14-15/08/2568	64.2	96.0	6.3
15-16/08/2568	64.7	95.9	6.8
16-17/08/2568	63.6	90.1	6.2
17-18/08/2568	61.5	93.7	5.0
18-19/08/2568	63.2	93.5	6.8
19-20/08/2568	63.1	94.5	6.8
20-21/08/2568	62.6	93.3	8.6
21-22/08/2568	63.8	94.8	6.7
22-23/08/2568	63.9	103.6	6.9
23-24/08/2568	63.7	93.8	7.1
24-25/08/2568	60.0	86.6	7.2
25-26/08/2568	63.6	94.4	6.6
26-27/08/2568	62.7	88.3	7.0
27-28/08/2568	65.0	93.9	7.2
28-29/08/2568	64.8	99.6	7.8
29-30/08/2568	64.6	89.5	7.8
30-31/08/2568	61.0	91.4	8.9
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
31/08-01/09/2568	60.0	89.1	8.3
01-02/09/2568	62.5	99.1	8.2
02-03/09/2568	64.5	90.9	7.8
03-04/09/2568	65.6	96.1	8.9
04-05/09/2568	64.8	98.1	7.4
05-06/09/2568	60.8	90.1	8.4
06-07/09/2568	60.7	89.2	8.7
07-08/09/2568	61.9	91.3	7.2
08-09/09/2568	61.7	87.4	7.5
09-10/09/2568	61.8	99.7	7.1
10-11/09/2568	62.9	92.3	5.5
11-12/09/2568	62.0	92.9	7.7
12-13/09/2568	62.9	99.2	7.1
13-14/09/2568	62.8	90.9	6.4
14-15/09/2568	62.8	93.5	8.5
15-16/09/2568	62.0	87.0	5.9
16-17/09/2568	61.6	85.0	7.7
17-18/09/2568	62.1	87.4	6.7
18-19/09/2568	61.2	89.6	5.5
19-20/09/2568	61.3	87.1	7.6
20-21/09/2568	61.0	86.6	7.7
21-22/09/2568	61.2	85.7	7.9
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
22-23/09/2568	64.6	88.4	5.4
23-24/09/2568	62.9	95.8	6.2
24-25/09/2568	62.5	98.8	5.7
25-26/09/2568	62.3	87.1	5.6
26-27/09/2568	61.7	86.2	7.2
27-28/09/2568	61.4	87.1	6.3
28-29/09/2568	62.0	86.7	6.7
29-30/09/2568	61.1	86.7	6.8
30/09-01/10/2568	60.6	86.5	6.2
01-02/10/2568	62.4	88.1	5.8
02-03/10/2568	62.3	97.4	6.1
03-04/10/2568	61.6	94.7	6.9
04-05/10/2568	61.1	94.0	7.2
05-06/10/2568	62.0	94.5	7.6
06-07/10/2568	61.7	94.3	8.0
07-08/10/2568	62.1	92.0	7.0
08-09/10/2568	61.4	93.4	6.7
09-10/10/2568	62.4	91.2	8.2
10-11/10/2568	62.3	93.6	7.9
11-12/10/2568	63.9	91.4	5.9
12-13/10/2568	63.6	96.3	6.6
13-14/10/2568	*	*	*
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
14-15/10/2568	63.5	92.3	7.2
15-16/10/2568	64.1	96.2	6.7
16-17/10/2568	62.5	95.2	5.3
17-18/10/2568	63.4	98.7	5.9
18-19/10/2568	63.3	98.6	6.7
19-20/10/2568	63.2	97.1	6.7
20-21/10/2568	63.0	98.3	6.0
21-22/10/2568	63.4	99.2	5.2
22-23/10/2568	62.9	96.2	5.2
23-24/10/2568	*	*	*
24-25/10/2568	62.7	98.6	6.5
25-26/10/2568	63.1	90.1	6.7
26-27/10/2568	62.3	97.0	5.9
27-28/10/2568	62.3	90.0	7.2
28-29/10/2568	62.1	90.8	6.1
29-30/10/2568	62.8	91.3	7.6
30-31/10/2568	63.1	90.2	6.2
31/10-01/11/2568	62.5	91.2	6.3
01-02/11/2568	61.7	93.1	6.6
02-03/11/2568	63.4	94.0	6.1
03-04/11/2568	62.6	93.6	8.1
04-05/11/2568	62.4	94.9	6.2
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
05-06/11/2568	63.4	93.7	6.3
06-07/11/2568	64.1	89.5	7.1
07-08/11/2568	63.2	92.2	7.6
08-09/11/2568	60.8	90.1	7.8
09-10/11/2568	62.3	90.2	7.8
10-11/11/2568	62.6	94.5	7.2
11-12/11/2568	62.1	96.3	6.4
12-13/11/2568	62.0	105.6	7.8
13-14/11/2568	62.3	91.7	7.7
14-15/11/2568	62.4	91.5	7.4
15-16/11/2568	62.9	89.4	6.6
16-17/11/2568	63.0	91.3	6.8
17-18/11/2568	63.5	93.1	7.8
18-19/11/2568	63.7	92.4	6.9
19-20/11/2568	64.0	93.4	6.1
20-21/11/2568	65.7	95.1	7.1
21-22/11/2568	64.9	90.1	6.5
22-23/11/2568	64.5	87.9	4.3
23-24/11/2568	64.8	94.2	5.1
24-25/11/2568	65.0	92.0	6.2
25-26/11/2568	64.6	96.3	5.2
26-27/11/2568	64.2	88.5	5.9
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
27-28/11/2568	64.4	93.0	7.0
28-29/11/2568	65.8	95.9	5.6
29-30/11/2568	64.1	93.4	5.6
30/11-01/12/2568	64.0	91.2	6.1
01-02/12/2568	63.5	89.7	5.8
02-03/12/2568	63.7	88.2	7.0
03-04/12/2568	63.2	89.5	6.3
04-05/12/2568	63.6	91.3	6.8
05-06/12/2568	*	*	*
06-07/12/2568	63.3	89.2	6.2
07-08/12/2568	63.4	89.9	6.4
08-09/12/2568	65.9	98.3	6.4
09-10/12/2568	65.5	99.6	6.9
10-11/12/2568	*	*	*
11-12/12/2568	63.8	98.3	5.8
12-13/12/2568	63.1	93.9	5.9
13-14/12/2568	63.0	90.1	6.2
14-15/12/2568	64.6	91.4	6.5
15-16/12/2568	64.2	91.1	6.9
16-17/12/2568	64.3	88.4	8.0
17-18/12/2568	64.6	88.4	7.0
18-19/12/2568	65.0	95.4	6.6
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
19-20/12/2568	64.7	90.2	5.1
20-21/12/2568	63.9	97.7	6.8
21-22/12/2568	64.2	86.1	6.6
22-23/12/2568	63.7	94.8	6.4
23-24/12/2568	64.7	91.1	6.7
24-25/12/2568	64.6	90.1	6.6
25-26/12/2568	64.5	91.2	6.4
26-27/12/2568	64.1	90.0	6.6
27-28/12/2568	63.9	93.7	6.9
28-29/12/2568	64.2	88.4	5.8
29-30/12/2568	63.9	96.3	5.7
30-31/12/2568	*	*	*
31/12/2568-01/01/2569	*	*	*
01-02/01/2569	*	*	*
02-03/01/2569	*	*	*
03-04/01/2569	*	*	*
04-05/01/2569	*	*	*
05-06/01/2569	62.3	90.5	7.0
06-07/01/2569	62.5	97.8	7.7
07-08/01/2569	62.9	101.2	5.4
08-09/01/2569	63.3	91.3	7.3
09-10/01/2569	63.7	94.7	6.5
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.6.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
10-11/01/2569	62.2	92.6	6.3
11-12/01/2569	61.3	90.6	4.7
12-13/01/2569	64.1	95.3	5.5
13-14/01/2569	64.0	95.6	5.0
14-15/01/2569	64.8	97.0	6.1
15-16/01/2569	65.4	93.2	6.3
16-17/01/2568	66.7	102.3	6.2
17-18/01/2568	65.8	101.5	6.0
18-19/01/2568	64.0	103.7	5.0
19-20/01/2568	66.1	96.3	5.3
20-21/01/2568	66.2	100.4	5.3
21-22/01/2568	66.3	96.3	5.8
22-23/01/2568	64.0	99.6	6.0
23-24/01/2568	63.9	97.9	6.3
24-25/01/2568	62.7	94.5	4.9
25-26/01/2568	62.8	90.4	5.2
26-27/01/2568	63.4	93.6	5.3
27-28/01/2568	64.3	96.9	5.1
28-29/01/2568	64.2	97.3	6.0
29-30/01/2568	63.9	88.7	6.4
30-31/01/2568	63.7	88.7	6.4
31/01-01/02/2569	63.1	92.2	6.5
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/02/2569	62.4	89.6	5.5
02-03/02/2569	63.7	94.7	6.5
03-04/02/2569	63.9	99.5	6.8
04-05/02/2569	64.0	91.3	6.6
05-06/02/2569	64.7	93.6	5.6
06-07/02/2569	63.9	96.2	6.2
07-08/02/2569	64.5	96.2	6.1
08-09/02/2569	64.6	97.0	6.7
09-10/02/2569	64.1	97.4	7.2
10-11/02/2569	65.5	93.3	6.9
11-12/02/2569	65.0	93.1	7.6
12-13/02/2569	64.8	93.6	5.3
13-14/02/2569	65.0	96.7	6.4
14-15/02/2569	65.6	89.8	6.8
15-16/02/2569	64.2	88.0	5.3
16-17/02/2569	63.4	94.1	5.4
17-18/02/2569	64.7	92.3	5.5
18-19/02/2569	63.5	93.4	6.1
19-20/02/2569	64.9	94.5	6.4
20-21/02/2569	64.8	97.1	5.0
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
21-22/02/2569	64.9	96.1	5.4
22-23/02/2569	64.4	90.3	5.7
23-24/02/2569	63.9	97.4	6.9
24-25/02/2569	64.2	96.4	6.7
25-26/02/2569	64.5	94.4	5.7
26-27/02/2569	64.4	97.5	6.8
27-28/02/2569	64.7	89.0	5.2
28/02-01/03/2569	64.9	92.5	5.5
01-02/03/2569	64.6	87.3	7.5
02-03/03/2569	63.9	88.7	6.2
03-04/03/2569	*	*	*
04-05/03/2569	64.1	90.1	5.7
05-06/03/2569	64.2	86.1	4.3
06-07/03/2569	63.3	86.3	6.9
07-08/03/2569	63.4	84.5	7.1
08-09/03/2569	63.2	87.1	5.8
09-10/03/2569	64.7	86.9	5.9
10-11/03/2569	64.7	86.3	6.7
11-12/03/2569	64.6	86.9	6.5
12-13/03/2569	64.7	91.5	5.7
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
* ไม่มีการตรวจวัดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
13-14/03/2569	63.8	87.5	6.3
14-15/03/2569	63.7	92.0	7.1
15-16/03/2569	62.8	87.0	4.9
16-17/03/2569	63.6	93.6	4.0
17-18/03/2569	63.4	84.5	6.3
18-19/03/2569	64.5	86.3	4.1
19-20/03/2569	64.0	85.6	5.1
20-21/03/2569	63.5	92.3	5.0
21-22/03/2569	65.4	94.4	4.6
22-23/03/2569	64.8	90.0	3.9
23-24/03/2569	64.4	89.9	4.2
24-25/03/2569	64.0	91.8	6.4
25-26/03/2569	63.5	89.2	6.8
26-27/03/2569	64.3	89.6	4.8
27-28/03/2569	64.1	95.3	5.8
28-29/03/2569	65.7	89.5	4.4
29-30/03/2569	65.1	86.3	4.3
30-31/03/2569	64.3	89.2	6.1
31/03-01/04/2569	64.5	89.3	6.0
01-02/04/2569	64.1	91.4	5.2
02-03/04/2569	64.2	92.0	5.4
มาตรฐาน	**70.0** [1]	**115.0** [1]	**10.0** [2]

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน


หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
03-04/04/2569	63.9	89.8	4.7
06-07/04/2569	61.5	91.4	4.2
16-17/04/2569	61.9	85.6	6.2
20-21/04/2569	62.1	90.1	6.1
27-28/04/2569	62.3	91.2	5.0
07-08/05/2569	62.4	86.9	6.6
14-15/05/2569	63.0	87.2	4.5
21-22/05/2569	62.2	85.9	4.7
26-27/05/2569	61.6	86.9	5.2
05-06/06/2569	62.5	90.1	5.1
08-09/06/2569	62.8	86.9	5.3
15-16/06/2569	62.4	89.1	4.8
23-24/06/2569	63.3	91.1	6.1
มาตรฐาน	**70.0** [(1)]	**115.0** [(1)]	**10.0** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน


หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด
dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

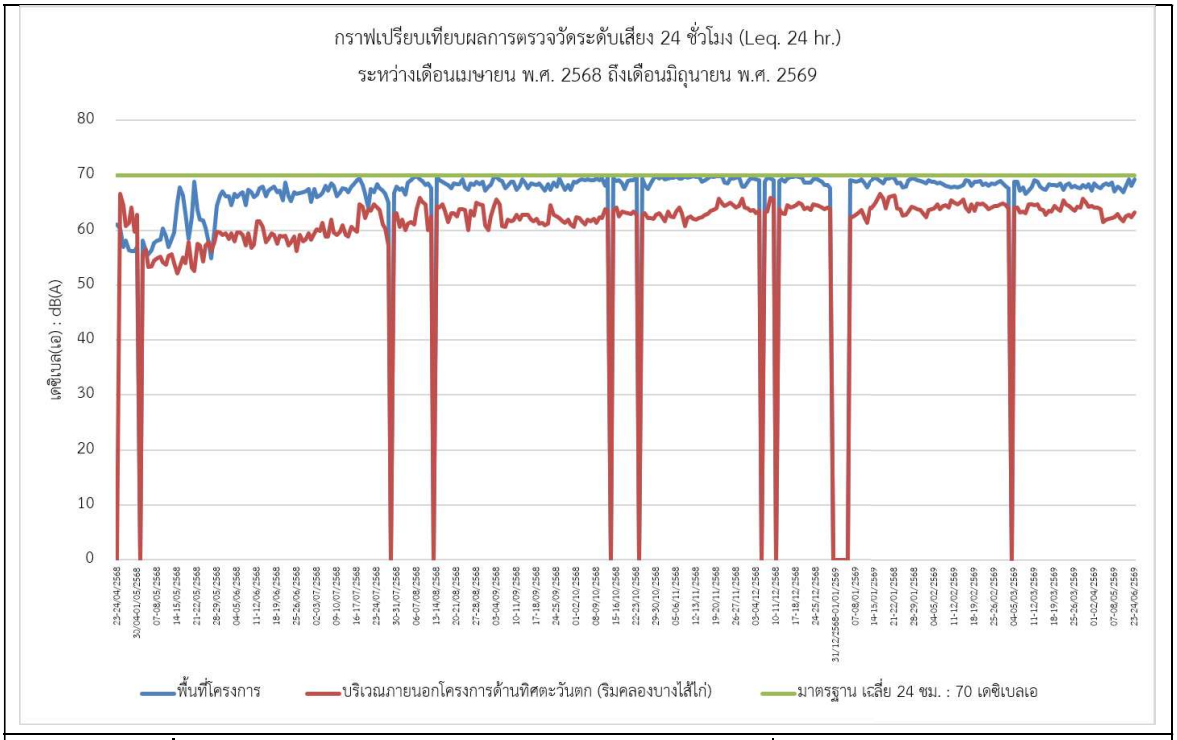

รูปที่ 4-28 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

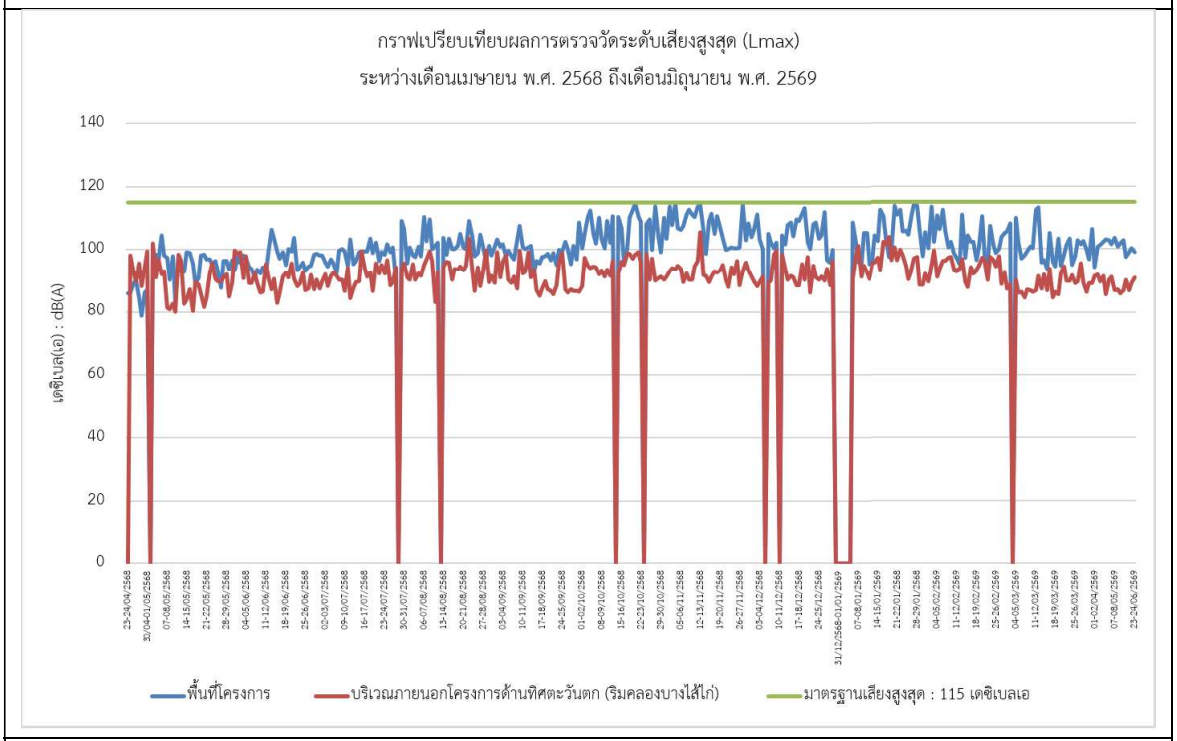

รูปที่ 4-29 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) ระดับเสียงดังสูงสุดของ (Lmax) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

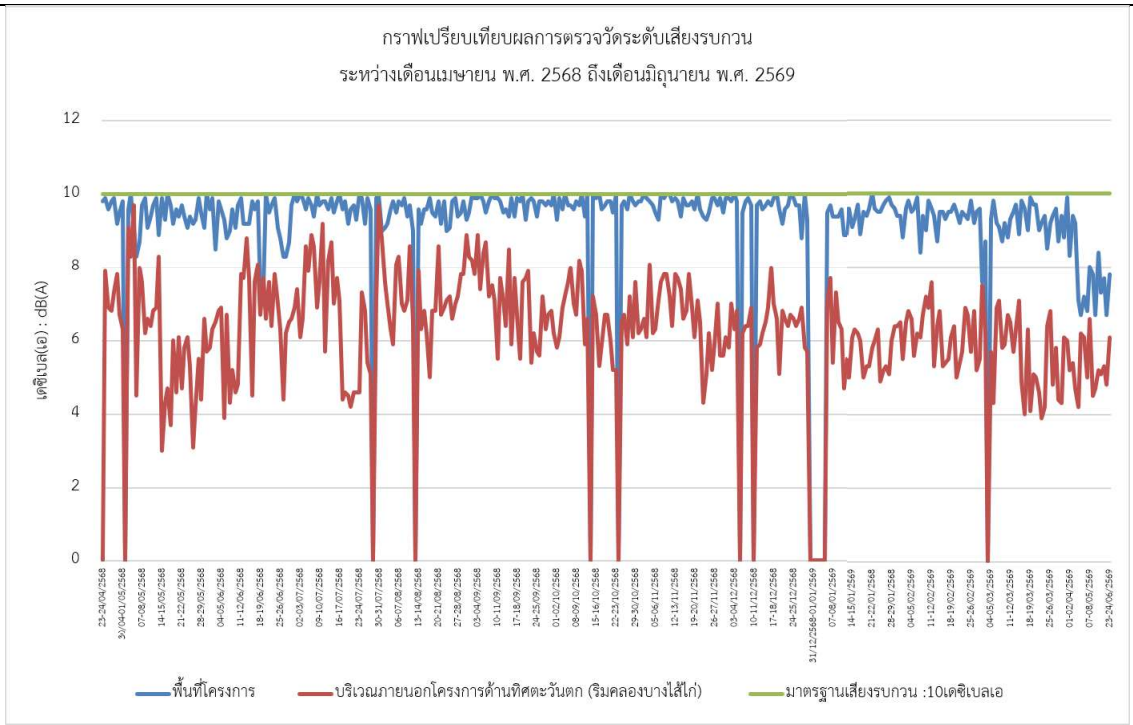

รูปที่ 4-30 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

4.6.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รายละเอียดรายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.6.3-1**

ตารางที่ 4.6.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
23-24/04/2568	แนวแกนยาว	2.948	5.2	5.000
24-25/04/2568	แนวแกนดิ่ง	2.309	8.9	5.000
25-26/04/2568	แนวแกนดิ่ง	3.429	5.9	5.000
26-27/04/2568	แนวแกนดิ่ง	0.749	5.2	5.000
27-28/04/2568	แนวแกนดิ่ง	2.484	7.8	5.000
28-29/04/2568	แนวแกนดิ่ง	1.316	7.8	5.000
29-30/04/2568	แนวแกนดิ่ง	2.461	6.1	5.000
30/04-01/05/2568	แนวแกนดิ่ง	0.958	5.6	5.000
01-02/05/2568	-	*	*	*
02-03/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.119	3.8	5.000
03-04/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.860	10.8	5.200
04-05/05/2568	แนวแกนดิ่ง	0.971	3.3	5.000
05-06/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.751	6.3	5.000
06-07/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.263	6.0	5.000
07-08/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.261	7.2	5.000
08-09/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.236	6.9	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

* ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2568 เป็นวันหยุดวันแรงงาน

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
09-10/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.325	8.1	5.000
10-11/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.256	7.2	5.000
11-12/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.331	6.2	5.000
12-13/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.710	6.1	5.000
13-14/05/2568	แนวแกนดิ่ง	2.798	6.6	5.000
14-15/05/2568	แนวแกนดิ่ง	4.004	5.3	5.000
15-16/05/2568	แนวแกนดิ่ง	2.254	9.8	5.000
16-17/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.250	8.9	5.000
17-18/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.340	4.9	5.000
18-19/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.250	5.6	5.000
19-20/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.718	6.1	5.000
20-21/05/2568	แนวแกนดิ่ง	0.895	6.2	5.000
21-22/05/2568	แนวแกนดิ่ง	2.365	7.6	5.000
22-23/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.923	6.2	5.000
23-24/05/2568	แนวแกนดิ่ง	2.010	6.1	5.000
24-25/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.266	5.1	5.000
25-26/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.352	4.1	5.000
26-27/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.325	4.1	5.000
27-28/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.421	4.8	5.000
28-29/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.254	4.8	5.000
29-30/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.332	5.8	5.000
30-31/05/2568	แนวแกนดิ่ง	1.970	8.8	5.000
31/05-01/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.986	6.6	5.000
01-02/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.025	5.1	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
02-03/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.892	6.5	5.000
03-04/06/2568	แนวแกนดิ่ง	2.475	3.7	5.000
04-05/06/2568	แนวแกนดิ่ง	4.020	6.2	5.000
05-06/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.781	6.1	5.000
06-07/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.829	5.5	5.000
07-08/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.625	3.2	5.000
08-09/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.458	6.3	5.000
09-10/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.592	5.2	5.000
10-11/06/2568	แนวแกนดิ่ง	4.335	9.3	5.000
11-12/06/2568	แนวแกนดิ่ง	3.831	6.0	5.000
12-13/06/2568	แนวแกนดิ่ง	2.656	9.6	5.000
13-14/06/2568	แนวแกนดิ่ง	2.246	5.1	5.000
14-15/06/2568	แนวแกนดิ่ง	3.373	7.1	5.000
15-16/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.235	5.6	5.000
16-17/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.023	2.3	5.000
17-18/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.236	5.8	5.000
18-19/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.584	3.9	5.000
19-20/06/2568	แนวแกนดิ่ง	4.571	7.9	5.000
20-21/06/2568	แนวแกนดิ่ง	2.191	6.0	5.000
21-22/06/2568	แนวแกนดิ่ง	2.010	4.6	5.000
22-23/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.244	5.9	5.000
23-24/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.321	5.9	5.000
24-25/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.236	4.5	5.000
25-26/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.513	5.6	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
26-27/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.026	5.6	5.000
27-28/06/2568	แนวแกนดิ่ง	0.678	5.9	5.000
28-29/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.214	6.9	5.000
29-30/06/2568	แนวแกนดิ่ง	1.023	6.7	5.000
30/06-01/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.474	7.6	5.000
01-02/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.214	7.8	5.000
02-03/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.419	6.4	5.000
03-04/07/2568	แนวแกนดิ่ง	4.106	4.9	5.000
04-05/07/2568	แนวแกนดิ่ง	2.341	5.8	5.000
05-06/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.214	6.9	5.000
06-07/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.023	6.7	5.000
07-08/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.302	9.6	5.000
08-09/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.365	8.9	5.000
09-10/07/2568	แนวแกนดิ่ง	4.122	5.6	5.000
10-11/06/2568	แนวแกนดิ่ง	2.199	4.9	5.000
11-12/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.217	3.6	5.000
12-13/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.017	> 100	20.000
13-14/07/2568	แนวแกนดิ่ง	0.969	10.8	5.200
14-15/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.647	5.1	5.000
15-16/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.214	7.8	5.000
16-17/07/2568	แนวแกนดิ่ง	3.626	4.6	5.000
17-18/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.679	26.0	9.000
18-19/07/2568	แนวแกนดิ่ง	2.380	4.9	5.000
19-20/07/2568	แนวแกนดิ่ง	0.370	45.0	13.750

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
20-21/07/2568	แนวแกนดิ่ง	4.177	4.3	5.000
21-22/07/2568	แนวแกนดิ่ง	2.877	6.3	5.000
22-23/07/2568	แนวแกนดิ่ง	2.081	5.7	5.000
23-24/07/2568	แนวแกนดิ่ง	3.815	6.2	5.000
24-25/07/2568	แนวแกนดิ่ง	0.985	5.4	5.000
25-26/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.526	5.8	5.000
26-27/07/2568	แนวแกนดิ่ง	1.326	3.6	5.000
27-28/07/2568	แนวแกนดิ่ง	0.947	5.8	5.000
28-29/07/2568	*	*	*	*
29-30/07/2568	แนวแกนดิ่ง	0.481	9.8	5.000
30-31/07/2568	แนวแกนตามขวาง	2.097	47.0	14.250
31/07-01/08/2568	แนวแกนดิ่ง	0.891	4.1	5.000
01-02/08/2568	แนวแกนดิ่ง	0.784	4.9	5.000
02-03/08/2568	แนวแกนดิ่ง	2.467	6.2	5.000
03-04/08/2568	แนวแกนดิ่ง	3.878	4.0	5.000
04-05/08/2568	แนวแกนดิ่ง	0.971	5.2	5.000
05-06/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.028	5.9	5.000
06-07/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.332	6.5	5.000
07-08/08/2568	แนวแกนดิ่ง	3.381	4.8	5.000
08-09/08/2568	แนวแกนดิ่ง	2.861	4.1	5.000
09-10/08/2568	แนวแกนดิ่ง	2.609	12.6	5.650
10-11/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.235	8.7	5.000
11-12/08/2568	แนวแกนดิ่ง	4.264	5.2	5.000
12-13/08/2568	*	*	*	*

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
13-14/08/2568	แนวแกนดิ่ง	3.192	4.8	5.000
14-15/08/2568	แนวแกนดิ่ง	3.192	4.8	5.000
15-16/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.103	9.7	5.000
16-17/08/2568	แนวแกนดิ่ง	3.870	5.9	5.000
17-18/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.141	7.9	5.000
18-19/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.466	5.5	5.000
19-20/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.939	5.4	5.000
20-21/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.805	4.4	5.000
21-22/08/2568	แนวแกนดิ่ง	2.081	8.3	5.000
22-23/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.907	4.9	5.000
23-24/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.356	4.9	5.000
24-25/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.395	5.6	5.000
25-26/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.939	5.1	5.000
26-27/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.561	7.1	5.000
27-28/08/2568	แนวแกนดิ่ง	2.136	7.0	5.000
28-29/08/2568	แนวแกนดิ่ง	3.531	3.8	5.000
29-30/08/2568	แนวแกนดิ่ง	3.712	5.8	5.000
30-31/08/2568	แนวแกนดิ่ง	1.608	5.5	5.000
31/08-01/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.430	4.7	5.000
01-02/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.524	7.9	5.000
02-03/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.816	13.3	5.825
03-04/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.926	5.9	5.000
04-05/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.406	12.2	5.550
05-06/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.729	7.3	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
06-07/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.122	6.3	5.000
07-08/09/2568	แนวแกนดิ่ง	3.184	7.7	5.000
08-09/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.774	7.6	5.000
09-10/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.138	6.4	5.000
10-11/09/2568	แนวแกนดิ่ง	1.364	4.1	5.000
11-12/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.122	17.1	6.775
12-13/09/2568	แนวแกนดิ่ง	3.295	6.3	5.000
13-14/09/2568	แนวแกนดิ่ง	1.265	7.4	5.000
14-15/09/2568	แนวแกนดิ่ง	1.325	8.7	5.000
15-16/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.321	9.4	5.000
16-17/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.140	7.2	5.000
17-18/09/2568	แนวแกนดิ่ง	1.655	6.4	5.000
18-19/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.141	8.4	5.000
19-20/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.021	9.0	5.000
20-21/09/2568	แนวแกนดิ่ง	1.734	6.0	5.000
21-22/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.365	5.8	5.000
22-23/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.516	8.9	5.000
23-24/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.325	10.9	5.225
24-25/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.201	5.9	5.000
25-26/09/2568	แนวแกนดิ่ง	4.824	13.7	5.925
26-27/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.680	7.2	5.000
27-28/09/2568	แนวแกนดิ่ง	2.908	7.0	5.000
28-29/09/2568	แนวแกนดิ่ง	1.616	6.0	5.000
29-30/09/2568	แนวแกนดิ่ง	1.843	6.4	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
30/09-01/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.100	7.8	5.000
01-02/10/2568	แนวแกนดิ่ง	4.240	14.8	6.200
02-03/10/2568	แนวแกนดิ่ง	4.343	9.5	5.000
03-04/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.964	2.9	5.000
04-05/10/2568	แนวแกนดิ่ง	1.836	8.8	5.000
05-06/10/2568	แนวแกนดิ่ง	4.343	85.0	18.500
06-07/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.845	> 100	20.000
07-08/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.136	24.0	8.500
08-09/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.236	7.1	5.000
09-10/10/2568	แนวแกนดิ่ง	3.263	> 100	20.000
10-11/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.325	> 100	20.000
11-12/10/2568	แนวแกนดิ่ง	3.232	> 100	20.000
12-13/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.073	> 100	20.000
13-14/10/2568	*	*	*	*
14-15/10/2568	แนวแกนตามขวาง	3.917	> 100	20.000
15-16/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.696	3.0	5.000
16-17/10/2568	แนวแกนดิ่ง	4.650	6.2	5.000
17-18/10/2568	แนวแกนดิ่ง	3.224	3.6	5.000
18-19/10/2568	แนวแกนดิ่ง	4.902	64.0	16.400
19-20/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.396	54.0	15.400
20-21/10/2568	แนวแกนดิ่ง	3.500	22.0	8.000
21-22/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.459	8.7	5.000
22-23/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.250	5.6	5.000
23-24/10/2568	*	*	*	*

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
24-25/10/2568	แนวแกนดิ่ง	4.374	45.0	13.750
25-26/10/2568	แนวแกนดิ่ง	3.137	4.1	5.000
26-27/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.254	6.8	5.000
27-28/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.236	8.0	5.000
28-29/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.201	9.6	5.000
29-30/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.262	10.0	5.000
30-31/10/2568	แนวแกนดิ่ง	2.201	7.8	5.000
31/10-01/11/2568	แนวแกนดิ่ง	2.174	8.9	5.000
01-02/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.508	5.6	5.000
02-03/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.484	5.6	5.000
03-04/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.816	> 100	20.000
04-05/11/2568	แนวแกนดิ่ง	1.907	6.2	5.000
05-06/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.255	57.0	15.700
06-07/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.477	7.6	5.000
07-08/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.075	45.0	13.750
08-09/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.737	7.8	5.000
09-10/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.437	12.8	5.700
10-11/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.934	6.2	5.000
11-12/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.917	68.0	16.800
12-13/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.351	54.0	15.400
13-14/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.895	37.0	11.750
14-15/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.847	54.0	15.400
15-16/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.200	12.8	5.700
16-17/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.209	23.0	8.250

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
17-18/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.168	> 100	20.000
18-19/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.965	2.9	5.000
19-20/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.099	60.0	16.000
20-21/11/2568	แนวแกนดิ่ง	2.861	6.0	5.000
21-22/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.011	3.4	5.000
22-23/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.855	4.1	5.000
23-24/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.342	6.7	5.000
24-25/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.808	8.8	5.000
25-26/11/2568	แนวแกนดิ่ง	4.761	51.0	15.100
26-27/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.783	> 100	20.000
27-28/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.184	57.0	15.700
28-29/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.287	60.0	16.000
29-30/11/2568	แนวแกนดิ่ง	3.405	79.0	17.900
30/11-01/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.594	> 100	20.000
01-02/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.601	21.0	7.750
02-03/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.626	43.0	13.250
03-04/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.452	68.0	16.800
04-05/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.846	73.0	17.300
05-06/12/2568	*	*	*	*
06-07/12/2568	แนวแกนดิ่ง	4.816	54.0	15.400
07-08/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.870	3.6	5.000
08-09/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.641	3.6	5.000
09-10/12/2568	แนวแกนดิ่ง	4.177	3.1	5.000
10-11/12/2568	*	*	*	*

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
11-12/12/2568	แนวแกนดิ่ง	4.288	> 100	20.000
12-13/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.318	15.8	6.450
13-14/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.358	14.8	6.200
14-15/12/2568	แนวแกนดิ่ง	3.744	43.0	13.250
15-16/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.250	5.8	5.000
16-17/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.360	7.0	5.000
17-18/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.366	9.4	5.000
18-19/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.633	4.1	5.000
19-20/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.336	6.9	5.000
20-21/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.326	9.1	5.000
21-22/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.620	6.8	5.000
22-23/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.204	7.8	5.000
23-24/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.125	8.0	5.000
24-25/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.174	7.0	5.000
25-26/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.102	8.4	5.000
26-27/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.014	8.4	5.000
27-28/12/2568	แนวแกนดิ่ง	1.955	4.5	5.000
28-29/12/2568	แนวแกนดิ่ง	1.853	7.5	5.000
29-30/12/2568	แนวแกนดิ่ง	2.052	8.1	5.000
30-31/12/2568	*	*	*	*
31/12/2568-01/01/2569	*	*	*	*
01-02/01/2569	-	*	*	-
02-03/01/2569	-	*	*	-
03-04/01/2569	-	*	*	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.6.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
04-05/01/2569	-	*	*	-
05-06/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.125	8.7	5.000
06-07/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.236	6.3	5.000
07-08/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.526	4.1	5.000
08-09/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.151	6.5	5.000
09-10/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.120	8.9	5.000
10-11/01/2569	แนวแกนดิ่ง	1.898	5.6	5.000
11-12/01/2569	แนวแกนดิ่ง	1.856	5.6	5.000
12-13/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.102	7.9	5.000
13-14/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.236	8.9	5.000
14-15/01/2569	แนวแกนดิ่ง	2.141	8.6	5.000
15-16/01/2569	แนวแกนดิ่ง	1.598	5.1	5.000
16-17/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.874	7.8	5.000
17-18/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.536	6.3	5.000
18-19/01/2568	แนวแกนดิ่ง	2.201	8.7	5.000
19-20/01/2568	แนวแกนดิ่ง	2.044	5.8	5.000
20-21/01/2568	แนวแกนดิ่ง	2.541	8.9	5.000
21-22/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.895	5.4	5.000
22-23/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.623	7.0	5.000
23-24/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.126	4.8	5.000
24-25/01/2568	แนวแกนดิ่ง	4.225	43.0	13.250
25-26/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.701	5.3	5.000
26-27/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.954	6.4	5.000
27-28/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.316	> 100	20.000
28-29/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.237	4.1	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

* ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากวันที่ 01 - 04 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นวันหยุดปีใหม่

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
29-30/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.080	4.3	5.000
30-31/01/2568	แนวแกนดิ่ง	1.403	3.3	5.000
31/01-01/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.765	5.8	5.000
01-02/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.389	7.9	5.000
02-03/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.056	3.3	5.000
03-04/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.036	5.8	5.000
04-05/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.569	7.6	5.000
05-06/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.174	4.1	5.000
06-07/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.773	51.0	15.100
07-08/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.041	7.9	5.000
08-09/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.560	8.7	5.000
09-10/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.889	8.7	5.000
10-11/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.977	6.9	5.000
11-12/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.009	7.8	5.000
12-13/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.190	6.7	5.000
13-14/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.899	5.8	5.000
14-15/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.520	8.0	5.000
15-16/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.591	3.8	5.000
16-17/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.245	24.0	8.500
17-18/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.357	3.6	5.000
18-19/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.725	9.4	5.000
19-20/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.600	3.6	5.000
20-21/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.505	3.8	5.000
21-22/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.158	9.7	5.000
22-23/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.096	7.8	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
23-24/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.011	6.4	5.000
24-25/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.144	> 100	20.000
25-26/02/2569	แนวแกนยาว	3.050	1.3	5.000
26-27/02/2569	แนวแกนดิ่ง	1.565	5.2	5.000
27-28/02/2569	แนวแกนดิ่ง	2.380	4.8	5.000
28/02-01/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.026	8.4	5.000
01-02/03/2569	แนวแกนยาว	4.650	1.7	5.000
02-03/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.678	5.6	5.000
03-04/03/2569	-	*	*	-
04-05/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.324	6.8	5.000
05-06/03/2569	แนวแกนยาว	0.938	51.0	15.100
06-07/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.624	4.5	5.000
07-08/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.647	3.4	5.000
08-09/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.600	> 100	20.000
09-10/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.316	4.1	5.000
10-11/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.088	4.5	5.000
11-12/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.230	3.3	5.000
12-13/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.868	64.0	16.400
13-14/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.836	3.7	5.000
14-15/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.434	3.8	5.000
15-16/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.325	5.6	5.000
16-17/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.268	5.2	5.000
17-18/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.025	3.2	5.000
18-19/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.301	3.1	5.000
19-20/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.237	3.6	5.000
20-21/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.261	3.1	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
21-22/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.655	4.2	5.000
22-23/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.241	8.6	5.000
23-24/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.033	57.0	15.700
24-25/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.250	6.9	5.000
25-26/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.252	6.5	5.000
26-27/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.200	4.1	5.000
27-28/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.253	6.8	5.000
28-29/03/2569	แนวแกนดิ่ง	2.610	6.7	5.000
29-30/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.205	6.2	5.000
30-31/03/2569	แนวแกนดิ่ง	1.302	3.6	5.000
31/03-01/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.204	6.8	5.000
01-02/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.041	7.8	5.000
02-03/04/2569	แนวแกนดิ่ง	1.205	5.8	5.000
03-04/04/2569	แนวแกนดิ่ง	1.223	5.6	5.000
06-07/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.014	6.8	5.000
16-17/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.201	6.2	5.000
20-21/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.085	7.7	5.000
27-28/04/2569	แนวแกนดิ่ง	2.155	8.4	5.000
07-08/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.696	4.8	5.000
14-15/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.357	4.1	5.000
21-22/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.948	4.4	5.000
26-27/05/2569	แนวแกนดิ่ง	2.522	5.0	5.000
05-06/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.044	7.5	5.000
08-09/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.156	6.7	5.000
15-16/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.073	7.4	5.000
23-24/06/2569	แนวแกนดิ่ง	2.038	6.8	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

4.6.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการศุภาลัย ธาม เจริญนคร (Supalai Tyme Charoen Nakhon) (ระยะก่อสร้าง) โดยทำการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง**ตารางที่** 4.6.4

ตารางที่ 4.6.4-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด					มาตรฐาน
		สิงหาคม 2568	กันยายน 2568	ตุลาคม 2568	พฤศจิกายน 2568	ธันวาคม 2568	
pH	-	7.8	*	7.9	7.6	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	149	*	186	135	222	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	< 5.0	*	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	< 2.0	*	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 30
Sulfide	mg/L	< 2.0	*	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 1.0
Oil and Grease	mg/L	< 0.60	*	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 20
Settleable Solids	mL/L	< 0.1	*	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	< 0.28	*	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35


มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคารประเภท ข

* ในระหว่างเดือนกันยายน ไม่สามารถทำการเก็บตัวอย่างน้ำได้ เนื่องจากทางโครงการมีการรื้อบ่อพักน้ำเพื่อปรับหน้าดินพื้นที่โครงการ


ตารางที่ 4.6.4-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน
		มกราคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569	เมษายน 2569	พฤษภาคม 2569	มิถุนายน 2569	
pH at 24.8 °C	-	7.4	7.8	10.4	7.8	7.4	8.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	< 5.0	< 5.0	83.4	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	127	218	278	108	133	114	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	< 2.0	< 2.0	52.8	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 30
Sulfide	mg/L	< 0.60	< 0.60	2.74	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease	mg/L	< 2.0	< 2.0	2.1	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20
Settleable Solids	mL/L	< 0.1	< 0.1	0.9	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	< 0.28	< 0.28	13	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35


มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคารประเภท ข

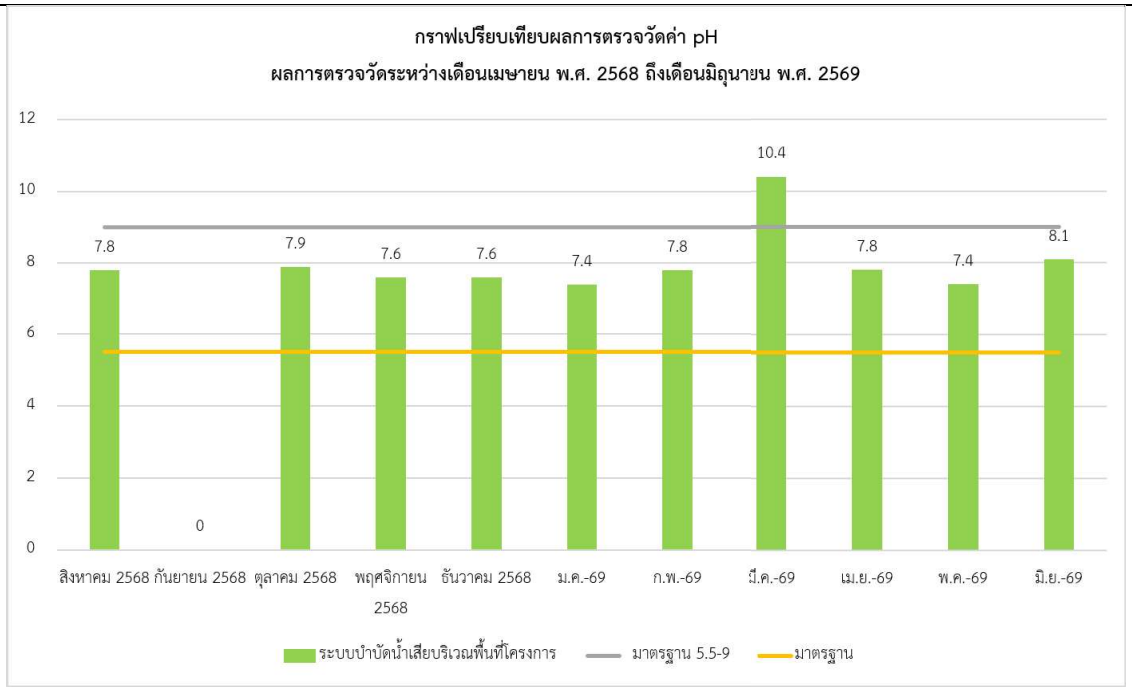


รูปที่ 4-31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า pH บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

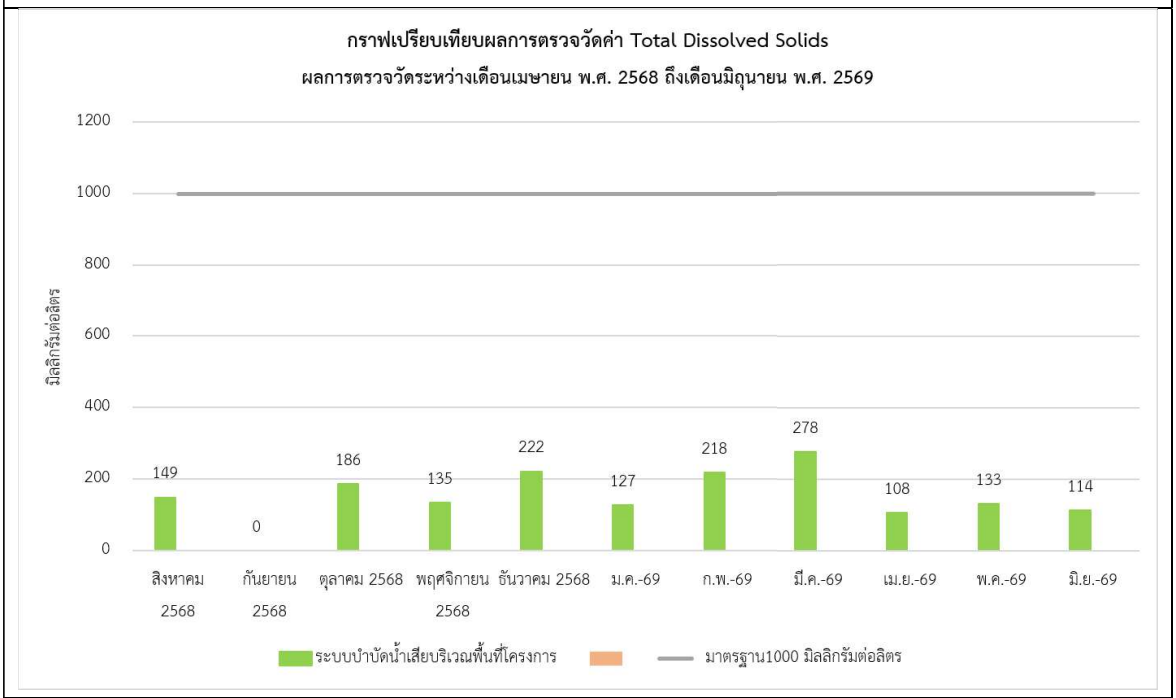


รูปที่ 4-32 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Total Dissolved Solids** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

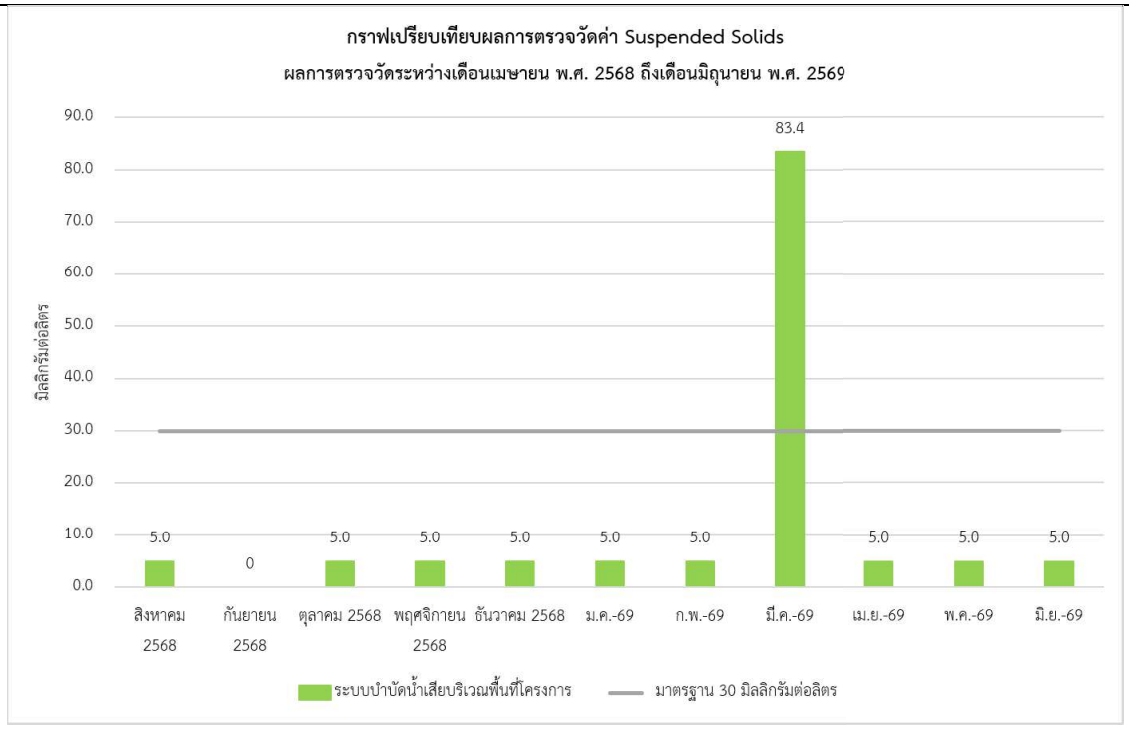


รูปที่ 4-33 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Suspended Solids** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

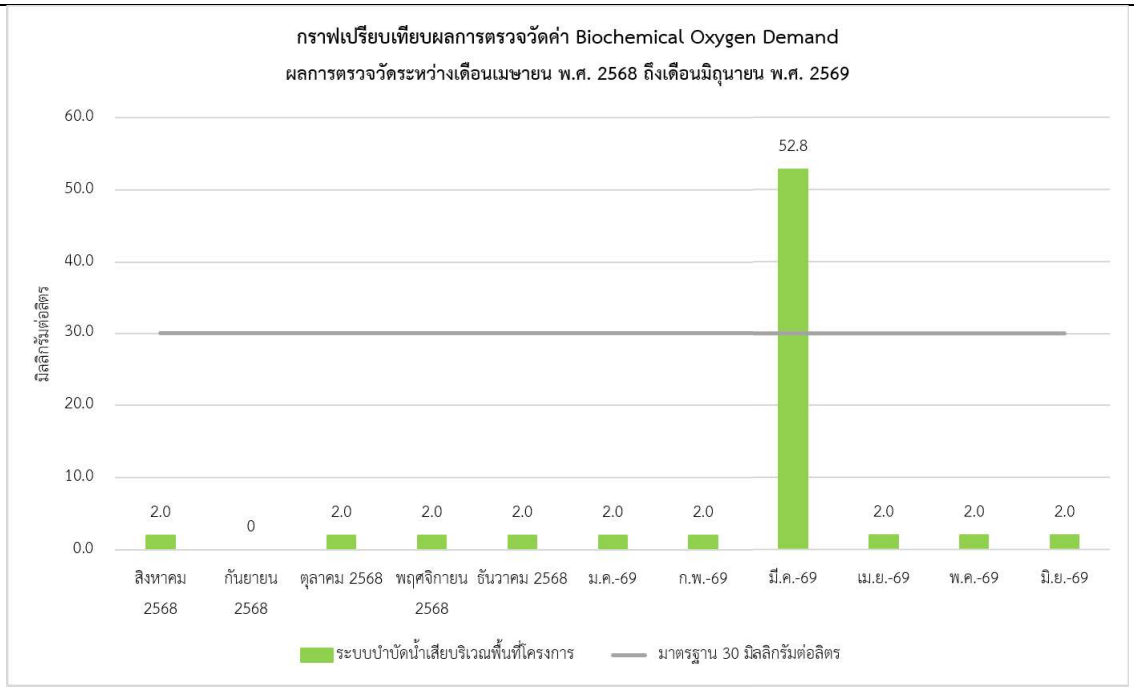


รูปที่ 4-34 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Biochemical Oxygen Demand** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

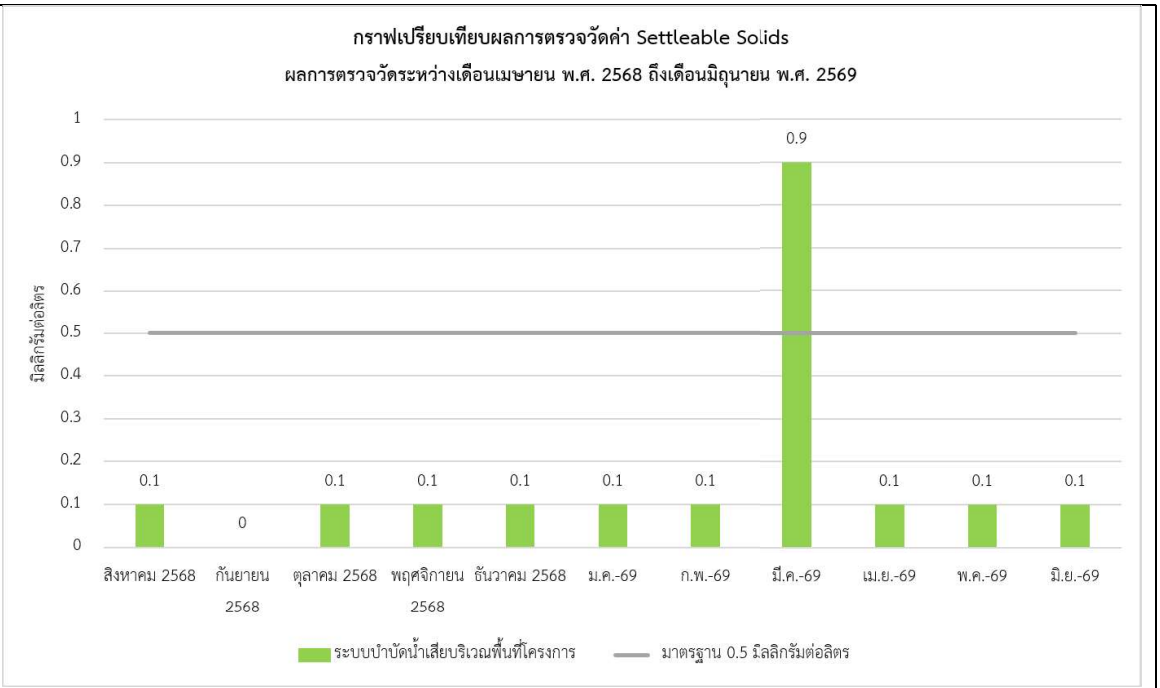


รูปที่ 4-35 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Settleable Solids** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

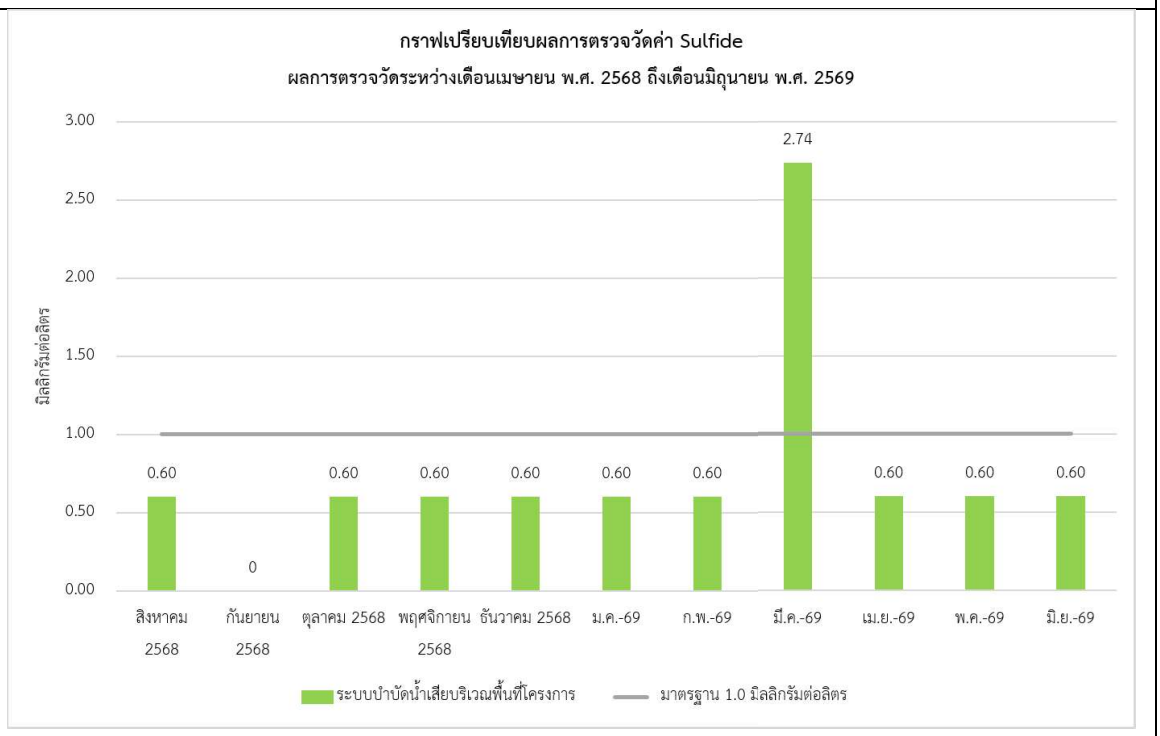

รูปที่ 4-36 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Sulfide** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

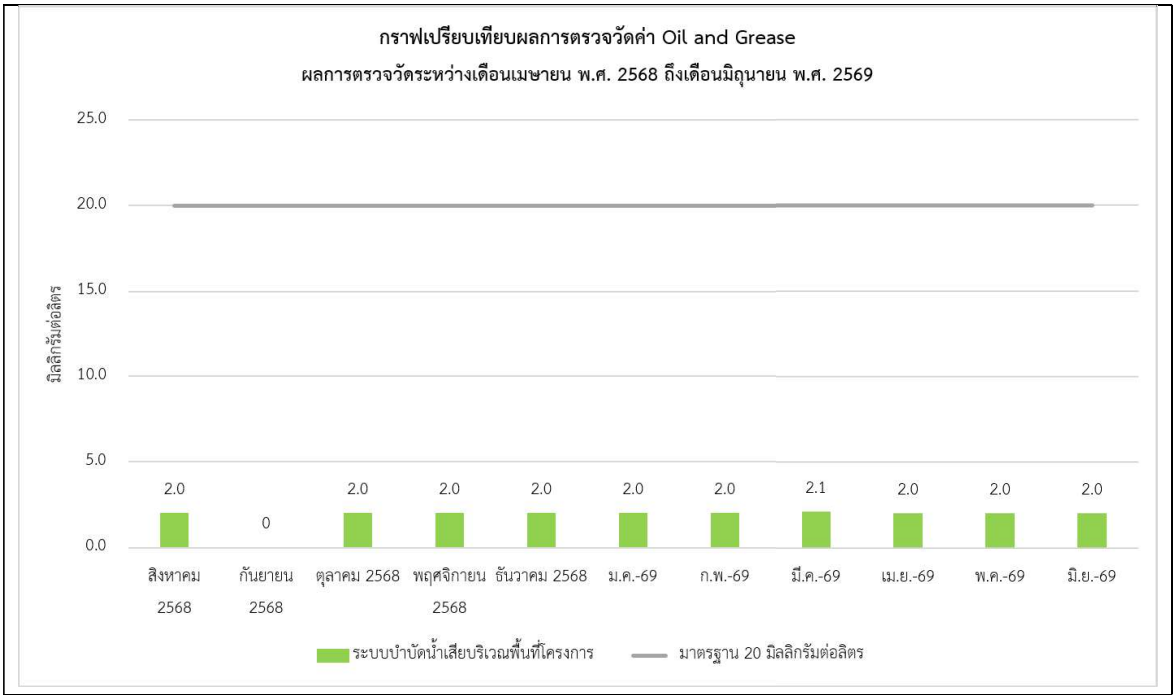

รูปที่ 4-37 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Oil and Grease** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

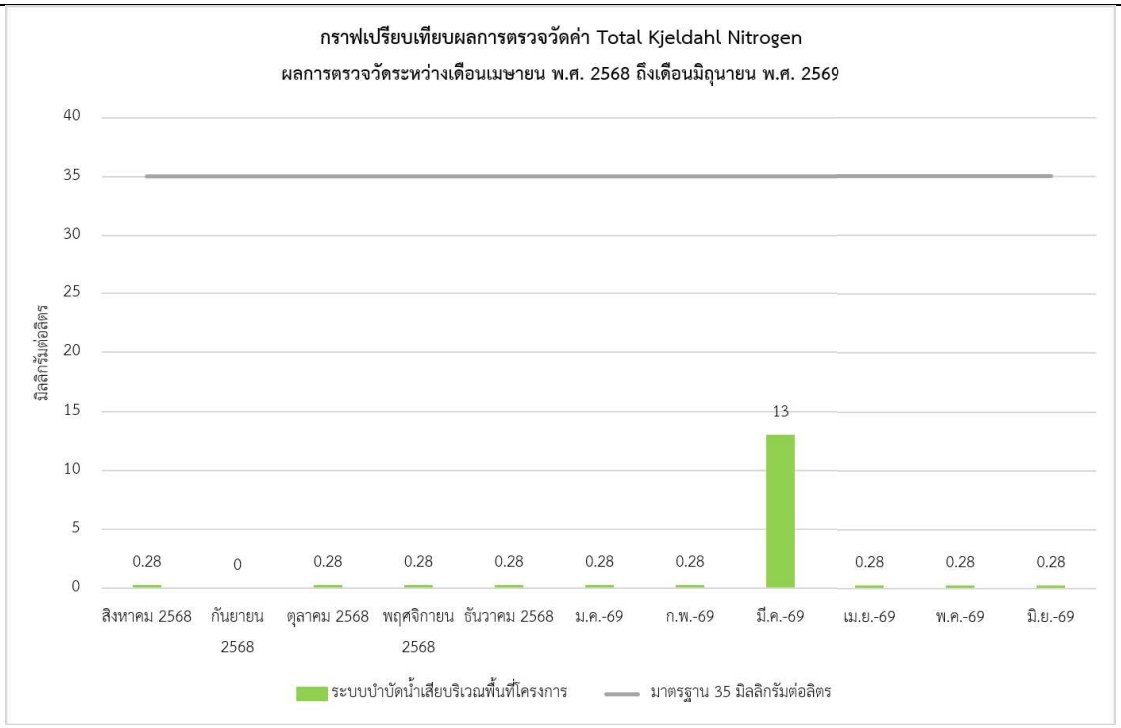

รูปที่ 4-38 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่า **Total Kjeldahl Nitrogen** บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979
Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th
