บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq, 24\ hrs.}$	$L_{A90, 24\ hrs.}$	$L_{Amax, 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
8-9 มกราคม 2569	66	104	52
9-10 มกราคม 2569	67	101	52
10-11 มกราคม 2569	66	99	52
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
8-9 มกราคม 2569	58	96	54
9-10 มกราคม 2569	59	92	53
10-11 มกราคม 2569	59	90	54
มาตรฐาน(*)	**≤ 70**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ(*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0064-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236 Serial No. 222195, ID No. NS-03-025
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28-29 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 27 เมษายน 2569
Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน(*)
	8-9 มกราคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	15.53-16.53	68.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.53-19.53	63.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.53-19.53	60.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		66.8	-
ระดับการรบกวน	-	6.2	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน(*)
	9-10 มกราคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.53-10.53	63.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.53-06.53	59.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.53-06.53	56.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.2	-
ระดับการรบกวน	-	4.8	≤10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0064-01

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820891, ID No. NS-12-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-12D, Serial No.10351425, ID No. NS-14-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 4 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 3 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	9-10 มกราคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	15.07-16.07	62.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	19.07-20.07	57.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	19.07-20.07	55.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	60.5	-
ระดับการรบกวน	-	5.2	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	10-11 มกราคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	13.07-14.07	61.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.07-19.07	58.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.07-19.07	55.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.5	-
ระดับการรบกวน	-	3.3	≤10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ (*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน(*)
	10-11 มกราคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.53-09.53	58.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	04.53-05.53	53.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	04.53-05.53	51.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.8	-
ระดับการรบกวน	-	5.1	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	8-9 มกราคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.07-10.07	61.1	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	04.07-05.07	56.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	04.07-05.07	54.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.1	-
ระดับการรบกวน	-	4.4	≤10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 8-9 มกราคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.53	2.900	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
10.53	2.800	198	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
11.53	2.900	218	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
12.53	2.400	222	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
13.53	2.400	198	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
14.53	2.900	185	ใต้ (S)
15.53	3.100	198	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
16.53	2.900	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
17.53	4.300	239	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
18.53	4.500	197	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
19.53	4.700	205	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
20.53	5.900	197	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
21.53	3.800	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
22.53	5.100	206	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
23.53	4.500	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
00.53	4.600	211	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
01.53	6.000	188	ใต้ (S)
02.53	5.600	197	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.53	5.700	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
04.53	5.900	213	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
05.53	4.600	229	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
06.53	5.300	218	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
07.53	6.800	249	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
08.53	4.800	274	ตะวันตก (W)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		4.350	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0064-01

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :

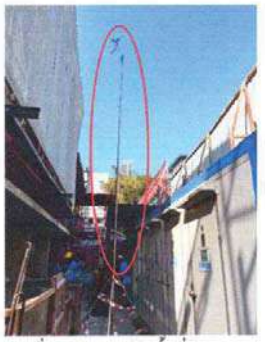

จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 10-11 มกราคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.53	1.700	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
10.53	2.000	142	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
11.53	1.900	150	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
12.53	1.700	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.53	2.100	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.53	2.500	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
15.53	1.800	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.53	1.600	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.53	1.400	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.53	1.700	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.53	1.800	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
20.53	1.800	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
21.53	2.000	165	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.53	2.500	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.53	1.500	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
00.53	1.600	150	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
01.53	1.600	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
02.53	2.600	150	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
03.53	2.200	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.53	1.600	165	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.53	1.800	141	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
06.53	1.800	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
07.53	1.800	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.53	1.700	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.863	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 9-10 มกราคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.53	4.700	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
10.53	4.100	252	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
11.53	2.800	217	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
12.53	2.300	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
13.53	1.400	186	ใต้ (S)
14.53	1.100	179	ใต้ (S)
15.53	1.900	69	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
16.53	5.800	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
17.53	2.800	14	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
18.53	3.200	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
19.53	3.000	8	เหนือ (N)
20.53	2.500	33	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
21.53	2.400	32	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
22.53	2.400	159	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.53	3.600	207	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
00.53	3.000	226	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
01.53	3.600	243	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
02.53	1.800	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.53	1.400	184	ใต้ (S)
04.53	2.400	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
05.53	1.700	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.53	2.200	132	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
07.53	2.300	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.53	1.800	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.675	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 9-10 มกราคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.07	1.000	176	ใต้ (S)
10.07	0.800	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
11.07	1.400	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
12.07	1.700	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.07	1.600	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.07	2.200	147	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
15.07	2.500	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.07	2.200	150	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.07	2.400	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.07	2.000	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.07	2.800	141	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.07	3.800	166	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
21.07	3.200	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.07	2.600	175	ใต้ (S)
23.07	2.300	169	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
00.07	3.200	199	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
01.07	2.400	163	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
02.07	3.900	164	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
03.07	2.200	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.07	3.900	156	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.07	3.400	177	ใต้ (S)
06.07	2.900	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
07.07	3.400	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.07	3.100	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.538	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0064-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 8-9 มกราคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.07	0.600	190	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
10.07	0.600	194	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
11.07	0.700	211	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
12.07	1.100	235	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
13.07	0.500	208	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
14.07	1.300	194	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
15.07	0.600	202	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
16.07	1.000	166	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.07	1.400	153	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.07	1.000	189	ใต้ (S)
19.07	0.900	173	ใต้ (S)
20.07	1.000	177	ใต้ (S)
21.07	1.500	193	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
22.07	1.100	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
23.07	1.100	163	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
00.07	0.700	186	ใต้ (S)
01.07	1.200	186	ใต้ (S)
02.07	1.000	183	ใต้ (S)
03.07	1.200	176	ใต้ (S)
04.07	1.400	168	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.07	1.600	182	ใต้ (S)
06.07	1.400	178	ใต้ (S)
07.07	1.400	176	ใต้ (S)
08.07	1.500	174	ใต้ (S)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.075	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3272, ID No. AB-09-011
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3245, ID No. AB-10-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
PM 2.5-PM 10 Air sampler "THERMO SCIENTIFIC" Model. 2000-H, Serial No. 200FA201669708, ID No. AB-16-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 10-11 มกราคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.07	2.900	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
10.07	2.200	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
11.07	1.200	186	ใต้ (S)
12.07	1.600	187	ใต้ (S)
13.07	2.100	173	ใต้ (S)
14.07	3.800	180	ใต้ (S)
15.07	4.200	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.07	2.800	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.07	2.900	165	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.07	2.100	181	ใต้ (S)
19.07	2.900	180	ใต้ (S)
20.07	3.100	171	ใต้ (S)
21.07	1.600	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.07	2.600	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
23.07	3.600	174	ใต้ (S)
00.07	4.300	159	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
01.07	1.600	192	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
02.07	2.200	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.07	2.600	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.07	2.100	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
05.07	2.900	202	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
06.07	3.900	194	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.07	4.200	234	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
08.07	4.500	231	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.829	
วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	8-9 มกราคม 2569	112	0.059	73	0.045	0.5	0.023	2.27
2	9-10 มกราคม 2569	122	0.063	85	0.052	0.6	0.025	2.09
3	10-11 มกราคม 2569	100	0.052	71	0.043	0.5	0.022	2.16
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	8-9 มกราคม 2569	61	0.033	41	0.025	-	-	2.24
2	9-10 มกราคม 2569	54	0.028	40	0.024	-	-	2.16
3	10-11 มกราคม 2569	49	0.026	37	0.023	-	-	2.08
มาตรฐาน		-	**≤ 0.33**[1]	-	**≤ 0.12**[1]	-	**≤ 0.0375**[2]	-
LOQ[3]		10	0.005	3	0.001	0.1	0.004	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :	1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler 2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย PM-2.5 air sampler, FRM method 4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer
มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :	1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B 2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L 4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2565

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
1	8-9 มกราคม 2569	09.00-10.00	4.62
		10.00-11.00	4.53
		11.00-12.00	4.99
		12.00-13.00	4.86
		13.00-14.00	5.50
		14.00-15.00	5.05
		15.00-16.00	4.93
		16.00-17.00	4.85
		17.00-18.00	4.79
		18.00-19.00	4.74
		19.00-20.00	4.75
		20.00-21.00	4.76
		21.00-22.00	4.76
		22.00-23.00	4.77
		23.00-00.00	4.77
		00.00-01.00	4.75
		01.00-02.00	4.74
		02.00-03.00	4.74
		03.00-04.00	4.75
		04.00-05.00	4.76
		05.00-06.00	4.75
		06.00-07.00	4.74
		07.00-08.00	4.74
		08.00-09.00	4.74
		Max (1 ชั่วโมง)	5.50
		Min (1 ชั่วโมง)	4.53
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.81
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0064-01

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 401304261, ID No. AB-03-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.65775350, ID No. AB-03-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 3 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
3	10-11 มกราคม 2569	09.00-10.00	3.41
		10.00-11.00	3.42
		11.00-12.00	3.47
		12.00-13.00	3.36
		13.00-14.00	3.41
		14.00-15.00	3.19
		15.00-16.00	2.88
		16.00-17.00	2.85
		17.00-18.00	2.92
		18.00-19.00	3.12
		19.00-20.00	3.28
		20.00-21.00	3.41
		21.00-22.00	3.46
		22.00-23.00	3.49
		23.00-00.00	3.51
		00.00-01.00	3.52
		01.00-02.00	3.54
		02.00-03.00	3.54
		03.00-04.00	3.51
		04.00-05.00	3.50
		05.00-06.00	3.52
		06.00-07.00	3.53
		07.00-08.00	3.54
		08.00-09.00	3.53
		Max (1 ชั่วโมง)	3.54
		Min (1 ชั่วโมง)	2.85
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.37
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
2	9-10 มกราคม 2569	09.00-10.00	4.69
		10.00-11.00	4.63
		11.00-12.00	4.60
		12.00-13.00	4.60
		13.00-14.00	4.58
		14.00-15.00	3.31
		15.00-16.00	2.91
		16.00-17.00	2.57
		17.00-18.00	2.61
		18.00-19.00	2.80
		19.00-20.00	3.02
		20.00-21.00	3.22
		21.00-22.00	3.32
		22.00-23.00	3.35
		23.00-00.00	3.36
		00.00-01.00	3.38
		01.00-02.00	3.37
		02.00-03.00	3.36
		03.00-04.00	3.36
		04.00-05.00	3.37
		05.00-06.00	3.40
		06.00-07.00	3.43
		07.00-08.00	3.44
		08.00-09.00	3.44
		Max (1 ชั่วโมง)	4.69
		Min (1 ชั่วโมง)	2.57
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.51
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
5	9-10 มกราคม 2569	10.00-11.00	3.47
		11.00-12.00	3.41
		12.00-13.00	3.46
		13.00-14.00	3.45
		14.00-15.00	3.36
		15.00-16.00	3.24
		16.00-17.00	3.13
		17.00-18.00	3.13
		18.00-19.00	3.22
		19.00-20.00	3.26
		20.00-21.00	2.93
		21.00-22.00	2.96
		22.00-23.00	3.85
		23.00-00.00	4.22
		00.00-01.00	4.44
		01.00-02.00	4.48
		02.00-03.00	4.12
		03.00-04.00	4.00
		04.00-05.00	4.27
		05.00-06.00	4.08
		06.00-07.00	3.89
		07.00-08.00	3.72
		08.00-09.00	3.44
		09.00-10.00	3.45
		Max (1 ชั่วโมง)	4.48
		Min (1 ชั่วโมง)	2.93
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.62
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
4	8-9 มกราคม 2569	10.00-11.00	2.60
		11.00-12.00	2.56
		12.00-13.00	2.50
		13.00-14.00	2.47
		14.00-15.00	2.50
		15.00-16.00	2.52
		16.00-17.00	2.53
		17.00-18.00	2.57
		18.00-19.00	2.64
		19.00-20.00	2.68
		20.00-21.00	2.71
		21.00-22.00	2.70
		22.00-23.00	2.74
		23.00-00.00	2.74
		00.00-01.00	2.75
		01.00-02.00	2.76
		02.00-03.00	2.77
		03.00-04.00	2.77
		04.00-05.00	2.79
		05.00-06.00	2.80
		06.00-07.00	2.81
		07.00-08.00	2.79
		08.00-09.00	3.74
		09.00-10.00	3.54
		Max (1 ชั่วโมง)	3.74
		Min (1 ชั่วโมง)	2.47
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.75
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No.AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
6	10-11 มกราคม 2569	10.00-11.00	2.43
		11.00-12.00	2.41
		12.00-13.00	2.46
		13.00-14.00	2.43
		14.00-15.00	2.42
		15.00-16.00	2.44
		16.00-17.00	2.46
		17.00-18.00	2.42
		18.00-19.00	2.56
		19.00-20.00	2.55
		20.00-21.00	2.56
		21.00-22.00	2.54
		22.00-23.00	2.58
		23.00-00.00	2.57
		00.00-01.00	2.56
		01.00-02.00	2.57
		02.00-03.00	2.58
		03.00-04.00	2.58
		04.00-05.00	2.59
		05.00-06.00	2.59
		06.00-07.00	2.60
		07.00-08.00	2.58
		08.00-09.00	2.60
		09.00-10.00	2.59
		Max (1 ชั่วโมง)	2.60
		Min (1 ชั่วโมง)	2.41
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.53
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05
วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
1	8-9 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.020
		10.00-11.00	0.016
		11.00-12.00	0.019
		12.00-13.00	0.015
		13.00-14.00	0.018
		14.00-15.00	0.019
		15.00-16.00	0.009
		16.00-17.00	0.013
		17.00-18.00	0.015
		18.00-19.00	0.022
		19.00-20.00	0.023
		20.00-21.00	0.015
		21.00-22.00	0.016
		22.00-23.00	0.019
		23.00-00.00	0.013
		00.00-01.00	0.016
		01.00-02.00	0.013
		02.00-03.00	0.018
		03.00-04.00	0.022
		04.00-05.00	0.012
		05.00-06.00	0.017
		06.00-07.00	0.019
		07.00-08.00	0.014
		08.00-09.00	0.016
		Max (1 ชั่วโมง)	0.023
		Min (1 ชั่วโมง)	0.009
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.017
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
2	9-10 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.019
		10.00-11.00	0.020
		11.00-12.00	0.022
		12.00-13.00	0.017
		13.00-14.00	0.023
		14.00-15.00	0.021
		15.00-16.00	0.016
		16.00-17.00	0.016
		17.00-18.00	0.019
		18.00-19.00	0.023
		19.00-20.00	0.024
		20.00-21.00	0.017
		21.00-22.00	0.019
		22.00-23.00	0.023
		23.00-00.00	0.019
		00.00-01.00	0.018
		01.00-02.00	0.018
		02.00-03.00	0.020
		03.00-04.00	0.021
		04.00-05.00	0.015
		05.00-06.00	0.020
		06.00-07.00	0.022
		07.00-08.00	0.013
		08.00-09.00	0.018
		Max (1 ชั่วโมง)	0.024
		Min (1 ชั่วโมง)	0.013
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.019
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข้าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
4	8-9 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.027
		11.00-12.00	0.029
		12.00-13.00	0.029
		13.00-14.00	0.031
		14.00-15.00	0.030
		15.00-16.00	0.030
		16.00-17.00	0.033
		17.00-18.00	0.028
		18.00-19.00	0.027
		19.00-20.00	0.027
		20.00-21.00	0.030
		21.00-22.00	0.031
		22.00-23.00	0.028
		23.00-00.00	0.028
		00.00-01.00	0.031
		01.00-02.00	0.032
		02.00-03.00	0.027
		03.00-04.00	0.030
		04.00-05.00	0.027
		05.00-06.00	0.031
		06.00-07.00	0.027
		07.00-08.00	0.027
		08.00-09.00	0.026
		09.00-10.00	0.026
		Max (1 ชั่วโมง)	0.033
		Min (1 ชั่วโมง)	0.026
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.029
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0064-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
3	10-11 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.015
		10.00-11.00	0.017
		11.00-12.00	0.022
		12.00-13.00	0.015
		13.00-14.00	0.020
		14.00-15.00	0.018
		15.00-16.00	0.016
		16.00-17.00	0.015
		17.00-18.00	0.018
		18.00-19.00	0.022
		19.00-20.00	0.022
		20.00-21.00	0.013
		21.00-22.00	0.015
		22.00-23.00	0.018
		23.00-00.00	0.012
		00.00-01.00	0.014
		01.00-02.00	0.018
		02.00-03.00	0.021
		03.00-04.00	0.025
		04.00-05.00	0.015
		05.00-06.00	0.018
		06.00-07.00	0.020
		07.00-08.00	0.014
		08.00-09.00	0.019
		Max (1 ชั่วโมง)	0.025
		Min (1 ชั่วโมง)	0.012
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.018
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
6	10-11 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.026
		11.00-12.00	0.022
		12.00-13.00	0.021
		13.00-14.00	0.024
		14.00-15.00	0.025
		15.00-16.00	0.018
		16.00-17.00	0.024
		17.00-18.00	0.015
		18.00-19.00	0.018
		19.00-20.00	0.022
		20.00-21.00	0.025
		21.00-22.00	0.032
		22.00-23.00	0.027
		23.00-00.00	0.028
		00.00-01.00	0.023
		01.00-02.00	0.022
		02.00-03.00	0.024
		03.00-04.00	0.026
		04.00-05.00	0.021
		05.00-06.00	0.029
		06.00-07.00	0.018
		07.00-08.00	0.019
		08.00-09.00	0.023
		09.00-10.00	0.019
		Max (1 ชั่วโมง)	0.032
		Min (1 ชั่วโมง)	0.015
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.023
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001
วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
5	9-10 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.022
		11.00-12.00	0.020
		12.00-13.00	0.021
		13.00-14.00	0.027
		14.00-15.00	0.023
		15.00-16.00	0.022
		16.00-17.00	0.027
		17.00-18.00	0.021
		18.00-19.00	0.021
		19.00-20.00	0.029
		20.00-21.00	0.024
		21.00-22.00	0.035
		22.00-23.00	0.024
		23.00-00.00	0.029
		00.00-01.00	0.022
		01.00-02.00	0.022
		02.00-03.00	0.022
		03.00-04.00	0.022
		04.00-05.00	0.021
		05.00-06.00	0.024
		06.00-07.00	0.021
		07.00-08.00	0.023
		08.00-09.00	0.024
		09.00-10.00	0.024
		Max (1 ชั่วโมง)	0.035
		Min (1 ชั่วโมง)	0.020
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.024
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
1	8-9 มกราคม 2569	09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0064-01

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 508011077, ID No.AB-02-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
3	10-11 มกราคม 2569	09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
2	9-10 มกราคม 2569	09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
5	9-10 มกราคม 2569	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
4	8-9 มกราคม 2569	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-11 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 19 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
6	10-11 มกราคม 2569	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094
วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099			

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
10 มกราคม 2569						
08.27	0.692	> 100.00	1.088	> 100.00	0.481	> 100.00
09.51	0.246	> 100.00	0.591	45.62	0.527	> 100.00
10.49	0.258	5.63	0.997	31.57	0.922	85.33
11.21	0.384	1.55	0.816	3.24	0.326	1.47
13.23	1.017	23.27	1.836	6.85	0.969	32.00
14.41	0.439	28.44	0.859	42.67	0.560	> 100.00
15.25	0.361	14.53	0.875	> 100.00	0.637	64.53
16.31	0.352	5.29	0.961	> 100.00	0.363	73.14
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ [1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[3]= วันที่ 11 มกราคม 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
8 มกราคม 2569						
09.59	0.449	> 100.00	0.762	> 100.00	0.237	> 100.00
10.17	0.434	> 100.00	0.965	63.40	0.205	> 100.00
11.17	0.489	> 100.00	0.574	> 100.00	0.259	> 100.00
13.12	1.025	> 100.00	2.601	> 100.00	0.772	> 100.00
14.49	0.331	> 100.00	0.567	8.53	0.394	24.51
15.13	0.652	> 100.00	1.068	> 100.00	0.888	> 100.00
16.41	0.654	> 100.00	0.968	28.63	0.547	> 100.00
9 มกราคม 2569						
08.33	0.843	> 100.00	0.957	47.53	0.320	> 100.00
09.41	0.662	15.62	0.575	36.57	0.158	> 100.00
10.07	0.930	> 100.00	1.123	> 100.00	0.307	> 100.00
11.10	0.512	> 100.00	0.875	1.90	0.197	> 100.00
13.29	0.355	1.25	0.631	> 100.00	0.300	> 100.00
14.51	0.339	> 100.00	0.504	1.99	0.187	> 100.00
15.08	0.416	> 100.00	0.615	> 100.00	0.236	> 100.00
16.59	0.457	> 100.00	0.583	> 100.00	0.268	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 1

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 18 มกราคม 2569	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ประเภท ค[3]
pH	-	-	-	12.6	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	16	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	137	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	1.5	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	1,534	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	4	≤ 40
Oil and grease	mg/L	1	3	4	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ใส มีตะกอนมาก	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0049-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 10 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 10-26 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 กุมภาพันธ์ 2569
เครื่องมือ : Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเหตุ (1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

(นางสาวพัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattanaporn
(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
1 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.031
1 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.026
1 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.022
1 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.021
1 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.021
1 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.026
1 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.024
1 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.021
1 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.022
1 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.028
1 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.024
1 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.026
1 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.027
1 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.026
2 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.029
2 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.023
2 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.029
2 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.026
2 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.023
2 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.024
2 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.027
2 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.025
2 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.022
2 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.027

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทดสอบ : 3 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 4 กุมภาพันธ์ 2569

เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
3 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.021
3 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.024
3 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.029
3 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.026
3 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.027
3 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.022
3 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.030
3 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.026
3 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.023
3 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.026
3 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.026
3 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.021
3 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.022
3 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.026
4 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.025
4 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.030
4 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.027
4 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.029
4 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.021
4 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.032
4 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.025
4 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.020
4 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.026
4 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.027

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
2 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.030
2 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.025
2 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.028
2 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.025
2 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.030
2 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.021
2 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.024
2 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.025
2 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.024
2 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.033
2 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.023
2 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.029
2 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.023
2 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.025
3 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.026
3 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.021
3 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.028
3 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.023
3 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.024
3 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.026
3 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.024
3 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.030
3 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.027
3 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.026

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
5 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.027
5 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.024
5 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.025
5 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.028
5 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.035
5 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.027
5 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.032
5 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.030
5 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.037
5 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.039
5 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.025
5 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.028
5 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.023
5 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.034
6 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.026
6 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.031
6 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.024
6 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.025
6 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.025
6 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.030
6 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.027
6 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.024
6 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.021
6 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.025

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
4 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.028
4 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.032
4 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.031
4 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.032
4 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.031
4 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.022
4 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.034
4 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.027
4 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.030
4 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.026
4 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.024
4 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.020
4 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.016
4 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.018
5 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.019
5 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.027
5 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.025
5 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.027
5 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.027
5 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.026
5 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.031
5 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.024
5 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.029
5 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.025

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
7 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.029
7 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.026
7 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.023
7 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.025
7 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.027
7 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.031
7 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.024
7 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.025
7 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.028
7 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.032
7 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.027
7 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.022
7 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.031
7 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.024
8 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.024
8 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.023
8 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.020
8 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.024
8 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.028
8 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.033
8 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.032
8 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.040
8 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.024
8 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.029

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
6 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.025
6 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.028
6 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.029
6 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.031
6 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.025
6 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.024
6 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.021
6 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.024
6 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.034
6 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.028
6 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.024
6 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.027
6 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.029
6 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.023
7 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.023
7 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.024
7 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.026
7 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.027
7 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.021
7 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.029
7 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.025
7 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.024
7 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.034
7 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.034

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
8 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.027
8 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.027
8 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.024
8 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.019
8 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.020
8 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.026
8 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.034
8 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.026
8 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.031
8 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.031
8 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.025
8 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.026
8 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.022
8 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.023
9 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.027
9 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.028
9 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.028
9 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.031
9 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.028
9 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.032
9 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.033
9 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.021
9 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.034
9 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.028

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
9 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.022
9 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.019
9 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.014
9 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.034
9 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.026
9 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.023
9 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.034
9 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.027
9 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.031
9 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.030
9 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.029
9 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.024
9 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.020
9 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.032
10 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.031
10 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.029
10 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.027
10 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.031
10 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.029
10 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.023
10 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.024
10 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.033
10 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.020
10 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.021

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
11 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.033
11 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.031
11 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.038
11 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.031
11 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.037
11 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.035
11 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.030
11 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.028
11 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.031
11 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.037
11 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.031
11 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.030
11 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.033
11 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.036
12 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.038
12 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.031
12 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.039
12 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.026
12 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.033
12 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.028
12 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.032
12 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.030
12 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.027
12 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.033

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
10 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.030
10 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.028
10 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.022
10 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.026
10 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.027
10 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.025
10 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.024
10 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.027
10 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.033
10 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.026
10 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.021
10 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.023
10 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.024
10 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.029
11 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.032
11 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.027
11 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.033
11 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.032
11 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.031
11 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.024
11 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.021
11 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.026
11 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.024
11 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.037

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเทพรักษ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
13 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.031
13 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.030
13 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.023
13 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.027
13 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.030
13 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.034
13 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.036
13 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.028
13 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.031
13 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.032
13 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.033
13 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.027
13 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.036
13 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.027
14 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.027
14 มกราคม 2569	01.00-02.00	*
14 มกราคม 2569	02.00-03.00	*
14 มกราคม 2569	03.00-04.00	*
14 มกราคม 2569	04.00-05.00	*
14 มกราคม 2569	05.00-06.00	*
14 มกราคม 2569	06.00-07.00	*
14 มกราคม 2569	07.00-08.00	*
14 มกราคม 2569	08.00-09.00	*
14 มกราคม 2569	09.00-10.00	*

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 01.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเทพรักษ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
12 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.039
12 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.037
12 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.034
12 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.041
12 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.035
12 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.034
12 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.039
12 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.033
12 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.027
12 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.026
12 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.029
12 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.038
12 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.035
12 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.038
13 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.034
13 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.033
13 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.041
13 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.039
13 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.035
13 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.037
13 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.033
13 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.040
13 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.042
13 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.038

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
16 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.032
16 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.040
16 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.038
16 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.028
16 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.037
16 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.026
16 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.024
16 มกราคม 2569	17.00-18.00	*
16 มกราคม 2569	18.00-19.00	*
16 มกราคม 2569	19.00-20.00	*
16 มกราคม 2569	20.00-21.00	*
16 มกราคม 2569	21.00-22.00	*
16 มกราคม 2569	22.00-23.00	*
16 มกราคม 2569	23.00-00.00	*
17 มกราคม 2569	00.00-01.00	*
17 มกราคม 2569	01.00-02.00	*
17 มกราคม 2569	02.00-03.00	*
17 มกราคม 2569	03.00-04.00	*
17 มกราคม 2569	04.00-05.00	*
17 มกราคม 2569	05.00-06.00	*
17 มกราคม 2569	06.00-07.00	*
17 มกราคม 2569	07.00-08.00	*
17 มกราคม 2569	08.00-09.00	*
17 มกราคม 2569	09.00-10.00	*

<u>หมายเหตุ</u>* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
17 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.033
17 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.034
17 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.024
17 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.032
17 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.029
17 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.026
17 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.027
17 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.030
17 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.026
17 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.035
17 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.032
17 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.027
17 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.026
17 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.022
18 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.026
18 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.027
18 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.031
18 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.026
18 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.023
18 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.026
18 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.027
18 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.020
18 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.021
18 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.025

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
19 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.032
19 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.028
19 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.030
19 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.024
19 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.022
19 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.027
19 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.038
19 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.035
19 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.031
19 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.029
19 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.028
19 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.023
19 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.029
19 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.033
20 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.029
20 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.033
20 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.031
20 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.026
20 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.031
20 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.026
20 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.027
20 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.021
20 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.034
20 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.026

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
18 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.031
18 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.034
18 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.039
18 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.035
18 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.029
18 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.034
18 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.031
18 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.029
18 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.034
18 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.035
18 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.038
18 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.033
18 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.028
18 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.031
19 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.032
19 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.036
19 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.039
19 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.023
19 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.024
19 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.020
19 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.025
19 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.024
19 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.031
19 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.027

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
21 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.029
21 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.030
21 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.028
21 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.026
21 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.022
21 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.025
21 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.022
21 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.024
21 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.021
21 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.029
21 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.030
21 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.032
21 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.029
21 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.027
22 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.026
22 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.032
22 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.027
22 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.032
22 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.029
22 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.023
22 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.022
22 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.031
22 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.032
22 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.034

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
20 มกราคม 2569	10.00-11.00	0.025
20 มกราคม 2569	11.00-12.00	0.027
20 มกราคม 2569	12.00-13.00	0.036
20 มกราคม 2569	13.00-14.00	0.025
20 มกราคม 2569	14.00-15.00	0.027
20 มกราคม 2569	15.00-16.00	0.032
20 มกราคม 2569	16.00-17.00	0.029
20 มกราคม 2569	17.00-18.00	0.034
20 มกราคม 2569	18.00-19.00	0.026
20 มกราคม 2569	19.00-20.00	0.025
20 มกราคม 2569	20.00-21.00	0.024
20 มกราคม 2569	21.00-22.00	0.027
20 มกราคม 2569	22.00-23.00	0.028
20 มกราคม 2569	23.00-00.00	0.027
21 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.024
21 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.028
21 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.027
21 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.021
21 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.026
21 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.028
21 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.023
21 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.025
21 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.018
21 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.023

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
22 มกราคม 2569	10.00-11.00	24.7
22 มกราคม 2569	11.00-12.00	24.8
22 มกราคม 2569	12.00-13.00	27.1
22 มกราคม 2569	13.00-14.00	32.0
22 มกราคม 2569	14.00-15.00	26.8
22 มกราคม 2569	15.00-16.00	25.9
22 มกราคม 2569	16.00-17.00	26.0
22 มกราคม 2569	17.00-18.00	23.4
22 มกราคม 2569	18.00-19.00	21.0
22 มกราคม 2569	19.00-20.00	26.1
22 มกราคม 2569	20.00-21.00	25.6
22 มกราคม 2569	21.00-22.00	26.3
22 มกราคม 2569	22.00-23.00	28.2
22 มกราคม 2569	23.00-00.00	27.3
23 มกราคม 2569	00.00-01.00	23.0
23 มกราคม 2569	01.00-02.00	25.6
23 มกราคม 2569	02.00-03.00	25.5
23 มกราคม 2569	03.00-04.00	27.3
23 มกราคม 2569	04.00-05.00	24.8
23 มกราคม 2569	05.00-06.00	24.5
23 มกราคม 2569	06.00-07.00	29.0
23 มกราคม 2569	07.00-08.00	32.0
23 มกราคม 2569	08.00-09.00	25.4
23 มกราคม 2569	09.00-10.00	23.3

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
23 มกราคม 2569	10.00-11.00	25.0
23 มกราคม 2569	11.00-12.00	20.6
23 มกราคม 2569	12.00-13.00	26.4
23 มกราคม 2569	13.00-14.00	21.0
23 มกราคม 2569	14.00-15.00	23.0
23 มกราคม 2569	15.00-16.00	25.5
23 มกราคม 2569	16.00-17.00	26.3
23 มกราคม 2569	17.00-18.00	29.0
23 มกราคม 2569	18.00-19.00	21.6
23 มกราคม 2569	19.00-20.00	28.0
23 มกราคม 2569	20.00-21.00	24.6
23 มกราคม 2569	21.00-22.00	27.4
23 มกราคม 2569	22.00-23.00	26.9
23 มกราคม 2569	23.00-00.00	23.0
24 มกราคม 2569	00.00-01.00	31.0
24 มกราคม 2569	01.00-02.00	26.9
24 มกราคม 2569	02.00-03.00	26.6
24 มกราคม 2569	03.00-04.00	27.7
24 มกราคม 2569	04.00-05.00	31.0
24 มกราคม 2569	05.00-06.00	27.5
24 มกราคม 2569	06.00-07.00	23.1
24 มกราคม 2569	07.00-08.00	26.6
24 มกราคม 2569	08.00-09.00	24.2
24 มกราคม 2569	09.00-10.00	26.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
25 มกราคม 2569	10.00-11.00	36.8
25 มกราคม 2569	11.00-12.00	36.2
25 มกราคม 2569	12.00-13.00	40.0
25 มกราคม 2569	13.00-14.00	34.0
25 มกราคม 2569	14.00-15.00	42.0
25 มกราคม 2569	15.00-16.00	36.9
25 มกราคม 2569	16.00-17.00	38.0
25 มกราคม 2569	17.00-18.00	34.0
25 มกราคม 2569	18.00-19.00	29.0
25 มกราคม 2569	19.00-20.00	33.0
25 มกราคม 2569	20.00-21.00	37.5
25 มกราคม 2569	21.00-22.00	38.2
25 มกราคม 2569	22.00-23.00	36.5
25 มกราคม 2569	23.00-00.00	38.7
26 มกราคม 2569	00.00-01.00	29.0
26 มกราคม 2569	01.00-02.00	29.0
26 มกราคม 2569	02.00-03.00	21.0
26 มกราคม 2569	03.00-04.00	22.0
26 มกราคม 2569	04.00-05.00	37.0
26 มกราคม 2569	05.00-06.00	35.4
26 มกราคม 2569	06.00-07.00	35.0
26 มกราคม 2569	07.00-08.00	29.0
26 มกราคม 2569	08.00-09.00	31.0
26 มกราคม 2569	09.00-10.00	24.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
24 มกราคม 2569	10.00-11.00	25.8
24 มกราคม 2569	11.00-12.00	31.0
24 มกราคม 2569	12.00-13.00	27.0
24 มกราคม 2569	13.00-14.00	25.4
24 มกราคม 2569	14.00-15.00	20.0
24 มกราคม 2569	15.00-16.00	24.4
24 มกราคม 2569	16.00-17.00	22.3
24 มกราคม 2569	17.00-18.00	23.8
24 มกราคม 2569	18.00-19.00	17.2
24 มกราคม 2569	19.00-20.00	22.0
24 มกราคม 2569	20.00-21.00	25.5
24 มกราคม 2569	21.00-22.00	28.4
24 มกราคม 2569	22.00-23.00	26.4
24 มกราคม 2569	23.00-00.00	28.3
25 มกราคม 2569	00.00-01.00	27.4
25 มกราคม 2569	01.00-02.00	31.0
25 มกราคม 2569	02.00-03.00	26.8
25 มกราคม 2569	03.00-04.00	26.3
25 มกราคม 2569	04.00-05.00	32.0
25 มกราคม 2569	05.00-06.00	25.8
25 มกราคม 2569	06.00-07.00	31.0
25 มกราคม 2569	07.00-08.00	23.8
25 มกราคม 2569	08.00-09.00	21.0
25 มกราคม 2569	09.00-10.00	25.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
27 มกราคม 2569	10.00-11.00	38.6
27 มกราคม 2569	11.00-12.00	39.8
27 มกราคม 2569	12.00-13.00	33.0
27 มกราคม 2569	13.00-14.00	36.0
27 มกราคม 2569	14.00-15.00	42.9
27 มกราคม 2569	15.00-16.00	42.2
27 มกราคม 2569	16.00-17.00	35.4
27 มกราคม 2569	17.00-18.00	31.8
27 มกราคม 2569	18.00-19.00	29.0
27 มกราคม 2569	19.00-20.00	23.9
27 มกราคม 2569	20.00-21.00	29.0
27 มกราคม 2569	21.00-22.00	34.3
27 มกราคม 2569	22.00-23.00	40.5
27 มกราคม 2569	23.00-00.00	36.0
28 มกราคม 2569	00.00-01.00	38.2
28 มกราคม 2569	01.00-02.00	33.5
28 มกราคม 2569	02.00-03.00	31.9
28 มกราคม 2569	03.00-04.00	31.0
28 มกราคม 2569	04.00-05.00	28.1
28 มกราคม 2569	05.00-06.00	34.4
28 มกราคม 2569	06.00-07.00	37.0
28 มกราคม 2569	07.00-08.00	36.0
28 มกราคม 2569	08.00-09.00	34.8
28 มกราคม 2569	09.00-10.00	42.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
26 มกราคม 2569	10.00-11.00	42.0
26 มกราคม 2569	11.00-12.00	33.5
26 มกราคม 2569	12.00-13.00	39.0
26 มกราคม 2569	13.00-14.00	32.0
26 มกราคม 2569	14.00-15.00	35.7
26 มกราคม 2569	15.00-16.00	40.0
26 มกราคม 2569	16.00-17.00	35.7
26 มกราคม 2569	17.00-18.00	27.1
26 มกราคม 2569	18.00-19.00	32.2
26 มกราคม 2569	19.00-20.00	35.0
26 มกราคม 2569	20.00-21.00	35.2
26 มกราคม 2569	21.00-22.00	38.0
26 มกราคม 2569	22.00-23.00	37.3
26 มกราคม 2569	23.00-00.00	38.1
27 มกราคม 2569	00.00-01.00	38.0
27 มกราคม 2569	01.00-02.00	41.0
27 มกราคม 2569	02.00-03.00	36.0
27 มกราคม 2569	03.00-04.00	34.0
27 มกราคม 2569	04.00-05.00	41.0
27 มกราคม 2569	05.00-06.00	39.6
27 มกราคม 2569	06.00-07.00	42.1
27 มกราคม 2569	07.00-08.00	40.0
27 มกราคม 2569	08.00-09.00	36.0
27 มกราคม 2569	09.00-10.00	41.1

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
29 มกราคม 2569	10.00-11.00	40.0
29 มกราคม 2569	11.00-12.00	33.9
29 มกราคม 2569	12.00-13.00	39.0
29 มกราคม 2569	13.00-14.00	35.0
29 มกราคม 2569	14.00-15.00	38.0
29 มกราคม 2569	15.00-16.00	35.0
29 มกราคม 2569	16.00-17.00	32.0
29 มกราคม 2569	17.00-18.00	34.0
29 มกราคม 2569	18.00-19.00	40.0
29 มกราคม 2569	19.00-20.00	38.0
29 มกราคม 2569	20.00-21.00	34.0
29 มกราคม 2569	21.00-22.00	35.8
29 มกราคม 2569	22.00-23.00	39.0
29 มกราคม 2569	23.00-00.00	35.2
30 มกราคม 2569	00.00-01.00	32.6
30 มกราคม 2569	01.00-02.00	31.4
30 มกราคม 2569	02.00-03.00	35.0
30 มกราคม 2569	03.00-04.00	42.0
30 มกราคม 2569	04.00-05.00	32.9
30 มกราคม 2569	05.00-06.00	38.0
30 มกราคม 2569	06.00-07.00	37.0
30 มกราคม 2569	07.00-08.00	36.0
30 มกราคม 2569	08.00-09.00	35.0
30 มกราคม 2569	09.00-10.00	32.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
28 มกราคม 2569	10.00-11.00	35.1
28 มกราคม 2569	11.00-12.00	37.0
28 มกราคม 2569	12.00-13.00	30.9
28 มกราคม 2569	13.00-14.00	34.2
28 มกราคม 2569	14.00-15.00	36.2
28 มกราคม 2569	15.00-16.00	40.0
28 มกราคม 2569	16.00-17.00	34.9
28 มกราคม 2569	17.00-18.00	31.0
28 มกราคม 2569	18.00-19.00	34.0
28 มกราคม 2569	19.00-20.00	32.0
28 มกราคม 2569	20.00-21.00	38.0
28 มกราคม 2569	21.00-22.00	40.0
28 มกราคม 2569	22.00-23.00	35.6
28 มกราคม 2569	23.00-00.00	37.0
29 มกราคม 2569	00.00-01.00	29.0
29 มกราคม 2569	01.00-02.00	23.0
29 มกราคม 2569	02.00-03.00	30.0
29 มกราคม 2569	03.00-04.00	36.2
29 มกราคม 2569	04.00-05.00	28.0
29 มกราคม 2569	05.00-06.00	36.1
29 มกราคม 2569	06.00-07.00	37.3
29 มกราคม 2569	07.00-08.00	34.4
29 มกราคม 2569	08.00-09.00	30.4
29 มกราคม 2569	09.00-10.00	35.8

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
31 มกราคม 2569	10.00-11.00	29.9
31 มกราคม 2569	11.00-12.00	37.0
31 มกราคม 2569	12.00-13.00	33.7
31 มกราคม 2569	13.00-14.00	31.5
31 มกราคม 2569	14.00-15.00	35.4
31 มกราคม 2569	15.00-16.00	36.0
31 มกราคม 2569	16.00-17.00	33.2
31 มกราคม 2569	17.00-18.00	39.0
31 มกราคม 2569	18.00-19.00	24.2
31 มกราคม 2569	19.00-20.00	29.9
31 มกราคม 2569	20.00-21.00	34.3
31 มกราคม 2569	21.00-22.00	39.0
31 มกราคม 2569	22.00-23.00	37.5
31 มกราคม 2569	23.00-00.00	40.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	43.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	39.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	33.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	37.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	35.8
1 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	36.8
1 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	33.1
1 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	28.0
1 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	34.9
1 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	36.5

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
30 มกราคม 2569	10.00-11.00	37.5
30 มกราคม 2569	11.00-12.00	33.8
30 มกราคม 2569	12.00-13.00	42.0
30 มกราคม 2569	13.00-14.00	34.5
30 มกราคม 2569	14.00-15.00	42.3
30 มกราคม 2569	15.00-16.00	36.6
30 มกราคม 2569	16.00-17.00	32.0
30 มกราคม 2569	17.00-18.00	38.2
30 มกราคม 2569	18.00-19.00	38.5
30 มกราคม 2569	19.00-20.00	37.0
30 มกราคม 2569	20.00-21.00	39.9
30 มกราคม 2569	21.00-22.00	37.0
30 มกราคม 2569	22.00-23.00	38.0
30 มกราคม 2569	23.00-00.00	37.0
31 มกราคม 2569	00.00-01.00	36.0
31 มกราคม 2569	01.00-02.00	39.0
31 มกราคม 2569	02.00-03.00	40.2
31 มกราคม 2569	03.00-04.00	40.6
31 มกราคม 2569	04.00-05.00	37.0
31 มกราคม 2569	05.00-06.00	35.0
31 มกราคม 2569	06.00-07.00	32.0
31 มกราคม 2569	07.00-08.00	36.0
31 มกราคม 2569	08.00-09.00	37.5
31 มกราคม 2569	09.00-10.00	35.7


ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 3


- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

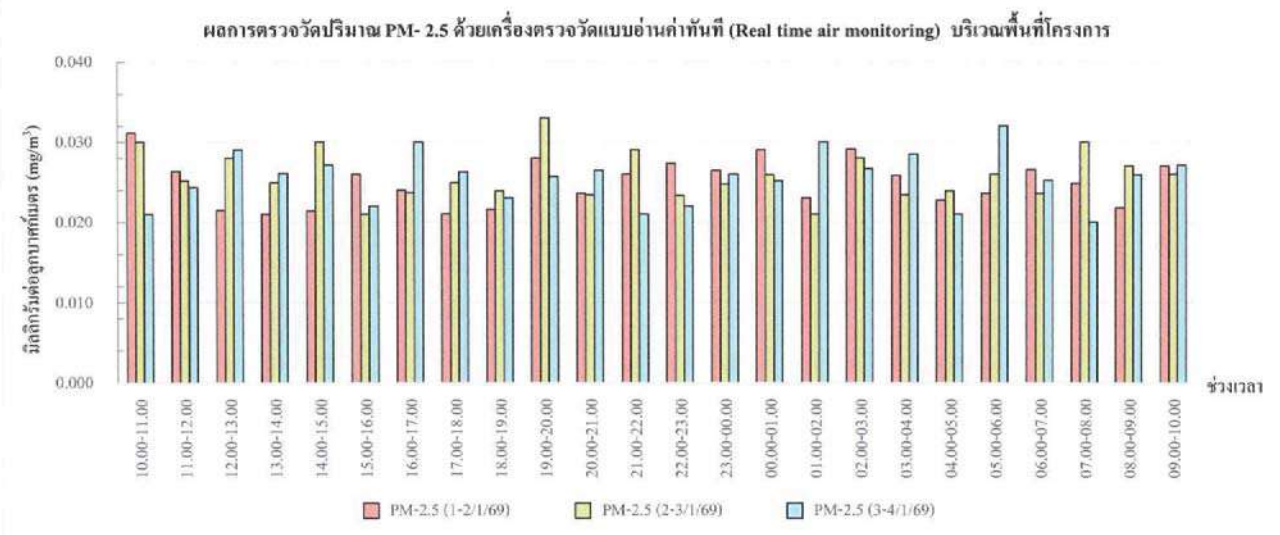

กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

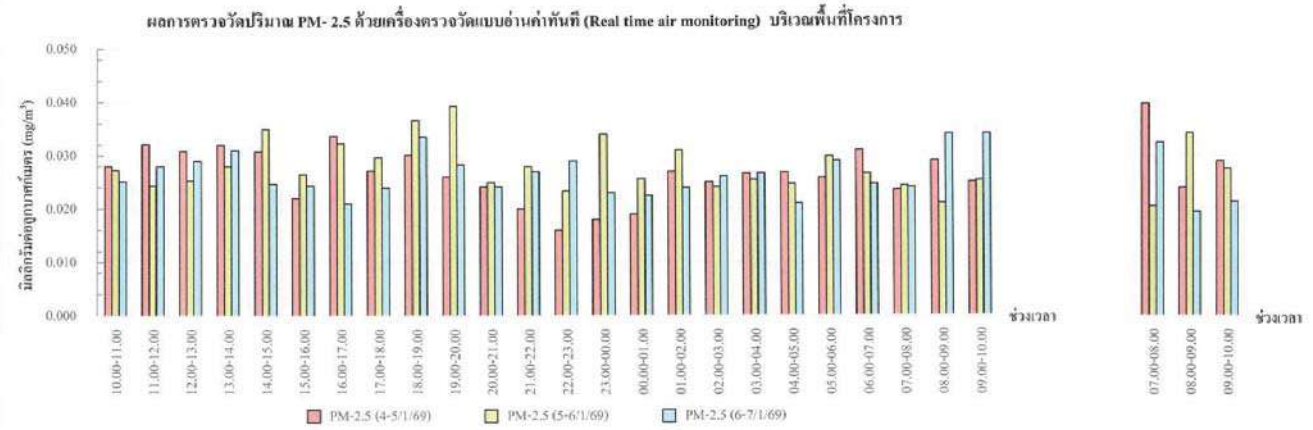


กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

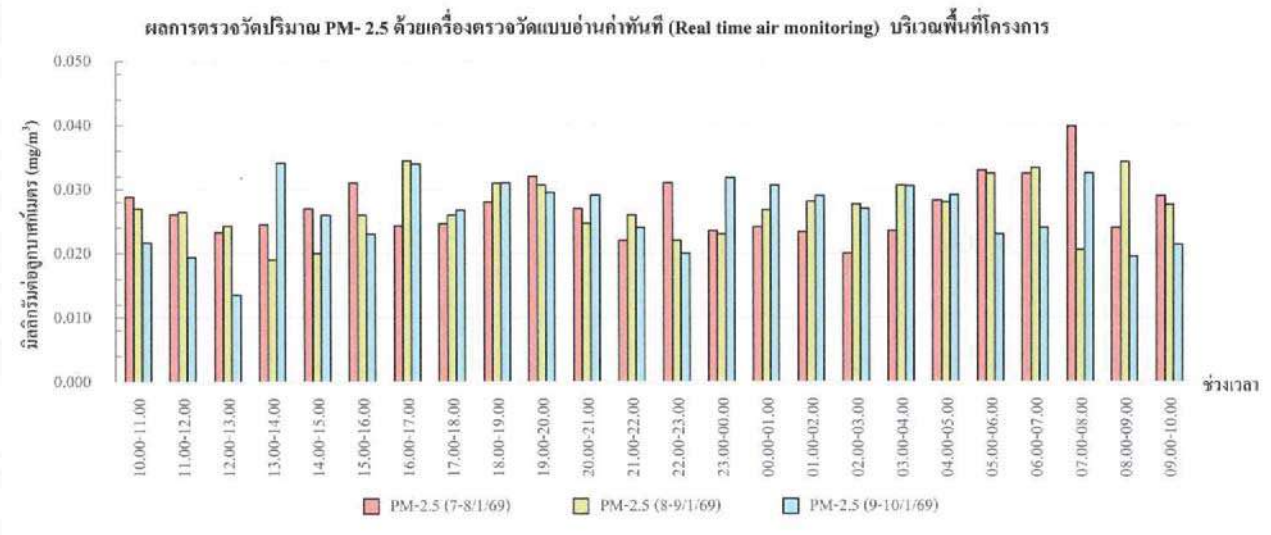

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

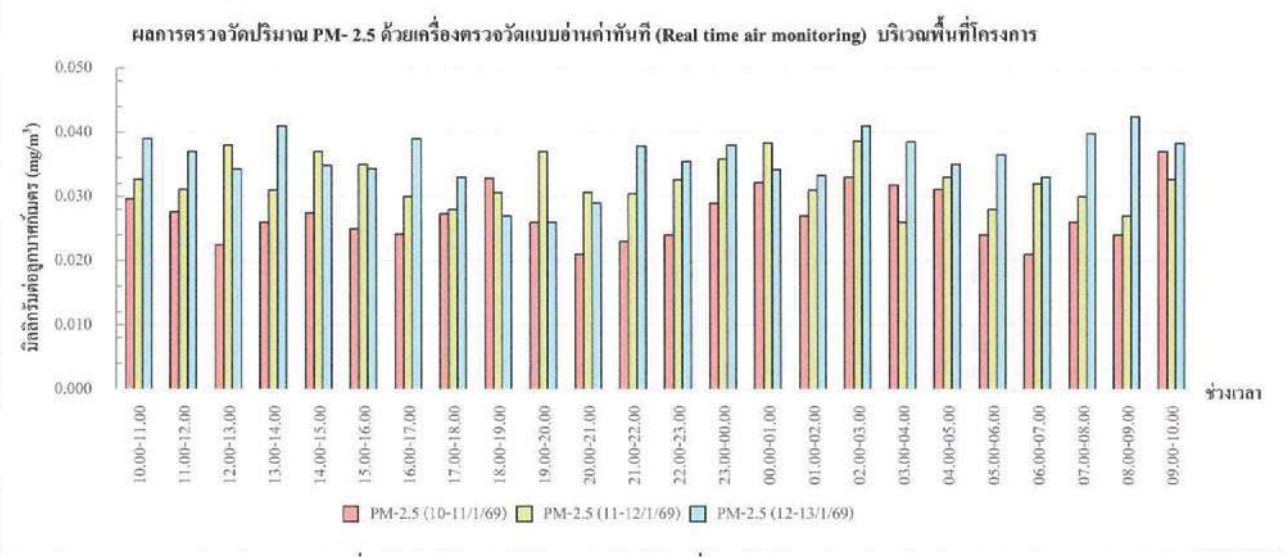


กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

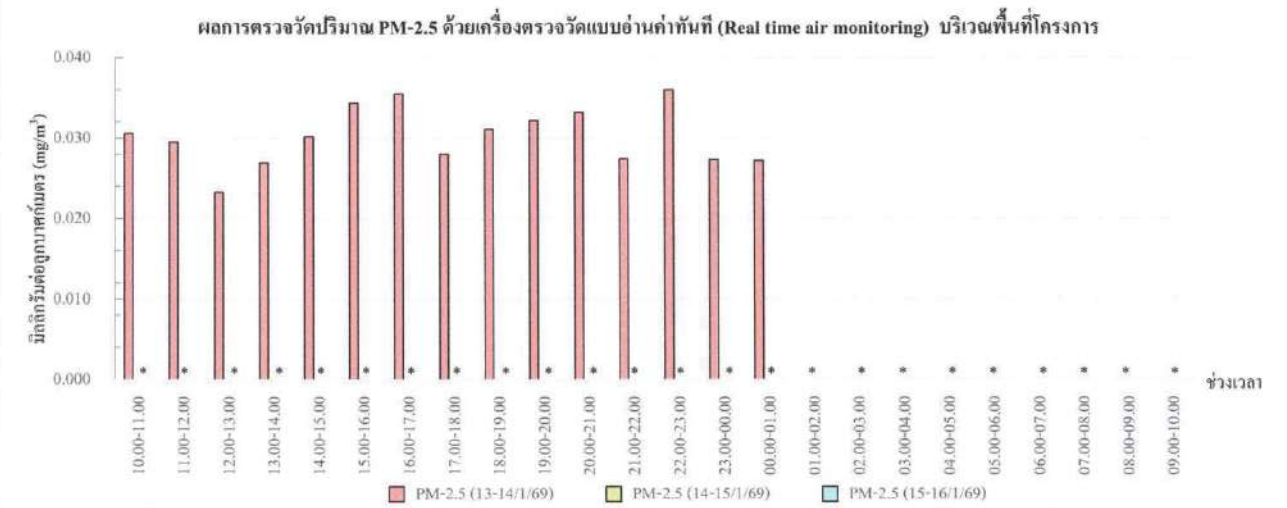


หมายเหตุ* – ในช่วงเวลาตั้งแต่ 01.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

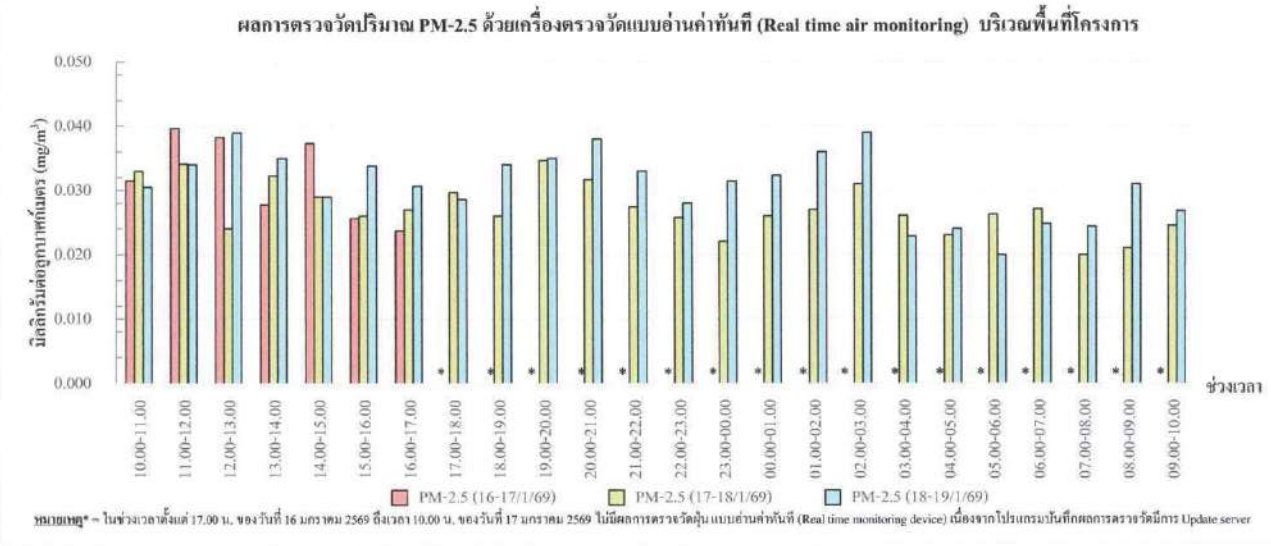


กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

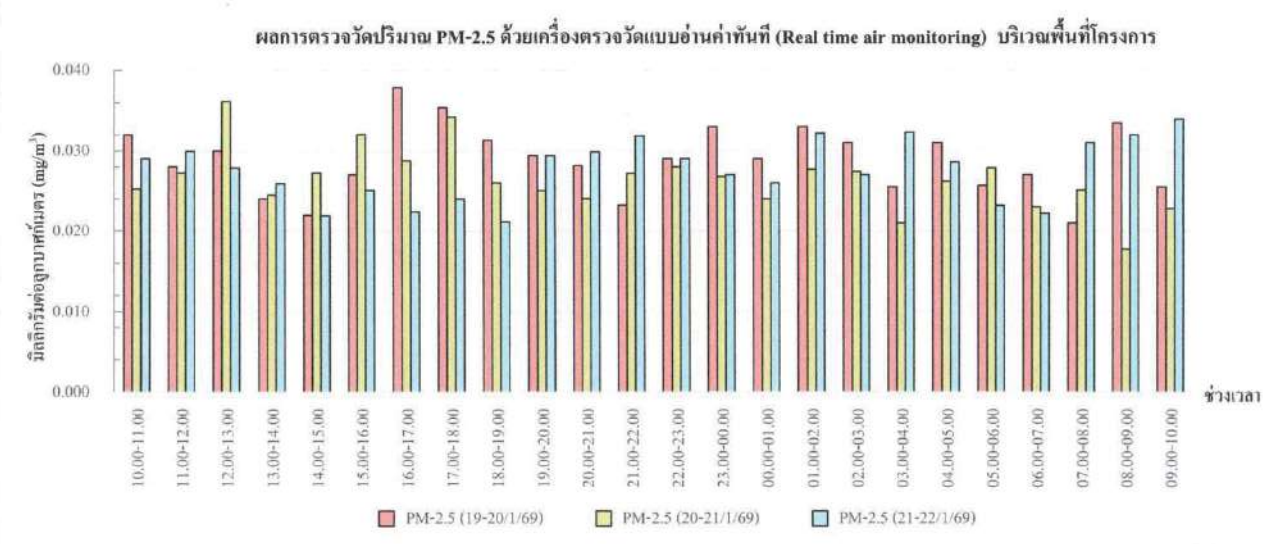

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

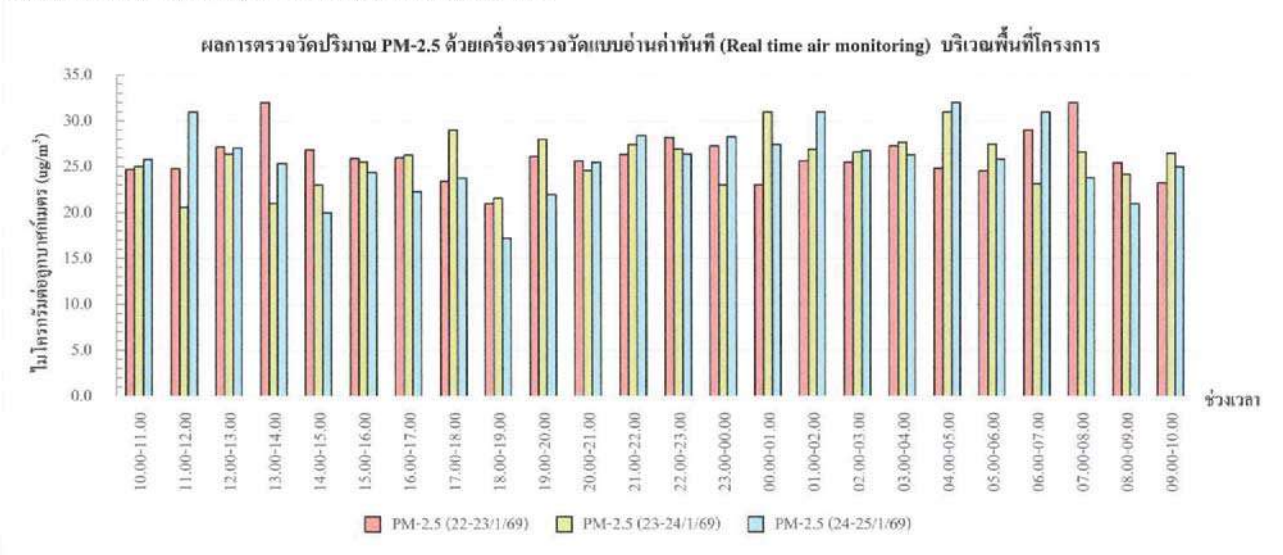


กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

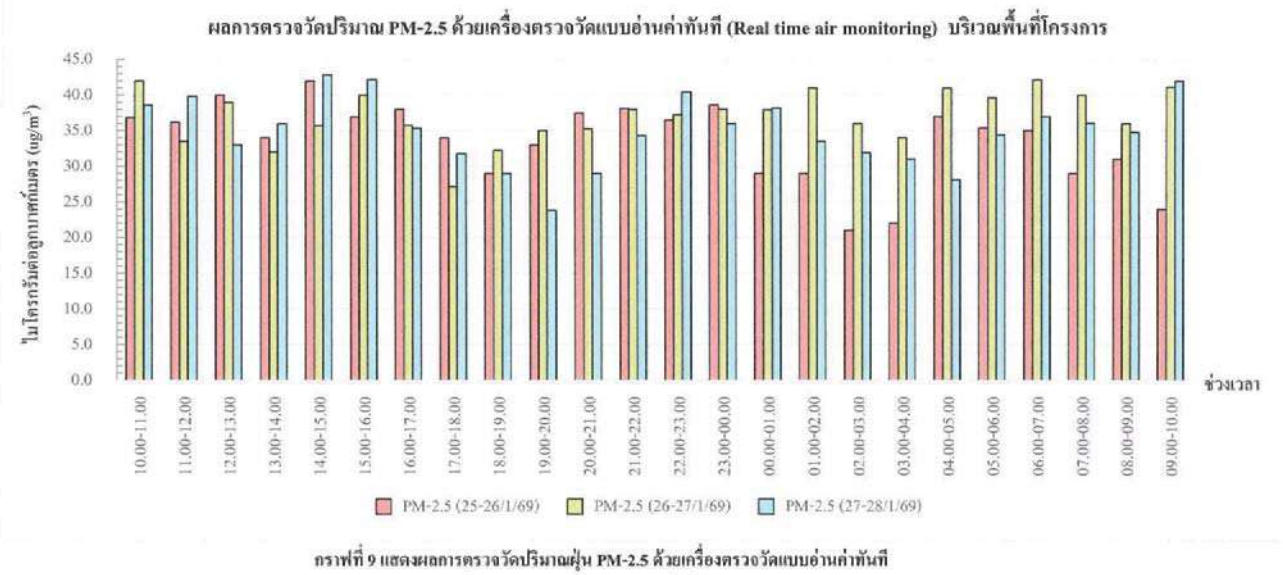

กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

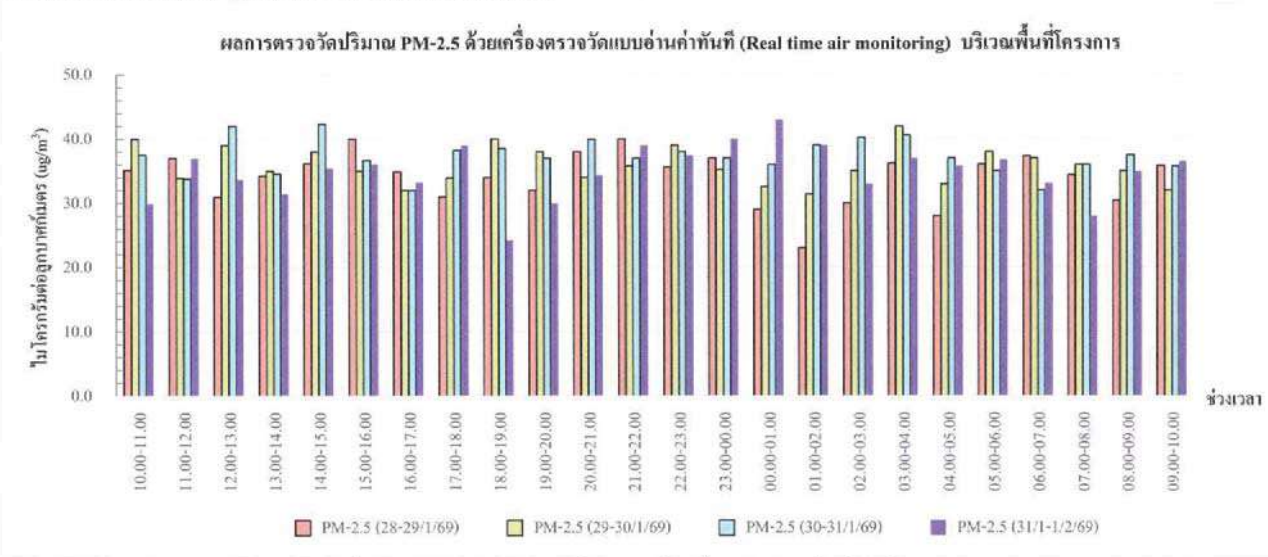

กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 มกราคม 2569 – 1 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน เอกมัย คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศละวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้ช่างออกรถด้านทิศละวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 20 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 มีนาคม 2569
เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-21D, Serial No. 821090, ID No. NS-15-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
Sound level meter "PULSAR" Model 44, Serial No. PN2365, ID No. NS-08-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 31 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 30 ตุลาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศละวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้ช่างออกรถ ด้านทิศละวันออกเฉียงเหนือ

ในรายงานผลการทดสอบรับรองฉบับนี้ ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 12-13 กุมภาพันธ์ 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	14.19-15.19	65.1	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.19-19.19	62.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.19-19.19	56.9	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		61.8	-
ระดับการรบกวน	-	4.9	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 13-14 กุมภาพันธ์ 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.19-09.19	65.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	19.19-20.19	61.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	19.19-20.19	56.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		62.6	-
ระดับการรบกวน	-	6.0	≤10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดรับตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ใช้ทำของครอบด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่รับตัวอย่าง : โครงการอาหารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทดสอบ : 21 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SOUNDTEK" Model ST-1090, Serial No. 221201934, ID No. NS-11-001
ปรับเทียบมาถูกต้อง วันที่ 8 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 7 กันยายน 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820188, ID No. NS-12-001
ปรับเทียบมาถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569

รูปถ่ายการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ใช้ทำของครอบด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาหารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) : หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq, 1hr.}$	$L_{A90, 1hr.}$	$L_{Amax, 1hr.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
12-13 กุมภาพันธ์ 2569	69	56	105
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	69	56	101
14-15 กุมภาพันธ์ 2569	68	61	101
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ใช้ทำของครอบด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
12-13 กุมภาพันธ์ 2569	58	52	103
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	58	54	84
14-15 กุมภาพันธ์ 2569	60	57	96
มาตรฐาน(*)	≤ 70	-	≤ 115

วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การตำนวนค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540

หมายเหตุ(*) : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	14.22-15.22	60.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.22-19.22	55.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.22-19.22	54.0	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.6	-
ระดับการรบกวน	-	4.6	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.22-10.22	60.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.22-06.22	57.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.22-06.22	53.1	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	57.4	-
ระดับการรบกวน	-	4.3	≤10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ (*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน(*)
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.19-10.19	62.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	04.19-05.19	59.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	04.19-05.19	55.0	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.1	-
ระดับการรบกวน	-	4.1	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.22-11.22	57.9	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.22-06.22	52.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.22-06.22	50.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.5	-
ระดับการรบกวน	-	5.7	≤10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 12-13 กุมภาพันธ์ 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.21	4.400	123	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
11.21	6.400	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
12.21	2.900	22	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
13.21	3.700	32	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
14.21	3.000	16	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
15.21	4.500	26	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
16.21	4.700	44	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
17.21	3.500	53	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
18.21	4.100	69	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
19.21	2.700	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
20.21	2.200	134	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
21.21	2.000	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.21	1.800	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.21	0.900	292	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.21	1.000	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
01.21	1.200	285	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
02.21	0.900	282	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
03.21	0.900	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
04.21	0.900	272	ตะวันตก (W)
05.21	1.000	285	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
06.21	1.100	243	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
07.21	1.100	275	ตะวันตก (W)
08.21	2.200	40	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
09.21	3.400	79	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.521	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทดสอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท จี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 13-14 กุมภาพันธ์ 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.21	3.000	71	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
11.21	3.400	71	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
12.21	3.700	66	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
13.21	3.600	83	ตะวันออก (E)
14.21	3.300	66	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
15.21	4.000	82	ตะวันออก (E)
16.21	3.300	86	ตะวันออก (E)
17.21	2.400	67	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
18.21	2.900	91	ตะวันออก (E)
19.21	2.400	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.21	1.700	302	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
21.21	1.700	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
22.21	1.200	277	ตะวันตก (W)
23.21	1.400	252	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
00.21	1.100	259	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
01.21	4.100	115	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
02.21	2.600	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
03.21	1.400	200	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
04.21	1.500	216	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
05.21	1.300	184	ใต้ (S)
06.21	0.900	262	ตะวันตก (W)
07.21	1.100	278	ตะวันตก (W)
08.21	2.000	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
09.21	3.900	89	ตะวันออก (E)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.413	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท จี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 14-15 กุมภาพันธ์ 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.21	3.900	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
11.21	4.600	99	ตะวันออก (E)
12.21	5.300	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
13.21	5.800	115	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
14.21	5.100	116	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.21	5.300	107	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
16.21	4.900	99	ตะวันออก (E)
17.21	3.900	101	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
18.21	3.400	101	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.21	1.600	178	ใต้ (S)
20.21	1.100	268	ตะวันตก (W)
21.21	1.100	260	ตะวันตก (W)
22.21	1.100	280	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.21	1.100	258	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
00.21	1.100	236	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
01.21	1.300	275	ตะวันตก (W)
02.21	1.300	278	ตะวันตก (W)
03.21	1.300	280	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
04.21	0.700	268	ตะวันตก (W)
05.21	0.900	287	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
06.21	1.200	272	ตะวันตก (W)
07.21	1.700	297	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
08.21	2.900	315	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
09.21	2.400	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.625	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 13-14 กุมภาพันธ์ 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.28	4.300	173	ใต้ (S)
12.28	4.700	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.28	4.500	188	ใต้ (S)
14.28	5.800	197	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
15.28	5.100	204	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
16.28	5.300	217	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
17.28	4.700	209	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
18.28	4.100	221	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
19.28	3.200	236	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
20.28	2.700	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
21.28	1.600	355	เหนือ (N)
22.28	1.300	15	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
23.28	1.300	140	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
00.28	1.600	13	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
01.28	1.800	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.28	1.300	2	เหนือ (N)
03.28	1.400	33	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
04.28	1.700	13	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
05.28	0.900	35	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
06.28	1.200	34	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
07.28	1.900	21	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
08.28	2.900	353	เหนือ (N)
09.28	3.600	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
10.28	3.400	346	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.929	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 12-13 กุมภาพันธ์ 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.28	3.800	177	ใต้ (S)
12.28	3.600	175	ใต้ (S)
13.28	5.400	47	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
14.28	4.900	48	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
15.28	4.700	67	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
16.28	4.900	57	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
17.28	4.100	72	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
18.28	3.300	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.28	2.000	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
20.28	2.000	133	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
21.28	1.500	198	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
22.28	0.900	324	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
23.28	0.900	140	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
00.28	1.400	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.28	1.300	30	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
02.28	1.300	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
03.28	2.000	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.28	1.100	164	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.28	1.600	349	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.28	1.600	301	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
07.28	2.200	243	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
08.28	2.400	238	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
09.28	2.200	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
10.28	4.300	37	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.642	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเคน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทดสอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3272, ID No. AB-09-011
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3245, ID No. AB-10-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
PM 2.5-PM 10 Air sampler "BGI" Model. PQ-200, Serial No. 140AB25409410, ID No. AB-16-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 30 สิงหาคม 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 14-15 กุมภาพันธ์ 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.28	5.000	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
12.28	5.800	207	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
13.28	7.800	212	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
14.28	6.800	218	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
15.28	7.700	216	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
16.28	6.400	220	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
17.28	6.000	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
18.28	6.000	239	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
19.28	4.400	242	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
20.28	3.900	288	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
21.28	2.700	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
22.28	1.800	34	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
23.28	1.400	43	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
00.28	1.600	53	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
01.28	2.200	56	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
02.28	1.800	52	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
03.28	1.600	57	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
04.28	1.400	36	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
05.28	3.000	63	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
06.28	3.900	313	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
07.28	2.800	351	เหนือ (N)
08.28	3.400	7	เหนือ (N)
09.28	2.900	6	เหนือ (N)
10.28	3.800	327	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.921	
วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	138,700	77	119,700	73	730	32	2.19
2	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	107,700	58	89,700	55	540	23	2.04
3	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	94,700	52	81,700	50	490	21	2.16
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	94,600	55	80,600	49	-	-	2.21
2	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	89,600	50	71,600	44	-	-	2.19
3	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	78,600	44	67,600	41	-	-	2.05
มาตรฐาน[1]		-	≤ 200	-	≤ 100	-	≤ 37.5	-
LOQ[2]		10,000	5	3,000	1	100	4.3	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :	1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler 2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย PM-2.5 air sampler, FRM method 4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer
มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :	1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B 2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L 4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	1.09
		11.00-12.00	3.01
		12.00-13.00	2.06
		13.00-14.00	1.80
		14.00-15.00	1.76
		15.00-16.00	1.77
		16.00-17.00	1.80
		17.00-18.00	1.82
		18.00-19.00	1.85
		19.00-20.00	1.90
		20.00-21.00	1.95
		21.00-22.00	1.99
		22.00-23.00	2.01
		23.00-00.00	2.03
		00.00-01.00	2.06
		01.00-02.00	2.09
		02.00-03.00	2.10
		03.00-04.00	2.12
		04.00-05.00	2.14
		05.00-06.00	2.16
		06.00-07.00	2.17
		07.00-08.00	2.17
		08.00-09.00	2.17
		09.00-10.00	2.14
		Max (1 ชั่วโมง)	3.01
		Min (1 ชั่วโมง)	1.09
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.01
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 30
		LOQ(2)	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทดสอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 401304261, ID No. AB-03-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
3	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	1.58
		11.00-12.00	2.00
		12.00-13.00	1.78
		13.00-14.00	1.65
		14.00-15.00	1.80
		15.00-16.00	1.96
		16.00-17.00	2.05
		17.00-18.00	2.09
		18.00-19.00	2.12
		19.00-20.00	2.15
		20.00-21.00	2.19
		21.00-22.00	2.21
		22.00-23.00	2.23
		23.00-00.00	2.24
		00.00-01.00	2.24
		01.00-02.00	2.26
		02.00-03.00	2.27
		03.00-04.00	2.26
		04.00-05.00	2.25
		05.00-06.00	2.26
		06.00-07.00	2.26
		07.00-08.00	2.27
		08.00-09.00	2.27
		09.00-10.00	2.24
		Max (1 ชั่วโมง)	2.27
		Min (1 ชั่วโมง)	1.58
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.11
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 30
		LOQ(2)	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	2.08
		11.00-12.00	1.42
		12.00-13.00	2.05
		13.00-14.00	1.93
		14.00-15.00	1.91
		15.00-16.00	1.91
		16.00-17.00	1.97
		17.00-18.00	2.00
		18.00-19.00	2.01
		19.00-20.00	2.05
		20.00-21.00	2.11
		21.00-22.00	2.15
		22.00-23.00	2.17
		23.00-00.00	2.19
		00.00-01.00	2.21
		01.00-02.00	2.20
		02.00-03.00	2.20
		03.00-04.00	2.20
		04.00-05.00	2.21
		05.00-06.00	2.21
		06.00-07.00	2.21
		07.00-08.00	2.22
		08.00-09.00	2.23
		09.00-10.00	2.21
		Max (1 ชั่วโมง)	2.23
		Min (1 ชั่วโมง)	1.42
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.08
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 30
		LOQ(2)	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
5	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	3.60
		12.00-13.00	3.55
		13.00-14.00	3.59
		14.00-15.00	3.58
		15.00-16.00	3.50
		16.00-17.00	3.40
		17.00-18.00	3.30
		18.00-19.00	3.30
		19.00-20.00	3.38
		20.00-21.00	3.41
		21.00-22.00	3.13
		22.00-23.00	3.15
		23.00-00.00	3.93
		00.00-01.00	4.26
		01.00-02.00	4.44
		02.00-03.00	4.48
		03.00-04.00	4.17
		04.00-05.00	4.06
		05.00-06.00	4.30
		06.00-07.00	4.13
		07.00-08.00	3.96
		08.00-09.00	3.81
		09.00-10.00	3.57
		10.00-11.00	3.58
		Max (1 ชั่วโมง)	4.48
		Min (1 ชั่วโมง)	3.13
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.73
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 30
		LOQ(2)	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
4	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	2.84
		12.00-13.00	2.81
		13.00-14.00	2.75
		14.00-15.00	2.72
		15.00-16.00	2.75
		16.00-17.00	2.77
		17.00-18.00	2.78
		18.00-19.00	2.81
		19.00-20.00	2.87
		20.00-21.00	2.91
		21.00-22.00	2.93
		22.00-23.00	2.93
		23.00-00.00	2.96
		00.00-01.00	2.96
		01.00-02.00	2.97
		02.00-03.00	2.98
		03.00-04.00	2.98
		04.00-05.00	2.99
		05.00-06.00	3.01
		06.00-07.00	3.01
		07.00-08.00	3.02
		08.00-09.00	3.00
		09.00-10.00	3.84
		10.00-11.00	3.66
		Max (1 ชั่วโมง)	3.84
		Min (1 ชั่วโมง)	2.72
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.97
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 30
		LOQ(2)	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 20 กุมภาพันธ์ 2569


วันที่ทดสอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385, ID No.AB-01-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
SO2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-62201-334, ID No.AB-01-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ

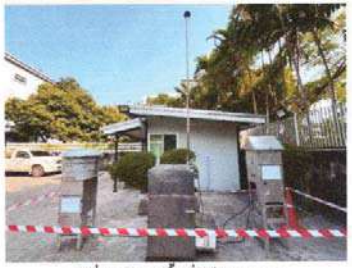

จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
6	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	2.69
		12.00-13.00	2.67
		13.00-14.00	2.71
		14.00-15.00	2.69
		15.00-16.00	2.68
		16.00-17.00	2.70
		17.00-18.00	2.72
		18.00-19.00	2.68
		19.00-20.00	2.80
		20.00-21.00	2.79
		21.00-22.00	2.80
		22.00-23.00	2.79
		23.00-00.00	2.82
		00.00-01.00	2.81
		01.00-02.00	2.80
		02.00-03.00	2.81
		03.00-04.00	2.82
		04.00-05.00	2.82
		05.00-06.00	2.83
		06.00-07.00	2.83
		07.00-08.00	2.84
		08.00-09.00	2.82
		09.00-10.00	2.84
		10.00-11.00	2.83
		Max (1 ชั่วโมง)	2.84
		Min (1 ชั่วโมง)	2.67
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.77
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04
วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
1	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	6.9
		11.00-12.00	6.9
		12.00-13.00	6.7
		13.00-14.00	6.6
		14.00-15.00	6.3
		15.00-16.00	6.2
		16.00-17.00	6.3
		17.00-18.00	6.2
		18.00-19.00	6.1
		19.00-20.00	6.1
		20.00-21.00	5.9
		21.00-22.00	5.7
		22.00-23.00	4.4
		23.00-00.00	5.9
		00.00-01.00	5.9
		01.00-02.00	6.0
		02.00-03.00	6.0
		03.00-04.00	6.0
		04.00-05.00	6.1
		05.00-06.00	5.3
		06.00-07.00	6.2
		07.00-08.00	6.3
		08.00-09.00	6.4
		09.00-10.00	6.4
		Max (1 ชั่วโมง)	6.9
		Min (1 ชั่วโมง)	4.4
		Avg (24 ชั่วโมง)	6.1
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
2	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	6.6
		11.00-12.00	6.8
		12.00-13.00	6.9
		13.00-14.00	6.7
		14.00-15.00	6.6
		15.00-16.00	6.5
		16.00-17.00	6.8
		17.00-18.00	6.8
		18.00-19.00	6.0
		19.00-20.00	7.0
		20.00-21.00	6.9
		21.00-22.00	6.6
		22.00-23.00	6.6
		23.00-00.00	6.7
		00.00-01.00	6.7
		01.00-02.00	6.7
		02.00-03.00	6.7
		03.00-04.00	6.8
		04.00-05.00	6.5
		05.00-06.00	6.6
		06.00-07.00	6.7
		07.00-08.00	6.8
		08.00-09.00	6.8
		09.00-10.00	7.0
		Max (1 ชั่วโมง)	7.0
		Min (1 ชั่วโมง)	6.0
		Avg (24 ชั่วโมง)	6.7
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
4	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	21.6
		12.00-13.00	22.4
		13.00-14.00	26.4
		14.00-15.00	23.8
		15.00-16.00	24.8
		16.00-17.00	25.7
		17.00-18.00	24.3
		18.00-19.00	26.5
		19.00-20.00	23.6
		20.00-21.00	24.6
		21.00-22.00	26.8
		22.00-23.00	24.7
		23.00-00.00	25.9
		00.00-01.00	23.9
		01.00-02.00	24.9
		02.00-03.00	25.2
		03.00-04.00	25.6
		04.00-05.00	24.7
		05.00-06.00	22.9
		06.00-07.00	23.3
		07.00-08.00	24.3
		08.00-09.00	26.2
		09.00-10.00	24.8
		10.00-11.00	24.7
		Max (1 ชั่วโมง)	26.8
		Min (1 ชั่วโมง)	21.6
		Avg (24 ชั่วโมง)	24.7
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(1)	≤ 50
		LOQ(2)	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
3	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	7.0
		11.00-12.00	6.8
		12.00-13.00	6.6
		13.00-14.00	6.5
		14.00-15.00	6.3
		15.00-16.00	6.1
		16.00-17.00	6.0
		17.00-18.00	6.2
		18.00-19.00	5.9
		19.00-20.00	5.5
		20.00-21.00	5.2
		21.00-22.00	5.1
		22.00-23.00	4.7
		23.00-00.00	4.7
		00.00-01.00	4.7
		01.00-02.00	4.8
		02.00-03.00	4.9
		03.00-04.00	5.1
		04.00-05.00	5.3
		05.00-06.00	5.4
		06.00-07.00	4.4
		07.00-08.00	5.4
		08.00-09.00	5.4
		09.00-10.00	5.3
		Max (1 ชั่วโมง)	7.0
		Min (1 ชั่วโมง)	4.4
		Avg (24 ชั่วโมง)	5.5
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(1)	≤ 50
		LOQ(2)	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
6	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	24.5
		12.00-13.00	22.8
		13.00-14.00	24.2
		14.00-15.00	24.6
		15.00-16.00	25.5
		16.00-17.00	25.5
		17.00-18.00	25.7
		18.00-19.00	25.3
		19.00-20.00	23.6
		20.00-21.00	24.7
		21.00-22.00	25.9
		22.00-23.00	24.7
		23.00-00.00	25.2
		00.00-01.00	24.8
		01.00-02.00	24.2
		02.00-03.00	25.9
		03.00-04.00	25.7
		04.00-05.00	24.6
		05.00-06.00	25.7
		06.00-07.00	26.4
		07.00-08.00	24.2
		08.00-09.00	26.3
		09.00-10.00	23.6
		10.00-11.00	25.2
		Max (1 ชั่วโมง)	26.4
		Min (1 ชั่วโมง)	22.8
		Avg (24 ชั่วโมง)	24.9
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5
วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
5	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	24.9
		12.00-13.00	24.5
		13.00-14.00	25.1
		14.00-15.00	25.5
		15.00-16.00	25.6
		16.00-17.00	25.7
		17.00-18.00	25.9
		18.00-19.00	25.0
		19.00-20.00	24.8
		20.00-21.00	23.8
		21.00-22.00	24.1
		22.00-23.00	24.2
		23.00-00.00	24.7
		00.00-01.00	24.2
		01.00-02.00	24.1
		02.00-03.00	25.6
		03.00-04.00	25.1
		04.00-05.00	24.2
		05.00-06.00	23.7
		06.00-07.00	22.4
		07.00-08.00	23.8
		08.00-09.00	23.4
		09.00-10.00	27.7
		10.00-11.00	27.7
		Max (1 ชั่วโมง)	27.7
		Min (1 ชั่วโมง)	22.4
		Avg (24 ชั่วโมง)	24.8
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
1	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 120
		LOQ(2)	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทดสอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 508011077, ID No.AB-02-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
3	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
2	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
5	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 120
		LOQ(2)	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
4	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 120
		LOQ(2)	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก


ฉถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-15 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทดสอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :

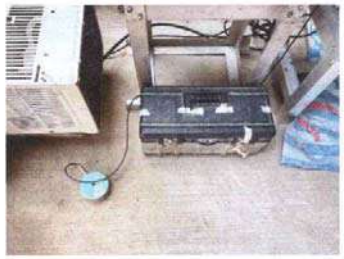

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
6	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50
วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
14 กุมภาพันธ์ 2569						
08.57	0.284	> 100.00	0.638	1.98	0.166	> 100.00
09.48	0.181	15.75	0.512	56.32	0.110	30.12
10.56	0.363	85.47	1.718	> 100.00	0.366	> 100.00
11.46	0.276	9.66	0.843	74.23	0.258	80.21
13.34	0.205	5.75	0.615	25.60	0.250	> 100.00
14.34	0.261	7.31	0.835	> 100.00	0.266	73.62
15.58	0.236	1.86	0.968	64.51	0.392	> 100.00
16.59	0.231	63.25	0.958	54.77	0.337	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ[1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[3]= วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

(นางสาวเกษญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0369-01

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
12 กุมภาพันธ์ 2569						
13.37	0.481	> 100.00	0.607	1.99	0.394	> 100.00
14.32	0.421	28.44	0.536	> 100.00	0.244	> 100.00
15.13	0.352	> 100.00	0.599	> 100.00	0.441	> 100.00
16.47	0.260	1.96	0.891	> 100.00	0.229	> 100.00
13 กุมภาพันธ์ 2569						
08.45	0.189	2.36	0.678	85.12	0.134	> 100.00
09.44	0.339	> 100.00	0.560	> 100.00	0.307	> 100.00
10.38	0.465	> 100.00	1.529	> 100.00	0.402	> 100.00
11.47	1.088	> 100.00	2.191	> 100.00	1.040	> 100.00
13.36	0.197	21.23	0.528	14.39	0.214	> 100.00
14.07	0.213	1.93	0.733	84.22	0.173	64.00
15.18	0.221	4.56	0.567	74.16	0.142	85.33
16.07	0.300	36.57	0.804	88.36	0.126	73.14
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 12 กุมภาพันธ์ 2569	มาตรฐาน[3]
pH	-	-	-	12.6	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	16	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	137	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	1.5	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	1,534	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	4	≤ 40
Oil and grease	mg/L	1	3	4	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ใส มีตะกอนมาก	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0346-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 มีนาคม 2569
เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0346-01

หมายเหตุ (1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

Kanyaa

(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattana porn

(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุไชย)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
1 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	27
1 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	25
1 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	27
1 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	27
1 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	27
1 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
1 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	27
1 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	27
2 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	27
2 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
2 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	25
2 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 3 มีนาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 3 มีนาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 4 มีนาคม 2569

เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
3 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	25
3 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	25
3 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	24
3 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	25
3 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	24
4 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	27
4 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	27
4 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
4 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	27
4 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	24

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
2 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	25
2 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	25
2 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	27
2 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	27
2 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	27
2 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
2 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	25
3 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	27
3 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
3 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	25
3 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
5 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	24
5 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	27
5 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	27
5 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	25
5 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	27
5 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
6 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	27
6 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	27

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
4 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	27
4 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	25
4 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	25
4 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	20
4 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	20
4 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	24
4 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	25
4 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	23
4 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
4 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	22
4 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	27
4 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	25
5 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	27
5 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	25
5 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	22
5 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
5 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
5 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	27

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
7 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	27
7 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	25
7 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	27
7 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	25
7 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
6 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
6 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	27
6 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	27
6 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
6 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	27
7 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	25
7 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
7 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	27
7 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	25
7 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
7 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
8 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
8 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	25
8 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
8 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	27
9 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	28
9 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
9 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	27
9 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	27
9 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	25
9 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
9 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	27
10 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	27
10 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
11 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	25
11 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	25
11 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	27
11 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	27
11 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	28
11 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	27
11 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	25
11 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	27
12 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	28
12 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
12 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	25

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
10 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	25
10 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
10 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	25
10 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	25
10 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	27
10 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
10 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
11 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
11 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
11 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	25

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
13 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	25
13 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	27
13 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	25
13 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	*
13 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	*
13 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	*
13 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	*
13 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	*
13 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	*
13 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	*
13 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	*

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
12 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	25
12 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	25
12 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	24
12 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	23
12 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	27
12 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	25
12 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	25
12 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	25
12 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
12 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	25
13 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	27
13 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	27
13 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	25
13 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	27
13 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
13 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	25
13 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	24

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
15 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	25
15 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	25
16 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	27
16 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
16 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	25
16 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
14 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	*
14 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	27
14 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
14 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
14 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	23
14 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
14 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	28
14 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
14 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	25
14 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	22
14 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
14 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	25
15 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	28
15 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	24
15 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
15 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	24
15 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	21
15 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	27
15 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	28

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาดังแต่ 10.00-13.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
17 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	25
17 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	25
17 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	25
17 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	25
17 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	27
18 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	25
18 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	25
18 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	25

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
16 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	23
16 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	25
16 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	27
16 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	25
16 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
16 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	27
17 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
17 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
17 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
17 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
19 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	27
19 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
19 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	25
19 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	27
19 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	25
19 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	25
19 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	25
19 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	25
20 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	25
20 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
20 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
18 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	23
18 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
18 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	25
18 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	29
18 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	24
18 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	23
18 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	20
18 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	23
18 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	22
18 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
18 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	29
19 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	25
19 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	25
19 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
19 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
19 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	21
19 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
19 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
19 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	22
19 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
21 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	25
21 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	25
21 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	25
21 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	25
21 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	25
22 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	25

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
20 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	25
20 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	23
20 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	24
20 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	27
20 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
20 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	27
21 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
21 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	26
21 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
23 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
23 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	24
23 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	25
23 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	21
23 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
23 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	*
23 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	*
23 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	23
24 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	27
24 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	25
24 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	21
24 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	21
24 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	27

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00-21.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
22 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	25
22 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	25
22 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	27
22 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	25
22 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
22 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
23 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
23 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	27
23 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	25
23 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
23 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
23 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
23 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	25
23 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	25
23 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	25
23 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
25 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	25
25 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	25
25 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	28
25 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	25
26 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
24 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	27
24 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	27
24 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	27
24 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
24 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	25
24 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	25
25 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
25 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
25 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	27
25 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
27 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	27
27 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	25
27 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	24
27 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	27
27 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	24
27 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	23
27 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	29
27 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	21
27 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	30
28 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	27
28 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	25
28 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	22
28 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	*
28 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	*

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-10.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
26 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	29
26 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	25
26 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	25
26 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	20
26 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	29
26 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	27
26 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	24
26 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	26
26 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	24
27 กุมภาพันธ์ 2569	00.00-01.00	29
27 กุมภาพันธ์ 2569	01.00-02.00	25
27 กุมภาพันธ์ 2569	02.00-03.00	22
27 กุมภาพันธ์ 2569	03.00-04.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	04.00-05.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	05.00-06.00	30
27 กุมภาพันธ์ 2569	06.00-07.00	26
27 กุมภาพันธ์ 2569	07.00-08.00	20
27 กุมภาพันธ์ 2569	08.00-09.00	27
27 กุมภาพันธ์ 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

C.E.M TECH

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)


วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
28 กุมภาพันธ์ 2569	10.00-11.00	*
28 กุมภาพันธ์ 2569	11.00-12.00	*
28 กุมภาพันธ์ 2569	12.00-13.00	*
28 กุมภาพันธ์ 2569	13.00-14.00	*
28 กุมภาพันธ์ 2569	14.00-15.00	27
28 กุมภาพันธ์ 2569	15.00-16.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	16.00-17.00	22
28 กุมภาพันธ์ 2569	17.00-18.00	27
28 กุมภาพันธ์ 2569	18.00-19.00	25
28 กุมภาพันธ์ 2569	19.00-20.00	29
28 กุมภาพันธ์ 2569	20.00-21.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	21.00-22.00	26
28 กุมภาพันธ์ 2569	22.00-23.00	24
28 กุมภาพันธ์ 2569	23.00-00.00	26
1 มีนาคม 2569	00.00-01.00	26
1 มีนาคม 2569	01.00-02.00	21
1 มีนาคม 2569	02.00-03.00	27
1 มีนาคม 2569	03.00-04.00	28
1 มีนาคม 2569	04.00-05.00	25
1 มีนาคม 2569	05.00-06.00	26
1 มีนาคม 2569	06.00-07.00	29
1 มีนาคม 2569	07.00-08.00	26
1 มีนาคม 2569	08.00-09.00	24
1 มีนาคม 2569	09.00-10.00	26
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-14.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

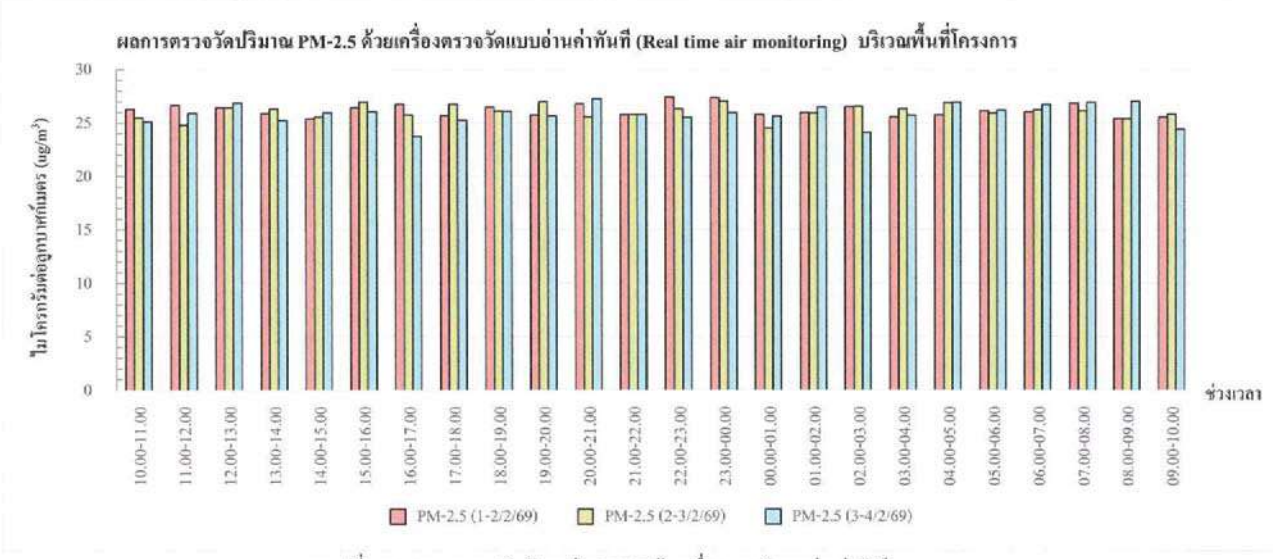


กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

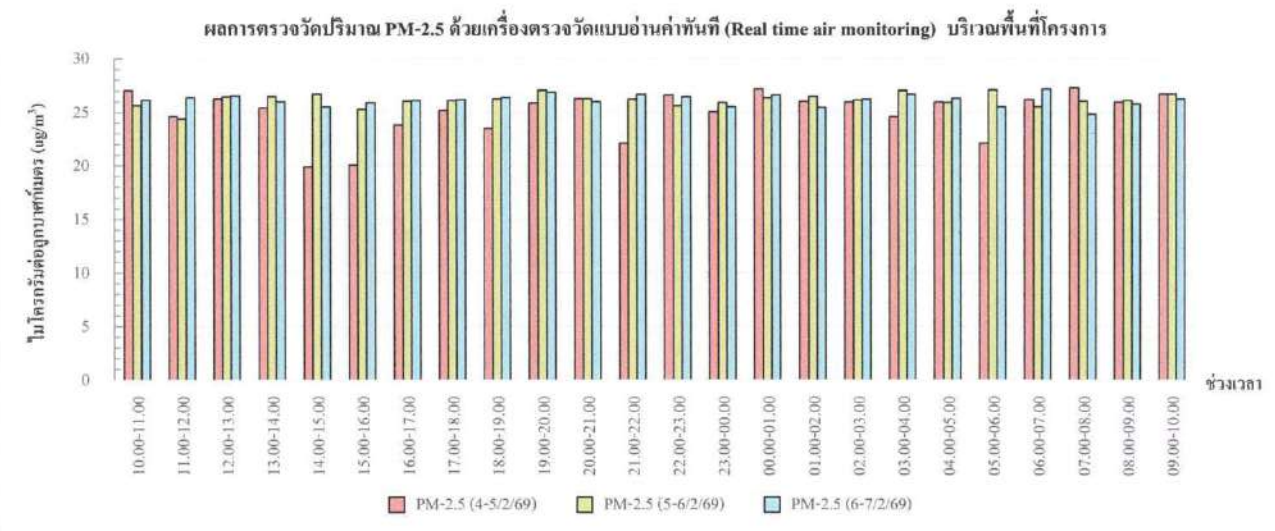

กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

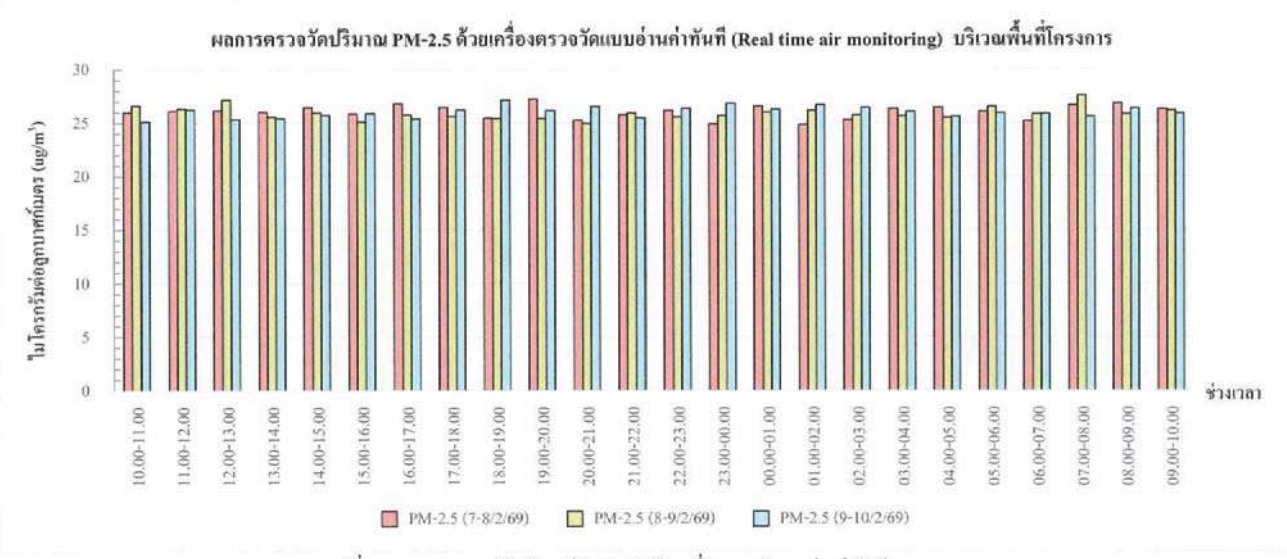


กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

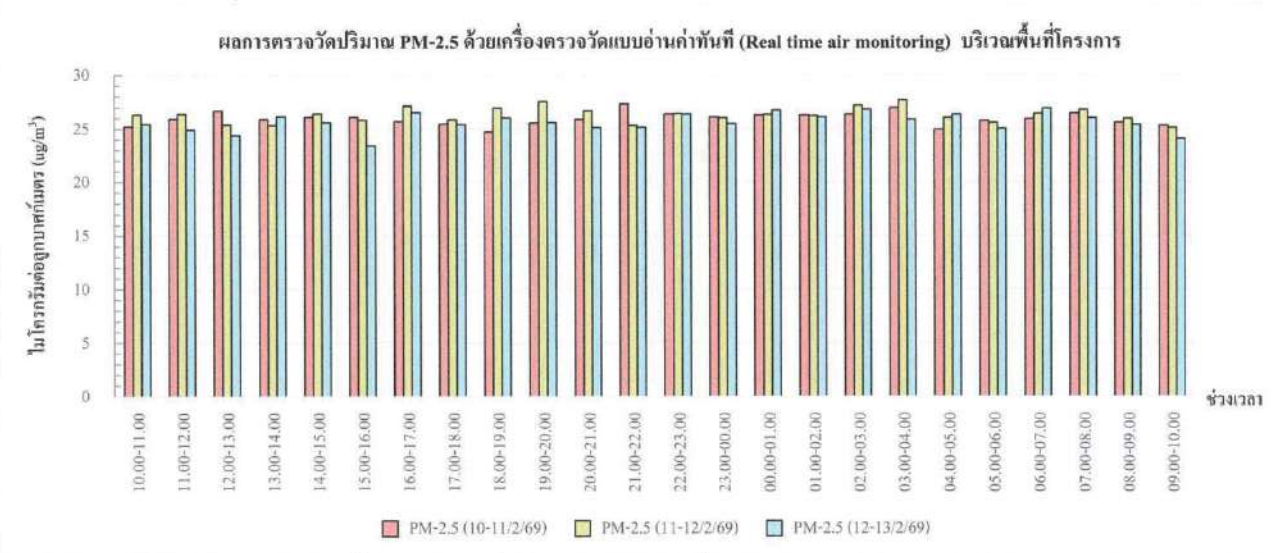

กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

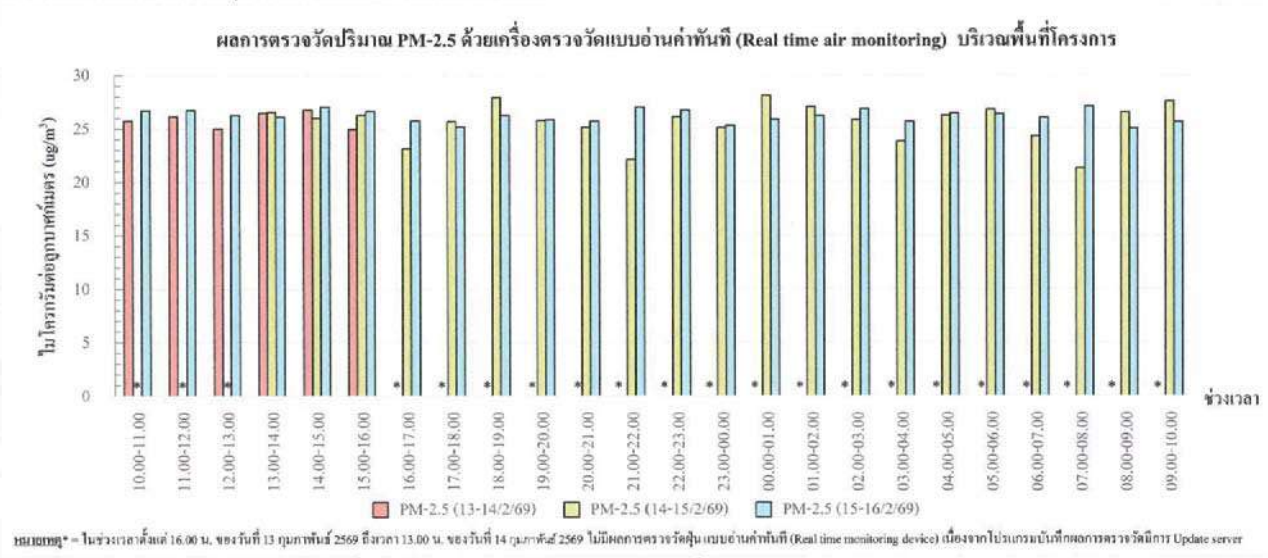


กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECH


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

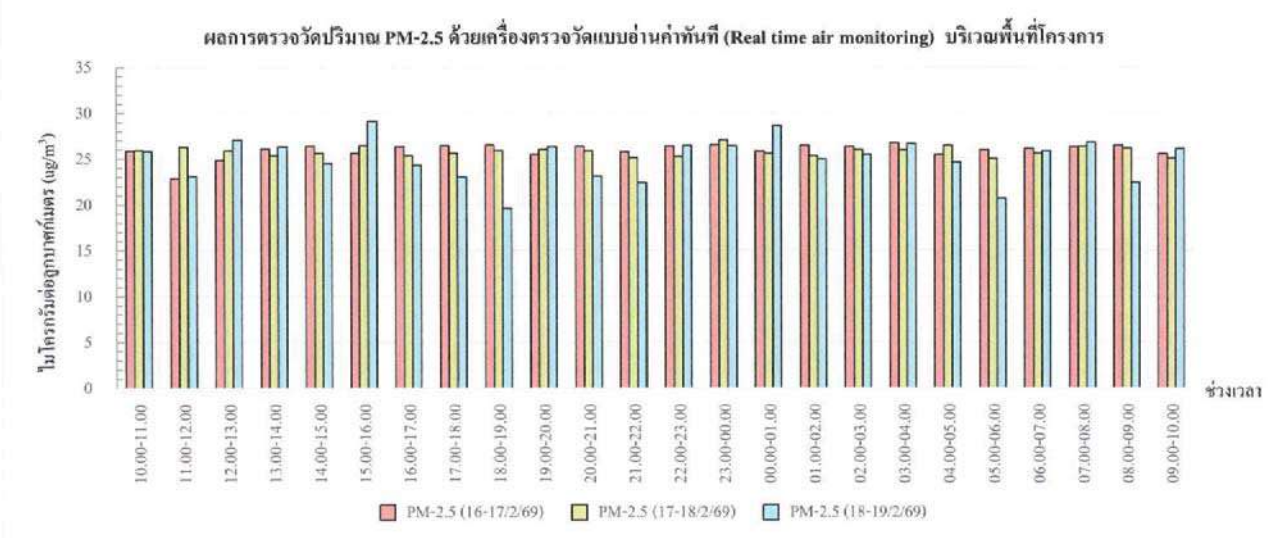

กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

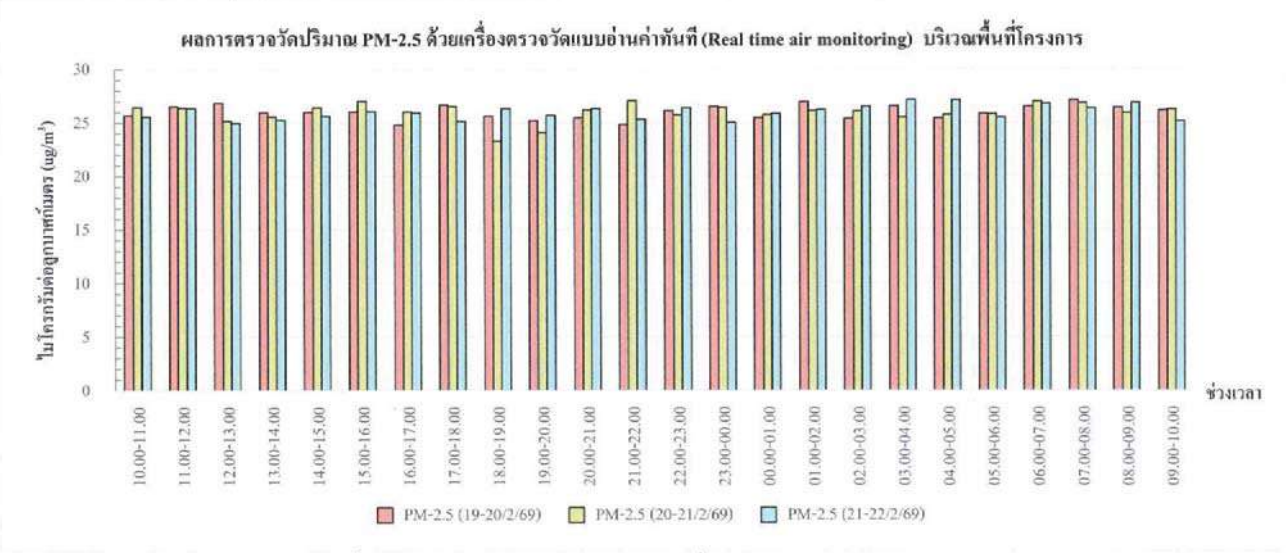


กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

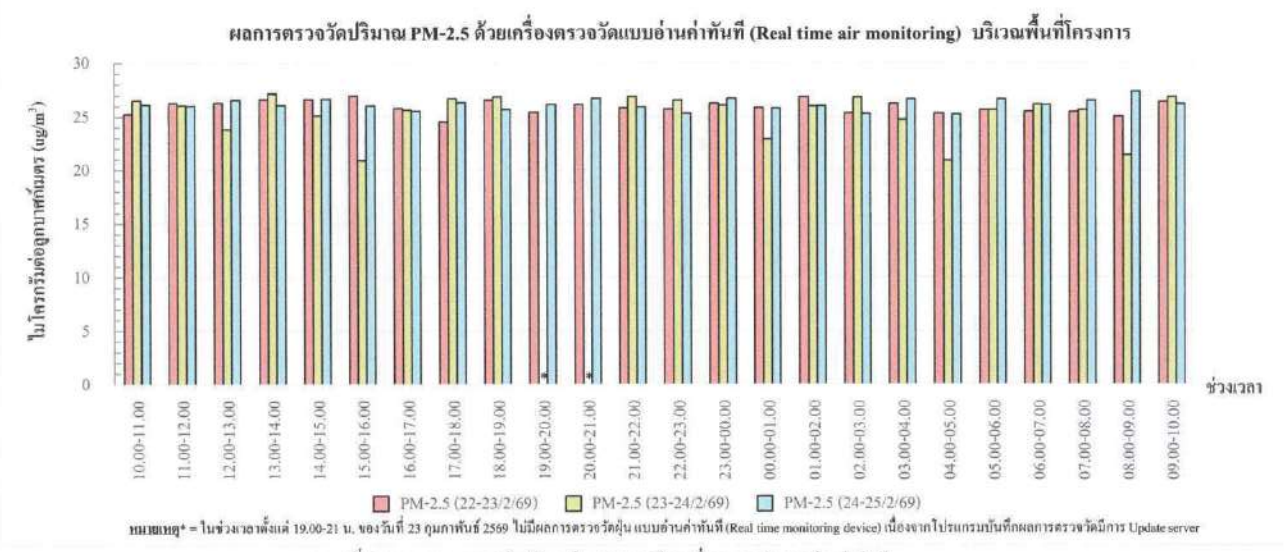


หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00-21 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

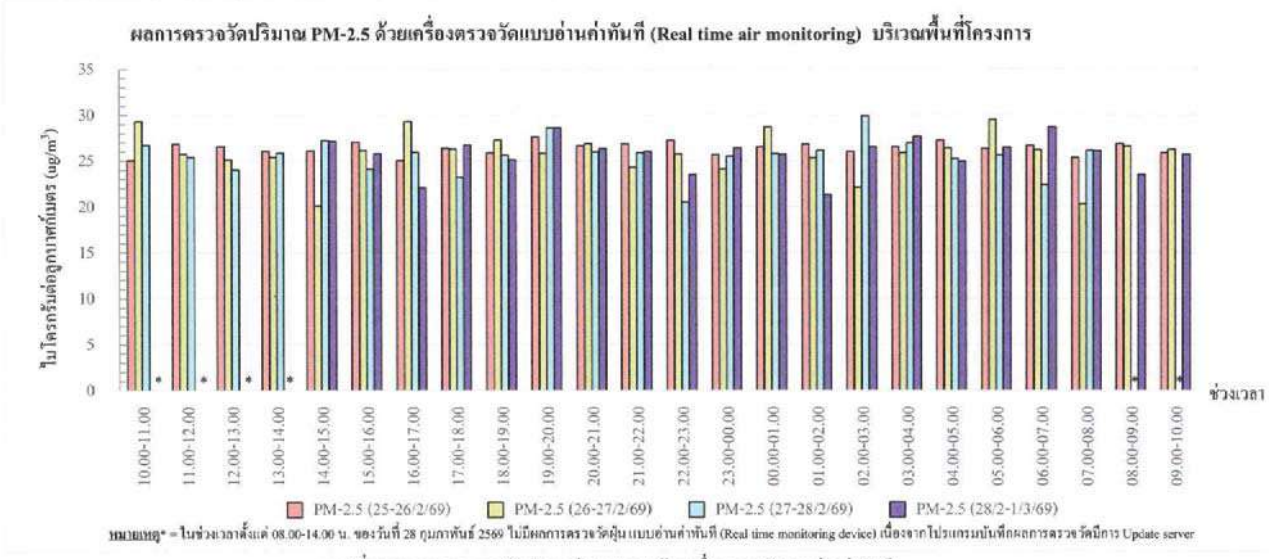

กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 – 1 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0671-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ	:	บริษัท อีเดน ลุฟริน คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
		ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป
จุดเก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	26-29 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ	:	7 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569
เครื่องมือ	:	Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590102, ID No. NS-04-003 ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569 Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-21D, Serial No. 821090, ID No. NS-15-003 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง	:	 จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)  จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

โปรดดูรายงานผลการทดสอบปรับรองฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการทดสอบแล้วนั้น
ห้ามคัดถ่ายโปรดรายงานผลการทดสอบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 28-29 มีนาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	13.27-14.27	67.2	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	17.27-18.27	64.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	17.27-18.27	60.0	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.5	-
ระดับการรบกวน	-	3.5	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 26-27 มีนาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.22-09.22	60.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	17.22-18.22	57.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	17.22-18.22	53.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	57.5	-
ระดับการรบกวน	-	3.8	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0671-01

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 26-27 มีนาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.27-11.27	66.9	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	19.27-20.27	61.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	19.27-20.27	58.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	65.4	-
ระดับการรบกวน	-	6.7	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 27-28 มีนาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.27-09.27	66.0	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.27-06.27	60.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.27-06.27	59.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	64.5	-
ระดับการรบกวน	-	4.8	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 7 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :


จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ


จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	27-28 มีนาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	10.22-11.22	62.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	05.22-06.22	59.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1\ hr.}$)	05.22-06.22	56.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.3	-
ระดับการรบกวน	-	3.0	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	28-29 มีนาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	13.22-14.22	60.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	18.22-19.22	55.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1\ hr.}$)	18.22-19.22	52.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.6	-
ระดับการรบกวน	-	5.9	≤ 10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ (*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 26-27 มีนาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.37	6.200	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
12.37	5.800	109	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
13.37	6.200	108	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
14.37	5.700	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.37	5.400	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
16.37	4.900	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
17.37	5.100	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
18.37	5.000	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.37	5.100	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
20.37	4.700	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
21.37	4.300	100	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
22.37	5.300	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
23.37	6.100	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
00.37	6.300	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
01.37	6.900	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
02.37	7.200	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
03.37	6.600	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
04.37	6.200	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
05.37	6.900	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.37	6.600	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
07.37	6.600	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
08.37	7.500	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
09.37	7.300	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
10.37	6.600	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		6.021	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 27-28 มีนาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.37	6.600	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
12.37	7.500	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
13.37	7.900	107	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
14.37	6.800	107	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.37	6.600	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
16.37	7.500	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
17.37	6.900	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
18.37	5.400	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.37	5.300	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
20.37	5.800	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
21.37	4.900	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
22.37	5.000	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
23.37	5.800	101	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
00.37	5.400	101	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
01.37	3.700	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
02.37	5.900	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
03.37	5.100	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
04.37	4.700	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
05.37	4.900	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.37	4.900	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
07.37	6.400	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
08.37	5.400	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
09.37	6.200	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
10.37	6.800	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		5.892	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 26-27 มีนาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.32	0.600	28	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
11.32	0.100	8	เหนือ (N)
12.32	3.600	4	เหนือ (N)
13.32	3.600	0	เหนือ (N)
14.32	3.600	0	เหนือ (N)
15.32	3.600	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
16.32	1.100	4	เหนือ (N)
17.32	3.600	4	เหนือ (N)
18.32	0.400	10	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
19.32	1.300	11	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
20.32	0.300	28	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
21.32	1.100	4	เหนือ (N)
22.32	2.700	2	เหนือ (N)
23.32	1.000	4	เหนือ (N)
00.32	1.800	100	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
01.32	ลมสงบ	2	เหนือ (N)
02.32	0.200	5	เหนือ (N)
03.32	0.100	32	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
04.32	0.400	4	เหนือ (N)
05.32	0.900	1	เหนือ (N)
06.32	1.100	0	เหนือ (N)
07.32	0.900	3	เหนือ (N)
08.32	0.900	36	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
09.32	0.800	72	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.404	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0671-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 28-29 มีนาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.37	7.100	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
12.37	6.000	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
13.37	5.400	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
14.37	5.400	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.37	7.000	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
16.37	6.200	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
17.37	6.600	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
18.37	5.300	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.37	5.600	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
20.37	6.400	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
21.37	6.700	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
22.37	6.600	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
23.37	7.300	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
00.37	6.800	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
01.37	6.400	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
02.37	6.900	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
03.37	6.400	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
04.37	7.200	104	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
05.37	6.000	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.37	5.600	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
07.37	4.400	100	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
08.37	5.300	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
09.37	5.300	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
10.37	5.700	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		6.150	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 28-29 มีนาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.32	5.600	11	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
11.32	4.600	6	เหนือ (N)
12.32	4.500	350	เหนือ (N)
13.32	3.800	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.32	3.800	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
15.32	3.600	336	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
16.32	3.900	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
17.32	4.300	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
18.32	3.300	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
19.32	2.700	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
20.32	2.900	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
21.32	3.600	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.32	3.800	327	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.32	3.900	331	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.32	3.600	334	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.32	3.600	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.32	3.000	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.32	2.700	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.32	3.400	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
05.32	2.600	328	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.32	2.300	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
07.32	2.900	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
08.32	3.600	337	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.32	3.300	331	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.554	

วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 27-28 มีนาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.32	3.800	2	เหนือ (N)
11.32	3.600	0	เหนือ (N)
12.32	4.000	20	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
13.32	4.300	3	เหนือ (N)
14.32	3.800	0	เหนือ (N)
15.32	3.800	1	เหนือ (N)
16.32	3.800	9	เหนือ (N)
17.32	0.200	4	เหนือ (N)
18.32	0.100	20	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
19.32	0.200	4	เหนือ (N)
20.32	0.900	16	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
21.32	1.200	1	เหนือ (N)
22.32	0.700	340	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.32	0.100	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
00.32	0.900	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.32	0.800	337	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.32	2.300	0	เหนือ (N)
03.32	0.900	0	เหนือ (N)
04.32	1.000	16	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
05.32	2.000	1	เหนือ (N)
06.32	0.200	6	เหนือ (N)
07.32	1.900	1	เหนือ (N)
08.32	3.500	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.32	3.400	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.975	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0671-01

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 7 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569

เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3272, ID No. AB-09-011
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3245, ID No. AB-10-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
PM 2.5-PM 10 Air sampler "BGI" Model. PQ-200, Serial No. 140AB25409410, ID No. AB-16-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 30 สิงหาคม 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 7 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011069, ID No. AB-03-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0671-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	26-27 มีนาคม 2569	50,100	28	42,700	26	380	16	2.28
2	27-28 มีนาคม 2569	56,100	32	48,300	30	460	20	2.19
3	28-29 มีนาคม 2569	53,300	30	44,600	27	420	18	2.04
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	26-27 มีนาคม 2569	63,600	35	53,300	33	-	-	2.25
2	27-28 มีนาคม 2569	49,800	28	37,200	23	-	-	2.01
3	28-29 มีนาคม 2569	48,800	27	42,500	26	-	-	2.19
มาตรฐาน[1]		-	≤ 200	-	≤ 100	-	≤ 37.5	-
LOQ[2]		10,000	5	3,000	1	100	4.3	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :
1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย PM-2.5 air sampler, FRM method
4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :
1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B
2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2]= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	27-28 มีนาคม 2569	10.00-11.00	7.84
		11.00-12.00	7.95
		12.00-13.00	7.91
		13.00-14.00	8.10
		14.00-15.00	7.80
		15.00-16.00	7.78
		16.00-17.00	7.67
		17.00-18.00	7.86
		18.00-19.00	7.82
		19.00-20.00	7.84
		20.00-21.00	7.64
		21.00-22.00	7.69
		22.00-23.00	7.56
		23.00-00.00	7.56
		00.00-01.00	7.69
		01.00-02.00	7.60
		02.00-03.00	7.58
		03.00-04.00	7.54
		04.00-05.00	7.53
		05.00-06.00	7.55
		06.00-07.00	7.69
		07.00-08.00	7.84
		08.00-09.00	7.91
		09.00-10.00	7.98
		Max (1 ชั่วโมง)	8.10
		Min (1 ชั่วโมง)	7.53
		Avg (24 ชั่วโมง)	7.75
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	26-27 มีนาคม 2569	10.00-11.00	7.86
		11.00-12.00	3.48
		12.00-13.00	7.53
		13.00-14.00	7.43
		14.00-15.00	7.42
		15.00-16.00	7.83
		16.00-17.00	7.83
		17.00-18.00	8.05
		18.00-19.00	8.08
		19.00-20.00	7.98
		20.00-21.00	7.72
		21.00-22.00	7.71
		22.00-23.00	7.67
		23.00-00.00	7.57
		00.00-01.00	7.65
		01.00-02.00	7.58
		02.00-03.00	7.60
		03.00-04.00	7.57
		04.00-05.00	7.55
		05.00-06.00	7.59
		06.00-07.00	7.77
		07.00-08.00	8.01
		08.00-09.00	4.75
		09.00-10.00	7.98
		Max (1 ชั่วโมง)	8.08
		Min (1 ชั่วโมง)	3.48
		Avg (24 ชั่วโมง)	7.42
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
4	26-27 มีนาคม 2569	09.00-10.00	2.27
		10.00-11.00	2.24
		11.00-12.00	2.19
		12.00-13.00	2.15
		13.00-14.00	2.18
		14.00-15.00	2.20
		15.00-16.00	2.21
		16.00-17.00	2.24
		17.00-18.00	2.30
		18.00-19.00	2.34
		19.00-20.00	2.36
		20.00-21.00	2.36
		21.00-22.00	2.39
		22.00-23.00	2.39
		23.00-00.00	2.40
		00.00-01.00	2.41
		01.00-02.00	2.41
		02.00-03.00	2.42
		03.00-04.00	2.44
		04.00-05.00	2.44
		05.00-06.00	2.46
		06.00-07.00	2.43
		07.00-08.00	3.27
		08.00-09.00	3.09
		Max (1 ชั่วโมง)	3.27
		Min (1 ชั่วโมง)	2.15
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.40
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
3	28-29 มีนาคม 2569	10.00-11.00	7.90
		11.00-12.00	7.72
		12.00-13.00	7.74
		13.00-14.00	7.77
		14.00-15.00	7.97
		15.00-16.00	7.82
		16.00-17.00	7.90
		17.00-18.00	8.06
		18.00-19.00	8.21
		19.00-20.00	8.15
		20.00-21.00	7.84
		21.00-22.00	7.59
		22.00-23.00	7.55
		23.00-00.00	7.54
		00.00-01.00	7.46
		01.00-02.00	7.49
		02.00-03.00	7.52
		03.00-04.00	7.56
		04.00-05.00	7.68
		05.00-06.00	7.66
		06.00-07.00	7.79
		07.00-08.00	7.87
		08.00-09.00	8.01
		09.00-10.00	7.91
		Max (1 ชั่วโมง)	8.21
		Min (1 ชั่วโมง)	7.46
		Avg (24 ชั่วโมง)	7.78
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
6	28-29 มีนาคม 2569	09.00-10.00	2.12
		10.00-11.00	2.10
		11.00-12.00	2.14
		12.00-13.00	2.12
		13.00-14.00	2.12
		14.00-15.00	2.13
		15.00-16.00	2.15
		16.00-17.00	2.11
		17.00-18.00	2.23
		18.00-19.00	2.22
		19.00-20.00	2.23
		20.00-21.00	2.22
		21.00-22.00	2.25
		22.00-23.00	2.24
		23.00-00.00	2.23
		00.00-01.00	2.24
		01.00-02.00	2.25
		02.00-03.00	2.25
		03.00-04.00	2.26
		04.00-05.00	2.26
		05.00-06.00	2.27
		06.00-07.00	2.25
		07.00-08.00	2.27
		08.00-09.00	2.26
		Max (1 ชั่วโมง)	2.27
		Min (1 ชั่วโมง)	2.10
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.20
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04
วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
5	27-28 มีนาคม 2569	09.00-10.00	3.03
		10.00-11.00	2.98
		11.00-12.00	3.02
		12.00-13.00	3.01
		13.00-14.00	2.93
		14.00-15.00	2.83
		15.00-16.00	2.73
		16.00-17.00	2.73
		17.00-18.00	2.81
		18.00-19.00	2.84
		19.00-20.00	2.56
		20.00-21.00	2.58
		21.00-22.00	3.36
		22.00-23.00	3.69
		23.00-00.00	3.88
		00.00-01.00	3.91
		01.00-02.00	3.60
		02.00-03.00	3.49
		03.00-04.00	3.73
		04.00-05.00	3.56
		05.00-06.00	3.39
		06.00-07.00	3.25
		07.00-08.00	3.01
		08.00-09.00	3.01
		Max (1 ชั่วโมง)	3.91
		Min (1 ชั่วโมง)	2.56
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.16
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
1	26-27 มีนาคม 2569	10.00-11.00	10.2
		11.00-12.00	9.6
		12.00-13.00	9.8
		13.00-14.00	9.7
		14.00-15.00	9.6
		15.00-16.00	11.0
		16.00-17.00	9.4
		17.00-18.00	8.2
		18.00-19.00	8.0
		19.00-20.00	7.7
		20.00-21.00	9.0
		21.00-22.00	8.0
		22.00-23.00	7.8
		23.00-00.00	6.7
		00.00-01.00	6.2
		01.00-02.00	6.4
		02.00-03.00	8.6
		03.00-04.00	8.9
		04.00-05.00	8.0
		05.00-06.00	8.7
		06.00-07.00	9.1
		07.00-08.00	6.8
		08.00-09.00	7.9
		09.00-10.00	6.4
		Max (1 ชั่วโมง)	11.0
		Min (1 ชั่วโมง)	6.2
		Avg (24 ชั่วโมง)	8.4
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 7 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-62201-334, ID No.AB-01-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
3	28-29 มีนาคม 2569	10.00-11.00	13.3
		11.00-12.00	14.2
		12.00-13.00	13.7
		13.00-14.00	10.6
		14.00-15.00	10.7
		15.00-16.00	10.4
		16.00-17.00	11.7
		17.00-18.00	10.5
		18.00-19.00	10.3
		19.00-20.00	9.6
		20.00-21.00	9.3
		21.00-22.00	10.4
		22.00-23.00	9.7
		23.00-00.00	9.7
		00.00-01.00	11.3
		01.00-02.00	12.7
		02.00-03.00	11.9
		03.00-04.00	9.5
		04.00-05.00	10.5
		05.00-06.00	10.4
		06.00-07.00	9.7
		07.00-08.00	9.9
		08.00-09.00	9.1
		09.00-10.00	9.4
		Max (1 ชั่วโมง)	14.2
		Min (1 ชั่วโมง)	9.1
		Avg (24 ชั่วโมง)	10.8
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0671-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
2	27-28 มีนาคม 2569	10.00-11.00	18.0
		11.00-12.00	12.0
		12.00-13.00	11.0
		13.00-14.00	9.2
		14.00-15.00	9.7
		15.00-16.00	9.9
		16.00-17.00	8.4
		17.00-18.00	8.5
		18.00-19.00	8.8
		19.00-20.00	9.1
		20.00-21.00	9.3
		21.00-22.00	9.7
		22.00-23.00	11.7
		23.00-00.00	13.5
		00.00-01.00	12.9
		01.00-02.00	11.2
		02.00-03.00	9.7
		03.00-04.00	9.6
		04.00-05.00	10.4
		05.00-06.00	9.7
		06.00-07.00	10.5
		07.00-08.00	10.1
		08.00-09.00	9.7
		09.00-10.00	10.0
		Max (1 ชั่วโมง)	18.0
		Min (1 ชั่วโมง)	8.4
		Avg (24 ชั่วโมง)	10.5
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
5	27-28 มีนาคม 2569	09.00-10.00	14.2
		10.00-11.00	13.9
		11.00-12.00	14.4
		12.00-13.00	14.9
		13.00-14.00	14.9
		14.00-15.00	15.0
		15.00-16.00	15.2
		16.00-17.00	14.3
		17.00-18.00	14.1
		18.00-19.00	13.1
		19.00-20.00	13.4
		20.00-21.00	13.5
		21.00-22.00	14.1
		22.00-23.00	13.6
		23.00-00.00	13.5
		00.00-01.00	15.0
		01.00-02.00	14.4
		02.00-03.00	13.6
		03.00-04.00	13.1
		04.00-05.00	11.7
		05.00-06.00	13.2
		06.00-07.00	12.7
		07.00-08.00	17.0
		08.00-09.00	17.0
		Max (1 ชั่วโมง)	17.0
		Min (1 ชั่วโมง)	11.7
		Avg (24 ชั่วโมง)	14.1
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
4	26-27 มีนาคม 2569	09.00-10.00	11.0
		10.00-11.00	11.8
		11.00-12.00	15.7
		12.00-13.00	13.1
		13.00-14.00	14.2
		14.00-15.00	15.0
		15.00-16.00	13.7
		16.00-17.00	15.9
		17.00-18.00	13.0
		18.00-19.00	13.9
		19.00-20.00	16.1
		20.00-21.00	14.0
		21.00-22.00	15.2
		22.00-23.00	13.3
		23.00-00.00	14.2
		00.00-01.00	14.6
		01.00-02.00	15.0
		02.00-03.00	14.0
		03.00-04.00	12.3
		04.00-05.00	12.6
		05.00-06.00	13.6
		06.00-07.00	15.5
		07.00-08.00	14.1
		08.00-09.00	14.1
		Max (1 ชั่วโมง)	16.1
		Min (1 ชั่วโมง)	11.0
		Avg (24 ชั่วโมง)	14.0
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 7 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 508011077, ID No.AB-02-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
6	28-29 มีนาคม 2569	09.00-10.00	13.8
		10.00-11.00	12.1
		11.00-12.00	13.5
		12.00-13.00	13.9
		13.00-14.00	14.8
		14.00-15.00	14.8
		15.00-16.00	15.1
		16.00-17.00	14.7
		17.00-18.00	12.9
		18.00-19.00	14.0
		19.00-20.00	15.2
		20.00-21.00	14.0
		21.00-22.00	14.5
		22.00-23.00	14.1
		23.00-00.00	13.5
		00.00-01.00	15.2
		01.00-02.00	15.0
		02.00-03.00	13.9
		03.00-04.00	15.0
		04.00-05.00	15.7
		05.00-06.00	13.6
		06.00-07.00	15.6
		07.00-08.00	12.9
		08.00-09.00	14.6
		Max (1 ชั่วโมง)	15.7
		Min (1 ชั่วโมง)	12.1
		Avg (24 ชั่วโมง)	14.3
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5
วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
2	27-28 มีนาคม 2569	10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
1	26-27 มีนาคม 2569	10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
4	26-27 มีนาคม 2569	09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
3	28-29 มีนาคม 2569	10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
6	28-29 มีนาคม 2569	09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
5	27-28 มีนาคม 2569	09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
26 มีนาคม 2569						
13.06	0.331	1.08	0.772	2.77	0.241	4.66
14.52	0.362	3.88	0.965	2.63	0.326	73.14
15.28	0.275	5.62	0.850	4.55	0.274	2.61
16.49	0.315	4.32	0.638	2.32	0.395	3.28
27 มีนาคม 2569						
08.30	0.287	1.30	0.591	2.15	0.205	3.56
09.30	0.339	2.84	0.678	2.45	0.142	7.64
10.31	0.355	1.46	0.701	2.51	0.192	3.51
11.24	0.254	10.62	1.009	> 100.00	0.189	51.20
13.40	0.295	7.55	0.512	85.41	0.411	56.89
14.54	0.660	1.99	0.796	> 100.00	0.166	> 100.00
15.24	0.173	6.32	0.497	62.32	0.251	34.13
16.35	0.236	1.82	0.847	64.00	0.181	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0671-01

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 7 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 29 กันยายน 2569
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 27 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มีนาคม – 18 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 24 เมษายน 2569
เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
Oven "Memmert"Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
28 มีนาคม 2569						
08.46	0.244	5.28	1.040	> 100.00	0.218	> 100.00
09.16	0.221	7.26	0.544	1.93	0.423	> 100.00
10.07	0.213	3.16	0.654	> 100.00	0.148	> 100.00
11.47	0.292	1.89	0.993	> 100.00	0.229	> 100.00
13.18	0.312	4.10	1.135	> 100.00	0.300	> 100.00
14.08	0.188	10.23	0.665	11.13	0.211	36.57
15.49	0.162	9.66	0.788	85.33	0.231	> 100.00
16.50	0.252	5.26	0.552	1.98	0.268	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ [1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
[3]= วันที่ 29 มีนาคม 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรมาษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเหตุ [1]= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)
[2]= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
[3]= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
[4]= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรมาษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0657-01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 26 มีนาคม 2569	มาตรฐาน[3]
pH	-	-	-	9.2	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	5	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	8	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	204	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	< 4	≤ 40
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอน	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 มีนาคม – 1 เมษายน 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	3 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ	:	3 เมษายน 2569	**วันที่ออกรายงาน**	:	24 เมษายน 2569
เครื่องมือ	:	Real time monitoring device No. AB-22-001			

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอัมพวา อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
1 มีนาคม 2569	10.00-11.00	18
1 มีนาคม 2569	11.00-12.00	19
1 มีนาคม 2569	12.00-13.00	19
1 มีนาคม 2569	13.00-14.00	18
1 มีนาคม 2569	14.00-15.00	18
1 มีนาคม 2569	15.00-16.00	19
1 มีนาคม 2569	16.00-17.00	19
1 มีนาคม 2569	17.00-18.00	18
1 มีนาคม 2569	18.00-19.00	19
1 มีนาคม 2569	19.00-20.00	18
1 มีนาคม 2569	20.00-21.00	19
1 มีนาคม 2569	21.00-22.00	18
1 มีนาคม 2569	22.00-23.00	20
1 มีนาคม 2569	23.00-00.00	20
2 มีนาคม 2569	00.00-01.00	18
2 มีนาคม 2569	01.00-02.00	18
2 มีนาคม 2569	02.00-03.00	19
2 มีนาคม 2569	03.00-04.00	18
2 มีนาคม 2569	04.00-05.00	18
2 มีนาคม 2569	05.00-06.00	18
2 มีนาคม 2569	06.00-07.00	18
2 มีนาคม 2569	07.00-08.00	19
2 มีนาคม 2569	08.00-09.00	18
2 มีนาคม 2569	09.00-10.00	18

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอัมพวา อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
2 มีนาคม 2569	10.00-11.00	14
2 มีนาคม 2569	11.00-12.00	14
2 มีนาคม 2569	12.00-13.00	15
2 มีนาคม 2569	13.00-14.00	15
2 มีนาคม 2569	14.00-15.00	14
2 มีนาคม 2569	15.00-16.00	16
2 มีนาคม 2569	16.00-17.00	14
2 มีนาคม 2569	17.00-18.00	15
2 มีนาคม 2569	18.00-19.00	15
2 มีนาคม 2569	19.00-20.00	16
2 มีนาคม 2569	20.00-21.00	14
2 มีนาคม 2569	21.00-22.00	14
2 มีนาคม 2569	22.00-23.00	15
2 มีนาคม 2569	23.00-00.00	16
3 มีนาคม 2569	00.00-01.00	13
3 มีนาคม 2569	01.00-02.00	15
3 มีนาคม 2569	02.00-03.00	15
3 มีนาคม 2569	03.00-04.00	15
3 มีนาคม 2569	04.00-05.00	16
3 มีนาคม 2569	05.00-06.00	15
3 มีนาคม 2569	06.00-07.00	15
3 มีนาคม 2569	07.00-08.00	15
3 มีนาคม 2569	08.00-09.00	14
3 มีนาคม 2569	09.00-10.00	15

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
4 มีนาคม 2569	10.00-11.00	33
4 มีนาคม 2569	11.00-12.00	31
4 มีนาคม 2569	12.00-13.00	32
4 มีนาคม 2569	13.00-14.00	31
4 มีนาคม 2569	14.00-15.00	26
4 มีนาคม 2569	15.00-16.00	26
4 มีนาคม 2569	16.00-17.00	30
4 มีนาคม 2569	17.00-18.00	31
4 มีนาคม 2569	18.00-19.00	29
4 มีนาคม 2569	19.00-20.00	32
4 มีนาคม 2569	20.00-21.00	32
4 มีนาคม 2569	21.00-22.00	28
4 มีนาคม 2569	22.00-23.00	33
4 มีนาคม 2569	23.00-00.00	31
5 มีนาคม 2569	00.00-01.00	33
5 มีนาคม 2569	01.00-02.00	32
5 มีนาคม 2569	02.00-03.00	32
5 มีนาคม 2569	03.00-04.00	30
5 มีนาคม 2569	04.00-05.00	32
5 มีนาคม 2569	05.00-06.00	28
5 มีนาคม 2569	06.00-07.00	32
5 มีนาคม 2569	07.00-08.00	33
5 มีนาคม 2569	08.00-09.00	32
5 มีนาคม 2569	09.00-10.00	33

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
3 มีนาคม 2569	10.00-11.00	27
3 มีนาคม 2569	11.00-12.00	27
3 มีนาคม 2569	12.00-13.00	28
3 มีนาคม 2569	13.00-14.00	27
3 มีนาคม 2569	14.00-15.00	27
3 มีนาคม 2569	15.00-16.00	28
3 มีนาคม 2569	16.00-17.00	25
3 มีนาคม 2569	17.00-18.00	27
3 มีนาคม 2569	18.00-19.00	28
3 มีนาคม 2569	19.00-20.00	27
3 มีนาคม 2569	20.00-21.00	29
3 มีนาคม 2569	21.00-22.00	27
3 มีนาคม 2569	22.00-23.00	27
3 มีนาคม 2569	23.00-00.00	27
4 มีนาคม 2569	00.00-01.00	27
4 มีนาคม 2569	01.00-02.00	28
4 มีนาคม 2569	02.00-03.00	26
4 มีนาคม 2569	03.00-04.00	27
4 มีนาคม 2569	04.00-05.00	28
4 มีนาคม 2569	05.00-06.00	28
4 มีนาคม 2569	06.00-07.00	28
4 มีนาคม 2569	07.00-08.00	28
4 มีนาคม 2569	08.00-09.00	28
4 มีนาคม 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
5 มีนาคม 2569	10.00-11.00	26
5 มีนาคม 2569	11.00-12.00	25
5 มีนาคม 2569	12.00-13.00	27
5 มีนาคม 2569	13.00-14.00	27
5 มีนาคม 2569	14.00-15.00	28
5 มีนาคม 2569	15.00-16.00	26
5 มีนาคม 2569	16.00-17.00	27
5 มีนาคม 2569	17.00-18.00	27
5 มีนาคม 2569	18.00-19.00	27
5 มีนาคม 2569	19.00-20.00	28
5 มีนาคม 2569	20.00-21.00	27
5 มีนาคม 2569	21.00-22.00	27
5 มีนาคม 2569	22.00-23.00	26
5 มีนาคม 2569	23.00-00.00	27
6 มีนาคม 2569	00.00-01.00	27
6 มีนาคม 2569	01.00-02.00	27
6 มีนาคม 2569	02.00-03.00	27
6 มีนาคม 2569	03.00-04.00	28
6 มีนาคม 2569	04.00-05.00	27
6 มีนาคม 2569	05.00-06.00	28
6 มีนาคม 2569	06.00-07.00	26
6 มีนาคม 2569	07.00-08.00	27
6 มีนาคม 2569	08.00-09.00	27
6 มีนาคม 2569	09.00-10.00	28

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
6 มีนาคม 2569	10.00-11.00	20
6 มีนาคม 2569	11.00-12.00	21
6 มีนาคม 2569	12.00-13.00	21
6 มีนาคม 2569	13.00-14.00	20
6 มีนาคม 2569	14.00-15.00	20
6 มีนาคม 2569	15.00-16.00	20
6 มีนาคม 2569	16.00-17.00	20
6 มีนาคม 2569	17.00-18.00	20
6 มีนาคม 2569	18.00-19.00	21
6 มีนาคม 2569	19.00-20.00	21
6 มีนาคม 2569	20.00-21.00	20
6 มีนาคม 2569	21.00-22.00	21
6 มีนาคม 2569	22.00-23.00	21
6 มีนาคม 2569	23.00-00.00	20
7 มีนาคม 2569	00.00-01.00	21
7 มีนาคม 2569	01.00-02.00	20
7 มีนาคม 2569	02.00-03.00	20
7 มีนาคม 2569	03.00-04.00	21
7 มีนาคม 2569	04.00-05.00	20
7 มีนาคม 2569	05.00-06.00	20
7 มีนาคม 2569	06.00-07.00	21
7 มีนาคม 2569	07.00-08.00	19
7 มีนาคม 2569	08.00-09.00	20
7 มีนาคม 2569	09.00-10.00	20

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
8 มีนาคม 2569	10.00-11.00	23
8 มีนาคม 2569	11.00-12.00	23
8 มีนาคม 2569	12.00-13.00	23
8 มีนาคม 2569	13.00-14.00	22
8 มีนาคม 2569	14.00-15.00	22
8 มีนาคม 2569	15.00-16.00	21
8 มีนาคม 2569	16.00-17.00	22
8 มีนาคม 2569	17.00-18.00	27
8 มีนาคม 2569	18.00-19.00	22
8 มีนาคม 2569	19.00-20.00	22
8 มีนาคม 2569	20.00-21.00	21
8 มีนาคม 2569	21.00-22.00	22
8 มีนาคม 2569	22.00-23.00	22
8 มีนาคม 2569	23.00-00.00	22
9 มีนาคม 2569	00.00-01.00	22
9 มีนาคม 2569	01.00-02.00	23
9 มีนาคม 2569	02.00-03.00	22
9 มีนาคม 2569	03.00-04.00	25
9 มีนาคม 2569	04.00-05.00	22
9 มีนาคม 2569	05.00-06.00	23
9 มีนาคม 2569	06.00-07.00	22
9 มีนาคม 2569	07.00-08.00	24
9 มีนาคม 2569	08.00-09.00	22
9 มีนาคม 2569	09.00-10.00	22

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
7 มีนาคม 2569	10.00-11.00	19
7 มีนาคม 2569	11.00-12.00	16
7 มีนาคม 2569	12.00-13.00	21
7 มีนาคม 2569	13.00-14.00	16
7 มีนาคม 2569	14.00-15.00	22
7 มีนาคม 2569	15.00-16.00	19
7 มีนาคม 2569	16.00-17.00	21
7 มีนาคม 2569	17.00-18.00	17
7 มีนาคม 2569	18.00-19.00	23
7 มีนาคม 2569	19.00-20.00	18
7 มีนาคม 2569	20.00-21.00	16
7 มีนาคม 2569	21.00-22.00	16
7 มีนาคม 2569	22.00-23.00	25
7 มีนาคม 2569	23.00-00.00	15
8 มีนาคม 2569	00.00-01.00	20
8 มีนาคม 2569	01.00-02.00	19
8 มีนาคม 2569	02.00-03.00	16
8 มีนาคม 2569	03.00-04.00	17
8 มีนาคม 2569	04.00-05.00	23
8 มีนาคม 2569	05.00-06.00	16
8 มีนาคม 2569	06.00-07.00	22
8 มีนาคม 2569	07.00-08.00	19
8 มีนาคม 2569	08.00-09.00	22
8 มีนาคม 2569	09.00-10.00	21

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
10 มีนาคม 2569	10.00-11.00	19
10 มีนาคม 2569	11.00-12.00	20
10 มีนาคม 2569	12.00-13.00	20
10 มีนาคม 2569	13.00-14.00	20
10 มีนาคม 2569	14.00-15.00	20
10 มีนาคม 2569	15.00-16.00	20
10 มีนาคม 2569	16.00-17.00	19
10 มีนาคม 2569	17.00-18.00	19
10 มีนาคม 2569	18.00-19.00	18
10 มีนาคม 2569	19.00-20.00	19
10 มีนาคม 2569	20.00-21.00	20
10 มีนาคม 2569	21.00-22.00	21
10 มีนาคม 2569	22.00-23.00	20
10 มีนาคม 2569	23.00-00.00	20
11 มีนาคม 2569	00.00-01.00	20
11 มีนาคม 2569	01.00-02.00	20
11 มีนาคม 2569	02.00-03.00	20
11 มีนาคม 2569	03.00-04.00	21
11 มีนาคม 2569	04.00-05.00	19
11 มีนาคม 2569	05.00-06.00	20
11 มีนาคม 2569	06.00-07.00	20
11 มีนาคม 2569	07.00-08.00	20
11 มีนาคม 2569	08.00-09.00	19
11 มีนาคม 2569	09.00-10.00	19

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
9 มีนาคม 2569	10.00-11.00	22
9 มีนาคม 2569	11.00-12.00	23
9 มีนาคม 2569	12.00-13.00	22
9 มีนาคม 2569	13.00-14.00	22
9 มีนาคม 2569	14.00-15.00	23
9 มีนาคม 2569	15.00-16.00	23
9 มีนาคม 2569	16.00-17.00	22
9 มีนาคม 2569	17.00-18.00	23
9 มีนาคม 2569	18.00-19.00	24
9 มีนาคม 2569	19.00-20.00	23
9 มีนาคม 2569	20.00-21.00	24
9 มีนาคม 2569	21.00-22.00	22
9 มีนาคม 2569	22.00-23.00	23
9 มีนาคม 2569	23.00-00.00	24
10 มีนาคม 2569	00.00-01.00	23
10 มีนาคม 2569	01.00-02.00	24
10 มีนาคม 2569	02.00-03.00	23
10 มีนาคม 2569	03.00-04.00	23
10 มีนาคม 2569	04.00-05.00	23
10 มีนาคม 2569	05.00-06.00	23
10 มีนาคม 2569	06.00-07.00	23
10 มีนาคม 2569	07.00-08.00	23
10 มีนาคม 2569	08.00-09.00	23
10 มีนาคม 2569	09.00-10.00	23

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
12 มีนาคม 2569	10.00-11.00	32
12 มีนาคม 2569	11.00-12.00	31
12 มีนาคม 2569	12.00-13.00	31
12 มีนาคม 2569	13.00-14.00	32
12 มีนาคม 2569	14.00-15.00	32
12 มีนาคม 2569	15.00-16.00	30
12 มีนาคม 2569	16.00-17.00	33
12 มีนาคม 2569	17.00-18.00	32
12 มีนาคม 2569	18.00-19.00	32
12 มีนาคม 2569	19.00-20.00	32
12 มีนาคม 2569	20.00-21.00	31
12 มีนาคม 2569	21.00-22.00	31
12 มีนาคม 2569	22.00-23.00	32
12 มีนาคม 2569	23.00-00.00	32
13 มีนาคม 2569	00.00-01.00	33
13 มีนาคม 2569	01.00-02.00	32
13 มีนาคม 2569	02.00-03.00	33
13 มีนาคม 2569	03.00-04.00	32
13 มีนาคม 2569	04.00-05.00	32
13 มีนาคม 2569	05.00-06.00	31
13 มีนาคม 2569	06.00-07.00	33
13 มีนาคม 2569	07.00-08.00	32
13 มีนาคม 2569	08.00-09.00	31
13 มีนาคม 2569	09.00-10.00	30

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
11 มีนาคม 2569	10.00-11.00	22
11 มีนาคม 2569	11.00-12.00	23
11 มีนาคม 2569	12.00-13.00	22
11 มีนาคม 2569	13.00-14.00	21
11 มีนาคม 2569	14.00-15.00	23
11 มีนาคม 2569	15.00-16.00	22
11 มีนาคม 2569	16.00-17.00	23
11 มีนาคม 2569	17.00-18.00	22
11 มีนาคม 2569	18.00-19.00	23
11 มีนาคม 2569	19.00-20.00	24
11 มีนาคม 2569	20.00-21.00	23
11 มีนาคม 2569	21.00-22.00	21
11 มีนาคม 2569	22.00-23.00	23
11 มีนาคม 2569	23.00-00.00	22
12 มีนาคม 2569	00.00-01.00	22
12 มีนาคม 2569	01.00-02.00	22
12 มีนาคม 2569	02.00-03.00	23
12 มีนาคม 2569	03.00-04.00	24
12 มีนาคม 2569	04.00-05.00	22
12 มีนาคม 2569	05.00-06.00	22
12 มีนาคม 2569	06.00-07.00	23
12 มีนาคม 2569	07.00-08.00	23
12 มีนาคม 2569	08.00-09.00	22
12 มีนาคม 2569	09.00-10.00	21

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
14 มีนาคม 2569	10.00-11.00	27
14 มีนาคม 2569	11.00-12.00	28
14 มีนาคม 2569	12.00-13.00	26
14 มีนาคม 2569	13.00-14.00	25
14 มีนาคม 2569	14.00-15.00	25
14 มีนาคม 2569	15.00-16.00	25
14 มีนาคม 2569	16.00-17.00	22
14 มีนาคม 2569	17.00-18.00	24
14 มีนาคม 2569	18.00-19.00	27
14 มีนาคม 2569	19.00-20.00	25
14 มีนาคม 2569	20.00-21.00	24
14 มีนาคม 2569	21.00-22.00	21
14 มีนาคม 2569	22.00-23.00	25
14 มีนาคม 2569	23.00-00.00	24
15 มีนาคม 2569	00.00-01.00	27
15 มีนาคม 2569	01.00-02.00	26
15 มีนาคม 2569	02.00-03.00	25
15 มีนาคม 2569	03.00-04.00	23
15 มีนาคม 2569	04.00-05.00	25
15 มีนาคม 2569	05.00-06.00	26
15 มีนาคม 2569	06.00-07.00	23
15 มีนาคม 2569	07.00-08.00	20
15 มีนาคม 2569	08.00-09.00	25
15 มีนาคม 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
13 มีนาคม 2569	10.00-11.00	27
13 มีนาคม 2569	11.00-12.00	27
13 มีนาคม 2569	12.00-13.00	26
13 มีนาคม 2569	13.00-14.00	28
13 มีนาคม 2569	14.00-15.00	27
13 มีนาคม 2569	15.00-16.00	25
13 มีนาคม 2569	16.00-17.00	28
13 มีนาคม 2569	17.00-18.00	27
13 มีนาคม 2569	18.00-19.00	28
13 มีนาคม 2569	19.00-20.00	27
13 มีนาคม 2569	20.00-21.00	27
13 มีนาคม 2569	21.00-22.00	27
13 มีนาคม 2569	22.00-23.00	28
13 มีนาคม 2569	23.00-00.00	27
14 มีนาคม 2569	00.00-01.00	28
14 มีนาคม 2569	01.00-02.00	28
14 มีนาคม 2569	02.00-03.00	28
14 มีนาคม 2569	03.00-04.00	28
14 มีนาคม 2569	04.00-05.00	28
14 มีนาคม 2569	05.00-06.00	27
14 มีนาคม 2569	06.00-07.00	29
14 มีนาคม 2569	07.00-08.00	28
14 มีนาคม 2569	08.00-09.00	27
14 มีนาคม 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
16 มีนาคม 2569	10.00-11.00	22
16 มีนาคม 2569	11.00-12.00	19
16 มีนาคม 2569	12.00-13.00	21
16 มีนาคม 2569	13.00-14.00	16
16 มีนาคม 2569	14.00-15.00	23
16 มีนาคม 2569	15.00-16.00	22
16 มีนาคม 2569	16.00-17.00	23
16 มีนาคม 2569	17.00-18.00	23
16 มีนาคม 2569	18.00-19.00	20
16 มีนาคม 2569	19.00-20.00	22
16 มีนาคม 2569	20.00-21.00	23
16 มีนาคม 2569	21.00-22.00	22
16 มีนาคม 2569	22.00-23.00	23
16 มีนาคม 2569	23.00-00.00	23
17 มีนาคม 2569	00.00-01.00	22
17 มีนาคม 2569	01.00-02.00	19
17 มีนาคม 2569	02.00-03.00	23
17 มีนาคม 2569	03.00-04.00	23
17 มีนาคม 2569	04.00-05.00	22
17 มีนาคม 2569	05.00-06.00	22
17 มีนาคม 2569	06.00-07.00	22
17 มีนาคม 2569	07.00-08.00	28
17 มีนาคม 2569	08.00-09.00	23
17 มีนาคม 2569	09.00-10.00	22

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
15 มีนาคม 2569	10.00-11.00	27
15 มีนาคม 2569	11.00-12.00	27
15 มีนาคม 2569	12.00-13.00	27
15 มีนาคม 2569	13.00-14.00	27
15 มีนาคม 2569	14.00-15.00	28
15 มีนาคม 2569	15.00-16.00	27
15 มีนาคม 2569	16.00-17.00	26
15 มีนาคม 2569	17.00-18.00	26
15 มีนาคม 2569	18.00-19.00	27
15 มีนาคม 2569	19.00-20.00	26
15 มีนาคม 2569	20.00-21.00	26
15 มีนาคม 2569	21.00-22.00	27
15 มีนาคม 2569	22.00-23.00	27
15 มีนาคม 2569	23.00-00.00	26
16 มีนาคม 2569	00.00-01.00	26
16 มีนาคม 2569	01.00-02.00	27
16 มีนาคม 2569	02.00-03.00	27
16 มีนาคม 2569	03.00-04.00	26
16 มีนาคม 2569	04.00-05.00	27
16 มีนาคม 2569	05.00-06.00	27
16 มีนาคม 2569	06.00-07.00	27
16 มีนาคม 2569	07.00-08.00	28
16 มีนาคม 2569	08.00-09.00	26
16 มีนาคม 2569	09.00-10.00	26

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
18 มีนาคม 2569	10.00-11.00	16
18 มีนาคม 2569	11.00-12.00	13
18 มีนาคม 2569	12.00-13.00	17
18 มีนาคม 2569	13.00-14.00	16
18 มีนาคม 2569	14.00-15.00	15
18 มีนาคม 2569	15.00-16.00	19
18 มีนาคม 2569	16.00-17.00	14
18 มีนาคม 2569	17.00-18.00	13
18 มีนาคม 2569	18.00-19.00	10
18 มีนาคม 2569	19.00-20.00	16
18 มีนาคม 2569	20.00-21.00	13
18 มีนาคม 2569	21.00-22.00	12
18 มีนาคม 2569	22.00-23.00	16
18 มีนาคม 2569	23.00-00.00	16
19 มีนาคม 2569	00.00-01.00	19
19 มีนาคม 2569	01.00-02.00	15
19 มีนาคม 2569	02.00-03.00	15
19 มีนาคม 2569	03.00-04.00	17
19 มีนาคม 2569	04.00-05.00	15
19 มีนาคม 2569	05.00-06.00	11
19 มีนาคม 2569	06.00-07.00	16
19 มีนาคม 2569	07.00-08.00	17
19 มีนาคม 2569	08.00-09.00	12
19 มีนาคม 2569	09.00-10.00	16

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
17 มีนาคม 2569	10.00-11.00	16
17 มีนาคม 2569	11.00-12.00	16
17 มีนาคม 2569	12.00-13.00	16
17 มีนาคม 2569	13.00-14.00	15
17 มีนาคม 2569	14.00-15.00	15
17 มีนาคม 2569	15.00-16.00	16
17 มีนาคม 2569	16.00-17.00	15
17 มีนาคม 2569	17.00-18.00	15
17 มีนาคม 2569	18.00-19.00	16
17 มีนาคม 2569	19.00-20.00	16
17 มีนาคม 2569	20.00-21.00	16
17 มีนาคม 2569	21.00-22.00	15
17 มีนาคม 2569	22.00-23.00	15
17 มีนาคม 2569	23.00-00.00	17
18 มีนาคม 2569	00.00-01.00	15
18 มีนาคม 2569	01.00-02.00	15
18 มีนาคม 2569	02.00-03.00	16
18 มีนาคม 2569	03.00-04.00	16
18 มีนาคม 2569	04.00-05.00	16
18 มีนาคม 2569	05.00-06.00	15
18 มีนาคม 2569	06.00-07.00	15
18 มีนาคม 2569	07.00-08.00	16
18 มีนาคม 2569	08.00-09.00	16
18 มีนาคม 2569	09.00-10.00	15

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
20 มีนาคม 2569	10.00-11.00	19
20 มีนาคม 2569	11.00-12.00	19
20 มีนาคม 2569	12.00-13.00	18
20 มีนาคม 2569	13.00-14.00	18
20 มีนาคม 2569	14.00-15.00	19
20 มีนาคม 2569	15.00-16.00	19
20 มีนาคม 2569	16.00-17.00	18
20 มีนาคม 2569	17.00-18.00	19
20 มีนาคม 2569	18.00-19.00	16
20 มีนาคม 2569	19.00-20.00	16
20 มีนาคม 2569	20.00-21.00	19
20 มีนาคม 2569	21.00-22.00	19
20 มีนาคม 2569	22.00-23.00	18
20 มีนาคม 2569	23.00-00.00	19
21 มีนาคม 2569	00.00-01.00	18
21 มีนาคม 2569	01.00-02.00	18
21 มีนาคม 2569	02.00-03.00	20
21 มีนาคม 2569	03.00-04.00	18
21 มีนาคม 2569	04.00-05.00	18
21 มีนาคม 2569	05.00-06.00	18
21 มีนาคม 2569	06.00-07.00	19
21 มีนาคม 2569	07.00-08.00	19
21 มีนาคม 2569	08.00-09.00	18
21 มีนาคม 2569	09.00-10.00	19

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
19 มีนาคม 2569	10.00-11.00	17
19 มีนาคม 2569	11.00-12.00	18
19 มีนาคม 2569	12.00-13.00	18
19 มีนาคม 2569	13.00-14.00	17
19 มีนาคม 2569	14.00-15.00	17
19 มีนาคม 2569	15.00-16.00	17
19 มีนาคม 2569	16.00-17.00	16
19 มีนาคม 2569	17.00-18.00	18
19 มีนาคม 2569	18.00-19.00	17
19 มีนาคม 2569	19.00-20.00	16
19 มีนาคม 2569	20.00-21.00	16
19 มีนาคม 2569	21.00-22.00	16
19 มีนาคม 2569	22.00-23.00	17
19 มีนาคม 2569	23.00-00.00	18
20 มีนาคม 2569	00.00-01.00	17
20 มีนาคม 2569	01.00-02.00	18
20 มีนาคม 2569	02.00-03.00	16
20 มีนาคม 2569	03.00-04.00	18
20 มีนาคม 2569	04.00-05.00	16
20 มีนาคม 2569	05.00-06.00	17
20 มีนาคม 2569	06.00-07.00	18
20 มีนาคม 2569	07.00-08.00	18
20 มีนาคม 2569	08.00-09.00	17
20 มีนาคม 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
22 มีนาคม 2569	10.00-11.00	17
22 มีนาคม 2569	11.00-12.00	18
22 มีนาคม 2569	12.00-13.00	18
22 มีนาคม 2569	13.00-14.00	19
22 มีนาคม 2569	14.00-15.00	19
22 มีนาคม 2569	15.00-16.00	19
22 มีนาคม 2569	16.00-17.00	18
22 มีนาคม 2569	17.00-18.00	17
22 มีนาคม 2569	18.00-19.00	19
22 มีนาคม 2569	19.00-20.00	18
22 มีนาคม 2569	20.00-21.00	18
22 มีนาคม 2569	21.00-22.00	18
22 มีนาคม 2569	22.00-23.00	18
22 มีนาคม 2569	23.00-00.00	18
23 มีนาคม 2569	00.00-01.00	18
23 มีนาคม 2569	01.00-02.00	19
23 มีนาคม 2569	02.00-03.00	18
23 มีนาคม 2569	03.00-04.00	18
23 มีนาคม 2569	04.00-05.00	17
23 มีนาคม 2569	05.00-06.00	18
23 มีนาคม 2569	06.00-07.00	18
23 มีนาคม 2569	07.00-08.00	18
23 มีนาคม 2569	08.00-09.00	17
23 มีนาคม 2569	09.00-10.00	19

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
21 มีนาคม 2569	10.00-11.00	20
21 มีนาคม 2569	11.00-12.00	20
21 มีนาคม 2569	12.00-13.00	19
21 มีนาคม 2569	13.00-14.00	19
21 มีนาคม 2569	14.00-15.00	20
21 มีนาคม 2569	15.00-16.00	20
21 มีนาคม 2569	16.00-17.00	20
21 มีนาคม 2569	17.00-18.00	19
21 มีนาคม 2569	18.00-19.00	20
21 มีนาคม 2569	19.00-20.00	20
21 มีนาคม 2569	20.00-21.00	20
21 มีนาคม 2569	21.00-22.00	19
21 มีนาคม 2569	22.00-23.00	21
21 มีนาคม 2569	23.00-00.00	19
22 มีนาคม 2569	00.00-01.00	20
22 มีนาคม 2569	01.00-02.00	20
22 มีนาคม 2569	02.00-03.00	21
22 มีนาคม 2569	03.00-04.00	21
22 มีนาคม 2569	04.00-05.00	21
22 มีนาคม 2569	05.00-06.00	20
22 มีนาคม 2569	06.00-07.00	21
22 มีนาคม 2569	07.00-08.00	20
22 มีนาคม 2569	08.00-09.00	21
22 มีนาคม 2569	09.00-10.00	19

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
24 มีนาคม 2569	10.00-11.00	17
24 มีนาคม 2569	11.00-12.00	17
24 มีนาคม 2569	12.00-13.00	18
24 มีนาคม 2569	13.00-14.00	17
24 มีนาคม 2569	14.00-15.00	18
24 มีนาคม 2569	15.00-16.00	17
24 มีนาคม 2569	16.00-17.00	17
24 มีนาคม 2569	17.00-18.00	18
24 มีนาคม 2569	18.00-19.00	17
24 มีนาคม 2569	19.00-20.00	18
24 มีนาคม 2569	20.00-21.00	18
24 มีนาคม 2569	21.00-22.00	17
24 มีนาคม 2569	22.00-23.00	17
24 มีนาคม 2569	23.00-00.00	18
25 มีนาคม 2569	00.00-01.00	17
25 มีนาคม 2569	01.00-02.00	17
25 มีนาคม 2569	02.00-03.00	17
25 มีนาคม 2569	03.00-04.00	18
25 มีนาคม 2569	04.00-05.00	17
25 มีนาคม 2569	05.00-06.00	18
25 มีนาคม 2569	06.00-07.00	17
25 มีนาคม 2569	07.00-08.00	18
25 มีนาคม 2569	08.00-09.00	19
25 มีนาคม 2569	09.00-10.00	18

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
23 มีนาคม 2569	10.00-11.00	19
23 มีนาคม 2569	11.00-12.00	18
23 มีนาคม 2569	12.00-13.00	16
23 มีนาคม 2569	13.00-14.00	20
23 มีนาคม 2569	14.00-15.00	17
23 มีนาคม 2569	15.00-16.00	13
23 มีนาคม 2569	16.00-17.00	18
23 มีนาคม 2569	17.00-18.00	19
23 มีนาคม 2569	18.00-19.00	19
23 มีนาคม 2569	19.00-20.00	16
23 มีนาคม 2569	20.00-21.00	19
23 มีนาคม 2569	21.00-22.00	19
23 มีนาคม 2569	22.00-23.00	19
23 มีนาคม 2569	23.00-00.00	18
24 มีนาคม 2569	00.00-01.00	15
24 มีนาคม 2569	01.00-02.00	18
24 มีนาคม 2569	02.00-03.00	19
24 มีนาคม 2569	03.00-04.00	17
24 มีนาคม 2569	04.00-05.00	13
24 มีนาคม 2569	05.00-06.00	18
24 มีนาคม 2569	06.00-07.00	19
24 มีนาคม 2569	07.00-08.00	18
24 มีนาคม 2569	08.00-09.00	14
24 มีนาคม 2569	09.00-10.00	19

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
26 มีนาคม 2569	10.00-11.00	25
26 มีนาคม 2569	11.00-12.00	21
26 มีนาคม 2569	12.00-13.00	20
26 มีนาคม 2569	13.00-14.00	21
26 มีนาคม 2569	14.00-15.00	15
26 มีนาคม 2569	15.00-16.00	21
26 มีนาคม 2569	16.00-17.00	25
26 มีนาคม 2569	17.00-18.00	22
26 มีนาคม 2569	18.00-19.00	23
26 มีนาคม 2569	19.00-20.00	21
26 มีนาคม 2569	20.00-21.00	22
26 มีนาคม 2569	21.00-22.00	20
26 มีนาคม 2569	22.00-23.00	21
26 มีนาคม 2569	23.00-00.00	19
27 มีนาคม 2569	00.00-01.00	24
27 มีนาคม 2569	01.00-02.00	21
27 มีนาคม 2569	02.00-03.00	17
27 มีนาคม 2569	03.00-04.00	21
27 มีนาคม 2569	04.00-05.00	22
27 มีนาคม 2569	05.00-06.00	25
27 มีนาคม 2569	06.00-07.00	22
27 มีนาคม 2569	07.00-08.00	16
27 มีนาคม 2569	08.00-09.00	22
27 มีนาคม 2569	09.00-10.00	22

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
25 มีนาคม 2569	10.00-11.00	18
25 มีนาคม 2569	11.00-12.00	20
25 มีนาคม 2569	12.00-13.00	20
25 มีนาคม 2569	13.00-14.00	19
25 มีนาคม 2569	14.00-15.00	19
25 มีนาคม 2569	15.00-16.00	20
25 มีนาคม 2569	16.00-17.00	18
25 มีนาคม 2569	17.00-18.00	20
25 มีนาคม 2569	18.00-19.00	19
25 มีนาคม 2569	19.00-20.00	21
25 มีนาคม 2569	20.00-21.00	20
25 มีนาคม 2569	21.00-22.00	20
25 มีนาคม 2569	22.00-23.00	21
25 มีนาคม 2569	23.00-00.00	19
26 มีนาคม 2569	00.00-01.00	20
26 มีนาคม 2569	01.00-02.00	20
26 มีนาคม 2569	02.00-03.00	19
26 มีนาคม 2569	03.00-04.00	20
26 มีนาคม 2569	04.00-05.00	21
26 มีนาคม 2569	05.00-06.00	20
26 มีนาคม 2569	06.00-07.00	20
26 มีนาคม 2569	07.00-08.00	19
26 มีนาคม 2569	08.00-09.00	20
26 มีนาคม 2569	09.00-10.00	19

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหอมนอย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
28 มีนาคม 2569	10.00-11.00	26
28 มีนาคม 2569	11.00-12.00	24
28 มีนาคม 2569	12.00-13.00	26
28 มีนาคม 2569	13.00-14.00	28
28 มีนาคม 2569	14.00-15.00	24
28 มีนาคม 2569	15.00-16.00	23
28 มีนาคม 2569	16.00-17.00	19
28 มีนาคม 2569	17.00-18.00	24
28 มีนาคม 2569	18.00-19.00	22
28 มีนาคม 2569	19.00-20.00	26
28 มีนาคม 2569	20.00-21.00	24
28 มีนาคม 2569	21.00-22.00	23
28 มีนาคม 2569	22.00-23.00	21
28 มีนาคม 2569	23.00-00.00	24
29 มีนาคม 2569	00.00-01.00	23
29 มีนาคม 2569	01.00-02.00	19
29 มีนาคม 2569	02.00-03.00	24
29 มีนาคม 2569	03.00-04.00	25
29 มีนาคม 2569	04.00-05.00	22
29 มีนาคม 2569	05.00-06.00	24
29 มีนาคม 2569	06.00-07.00	26
29 มีนาคม 2569	07.00-08.00	23
29 มีนาคม 2569	08.00-09.00	21
29 มีนาคม 2569	09.00-10.00	23

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหอมนอย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
27 มีนาคม 2569	10.00-11.00	23
27 มีนาคม 2569	11.00-12.00	22
27 มีนาคม 2569	12.00-13.00	20
27 มีนาคม 2569	13.00-14.00	22
27 มีนาคม 2569	14.00-15.00	24
27 มีนาคม 2569	15.00-16.00	20
27 มีนาคม 2569	16.00-17.00	22
27 มีนาคม 2569	17.00-18.00	20
27 มีนาคม 2569	18.00-19.00	22
27 มีนาคม 2569	19.00-20.00	25
27 มีนาคม 2569	20.00-21.00	22
27 มีนาคม 2569	21.00-22.00	22
27 มีนาคม 2569	22.00-23.00	17
27 มีนาคม 2569	23.00-00.00	22
28 มีนาคม 2569	00.00-01.00	22
28 มีนาคม 2569	01.00-02.00	23
28 มีนาคม 2569	02.00-03.00	26
28 มีนาคม 2569	03.00-04.00	23
28 มีนาคม 2569	04.00-05.00	22
28 มีนาคม 2569	05.00-06.00	22
28 มีนาคม 2569	06.00-07.00	19
28 มีนาคม 2569	07.00-08.00	22
28 มีนาคม 2569	08.00-09.00	20
28 มีนาคม 2569	09.00-10.00	18

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
29 มีนาคม 2569	10.00-11.00	17
29 มีนาคม 2569	11.00-12.00	18
29 มีนาคม 2569	12.00-13.00	18
29 มีนาคม 2569	13.00-14.00	18
29 มีนาคม 2569	14.00-15.00	18
29 มีนาคม 2569	15.00-16.00	19
29 มีนาคม 2569	16.00-17.00	17
29 มีนาคม 2569	17.00-18.00	16
29 มีนาคม 2569	18.00-19.00	18
29 มีนาคม 2569	19.00-20.00	17
29 มีนาคม 2569	20.00-21.00	18
29 มีนาคม 2569	21.00-22.00	17
29 มีนาคม 2569	22.00-23.00	17
29 มีนาคม 2569	23.00-00.00	18
30 มีนาคม 2569	00.00-01.00	17
30 มีนาคม 2569	01.00-02.00	19
30 มีนาคม 2569	02.00-03.00	17
30 มีนาคม 2569	03.00-04.00	18
30 มีนาคม 2569	04.00-05.00	17
30 มีนาคม 2569	05.00-06.00	17
30 มีนาคม 2569	06.00-07.00	17
30 มีนาคม 2569	07.00-08.00	17
30 มีนาคม 2569	08.00-09.00	17
30 มีนาคม 2569	09.00-10.00	18

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
30 มีนาคม 2569	10.00-11.00	21
30 มีนาคม 2569	11.00-12.00	22
30 มีนาคม 2569	12.00-13.00	21
30 มีนาคม 2569	13.00-14.00	21
30 มีนาคม 2569	14.00-15.00	21
30 มีนาคม 2569	15.00-16.00	22
30 มีนาคม 2569	16.00-17.00	22
30 มีนาคม 2569	17.00-18.00	21
30 มีนาคม 2569	18.00-19.00	22
30 มีนาคม 2569	19.00-20.00	22
30 มีนาคม 2569	20.00-21.00	22
30 มีนาคม 2569	21.00-22.00	21
30 มีนาคม 2569	22.00-23.00	22
30 มีนาคม 2569	23.00-00.00	21
31 มีนาคม 2569	00.00-01.00	22
31 มีนาคม 2569	01.00-02.00	22
31 มีนาคม 2569	02.00-03.00	22
31 มีนาคม 2569	03.00-04.00	23
31 มีนาคม 2569	04.00-05.00	23
31 มีนาคม 2569	05.00-06.00	21
31 มีนาคม 2569	06.00-07.00	23
31 มีนาคม 2569	07.00-08.00	22
31 มีนาคม 2569	08.00-09.00	23
31 มีนาคม 2569	09.00-10.00	21

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

C.E.M TECH

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
31 มีนาคม 2569	10.00-11.00	21
31 มีนาคม 2569	11.00-12.00	22
31 มีนาคม 2569	12.00-13.00	22
31 มีนาคม 2569	13.00-14.00	21
31 มีนาคม 2569	14.00-15.00	21
31 มีนาคม 2569	15.00-16.00	21
31 มีนาคม 2569	16.00-17.00	20
31 มีนาคม 2569	17.00-18.00	22
31 มีนาคม 2569	18.00-19.00	21
31 มีนาคม 2569	19.00-20.00	20
31 มีนาคม 2569	20.00-21.00	21
31 มีนาคม 2569	21.00-22.00	20
31 มีนาคม 2569	22.00-23.00	21
31 มีนาคม 2569	23.00-00.00	22
1 เมษายน 2569	00.00-01.00	21
1 เมษายน 2569	01.00-02.00	22
1 เมษายน 2569	02.00-03.00	21
1 เมษายน 2569	03.00-04.00	22
1 เมษายน 2569	04.00-05.00	21
1 เมษายน 2569	05.00-06.00	21
1 เมษายน 2569	06.00-07.00	22
1 เมษายน 2569	07.00-08.00	24
1 เมษายน 2569	08.00-09.00	22
1 เมษายน 2569	09.00-10.00	21
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

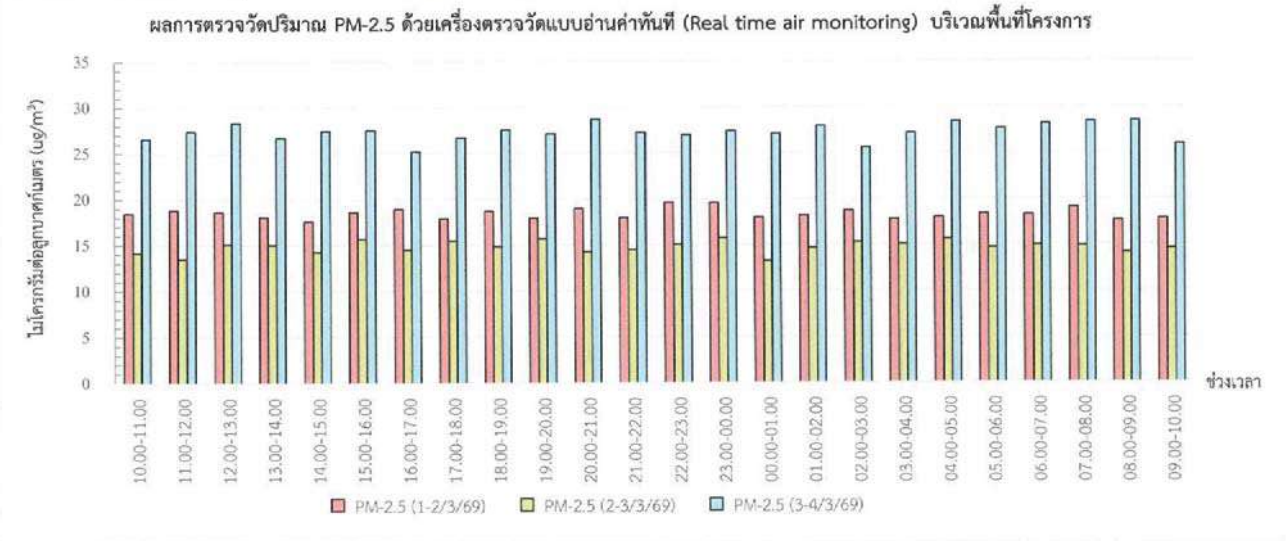

กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

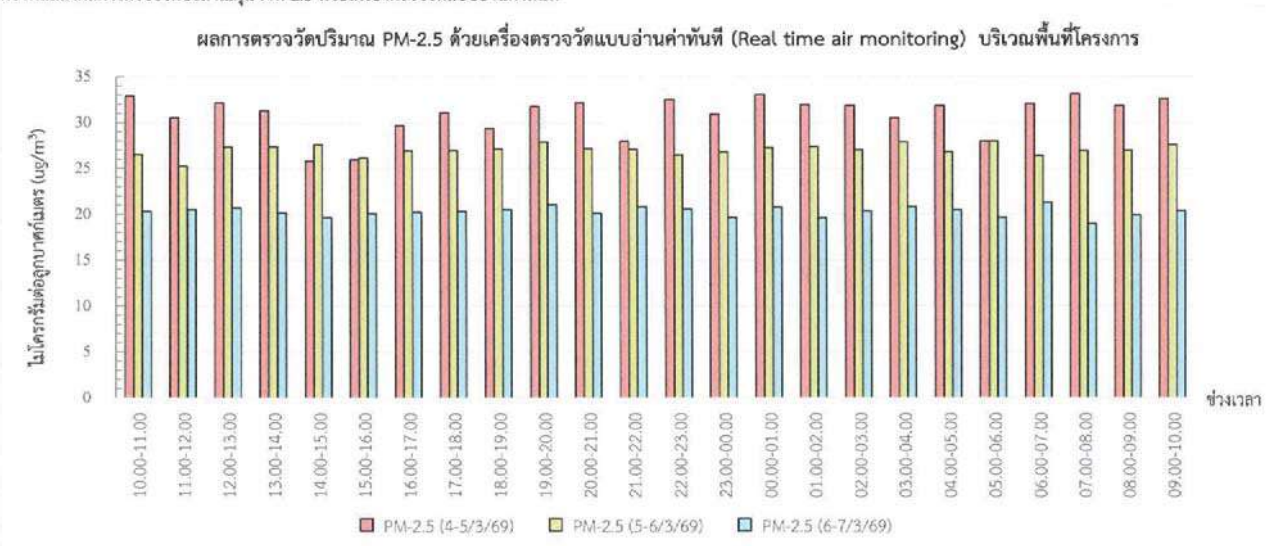

กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

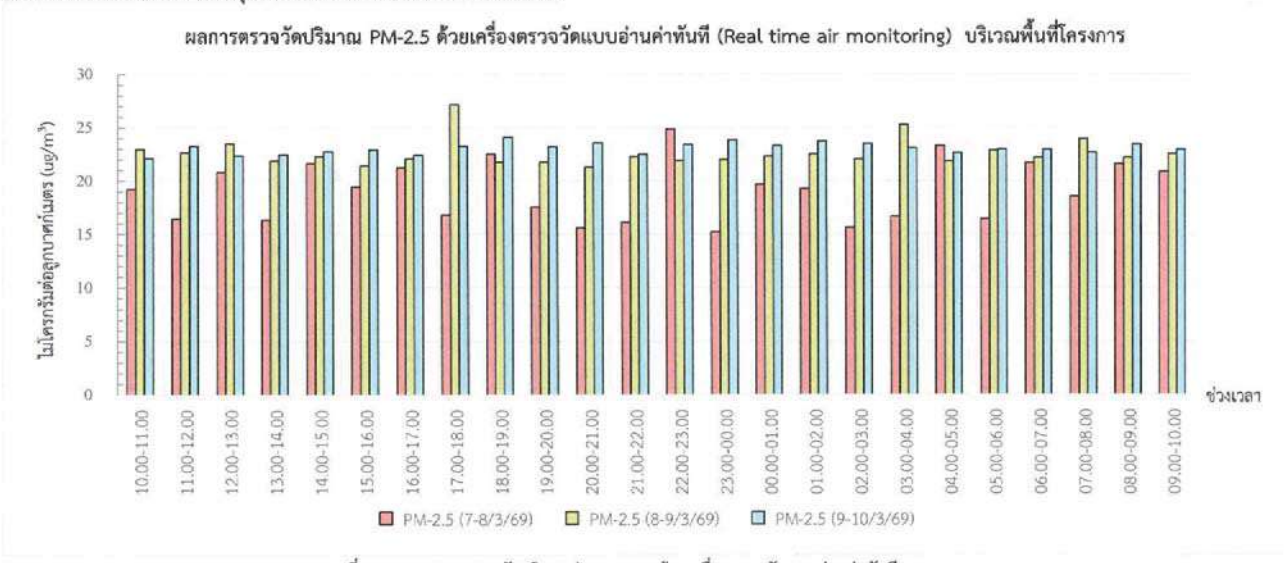

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

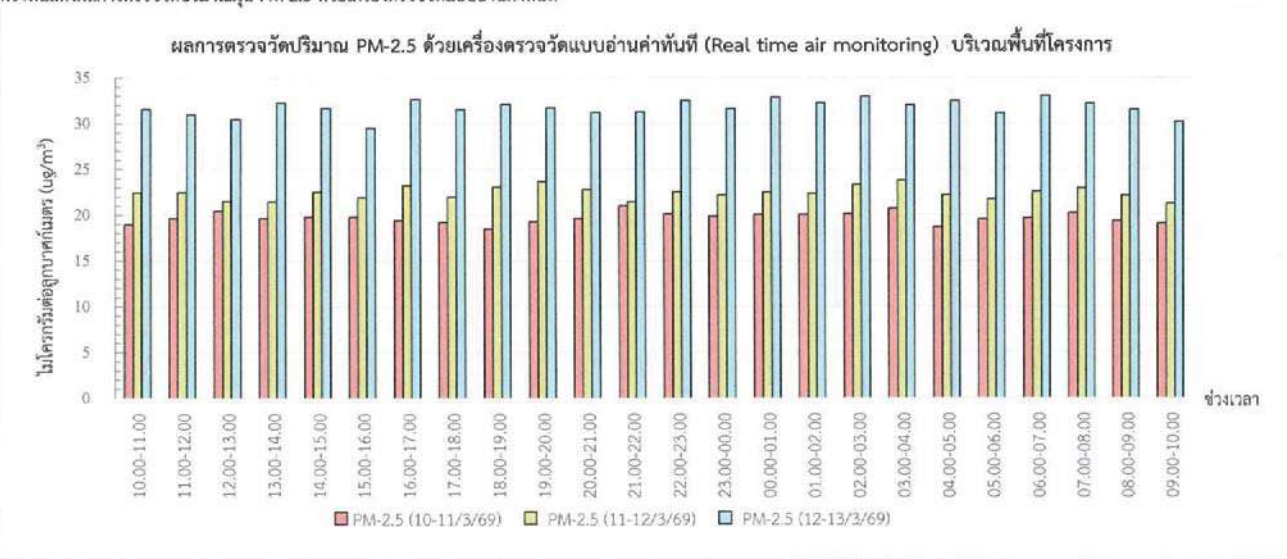

กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

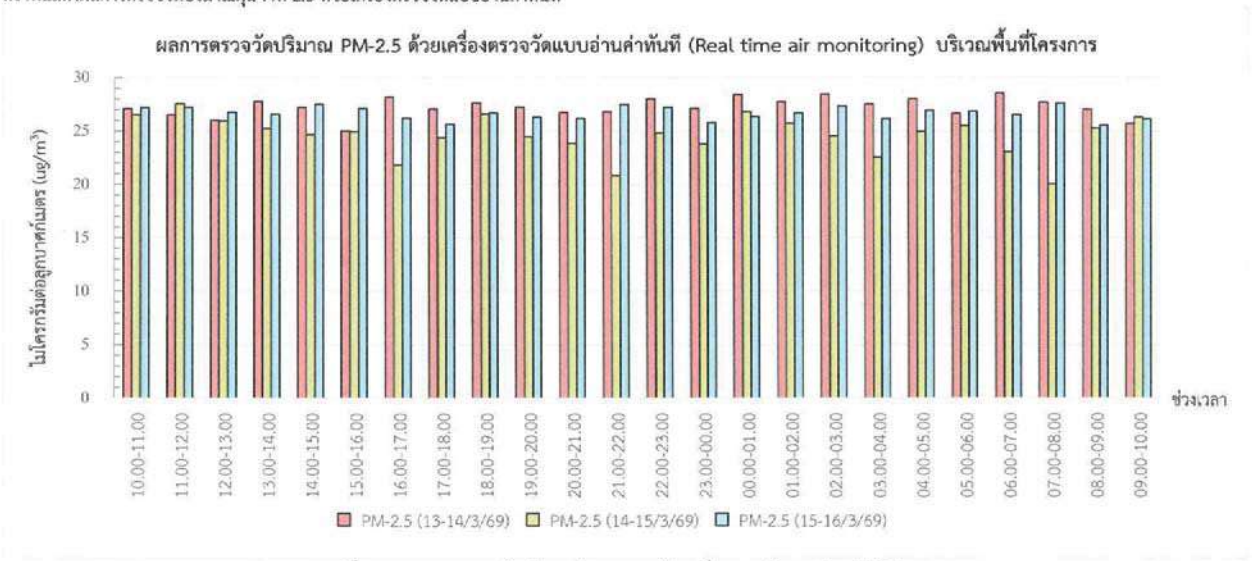

กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

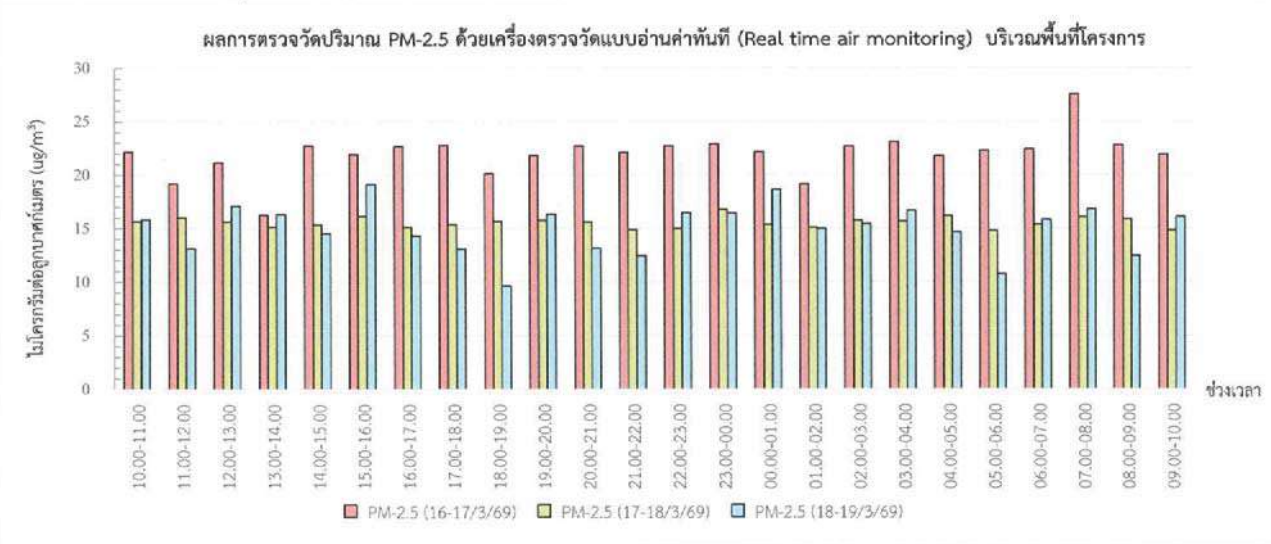

กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

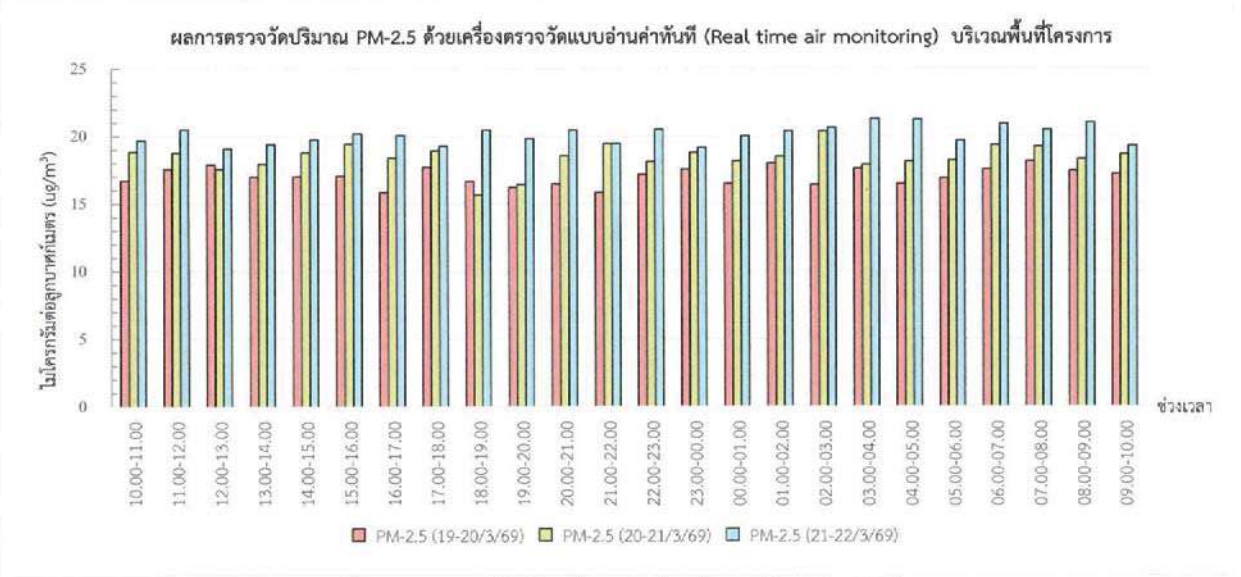

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

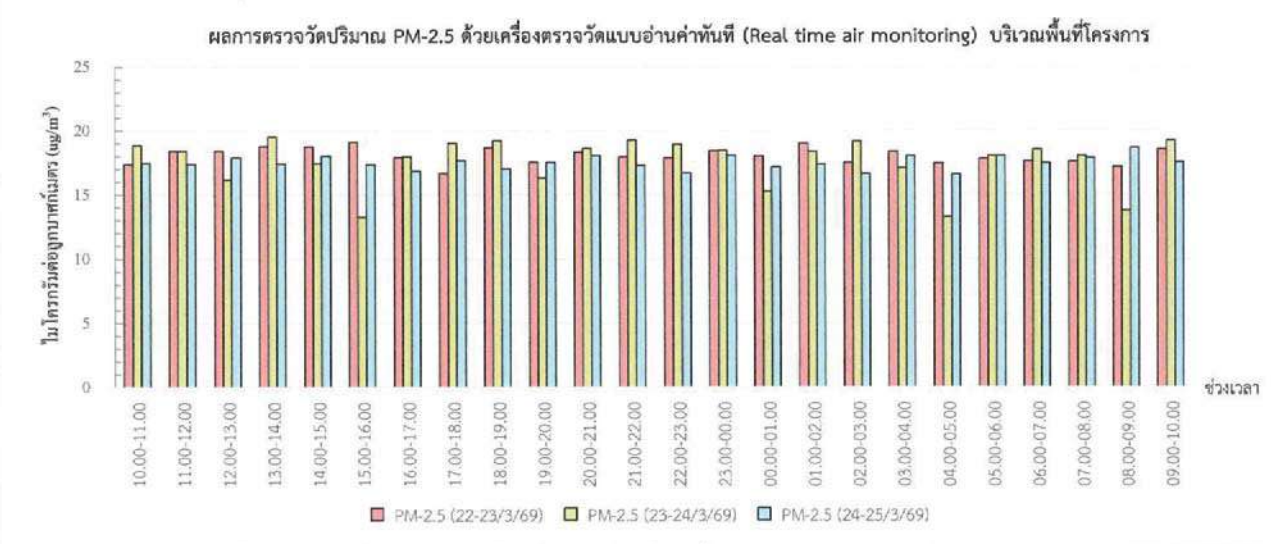

กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

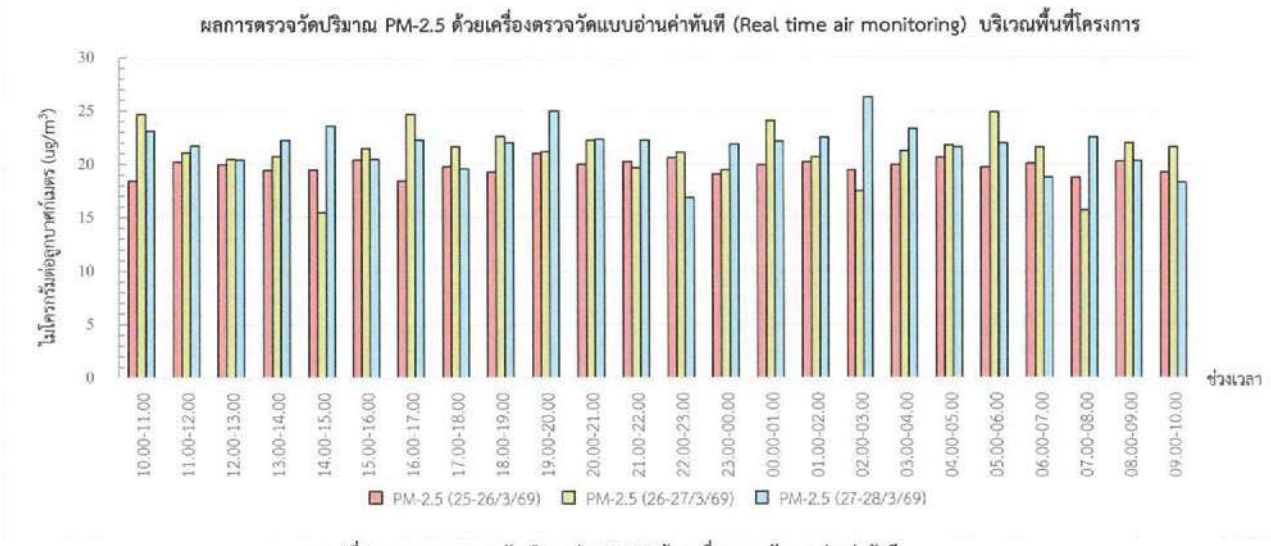

กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

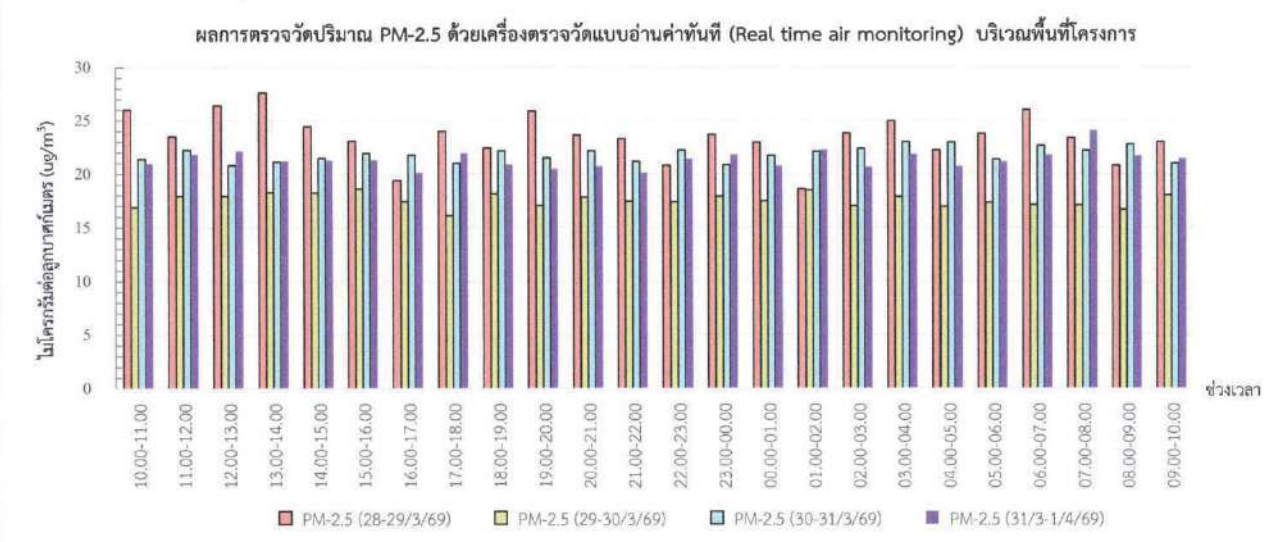

กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 มีนาคม 2569 – 1 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq,\ 24\ hrs.}$	$L_{A90,\ 24\ hrs.}$	$L_{Amax,\ 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
17-18 เมษายน 2569	65	61	87
18-19 เมษายน 2569	63	60	88
19-20 เมษายน 2569	64	58	85
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
17-18 เมษายน 2569	63	58	86
18-19 เมษายน 2569	61	57	84
19-20 เมษายน 2569	62	58	87
มาตรฐาน(*)	**≤ 70**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ(*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0862-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-21D, Serial No. 821088, ID No. NS-15-001 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-21D, Serial No. 821090, ID No. NS-15-003 ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 17-18 เมษายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	10.15-11.15	67.2	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	05.15-06.15	63.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	05.15-06.15	59.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		64.9	-
ระดับการรบกวน	-	5.2	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 18-19 เมษายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	14.15-15.15	63.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	18.15-19.15	61.2	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	18.15-19.15	55.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		60.1	-
ระดับการรบกวน	-	4.5	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0862-01

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821487, ID No. NS-12-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 11-12 มีนาคม 2569, หมดอายุ วันที่ 10 มีนาคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 18-19 เมษายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.40-09.40	60.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	17.40-18.40	58.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	17.40-18.40	53.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.5	-
ระดับการรบกวน	-	3.3	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 19-20 เมษายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.40-11.40	63.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.40-06.40	59.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.40-06.40	56.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.6	-
ระดับการรบกวน	-	4.9	≤ 10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ (*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 19-20 เมษายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.15-10.15	66.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	04.15-05.15	64.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	04.15-05.15	57.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		61.3	-
ระดับการรบกวน	-	3.7	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 17-18 เมษายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	15.40-16.40	64.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.40-19.40	61.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.40-19.40	56.5	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.7	-
ระดับการรบกวน	-	5.2	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 17-18 เมษายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
13.15	8.100	237	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
14.15	6.900	235	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
15.15	7.500	234	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
16.15	6.900	235	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
17.15	7.600	229	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
18.15	7.900	229	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
19.15	7.900	226	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
20.15	8.300	230	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
21.15	8.900	231	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
22.15	8.400	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
23.15	7.100	230	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
00.15	5.700	249	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
01.15	5.600	239	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
02.15	7.100	232	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
03.15	4.200	249	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
04.15	5.000	242	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
05.15	3.500	243	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
06.15	5.200	246	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
07.15	4.300	242	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
08.15	6.200	235	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
09.15	7.400	237	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
10.15	7.300	238	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
11.15	6.800	239	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
12.15	3.500	290	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		6.554	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0862-01

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569


วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ

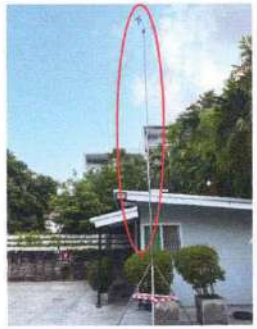

จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 เมษายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
13.15	2.000	271	ตะวันตก (W)
14.15	3.600	258	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
15.15	4.400	269	ตะวันตก (W)
16.15	2.900	271	ตะวันตก (W)
17.15	3.600	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.15	4.300	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.15	4.300	297	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.15	3.900	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
21.15	4.100	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
22.15	3.900	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.15	3.000	297	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.15	2.600	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
01.15	1.400	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
02.15	2.600	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
03.15	3.400	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
04.15	3.200	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
05.15	2.200	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
06.15	2.900	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
07.15	2.500	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
08.15	2.300	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
09.15	4.200	292	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
10.15	3.800	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
11.15	4.200	291	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
12.15	4.700	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.333	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 เมษายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
13.15	2.900	290	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
14.15	8.700	183	ใต้ (S)
15.15	8.300	175	ใต้ (S)
16.15	6.100	209	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
17.15	6.400	231	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
18.15	8.500	209	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
19.15	9.800	176	ใต้ (S)
20.15	9.900	174	ใต้ (S)
21.15	7.900	180	ใต้ (S)
22.15	7.500	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
23.15	7.900	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
00.15	6.600	215	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
01.15	7.300	190	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
02.15	7.600	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.15	6.500	207	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
04.15	5.500	214	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
05.15	5.200	207	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
06.15	4.900	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.15	6.200	200	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
08.15	6.100	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
09.15	6.400	211	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
10.15	7.600	282	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
11.15	8.600	280	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
12.15	3.600	290	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		6.917	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 เมษายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
14.40	4.300	275	ตะวันตก (W)
15.40	4.100	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
16.40	2.700	346	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
17.40	5.100	129	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
18.40	6.000	121	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.40	7.900	356	เหนือ (N)
20.40	2.600	120	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
21.40	1.900	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
22.40	1.800	208	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
23.40	2.200	102	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
00.40	1.100	36	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
01.40	1.200	96	ตะวันออก (E)
02.40	1.400	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.40	1.400	257	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
04.40	1.100	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
05.40	1.300	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.40	1.100	113	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
07.40	1.200	9	เหนือ (N)
08.40	1.600	7	เหนือ (N)
09.40	5.200	62	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
10.40	3.700	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
11.40	3.600	61	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
12.40	3.000	60	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
13.40	4.100	76	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.900	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 17-18 เมษายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
14.40	4.300	180	ใต้ (S)
15.40	4.100	176	ใต้ (S)
16.40	3.600	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.40	3.100	142	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
18.40	3.600	165	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.40	3.500	142	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.40	3.600	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
21.40	5.400	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.40	2.800	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.40	2.600	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
00.40	4.300	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
01.40	2.400	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
02.40	2.800	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
03.40	2.400	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.40	2.600	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
05.40	2.000	135	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
06.40	1.400	138	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
07.40	2.400	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.40	2.500	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
09.40	3.700	134	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
10.40	4.000	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
11.40	4.100	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.40	4.400	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
13.40	3.900	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.313	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569

เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3272, ID No. AB-09-011
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3245, ID No. AB-10-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
PM 2.5-PM 10 Air sampler "BGI" Model. PQ-200, Serial No. 140AB25409410, ID No. AB-16-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 30 สิงหาคม 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 เมษายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
14.40	3.900	115	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.40	4.700	115	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
16.40	4.900	177	ใต้ (S)
17.40	5.600	272	ตะวันตก (W)
18.40	3.400	290	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.40	4.200	9	เหนือ (N)
20.40	2.800	91	ตะวันออก (E)
21.40	1.400	164	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.40	3.600	166	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.40	2.600	135	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
00.40	0.900	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
01.40	0.800	166	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
02.40	0.900	111	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
03.40	0.800	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.40	1.100	130	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
05.40	0.800	121	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.40	0.700	135	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
07.40	1.100	120	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
08.40	1.600	113	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
09.40	3.000	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
10.40	4.500	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
11.40	4.200	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
12.40	2.900	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.40	3.400	163	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.658	
วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	17-18 เมษายน 2569	82,600	45	59,800	36	420	18	2.14
2	18-19 เมษายน 2569	74,100	41	57,200	34	400	17	2.25
3	19-20 เมษายน 2569	74,200	40	54,300	32	380	16	2.08
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	17-18 เมษายน 2569	65,000	37	58,000	35	-	-	2.16
2	18-19 เมษายน 2569	58,000	33	51,000	31	-	-	2.07
3	19-20 เมษายน 2569	54,900	31	48,000	29	-	-	2.03
มาตรฐาน[1]		-	≤ 200	-	≤ 100	-	≤ 37.5	-
LOQ[2]		10,000	5	3,000	1	100	4.3	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :
1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย PM-2.5 air sampler, FRM method
4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :
1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B
2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0862-01

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	17-18 เมษายน 2569	13.00-14.00	1.05
		14.00-15.00	1.02
		15.00-16.00	1.02
		16.00-17.00	1.05
		17.00-18.00	1.05
		18.00-19.00	1.24
		19.00-20.00	1.34
		20.00-21.00	1.51
		21.00-22.00	1.64
		22.00-23.00	1.68
		23.00-00.00	1.36
		00.00-01.00	1.63
		01.00-02.00	1.55
		02.00-03.00	1.56
		03.00-04.00	1.52
		04.00-05.00	1.47
		05.00-06.00	1.51
		06.00-07.00	1.41
		07.00-08.00	1.38
		08.00-09.00	1.36
		09.00-10.00	1.06
		10.00-11.00	1.26
		11.00-12.00	1.37
		12.00-13.00	1.40
		Max (1 ชั่วโมง)	1.68
		Min (1 ชั่วโมง)	1.02
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.35
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011069, ID No. AB-03-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
3	19-20 เมษายน 2569	13.00-14.00	1.12
		14.00-15.00	1.29
		15.00-16.00	1.34
		16.00-17.00	1.44
		17.00-18.00	1.50
		18.00-19.00	1.57
		19.00-20.00	1.60
		20.00-21.00	1.62
		21.00-22.00	1.64
		22.00-23.00	1.64
		23.00-00.00	1.54
		00.00-01.00	1.36
		01.00-02.00	1.19
		02.00-03.00	1.21
		03.00-04.00	1.43
		04.00-05.00	1.57
		05.00-06.00	1.56
		06.00-07.00	1.70
		07.00-08.00	1.51
		08.00-09.00	1.28
		09.00-10.00	0.94
		10.00-11.00	1.48
		11.00-12.00	1.48
		12.00-13.00	1.52
		Max (1 ชั่วโมง)	1.70
		Min (1 ชั่วโมง)	0.94
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.44
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0862-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	18-19 เมษายน 2569	13.00-14.00	1.39
		14.00-15.00	1.32
		15.00-16.00	1.29
		16.00-17.00	1.23
		17.00-18.00	1.30
		18.00-19.00	1.34
		19.00-20.00	1.38
		20.00-21.00	1.47
		21.00-22.00	1.52
		22.00-23.00	1.60
		23.00-00.00	1.61
		00.00-01.00	1.61
		01.00-02.00	1.60
		02.00-03.00	1.55
		03.00-04.00	1.46
		04.00-05.00	1.39
		05.00-06.00	1.47
		06.00-07.00	1.57
		07.00-08.00	1.39
		08.00-09.00	1.11
		09.00-10.00	0.98
		10.00-11.00	1.13
		11.00-12.00	0.96
		12.00-13.00	0.98
		Max (1 ชั่วโมง)	1.61
		Min (1 ชั่วโมง)	0.96
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.36
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
5	18-19 เมษายน 2569	14.00-15.00	1.66
		15.00-16.00	1.47
		16.00-17.00	1.36
		17.00-18.00	1.48
		18.00-19.00	1.59
		19.00-20.00	1.62
		20.00-21.00	1.75
		21.00-22.00	1.69
		22.00-23.00	1.56
		23.00-00.00	1.55
		00.00-01.00	1.56
		01.00-02.00	1.62
		02.00-03.00	1.61
		03.00-04.00	1.57
		04.00-05.00	1.55
		05.00-06.00	1.54
		06.00-07.00	1.64
		07.00-08.00	1.65
		08.00-09.00	1.57
		09.00-10.00	1.55
		10.00-11.00	1.78
		11.00-12.00	1.43
		12.00-13.00	1.33
		13.00-14.00	1.13
		Max (1 ชั่วโมง)	1.78
		Min (1 ชั่วโมง)	1.13
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.55
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
4	17-18 เมษายน 2569	14.00-15.00	2.58
		15.00-16.00	1.40
		16.00-17.00	1.36
		17.00-18.00	1.27
		18.00-19.00	1.32
		19.00-20.00	1.38
		20.00-21.00	1.38
		21.00-22.00	1.34
		22.00-23.00	1.37
		23.00-00.00	1.40
		00.00-01.00	1.41
		01.00-02.00	1.42
		02.00-03.00	1.39
		03.00-04.00	1.38
		04.00-05.00	1.39
		05.00-06.00	1.44
		06.00-07.00	1.44
		07.00-08.00	1.49
		08.00-09.00	1.16
		09.00-10.00	1.34
		10.00-11.00	2.69
		11.00-12.00	2.53
		12.00-13.00	2.04
		13.00-14.00	1.77
		Max (1 ชั่วโมง)	2.69
		Min (1 ชั่วโมง)	1.16
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.57
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-62201-334, ID No.AB-01-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
6	19-20 เมษายน 2569	14.00-15.00	1.17
		15.00-16.00	1.19
		16.00-17.00	1.25
		17.00-18.00	1.19
		18.00-19.00	1.23
		19.00-20.00	1.20
		20.00-21.00	1.31
		21.00-22.00	1.33
		22.00-23.00	1.31
		23.00-00.00	1.31
		00.00-01.00	1.33
		01.00-02.00	1.34
		02.00-03.00	1.34
		03.00-04.00	1.36
		04.00-05.00	1.36
		05.00-06.00	1.38
		06.00-07.00	1.39
		07.00-08.00	1.41
		08.00-09.00	1.42
		09.00-10.00	1.39
		10.00-11.00	1.36
		11.00-12.00	1.35
		12.00-13.00	1.37
		13.00-14.00	1.38
		Max (1 ชั่วโมง)	1.42
		Min (1 ชั่วโมง)	1.17
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.32
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04
วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
2	18-19 เมษายน 2569	13.00-14.00	7.7
		14.00-15.00	8.3
		15.00-16.00	6.9
		16.00-17.00	8.9
		17.00-18.00	9.4
		18.00-19.00	9.5
		19.00-20.00	8.1
		20.00-21.00	8.2
		21.00-22.00	8.5
		22.00-23.00	8.7
		23.00-00.00	8.9
		00.00-01.00	9.4
		01.00-02.00	7.7
		02.00-03.00	7.5
		03.00-04.00	7.0
		04.00-05.00	7.8
		05.00-06.00	9.3
		06.00-07.00	9.3
		07.00-08.00	8.6
		08.00-09.00	9.3
		09.00-10.00	8.5
		10.00-11.00	9.7
		11.00-12.00	9.3
		12.00-13.00	9.7
		Max (1 ชั่วโมง)	9.7
		Min (1 ชั่วโมง)	6.9
		Avg (24 ชั่วโมง)	8.6
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
1	17-18 เมษายน 2569	13.00-14.00	8.2
		14.00-15.00	7.7
		15.00-16.00	7.9
		16.00-17.00	7.7
		17.00-18.00	7.6
		18.00-19.00	9.0
		19.00-20.00	7.5
		20.00-21.00	6.2
		21.00-22.00	6.0
		22.00-23.00	5.7
		23.00-00.00	7.0
		00.00-01.00	6.1
		01.00-02.00	5.8
		02.00-03.00	4.8
		03.00-04.00	4.2
		04.00-05.00	4.5
		05.00-06.00	6.6
		06.00-07.00	6.9
		07.00-08.00	6.0
		08.00-09.00	6.7
		09.00-10.00	7.1
		10.00-11.00	4.8
		11.00-12.00	5.9
		12.00-13.00	4.5
		Max (1 ชั่วโมง)	9.0
		Min (1 ชั่วโมง)	4.2
		Avg (24 ชั่วโมง)	6.4
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
4	17-18 เมษายน 2569	14.00-15.00	4.0
		15.00-16.00	4.8
		16.00-17.00	8.8
		17.00-18.00	6.1
		18.00-19.00	7.2
		19.00-20.00	8.0
		20.00-21.00	6.7
		21.00-22.00	8.9
		22.00-23.00	6.0
		23.00-00.00	7.0
		00.00-01.00	9.1
		01.00-02.00	7.0
		02.00-03.00	8.3
		03.00-04.00	6.3
		04.00-05.00	7.2
		05.00-06.00	7.6
		06.00-07.00	8.0
		07.00-08.00	7.0
		08.00-09.00	5.3
		09.00-10.00	5.6
		10.00-11.00	6.6
		11.00-12.00	8.5
		12.00-13.00	7.1
		13.00-14.00	7.1
		Max (1 ชั่วโมง)	9.1
		Min (1 ชั่วโมง)	4.0
		Avg (24 ชั่วโมง)	7.0
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
3	19-20 เมษายน 2569	13.00-14.00	9.3
		14.00-15.00	9.0
		15.00-16.00	9.7
		16.00-17.00	6.6
		17.00-18.00	6.8
		18.00-19.00	6.4
		19.00-20.00	7.7
		20.00-21.00	6.5
		21.00-22.00	6.3
		22.00-23.00	5.6
		23.00-00.00	5.3
		00.00-01.00	6.4
		01.00-02.00	5.7
		02.00-03.00	5.8
		03.00-04.00	7.3
		04.00-05.00	8.7
		05.00-06.00	7.9
		06.00-07.00	5.5
		07.00-08.00	6.5
		08.00-09.00	6.4
		09.00-10.00	5.7
		10.00-11.00	6.0
		11.00-12.00	5.1
		12.00-13.00	5.4
		Max (1 ชั่วโมง)	9.7
		Min (1 ชั่วโมง)	5.1
		Avg (24 ชั่วโมง)	6.7
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
6	19-20 เมษายน 2569	14.00-15.00	6.8
		15.00-16.00	5.1
		16.00-17.00	6.5
		17.00-18.00	6.9
		18.00-19.00	7.8
		19.00-20.00	7.8
		20.00-21.00	8.1
		21.00-22.00	7.7
		22.00-23.00	5.9
		23.00-00.00	7.1
		00.00-01.00	8.3
		01.00-02.00	7.1
		02.00-03.00	7.5
		03.00-04.00	7.2
		04.00-05.00	6.6
		05.00-06.00	8.2
		06.00-07.00	8.0
		07.00-08.00	6.9
		08.00-09.00	8.0
		09.00-10.00	8.8
		10.00-11.00	6.6
		11.00-12.00	8.7
		12.00-13.00	6.0
		13.00-14.00	7.6
		Max (1 ชั่วโมง)	8.8
		Min (1 ชั่วโมง)	5.1
		Avg (24 ชั่วโมง)	7.3
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
5	18-19 เมษายน 2569	14.00-15.00	7.2
		15.00-16.00	6.9
		16.00-17.00	7.4
		17.00-18.00	7.9
		18.00-19.00	7.9
		19.00-20.00	8.1
		20.00-21.00	8.2
		21.00-22.00	7.3
		22.00-23.00	7.1
		23.00-00.00	6.1
		00.00-01.00	6.4
		01.00-02.00	6.6
		02.00-03.00	7.1
		03.00-04.00	6.6
		04.00-05.00	6.5
		05.00-06.00	8.0
		06.00-07.00	7.5
		07.00-08.00	6.6
		08.00-09.00	6.1
		09.00-10.00	4.7
		10.00-11.00	6.2
		11.00-12.00	5.7
		12.00-13.00	10.0
		13.00-14.00	10.0
		Max (1 ชั่วโมง)	10.0
		Min (1 ชั่วโมง)	4.7
		Avg (24 ชั่วโมง)	7.2
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	0.5

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
1	17-18 เมษายน 2569	13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0862-01

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 508011077, ID No.AB-02-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
3	19-20 เมษายน 2569	13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
2	18-19 เมษายน 2569	13.00-14.00	< 50
		14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
5	18-19 เมษายน 2569	14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
4	17-18 เมษายน 2569	14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-20 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 26 เมษายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 29 กันยายน 2569
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
6	19-20 เมษายน 2569	14.00-15.00	< 50
		15.00-16.00	< 50
		16.00-17.00	< 50
		17.00-18.00	< 50
		18.00-19.00	< 50
		19.00-20.00	< 50
		20.00-21.00	< 50
		21.00-22.00	< 50
		22.00-23.00	< 50
		23.00-00.00	< 50
		00.00-01.00	< 50
		01.00-02.00	< 50
		02.00-03.00	< 50
		03.00-04.00	< 50
		04.00-05.00	< 50
		05.00-06.00	< 50
		06.00-07.00	< 50
		07.00-08.00	< 50
		08.00-09.00	< 50
		09.00-10.00	< 50
		10.00-11.00	< 50
		11.00-12.00	< 50
		12.00-13.00	< 50
		13.00-14.00	< 50
		Max (1 ชั่วโมง)	< 50
		Min (1 ชั่วโมง)	< 50
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	50
วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรกาษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
17 เมษายน 2569						
13.25	0.591	1.98	1.387	> 100.00	0.441	> 100.00
14.45	0.298	5.62	0.835	> 100.00	0.241	> 100.00
15.36	0.317	65.32	1.364	> 100.00	0.374	> 100.00
16.57	0.339	24.38	1.033	41.26	0.512	> 100.00
18 เมษายน 2569						
08.17	0.287	6.52	0.975	57.92	0.635	> 100.00
09.40	0.629	1.13	1.190	> 100.00	0.173	> 100.00
10.51	0.342	7.19	0.725	> 100.00	0.258	36.57
11.31	0.347	73.14	1.316	> 100.00	0.277	> 100.00
13.21	0.268	8.56	1.419	> 100.00	0.315	> 100.00
14.42	0.522	1.93	0.820	> 100.00	0.260	> 100.00
15.12	0.621	5.75	1.127	64.00	0.244	> 100.00
16.47	0.840	7.31	0.899	46.55	0.205	85.33
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรกาษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
19 เมษายน 2569						
08.18	0.229	7.26	0.987	25.60	0.181	> 100.00
09.59	0.365	8.43	0.638	> 100.00	0.189	> 100.00
10.39	0.307	2.01	0.914	> 100.00	0.355	> 100.00
11.21	0.514	45.26	0.981	56.89	0.134	> 100.00
13.40	0.213	17.59	0.607	4.38	0.142	> 100.00
14.26	0.292	56.31	0.662	16.52	0.586	> 100.00
15.38	0.331	> 100.00	1.513	> 100.00	0.252	> 100.00
16.49	0.197	41.87	0.560	51.20	0.158	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ[1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
[3]= วันที่ 20 เมษายน 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 21 เมษายน 2569	มาตรฐาน[3]
pH	-	-	-	10.3	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	4	6	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	< 3	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	5	276	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	4	5	≤ 40
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ใส มีตะกอน	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0861-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 22 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 22 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
Oven "Memmert"Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- **รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที**

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-0861-01

หมายเหตุ
(1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)
(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu g/m^3$)
1 เมษายน 2569	10.00-11.00	10
1 เมษายน 2569	11.00-12.00	20
1 เมษายน 2569	12.00-13.00	14
1 เมษายน 2569	13.00-14.00	11
1 เมษายน 2569	14.00-15.00	15
1 เมษายน 2569	15.00-16.00	14
1 เมษายน 2569	16.00-17.00	14
1 เมษายน 2569	17.00-18.00	14
1 เมษายน 2569	18.00-19.00	10
1 เมษายน 2569	19.00-20.00	14
1 เมษายน 2569	20.00-21.00	19
1 เมษายน 2569	21.00-22.00	14
1 เมษายน 2569	22.00-23.00	14
1 เมษายน 2569	23.00-00.00	15
2 เมษายน 2569	00.00-01.00	15
2 เมษายน 2569	01.00-02.00	13
2 เมษายน 2569	02.00-03.00	10
2 เมษายน 2569	03.00-04.00	14
2 เมษายน 2569	04.00-05.00	14
2 เมษายน 2569	05.00-06.00	14
2 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
2 เมษายน 2569	07.00-08.00	13
2 เมษายน 2569	08.00-09.00	14
2 เมษายน 2569	09.00-10.00	14

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 พฤษภาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
2 เมษายน 2569	10.00-11.00	14
2 เมษายน 2569	11.00-12.00	13
2 เมษายน 2569	12.00-13.00	13
2 เมษายน 2569	13.00-14.00	19
2 เมษายน 2569	14.00-15.00	18
2 เมษายน 2569	15.00-16.00	16
2 เมษายน 2569	16.00-17.00	13
2 เมษายน 2569	17.00-18.00	13
2 เมษายน 2569	18.00-19.00	11
2 เมษายน 2569	19.00-20.00	12
2 เมษายน 2569	20.00-21.00	13
2 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
2 เมษายน 2569	22.00-23.00	13
2 เมษายน 2569	23.00-00.00	13
3 เมษายน 2569	00.00-01.00	13
3 เมษายน 2569	01.00-02.00	12
3 เมษายน 2569	02.00-03.00	13
3 เมษายน 2569	03.00-04.00	13
3 เมษายน 2569	04.00-05.00	12
3 เมษายน 2569	05.00-06.00	13
3 เมษายน 2569	06.00-07.00	13
3 เมษายน 2569	07.00-08.00	11
3 เมษายน 2569	08.00-09.00	15
3 เมษายน 2569	09.00-10.00	16

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
3 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
3 เมษายน 2569	11.00-12.00	16
3 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
3 เมษายน 2569	13.00-14.00	16
3 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
3 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
3 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
3 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
3 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
3 เมษายน 2569	19.00-20.00	18
3 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
3 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
3 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
3 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
4 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
4 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
4 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
4 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
4 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
4 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
4 เมษายน 2569	06.00-07.00	16
4 เมษายน 2569	07.00-08.00	18
4 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
4 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
5 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
5 เมษายน 2569	11.00-12.00	18
5 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
5 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
5 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
5 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
5 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
5 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
5 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
5 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
5 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
5 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
5 เมษายน 2569	22.00-23.00	16
5 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
6 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
6 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
6 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
6 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
6 เมษายน 2569	04.00-05.00	18
6 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
6 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
6 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
6 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
6 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
4 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
4 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
4 เมษายน 2569	12.00-13.00	37
4 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
4 เมษายน 2569	14.00-15.00	16
4 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
4 เมษายน 2569	16.00-17.00	21
4 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
4 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
4 เมษายน 2569	19.00-20.00	18
4 เมษายน 2569	20.00-21.00	13
4 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
4 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
4 เมษายน 2569	23.00-00.00	20
5 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
5 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
5 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
5 เมษายน 2569	03.00-04.00	14
5 เมษายน 2569	04.00-05.00	19
5 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
5 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
5 เมษายน 2569	07.00-08.00	20
5 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
5 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
7 เมษายน 2569	10.00-11.00	22
7 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
7 เมษายน 2569	12.00-13.00	18
7 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
7 เมษายน 2569	14.00-15.00	23
7 เมษายน 2569	15.00-16.00	20
7 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
7 เมษายน 2569	17.00-18.00	19
7 เมษายน 2569	18.00-19.00	23
7 เมษายน 2569	19.00-20.00	21
7 เมษายน 2569	20.00-21.00	19
7 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
7 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
7 เมษายน 2569	23.00-00.00	18
8 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
8 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
8 เมษายน 2569	02.00-03.00	16
8 เมษายน 2569	03.00-04.00	15
8 เมษายน 2569	04.00-05.00	14
8 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
8 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
8 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
8 เมษายน 2569	08.00-09.00	19
8 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
6 เมษายน 2569	10.00-11.00	18
6 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
6 เมษายน 2569	12.00-13.00	20
6 เมษายน 2569	13.00-14.00	19
6 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
6 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
6 เมษายน 2569	16.00-17.00	20
6 เมษายน 2569	17.00-18.00	22
6 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
6 เมษายน 2569	19.00-20.00	18
6 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
6 เมษายน 2569	21.00-22.00	16
6 เมษายน 2569	22.00-23.00	16
6 เมษายน 2569	23.00-00.00	14
7 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
7 เมษายน 2569	01.00-02.00	16
7 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
7 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
7 เมษายน 2569	04.00-05.00	20
7 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
7 เมษายน 2569	06.00-07.00	16
7 เมษายน 2569	07.00-08.00	18
7 เมษายน 2569	08.00-09.00	18
7 เมษายน 2569	09.00-10.00	15

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
8 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
8 เมษายน 2569	11.00-12.00	20
8 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
8 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
8 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
8 เมษายน 2569	15.00-16.00	20
8 เมษายน 2569	16.00-17.00	23
8 เมษายน 2569	17.00-18.00	19
8 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
8 เมษายน 2569	19.00-20.00	18
8 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
8 เมษายน 2569	21.00-22.00	16
8 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
8 เมษายน 2569	23.00-00.00	20
9 เมษายน 2569	00.00-01.00	24
9 เมษายน 2569	01.00-02.00	22
9 เมษายน 2569	02.00-03.00	16
9 เมษายน 2569	03.00-04.00	18
9 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
9 เมษายน 2569	05.00-06.00	18
9 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
9 เมษายน 2569	07.00-08.00	18
9 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
9 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
9 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
9 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
9 เมษายน 2569	12.00-13.00	18
9 เมษายน 2569	13.00-14.00	16
9 เมษายน 2569	14.00-15.00	16
9 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
9 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
9 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
9 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
9 เมษายน 2569	19.00-20.00	16
9 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
9 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
9 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
9 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
10 เมษายน 2569	00.00-01.00	18
10 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
10 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
10 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
10 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
10 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
10 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
10 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
10 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
10 เมษายน 2569	09.00-10.00	16

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
11 เมษายน 2569	10.00-11.00	18
11 เมษายน 2569	11.00-12.00	18
11 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
11 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
11 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
11 เมษายน 2569	15.00-16.00	18
11 เมษายน 2569	16.00-17.00	16
11 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
11 เมษายน 2569	18.00-19.00	18
11 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
11 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
11 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
11 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
11 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
12 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
12 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
12 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
12 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
12 เมษายน 2569	04.00-05.00	18
12 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
12 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
12 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
12 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
12 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
10 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
10 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
10 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
10 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
10 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
10 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
10 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
10 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
10 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
10 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
10 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
10 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
10 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
10 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
11 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
11 เมษายน 2569	01.00-02.00	18
11 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
11 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
11 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
11 เมษายน 2569	05.00-06.00	18
11 เมษายน 2569	06.00-07.00	18
11 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
11 เมษายน 2569	08.00-09.00	18
11 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
13 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
13 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
13 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
13 เมษายน 2569	13.00-14.00	18
13 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
13 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
13 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
13 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
13 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
13 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
13 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
13 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
13 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
13 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
14 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
14 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
14 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
14 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
14 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
14 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
14 เมษายน 2569	06.00-07.00	16
14 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
14 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
14 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
12 เมษายน 2569	10.00-11.00	16
12 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
12 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
12 เมษายน 2569	13.00-14.00	16
12 เมษายน 2569	14.00-15.00	16
12 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
12 เมษายน 2569	16.00-17.00	18
12 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
12 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
12 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
12 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
12 เมษายน 2569	21.00-22.00	15
12 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
12 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
13 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
13 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
13 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
13 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
13 เมษายน 2569	04.00-05.00	18
13 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
13 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
13 เมษายน 2569	07.00-08.00	16
13 เมษายน 2569	08.00-09.00	18
13 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
14 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
14 เมษายน 2569	11.00-12.00	18
14 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
14 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
14 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
14 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
14 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
14 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
14 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
14 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
14 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
14 เมษายน 2569	21.00-22.00	16
14 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
14 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
15 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
15 เมษายน 2569	01.00-02.00	18
15 เมษายน 2569	02.00-03.00	16
15 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
15 เมษายน 2569	04.00-05.00	16
15 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
15 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
15 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
15 เมษายน 2569	08.00-09.00	18
15 เมษายน 2569	09.00-10.00	18

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
15 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
15 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
15 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
15 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
15 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
15 เมษายน 2569	15.00-16.00	18
15 เมษายน 2569	16.00-17.00	16
15 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
15 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
15 เมษายน 2569	19.00-20.00	18
15 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
15 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
15 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
15 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
16 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
16 เมษายน 2569	01.00-02.00	18
16 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
16 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
16 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
16 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
16 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
16 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
16 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
16 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
17 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
17 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
17 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
17 เมษายน 2569	13.00-14.00	19
17 เมษายน 2569	14.00-15.00	21
17 เมษายน 2569	15.00-16.00	22
17 เมษายน 2569	16.00-17.00	19
17 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
17 เมษายน 2569	18.00-19.00	16
17 เมษายน 2569	19.00-20.00	18
17 เมษายน 2569	20.00-21.00	20
17 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
17 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
17 เมษายน 2569	23.00-00.00	18
18 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
18 เมษายน 2569	01.00-02.00	13
18 เมษายน 2569	02.00-03.00	18
18 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
18 เมษายน 2569	04.00-05.00	18
18 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
18 เมษายน 2569	06.00-07.00	20
18 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
18 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
18 เมษายน 2569	09.00-10.00	*

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
16 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
16 เมษายน 2569	11.00-12.00	16
16 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
16 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
16 เมษายน 2569	14.00-15.00	18
16 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
16 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
16 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
16 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
16 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
16 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
16 เมษายน 2569	21.00-22.00	17
16 เมษายน 2569	22.00-23.00	18
16 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
17 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
17 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
17 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
17 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
17 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
17 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
17 เมษายน 2569	06.00-07.00	18
17 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
17 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
17 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
20 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
20 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
20 เมษายน 2569	12.00-13.00	16
20 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
20 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
20 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
20 เมษายน 2569	16.00-17.00	17
20 เมษายน 2569	17.00-18.00	17
20 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
20 เมษายน 2569	19.00-20.00	17
20 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
20 เมษายน 2569	21.00-22.00	18
20 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
20 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
21 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
21 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
21 เมษายน 2569	02.00-03.00	16
21 เมษายน 2569	03.00-04.00	16
21 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
21 เมษายน 2569	05.00-06.00	17
21 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
21 เมษายน 2569	07.00-08.00	17
21 เมษายน 2569	08.00-09.00	17
21 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
19 เมษายน 2569	10.00-11.00	*
19 เมษายน 2569	11.00-12.00	*
19 เมษายน 2569	12.00-13.00	*
19 เมษายน 2569	13.00-14.00	*
19 เมษายน 2569	14.00-15.00	*
19 เมษายน 2569	15.00-16.00	*
19 เมษายน 2569	16.00-17.00	*
19 เมษายน 2569	17.00-18.00	*
19 เมษายน 2569	18.00-19.00	*
19 เมษายน 2569	19.00-20.00	*
19 เมษายน 2569	20.00-21.00	*
19 เมษายน 2569	21.00-22.00	*
19 เมษายน 2569	22.00-23.00	*
19 เมษายน 2569	23.00-00.00	*
20 เมษายน 2569	00.00-01.00	*
20 เมษายน 2569	01.00-02.00	*
20 เมษายน 2569	02.00-03.00	*
20 เมษายน 2569	03.00-04.00	*
20 เมษายน 2569	04.00-05.00	*
20 เมษายน 2569	05.00-06.00	*
20 เมษายน 2569	06.00-07.00	*
20 เมษายน 2569	07.00-08.00	*
20 เมษายน 2569	08.00-09.00	*
20 เมษายน 2569	09.00-10.00	17

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
22 เมษายน 2569	10.00-11.00	15
22 เมษายน 2569	11.00-12.00	*
22 เมษายน 2569	12.00-13.00	*
22 เมษายน 2569	13.00-14.00	*
22 เมษายน 2569	14.00-15.00	*
22 เมษายน 2569	15.00-16.00	*
22 เมษายน 2569	16.00-17.00	*
22 เมษายน 2569	17.00-18.00	*
22 เมษายน 2569	18.00-19.00	*
22 เมษายน 2569	19.00-20.00	*
22 เมษายน 2569	20.00-21.00	*
22 เมษายน 2569	21.00-22.00	*
22 เมษายน 2569	22.00-23.00	*
22 เมษายน 2569	23.00-00.00	*
23 เมษายน 2569	00.00-01.00	*
23 เมษายน 2569	01.00-02.00	*
23 เมษายน 2569	02.00-03.00	*
23 เมษายน 2569	03.00-04.00	*
23 เมษายน 2569	04.00-05.00	*
23 เมษายน 2569	05.00-06.00	*
23 เมษายน 2569	06.00-07.00	*
23 เมษายน 2569	07.00-08.00	*
23 เมษายน 2569	08.00-09.00	*
23 เมษายน 2569	09.00-10.00	*
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากจุดตั้งเครื่อง Realtime ทางโครงการมีการต่อเติม จึงทำการถอดปลั๊กเครื่องออก

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
21 เมษายน 2569	10.00-11.00	17
21 เมษายน 2569	11.00-12.00	17
21 เมษายน 2569	12.00-13.00	17
21 เมษายน 2569	13.00-14.00	17
21 เมษายน 2569	14.00-15.00	17
21 เมษายน 2569	15.00-16.00	17
21 เมษายน 2569	16.00-17.00	16
21 เมษายน 2569	17.00-18.00	16
21 เมษายน 2569	18.00-19.00	17
21 เมษายน 2569	19.00-20.00	18
21 เมษายน 2569	20.00-21.00	17
21 เมษายน 2569	21.00-22.00	18
21 เมษายน 2569	22.00-23.00	17
21 เมษายน 2569	23.00-00.00	17
22 เมษายน 2569	00.00-01.00	17
22 เมษายน 2569	01.00-02.00	17
22 เมษายน 2569	02.00-03.00	17
22 เมษายน 2569	03.00-04.00	17
22 เมษายน 2569	04.00-05.00	17
22 เมษายน 2569	05.00-06.00	18
22 เมษายน 2569	06.00-07.00	17
22 เมษายน 2569	07.00-08.00	18
22 เมษายน 2569	08.00-09.00	16
22 เมษายน 2569	09.00-10.00	16


ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

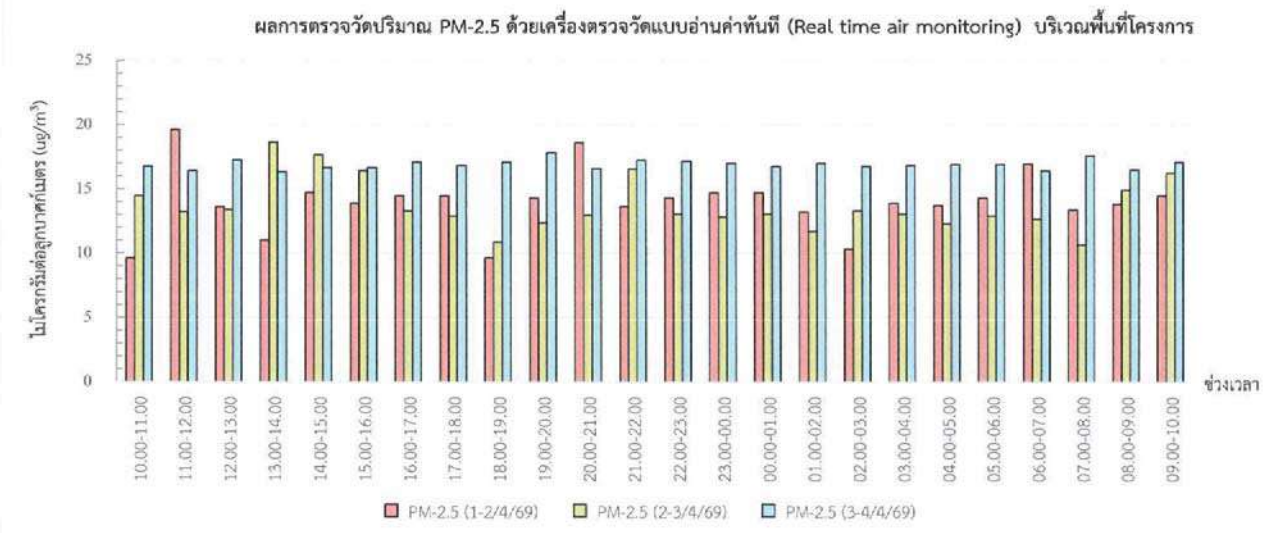

กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

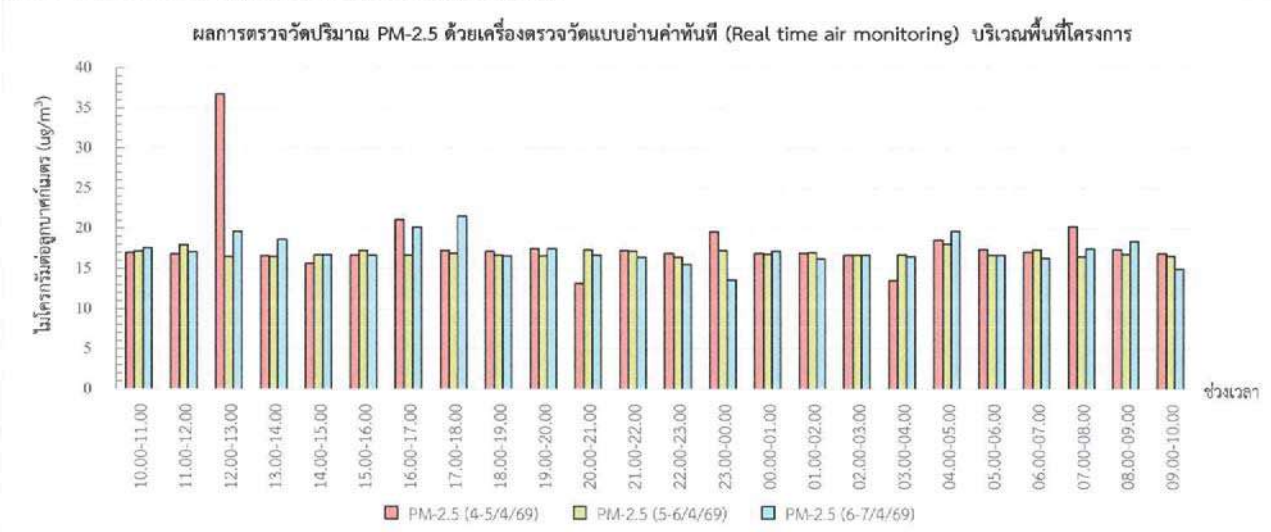

กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

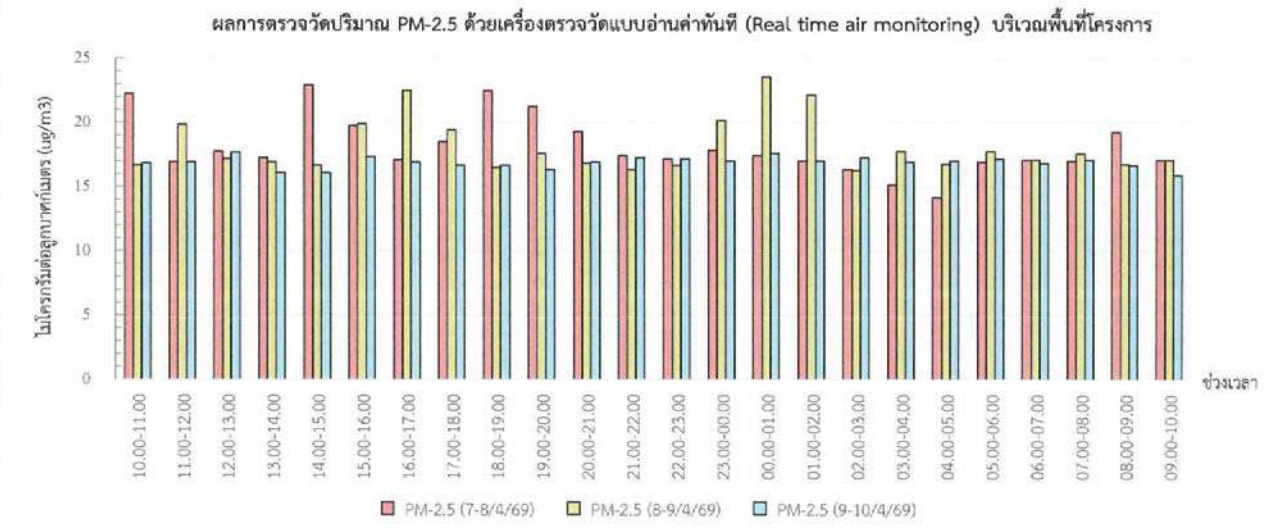

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท จี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลย้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

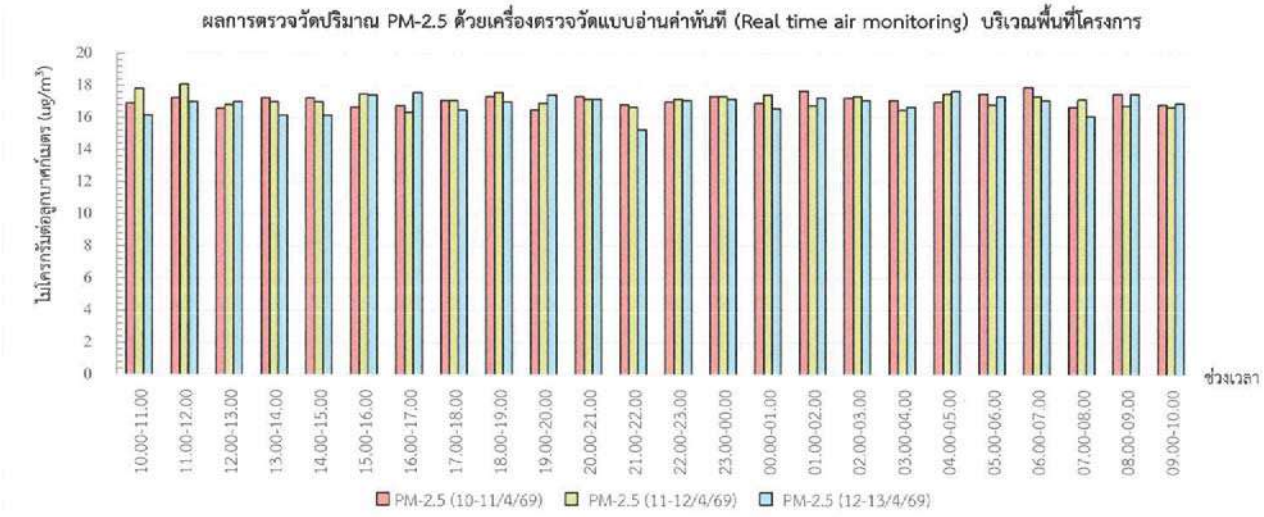

กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท จี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลย้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

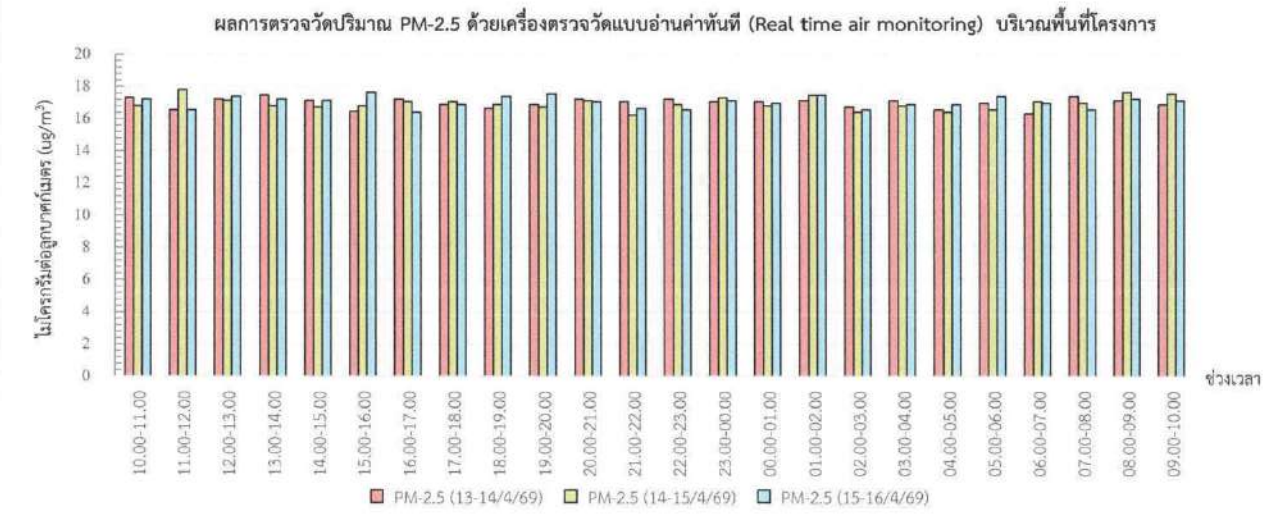

กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

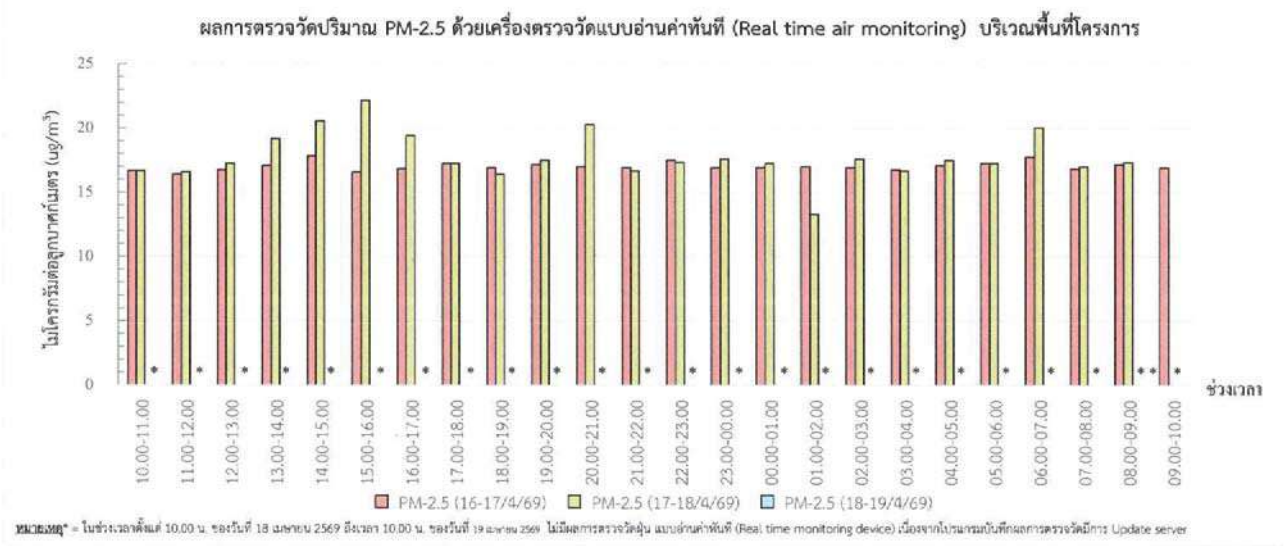


หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

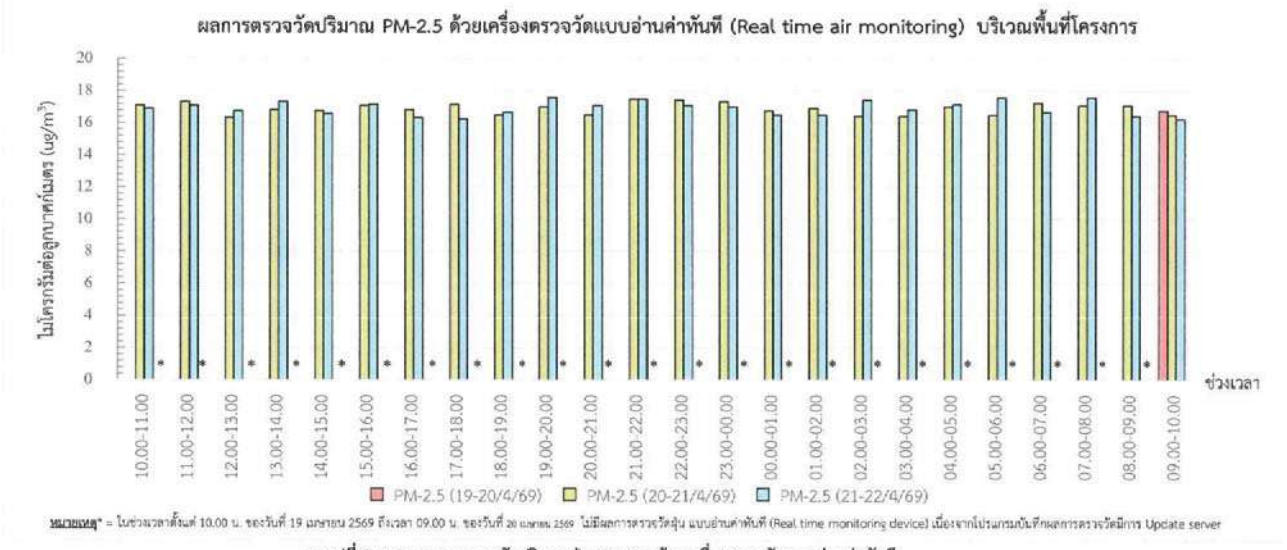

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2569 ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรมาพม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากจุดตั้งเครื่อง Realtime ทางโครงการมีการต่อเติม จึงทำการถอดปลั๊กเครื่องออก

กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 เมษายน 2569 – 1 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรมาพม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236 Serial No. 222186, ID No. NS-03-016
ปรับความถูกต้อง วันที่ 19 มีนาคม 2569, หมดอายุ วันที่ 18 มีนาคม 2570
Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590101, ID No. NS-04-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

โปรดดูหมายเหตุท้ายรายงานผลการทดสอบ

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820891, ID No. NS-12-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10-11 มีนาคม 2569, หมดอายุ วันที่ 9 มีนาคม 2570
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq, 24\ hrs.}$	$L_{A90, 24\ hrs.}$	$L_{Amax, 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
21-22 พฤษภาคม 2569	64	58	95
22-23 พฤษภาคม 2569	62	57	95
23-24 พฤษภาคม 2569	62	56	91
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
21-22 พฤษภาคม 2569	58	52	83
22-23 พฤษภาคม 2569	61	57	87
23-24 พฤษภาคม 2569	59	56	85
มาตรฐาน(*)	≤ 70	-	≤ 115
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ(*) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 23-24 พฤษภาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.43-10.43	62.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.43-06.43	60.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.43-06.43	55.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		58.8	-
ระดับการรบกวน	-	3.5	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 21-22 พฤษภาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.30-11.30	61.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	17.30-18.30	56.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	17.30-18.30	54.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	60.0	-
ระดับการรบกวน	-	5.8	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 21-22 พฤษภาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	14.43-15.43	66.9	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	17.43-18.43	62.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	17.43-18.43	59.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		65.1	-
ระดับการรบกวน	-	5.9	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 22-23 พฤษภาคม 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.43-11.43	68.0	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.43-19.43	63.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.43-19.43	60.1	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		65.9	-
ระดับการรบกวน	-	5.8	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	22-23 พฤษภาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	14.30-15.30	62.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	05.30-06.30	59.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	05.30-06.30	56.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	60.2	-
ระดับการรบกวน	-	4.0	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	23-24 พฤษภาคม 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	09.30-10.30	59.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	18.30-19.30	56.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	18.30-19.30	51.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.8	-
ระดับการรบกวน	-	5.4	≤ 10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565		

หมายเหตุ (*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 22-23 พฤษภาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.48	3.200	213	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
11.48	5.300	220	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
12.48	6.100	238	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
13.48	5.400	252	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
14.48	5.500	235	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
15.48	6.400	275	ตะวันตก (W)
16.48	5.600	303	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
17.48	5.200	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.48	4.100	302	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.48	1.900	298	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.48	1.400	250	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
21.48	1.400	250	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
22.48	1.900	314	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
23.48	1.500	244	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
00.48	1.600	317	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.48	2.600	351	เหนือ (N)
02.48	2.000	237	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
03.48	2.200	252	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
04.48	5.100	311	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
05.48	3.400	359	เหนือ (N)
06.48	2.600	13	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
07.48	3.200	354	เหนือ (N)
08.48	2.600	325	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.48	2.800	12	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.458	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 21-22 พฤษภาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.48	4.700	235	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
11.48	7.200	248	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
12.48	8.500	1	เหนือ (N)
13.48	4.700	0	เหนือ (N)
14.48	4.300	186	ใต้ (S)
15.48	3.200	186	ใต้ (S)
16.48	2.500	203	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
17.48	2.200	354	เหนือ (N)
18.48	2.000	353	เหนือ (N)
19.48	1.700	239	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
20.48	2.000	226	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
21.48	2.800	183	ใต้ (S)
22.48	6.400	186	ใต้ (S)
23.48	2.800	302	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.48	1.600	241	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
01.48	1.400	222	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
02.48	1.600	232	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
03.48	1.100	225	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
04.48	0.900	231	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
05.48	0.800	223	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
06.48	0.900	231	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
07.48	3.400	223	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
08.48	3.100	229	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
09.48	2.800	215	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.025	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 21-22 พฤษภาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
9.44	2.100	60	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
10.44	2.900	58	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
11.44	3.800	51	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
12.44	4.500	319	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
13.44	4.100	313	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
14.44	3.400	305	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
15.44	3.700	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
16.44	4.500	312	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
17.44	4.500	299	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.44	4.100	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.44	2.600	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.44	1.900	306	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
21.44	2.900	109	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
22.44	2.000	54	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
23.44	2.400	70	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
00.44	1.600	74	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
01.44	1.300	60	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
02.44	1.300	65	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
03.44	1.500	358	เหนือ (N)
04.44	1.800	33	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
05.44	1.000	57	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
06.44	1.300	61	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
07.44	2.000	100	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
08.44	1.700	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.621	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 23-24 พฤษภาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.48	2.300	291	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
11.48	2.600	305	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
12.48	3.300	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
13.48	5.000	331	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.48	4.900	291	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
15.48	4.100	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
16.48	5.100	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
17.48	3.600	339	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
18.48	2.300	44	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
19.48	1.100	211	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
20.48	0.900	207	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
21.48	1.600	311	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.48	2.300	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.48	1.600	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.48	1.500	312	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.48	1.200	273	ตะวันตก (W)
02.48	0.900	210	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.48	0.700	210	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
04.48	0.900	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
05.48	0.700	209	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
06.48	1.700	216	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
07.48	4.600	229	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
08.48	5.300	226	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
09.48	6.000	242	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.675	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 23-24 พฤษภาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
9.44	3.100	75	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
10.44	2.700	39	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
11.44	3.400	80	ตะวันออก (E)
12.44	2.600	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
13.44	3.400	2	เหนือ (N)
14.44	2.900	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
15.44	3.400	315	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
16.44	2.900	316	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
17.44	3.300	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
18.44	3.200	43	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
19.44	2.600	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
20.44	2.900	313	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
21.44	2.700	315	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.44	2.800	327	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.44	2.000	301	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.44	2.500	320	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.44	1.800	299	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
02.44	1.800	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.44	1.300	320	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
04.44	1.800	99	ตะวันออก (E)
05.44	1.800	22	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
06.44	1.700	38	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
07.44	3.400	45	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
08.44	2.800	62	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.617	

วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 22-23 พฤษภาคม 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
9.44	2.300	12	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
10.44	4.700	306	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
11.44	2.400	301	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
12.44	2.800	298	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
13.44	2.900	319	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
14.44	2.800	309	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
15.44	2.400	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
16.44	2.100	306	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
17.44	3.200	309	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
18.44	4.900	302	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.44	2.900	304	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.44	2.600	299	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
21.44	2.000	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
22.44	2.800	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.44	3.300	313	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
00.44	2.500	307	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.44	2.800	11	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
02.44	0.900	37	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
03.44	0.800	54	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
04.44	1.700	32	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
05.44	1.600	66	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
06.44	0.900	63	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
07.44	2.000	71	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
08.44	2.500	14	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.492	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569

เครื่องมือ :
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3272, ID No. AB-09-011
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3245, ID No. AB-10-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
PM 2.5-PM 10 Air sampler "BGI" Model. PQ-200, Serial No. 140AB25409410, ID No. AB-16-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 30 สิงหาคม 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011069, ID No. AB-03-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(µg /filter)	(µg /m³)	(µg /filter)	(µg /m³)	(µg /filter)	(µg /m³)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	21-22 พฤษภาคม 2569	78,700	44	60,200	37	270	11.7	2.22
2	22-23 พฤษภาคม 2569	51,500	29	40,500	25	260	11.3	2.06
3	23-24 พฤษภาคม 2569	47,200	27	35,800	22	170	7.4	2.19
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	21-22 พฤษภาคม 2569	55,400	31	45,900	28	-	-	2.25
2	22-23 พฤษภาคม 2569	47,400	27	37,900	23	-	-	2.18
3	23-24 พฤษภาคม 2569	38,400	22	28,900	18	-	-	2.09
มาตรฐาน[1]		-	≤ 200	-	≤ 100	-	≤ 37.5	-
LOQ[2]		10,000	5	3,000	1	100	4.3	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :
1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย PM-2.5 air sampler, FRM method
4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :
1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B
2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2]= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	22-23 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	1.26
		11.00-12.00	1.19
		12.00-13.00	1.17
		13.00-14.00	1.10
		14.00-15.00	1.18
		15.00-16.00	1.22
		16.00-17.00	1.26
		17.00-18.00	1.35
		18.00-19.00	1.39
		19.00-20.00	1.47
		20.00-21.00	1.48
		21.00-22.00	1.48
		22.00-23.00	1.48
		23.00-00.00	1.43
		00.00-01.00	1.34
		01.00-02.00	1.27
		02.00-03.00	1.34
		03.00-04.00	1.45
		04.00-05.00	1.27
		05.00-06.00	0.99
		06.00-07.00	0.86
		07.00-08.00	1.01
		08.00-09.00	0.84
		09.00-10.00	0.86
		Max (1 ชั่วโมง)	1.48
		Min (1 ชั่วโมง)	0.84
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.24
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	21-22 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	0.93
		11.00-12.00	0.90
		12.00-13.00	0.89
		13.00-14.00	0.93
		14.00-15.00	0.92
		15.00-16.00	1.12
		16.00-17.00	1.21
		17.00-18.00	1.39
		18.00-19.00	1.52
		19.00-20.00	1.56
		20.00-21.00	1.24
		21.00-22.00	1.50
		22.00-23.00	1.42
		23.00-00.00	1.44
		00.00-01.00	1.39
		01.00-02.00	1.34
		02.00-03.00	1.38
		03.00-04.00	1.28
		04.00-05.00	1.25
		05.00-06.00	1.24
		06.00-07.00	0.93
		07.00-08.00	1.14
		08.00-09.00	1.24
		09.00-10.00	1.28
		Max (1 ชั่วโมง)	1.56
		Min (1 ชั่วโมง)	0.89
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.23
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
4	21-22 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	1.12
		10.00-11.00	1.12
		11.00-12.00	1.14
		12.00-13.00	1.16
		13.00-14.00	1.15
		14.00-15.00	1.16
		15.00-16.00	1.17
		16.00-17.00	1.14
		17.00-18.00	1.15
		18.00-19.00	1.20
		19.00-20.00	1.18
		20.00-21.00	1.18
		21.00-22.00	1.20
		22.00-23.00	1.18
		23.00-00.00	1.13
		00.00-01.00	1.17
		01.00-02.00	1.04
		02.00-03.00	1.05
		03.00-04.00	1.17
		04.00-05.00	1.15
		05.00-06.00	1.15
		06.00-07.00	1.18
		07.00-08.00	1.15
		08.00-09.00	1.17
		Max (1 ชั่วโมง)	1.20
		Min (1 ชั่วโมง)	1.04
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.15
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
3	23-24 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	1.00
		11.00-12.00	1.17
		12.00-13.00	1.21
		13.00-14.00	1.32
		14.00-15.00	1.38
		15.00-16.00	1.45
		16.00-17.00	1.48
		17.00-18.00	1.49
		18.00-19.00	1.51
		19.00-20.00	1.52
		20.00-21.00	1.42
		21.00-22.00	1.23
		22.00-23.00	1.07
		23.00-00.00	1.08
		00.00-01.00	1.30
		01.00-02.00	1.45
		02.00-03.00	1.44
		03.00-04.00	1.58
		04.00-05.00	1.39
		05.00-06.00	1.15
		06.00-07.00	0.82
		07.00-08.00	1.36
		08.00-09.00	1.35
		09.00-10.00	1.39
		Max (1 ชั่วโมง)	1.58
		Min (1 ชั่วโมง)	0.82
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.31
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
6	23-24 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	1.15
		10.00-11.00	1.14
		11.00-12.00	1.17
		12.00-13.00	1.15
		13.00-14.00	1.15
		14.00-15.00	1.16
		15.00-16.00	1.13
		16.00-17.00	1.12
		17.00-18.00	1.09
		18.00-19.00	1.11
		19.00-20.00	1.11
		20.00-21.00	1.10
		21.00-22.00	1.11
		22.00-23.00	1.11
		23.00-00.00	1.10
		00.00-01.00	1.10
		01.00-02.00	1.07
		02.00-03.00	1.05
		03.00-04.00	1.04
		04.00-05.00	1.08
		05.00-06.00	1.09
		06.00-07.00	1.08
		07.00-08.00	1.06
		08.00-09.00	1.09
		Max (1 ชั่วโมง)	1.17
		Min (1 ชั่วโมง)	1.04
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.11
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
5	22-23 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	1.15
		10.00-11.00	1.09
		11.00-12.00	1.10
		12.00-13.00	0.92
		13.00-14.00	1.13
		14.00-15.00	1.15
		15.00-16.00	1.14
		16.00-17.00	1.15
		17.00-18.00	1.13
		18.00-19.00	1.14
		19.00-20.00	1.14
		20.00-21.00	1.13
		21.00-22.00	1.12
		22.00-23.00	1.10
		23.00-00.00	1.05
		00.00-01.00	1.08
		01.00-02.00	1.12
		02.00-03.00	1.12
		03.00-04.00	1.12
		04.00-05.00	1.13
		05.00-06.00	1.08
		06.00-07.00	1.10
		07.00-08.00	1.13
		08.00-09.00	1.13
		Max (1 ชั่วโมง)	1.15
		Min (1 ชั่วโมง)	0.92
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.11
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
1	21-22 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	3.98
		11.00-12.00	3.43
		12.00-13.00	3.62
		13.00-14.00	3.44
		14.00-15.00	3.40
		15.00-16.00	4.76
		16.00-17.00	3.22
		17.00-18.00	1.96
		18.00-19.00	1.76
		19.00-20.00	1.47
		20.00-21.00	2.75
		21.00-22.00	1.82
		22.00-23.00	1.61
		23.00-00.00	< 1.00
		00.00-01.00	< 1.00
		01.00-02.00	< 1.00
		02.00-03.00	2.35
		03.00-04.00	2.67
		04.00-05.00	1.74
		05.00-06.00	2.50
		06.00-07.00	2.84
		07.00-08.00	< 1.00
		08.00-09.00	1.71
		09.00-10.00	< 1.00
		Max (1 ชั่วโมง)	4.76
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.19
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-62201-334, ID No.AB-01-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
3	23-24 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	5.10
		11.00-12.00	4.72
		12.00-13.00	5.49
		13.00-14.00	2.37
		14.00-15.00	2.53
		15.00-16.00	2.20
		16.00-17.00	3.47
		17.00-18.00	2.25
		18.00-19.00	2.07
		19.00-20.00	1.38
		20.00-21.00	1.11
		21.00-22.00	2.15
		22.00-23.00	1.47
		23.00-00.00	1.53
		00.00-01.00	3.11
		01.00-02.00	4.48
		02.00-03.00	3.68
		03.00-04.00	1.29
		04.00-05.00	2.30
		05.00-06.00	2.17
		06.00-07.00	1.46
		07.00-08.00	1.72
		08.00-09.00	< 1.00
		09.00-10.00	1.20
		Max (1 ชั่วโมง)	5.49
		Min (1 ชั่วโมง)	< 1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
2	22-23 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	3.42
		11.00-12.00	4.11
		12.00-13.00	2.64
		13.00-14.00	4.65
		14.00-15.00	5.12
		15.00-16.00	5.30
		16.00-17.00	3.85
		17.00-18.00	3.94
		18.00-19.00	4.27
		19.00-20.00	4.51
		20.00-21.00	4.71
		21.00-22.00	5.18
		22.00-23.00	3.42
		23.00-00.00	3.26
		00.00-01.00	2.75
		01.00-02.00	3.59
		02.00-03.00	5.10
		03.00-04.00	5.06
		04.00-05.00	4.39
		05.00-06.00	5.10
		06.00-07.00	4.24
		07.00-08.00	5.49
		08.00-09.00	5.10
		09.00-10.00	5.42
		Max (1 ชั่วโมง)	5.49
		Min (1 ชั่วโมง)	2.64
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.36
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
4	21-22 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	2.45
		10.00-11.00	3.26
		11.00-12.00	7.23
		12.00-13.00	4.60
		13.00-14.00	5.65
		14.00-15.00	6.47
		15.00-16.00	5.15
		16.00-17.00	7.35
		17.00-18.00	4.46
		18.00-19.00	5.43
		19.00-20.00	7.59
		20.00-21.00	5.52
		21.00-22.00	6.73
		22.00-23.00	4.75
		23.00-00.00	5.67
		00.00-01.00	6.06
		01.00-02.00	6.45
		02.00-03.00	5.51
		03.00-04.00	3.75
		04.00-05.00	4.12
		05.00-06.00	5.09
		06.00-07.00	7.01
		07.00-08.00	5.57
		08.00-09.00	5.56
		Max (1 ชั่วโมง)	7.59
		Min (1 ชั่วโมง)	2.45
		Avg (24 ชั่วโมง)	5.47
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
5	22-23 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	5.72
		10.00-11.00	5.36
		11.00-12.00	5.90
		12.00-13.00	6.35
		13.00-14.00	6.42
		14.00-15.00	6.54
		15.00-16.00	6.70
		16.00-17.00	5.82
		17.00-18.00	5.57
		18.00-19.00	4.57
		19.00-20.00	4.90
		20.00-21.00	5.03
		21.00-22.00	5.56
		22.00-23.00	5.05
		23.00-00.00	4.95
		00.00-01.00	6.45
		01.00-02.00	5.94
		02.00-03.00	5.06
		03.00-04.00	4.55
		04.00-05.00	3.21
		05.00-06.00	4.66
		06.00-07.00	4.18
		07.00-08.00	8.47
		08.00-09.00	8.47
		Max (1 ชั่วโมง)	8.47
		Min (1 ชั่วโมง)	3.21
		Avg (24 ชั่วโมง)	5.64
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 59406-323, ID No.AB-02-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
6	23-24 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	5.27
		10.00-11.00	3.59
		11.00-12.00	4.98
		12.00-13.00	5.42
		13.00-14.00	6.31
		14.00-15.00	6.27
		15.00-16.00	6.56
		16.00-17.00	6.15
		17.00-18.00	4.38
		18.00-19.00	5.54
		19.00-20.00	6.73
		20.00-21.00	5.54
		21.00-22.00	6.00
		22.00-23.00	5.64
		23.00-00.00	5.04
		00.00-01.00	6.68
		01.00-02.00	6.48
		02.00-03.00	5.38
		03.00-04.00	6.49
		04.00-05.00	7.23
		05.00-06.00	5.06
		06.00-07.00	7.13
		07.00-08.00	4.43
		08.00-09.00	6.05
		Max (1 ชั่วโมง)	7.23
		Min (1 ชั่วโมง)	3.59
		Avg (24 ชั่วโมง)	5.76
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
2	22-23 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	< 0.40
		11.00-12.00	< 0.40
		12.00-13.00	< 0.40
		13.00-14.00	< 0.40
		14.00-15.00	< 0.40
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	< 0.40
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	< 0.40
		19.00-20.00	< 0.40
		20.00-21.00	< 0.40
		21.00-22.00	< 0.40
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	< 0.40
		00.00-01.00	< 0.40
		01.00-02.00	< 0.40
		02.00-03.00	< 0.40
		03.00-04.00	< 0.40
		04.00-05.00	< 0.40
		05.00-06.00	< 0.40
		06.00-07.00	< 0.40
		07.00-08.00	< 0.40
		08.00-09.00	< 0.40
		09.00-10.00	< 0.40
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.40
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
1	21-22 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	< 0.40
		11.00-12.00	< 0.40
		12.00-13.00	< 0.40
		13.00-14.00	< 0.40
		14.00-15.00	< 0.40
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	< 0.40
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	< 0.40
		19.00-20.00	< 0.40
		20.00-21.00	< 0.40
		21.00-22.00	< 0.40
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	< 0.40
		00.00-01.00	< 0.40
		01.00-02.00	0.54
		02.00-03.00	< 0.40
		03.00-04.00	< 0.40
		04.00-05.00	< 0.40
		05.00-06.00	< 0.40
		06.00-07.00	< 0.40
		07.00-08.00	< 0.40
		08.00-09.00	< 0.40
		09.00-10.00	< 0.40
		Max (1 ชั่วโมง)	0.54
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.40
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
4	21-22 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	1.74
		10.00-11.00	1.67
		11.00-12.00	1.89
		12.00-13.00	1.73
		13.00-14.00	1.50
		14.00-15.00	1.94
		15.00-16.00	1.79
		16.00-17.00	1.87
		17.00-18.00	1.81
		18.00-19.00	1.40
		19.00-20.00	1.87
		20.00-21.00	1.93
		21.00-22.00	1.93
		22.00-23.00	1.40
		23.00-00.00	1.93
		00.00-01.00	1.88
		01.00-02.00	1.81
		02.00-03.00	1.87
		03.00-04.00	1.43
		04.00-05.00	1.68
		05.00-06.00	1.84
		06.00-07.00	2.01
		07.00-08.00	1.48
		08.00-09.00	1.78
		Max (1 ชั่วโมง)	2.01
		Min (1 ชั่วโมง)	1.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.76
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
3	23-24 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	< 0.40
		11.00-12.00	< 0.40
		12.00-13.00	< 0.40
		13.00-14.00	< 0.40
		14.00-15.00	< 0.40
		15.00-16.00	< 0.40
		16.00-17.00	< 0.40
		17.00-18.00	< 0.40
		18.00-19.00	< 0.40
		19.00-20.00	< 0.40
		20.00-21.00	< 0.40
		21.00-22.00	< 0.40
		22.00-23.00	< 0.40
		23.00-00.00	< 0.40
		00.00-01.00	< 0.40
		01.00-02.00	< 0.40
		02.00-03.00	< 0.40
		03.00-04.00	< 0.40
		04.00-05.00	< 0.40
		05.00-06.00	< 0.40
		06.00-07.00	< 0.40
		07.00-08.00	< 0.40
		08.00-09.00	< 0.40
		09.00-10.00	< 0.40
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.40
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
6	23-24 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	1.84
		10.00-11.00	2.21
		11.00-12.00	1.35
		12.00-13.00	1.83
		13.00-14.00	1.86
		14.00-15.00	2.04
		15.00-16.00	1.57
		16.00-17.00	1.97
		17.00-18.00	1.91
		18.00-19.00	1.78
		19.00-20.00	1.48
		20.00-21.00	2.03
		21.00-22.00	2.03
		22.00-23.00	2.05
		23.00-00.00	1.61
		00.00-01.00	1.98
		01.00-02.00	1.91
		02.00-03.00	1.97
		03.00-04.00	2.12
		04.00-05.00	1.78
		05.00-06.00	1.94
		06.00-07.00	2.11
		07.00-08.00	2.07
		08.00-09.00	1.88
		Max (1 ชั่วโมง)	2.21
		Min (1 ชั่วโมง)	1.35
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.89
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
5	22-23 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	1.99
		10.00-11.00	1.77
		11.00-12.00	1.45
		12.00-13.00	1.83
		13.00-14.00	1.86
		14.00-15.00	2.04
		15.00-16.00	1.64
		16.00-17.00	1.97
		17.00-18.00	1.91
		18.00-19.00	1.42
		19.00-20.00	1.97
		20.00-21.00	2.03
		21.00-22.00	2.03
		22.00-23.00	2.05
		23.00-00.00	1.71
		00.00-01.00	1.98
		01.00-02.00	1.91
		02.00-03.00	1.97
		03.00-04.00	2.23
		04.00-05.00	1.78
		05.00-06.00	1.94
		06.00-07.00	2.11
		07.00-08.00	2.07
		08.00-09.00	1.88
		Max (1 ชั่วโมง)	2.23
		Min (1 ชั่วโมง)	1.42
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.89
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
21 พฤษภาคม 2569						
10.48	0.583	> 100.00	1.521	> 100.00	0.843	> 100.00
11.23	0.520	> 100.00	1.726	> 100.00	0.867	> 100.00
13.39	0.560	> 100.00	1.262	> 100.00	0.985	> 100.00
14.49	0.449	> 100.00	1.576	> 100.00	0.591	> 100.00
15.50	0.375	> 100.00	1.119	> 100.00	0.512	> 100.00
16.31	0.402	> 100.00	1.632	> 100.00	0.352	> 100.00
22 พฤษภาคม 2569						
08.52	0.386	84.12	1.836	7.21	0.441	> 100.00
09.12	0.276	42.68	0.654	34.13	0.211	> 100.00
10.43	0.268	45.27	0.733	> 100.00	0.265	> 100.00
11.19	0.274	43.27	1.190	51.20	0.205	52.41
13.54	0.262	14.57	0.998	56.69	0.168	36.57
14.35	0.426	10.24	1.143	84.75	0.331	> 100.00
15.29	0.324	> 100.00	1.301	> 100.00	0.189	> 100.00
16.44	0.300	21.33	0.497	1.99	0.307	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-24 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 30 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 29 กันยายน 2569
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1127-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 26 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 20 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
Oven "Memmert"Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1130-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
22 พฤษภาคม 2569						
08.06	0.252	46.55	0.591	4.13	0.197	> 100.00
09.36	0.370	> 100.00	1.277	42.67	0.244	> 100.00
10.47	0.292	1.95	0.678	> 100.00	0.236	> 100.00
11.37	0.363	47.62	0.631	> 100.00	0.394	> 100.00
13.29	0.213	27.18	0.857	85.33	0.185	> 100.00
14.10	0.266	23.52	0.695	64.00	0.166	> 100.00
15.31	0.410	1.93	1.040	> 100.00	0.418	> 100.00
16.43	0.229	5.68	0.544	73.14	0.134	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ [1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
[3]= วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

Kanya
(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattanaporn
(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายลัทธพล พิทักษ์ทีม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเหตุ (1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)
(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

Kanya
(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Rattanaporn
(นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสัทธพล พิทักษ์ทิม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-69-1127-01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 25 พฤษภาคม 2569	มาตรฐาน[3]
pH	-	-	-	8.2	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	-	5	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	12	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	5	180	228	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	4	20	< 20	≤ 40
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอน	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

Kanya

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	2 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ	:	3 มิถุนายน 2569	**วันที่ออกรายงาน**	:	20 มิถุนายน 2569
เครื่องมือ	:	Real time monitoring device No. AB-22-002			

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
4 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	11
4 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	16
4 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	15
4 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	19
4 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	27
4 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	20
4 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	19
4 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	16
4 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	23
4 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	20
4 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	15
4 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	12
4 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	11
4 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	12
5 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	12
5 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	14
5 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	15
5 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	17
5 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	15
5 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	17
5 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	10
5 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	11
5 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	11
5 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	14

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
3 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	(*)
3 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	(*)
4 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	13
4 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	15
4 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	11
4 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	14
4 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	15
4 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	11
4 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	11
4 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	14
4 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	13
4 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	11

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากทางโครงการถอดปลั๊กเครื่องตรวจวัดออก

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
6 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	12
6 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	10
6 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	13
6 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	13
6 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	12
6 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	12
6 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	12
6 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	17
6 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	13
6 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	11
6 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	10
6 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	12
6 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	12
6 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	14
7 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	13
7 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	15
7 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	14
7 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	11
7 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	12
7 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	12
7 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	12
7 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	11
7 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	15
7 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	16

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
5 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	14
5 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	12
5 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	12
5 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	18
5 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	17
5 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	17
5 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	16
5 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	18
5 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	13
5 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	18
5 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	10
5 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	13
5 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	15
5 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	16
6 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	13
6 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	11
6 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	14
6 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	11
6 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	14
6 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	17
6 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	17
6 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	13
6 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	15
6 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
8 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	15
8 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	13
8 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	14
8 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	13
8 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	14
8 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	12
8 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	18
8 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	17
8 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	12
8 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	14
8 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	12
8 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	10
8 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	10
8 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
9 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	13
9 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	13
9 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	13
9 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	13
9 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	12
9 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	13
9 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	16
9 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	21
9 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	16
9 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	13

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
7 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	16
7 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	18
7 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	15
7 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	10
7 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	11
7 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	13
7 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	13
7 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	14
7 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	11
7 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	10
7 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	13
7 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	16
7 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	19
7 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	14
8 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	11
8 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	11
8 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	11
8 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	14
8 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	13
8 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	15
8 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	10
8 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	13
8 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	14
8 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
10 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	12
10 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	10
10 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	11
10 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	11
10 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	12
10 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	15
10 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	12
10 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	10
10 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	9
10 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	13
10 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	14
10 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	13
10 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	14
10 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	12
11 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	13
11 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	11
11 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	11
11 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	13
11 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	11
11 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	13
11 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	14
11 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	14
11 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	12
11 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	12

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
9 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	12
9 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	13
9 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	12
9 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	12
9 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	15
9 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	18
9 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	14
9 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	16
9 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	16
9 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	12
9 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	12
9 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	10
9 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	9
9 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	10
10 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	11
10 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	10
10 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	11
10 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	13
10 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	10
10 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	10
10 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	16
10 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	12
10 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	10
10 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	11

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
12 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	13
12 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	14
12 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	15
12 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	16
12 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	24
12 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	22
12 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	22
12 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	27
12 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	14
12 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	14
12 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	15
12 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	16
12 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	12
12 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	12
13 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	12
13 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	13
13 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	12
13 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	11
13 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	12
13 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	10
13 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	10
13 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	12
13 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	13
13 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	12

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
11 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	13
11 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	15
11 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	12
11 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	14
11 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	17
11 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	18
11 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	21
11 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	15
11 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	10
11 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	11
11 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	14
11 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	14
11 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	13
11 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
12 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	12
12 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	13
12 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	16
12 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	16
12 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	16
12 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	14
12 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	13
12 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	13
12 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	13
12 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	15

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
14 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	23
14 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	17
14 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	15
14 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	20
14 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	16
14 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	33
14 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	32
14 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	27
14 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	19
14 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	10
14 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	12
14 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	14
14 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	13
14 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	15
15 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	15
15 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	10
15 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	12
15 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	14
15 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	14
15 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	18
15 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	20
15 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	20
15 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	40
15 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	35

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
13 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	13
13 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	16
13 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	15
13 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	15
13 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	15
13 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	19
13 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	21
13 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	17
13 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	23
13 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	39
13 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	34
13 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	12
13 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	14
13 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	15
14 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	14
14 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	15
14 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	12
14 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	10
14 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	10
14 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	10
14 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	10
14 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	12
14 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	23
14 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	27

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
16 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	17
16 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	19
16 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	14
16 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	15
16 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	22
16 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	15
16 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	11
16 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	16
16 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	20
16 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	18
16 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	8
16 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	14
16 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	13
16 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
17 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	13
17 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	14
17 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	15
17 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	13
17 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	12
17 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	13
17 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	11
17 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	12
17 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	10
17 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	9

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
15 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	36
15 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	29
15 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	21
15 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	20
15 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	23
15 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	19
15 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	13
15 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	14
15 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	16
15 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	12
15 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	11
15 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	12
15 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	9
15 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	8
16 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	9
16 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	11
16 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	12
16 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	12
16 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	11
16 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	12
16 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	14
16 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	15
16 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	18
16 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	20

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
18 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	24
18 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	22
18 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	19
18 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	24
18 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	29
18 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	28
18 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	30
18 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	24
18 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	14
18 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	14
18 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	16
18 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	17
18 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	16
18 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	17
19 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	15
19 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	18
19 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	15
19 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	16
19 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	21
19 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	27
19 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	19
19 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	15
19 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	19
19 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	25

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
17 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	12
17 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	12
17 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	10
17 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	12
17 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	12
17 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	12
17 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	14
17 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	16
17 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	9
17 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	10
17 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	11
17 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	14
17 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	14
17 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	15
18 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	14
18 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	15
18 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	15
18 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	15
18 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	16
18 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	17
18 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	17
18 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	18
18 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	21
18 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	24

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
19 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	30
19 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	34
19 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	28
19 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	26
19 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	26
19 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	23
19 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	20
19 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	19
19 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	14
19 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	13
19 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	15
19 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	18
19 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	16
19 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	24
20 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	20
20 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	20
20 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	20
20 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	17
20 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	16
20 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	16
20 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	20
20 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	25
20 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	16
20 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	16

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
20 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	16
20 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	19
20 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	17
20 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	20
20 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	20
20 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	24
20 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	25
20 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	25
20 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	22
20 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	13
20 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	14
20 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	14
20 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	14
20 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
21 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	14
21 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	24
21 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	30
21 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	31
21 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	35
21 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	13
21 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	23
21 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	17
21 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	24
21 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
22 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	38
22 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	34
22 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	30
22 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	25
22 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	13
22 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	28
22 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	31
22 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	28
22 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	21
22 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	21
22 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	19
22 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	16
22 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	14
23 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
23 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	16
23 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	13
23 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	12
23 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	9
23 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	12
23 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	16
23 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	14
23 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	16
23 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	21
23 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	(*)

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
21 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	27
21 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	36
21 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	32
21 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	32
21 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	37
21 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	35
21 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	32
21 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	30
21 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	30
21 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	25
21 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	15
21 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	11
21 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	14
21 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	14
22 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	20
22 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	18
22 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	17
22 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	19
22 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	16
22 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	27
22 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	33
22 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	30
22 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	26
22 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	34

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
24 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	10
24 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	11
24 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	11
24 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	12
24 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	10
24 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	10
24 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	15
24 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	14
24 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	10
24 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	10
24 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	14
24 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	15
24 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	16
25 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	10
25 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	11
25 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	10
25 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	10
25 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	11
25 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	13
25 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	14
25 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	12
25 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	16
25 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	14
25 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
23 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	(*)
23 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	(*)
24 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	19
24 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	16
24 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	20
24 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	16

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
26 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	36
26 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	30
26 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	34
26 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	32
26 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	30
26 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	37
26 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	27
26 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	19
26 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	20
26 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	15
26 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	33
26 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	30
26 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	27
27 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	22
27 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	26
27 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	26
27 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	14
27 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	19
27 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	24
27 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	34
27 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	28
27 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	41
27 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	46
27 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	44

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
25 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	11
25 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	9
25 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	7
25 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	9
25 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	11
25 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	14
25 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	11
25 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	13
25 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	16
25 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	17
25 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	25
25 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	12
25 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	16
26 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
26 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	17
26 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	10
26 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	14
26 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	11
26 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	10
26 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	10
26 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	13
26 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	13
26 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	13
26 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	25

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
28 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	13
28 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	11
28 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	13
28 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	11
28 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	15
28 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	17
28 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	18
28 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	14
28 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	10
28 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	9
28 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	10
28 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	11
28 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	13
29 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
29 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	15
29 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	18
29 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	15
29 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	10
29 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	10
29 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	14
29 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	14
29 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	10
29 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	16
29 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	20

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
27 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	26
27 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	20
27 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	18
27 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	19
27 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	16
27 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	12
27 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	14
27 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	10
27 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	12
27 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	14
27 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	15
27 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	10
27 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	14
28 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	11
28 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	10
28 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	13
28 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	12
28 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	26
28 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	18
28 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	24
28 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	20
28 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	32
28 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	26
28 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	17

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
30 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	13
30 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	14
30 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	21
30 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	15
30 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	12
30 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	27
30 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	17
30 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	(*)
30 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	(*)
30 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	(*)
30 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	(*)
30 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	(*)
30 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	(*)

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
29 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	14
29 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	14
29 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	16
29 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	(*)
29 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	17
29 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	15
30 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	13
30 พฤษภาคม 2569	00.00-01.00	10
30 พฤษภาคม 2569	01.00-02.00	17
30 พฤษภาคม 2569	02.00-03.00	18
30 พฤษภาคม 2569	03.00-04.00	18
30 พฤษภาคม 2569	04.00-05.00	17
30 พฤษภาคม 2569	05.00-06.00	18
30 พฤษภาคม 2569	06.00-07.00	19
30 พฤษภาคม 2569	07.00-08.00	20
30 พฤษภาคม 2569	08.00-09.00	17
30 พฤษภาคม 2569	09.00-10.00	14

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00-21.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น PM-2.5 แบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)


วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
31 พฤษภาคม 2569	10.00-11.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	11.00-12.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	12.00-13.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	13.00-14.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	14.00-15.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	15.00-16.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	16.00-17.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	17.00-18.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	18.00-19.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	19.00-20.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	20.00-21.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	21.00-22.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	22.00-23.00	(*)
31 พฤษภาคม 2569	23.00-00.00	(*)
1 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	(*)
1 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	(*)
1 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	(*)
1 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	(*)
1 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	(*)
1 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	(*)
1 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	13
1 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	15
1 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	17
1 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	12
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

หมายเหตุ (*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

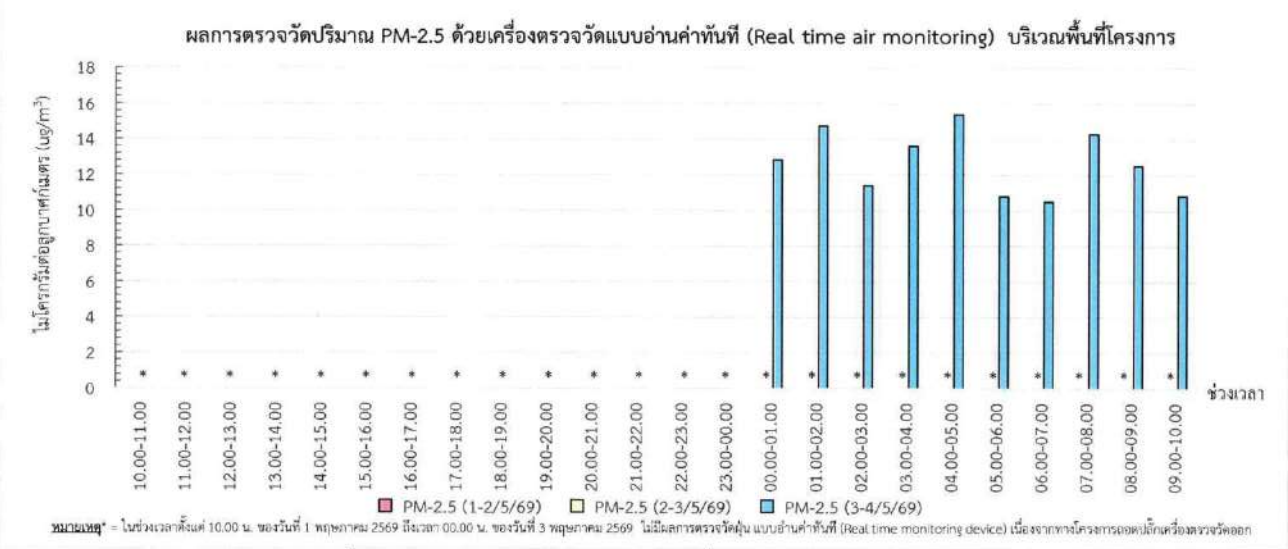


หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากทางโครงการถอดปลั๊กเครื่องตรวจวัดออก

กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

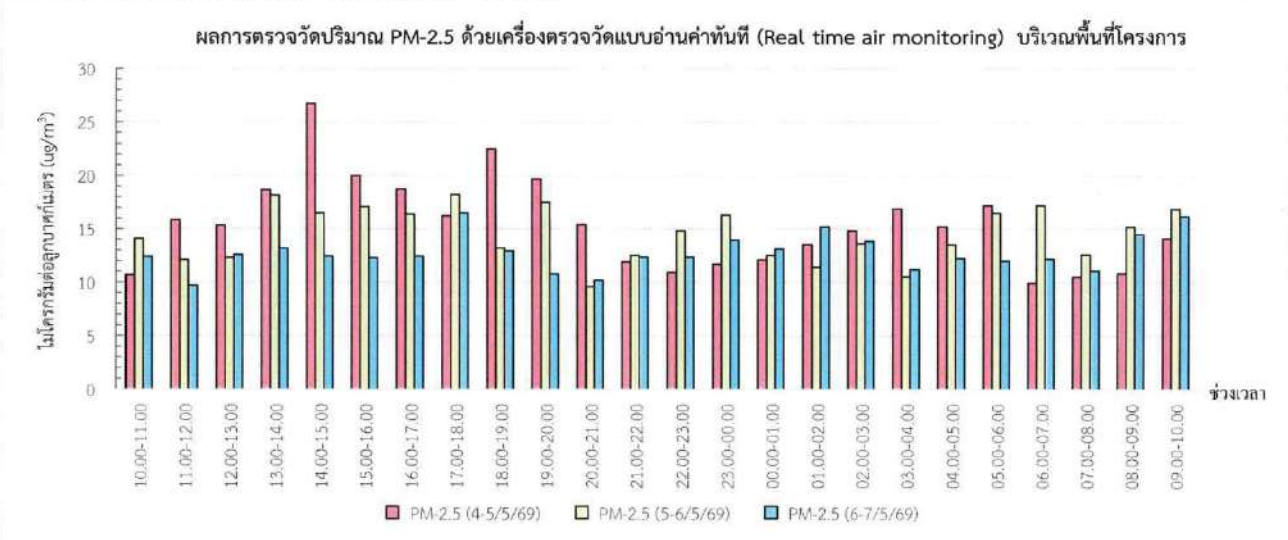

กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

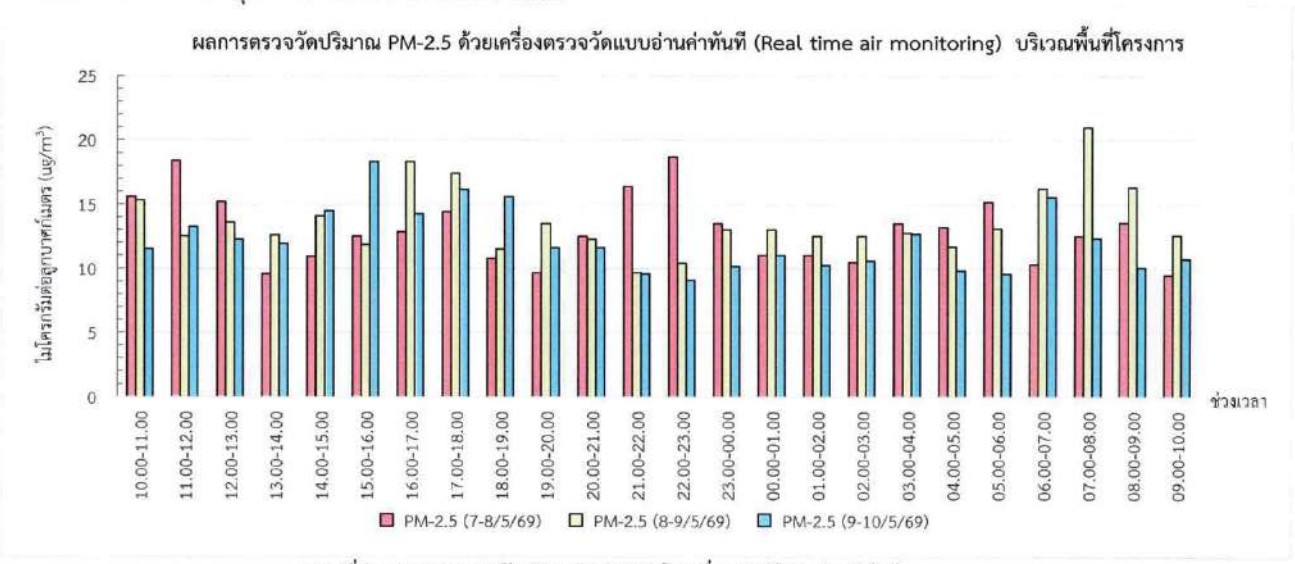

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

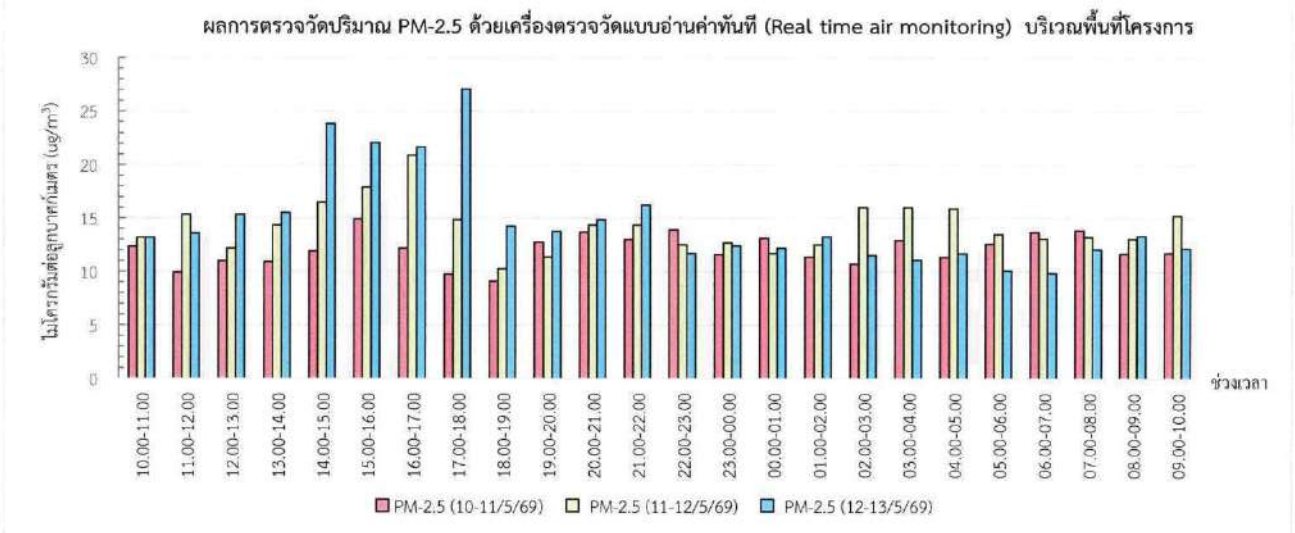

กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

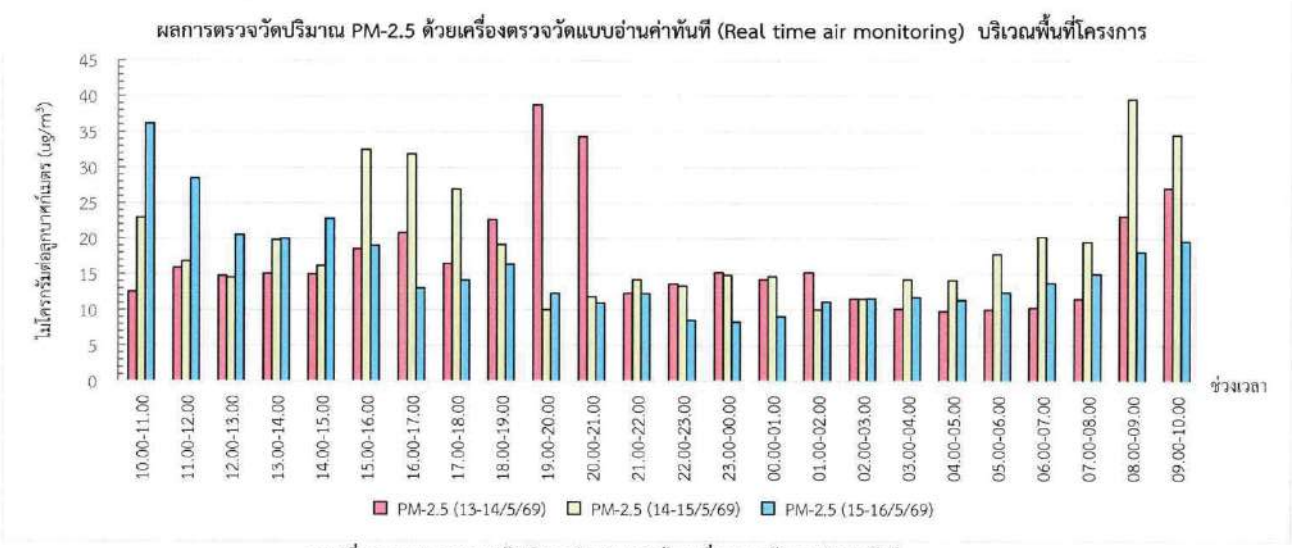

กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

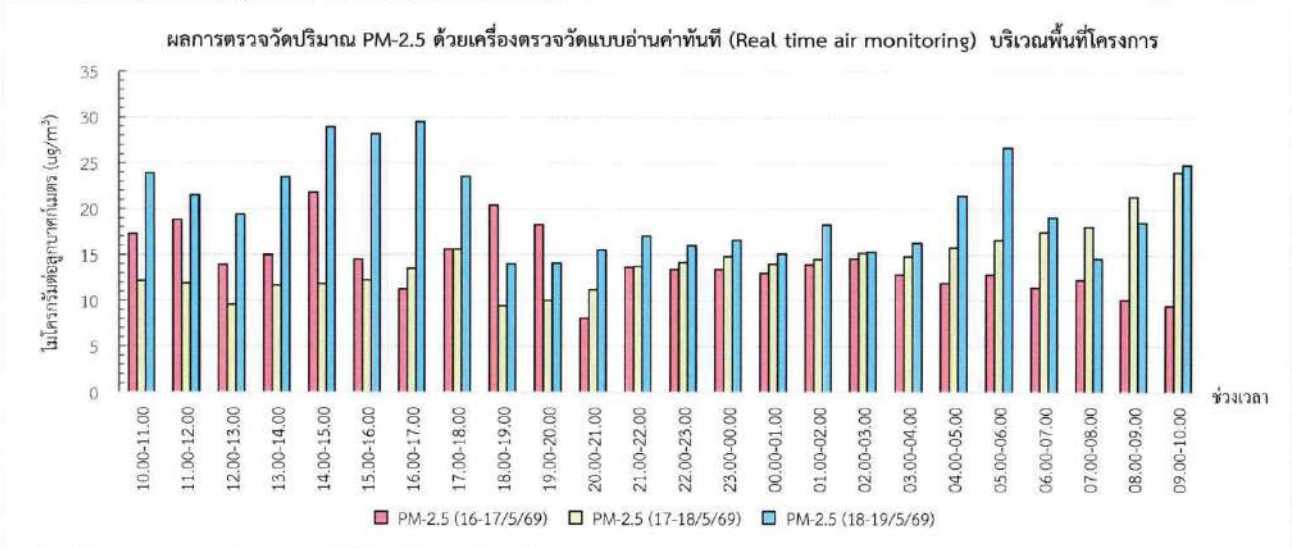

กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

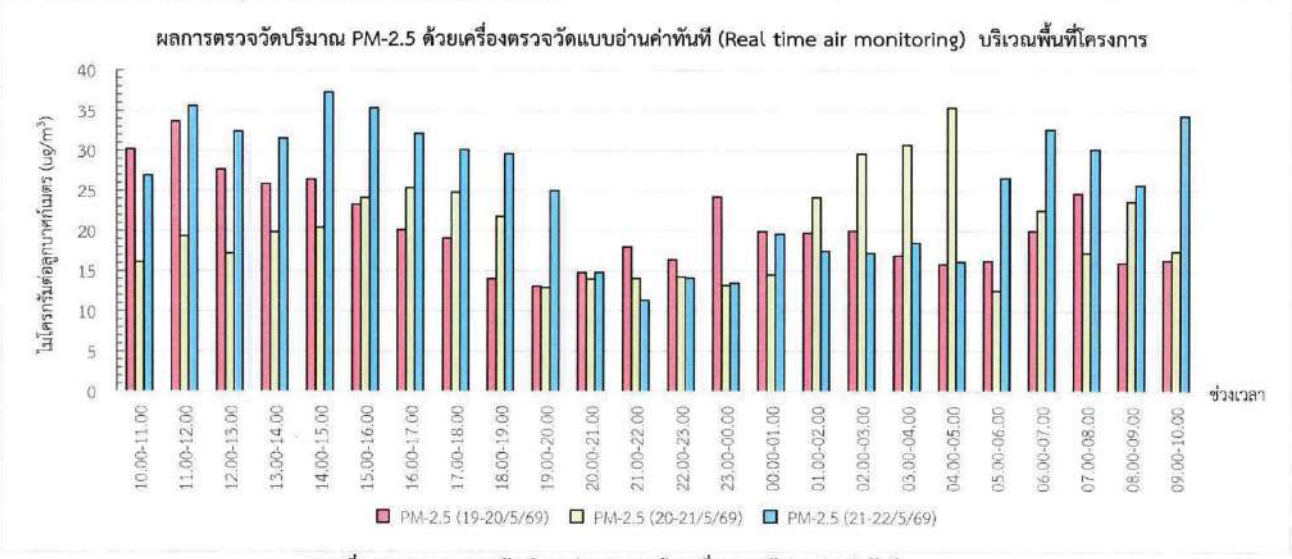

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

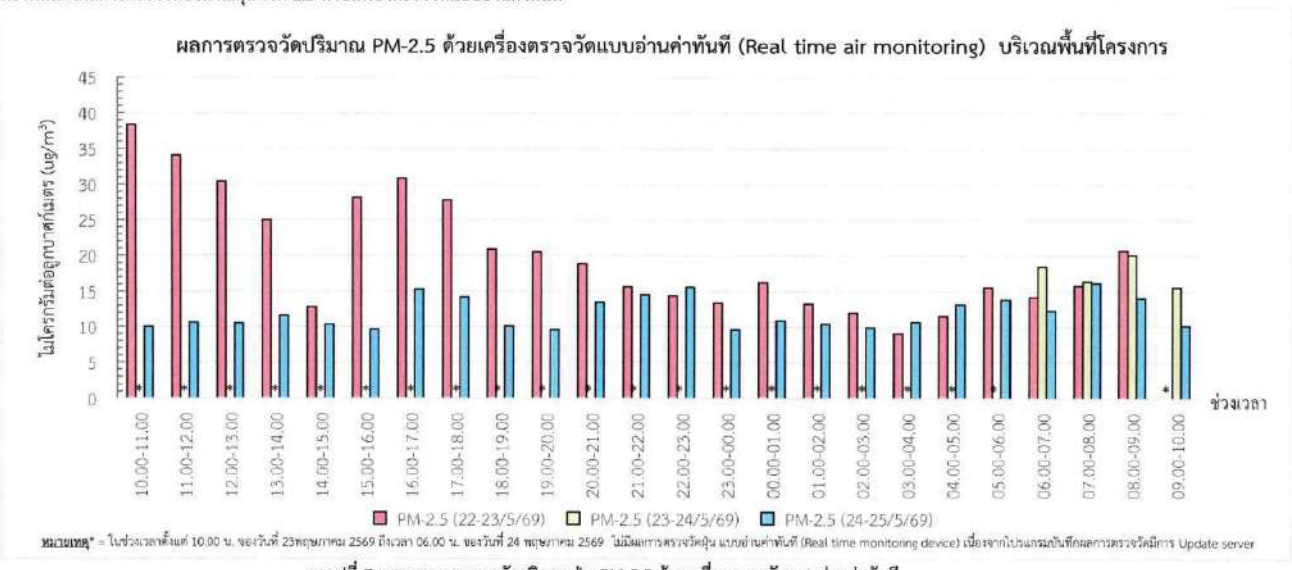


หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 23พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

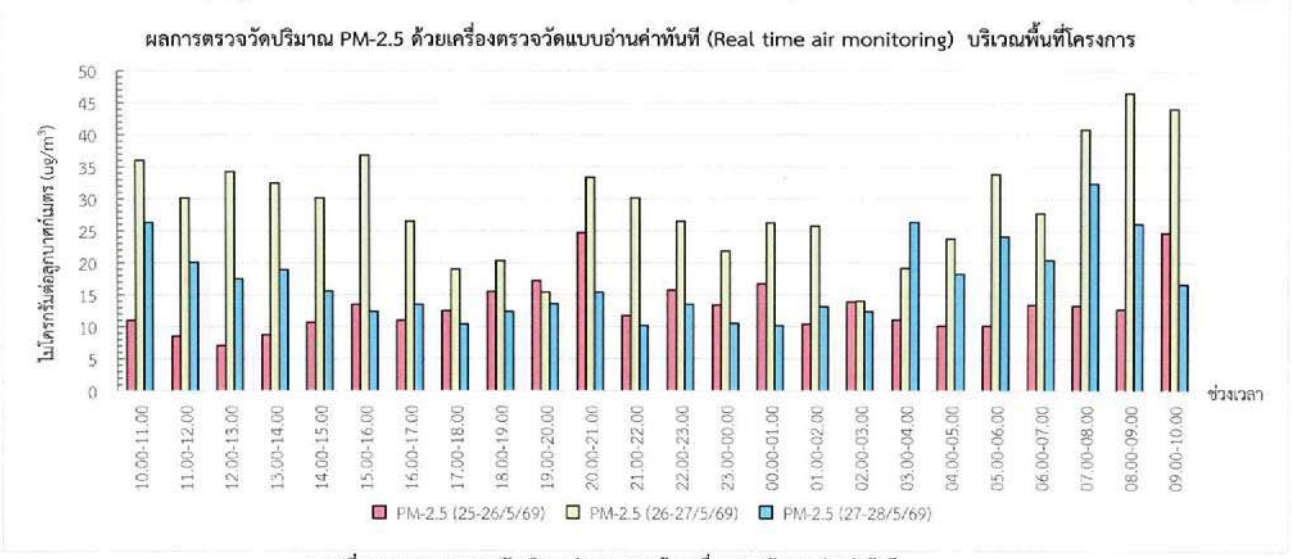

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

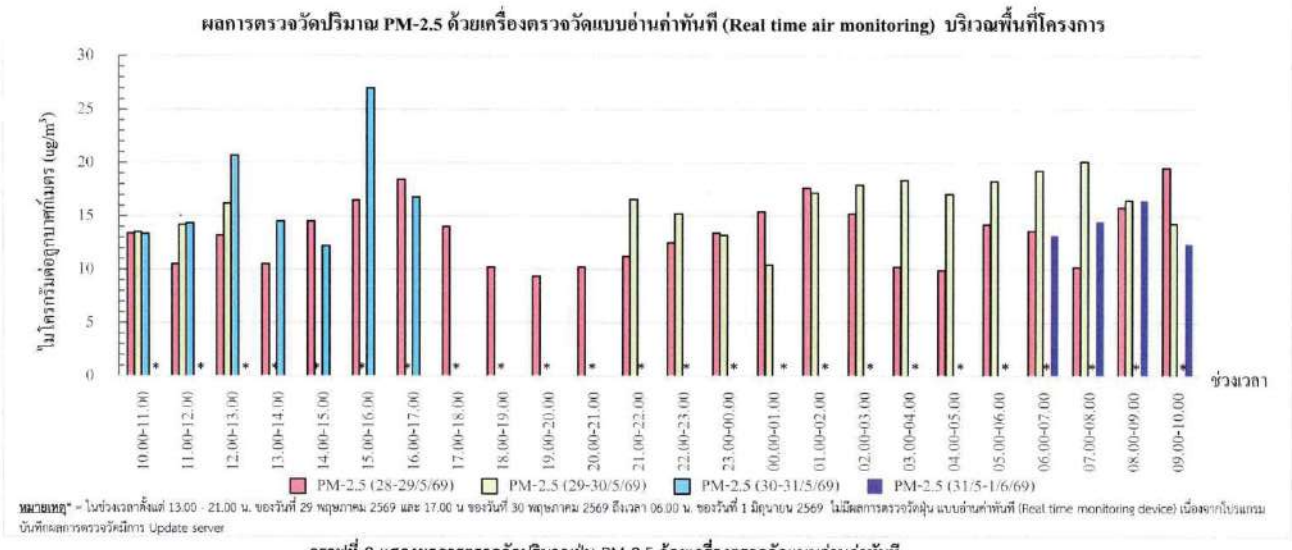

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 - 21.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 และ 17.00 น ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 – 1 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq,\ 24\ hrs.}$	$L_{A90,\ 24\ hrs.}$	$L_{Amax,\ 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายในรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
18-19 มิถุนายน 2569	63	59	88
19-20 มิถุนายน 2569	65	60	90
20-21 มิถุนายน 2569	63	57	86
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
18-19 มิถุนายน 2569	61	56	84
19-20 มิถุนายน 2569	58	53	86
20-21 มิถุนายน 2569	58	52	83
มาตรฐาน(*)	**≤ 70**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ(*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691286-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222185, ID No. NS-03-015
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20-21 เมษายน 2569, หมดอายุ วันที่ 19 เมษายน 2570
Sound level meter "ACO" Model 6236 Serial No. 222195, ID No. NS-03-025
ปรับความถูกต้อง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569, หมดอายุ วันที่ 4 พฤษภาคม 2570

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 18-19 มิถุนายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	15.11-16.11	64.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	18.11-19.11	60.2	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1\ hr.}$)	18.11-19.11	58.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		62.8	-
ระดับการรบกวน	-	4.5	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 19-20 มิถุนายน 2569		มาตรฐาน(*)
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	08.11-09.11	60.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1\ hr.}$)	05.11-06.11	57.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1\ hr.}$)	05.11-06.11	54.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		58.2	-
ระดับการรบกวน	-	3.6	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691286-01

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820892, ID No. NS-12-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10-11 มีนาคม 2569, หมดอายุ วันที่ 9 มีนาคม 2570
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	19-20 มิถุนายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.47-09.47	60.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	06.47-07.47	58.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	06.47-07.47	52.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.3	-
ระดับการรบกวน	-	3.7	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	20-21 มิถุนายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.47-11.47	60.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	17.47-18.47	56.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	17.47-18.47	53.9	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.7	-
ระดับการรบกวน	-	4.8	≤ 10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ (*)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน(*)
	20-21 มิถุนายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.11-11.11	65.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	06.11-07.11	61.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	06.11-07.11	57.5	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		63.7	-
ระดับการรบกวน	-	6.2	≤ 10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน(*)
	18-19 มิถุนายน 2569		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	13.47-14.47	66.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.47-06.47	61.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.47-06.47	59.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	64.9	-
ระดับการรบกวน	-	5.6	≤ 10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 มิถุนายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
9.11	2.800	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
10.11	4.800	346	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
11.11	4.100	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.11	3.900	355	เหนือ (N)
13.11	4.900	6	เหนือ (N)
14.11	4.900	351	เหนือ (N)
15.11	3.200	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
16.11	4.800	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
17.11	4.600	352	เหนือ (N)
18.11	4.000	349	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
19.11	4.000	354	เหนือ (N)
20.11	3.800	352	เหนือ (N)
21.11	2.500	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
22.11	1.800	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.11	2.000	331	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.11	1.800	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.11	2.000	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
02.11	1.900	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
03.11	2.000	324	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
04.11	1.600	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.11	1.100	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
06.11	1.600	353	เหนือ (N)
07.11	1.400	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.11	3.100	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.025	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691286-01

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 มิถุนายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
9.11	3.300	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
10.11	3.400	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
11.11	3.700	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.11	4.600	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
13.11	5.800	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.11	5.000	351	เหนือ (N)
15.11	4.500	353	เหนือ (N)
16.11	5.200	357	เหนือ (N)
17.11	4.400	350	เหนือ (N)
18.11	5.400	358	เหนือ (N)
19.11	4.700	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
20.11	4.700	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
21.11	3.000	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
22.11	2.200	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.11	2.300	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.11	1.400	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.11	2.400	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.11	4.900	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.11	2.800	328	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.11	2.500	334	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.11	2.200	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
06.11	1.300	334	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
07.11	1.500	349	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.11	2.600	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.492	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 มิถุนายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
9.11	3.700	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
10.11	3.900	339	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
11.11	4.400	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.11	3.600	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
13.11	4.100	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.11	3.900	353	เหนือ (N)
15.11	5.600	353	เหนือ (N)
16.11	6.000	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
17.11	1.200	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.11	1.000	298	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.11	1.300	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.11	1.000	316	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
21.11	1.000	316	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.11	4.300	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.11	1.600	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.11	1.800	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.11	1.800	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.11	3.500	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.11	2.900	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.11	2.500	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.11	2.400	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.11	3.600	349	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
07.11	2.200	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.11	2.500	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.908	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 มิถุนายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.47	2.700	358	เหนือ (N)
11.47	4.100	11	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
12.47	4.000	303	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
13.47	3.500	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
14.47	3.400	240	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
15.47	5.100	46	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
16.47	2.300	353	เหนือ (N)
17.47	3.000	32	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
18.47	2.400	19	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
19.47	1.100	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.47	1.400	283	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
21.47	1.100	276	ตะวันตก (W)
22.47	1.100	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
23.47	1.300	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.47	1.300	297	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
01.47	1.600	285	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
02.47	1.100	304	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
03.47	1.800	308	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
04.47	2.700	270	ตะวันตก (W)
05.47	1.300	271	ตะวันตก (W)
06.47	1.000	309	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
07.47	1.400	260	ตะวันตก (W)
08.47	2.800	297	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
09.47	2.700	311	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.258	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 มิถุนายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.47	3.000	354	เหนือ (N)
11.47	3.300	327	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.47	3.300	6	เหนือ (N)
13.47	5.000	41	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
14.47	5.600	238	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
15.47	4.700	204	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
16.47	2.400	240	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
17.47	2.400	282	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.47	1.300	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
19.47	0.900	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.47	1.300	264	ตะวันตก (W)
21.47	1.200	272	ตะวันตก (W)
22.47	1.300	292	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.47	1.100	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.47	1.200	263	ตะวันตก (W)
01.47	1.300	265	ตะวันตก (W)
02.47	0.900	274	ตะวันตก (W)
03.47	1.100	279	ตะวันตก (W)
04.47	1.000	324	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
05.47	0.300	310	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
06.47	0.700	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
07.47	1.500	285	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
08.47	2.600	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.47	2.400	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.075	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3272, ID No. AB-09-011
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3245, ID No. AB-10-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
PM 2.5-PM 10 Air sampler "BGI" Model. PQ-200, Serial No. 140AB25409410, ID No. AB-16-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 30 สิงหาคม 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 มกราคม 2569, หมดอายุ วันที่ 7 มกราคม 2570

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 มิถุนายน 2569			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.47	2.700	307	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
11.47	3.100	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
12.47	2.900	226	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
13.47	4.100	230	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
14.47	3.900	275	ตะวันตก (W)
15.47	2.400	312	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
16.47	2.000	291	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
17.47	2.100	270	ตะวันตก (W)
18.47	3.400	235	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
19.47	1.600	265	ตะวันตก (W)
20.47	7.000	77	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
21.47	2.600	245	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
22.47	1.600	291	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.47	1.100	278	ตะวันตก (W)
00.47	0.900	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
01.47	0.800	264	ตะวันตก (W)
02.47	1.200	250	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
03.47	0.700	278	ตะวันตก (W)
04.47	0.700	276	ตะวันตก (W)
05.47	0.300	301	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
06.47	1.100	310	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
07.47	2.000	40	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
08.47	3.000	58	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
09.47	3.200	50	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.267	

วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(µg /filter)	(µg /m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	18-19 มิถุนายน 2569	59,100	33	49,200	30	260	11.3	2.15
2	19-20 มิถุนายน 2569	69,900	39	57,000	35	300	13.0	2.17
3	20-21 มิถุนายน 2569	49,900	31	43,000	26	240	10.4	2.21
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	18-19 มิถุนายน 2569	35,100	20	29,200	18	-	-	2.02
2	19-20 มิถุนายน 2569	51,000	29	40,200	25	-	-	2.09
3	20-21 มิถุนายน 2569	39,900	22	32,300	20	-	-	2.13
มาตรฐาน[1]		-	≤ 200	-	≤ 100	-	≤ 37.5	-
LOQ[2]		10,000	5	3,000	1	100	4.3	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :
1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย PM-2.5 air sampler, FRM method
4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :
1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B
2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J
3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
1	18-19 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	2.68
		10.00-11.00	2.59
		11.00-12.00	2.47
		12.00-13.00	2.49
		13.00-14.00	2.49
		14.00-15.00	1.27
		15.00-16.00	3.02
		16.00-17.00	2.77
		17.00-18.00	2.62
		18.00-19.00	2.57
		19.00-20.00	2.54
		20.00-21.00	2.54
		21.00-22.00	2.63
		22.00-23.00	2.65
		23.00-00.00	2.62
		00.00-01.00	2.79
		01.00-02.00	2.91
		02.00-03.00	2.77
		03.00-04.00	2.66
		04.00-05.00	2.63
		05.00-06.00	2.53
		06.00-07.00	2.51
		07.00-08.00	2.49
		08.00-09.00	2.50
		Max (1 ชั่วโมง)	3.02
		Min (1 ชั่วโมง)	1.27
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.57
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011069, ID No. AB-03-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
3	20-21 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	2.62
		10.00-11.00	2.84
		11.00-12.00	2.54
		12.00-13.00	2.49
		13.00-14.00	2.44
		14.00-15.00	2.40
		15.00-16.00	2.40
		16.00-17.00	2.30
		17.00-18.00	2.35
		18.00-19.00	2.35
		19.00-20.00	2.40
		20.00-21.00	2.44
		21.00-22.00	2.49
		22.00-23.00	2.54
		23.00-00.00	2.56
		00.00-01.00	2.46
		01.00-02.00	2.44
		02.00-03.00	2.44
		03.00-04.00	2.38
		04.00-05.00	2.39
		05.00-06.00	2.39
		06.00-07.00	2.37
		07.00-08.00	2.41
		08.00-09.00	2.45
		Max (1 ชั่วโมง)	2.84
		Min (1 ชั่วโมง)	2.30
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.45
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
2	19-20 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	2.52
		10.00-11.00	2.73
		11.00-12.00	2.87
		12.00-13.00	2.55
		13.00-14.00	2.51
		14.00-15.00	2.47
		15.00-16.00	2.43
		16.00-17.00	2.41
		17.00-18.00	2.33
		18.00-19.00	2.35
		19.00-20.00	2.37
		20.00-21.00	2.41
		21.00-22.00	2.52
		22.00-23.00	2.53
		23.00-00.00	2.50
		00.00-01.00	2.50
		01.00-02.00	2.49
		02.00-03.00	2.47
		03.00-04.00	2.45
		04.00-05.00	2.43
		05.00-06.00	2.43
		06.00-07.00	2.45
		07.00-08.00	2.52
		08.00-09.00	2.53
		Max (1 ชั่วโมง)	2.87
		Min (1 ชั่วโมง)	2.33
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.49
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
5	19-20 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	1.29
		11.00-12.00	1.30
		12.00-13.00	1.29
		13.00-14.00	1.33
		14.00-15.00	1.12
		15.00-16.00	1.52
		16.00-17.00	1.69
		17.00-18.00	1.66
		18.00-19.00	1.90
		19.00-20.00	2.06
		20.00-21.00	1.90
		21.00-22.00	1.94
		22.00-23.00	1.96
		23.00-00.00	1.86
		00.00-01.00	1.88
		01.00-02.00	1.80
		02.00-03.00	1.88
		03.00-04.00	1.89
		04.00-05.00	1.94
		05.00-06.00	2.01
		06.00-07.00	1.93
		07.00-08.00	1.46
		08.00-09.00	1.51
		09.00-10.00	1.37
		Max (1 ชั่วโมง)	2.06
		Min (1 ชั่วโมง)	1.12
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.69
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691286-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
4	18-19 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	1.75
		11.00-12.00	1.77
		12.00-13.00	1.57
		13.00-14.00	1.50
		14.00-15.00	1.45
		15.00-16.00	1.43
		16.00-17.00	1.49
		17.00-18.00	1.46
		18.00-19.00	1.47
		19.00-20.00	1.48
		20.00-21.00	1.46
		21.00-22.00	1.52
		22.00-23.00	1.51
		23.00-00.00	1.44
		00.00-01.00	1.40
		01.00-02.00	1.38
		02.00-03.00	1.38
		03.00-04.00	1.36
		04.00-05.00	1.35
		05.00-06.00	1.33
		06.00-07.00	1.35
		07.00-08.00	1.41
		08.00-09.00	1.38
		09.00-10.00	1.32
		Max (1 ชั่วโมง)	1.77
		Min (1 ชั่วโมง)	1.32
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.46
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-77419-385, ID No.AB-01-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (ppm)
6	20-21 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	1.29
		11.00-12.00	1.20
		12.00-13.00	1.33
		13.00-14.00	1.48
		14.00-15.00	1.35
		15.00-16.00	1.26
		16.00-17.00	1.23
		17.00-18.00	1.28
		18.00-19.00	1.37
		19.00-20.00	1.43
		20.00-21.00	1.20
		21.00-22.00	1.11
		22.00-23.00	1.09
		23.00-00.00	1.08
		00.00-01.00	1.09
		01.00-02.00	1.06
		02.00-03.00	1.03
		03.00-04.00	1.07
		04.00-05.00	1.10
		05.00-06.00	1.07
		06.00-07.00	1.10
		07.00-08.00	1.10
		08.00-09.00	1.20
		09.00-10.00	1.20
		Max (1 ชั่วโมง)	1.48
		Min (1 ชั่วโมง)	1.03
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.20
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 30
		LOQ[2]	0.04

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
2	19-20 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	3.27
		10.00-11.00	3.48
		11.00-12.00	2.86
		12.00-13.00	3.30
		13.00-14.00	3.26
		14.00-15.00	3.22
		15.00-16.00	3.18
		16.00-17.00	3.16
		17.00-18.00	2.63
		18.00-19.00	3.11
		19.00-20.00	3.12
		20.00-21.00	3.17
		21.00-22.00	3.28
		22.00-23.00	3.28
		23.00-00.00	3.26
		00.00-01.00	3.25
		01.00-02.00	3.25
		02.00-03.00	3.22
		03.00-04.00	2.77
		04.00-05.00	3.19
		05.00-06.00	3.19
		06.00-07.00	3.20
		07.00-08.00	3.27
		08.00-09.00	3.29
		Max (1 ชั่วโมง)	3.48
		Min (1 ชั่วโมง)	2.63
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.17
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
1	18-19 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	3.43
		10.00-11.00	3.34
		11.00-12.00	3.23
		12.00-13.00	3.24
		13.00-14.00	3.24
		14.00-15.00	2.85
		15.00-16.00	3.77
		16.00-17.00	3.52
		17.00-18.00	3.37
		18.00-19.00	3.32
		19.00-20.00	2.75
		20.00-21.00	3.30
		21.00-22.00	3.38
		22.00-23.00	3.40
		23.00-00.00	2.96
		00.00-01.00	3.55
		01.00-02.00	3.66
		02.00-03.00	3.52
		03.00-04.00	3.42
		04.00-05.00	2.87
		05.00-06.00	3.28
		06.00-07.00	3.27
		07.00-08.00	3.24
		08.00-09.00	3.25
		Max (1 ชั่วโมง)	3.77
		Min (1 ชั่วโมง)	2.75
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.30
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
4	18-19 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	3.60
		11.00-12.00	3.62
		12.00-13.00	3.12
		13.00-14.00	3.32
		14.00-15.00	3.25
		15.00-16.00	3.24
		16.00-17.00	3.31
		17.00-18.00	3.27
		18.00-19.00	3.28
		19.00-20.00	3.11
		20.00-21.00	3.27
		21.00-22.00	3.34
		22.00-23.00	3.33
		23.00-00.00	3.25
		00.00-01.00	3.20
		01.00-02.00	3.17
		02.00-03.00	3.96
		03.00-04.00	3.15
		04.00-05.00	3.14
		05.00-06.00	3.11
		06.00-07.00	3.57
		07.00-08.00	3.21
		08.00-09.00	3.18
		09.00-10.00	3.11
		Max (1 ชั่วโมง)	3.96
		Min (1 ชั่วโมง)	3.11
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.30
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
3	20-21 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	3.37
		10.00-11.00	3.59
		11.00-12.00	3.30
		12.00-13.00	3.24
		13.00-14.00	3.19
		14.00-15.00	3.15
		15.00-16.00	3.15
		16.00-17.00	2.68
		17.00-18.00	3.10
		18.00-19.00	3.11
		19.00-20.00	2.84
		20.00-21.00	3.19
		21.00-22.00	3.24
		22.00-23.00	3.29
		23.00-00.00	3.31
		00.00-01.00	3.21
		01.00-02.00	3.20
		02.00-03.00	3.19
		03.00-04.00	2.86
		04.00-05.00	3.14
		05.00-06.00	3.15
		06.00-07.00	2.63
		07.00-08.00	3.16
		08.00-09.00	3.21
		Max (1 ชั่วโมง)	3.59
		Min (1 ชั่วโมง)	2.63
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.15
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
6	20-21 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	3.08
		11.00-12.00	2.97
		12.00-13.00	3.12
		13.00-14.00	3.29
		14.00-15.00	3.14
		15.00-16.00	3.03
		16.00-17.00	3.01
		17.00-18.00	2.65
		18.00-19.00	3.16
		19.00-20.00	3.24
		20.00-21.00	2.97
		21.00-22.00	2.86
		22.00-23.00	2.84
		23.00-00.00	2.84
		00.00-01.00	2.99
		01.00-02.00	2.81
		02.00-03.00	2.77
		03.00-04.00	2.82
		04.00-05.00	3.02
		05.00-06.00	2.82
		06.00-07.00	2.85
		07.00-08.00	2.86
		08.00-09.00	2.97
		09.00-10.00	2.97
		Max (1 ชั่วโมง)	3.29
		Min (1 ชั่วโมง)	2.65
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.96
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691286-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (ppb)
5	19-20 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	3.07
		11.00-12.00	3.09
		12.00-13.00	3.08
		13.00-14.00	1.98
		14.00-15.00	2.88
		15.00-16.00	3.33
		16.00-17.00	3.53
		17.00-18.00	3.49
		18.00-19.00	3.77
		19.00-20.00	3.95
		20.00-21.00	3.77
		21.00-22.00	3.12
		22.00-23.00	3.84
		23.00-00.00	3.72
		00.00-01.00	3.75
		01.00-02.00	3.06
		02.00-03.00	3.74
		03.00-04.00	3.76
		04.00-05.00	3.82
		05.00-06.00	3.90
		06.00-07.00	3.12
		07.00-08.00	3.27
		08.00-09.00	3.32
		09.00-10.00	3.16
		Max (1 ชั่วโมง)	3.95
		Min (1 ชั่วโมง)	1.98
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.40
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 100
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[1]	≤ 50
		LOQ[2]	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
1	18-19 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	1.38
		10.00-11.00	1.27
		11.00-12.00	1.14
		12.00-13.00	1.56
		13.00-14.00	1.16
		14.00-15.00	1.45
		15.00-16.00	1.77
		16.00-17.00	1.48
		17.00-18.00	1.31
		18.00-19.00	1.25
		19.00-20.00	1.22
		20.00-21.00	1.54
		21.00-22.00	1.32
		22.00-23.00	1.35
		23.00-00.00	1.31
		00.00-01.00	1.51
		01.00-02.00	1.64
		02.00-03.00	1.48
		03.00-04.00	1.36
		04.00-05.00	1.32
		05.00-06.00	1.20
		06.00-07.00	1.66
		07.00-08.00	1.16
		08.00-09.00	1.17
		Max (1 ชั่วโมง)	1.77
		Min (1 ชั่วโมง)	1.14
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.37
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691286-01

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569

วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 508011077, ID No.AB-02-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
3	20-21 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	1.31
		10.00-11.00	1.56
		11.00-12.00	1.22
		12.00-13.00	1.16
		13.00-14.00	1.11
		14.00-15.00	1.45
		15.00-16.00	1.06
		16.00-17.00	0.95
		17.00-18.00	1.00
		18.00-19.00	1.96
		19.00-20.00	1.06
		20.00-21.00	1.10
		21.00-22.00	1.16
		22.00-23.00	1.57
		23.00-00.00	1.24
		00.00-01.00	1.13
		01.00-02.00	1.11
		02.00-03.00	1.69
		03.00-04.00	1.04
		04.00-05.00	1.04
		05.00-06.00	1.36
		06.00-07.00	1.02
		07.00-08.00	1.07
		08.00-09.00	1.12
		Max (1 ชั่วโมง)	1.96
		Min (1 ชั่วโมง)	0.95
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.23
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
2	19-20 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	1.19
		10.00-11.00	1.44
		11.00-12.00	1.60
		12.00-13.00	1.23
		13.00-14.00	1.18
		14.00-15.00	1.14
		15.00-16.00	1.54
		16.00-17.00	1.07
		17.00-18.00	0.98
		18.00-19.00	1.00
		19.00-20.00	1.65
		20.00-21.00	1.07
		21.00-22.00	1.20
		22.00-23.00	1.21
		23.00-00.00	1.86
		00.00-01.00	1.17
		01.00-02.00	1.16
		02.00-03.00	1.13
		03.00-04.00	1.11
		04.00-05.00	1.68
		05.00-06.00	1.10
		06.00-07.00	1.11
		07.00-08.00	1.38
		08.00-09.00	1.21
		Max (1 ชั่วโมง)	1.86
		Min (1 ชั่วโมง)	0.98
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.27
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
5	19-20 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	1.47
		11.00-12.00	1.40
		12.00-13.00	1.08
		13.00-14.00	1.46
		14.00-15.00	1.49
		15.00-16.00	1.67
		16.00-17.00	1.28
		17.00-18.00	1.60
		18.00-19.00	1.54
		19.00-20.00	1.05
		20.00-21.00	1.60
		21.00-22.00	1.66
		22.00-23.00	1.66
		23.00-00.00	1.00
		00.00-01.00	1.99
		01.00-02.00	1.61
		02.00-03.00	1.54
		03.00-04.00	1.60
		04.00-05.00	1.12
		05.00-06.00	1.41
		06.00-07.00	1.57
		07.00-08.00	1.99
		08.00-09.00	1.70
		09.00-10.00	1.51
		Max (1 ชั่วโมง)	1.99
		Min (1 ชั่วโมง)	1.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.50
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
4	18-19 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	1.38
		11.00-12.00	1.31
		12.00-13.00	1.53
		13.00-14.00	1.37
		14.00-15.00	1.13
		15.00-16.00	1.58
		16.00-17.00	1.43
		17.00-18.00	1.98
		18.00-19.00	1.45
		19.00-20.00	1.03
		20.00-21.00	1.51
		21.00-22.00	1.57
		22.00-23.00	1.57
		23.00-00.00	1.03
		00.00-01.00	1.57
		01.00-02.00	1.52
		02.00-03.00	1.45
		03.00-04.00	1.51
		04.00-05.00	1.06
		05.00-06.00	1.32
		06.00-07.00	1.48
		07.00-08.00	1.65
		08.00-09.00	1.11
		09.00-10.00	1.42
		Max (1 ชั่วโมง)	1.98
		Min (1 ชั่วโมง)	1.03
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.41
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 29 กันยายน 2569
รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (ppb)
6	20-21 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	1.62
		11.00-12.00	1.99
		12.00-13.00	1.14
		13.00-14.00	1.61
		14.00-15.00	1.64
		15.00-16.00	1.82
		16.00-17.00	1.06
		17.00-18.00	1.75
		18.00-19.00	1.69
		19.00-20.00	1.56
		20.00-21.00	1.26
		21.00-22.00	1.81
		22.00-23.00	1.81
		23.00-00.00	1.83
		00.00-01.00	1.25
		01.00-02.00	1.76
		02.00-03.00	1.69
		03.00-04.00	1.75
		04.00-05.00	1.90
		05.00-06.00	1.56
		06.00-07.00	1.72
		07.00-08.00	1.89
		08.00-09.00	1.85
		09.00-10.00	1.66
		Max (1 ชั่วโมง)	1.99
		Min (1 ชั่วโมง)	1.06
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.65
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 120
		LOQ[2]	0.40

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
10 มิถุนายน 2569						
08.28	0.197	24.16	0.623	> 100.00	0.261	> 100.00
09.56	0.266	21.06	0.583	> 100.00	0.189	> 100.00
10.19	0.236	15.62	0.560	9.66	0.158	> 100.00
11.33	0.328	8.52	0.504	63.26	0.255	70.12
13.07	0.384	6.34	0.552	24.38	0.126	> 100.00
14.54	0.421	8.16	0.575	> 100.00	0.242	46.55
15.31	0.522	4.51	0.662	51.42	0.327	> 100.00
16.45	0.213	9.62	0.544	1.98	0.352	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ[1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[3]= วันที่ 21 มิถุนายน 2569 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
18 มิถุนายน 2569						
10.35	0.205	35.63	0.754	24.19	0.215	73.14
11.57	0.168	4.78	0.688	8.62	0.234	6.59
13.18	0.221	6.99	0.952	> 100.00	0.268	> 100.00
14.39	0.181	12.54	0.751	1.98	0.174	32.00
15.21	0.300	1.95	0.965	> 100.00	0.185	> 100.00
16.46	0.222	52.13	0.784	64.00	0.142	> 100.00
19 มิถุนายน 2569						
08.29	0.481	> 100.00	0.875	> 100.00	0.394	> 100.00
09.04	0.292	21.33	0.969	> 100.00	0.254	> 100.00
10.24	0.188	16.35	0.686	25.61	0.263	39.38
11.31	0.216	14.28	0.762	24.81	0.166	> 100.00
13.45	0.244	84.36	0.820	> 100.00	0.285	> 100.00
14.56	0.315	32.56	0.536	1.90	0.264	46.32
15.47	0.412	42.59	0.788	65.24	0.173	> 100.00
16.47	0.749	> 100.00	1.126	> 100.00	0.678	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 22 มิถุนายน 2569	มาตรฐาน[3]
pH	-	-	-	8.9	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	-	-	34	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	3	49	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	1.7	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	5	180	464	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	4	20	37	≤ 40
Oil and grease	mg/L	1	3	< 3	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนสีขาว มีกลิ่น	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-691286-01

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 23 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
Oven "Memmert"Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

หมายเหตุ
(1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)
(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

(นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว)
ผู้รายงาน

CEM
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาววัฒนาภรณ์ รัตนศรีสุโข)
ผู้อนุมัติ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเจษฎาภรณ์ ภูมี

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
1 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	11
1 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	13
1 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	12
1 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	11
1 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	10
1 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	12
1 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	10
1 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	12
1 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	11
1 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	12
1 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	10
1 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	9
1 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	12
1 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	10
2 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	9
2 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	9
2 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	10
2 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	12
2 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	17
2 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	15
2 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	14
2 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	12
2 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	10
2 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	9

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 3 กรกฎาคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 15 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-002

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
2 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	13
2 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	13
2 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	10
2 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	11
2 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	11
2 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	16
2 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	12
2 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	10
2 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	10
2 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	10
2 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	9
2 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	10
2 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	8
2 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	10
3 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	10
3 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	12
3 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	14
3 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	14
3 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	15
3 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	15
3 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	17
3 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	15
3 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	10
3 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	12

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
3 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	10
3 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	12
3 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	11
3 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	12
3 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	10
3 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	12
3 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	14
3 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	10
3 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	13
3 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	14
3 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	18
3 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	18
3 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	17
3 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	10
4 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	13
4 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	13
4 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	10
4 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	12
4 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	10
4 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	8
4 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	11
4 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	10
4 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	13
4 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	14

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu g/m^3$)
5 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	(*)
5 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	12
6 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	15

หมายเหตุ (*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ($\mu g/m^3$)
4 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	10
4 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	15
4 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	12
4 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	19
4 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	17
4 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	18
4 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	21
4 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	18
4 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	12
4 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	10
4 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	11
4 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	10
4 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	10
4 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	10
5 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	10
5 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	8
5 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	9
5 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	9
5 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	10
5 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	15
5 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	24
5 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	14
5 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	13
5 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
8 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	(*)
8 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	(*)
8 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	(*)
8 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	(*)
8 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	(*)
8 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	(*)
8 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	(*)
8 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	11
8 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	12
8 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	12
8 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	10
8 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	14
8 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	12
8 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	12
9 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	10
9 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	11
9 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	9
9 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	8
9 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	12
9 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	10
9 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	8
9 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	13
9 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	10
9 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	11

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
6 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	10
6 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	12
6 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	9
6 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	9
6 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	10
6 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	11
6 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	(*)
6 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	(*)
7 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	(*)

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
10 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	16
10 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	18
10 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	14
10 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	8
10 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	5
10 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	3
10 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	3
10 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	5
10 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	7
10 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	9
10 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	3
10 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	6
11 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	6
11 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	19
11 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	15
11 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	8
11 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	5
11 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	9
11 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	9
11 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	16
11 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	20
11 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	25

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
9 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	11
9 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	12
9 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	10
9 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	13
9 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	11
9 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	14
9 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	12
9 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	15
9 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	(*)
9 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	(*)
9 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	(*)
9 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	(*)
9 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	(*)
9 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	(*)
10 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	(*)

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
12 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	8
12 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	10
12 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	12
12 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	9
12 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	8
12 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	9
12 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	9
12 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	8
12 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	8
12 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	13
12 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	8
12 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	10
12 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	8
12 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	20
13 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	16
13 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	16
13 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	11
13 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	9
13 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	11
13 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	17
13 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	20
13 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	16
13 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	16
13 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	16

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
11 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	10
11 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	12
11 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	8
11 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	8
11 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	10
11 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	8
11 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	12
11 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	8
11 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	9
11 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	12
11 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	11
11 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	8
11 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	8
11 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	8
12 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	14
12 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	11
12 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	16
12 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	20
12 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	12
12 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	14
12 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	13
12 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	24
12 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	23
12 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
14 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	12
14 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	9
14 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	10
14 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	15
14 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	13
14 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	14
14 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	12
14 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	10
14 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	8
14 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	6
14 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	9
14 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	6
14 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	8
14 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	7
15 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	6
15 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	8
15 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	9
15 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	8
15 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	9
15 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	13
15 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	23
15 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	16
15 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	15
15 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
13 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	16
13 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	15
13 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	12
13 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	10
13 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	11
13 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	11
13 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	12
13 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	11
13 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	9
13 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	9
13 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	14
13 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	11
13 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	8
13 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	8
14 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	9
14 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	7
14 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	8
14 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	10
14 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	10
14 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	9
14 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	15
14 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	8
14 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	7
14 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
16 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	9
16 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	10
16 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	13
16 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	10
16 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	9
16 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	10
16 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	11
16 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	11
16 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	8
16 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	9
16 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	9
16 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	11
16 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	8
16 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	9
17 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	12
17 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	11
17 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	11
17 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	11
17 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	13
17 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	17
17 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	(*)
17 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	(*)
17 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	(*)
17 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	(*)

หมายเหตุ(*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
15 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	12
15 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	13
15 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	13
15 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	9
15 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	7
15 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	9
15 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	8
15 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	8
15 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	7
15 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	10
15 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	7
15 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	12
15 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	7
15 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	7
16 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	10
16 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	11
16 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	12
16 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	11
16 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	13
16 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	9
16 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	10
16 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	14
16 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	8
16 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
19 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	12
19 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	10
19 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	11
19 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	9
19 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	(*)
19 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	(*)
20 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	14
20 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	11

หมายเหตุ (*) = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 14.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
18 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	9
18 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	8
18 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	10
18 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	11
18 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	12
18 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	10
18 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	10
18 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	8
18 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	8
18 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	10
18 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	10
18 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	9
18 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	10
18 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	10
19 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	12
19 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	11
19 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	10
19 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	11
19 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	10
19 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	10
19 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	14
19 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	13
19 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	13
19 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	11

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
20 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	11
20 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	10
20 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	10
20 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	9
20 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	11
20 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	11
20 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	10
20 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	15
20 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	16
20 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	18
20 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	11
20 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	12
20 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	16
20 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	16
21 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	17
21 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	16
21 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	19
21 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	16
21 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	10
21 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	15
21 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	11
21 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	15
21 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	16
21 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	14

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
21 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	11
21 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	10
21 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	11
21 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	14
21 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	10
21 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	9
21 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	10
21 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	10
21 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	9
21 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	8
21 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	9
21 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	9
21 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	10
21 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	11
22 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	14
22 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	11
22 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	12
22 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	15
22 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	12
22 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	10
22 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	13
22 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	13
22 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	16
22 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	12

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
22 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	11
22 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	15
22 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	17
22 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	13
22 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	12
22 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	12
22 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	12
22 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	13
22 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	12
22 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	12
22 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	12
22 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	12
22 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	12
23 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	12
23 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	14
23 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	12
23 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	11
23 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	11
23 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	13
23 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	11
23 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	11
23 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	12
23 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	9
23 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	10

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
23 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	9
23 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	9
23 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	10
23 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	14
23 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	14
23 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	14
23 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	7
23 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	5
23 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	5
23 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	5
23 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	6
23 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	9
23 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	12
24 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	10
24 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	8
24 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	8
24 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	7
24 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	7
24 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	6
24 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	5
24 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	6
24 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	8
24 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	9
24 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	12

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท จี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
25 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	16
25 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	15
25 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	13
25 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	13
25 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	16
25 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	16
25 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	17
25 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	18
25 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	18
25 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	16
25 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	14
25 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	19
25 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	19
26 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	11
26 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	11
26 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	11
26 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	13
26 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	11
26 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	10
26 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	9
26 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	8
26 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	9
26 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	11
26 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	11

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท จี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
24 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	14
24 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	19
24 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	21
24 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	19
24 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	18
24 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	20
24 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	14
24 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	9
24 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	8
24 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	12
24 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	12
24 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	11
24 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	10
25 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	10
25 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	15
25 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	10
25 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	8
25 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	10
25 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	9
25 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	10
25 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	11
25 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	13
25 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	12
25 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	13

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
27 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	11
27 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	10
27 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	8
27 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	7
27 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	7
27 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	11
27 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	7
27 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	7
27 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	9
27 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	10
27 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	12
27 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	14
27 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	19
28 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	22
28 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	23
28 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	21
28 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	19
28 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	15
28 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	8
28 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	16
28 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	21
28 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	20
28 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	23
28 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	22
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

หมายเหตุ : ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากทางโครงการถอดปลั๊กเครื่องตรวจวัด เพื่อทำรั้วโครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (ug/m^3)
26 มิถุนายน 2569	10.00-11.00	9
26 มิถุนายน 2569	11.00-12.00	8
26 มิถุนายน 2569	12.00-13.00	7
26 มิถุนายน 2569	13.00-14.00	10
26 มิถุนายน 2569	14.00-15.00	15
26 มิถุนายน 2569	15.00-16.00	15
26 มิถุนายน 2569	16.00-17.00	15
26 มิถุนายน 2569	17.00-18.00	10
26 มิถุนายน 2569	18.00-19.00	15
26 มิถุนายน 2569	19.00-20.00	14
26 มิถุนายน 2569	20.00-21.00	14
26 มิถุนายน 2569	21.00-22.00	13
26 มิถุนายน 2569	22.00-23.00	9
27 มิถุนายน 2569	23.00-00.00	9
27 มิถุนายน 2569	00.00-01.00	10
27 มิถุนายน 2569	01.00-02.00	15
27 มิถุนายน 2569	02.00-03.00	10
27 มิถุนายน 2569	03.00-04.00	9
27 มิถุนายน 2569	04.00-05.00	14
27 มิถุนายน 2569	05.00-06.00	9
27 มิถุนายน 2569	06.00-07.00	8
27 มิถุนายน 2569	07.00-08.00	7
27 มิถุนายน 2569	08.00-09.00	7
27 มิถุนายน 2569	09.00-10.00	7

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

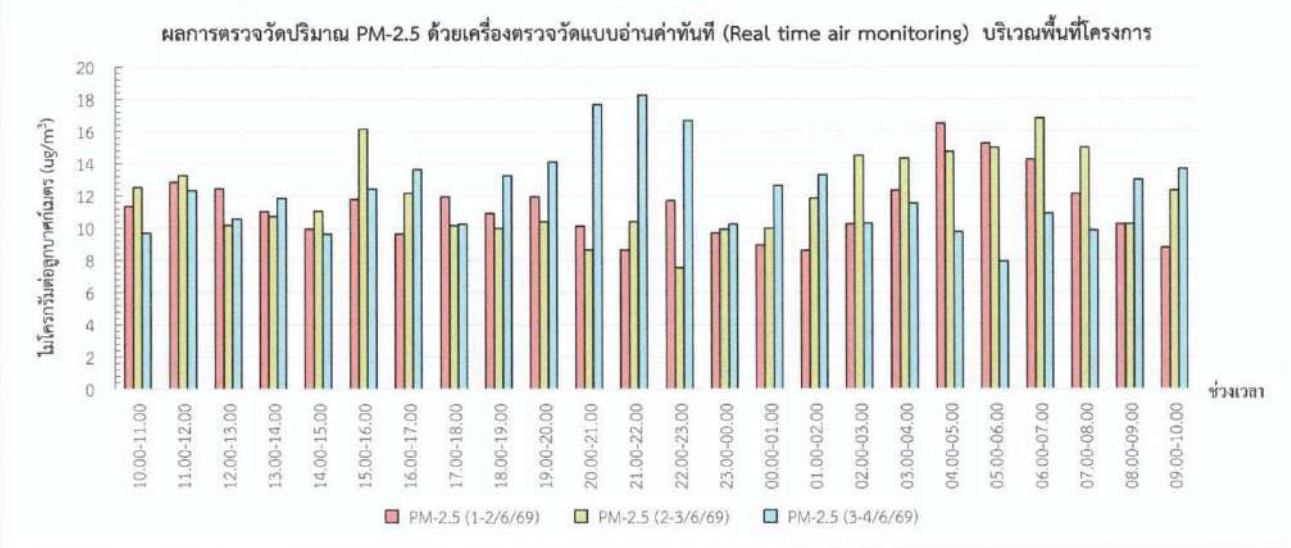


กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

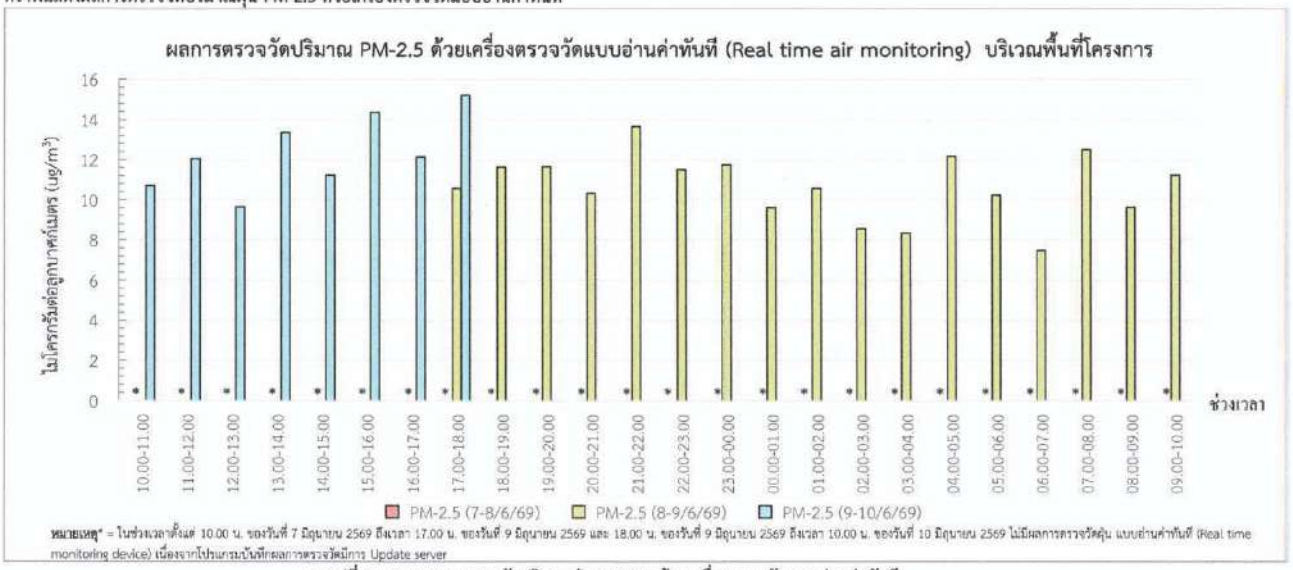

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

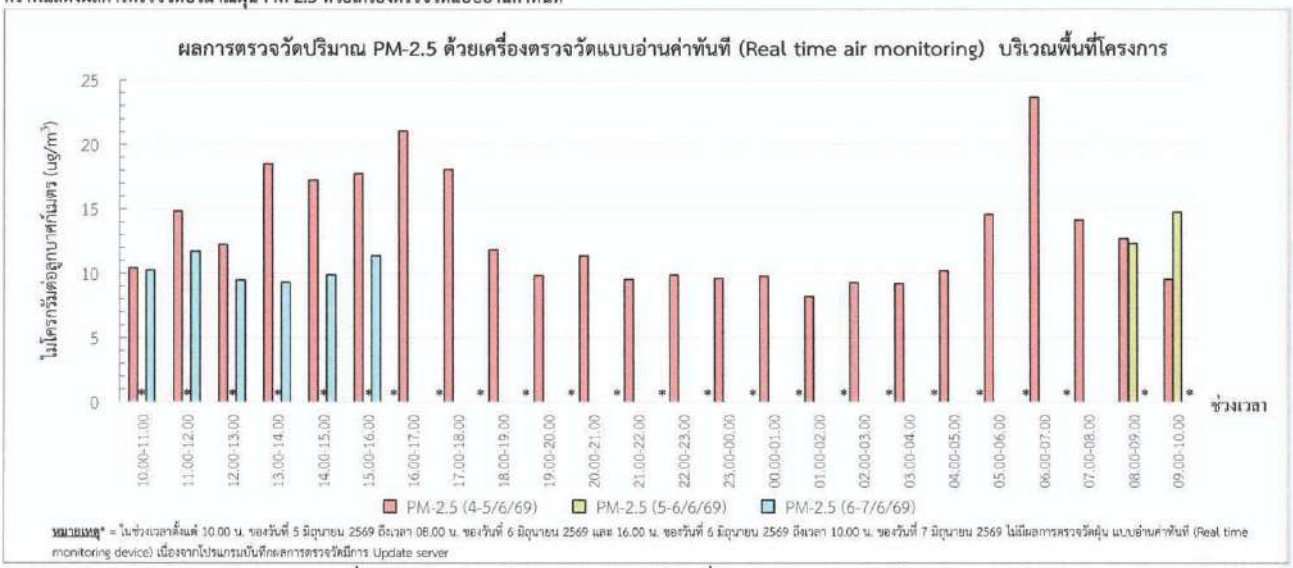

กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

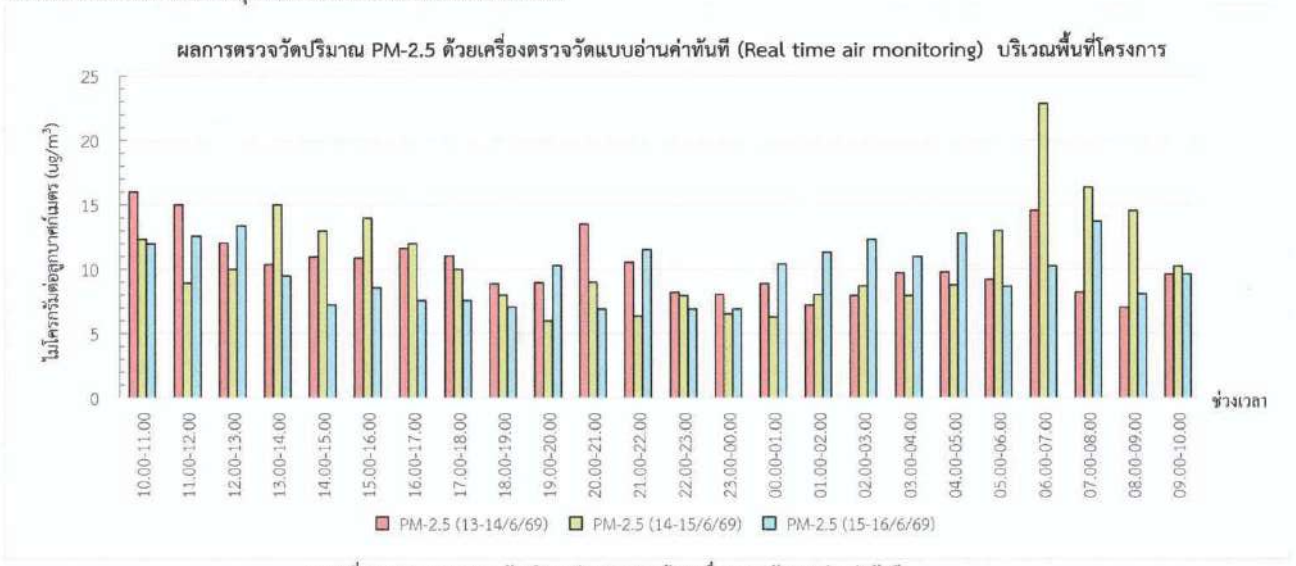

กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

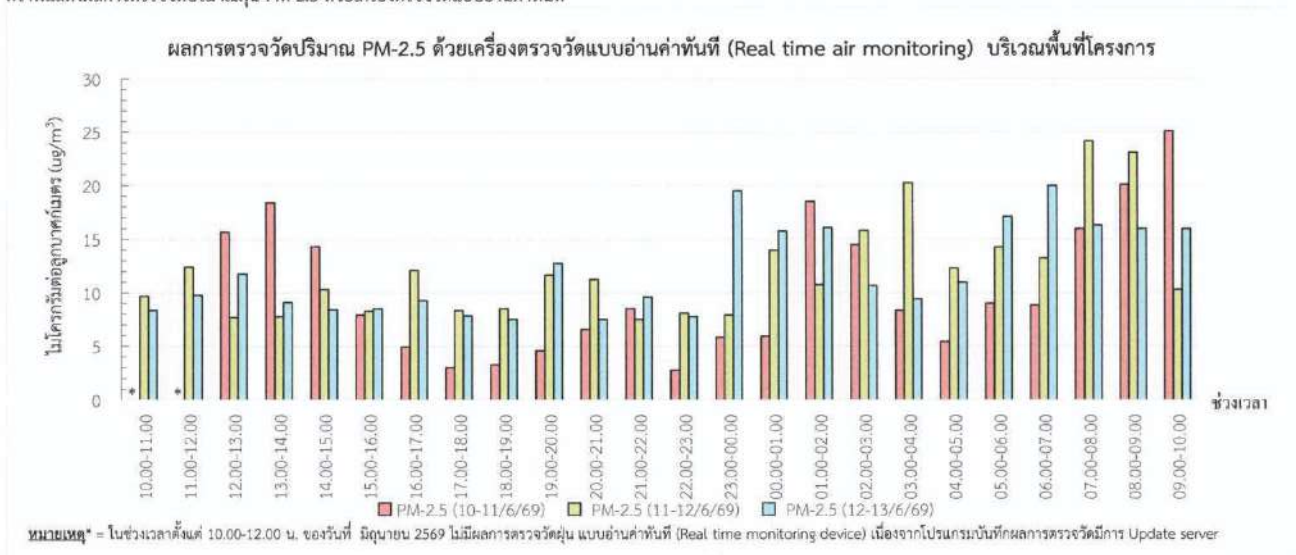


หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-12.00 น. ของวันที่ มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

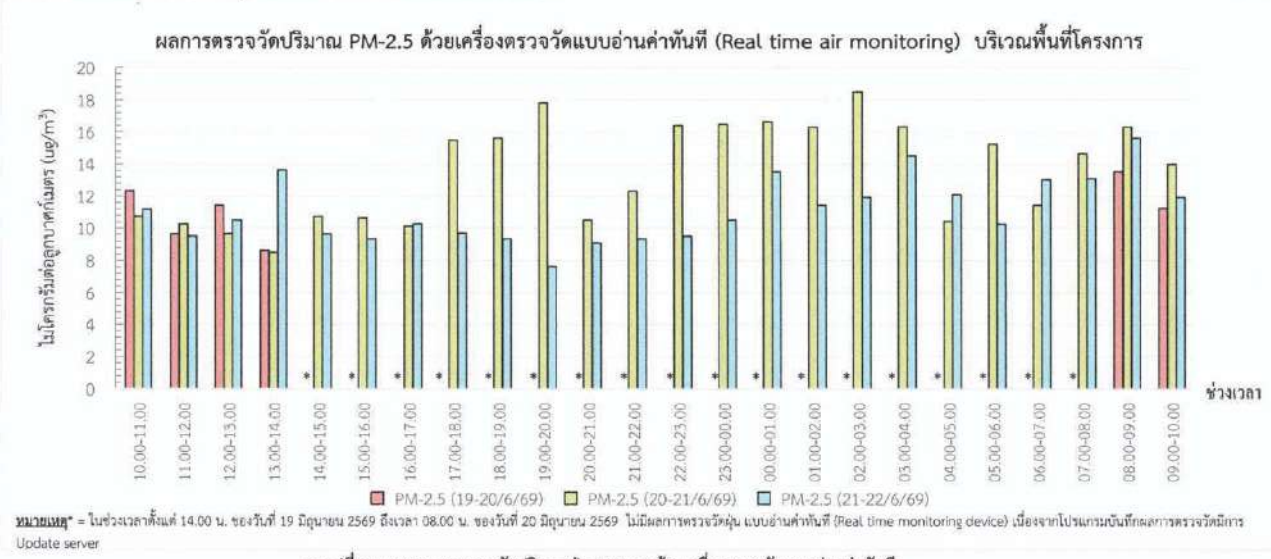


หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 14.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

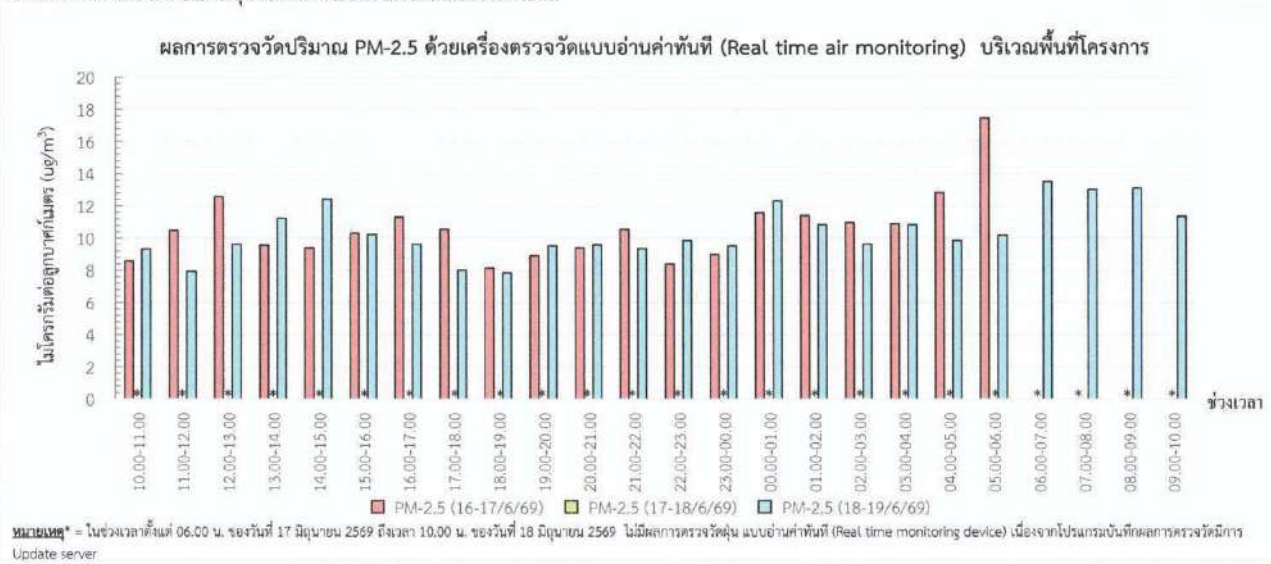


หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

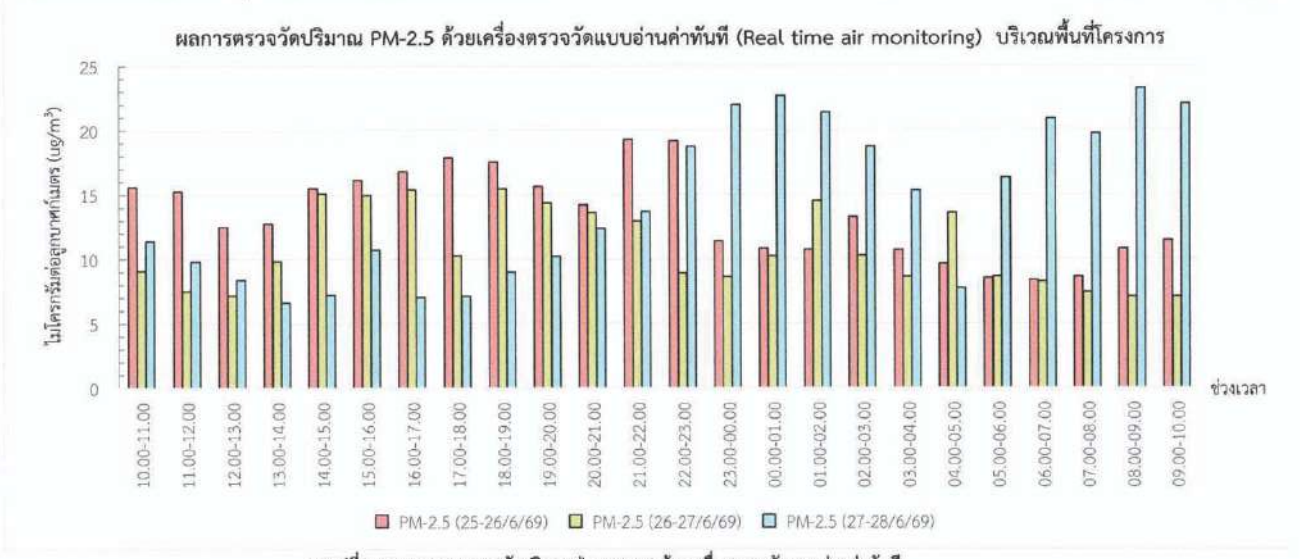

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ห้องปฏิบัติการ : เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 02-441-7100-99

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

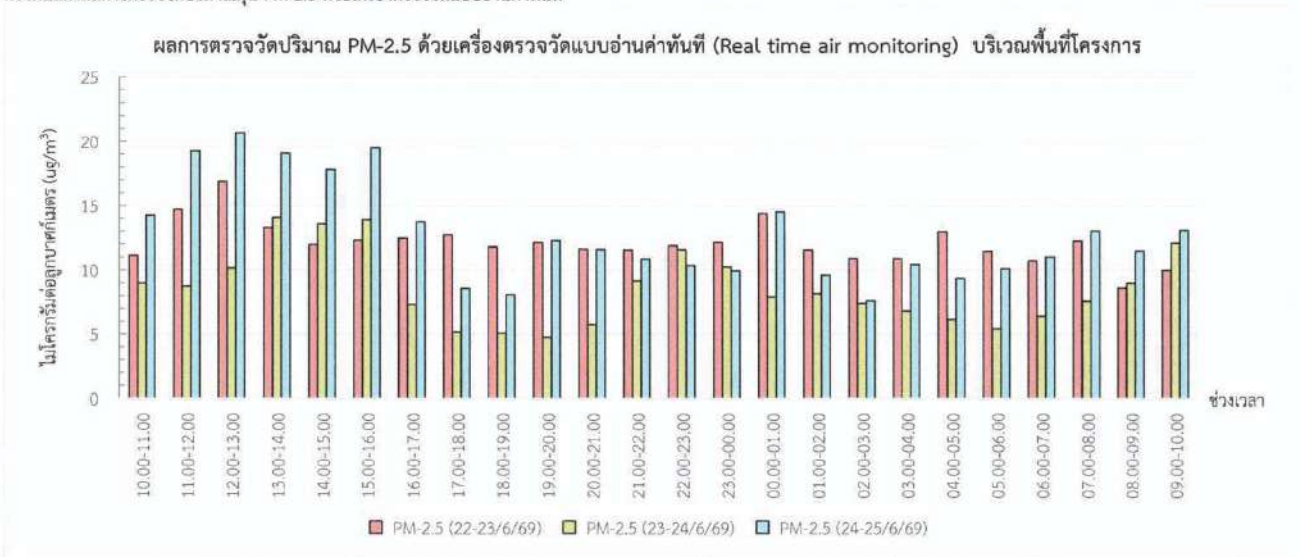

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ
