# เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 2

---

## หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อ.1)
- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
- เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
- ใบรับรองตรวจสอบอาคาร (ร.1)

# ด่วนมาก

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ

แบบ กทม.6

แบบ กทม.6 เดิม เลขที่ 70/2547
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

ตามแบบ กทม.1 เลขที่ 645
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

<u>ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร</u>
<u>หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ</u>

เลขที่ 645 / 2548

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ได้รับแจ้งจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด โดย นายปิยบุตร เลิศดำริห์การ และ
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร / ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ดัดแปลงอาคาร (ผังบริเวณ)
ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท
ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ 4074 (บางส่วน), 153547 , 153494 , 153545 , 18945 (บางส่วน)
เป็นที่ดินของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 2 เป็นอาคาร (ผังบริเวณ) สระว่ายน้ำ สำนักงาน – พาณิชย์ – จอดรถยนต์ - (383 ห้อง)

2.1 ชนิด ค.ส.ล. 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (383 ห้อง)
พื้นที่ 34,515.00 ม.$^2$ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 226 คัน
พื้นที่ - ม.$^2$

2.2 ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น ระบายน้ำ
พื้นที่ ยาว 400.00 เมตร ม.$^2$ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.$^2$

2.3 ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.$^2$ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.$^2$

2.4 ชนิด.....-..... จำนวน.....-....หลัง เพื่อใช้เป็น.....-.....
พื้นที่.....-..... ม.$^2$ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน .....-..... คัน
พื้นที่.....-..... ม.$^2$

2.5 ชนิด.....-..... จำนวน.....-....หลัง เพื่อใช้เป็น.....-.....
พื้นที่.....-..... ม.$^2$ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน .....-..... คัน
พื้นที่.....-..... ม.$^2$

2.6 ชนิด.....-..... จำนวน.....-....หลัง เพื่อใช้เป็น.....-.....
พื้นที่.....-..... ม.$^2$ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน .....-..... คัน
พื้นที่.....-..... ม.$^2$

2.7 ชนิด.....-..... จำนวน.....-....หลัง เพื่อใช้เป็น.....-.....
ความยาว .....-..... เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน .....-..... คัน
พื้นที่.....-..... ม.$^{2-}$

2.8 ชนิด.....-..... จำนวน.....-....หลัง เพื่อใช้เป็น.....-.....
ความยาว .....-..... เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน .....-..... คัน
พื้นที่.....-..... ม.$^2$

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้ ข้อ 3 โดยมี

(1) นายเทเวศร์ อุตวิชัย วสถ.461 .....เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
(2) นายธนพล ภูมิสามพราน สสถ.1838 .....เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
(3) นายเสริมศักดิ์ เตชะปณิต วย.471 .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
(4) นายภูวดล ยิ้มประเสริฐ สย.3462 .....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
(5) นายศักดา รัตนเจษฎา วก.530 .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

(6). นายวิเชียร กอเจริญวิทย์ สก.2271 .....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

(7). นายเสริมศักดิ์ เตชะปณิต วย.471 .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(8). นายภูวดล ยิ้มประเสริฐ สย.3462 .....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(9). นายศักดา รัตนเจษฎา วก.530 .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

(10). นายวิเชียร กอเจริญวิทย์ สก.2271 .....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จงาน 730 วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคารเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2548 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2550

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ - บาท

ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั้ว เขื่อน กำแพงหรืออื่น ๆ - บาท

ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร - บาท

ค่าธรรมเนียมป้าย - บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 10.00 บาท

ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

(11). นายอุดม เมฆานันท์ วฟก.502 .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

(12). นายอุดม เมฆานันท์ วฟก.502 .....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

นายกิติพจน์ โกยแก้วพริ้ง สฟก.1360

6.2 จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

8.2 การกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ

8.2 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

8.3 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ 10 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน 22 พ.ย. 2548 พ.ศ. .....

ลายมือชื่อ.....

(นายวินัย ลิ่มสกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- ผู้ได้รับอนุญาตฯ ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 ต้องแสดงรายงานการควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นเอกสารรายงานผลการควบคุมงานที่ลงลายมือชื่อกำกับแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตฯ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ 645

ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ราย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
อาคารชุด (อยู่อาศัย) แบบ อ. ๖
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
อาคารพาณิชย์ 081016

# ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

นายปิยบุตร เลิศดำริห์การ
จำกัด โดย นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

เลขที่ 125 / 2549

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ชั้น 10 ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตตามแบบ กทม.6 ในใบอนุญาต
เลขที่ 645 / 2548 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเลขที่ 91/2549 29 มีนาคม 2549
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (383 ห้อง)- สำนักงาน-พาณิชย์- จอดรถยนต์-สระว่ายน้ำ
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 226 คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 2090,2095,153494,153545,
18945,48674 ,141302
เป็นที่ดินของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10.- บาท

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน - 3 ก.ค. 2549 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) [redacted]
(นางบรรณโศภิษฐ์ เผดิวิชัย)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

(อ.ช.๑๐)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ 2090, 2095, 153494, 153545, 18945, 48674, 141302

ตำบล พระโขนง ,พระโขนง(ที่11พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอ คลองเตย, พระโขนง

๓. ก. จำนวนอาคาร 1 หลัง

ข. จำนวนห้องชุด 392 ห้องชุด

๔. บันทึกรายละเอียด อาคารชุดนี้มีทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลดังนี้

ทรัพย์ส่วนกลาง

ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด อาคารตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2090, 2095, 153494, 153545, 18945, 48674, 141302 เลขที่ดิน 7168,8823,17370,7240,5549,10075,16849 หน้าสำรวจ 1122,1127,7189,7240,7362,7458,7167 ตำบลพระโขนง ,ตำบลพระโขนง (ที่11พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอคลองเตย, อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร

- โครงสร้างชั้นรากฐาน ประกอบด้วย เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม
- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เลขที่ 1414 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
- เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ชั้น 1)
- ห้องปั๊มน้ำห้องควบคุมระบบจักรกล ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบงานภายในอาคาร และห้องติดตั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ถังเก็บน้ำ บ่อหน่วง อยู่ที่ชั้น 1
- พื้นที่ทางเดินภายในและนอกอาคาร ราวระเบียงทางเดินภายในอาคาร บันไดภายในอาคารบันไดหนีไฟ กำแพง ลูกกรง ราวระเบียงนอกหน้าต่าง กันสาด
- ลิฟท์จำนวน 6 เครื่อง พร้อมระบบเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ส่วนควบสิ่งต่าง ๆ ที่จัดมีไว้
- หม้อแปลงไฟฟ้า และห้อง MBD (ชั้น 11)

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(นายวิเชียร พลสังข์)
นิติกรชำนาญการที่ดินปฏิบัติการ
๒๔ พ.ย. ๒๕๕๖

- ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล (อยู่ชั้น1)
- ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง (ชั้น 1 – 16)
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- สระว่ายน้ำรวมทั้งสวนรอบสระ ห้องอบไอน้ำ ห้องเกมส์ ห้องสมุด และบริเวณออกกำลังกาย (อยู่ชั้น 4)
- ห้องสุขา โถงรับแขก รวมถึงอุปกรณ์ที่จัดไว้สำหรับกิจกรรมและสถานที่นั้น ๆ พื้นที่จอดรถ ต้นไม้ และบริเวณ ที่ปลูกต้นไม้
- รั้วโครงการ ทางเดิน
- ป้ายชื่ออาคารอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร ป้ายทาง และป้านสัญลักษณ์อยู่ภายในอาคาร
- ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและประตูอัตโนมัติ (ทางเข้าโครงการ, หน้าลิฟท์ชั้นที่ 1 – 3)
- ไฟแสงสว่างรอบนอกอาคาร และไฟแสงสว่างทางเดินภายในอาคาร
- ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ชั้น 1 – 3
- ห้องพักขยะรวม อยู่แต่ละชั้น
- ป้อมยามโครงการ (ชั้นล่าง)
- สวนหย่อม (ชั้นล่าง ชั้น 4)

**ทรัพย์ส่วนบุคคล**

กรรมสิทธิ์ห้องชุดหมายเลข 1414/1 ถึง 1414/392 จำนวน 392 ห้องชุด

(ลงชื่อ) [redacted] พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) ประจำสำนักงานเขตทุ่งครุ

เจ้าพนักงานที่ดินประจำกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง


สำเนาถูกต้อง

(นายวิเชียร พลสังข์)
นิติกรชำนาญการ
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖

# รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

| ลำดับที่ | ประเภท | อาคารชุด | | นิติบุคคลอาคารชุด | | ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง | ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่ | พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน วัน เดือน ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ชื่อ | ทะเบียนเลขที่ | ชื่อ | ทะเบียนเลขที่ | | | |
| ๑๒ | เปลี่ยนแปลงกรรมการ | สุขุมวิท พลัส | ๒/๒๕๔๙ | สุขุมวิท พลัส | ๒/๒๕๔๙ | ๑. นายเมทนี มาศสิระรัตน์ | | [redacted] |
| | นิติบุคคลอาคารชุด | คอนโดมิเนียม | | คอนโดมิเนียม | | ๒. นางทิวาพร วัฒนโภคาสิน | | (นายสุรชาติ ยอดเยี่ยม) ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๔ |
| | | | | | | ๓. นางสาวพัชราภรณ์ คงนิรัฒน์ศิริ | | |
| | | | | | | ๔. นายธรรมธีรศ์ เลี้ยงธรรมรัตน์ | | |
| | | | | | | ๕. นางสาวอุษา พื้นผา | | |
| | | | | | | | | [redacted] |
| ๑๒๗ | เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ | สุขุมวิท พลัส | ๒/๒๕๔๙ | สุขุมวิท พลัส | ๒/๒๕๔๙ | บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | | |
| | นิติบุคคลอาคารชุด | คอนโดมิเนียม | | คอนโดมิเนียม | | | (โดย นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์ | (นายสุรชาติ ยอดเยี่ยม) ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๔ |
| | | | | | | | ผู้ดำเนินการแทน) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | สำเนาถูกต้อง [redacted] (นางสาวจิตารัตน์ แม่งช้วย) นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔ | |

(อ.ช.๑๓)



# หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม"

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ของอาคารชุด "สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม" ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด "สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม"

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1414 หมู่ที่ - ถนน สุขุมวิท ตรอก / ซอย ตำบล / แขวง พระโขนง อำเภอ / เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) [redacted]

( )

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(นายวิเชียร พลสังข์)

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖

[redacted]

นายไพศาล รังกาญ

เลขที่ ๒๔๗๙/๒๕๖๘

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
เลขที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๑๘๙๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

# ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม โดย นิติบุคคลอาคารชุด สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑๔ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ทีจี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขทะเบียน ผ.๐๑๓๙/๒๕๕๑ ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

[redacted]

(นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

**คำเตือน**

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๓) จะมีระยะเวลาครบ ๓ ปี

BID 997DEA14EC99

Activate W
Go to Settings

# เอกสารแนบ 3

# เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| แผนงานประจำปี 2569 | | | | | | | | | | | | | | นิติบุคคลอาคารชุด สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | กำหนดการของแผนงาน ประจำปี 2569 | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | รหัสงบประมาณ | หมายเหตุ (ประเภทงบประมาณ) |
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | | |
| 1 | **แผนงานดำเนินการและสำนักงานนิติฯ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ค่าตรวจสอบสภาพน้ำของโครงการ | 18,259.00 | X | | | X | | | | | | | | X | หัวหน้าช่าง | 5200302 | ค่ารายงาน Eia และ บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย |
| 1.2 | จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 32,100 | X | | | | | X | | | | | | X | หัวหน้าช่าง | 5200302 | ค่ารายงาน Eia และ บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย |
| 1.3 | ตรวจสอบอาคาร | | | | | | | | | | | | | X | หัวหน้าช่าง | 5200603 | ค่าบริการตรวจสอบอาคาร |
| 1.4 | จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมครั้งแรก ประจำปี 2569 | 40,000 | | | | X | | | | | | | | | ผู้จัดการอาคาร | 5400104 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม |
| 1.5 | จัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ | 5,000 | | | X | | | X | | | X | | X | | ผู้จัดการอาคาร | 5400104 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม |
| 1.6 | ตรวจสอบบัญชี | 13,000 | | | | | | | | | | | | X | ฝ่ายบัญชี | 5400108 | ค่าบริการตรวจสอบบัญชี |
| 1.7 | ค่าฟ้องร้องพื้นที่รุกล้ำถนนด้านนอกโครงการ | 300,000 | | | | | | X | | | | | | | ผู้จัดการอาคาร | 5400110 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี |
| 2 | **แผนงานจัดซื้อ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ถ่ายน้ำมันเครื่องกรองระบบ Fire Pump | | | | | | | X | | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500102 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบดับเพลิง |
| | ถ่ายน้ำมันเครื่องกรองระบบ Generator | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 2.2 | เปลี่ยนขอบยางตู้ดับเพลิงที่ชำรุด | | X | | | | | | X | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500102 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบดับเพลิง |
| 2.3 | ล้างเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง 21 ตัว ปีละ 1 ครั้ง | | | | | | X | | | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500104 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบปรับอากาศ |
| 2.5 | ตรวจเช็คหม้อแปลงและ MDB ประจำปี | | | | | | | | X | | | X | | | หัวหน้าช่าง | 5500106 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ MDB |
| 2.7 | เติมน้ำมันระบบ Generator | 8,000 | | | X | | | | | X | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500107 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 2.8 | ซื้อจุลินทรีย์ สำหรับระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย | 18,000 | X | | | | X | | | | X | | | | หัวหน้าช่าง | 5500109 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - CCTV |
| 2.9 | สูบสิ่งปฏิกูลประจำปี (บริการ 2 ครั้ง/ปี) | | | | X | | | | | | X | | | | หัวหน้าช่าง | 5500113 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบบำบัดน้ำเสีย |
| 2.10 | ทะลวงท่อเมนส่วนกลางและตัดต่อ ปีละ 2 ครั้ง | 50,000 | | X | | | | | | | X | | | | หัวหน้าช่าง | 5500114 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบประปา และสุขาภิบาล |
| 2.12 | ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า 2 ตัว,เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องซักผ้า 2 ตัว | | X | | | | | | X | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500114 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบประปา และสุขาภิบาล |
| 2.13 | การล้างบ่อพักน้ำประปา ชั้น G และ ดาดฟ้า | 5,000 | | | | | X | | | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500114 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบประปา และสุขาภิบาล |
| 2.14 | ปรับปรุงต้นไม้หน้าห้องชาวน่าใหม่โดยใช้ต้นไม้สูง | | X | | | | | | X | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500119 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ส่วนกลาง |
| 2.15 | การซ่อมแซมภายในห้องชุดที่อยู่ในค่า Deduct | | | | | X | | | | | X | | | | หัวหน้าช่าง | 5500119 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ส่วนกลาง |
| 2.17 | จัดซื้อหลอดไฟและวัสดุสำหรับจำหน่ายห้องชุด | | x | | | | | | | x | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500122 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - พื้นที่และอุปกรณ์สันทนาการ |
| 2.18 | จัดซื้อหลอดไฟและวัสดุส่วนกลาง | | x | | | | | | | x | | | | | หัวหน้าช่าง | 5500299 | วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป |
| 3 | **แผนงานด้านกิจกรรมต่างๆ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | จัดกิจกรรมทำบุญอาคารประจำปี | | X | | | X | | | | | | | | | ผู้จัดการอาคาร | 5400120 | ค่าทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม |
| 3.2 | จัดกิจกรรมวันฮาโลวัน | 3,000 | | | | | | | | | | | | X | ผู้จัดการอาคาร | 5400120 | ค่าทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม |
| 3.3 | จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น สำหรับพนักงานประจำโครงการ | 3,000 | | | | | | | | | | | X | | ผู้จัดการอาคาร | 5400121 | ค่าซ้อมอพยพหนีไฟ |
| 3.4 | จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี (สำหรับลูกบ้าน) | 5,000 | | | | | | | | | | | X | | ผู้จัดการอาคาร | 5400121 | ค่าซ้อมอพยพหนีไฟ |
| 4 | **งานปรับปรุงพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ทาสีเส้นแบ่งจราจรลานจอดรถส่วนกลางชั้น G 2 3 | 50,000 | | | X | | | | | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5600102 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณะทรัพย์สินของส่วนกลาง |
| 4.2 | การซ่อมแซมพื้นไม้บริเวณข้างบ่อปลาอาคาร A - B บางส่วนที่ชำรุด | 30,000 | | | | | | | X | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5600102 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณะทรัพย์สินของส่วนกลาง |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | การซ่อมแซมพื้นกระเบื้องในลิฟต์ โดยสารอาคาร A-B จำนวน 4 ตัว | 30,000 | | | | | X | | | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5600102 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณะทรัพย์สินของส่วนกลาง |
| 5 | **ทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | จัดซื้อกระจกโค้งสำหรับทางเดินรถภายในโครงการจำนวน 5 ตัว | 8,000 | X | | | | | | | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5600102 | อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน |
| 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | หัวหน้าช่าง | 5600102 | เครื่องตกแต่งและติดตั้ง |
| **รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| หมายเหตุเพิ่มเติม | ผู้จัดทำ (BM/VM) | ผู้ตรวจสอบ (OM) | ผู้ตรวจสอบ (PMC/ADP) | ผู้มีอำนาจอนุมัติ |
|---|---|---|---|---|
| | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| | วันที่ 2ต.ค.63 | วันที่ _____ | วันที่ _____ | วันที่ _____ |

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | RE/GEN-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | GENERATOR |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260100009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 07/01/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง MDB |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✔ | | | |
| 8 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....570.....ลิตร | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✔ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....45.....F | | | | |
| 2 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| 3 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | STOP.....179.1.....ชม. | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | START.....179.1.....ชม. | | | | |
| 4 | เวลา | ✔ | | | |
| | START.....13.42.....น. | | | | |
| | STOP.....13.58.....น. | | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....47.....PSI | | | | |
| 6 | ความเร็วรอบ | ✔ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1503.....RPM | | | | |
| 7 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....47.....F | | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | STOP.....179.1.....ชม. | | | | |
| | START.....179.1.....ชม. | | | | |
| 2 | วัดกระแส | ✔ | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| 3 | ไฟชาร์จ BATTERY | ✔ | | | |
| | ไฟชาร์จ BATTERY.....27.2.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✔ | | | |
| 5 | ความถี่ | ✔ | | | |
| | ความถี่.....50.1.....HZ | | | | |
| 6 | วัดแรงดัน | ✔ | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |

**<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>**

1.ณัฐ จันทวงษ์

---

**<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>**

---

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | RE/GEN-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | GENERATOR |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 04/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง MDB |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✔ | | | |
| 15 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....615.....ลิตร | | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....42.....F | | | | |
| 2 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| 3 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | START.....180.3.....ชม. | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | STOP.....180.3.....ชม. | | | | |
| 4 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....47.....PSI | | | | |
| 5 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....43.....F | | | | |
| 6 | ความเร็วรอบ | ✔ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1503.....RPM | | | | |
| 7 | เวลา | ✔ | | | |
| | STOP.....11.15.....น. | | | | |
| | START.....11.00.....น. | | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน | ✔ | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| 2 | วัดกระแส | ✔ | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| 3 | ไฟชาร์จ BATTERY | ✔ | | | |
| | ไฟชาร์จ BATTERY.....27.3.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✔ | | | |
| 5 | ความถี่ | ✔ | | | |
| | ความถี่.....50.1.....HZ | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | STOP.....180.3.....ชม. | | | | |
| | START.....180.3.....ชม. | | | | |

**<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>**

1.ณัฐ จันทวงษ์

---

**<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>**

---

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | RE/GEN-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | GENERATOR |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 04/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง MDB |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 11 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....660.....ลิตร | | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✔ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....48.....F | | | | |
| 2 | เวลา | ✔ | | | |
| | START.....14.10.....น. | | | | |
| | STOP.....14.20.....น. | | | | |
| 3 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | START.....181.3.....ชม. | | | | |
| | STOP.....181.3.....ชม. | | | | |
| 4 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....47.....PSI | | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| 6 | ความเร็วรอบ | ✔ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1502.....RPM | | | | |
| 7 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....47.....F | | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | STOP.....1813.....ชม. | | | | |
| | START.....181.3.....ชม. | | | | |
| 2 | วัดกระแส | ✔ | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| 3 | วัดแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| 4 | ไฟชาร์จ BATTERY | ✔ | | | |
| | ไฟชาร์จ BATTERY.....27.3.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✔ | | | |
| 6 | ความถี่ | ✔ | | | |
| | ความถี่.....50.1.....HZ | | | | |

**<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>**

1.ณัฐ จันทวงษ์

---

**<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>**

---

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | RE/GEN-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | GENERATOR |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400011 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 01/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง MDB |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 14 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....650.....ลิตร | | | | |
| 15 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | STOP.....182.0.....ชม. | | | | |
| | START.....182.0.....ชม. | | | | |
| 2 | ไฟชาร์จ BATTERY | ✔ | | | |
| | ไฟชาร์จ BATTERY.....27.0.....แอมป์ | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 4 | วัดกระแส | ✔ | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ความถี่ | ✔ | | | |
| | ความถี่.....50.1.....HZ | | | | |
| 6 | วัดแรงดัน | ✔ | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....40.....F | | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....40.....F | | | | |
| 3 | เวลา | ✔ | | | |
| | STOP.....15.10.....น. | | | | |
| | START.....15.00.....น. | | | | |
| 4 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | STOP.....182.0.....ชม. | | | | |
| | START.....182.0.....ชม. | | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....47.....PSI | | | | |
| 7 | ความเร็วรอบ | ✔ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1503.....RPM | | | | |

**<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>**

1.ณัฐ จันทวงษ์

---

**<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>**

---

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | RE/GEN-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | GENERATOR |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 06/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง MDB |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 10 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....630.....ลิตร | | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....47.....PSI | | | | |
| 2 | ความเร็วรอบ | ✔ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1503.....RPM | | | | |
| 3 | เวลา | ✔ | | | |
| | STOP.....13.15.....น. | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | START.....13.00.....น. | | | | |
| 4 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....43.....F | | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | START.....183.5.....ชม. | | | | |
| | STOP.....183.5.....ชม. | | | | |
| 7 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....43.....F | | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| 2 | ความถี่ | ✔ | | | |
| | ความถี่.....50.1.....HZ | | | | |
| 3 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | STOP.....183.5.....ชม. | | | | |
| | START.....183.5.....ชม. | | | | |
| 4 | วัดกระแส | ✔ | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY | ✔ | | | |
| | ไฟชาร์จ BATTERY.....27.3.....แอมป์ | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✔ | | | |

**<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>**

1.ณัฐ จันทวงษ์

---

**<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>**

---

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | RE/GEN-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | GENERATOR |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 03/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง MDB |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | ความถี่ | ✔ | | | |
| | ความถี่.....50.1.....HZ | | | | |
| 2 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | START.....184.1.....ชม. | | | | |
| | STOP.....184.1.....ชม. | | | | |
| 3 | วัดแรงดัน | ✔ | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| 4 | วัดกระแส | ✔ | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY | ✔ | | | |
| | ไฟชาร์จ BATTERY.....27.3.....แอมป์ | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 6 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....630.....ลิตร | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....40.....F | | | | |
| 2 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....47.....PSI | | | | |
| 3 | เวลา | ✔ | | | |
| | START.....15.15.....น. | | | | |
| | STOP.....15.30.....น. | | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ | ✔ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1504.....RPM | | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน | ✔ | | | |
| | START.....184.1.....ชม. | | | | |
| | STOP.....184.1.....ชม. | | | | |
| 7 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....40.....F | | | | |

**<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>**

1.ณัฐ จันทวงษ์

---

**<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>**

---

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260100005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 07/01/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....120.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....40.....F | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....955.....ชม. | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....600.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1950.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....3.0.....แอมป์ | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....380.....ลิตร | | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 04/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....3.0.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....40.....F | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....967.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....120.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....600.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1900.....RPM | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....390.....ลิตร | | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 04/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....420.....ลิตร | | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แอมมิเตอร์.....3.0.....แอมป์ | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....600.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....120.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....40.....F | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....979.....ชม. | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1900.....RPM | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบความพร้อมใช้งาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 01/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....410.....ลิตร | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....120.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....40.....F | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....989.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1900.....RPM | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....600.....PSI | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....3.0.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 06/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....995.....ชม. | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....40.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....600.....PSI | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....3.0.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....120.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1900.....RPM | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....405.....ลิตร | | | | |
| 11 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JOCKY PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260100001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 07/01/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....14.0.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....135.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JOCKY PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 04/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....11.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....135.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JOCKY PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 04/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....135.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....11.....แอมป์ | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| 9 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบความพร้อมการใช้งาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JOCKY PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400006 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 01/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....135.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....11.....แอมป์ | | | | |
| 3 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JOCKY PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 06/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....135.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....11.....แอมป์ | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 7 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JOCKY PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 03/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| B1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้อง TRANSFER PUMP ( CWP ) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | R.....0.....แอมป์ | | | | |
| | S.....0.....แอมป์ | | | | |
| | T.....0.....แอมป์ | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....11.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....385.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....386.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....386.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 7 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

1.ณัฐ จันทวงษ์

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทดสอบการทำงาน

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ใช้งานได้ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)


**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี **นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 (28 กรกฎาคม 2549) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

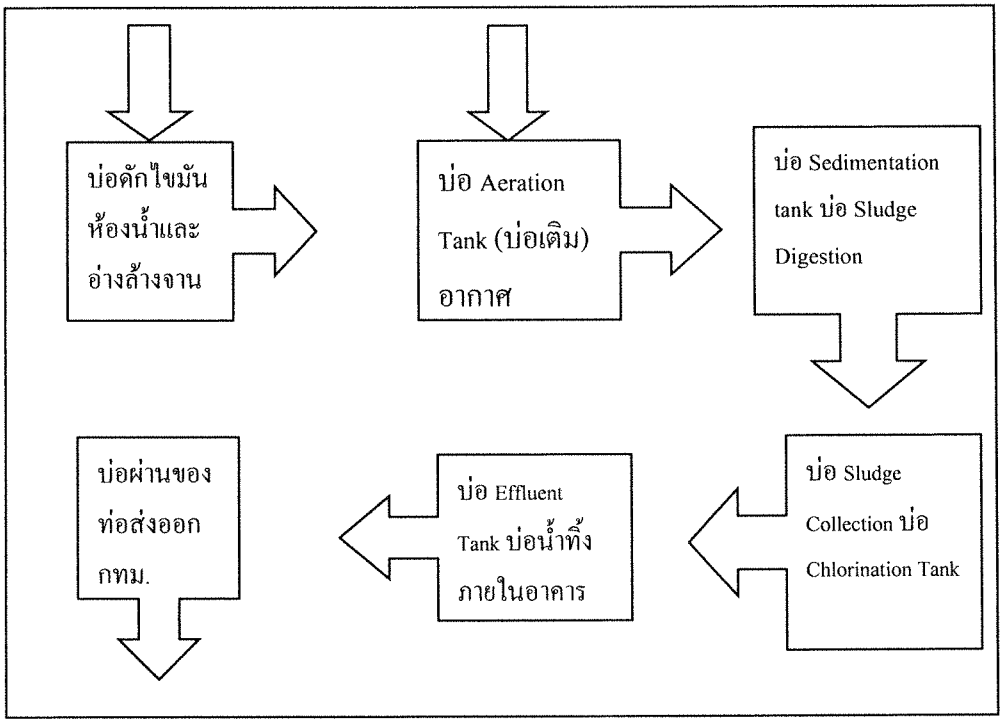


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 58 | 55.10 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 2/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 60 | 57.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 3/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 78 | 74.10 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 4/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 51 | 48.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 5/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 92 | 87.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 6/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 7/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 8/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 70 | 66.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 9/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 10/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 92 | 87.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 11/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 95 | 90.25 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 12/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 13/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 95 | 90.25 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 14/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 68 | 64.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 15/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 90 | 85.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 16/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 89 | 84.55 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 17/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 76 | 72.20 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 18/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 86 | 81.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 20/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 21/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 22/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 23/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 75 | 71.25 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 24/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 86 | 81.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 25/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 70 | 66.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 26/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 84 | 79.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 27/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 93 | 88.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 28/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 73 | 69.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 29/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 30/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 31/01/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

**หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

**๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน**

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลียงพันธุ์)

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ จันทวงษ์)

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ .....ไม่มี.....

ออกให้โดย.....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาต เลขที่ 6/2549 (28 กรกฎาคม 2549 ) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)

[redacted]..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นายณัฐ จันทวงษ์

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ. .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยแอวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..**บ่อพักตกตะกอนและเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกกทม**....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....100..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

## ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
รวมทั้งเดือน 2495.00 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
รวมทั้งเดือน 2370.25 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
ไม่ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

**คำเตือน** **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

**๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

| ประจำเดือน .มกราคม.. พ.ศ.2569 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | |
| ว/ด/ป | | ปริมาณน้ำ | น้ำบัด | เหลือ | | | | |
| 2569-01-01 | | 58 | 2.9 | 55.10 | | | | |
| 2569-01-02 | | 60 | 3 | 57.00 | | | | |
| 2569-01-03 | | 78 | 3.9 | 74.10 | | | | |
| 2569-01-04 | | 51 | 2.55 | 48.45 | | | | |
| 2569-01-05 | | 92 | 4.6 | 87.40 | | | | |
| 2569-01-06 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| 2569-01-07 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-01-08 | | 70 | 3.5 | 66.50 | | | | |
| 2569-01-09 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-01-10 | | 92 | 4.6 | 87.40 | | | | |
| 2569-01-11 | | 95 | 4.75 | 90.25 | | | | |
| 2569-01-12 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-01-13 | | 95 | 4.75 | 90.25 | | | | |
| 2569-01-14 | | 68 | 3.4 | 64.60 | | | | |
| 2569-01-15 | | 90 | 4.5 | 85.50 | | | | |
| 2569-01-16 | | 89 | 4.45 | 84.55 | | | | |
| 2569-01-17 | | 76 | 3.8 | 72.20 | | | | |
| 2569-01-18 | | 86 | 4.3 | 81.70 | | | | |
| 2569-01-19 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-01-20 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-01-21 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-01-22 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-01-23 | | 75 | 3.75 | 71.25 | | | | |
| 2569-01-24 | | 86 | 4.3 | 81.70 | | | | |
| 2569-01-25 | | 70 | 3.5 | 66.50 | | | | |
| 2569-01-26 | | 84 | 4.2 | 79.80 | | | | |
| 2569-01-27 | | 93 | 4.65 | 88.35 | | | | |
| 2569-01-28 | | 73 | 3.65 | 69.35 | | | | |
| 2569-01-29 | | 79 | 3.95 | 75.05 | | | | |
| 2569-01-30 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-01-31 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| รวม | | 2495 | 124.75 | 2370.25 | | | | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : sukhumvit plus

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1414 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : พระโขนง เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 392

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 6/2549 (28กรกฎาคม 25449) ออกให้โดย : กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นางสาวพิชญ์สุภางค์ เลียงพันธุ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 หมดอายุ ไม่มี

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,495.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,370.250 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี **นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 (28 กรกฎาคม 2549) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

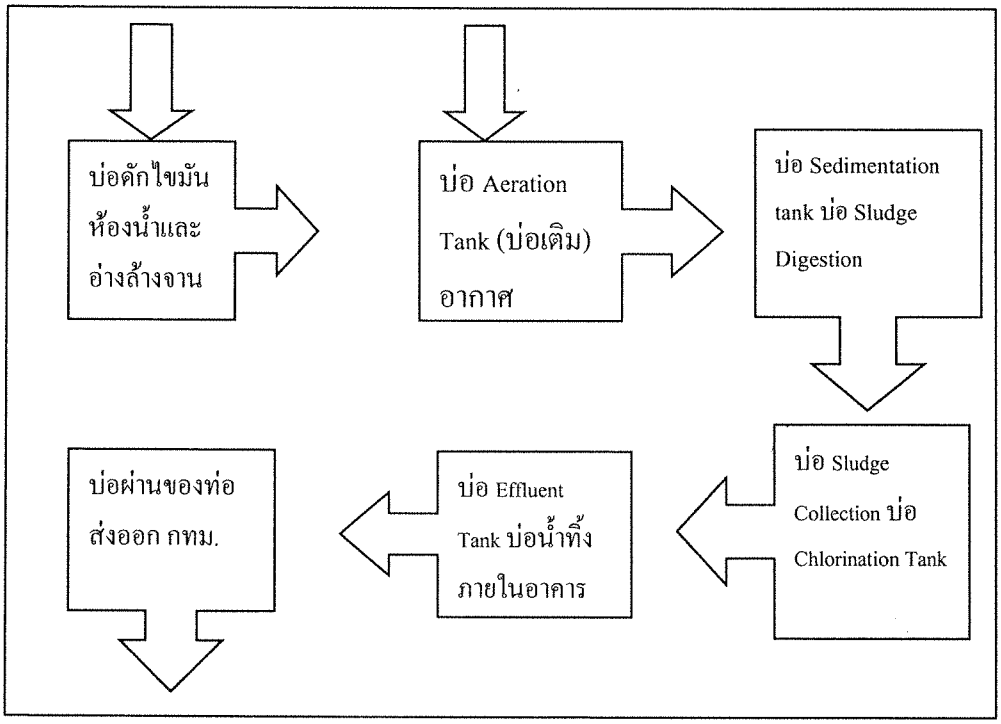


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 70 | 66.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 2/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 92 | 87.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 3/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 4/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 5/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 99 | 94.05 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 6/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 68 | 64.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 7/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 110 | 104.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 8/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 85 | 80.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 9/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 90 | 85.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 10/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 110 | 104.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 11/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 98 | 93.10 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 12/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 84 | 79.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 13/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 14/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 84 | 79.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 15/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 16/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 87 | 82.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 17/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 18/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 97 | 92.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 101 | 95.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 20/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 85 | 80.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 21/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 22/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 23/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 105 | 99.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 24/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 68 | 64.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 25/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 88 | 83.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 26/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 27/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 93 | 88.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 28/02/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวพิชญ์สุภางค์ เลี้ยงพันธุ์)

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ จันทวงษ์)

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

**๑. ข้อมูลทั่วไป**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาต เลขที่ 6/2549 (28 กรกฎาคม 2549 ) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)

..... ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นายณัฐ จันทวงษ์

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ. .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

**๒. ข้อมูลเกี่ยแอวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง**

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..**บ่อพักตกตะกอนและเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกกทม**.... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....100..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2501.00 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2375.95หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

ไม่ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

**คำเตือน** **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

**๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

| ประจำเดือน ..กุมภาพันธ์.. พ.ศ.2569 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเหนิดมลพิษ | | | | | | | | |
| ว/ด/ป | | ปริมาณน้ำ | บาบัด | เหลือ | | | | |
| 2569-02-01 | | 70 | 3.5 | 66.50 | | | | |
| 2569-02-02 | | 92 | 4.6 | 87.40 | | | | |
| 2569-02-03 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-02-04 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-02-05 | | 99 | 4.95 | 94.05 | | | | |
| 2569-02-06 | | 68 | 3.4 | 64.60 | | | | |
| 2569-02-07 | | 110 | 5.5 | 104.50 | | | | |
| 2569-02-08 | | 85 | 4.25 | 80.75 | | | | |
| 2569-02-09 | | 90 | 4.5 | 85.50 | | | | |
| 2569-02-10 | | 110 | 5.5 | 104.50 | | | | |
| 2569-02-11 | | 98 | 4.9 | 93.10 | | | | |
| 2569-02-12 | | 84 | 4.2 | 79.80 | | | | |
| 2569-02-13 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-02-14 | | 84 | 4.2 | 79.80 | | | | |
| 2569-02-15 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-02-16 | | 87 | 4.35 | 82.65 | | | | |
| 2569-02-17 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-02-18 | | 97 | 4.85 | 92.15 | | | | |
| 2569-02-19 | | 101 | 5.05 | 95.95 | | | | |
| 2569-02-20 | | 85 | 4.25 | 80.75 | | | | |
| 2569-02-21 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-02-22 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| 2569-02-23 | | 105 | 5.25 | 99.75 | | | | |
| 2569-02-24 | | 68 | 3.4 | 64.60 | | | | |
| 2569-02-25 | | 88 | 4.4 | 83.60 | | | | |
| 2569-02-26 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-02-27 | | 93 | 4.65 | 88.35 | | | | |
| 2569-02-28 | | 71 | 3.55 | 67.45 | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวม | | 2501 | 125.05 | 2375.95 | | | | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : sukhumvit plus

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1414 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : พระโขนง เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 392

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 6/2549 (28กรกฎาคม 25449) ออกให้โดย : กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพิชญศุภางค เลียงพันธุ เจาของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 หมดอายุ ไม่มี

ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,501.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,375.950 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี **นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 (28 กรกฎาคม 2549) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

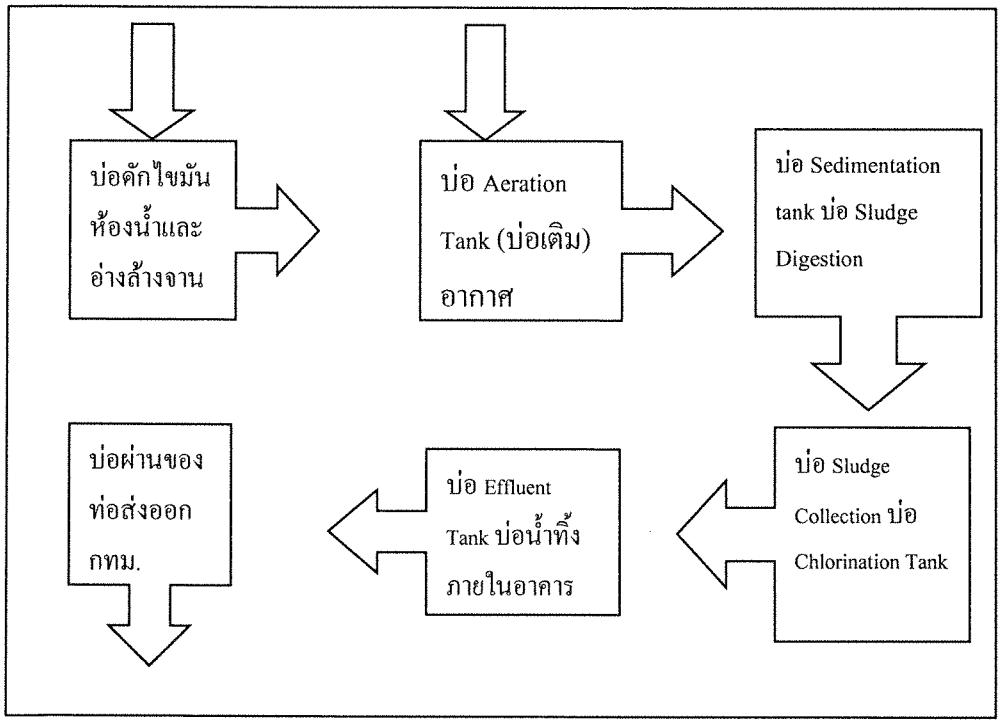


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 2/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 3/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 80 | 76.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 4/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 5/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 72 | 68.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 6/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 7/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 92 | 87.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 8/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 9/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 94 | 89.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 10/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 86 | 81.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 11/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 12/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 86 | 81.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 13/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 93 | 88.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 14/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 15/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 93 | 88.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 16/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 72 | 68.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 17/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 18/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 72 | 68.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 105 | 99.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 20/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 68 | 64.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 21/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 22/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 23/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 89 | 84.55 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 24/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 25/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 26/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 84 | 79.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 27/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 85 | 80.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 28/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 29/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 86 | 81.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 30/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 87 | 82.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 31/03/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 86 | 81.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

**หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

**๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน**

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวพิชญ์สุภางค์ เลี้ยงพันธุ์)

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ จันทวงษ์)

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาต เลขที่ 6/2549 (28 กรกฎาคม 2549 ) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... ... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)

..... ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นายณัฐ จันทวงษ์

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ. .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..**บ่อพักตกตะกอนและเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกกทม**.... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....100..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

## ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2642.00 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2509.90 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

ไม่ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

**คำเตือน** **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

**๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

| ประจำเดือน ..มีนาคม.. พ.ศ.2569 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเหนิดมลพิษ | | | | | | | | |
| ว/ด/ป | | ปริมาณน้ำ | บำบัด | เหลือ | | | | |
| 2569-03-01 | | 79 | 3.95 | 75.05 | | | | |
| 2569-03-02 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| 2569-03-03 | | 80 | 4 | 76.00 | | | | |
| 2569-03-04 | | 79 | 3.95 | 75.05 | | | | |
| 2569-03-05 | | 72 | 3.6 | 68.40 | | | | |
| 2569-03-06 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-03-07 | | 92 | 4.6 | 87.40 | | | | |
| 2569-03-08 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-03-09 | | 94 | 4.7 | 89.30 | | | | |
| 2569-03-10 | | 86 | 4.3 | 81.70 | | | | |
| 2569-03-11 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-03-12 | | 86 | 4.3 | 81.70 | | | | |
| 2569-03-13 | | 93 | 4.65 | 88.35 | | | | |
| 2569-03-14 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| 2569-03-15 | | 93 | 4.65 | 88.35 | | | | |
| 2569-03-16 | | 72 | 3.6 | 68.40 | | | | |
| 2569-03-17 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-03-18 | | 72 | 3.6 | 68.40 | | | | |
| 2569-03-19 | | 105 | 5.25 | 99.75 | | | | |
| 2569-03-20 | | 68 | 3.4 | 64.60 | | | | |
| 2569-03-21 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-03-22 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-03-23 | | 89 | 4.45 | 84.55 | | | | |
| 2569-03-24 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-03-25 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-03-26 | | 84 | 4.2 | 79.80 | | | | |
| 2569-03-27 | | 85 | 4.25 | 80.75 | | | | |
| 2569-03-28 | | 77 | 3.85 | 73.15 | | | | |
| 2569-03-29 | | 86 | 4.3 | 81.70 | | | | |
| 2569-03-30 | | 87 | 4.35 | 82.65 | | | | |
| 2569-03-31 | | 86 | 4.3 | 81.70 | | | | |
| รวม | | 2642 | 132.1 | 2509.90 | | | | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : sukhumvit plus

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1414 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : พระโขนง เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 392

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 6/2549 (28กรกฎาคม 25449) ออกให้โดย : กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพิชญศุภางค์ เลียงพันธุ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,642.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,509.900 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ หน่วย |
|---|---|
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี **นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 (28 กรกฎาคม 2549) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

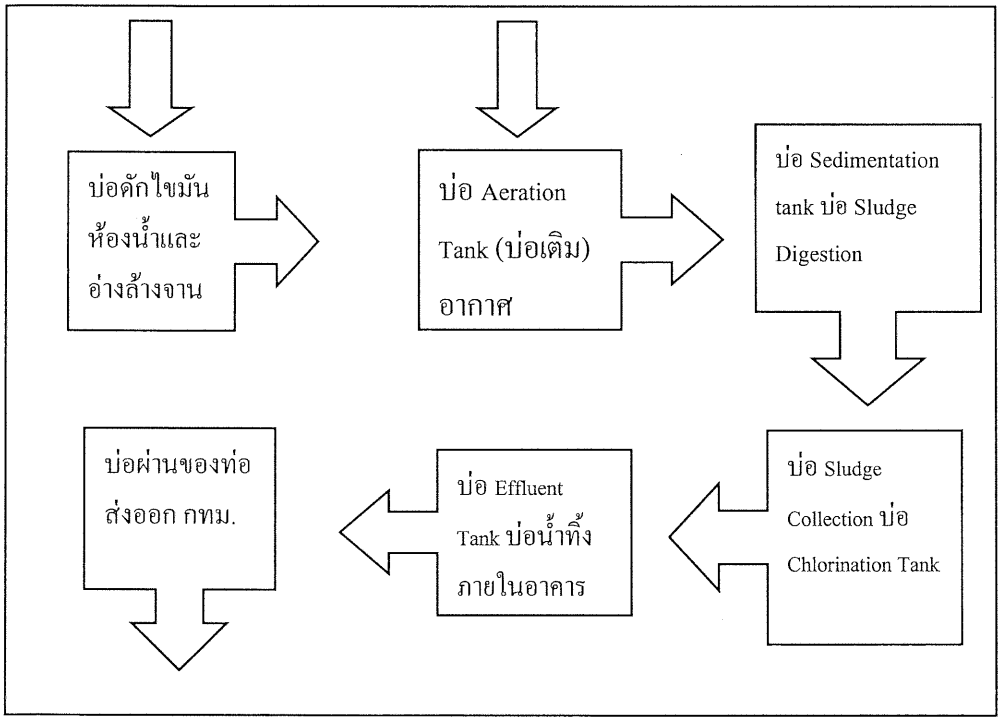


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 70 | 66.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 2/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 93 | 88.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 3/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 4/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 92 | 87.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 5/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 6/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 7/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 66 | 62.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 8/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 84 | 79.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 9/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 88 | 83.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 10/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 92 | 87.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 11/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 12/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 80 | 76.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 13/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 65 | 61.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 14/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 65 | 61.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 15/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 16/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 67 | 63.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 17/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 72 | 68.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 18/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 76 | 72.20 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 20/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 69 | 65.55 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 21/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 104 | 98.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 22/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 76 | 72.20 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 23/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 97 | 92.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 24/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 72 | 68.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 25/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 90 | 85.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 26/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 27/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 76 | 72.20 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 28/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 74 | 70.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 29/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 98 | 93.10 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 30/04/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 76 | 72.20 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวพิชญ์สุภางค์ เลียงพันธุ์)

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)



..... ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ จันทวงษ์)

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

**๑. ข้อมูลทั่วไป**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาต เลขที่ 6/2549 (28 กรกฎาคม 2549 ) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ...ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)

..... [redacted] ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นายณัฐ จันทวงษ์

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ. .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

**๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง**

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..**บ่อพักตกตะกอนและเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกกทม.**... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....100..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

**๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน**

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2435.00 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2313.25 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

ไม่ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. **เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

| ประจำเดือน ..เมษายน.. พ.ศ.2569 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเหนิดมลพิษ | | | | | | | | |
| ว/ด/ป | | ปริมาณน้ำ | บำบัด | เหลือ | | | | |
| 2569-04-01 | | 70 | 3.5 | 66.50 | | | | |
| 2569-04-02 | | 93 | 4.65 | 88.35 | | | | |
| 2569-04-03 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-04-04 | | 92 | 4.6 | 87.40 | | | | |
| 2569-04-05 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-04-06 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-04-07 | | 66 | 3.3 | 62.70 | | | | |
| 2569-04-08 | | 84 | 4.2 | 79.80 | | | | |
| 2569-04-09 | | 88 | 4.4 | 83.60 | | | | |
| 2569-04-10 | | 92 | 4.6 | 87.40 | | | | |
| 2569-04-11 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-04-12 | | 80 | 4 | 76.00 | | | | |
| 2569-04-13 | | 65 | 3.25 | 61.75 | | | | |
| 2569-04-14 | | 65 | 3.25 | 61.75 | | | | |
| 2569-04-15 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| 2569-04-16 | | 67 | 3.35 | 63.65 | | | | |
| 2569-04-17 | | 72 | 3.6 | 68.40 | | | | |
| 2569-04-18 | | 76 | 3.8 | 72.20 | | | | |
| 2569-04-19 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-04-20 | | 69 | 3.45 | 65.55 | | | | |
| 2569-04-21 | | 104 | 5.2 | 98.80 | | | | |
| 2569-04-22 | | 76 | 3.8 | 72.20 | | | | |
| 2569-04-23 | | 97 | 4.85 | 92.15 | | | | |
| 2569-04-24 | | 72 | 3.6 | 68.40 | | | | |
| 2569-04-25 | | 90 | 4.5 | 85.50 | | | | |
| 2569-04-26 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-04-27 | | 76 | 3.8 | 72.20 | | | | |
| 2569-04-28 | | 74 | 3.7 | 70.30 | | | | |
| 2569-04-29 | | 98 | 4.9 | 93.10 | | | | |
| 2569-04-30 | | 76 | 3.8 | 72.20 | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวม | | 2435 | 121.75 | 2313.25 | | | | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : sukhumvit plus

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1414 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : พระโขนง เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 392

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 6/2549 (28กรกฎาคม 25449) ออกให้โดย : กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพิชญสุภางค์ เลียงพันธุ เจาของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 หมดอายุ ไม่มี

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,435.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,313.250 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี **นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 (28 กรกฎาคม 2549) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

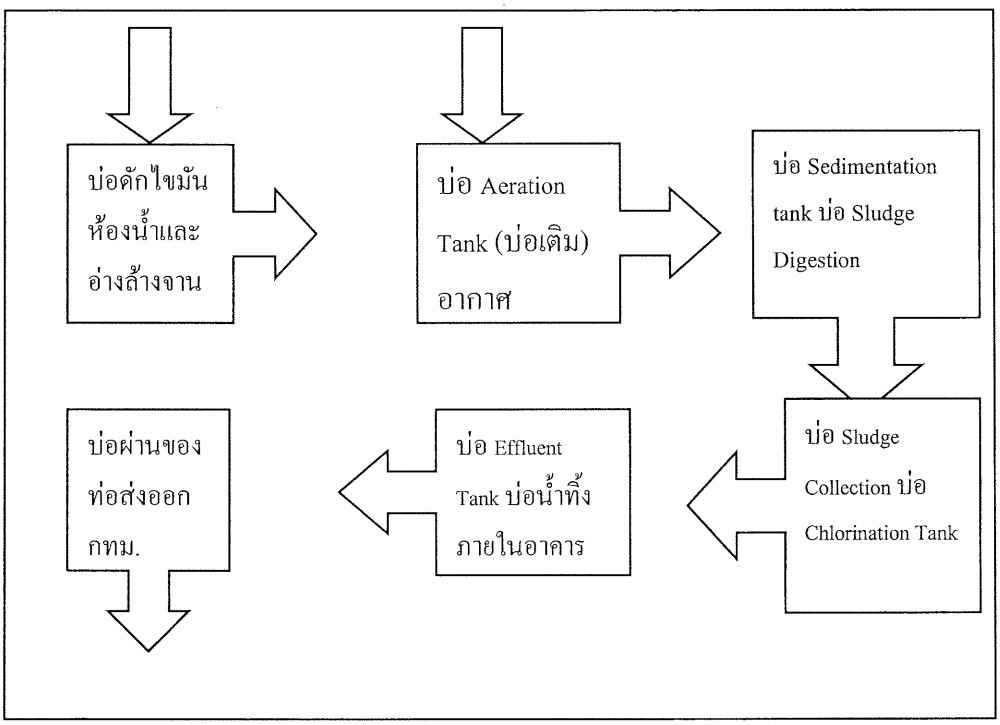


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 90 | 85.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 2/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 69 | 65.55 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 3/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 70 | 66.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 4/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 74 | 70.30 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 5/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 96 | 91.20 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 6/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 7/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 90 | 85.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 8/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 66 | 62.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 9/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 10/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 108 | 102.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 11/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 12/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 85 | 80.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 13/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 87 | 82.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 14/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 80 | 76.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 15/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 67 | 63.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 16/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 78 | 74.10 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 17/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 75 | 71.25 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 18/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 76 | 72.20 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 20/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 84 | 79.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 21/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 97 | 92.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 22/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 80 | 76.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 23/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 24/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 25/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 26/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 80 | 76.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 27/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 73 | 69.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ๘ ลบ.ม. | ไม่มี | ณัฐ |
| 28/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 107 | 101.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 29/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 63 | 59.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 30/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 84 | 79.80 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 31/05/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์)

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ จันทวงษ์)

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาต เลขที่ 6/2549 (28 กรกฎาคม 2549 ) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)

..... ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นายณัฐ จันทวงษ์

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ. .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..**บ่อพักตกตะกอนและเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกกทม**.... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....100..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อระบายน้ำ กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

.....ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด.....

## ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2507.00 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2381.65 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

ไม่ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

8 ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

**คำเตือน** **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

**๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

| ประจำเดือน ..พฤษภาคม.. พ.ศ.2569 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | |
| **ว/ด/ป** | | ปริมาณน้ำ | บำบัด | เหลือ | | | | |
| 1/5/2569 | | 90 | 4.5 | 85.50 | | | | |
| 2/5/2569 | | 69 | 3.45 | 65.55 | | | | |
| 3/5/2569 | | 70 | 3.5 | 66.50 | | | | |
| 4/5/2569 | | 74 | 3.7 | 70.30 | | | | |
| 5/5/2569 | | 96 | 4.8 | 91.20 | | | | |
| 6/5/2569 | | 71 | 3.55 | 67.45 | | | | |
| 7/5/2569 | | 90 | 4.5 | 85.50 | | | | |
| 8/5/2569 | | 66 | 3.3 | 62.70 | | | | |
| 9/5/2569 | | 79 | 3.95 | 75.05 | | | | |
| 10/5/2569 | | 108 | 5.4 | 102.60 | | | | |
| 11/5/2569 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 12/5/2569 | | 85 | 4.25 | 80.75 | | | | |
| 13/5/2569 | | 87 | 4.35 | 82.65 | | | | |
| 14/5/2569 | | 80 | 4 | 76.00 | | | | |
| 15/5/2569 | | 67 | 3.35 | 63.65 | | | | |
| 16/5/2569 | | 78 | 3.9 | 74.10 | | | | |
| 17/5/2569 | | 75 | 3.75 | 71.25 | | | | |
| 18/5/2569 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 19/5/2569 | | 76 | 3.8 | 72.20 | | | | |
| 20/5/2569 | | 84 | 4.2 | 79.80 | | | | |
| 21/5/2569 | | 97 | 4.85 | 92.15 | | | | |
| 22/5/2569 | | 80 | 4 | 76.00 | | | | |
| 23/5/2569 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 24/5/2569 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| 25/5/2569 | | 79 | 3.95 | 75.05 | | | | |
| 26/5/2569 | | 80 | 4 | 76.00 | | | | |
| 27/5/2569 | | 73 | 3.65 | 69.35 | | | | |
| 28/5/2569 | | 107 | 5.35 | 101.65 | | | | |
| 29/5/2569 | | 63 | 3.15 | 59.85 | | | | |
| 30/5/2569 | | 84 | 4.2 | 79.80 | | | | |
| 31/5/2569 | | 71 | 3.55 | 67.45 | | | | |
| รวม | | 2507 | 125.35 | 2381.65 | | | | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : sukhumvit plus

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1414 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : พระโขนง เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 392

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 6/2549 (28กรกฎาคม 25449) ออกให้โดย : กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพิชญศุภางค เลียงพันธุ เจาของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 หมดอายุ ไม่มี

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,507.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,381.650 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี **นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 (28 กรกฎาคม 2549) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

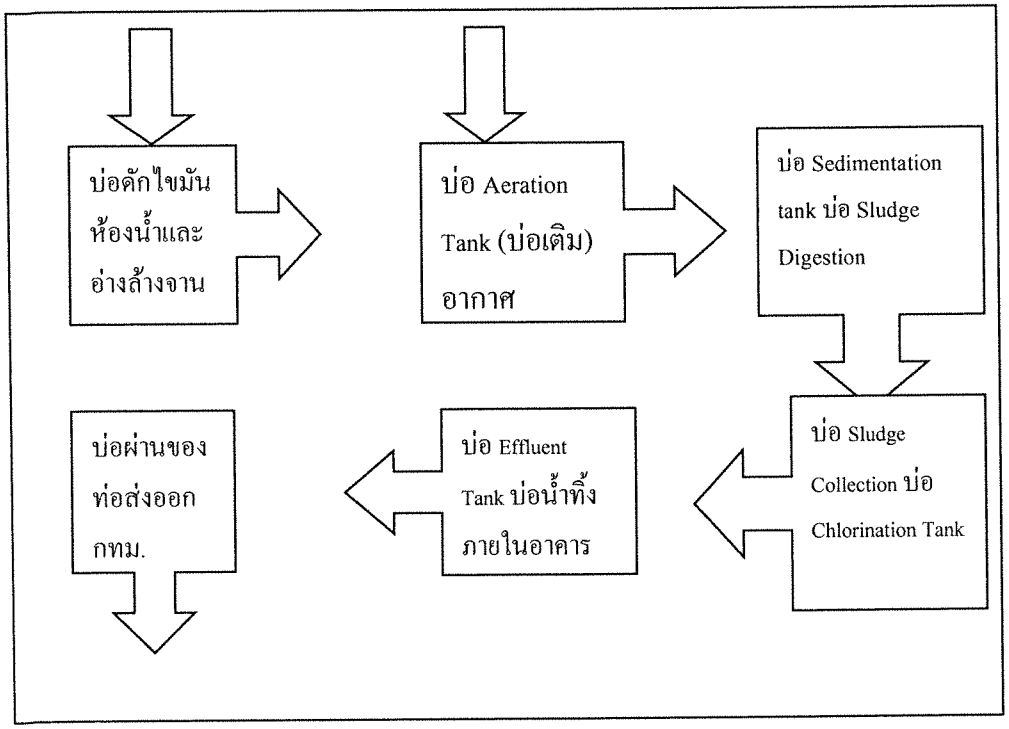


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 65 | 61.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 2/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 65 | 61.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 3/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 80 | 76.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 4/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 5/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 67 | 63.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 6/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 7/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 67 | 63.65 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 8/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 9/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 10/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 57 | 54.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 11/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 12/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 13/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 66 | 62.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 14/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 93 | 88.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 15/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 65 | 61.75 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 16/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 17/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 18/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 88 | 83.60 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 91 | 86.45 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 20/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 70 | 66.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 21/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 22/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 73 | 69.35 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 23/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 100 | 95.00 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 24/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 82 | 77.90 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 25/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 83 | 78.85 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 26/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 75 | 71.25 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 27/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 97 | 92.15 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 28/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 70 | 66.50 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 29/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 92 | 87.40 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| 30/06/69 | ไม่มี มิเตอร์ | 86 | 81.70 | ระบาย | ไม่ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยังไม่สูบ | ไม่มี | ณัฐ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลียงพันธุ์.....)

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)

..... ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ จันทวงษ์.....)

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....


แบบ ทส. ๒

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

**๑. ข้อมูลทั่วไป**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1414 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-712-1724-25 โทรสาร 02-712-1725 มี นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาต เลขที่ 6/2549 (28 กรกฎาคม 2549 ) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี


ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นายณัฐ จันทวงษ์

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... 06/2549..... หมดอายุ. .....ไม่มี.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

**๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง**

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..**บ่อพักตกตะกอนและเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกกทม**.... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....100..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อระบายน้ำ กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

.....ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2356.00 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2238.20 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

ไม่ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

**คำเตือน** **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

**๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

| ประจำเดือน .มิถุนายน.. พ.ศ.2569 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเหนิดมลพิษ | | | | | | | | |
| ว/ด/ป | | ปริมาณน้ำ | บำบัด | เหลือ | | | | |
| 2569-06-01 | | 65 | 3.25 | 61.75 | | | | |
| 2569-06-02 | | 65 | 3.25 | 61.75 | | | | |
| 2569-06-03 | | 80 | 4 | 76.00 | | | | |
| 2569-06-04 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-06-05 | | 67 | 3.35 | 63.65 | | | | |
| 2569-06-06 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-06-07 | | 67 | 3.35 | 63.65 | | | | |
| 2569-06-08 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-06-09 | | 81 | 4.05 | 76.95 | | | | |
| 2569-06-10 | | 57 | 2.85 | 54.15 | | | | |
| 2569-06-11 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-06-12 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-06-13 | | 66 | 3.3 | 62.70 | | | | |
| 2569-06-14 | | 93 | 4.65 | 88.35 | | | | |
| 2569-06-15 | | 65 | 3.25 | 61.75 | | | | |
| 2569-06-16 | | 77 | 3.85 | 73.15 | | | | |
| 2569-06-17 | | 77 | 3.85 | 73.15 | | | | |
| 2569-06-18 | | 88 | 4.4 | 83.60 | | | | |
| 2569-06-19 | | 91 | 4.55 | 86.45 | | | | |
| 2569-06-20 | | 70 | 3.5 | 66.50 | | | | |
| 2569-06-21 | | 77 | 3.85 | 73.15 | | | | |
| 2569-06-22 | | 73 | 3.65 | 69.35 | | | | |
| 2569-06-23 | | 100 | 5 | 95.00 | | | | |
| 2569-06-24 | | 82 | 4.1 | 77.90 | | | | |
| 2569-06-25 | | 83 | 4.15 | 78.85 | | | | |
| 2569-06-26 | | 75 | 3.75 | 71.25 | | | | |
| 2569-06-27 | | 97 | 4.85 | 92.15 | | | | |
| 2569-06-28 | | 70 | 3.5 | 66.50 | | | | |
| 2569-06-29 | | 92 | 4.6 | 87.40 | | | | |
| 2569-06-30 | | 86 | 4.3 | 81.70 | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวม | | 2356 | 117.8 | 2238.20 | | | | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : sukhumvit plus

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1414 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : พระโขนง เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 392

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 6/2549 (28กรกฎาคม 25449) ออกให้โดย : กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพิชญ์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 06/2549 หมดอายุ ไม่มี

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,356.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,238.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# เอกสารแนบ 4

# เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334


# ANALYSIS REPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NAME | : สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม | | |
| ADDRESS | : เลขที่ 1414 ซอย สุขุมวิท พลัส 1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. | | |
| SAMPLING LOCATION | : บ่อพักน้ำเสีย (ตึก A) | | |
| SAMPLING METHOD | : GRAB | | |
| SAMPLING CONDITION | : NORMAL | REPORT NO. | : RN260410872 |
| CHARACTERISTICS OF WATER | : เหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย | SAMPLING SOURCE | : WASTEWATER |
| SAMPLING DATE | : APRIL 30, 2026 | RECEIVED DATE | : APRIL 30, 2026 |
| SAMPLING TIME | : 13:00 | ANALYTICAL DATE | : APRIL 30 - MAY 8 , 2026 |
| SAMPLING BY | : นายโกวิท บุหา | REPORT DATE | : May 11, 2026 |

| PARAMETER | UNIT | METHODS OF ANALYSIS | RESULT | MDL | STANDARD* |
|---|---|---|---|---|---|
| pH# | - | Electrometric (SM: 4500-$H^+$ B.) | 7.1 at 25°C | - | - |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/l | Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.) | 100.0 | - | - |
| Total Suspended Solids# | mg/l | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) | 40.0 | - | - |
| Oil & Grease | mg/l | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.) | 1.0 | - | - |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 ml | MPN Test | $>2.4 \times 10^6$ | - | - |

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

# ANALYSIS REPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NAME | : สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม | | |
| ADDRESS | : เลขที่ 1414 ซอย สุขุมวิท พลัส 1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. | | |
| SAMPLING LOCATION | : บ่อน้ำใส (ตึก A) | | |
| SAMPLING METHOD | : GRAB | | |
| SAMPLING CONDITION | : NORMAL | REPORT NO. | : RN260410873 |
| CHARACTERISTICS OF WATER | : เหลือง ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น | SAMPLING SOURCE | : WASTEWATER |
| SAMPLING DATE | : APRIL 30, 2026 | RECEIVED DATE | : APRIL 30, 2026 |
| SAMPLING TIME | : 13:00 | ANALYTICAL DATE | : APRIL 30 - MAY 8 , 2026 |
| SAMPLING BY | : นายโกวิท บุหา | REPORT DATE | : May 11, 2026 |

| PARAMETER | UNIT | METHODS OF ANALYSIS | RESULT | MDL | STANDARD* |
|---|---|---|---|---|---|
| pH# | - | Electrometric (SM: 4500-$H^+$ B.) | 7.0 at 25°C | - | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/l | Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.) | 41.0 | - | ≤30 |
| Total Suspended Solids# | mg/l | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) | 15.0 | - | ≤40 |
| Oil & Grease | mg/l | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.) | 0.6 | - | ≤20 |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 ml | MPN Test | $2.1 \times 10^5$ | - | - |

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

# ANALYSIS REPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NAME | : สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม | | |
| ADDRESS | : เลขที่ 1414 ซอย สุขุมวิท พลัส 1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. | | |
| SAMPLING LOCATION | : บ่อพักน้ำเสีย (ตึก B) | | |
| SAMPLING METHOD | : GRAB | | |
| SAMPLING CONDITION | : NORMAL | REPORT NO. | : RN260410874 |
| CHARACTERISTICS OF WATER | : เหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน ไม่มีกลิ่น | SAMPLING SOURCE | : WASTEWATER |
| SAMPLING DATE | : APRIL 30, 2026 | RECEIVED DATE | : APRIL 30, 2026 |
| SAMPLING TIME | : 13:00 | ANALYTICAL DATE | : APRIL 30 - MAY 8 , 2026 |
| SAMPLING BY | : นายโกวิท บุหา | REPORT DATE | : May 11, 2026 |

| PARAMETER | UNIT | METHODS OF ANALYSIS | RESULT | MDL | STANDARD* |
|---|---|---|---|---|---|
| pH# | - | Electrometric (SM: 4500-$H^+$ B.) | 6.4 at 25°C | - | - |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/l | Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.) | 124.0 | - | - |
| Total Suspended Solids# | mg/l | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) | 24.0 | - | - |
| Oil & Grease | mg/l | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.) | 1.0 | - | - |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 ml | MPN Test | >2.4 x $10^6$ | - | - |

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

# ANALYSIS REPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NAME | : สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม | | |
| ADDRESS | : เลขที่ 1414 ซอย สุขุมวิท พลัส 1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. | | |
| SAMPLING LOCATION | : บ่อน้ำใส (ตึก B) | | |
| SAMPLING METHOD | : GRAB | | |
| SAMPLING CONDITION | : NORMAL | REPORT NO. | : RN260410875 |
| CHARACTERISTICS OF WATER | : เหลือง ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น | SAMPLING SOURCE | : WASTEWATER |
| SAMPLING DATE | : APRIL 30, 2026 | RECEIVED DATE | : APRIL 30, 2026 |
| SAMPLING TIME | : 13:00 | ANALYTICAL DATE | : APRIL 30 - MAY 8 , 2026 |
| SAMPLING BY | : นายโกวิท บุหา | REPORT DATE | : May 11, 2026 |

| PARAMETER | UNIT | METHODS OF ANALYSIS | RESULT | MDL | STANDARD* |
|---|---|---|---|---|---|
| pH# | - | Electrometric (SM: 4500-$H^+$ B.) | 6.4 at 25°C | - | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/l | Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.) | 108.0 | - | ≤30 |
| Total Suspended Solids# | mg/l | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) | 24.0 | - | ≤40 |
| Oil & Grease | mg/l | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.) | 1.0 | - | ≤20 |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 ml | MPN Test | $>2.4 \times 10^6$ | - | - |

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

เอกสารแนบ 5

# หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

| | |
|---|---|
| ๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวปนัดดา พันธ์กะจับ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวจามจุรี คำปุย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

| | |
|---|---|
| ๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวภานุชนารถ เชี่ยวชาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันวิสา หวังแววกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายปริญญา กล่ำน้อย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นายโกวิท บุพา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นายพีรพล ถวิลหวัง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙ |

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| 1 | Biochemical Oxygen Demand | 1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] |
| | | 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2] |
| 2 | Free Chlorine | Iodometric Method[2] |
| 3 | Oil & Grease | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2] |
| 4 | pH | Electrometric Method[2] |
| 5 | Sulfide | Iodometric Method[2] |
| 6 | Temperature | Laboratory and Field Methods[2] |
| 7 | Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C[2] |
| 8 | Total Kjeldahl Nitrogen | Macro-Kjeldahl Method[2] |
| 9 | Total Suspended Solids | Dried from 103 to 105 °C[2] |

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| 1 | Carbon Monoxide | Instrument Analyzer Method[3] |
| 2 | Opacity | Ringelmann's Method[1] |
| 3 | Oxides of Nitrogen | Instrument Analyzer Method[3] |
| 4 | Sulfur Dioxide | Instrument Analyzer Method[3] |
| 5 | Total Suspended Particulate | Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3] |

เอกสารอ้างอิง


1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

# ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

***ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด***
***เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ***
***เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600***

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

**หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334**

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : ***10 มกราคม 2568***
หมดอายุ วันที่ :
ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

# ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

| ลำดับที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|---|---|---|---|
| 2 | น้ำเสีย | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>4.0 ถึง 10.0 | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-$H^+$ B |
| | | - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>10 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D |
| | | - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C<br>100 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C |

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ : [redacted]

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

# ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

| ลำดับที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|---|---|---|---|
| 1 | น้ำ | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>6.0 ถึง 9.0 | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-$H^+$ B |
| | | - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>10 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D |
| | | - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C<br>100 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

# เอกสารแนบ 6

# เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

*Accredited calibration laboratory*
*ISO/IEC 17025:2017*
*NSC-TISI-TIS 17025*
*CALIBRATION 0367*

*Temperature measurement laboratory*
*Calibration services department.*

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

# CERTIFICATE OF CALIBRATION

**Certificate No.** : **CDT-033-69**



| | |
|---|---|
| **MEASUREMENT ITEM** | : Digital thermometer with sensor |
| **MANUFACTURER** | : Digicon |
| **MODEL/TYPE** | : DP-72 |
| **SERIAL NUMBER** | : 425066647 |
| **ID NUMBER** | : - |
| **CONDITION AS-RECEIVED** | : Used item |
| **CUSTOMER** | : OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd.<br>67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1, Petchakasem Rd,<br>Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 |
| **RECEIVED DATE** | : 19 Jan 2026 |
| **MEASUREMENT DATE** | : 28-29 Jan 2026 |
| **ISSUE DATE** | : 30 Jan 2026 |

**ENVIRONMENTAL CONDITIONS:**
Ambient condition in the laboratory are as follow:

| | | |
|---|---|---|
| Temperature | : 23.0 ± 3.0 | °C |
| Relative Humidity | : 55.0 ± 15.0 | %RH |

***NOTED:*** *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

**TABULATION OF RESULTS:**
The table on next page give the measured values.

***Calibration procedure:***
*The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.*

***Traceability:***
*The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-1013-25, Certificate number: ER-0061-25.*

***Reference Used During Calibration:***
*1. Standard Temperature Probe*
*Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09, Due date: 9 Apr 2026*
*2. Digital Temperature Indicator*
*Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 22 Apr 2026*

***Uncertainty of Measurement:***
*The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'*

**Calibrated by:**
☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

**Approved signatory:**

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

**Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-033-69**



**Result of Calibration:** ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

**Calibration Range:** 4 ˚C to 180 ˚C

**Function:**

**Table 1: This equipment was connected with Thermocouple Type K Model: TP-01 S/N: 1280000607. Dimension: Diameter 1.50 mm. Length 1000 mm.**

| Immersion Depth (mm) | Standard Reading (˚C) | UUC Reading (˚C) | Error (˚C) | Uncertainty (˚C) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 4.085 | 4.0 | -0.1 | 0.26 |
| 70 | 20.058 | 19.9 | -0.1 | 0.26 |
| 70 | 79.924 | 79.9 | 0.0 | 0.38 |
| 70 | 103.983 | 104.6 | 0.6 | 0.54 |
| 70 | 149.951 | 150.7 | 0.7 | 0.54 |
| 70 | 179.931 | 180.3 | 0.3 | 0.74 |

**UUC*:** Unit Under Calibration

*****End of Certificate of Calibration*****

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

**Hanna Instruments (Thailand) Ltd.**

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

**Certificate No. :** C26020021



# CERTIFICATE OF CALIBRATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Equipment** | : | pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity | | |
| **Meter Model** | : | HI5521-02 | **Serial No.** | : 04160019101 |
| **Probe Model** | : | HI7662-W | **Serial No.** | : 0615024N |
| **Resolution** | : | 0.1 °C | **Temperature Range** | : ( -20 to 120 )°C |
| **Manufacturer** | : | Hanna Instruments | **Made in** | : Romania |
| **Condition As-Received** | : | Used Product | **Reference** | : RE260170 |
| **Ambient Temperature** | : | ( 25 ± 2 )°C | **Relative Humidity** | : ( 50 ± 15 )%RH |
| **Customer name** | : | Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.<br>67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,<br>Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand | | |
| **Received date** | : | 30 January 2026 | | |
| **Calibrate date** | : | 4 February 2026 | | |
| **Issue date** | : | 6 February 2026 | | |
| **Calibrated Location** | : | Hanna Instruments (Thailand) Ltd. | | |
| **Calibration Method** | : | This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments. | | |

**Calibrated by** : Mr. Pichit Petthong

**Approved by :**

Authorized Signatory

Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

**Condition of this calibration result :**

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Traceable |
|---|---|---|---|---|
| Digital Thermo-Hygrometer | HT-771SD | AI.07155 | 26H106 | Technology Promotion Association (Thailand-Japan) |
| Temperature Block Calibrator | CTC-155A | 723705-01938 | T26-0057 | Unithai Group Co.,Ltd. |

**Calibration Result :**

Function : Temperature Measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

| Nominal Value (°C) | Standard Setting (°C) | UUC Reading (°C) | Error (°C) | Uncertainty (± °C) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.00 | 20.0 | 0.00 | 0.18 |
| 25 | 25.00 | 25.0 | 0.00 | 0.18 |
| 30 | 30.00 | 30.0 | 0.00 | 0.18 |

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MT26-1559
**Page** : 1 of 2

**Customer** : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
**Address** : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

**Description** : Refrigerator
**Manufacturer** : Sanden
**Model** : SPB0500
**Serial No.** : SPB0500-231007454
**Identification No.** : N/A
**Calibration Place** : Laboratory

**Order No.** : 0336/26
**Received date** : Jan 29, 2026
**Calibration date** : Jan 29, 2026
**Environment Condition :**
**Temperature** : ( 25+/-10 ) °C
**Humidity** : ( 50+/-30 ) %RH

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

**Reference Standard Instruments :**

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor | 34972A | MY57003222 | MT25-5590 | Jul 23, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor ( k ) = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

**Calibrated by :** Mr.Kriengkrai Jomthaisong

**Approved by :**

**Issue date :**

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025



**Function** : Temperature measurement
**Calibration point** : 4 °C
**Result** : Without adjustment
**Resolution** : 1 °C

| Calibration point | Temperature of UUC* at each position ( °C ) | | | | | | | | | Uncertainty of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( °C ) | Ch.1 | Ch.2 | Ch.3 | Ch.4 | Ch.5 | Ch.6 | Ch.7 | Ch.8 | Ch.9 | ( +/- °C ) |
| 4 | 4.756 | 5.042 | 4.964 | 4.852 | 4.949 | 4.889 | 4.954 | 4.858 | 4.816 | 0.66 |

| Setting temperature ( °C ) | Indicating Temperature ( °C ) | Measured stability ( +/- °C ) | Measured uniformity ( °C ) | Overall variation ( °C ) |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.8 to 4.9 | 0.21 | 0.36 | 0.54 |

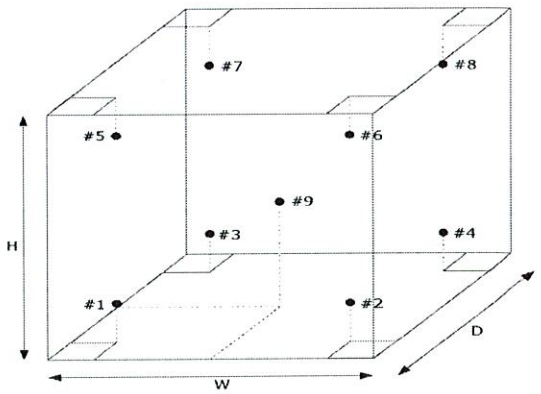


#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

**Front view**

**UUC*** = Unit under calibration
**Uniformity** = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
**Overall Variation** = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
**Stability** = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

**Hanna Instruments (Thailand) Ltd.**

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

**Certificate No. :** C26020019



# CERTIFICATE OF CALIBRATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Equipment** | : | pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter | | |
| **Meter Model** | : | HI5521-02 | **Serial No.** | : 04160019101 |
| **Probe Model** | : | HI1131B | **Serial No.** | : 11271C0N |
| **Resolution (pH)** | : | 0.01 pH | **Resolution (mV)** | : 0.1 mV |
| **Manufacturer** | : | Hanna Instruments | **Made in** | : Romania |
| **Condition As-Received** | : | Used Product | **Reference** | : RE260169 |
| **Ambient Temperature** | : | ( 25 ± 2 )°C | **Relative Humidity** | : ( 50 ± 15 )%RH |
| **Customer name** | : | Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.<br>67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,<br>Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand | | |
| **Received date** | : | 30 January 2026 | | |
| **Calibrate date** | : | 4 February 2026 | | |
| **Issue date** | : | 6 February 2026 | | |
| **Calibrated Location** | : | Hanna Instruments (Thailand) Ltd. | | |
| **Calibration Method** | : | This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure<br>CP-01, CP-02 by using standard voltage calibrator and certified reference material (CRM). | | |

**Calibrated by** : Mr. Pichit Petthong

**Approved by :**

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

**Condition of this calibration result :**

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Traceable |
|---|---|---|---|---|
| Thermometer with sensor | HI98509 | 39643D | 25T1021 | Technology Promotion Association (Thailand-Japan) |
| Digital Thermo-Hygrometer | HT-771SD | AI.07155 | 26H106 | |
| Documenting Process Calibrator | Fluke 753 | 43160061 | 25E2838 | |

2. Reference Standard Materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

| Buffer Solution | Manufacture | Certified Value | Lot Number | Exp. date |
|---|---|---|---|---|
| pH 4.0 | CPA chem Ltd. | 4.007 ± 0.006@25°C | 1086537 | 26 April 2026 |
| pH 7.0 | CPA chem Ltd. | 6.988 ± 0.007@25°C | 1138616 | 28 August 2026 |
| pH 10.0 | CPA chem Ltd. | 10.011 ± 0.008@25°C | 1086538 | 26 April 2026 |

**Calibration Result :**

1. Electrical Potential (without electrode) - DC Voltage measurement

Performing standard curve by Simulator at: (-177.5, 0.0, 177.5) mV

| Unit Under Calibration | Nominal Value | Standard Voltage Input | Average Reading | | Uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|
| | (pH) | (mV) | (mV) | (pH) | (± mV) |
| Meter S/N: 04160019101 | 4.01 | 177.50 | 177.5 | 4.01 | 0.097 |
| | 7.01 | 0.00 | 0.0 | 7.01 | 0.058 |
| | 10.01 | -177.50 | -177.5 | 10.01 | 0.097 |

2. Performance of electrode system (with electrode)

Performing standard curve by using buffer nominal : pH (4,7,10)

| Unit Under Calibration | Standard pH Buffer Solution | Average Reading | | Error | Uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (pH) | (mV) | (pH) | (± pH) |
| Electrode S/N: 11271C0N | 4.007 | 4.00 | 165.5 | -0.007 | 0.011 |
| | 6.988 | 6.98 | -2.8 | -0.008 | 0.010 |
| | 10.011 | 10.01 | -166.1 | -0.001 | 0.014 |

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

**Hanna Instruments (Thailand) Ltd.**

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

**Certificate No. :** C26020020



# CERTIFICATE OF CALIBRATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Equipment** | : | pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter | | |
| **Meter Model** | : | HI5521-02 | **Serial No.** | : 04160019101 |
| **Probe Model** | : | HI76312 | **Serial No.** | : 0614117M |
| **Resolution (EC)** | : | 0.01 µS/cm | **Resolution (EC)** | : 0.001 mS/cm |
| **Manufacturer** | : | Hanna Instruments | **Made in** | : Romania |
| **Condition As-Received** | : | Used Product | **Reference** | : RE260169 |
| **Ambient Temperature** | : | ( 25 ± 2 )°C | **Relative Humidity** | : ( 50 ± 15 )%RH |
| **Customer name** | : | Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.<br>67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,<br>Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand | | |
| **Received date** | : | 30 January 2026 | | |
| **Calibrate date** | : | 16 February 2026 | | |
| **Issue date** | : | 17 February 2026 | | |
| **Calibrated Location** | : | Hanna Instruments (Thailand) Ltd. | | |
| **Calibration Method** | : | This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-03 by using certified reference material (CRM). | | |

**Calibrated by** : Mr. Pichit Petthong

**Approved by :**

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

**Condition of this calibration result :**

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Traceable |
|---|---|---|---|---|
| Thermometer with sensor | HI98509 | 39643D | 25T1021 | Technology Promotion Association (Thailand-Japan) |
| Digital Thermo-Hygrometer | HT-771SD | AI.07155 | 26H106 | |

2. Reference Standard Materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

| Buffer Solution | Manufacture | Certified Value | Lot Number | Exp. date |
|---|---|---|---|---|
| 84 µS/cm | CPA chem Ltd. | 84.003 ± 0.534@25°C | 1086539 | 26 April 2026 |
| 1.413 mS/cm | CPA chem Ltd. | 1.413 ± 0.0082@25°C | 1086540 | 26 April 2026 |

**Calibration Result :**

Inspection the accuracy of the EC Meter by using the following certified reference material values.

Calibration result after adjustment at : 84 µS/cm, 1.413 mS/cm

| Standard EC Buffer Solution | | Unit Under Calibration Reading | | | | Error | | Uncertainty (±) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Before Adjustment | | After Adjustment | | | | | |
| 84.003 | µS/cm | 68.15 | µS/cm | 85.68 | µS/cm | 1.677 | µS/cm | 0.71 | µS/cm |
| 1.413 | mS/cm | 1.241 | mS/cm | 1.426 | mS/cm | 0.013 | mS/cm | 0.011 | mS/cm |

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MT26-1556
**Page** : 1 of 2

**Customer** : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
**Address** : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

**Description** : Incubator
**Manufacturer** : ศรีอมร
**Model** : SM61M
**Serial No.** : 18021147
**Identification No.** : N/A
**Calibration Place** : Laboratory

**Order No.** : 0336/26
**Received date** : Jan 29, 2026
**Calibration date** : Jan 29, 2026
**Environment Condition :**
**Temperature** : ( 25+/-10 ) °C
**Humidity** : ( 50+/-30 ) %RH

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

**Reference Standard Instruments :**

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor | 34972A | MY57003222 | MT25-5590 | Jul 23, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

**Calibrated by :** Mr.Kriengkrai Jomthaisong

**Approved b**

**Issue dat**

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025



**Function** : Temperature measurement
**Calibration point** : 20 °C
**Result** : Without adjustment
**Resolution** : 0.1 °C

| Calibration point ( °C ) | Temperature of UUC* at each position ( °C ) | | | | | | | | | Uncertainty of measurement ( +/- °C ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ch.1 | Ch.2 | Ch.3 | Ch.4 | Ch.5 | Ch.6 | Ch.7 | Ch.8 | Ch.9 | |
| 20 | 20.295 | 20.568 | 20.013 | 19.730 | 19.837 | 19.932 | 19.780 | 19.498 | 19.791 | 0.45 |

| Setting temperature ( °C ) | Indicating Temperature ( °C ) | Measured stability ( +/- °C ) | Measured uniformity ( °C ) | Overall variation ( °C ) |
|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.0 | 0.32 | 0.90 | 1.7 |

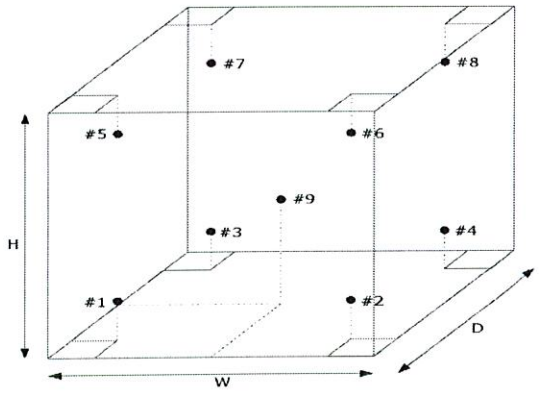


#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

**Front view**

**UUC*** = Unit under calibration
**Uniformity** = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
**Overall Variation** = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
**Stability** = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA A2LA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MT26-1558
**Page** : 1 of 2

**Customer** : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
**Address** : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

**Description** : Hot Air Oven
**Manufacturer** : Labtech
**Model** : LDO-060E
**Serial No.** : DLCCCL0513C
**Identification No.** : N/A
**Calibration Place** : Laboratory

**Order No.** : 0336/26
**Received date** : Jan 29, 2026
**Calibration date** : Jan 29, 2026
**Environment Condition :**
**Temperature** : ( 25+/-10 ) °C
**Humidity** : ( 50+/-30 ) %RH

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

**Reference Standard Instruments :**

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor | 34972A | MY57003222 | MT25-5590 | Jul 23, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor (k) = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

**Calibrated by :** Mr.Kriengkrai Jomthaisong

**Approved**

**Issue d**

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025



**Function** : Temperature measurement
**Calibration point** : 140, 160 °C
**Result** : Without adjustment
**Resolution** : 1 °C

| Calibration point | Temperature of UUC* at each position ( °C ) | | | | | | | | | Uncertainty of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( °C ) | Ch.1 | Ch.2 | Ch.3 | Ch.4 | Ch.5 | Ch.6 | Ch.7 | Ch.8 | Ch.9 | ( +/- °C ) |
| 140 | 141.785 | 141.603 | 141.640 | 141.457 | 141.689 | 142.147 | 141.509 | 141.574 | 141.364 | 3.2 |
| 160 | 161.388 | 161.667 | 161.517 | 161.509 | 161.431 | 161.453 | 161.694 | 161.753 | 161.512 | 2.7 |

| Setting temperature ( °C ) | Indicating Temperature ( °C ) | Measured stability ( +/- °C ) | Measured uniformity ( °C ) | Overall variation ( °C ) |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 | 2.7 | 2.2 | 5.4 |
| 160 | 160 | 2.2 | 2.2 | 4.9 |

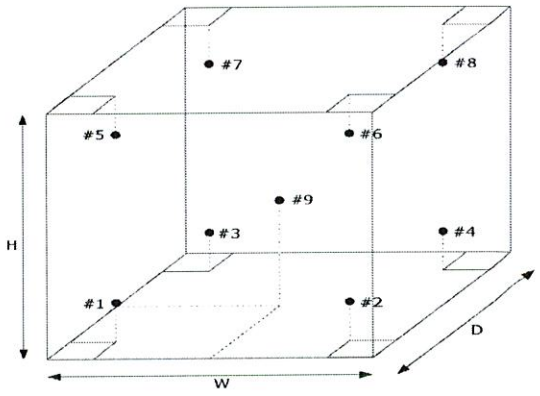


#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

**Front view**

**UUC*** = Unit under calibration
**Uniformity** = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
**Overall Variation** = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
**Stability** = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MT26-1557
**Page** : 1 of 2

**Customer** : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
**Address** : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

**Description** : Hot Air Oven
**Manufacturer** : KWF
**Model** : SOV70B
**Serial No.** : KWF2021021902
**Identification No.** : N/A
**Calibration Place** : Laboratory

**Order No.** : 0336/26
**Received date** : Jan 29, 2026
**Calibration date** : Jan 29, 2026
**Environment Condition :**
**Temperature** : ( 25+/-10 ) °C
**Humidity** : ( 50+/-30 ) %RH

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

**Reference Standard Instruments :**

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor | 34972A | MY57003222 | MT25-5590 | Jul 23, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

**Calibrated by :** Mr.Kriengkrai Jomthaisong

**Approved**

**Issue da**

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025



**Function** : Temperature measurement
**Calibration point** : 80, 104, 180 °C
**Result** : Without adjustment
**Resolution** : 0.1 °C

| Calibration point ( °C ) | Temperature of UUC* at each position ( °C ) | | | | | | | | | Uncertainty of measurement ( +/- °C ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ch.1 | Ch.2 | Ch.3 | Ch.4 | Ch.5 | Ch.6 | Ch.7 | Ch.8 | Ch.9 | |
| 80 | 80.277 | 80.877 | 79.915 | 80.312 | 80.617 | 80.154 | 79.991 | 80.587 | 80.074 | 0.51 |
| 104 | 104.268 | 104.528 | 104.228 | 104.120 | 104.485 | 104.519 | 104.304 | 104.664 | 104.154 | 0.71 |
| 180 | 180.400 | 180.880 | 180.314 | 180.356 | 180.450 | 180.243 | 180.266 | 180.540 | 180.400 | 1.3 |

| Setting temperature ( °C ) | Indicating Temperature ( °C ) | Measured stability ( +/- °C ) | Measured uniformity ( °C ) | Overall variation ( °C ) |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 79.9 to 80.1 | 0.35 | 1.1 | 1.5 |
| 104.0 | 104.0 to 104.2 | 0.56 | 0.81 | 1.5 |
| 180.0 | 180.0 to 180.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |

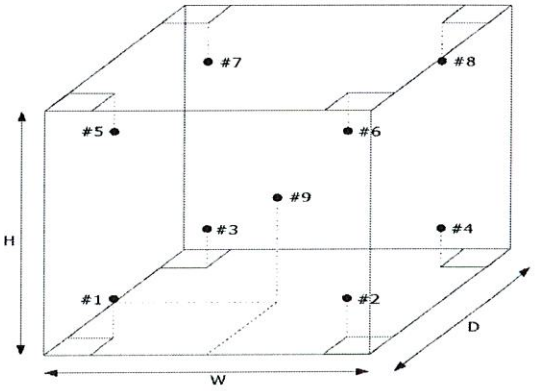


#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

**Front view**

**UUC*** = Unit under calibration
**Uniformity** = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
**Overall Variation** = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
**Stability** = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MM26-1194
**Page** : 1 of 3

**Customer** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
**Address** : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

**Description** : Electronic Balance
**Manufacturer** : Sartorius
**Model** : BSA224S-CW
**Serial No.** : 35790699
**Identification No.** : N/A
**Calibration Place** : Balance Room

**Order No.** : 0336/26
**Received date** : Jan 29, 2026
**Calibration date** : Jan 29, 2026
**Environment Condition :**
**Temperature** : (25+/-10) °C
**Humidity** : (50+/-30) %RH
**Atm. Pressure** : (1010+/-10) hPa

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set E1.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

**Reference Standard Instruments :**

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| Standard Weight Set | NC-001-0.2K-E1-ASS | 0022 | PL-512 | Oct 10, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

**Calibrated by** : Mr.Porntep Homchuay

**Approved by**

**Issue date** : Feb 02, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025




**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Repeatability
**Maximum Capacity** : 200 g
**Resolution** : 0.0001 g

| Nominal Weight Value (g) | Instrument Deviation of Reading (g) |
|---|---|
| 200 | 0.0000 |

**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Effect of Off Center Loading




**Front**
**( X )**




**Front**
**( )**

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

| Load | Measuring Positions | | | | | | Maximum Different |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | A | |
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
| 100 | 99.9996 | 99.9995 | 99.9996 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9996 | 0.0002 |

**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Effect of Tare

| Nominal Tare Weight (g) | Standard Weight (g) | | UUC* Reading (g) | UUC* Deviation (g) |
|---|---|---|---|---|
| | Tare | | 0.0000 | 0.0000 |
| | At 20 % | 20 | 19.9998 | 0.0002 |
| | At 40 % | 40 | 39.9998 | 0.0002 |
| 100 | At 60 % | 60 | 59.9997 | 0.0003 |
| | At 80 % | 80 | 79.9997 | 0.0003 |
| | At 100 % | 100 | 99.9996 | 0.0004 |

**UUC*** = Unit Under Calibration

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025



**Calibration Result** : Before Adjustment
**Function** : Departure of indication from nominal value

| Standard Weight Value ( g ) | UUC* Reading ( g ) | UUC* Correction ( g ) | Uncertainty of Measurement ( +/- g ) |
|---|---|---|---|
| 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.000058 |
| 0.01000 | 0.0099 | 0.00010 | 0.000058 |
| 0.05000 | 0.0499 | 0.00007 | 0.000058 |
| 0.10000 | 0.1001 | -0.00014 | 0.000058 |
| 0.20000 | 0.2001 | -0.00014 | 0.000059 |
| 0.50000 | 0.5000 | -0.00003 | 0.000059 |
| 1.00000 | 1.0000 | -0.00003 | 0.000059 |
| 10.00001 | 10.0000 | -0.00003 | 0.000064 |
| 49.99999 | 49.9998 | 0.00022 | 0.000090 |
| 99.99998 | 99.9996 | 0.00041 | 0.00014 |
| 149.99997 | 149.9991 | 0.00083 | 0.00027 |
| 199.99996 | 199.9991 | 0.00083 | 0.00027 |

**UUC*** = Unit Under Calibration

**Calibration Result** : After Adjustment

| Standard Weight Value ( g ) | UUC* Reading ( g ) | UUC* Correction ( g ) | Uncertainty of Measurement ( +/- g ) |
|---|---|---|---|
| 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.000058 |
| 0.01000 | 0.0100 | -0.00003 | 0.000058 |
| 0.05000 | 0.0500 | 0.00000 | 0.000058 |
| 0.10000 | 0.1000 | 0.00000 | 0.000058 |
| 0.20000 | 0.2000 | -0.00003 | 0.000059 |
| 0.50000 | 0.5000 | 0.00000 | 0.000059 |
| 1.00000 | 1.0000 | -0.00003 | 0.000059 |
| 10.00001 | 10.0000 | -0.00001 | 0.000064 |
| 49.99999 | 50.0000 | -0.00002 | 0.000090 |
| 99.99998 | 100.0000 | 0.00002 | 0.00014 |
| 149.99997 | 150.0000 | 0.00000 | 0.00027 |
| 199.99996 | 200.0000 | 0.00004 | 0.00027 |

**UUC*** = Unit Under Calibration

-oOo-

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA A2LA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MM26-1195
**Page** : 1 of 3

**Customer** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
**Address** : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

**Description** : Electronic Balance
**Manufacturer** : Mettler Toledo
**Model** : PL6001-S
**Serial No.** : 1230510473
**Identification No.** : N/A
**Calibration Place** : Balance Room

**Order No.** : 0336/26
**Received date** : Jan 29, 2026
**Calibration date** : Jan 29, 2026
**Environment Condition :**
**Temperature** : (25+/-10) °C
**Humidity** : (50+/-30) %RH
**Atm. Pressure** : (1010+/-10) hPa

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

**Reference Standard Instruments :**

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| Standard Weight Set | 50 mg - 2 kg | N/A | MM25-1949 | May 22, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY

**Calibrated by** : Mr.Porntep Homchuay
**Approved by** :
**Issue date** : Feb 02, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025




**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Repeatability
**Maximum Capacity** : 6000 g
**Resolution** : 0.1 g

| Nominal Weight Value (g) | Instrument Deviation of Reading (g) |
|---|---|
| 6000 | 0.0 |

**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Effect of Off Center Loading




**Front**
**( X )**




**Front**
**( )**

A Mass of 2000 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

| Load | Measuring Positions | | | | | | Maximum Different |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | A | |
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
| 2000 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 |

**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Effect of Tare

| Nominal Tare Weight (g) | Standard Weight (g) | | UUC* Reading (g) | UUC* Deviation (g) |
|---|---|---|---|---|
| | Tare | | 0.0 | 0.0 |
| | At 20 % | 600 | 600.0 | 0.0 |
| | At 40 % | 1200 | 1200.0 | 0.0 |
| 3000 | At 60 % | 1800 | 1800.0 | 0.0 |
| | At 80 % | 2400 | 2400.0 | 0.0 |
| | At 100 % | 3000 | 3000.0 | 0.0 |

**UUC*** = Unit Under Calibration

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025



**Calibration Resu** : Without Adjustment
**Function** : Departure of indication from nominal value

| Standard Weight Value ( g ) | UUC* Reading ( g ) | UUC* Correction ( g ) | Uncertainty of Measurement ( +/- g ) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.058 |
| 600 | 600.0 | 0.0 | 0.058 |
| 1200 | 1200.0 | 0.0 | 0.058 |
| 1800 | 1800.0 | 0.0 | 0.058 |
| 2400 | 2400.0 | 0.0 | 0.058 |
| 3000 | 3000.0 | 0.0 | 0.058 |
| 3600 | 3600.0 | 0.0 | 0.058 |
| 4200 | 4200.0 | 0.0 | 0.058 |
| 4800 | 4800.0 | 0.0 | 0.058 |
| 5400 | 5400.0 | 0.0 | 0.058 |
| 6000 | 6000.0 | 0.0 | 0.058 |

**UUC*** = Unit Under Calibration

-oOo-

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MM26-1196
**Page** : 1 of 3

**Customer** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
**Address** : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

**Description** : Electronic Balance
**Manufacturer** : Mettler Toledo
**Model** : PL3001-S
**Serial No.** : 1230040028
**Identification No.** : N/A
**Calibration Place** : Balance Room

**Order No.** : 0336/26
**Received date** : Jan 29, 2026
**Calibration date** : Jan 29, 2026
**Environment Condition :**
**Temperature** : (25+/-10) °C
**Humidity** : (50+/-30) %RH
**Atm. Pressure** : (1010+/-10) hPa

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

**Reference Standard Instruments :**

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| Standard Weight Set | 50 mg - 2 kg | N/A | MM25-1949 | May 22, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC

**Calibrated by** : Mr.Porntep Homchuay
**Approved by** :
**Issue date** :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025




**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Repeatability
**Maximum Capacity** : 3100 g
**Resolution** : 0.1 g

| Nominal Weight Value (g) | Instrument Deviation of Reading (g) |
|---|---|
| 3000 | 0.0 |

**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Effect of Off Center Loading




**Front**
**( X )**




**Front**
**( )**

A Mass of 1000 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

| Load | Measuring Positions | | | | | | Maximum Different |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | A | |
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
| 1000 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 0.0 |

**Calibration Result** : Without Adjustment
**Function** : Effect of Tare

| Nominal Tare Weight (g) | Standard Weight (g) | | UUC* Reading (g) | UUC* Deviation (g) |
|---|---|---|---|---|
| | Tare | | 0.0 | 0.0 |
| | At 20 % | 300 | 299.9 | 0.1 |
| | At 40 % | 600 | 599.9 | 0.1 |
| 1500 | At 60 % | 900 | 899.9 | 0.1 |
| | At 80 % | 1200 | 1199.9 | 0.1 |
| | At 100 % | 1500 | 1499.9 | 0.1 |

**UUC*** = Unit Under Calibration

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025



**Calibration Resu** : Without Adjustment
**Function** : Departure of indication from nominal value

| Standard Weight Value ( g ) | UUC* Reading ( g ) | UUC* Correction ( g ) | Uncertainty of Measurement ( +/- g ) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.058 |
| 300 | 299.9 | 0.1 | 0.058 |
| 600 | 599.9 | 0.1 | 0.058 |
| 900 | 899.9 | 0.1 | 0.058 |
| 1200 | 1199.9 | 0.1 | 0.058 |
| 1500 | 1499.9 | 0.1 | 0.058 |
| 1800 | 1799.9 | 0.1 | 0.058 |
| 2100 | 2099.8 | 0.2 | 0.058 |
| 2400 | 2399.8 | 0.2 | 0.058 |
| 2700 | 2699.8 | 0.2 | 0.058 |
| 3000 | 2999.7 | 0.3 | 0.058 |

**UUC*** = Unit Under Calibration

-oOo-

**Hanna Instruments (Thailand) Ltd.**

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

**Certificate No. :** C26020022



# CERTIFICATE OF CALIBRATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Equipment** | : | Dissolved Oxygen and BOD Meter | | | |
| **Meter Model** | : | HI5421-02 | **Serial No.** | : | 04240005101 |
| **Probe Model** | : | HI76483 | **Serial No.** | : | KC1N66J5P |
| **Manufacturer** | : | Hanna Instruments | **Made in** | : | Romania |
| **Condition As-Received** | : | Used Product | **Resolution** | : | 0.01 ppm (mg/L) |
| **Ambient Temperature** | : | ( 25 ± 2 )°C | **Relative Humidity** | : | ( 50 ± 15 )% RH |
| **Reference** | : | RE260168 | | | |
| **Customer name** | : | Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.<br>67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,<br>Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand | | | |
| **Received date** | : | 30 January 2026 | | | |
| **Calibrate date** | : | 6 February 2026 | | | |
| **Issue date** | : | 9 February 2026 | | | |
| **Calibrated Location** | : | Hanna Instruments (Thailand) Ltd. | | | |
| **Calibration Procedure** | : | This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-11 by using certified reference material (CRM). | | | |

**Calibrated by** : Mr. Pichit Petthong **Approved by :**

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

**Condition of this result of calibration :**

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Traceable |
|---|---|---|---|---|
| Thermometer with sensor | HI98509 | 39643D | 25T1021 | Technology Promotion Association (Thailand-Japan) |
| Digital Thermo-Hygrometer | HT-771SD | AI.07155 | 26H106 | |

2. Reference standard materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

| Buffer Solution | Manufacture | Certified Value | Lot Number | Exp. date |
|---|---|---|---|---|
| Zero Oxygen Solution | Hanna Inc. | 0.0 ± 0.1@25°C | S0121/25 | August 2030 |

**Calibration Result:**

Dissolved Oxygen Measurement

| Unit Under Calibration | Standard Buffer Solution | UUC Reading | Error | Uncertainty of Measurement (±) |
|---|---|---|---|---|
| DO Electrode | 0.0 mg/L | 0.00 mg/L | 0.00 mg/L | N/A mg/L |
| S/N: KC1N66J5P | 8.3 mg/L | 8.30 mg/L | 0.00 mg/L | 0.33 mg/L |

Remark : at 8.3 mg/L = Air Saturated.

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-1** **Page : 1 of 2**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved b

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-1**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 49.07 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 5 | 4.9984 |
| 15 | 14.9932 |
| 25 | 24.9964 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-2**



**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Burette
Manufacturer : Witeg Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 0.2 ml
ID No. : EM-MBR10001/18

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1015.6 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-2**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 43.77 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 20 | 19.9961 |
| 60 | 59.9874 |
| 100 | 99.9963 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.019 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-3**



**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by : _____

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-3**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 7.31 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 0.1 | 0.1014 |
| 0.5 | 0.4995 |
| 1 | 0.9908 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-4**



**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MER01001/18

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-4**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 9.39 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 0.5 | 0.5001 |
| 2.5 | 2.4840 |
| 5 | 4.9842 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration



**Certificate No.** : **69-300065-5**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by : _____

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration



**Certificate No. :** **69-300065-5**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 10.81 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 1 | 1.0008 |
| 5 | 4.9757 |
| 10 | 9.9777 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-6**



**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml
ID No. : EM-Mbro1051/17

**Environment** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ambient Temperature | : | ( 20 ± 3 ) | °C |
| Relative Humidity | : | ( 50 ± 10 ) | % |
| Air Pressure | : | 1010.7 | mbar. |

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-6**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 12.56 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 5 | 4.9820 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-7**



**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml
ID No. : EM-Mbro1001/17

**Environment** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ambient Temperature | : | ( 20 ± 3 ) | °C |
| Relative Humidity | : | ( 50 ± 10 ) | % |
| Air Pressure | : | 1010.7 | mbar. |

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration



**Certificate No. :** **69-300065-7**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 12.56 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 10 | 10.0044 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0038 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-8**



**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1010.7 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-8**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 15.10 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 20 | 19.9816 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-9** **Page : 1 of 2**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Pipette
Manufacturer : BOROSIL Class : A
Capacity : 25 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1010.7 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-9**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 37.49 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 25 | 24.9902 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-13** **Page : 1 of 2**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instrument :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241002 | 68-200620-1 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-13**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 50 | 50.38 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-14** **Page : 1 of 2**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instrument :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241002 | 68-200620-1 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved b

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-14**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 50 | 50.26 |
| 100 | 100.08 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-15** **Page : 1 of 2**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Cylinder
Manufacturer : BOROSIL Class : A
Capacity : 500 ml Graduation : 5 ml
ID No. : 0334-58

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026
**Date of Calibration** : 29 January 2026
**Date of Issue** : 29 January 2026
**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instrument :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241002 | 68-200620-1 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by : [redacted]
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-15**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 500 | 499.05 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-10**



**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

**Environment** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ambient Temperature | : | ( 20 ± 3 ) | °C |
| Relative Humidity | : | ( 50 ± 10 ) | % |
| Air Pressure | : | 1011.1 | mbar. |

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241005 | 68-200260-4 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-10**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 100 | 99.991 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration



**Certificate No.** : **69-300065-11**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1010.9 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241002 | 68-200620-1 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-11**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 500 | 499.99 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : **69-300065-12** **Page : 1 of 2**

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 1000 ml
ID No. : EM-VPP02501/20

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C
Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %
Air Pressure : 1011.0 mbar.

**Date of Received** : 22 January 2026

**Date of Calibration** : 29 January 2026

**Date of Issue** : 29 January 2026

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---|---|---|---|
| 241002 | 68-200620-1 | 02 Jun 2026 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

# Certificate of Calibration

**Certificate No. :** **69-300065-12**



**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|---|---|
| 1000 | 1000.00 |

Uncertainty of measurement with in ± 0.14 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -
