

เอกสารแนบที่ 2.4

แผนผังกำหนดขอบเขตการเดินหน้าเหมืองและทิศทางการเดินหน้าเหมือง

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...มกราคม...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้	455,525	ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000	ตัน
สต๊อกปลายงวด	696,179	ตัน
หินที่ต้องระเบิด	159,346	ตัน

Blast ที่		ขั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ขุดเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
1/01	P	185	Z-AA35	5.0	7.0	20	15	25,139	6.67	1.65	0.32	47.75	2.03	0.30	0.88	0.01	0.59	0.18	6/1	8/01	8/01	7-8	9/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
2/01	P	167	Y33-34	5.0	8.0	20	11	20,554	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	8/1	11/01	11/01	10-11	12/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
3/01	P	149	S29-30	5.5	8.0	20	9	17,826	3.32	0.76	0.20	50.60	2.16	0.20	0.41	0.01	0.28	0.06	8/1	13/01	13/01	12-13	14/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
4/01	P	185	Y-AA32-33	5.0	7.0	20	16	26,478	6.67	1.65	0.32	47.75	2.03	0.30	0.88	0.01	0.59	0.18	8/1	15/01	15/01	14-15	16/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
5/01	P	203	AB-AD37	5.0	7.0	20	15	25,321	6.66	1.54	0.00	47.38	2.23	0.30	0.86	0.01	0.58	0.15	15/1	18/01	18/01	16-17	19/01	งานเส้นทาง 185-203
	A																							
6/01	P	203	AE-AF32-33	5.0	7.0	20	12	19,877	6.66	1.54	0.00	47.38	2.23	0.30	0.86	0.01	0.58	0.15	15/1	18/01	18/01	17-18	19/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
7/01	P	149	U-V33-34	5.5	8.0	20	8	17,436	3.32	0.76	0.20	50.60	2.16	0.20	0.41	0.01	0.28	0.06	15/1	20/01	20/01	18-19	21/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
8/01	P	167	T-U33-35	5.0	8.0	20	17	32,193	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	15/1	20/01	20/01	19-20	21/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
9/01	P	185	S33-34	5.0	7.0	20	17	27,592	6.67	1.65	0.32	47.75	2.03	0.30	0.88	0.01	0.59	0.18	15/1	22/01	22/01	20-21	23/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
10/01	P	185	R-S32	5.0	7.0	20	19	30,368	6.67	1.65	0.32	47.75	2.03	0.30	0.88	0.01	0.59	0.18	15/1	22/01	22/01	21-22	23/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
11/01	P	149	S-T26-27	5.5	8.0	20	12	23,996	3.32	0.76	0.20	50.60	2.16	0.20	0.41	0.01	0.28	0.06	22/1	25/01	25/01	23-24	26/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
12/01	P	203	Z-AA36-37	5.0	7.0	20	12	19,255	6.66	1.54	0.00	47.38	2.23	0.30	0.86	0.01	0.58	0.15	22/1	25/01	25/01	24-25	26/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
13/01	P	221	Y-Z37	5.0	6.0	20	12	17,259	6.51	1.85	0.00	47.28	2.20	0.30	0.92	0.06	0.66	0.19	22/1	27/01	27/01	25-26	28/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
สรุป	P						175	303,294	5.66	1.37	0.20	48.50	2.08	0.26	0.73	0.01	0.49	0.14						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning And Rehabilitation

...../...../.....

.....

Mine Operation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor

...../...../.....

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...มกราคม...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้	455,525	ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000	ตัน
สต๊อกปลายงวด	696,179	ตัน
หินที่ต้องระเบิด	159,346	ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
14/01	P	167	Q28-29	5.0	8.0	20	15	27,878	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	22/1	27/01	27/01	26-27	28/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
15/01	P	167	N-O20-21	5.0	8.0	20	13	25,071	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	22/1	29/01	29/01	27-28	30/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
16/01	P	239	K28-29	5.0	6.0	20	7	9,526	7.68	1.89	0.15	45.74	2.15	0.30	1.03	0.03	0.71	0.16	22/1	29/01	29/01	28-29	30/01	คุณภาพผังเจาะ
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
สรุป	F						211	365,769	5.58	1.34	0.20	48.57	2.06	0.25	0.72	0.01	0.48	0.14						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning And Rehabilitation

...../...../.....

.....

Mine Operation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....


Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor

...../...../.....

R-Q-PD-001 (03)

9/10/68

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

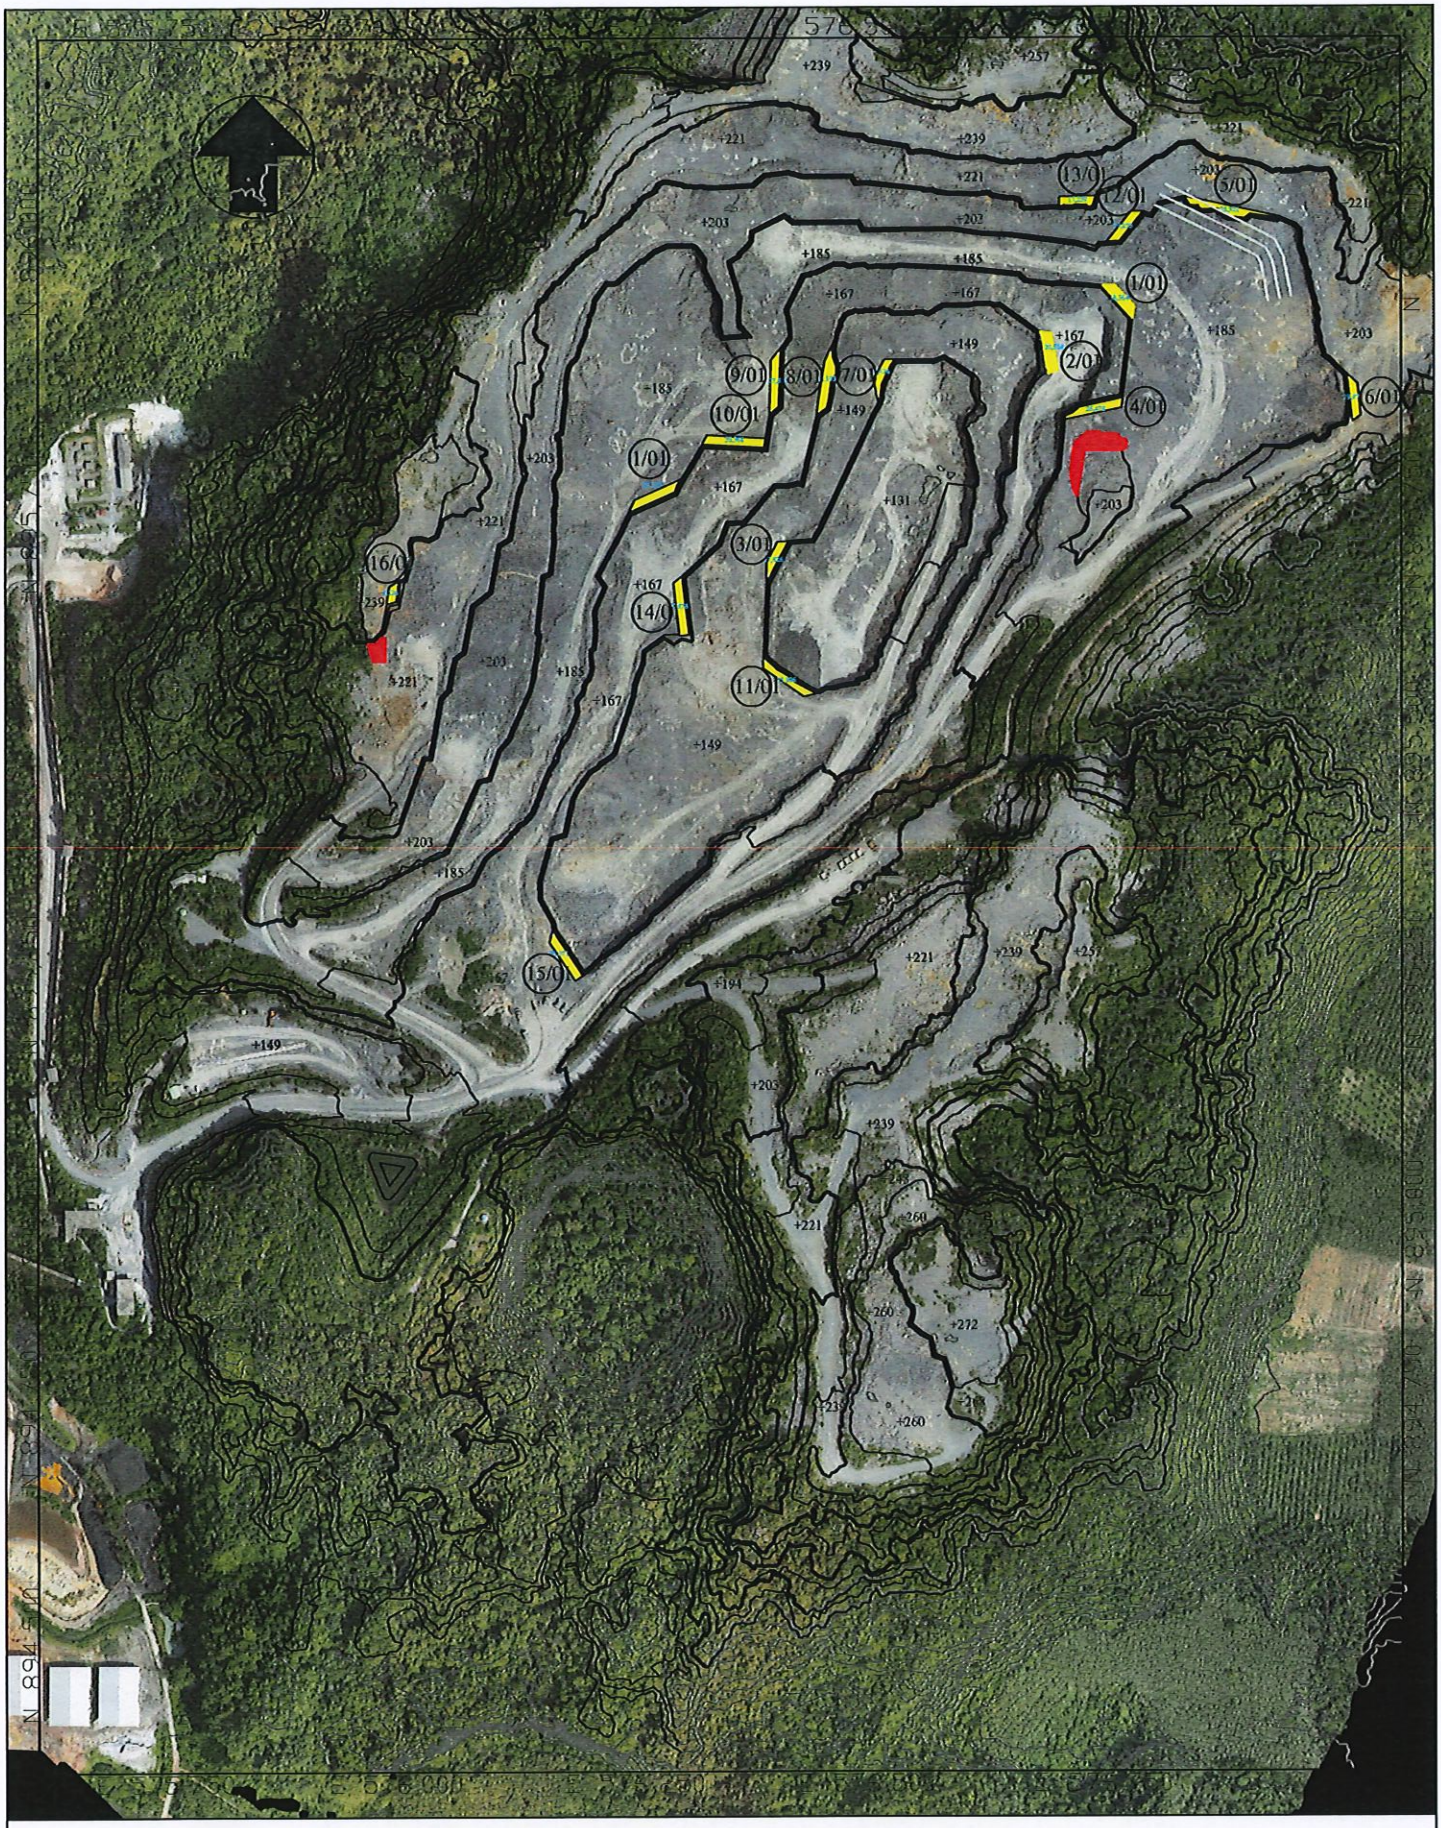

LEGEND

เส้นชั้นความสูง.

เส้นทางลำเลียงวัตถุดิบ

ขอบเขตแปลงประทานบัตร. 19 แปลง (4,972 ไร่)

ขอบเขตพื้นที่การทำเหมือง PH1 871-0-16 ไร่

Blasting Plan

Development

MAP SCALE

GRAPHIC SCALE IN METRES

REVISIONS	No.	DATE	MADE BY	DESCRIPTION
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			

DATE	DRAWN BY	CHECKED	APPROVED
26/12/2562	Teerachai P.		

MAP INDEX NUMBER	DIVISION
	MINERAL RESOURCES AND MINING

Plan January 2026

MAP INDEX NUMBER	SCALE	DRAWING NUMBER

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้	526,448 ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000 ตัน
สต๊อกปลายงวด	460,000 ตัน
หินที่ต้องระเบิด	466,448 ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	รีย Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ผักเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
1/02	P	167	S33-35	5.0	8.0	20	12	22,615	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.01	0.57	0.38	0.11	29/01	1/2	1/2	30-31	2/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
2/02	P	185	Y35-36,Z35	5.0	7.0	20	17	28,494	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.25	0.74	0.06	0.55	0.20	29/01	1/2	1/2	31-1	2/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
3/02	P	203	AE33-34	5.0	7.0	20	13	20,628	5.94	1.90	0.00	47.66	2.16	0.25	0.90	0.08	0.65	0.20	29/01	3/2	3/2	2-3	4/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
4/02	P	167	N21,O20-21	5.0	8.0	20	13	25,071	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.01	0.57	0.38	0.11	29/01	5/2	5/2	3-4	6/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
5/02	P	203	R-S34	5.0	6.0	20	10	14,083	5.94	1.90	0.00	47.66	2.16	0.25	0.90	0.08	0.65	0.20	29/01	5/2	5/2	4-5	6/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
6/02	P	185	Y32,Z32-33,AA33	5.0	7.0	20	13	21,012	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.25	0.74	0.06	0.55	0.20	5/02	8/2	8/2	6-7	9/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
7/02	P	239	Z-AA38-39	5.0	6.0	20	14	20,236	7.67	2.56	0.12	45.89	1.89	0.35	1.43	0.01	0.95	0.14	5/02	10/2	10/2	8-9	11/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
8/02	P	221	L25-27	5.0	7.0	20	18	30,243	6.15	1.85	0.00	47.51	2.26	0.30	0.88	0.07	0.64	0.19	5/02	12/2	12/2	10-11	13/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
9/02	P	239	K28-30	5.0	6.0	20	19	27,196	7.67	2.56	0.12	45.89	1.89	0.35	1.43	0.01	0.95	0.14	5/02	12/2	12/2	11-12	13/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
10/02	P	167	T32-34	5.0	8.0	20	15	28,841	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.01	0.57	0.38	0.11	12/02	15/2	15/2	13-14	16/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
11/02	P	185	S33-35	5.0	7.0	20	25	41,712	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.25	0.74	0.06	0.55	0.20	12/02	15/2	15/2	14-15	16/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
12/02	P	167	R30,S30-31	5.0	8.0	20	12	21,990	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.01	0.57	0.38	0.11	12/02	17/2	17/2	16-17	18/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
13/02	P	185	R-S32	5.0	7.0	20	17	28,149	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.25	0.74	0.06	0.55	0.20	12/02	19/2	19/2	17-18	20/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
สรุป	P						200	330,270	5.99	1.55	0.20	48.01	1.98	0.25	0.65	0.21	0.57	0.16						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning And Rehabilitation

...../...../.....

.....

Mine Operation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor

...../...../.....

R-Q-PD-001 (03)

9/10/68

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...2569...


แผนการใช้เดือนนี้	526,448	ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000	ตัน
สต๊อกปลายงวด	460,000	ตัน
หินที่ต้องระเบิด	466,448	ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัฒนาแท่นเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
14/02	P	167	Q28-29	5.0	7.0	20	16	26,150	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.01	0.57	0.38	0.11	12/02	19/2	19/2	18-19	20/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
15/02	P	185	P30-31,Q31	5.0	7.0	20	15	25,139	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.25	0.74	0.06	0.55	0.20	19/02	22/2	22/2	20-21	23/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
16/02	P	185	Z35,AA35	5.0	7.0	20	15	24,212	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.25	0.74	0.06	0.55	0.20	19/02	22/2	22/2	22-23	23/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
17/02	P	203	X-Z36	5.0	6.0	20	21	29,269	5.94	1.90	0.00	47.66	2.16	0.25	0.90	0.08	0.65	0.20	19/02	24/2	24/2	23-24	25/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
18/02	P	221	Y37	5.0	6.0	20	14	19,343	6.15	1.85	0.00	47.51	2.26	0.30	0.88	0.07	0.64	0.19	19/02	26/2	26/2	24-25	27/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
19/02	P	239	X-Y38	5.0	6.0	20	16	22,761	5.25	2.19	0.00	47.68	2.02	0.35	1.00	0.04	0.69	0.08	19/02	26/2	26/2	25-26	27/02	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
สรุป	F						297	477,144	5.93	1.57	0.18	48.02	2.00	0.26	0.67	0.19	0.57	0.16						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.40	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....	.....	.....	.....	
Mine Planning And Rehabilitation	Mine Operation Supervisor/Manager	Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager	Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor	R-Q-PD-001 (03)
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	9/10/68

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

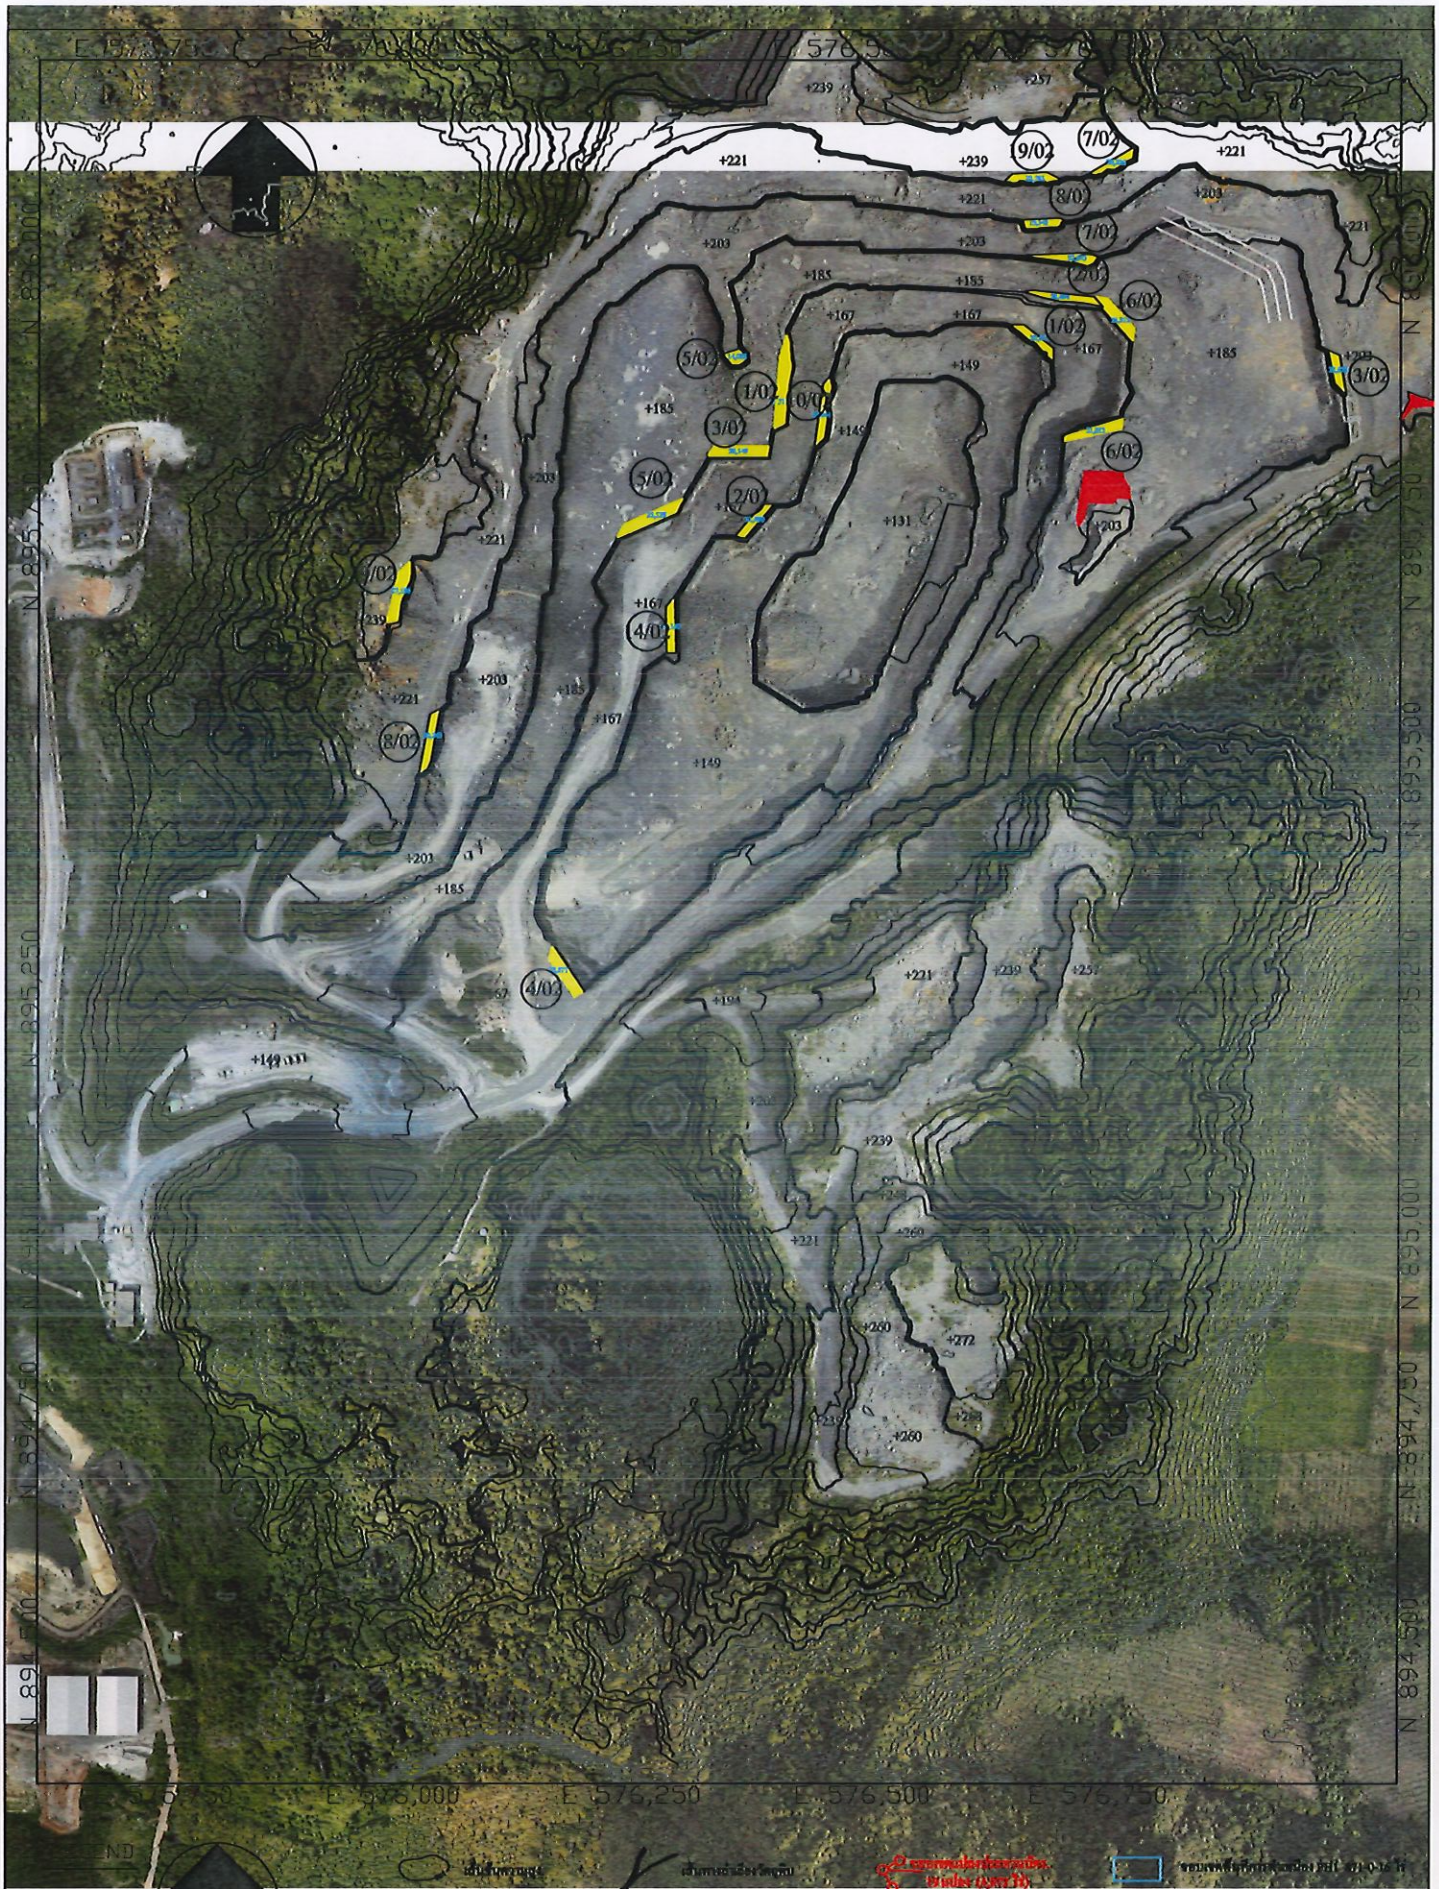

MAP SCALE

REVISIONS	No.	DATE	MADE BY	DESCRIPTION
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			

DATE	DRAWN BY	CHECKED	APPROVED
05/12/2562	Teerachai P.		

MAP INDEX NUMBER	DIVISION
	MINERAL RESOURCES AND MINING

Plan Febuarry 2026

MAP INDEX NUMBER	SCALE	DRAWING NUMBER

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...มีนาคม...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้ 505,223 ตัน
สต๊อกควบคุม 400,000 ตัน
สต๊อกปลายงวด 617,990 ตัน
หินที่ต้องระเบิด 287,233 ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ: กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ: SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตัดเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
1/3	P	167		5.0	8.0	20	16	30,266	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	25/2	3/3	3/3	27-28	4/03	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
2/3	P	185		5.0	7.0	20	9	14,766	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.30	0.74	0.06	0.55	0.20	25/2	3/3	3/3	1-2	4/03	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
3/3	P	185		5.0	7.0	20	14	22,293	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.30	0.74	0.06	0.55	0.20	25/2	5/3	5/3	2-3	6/03	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
4/3	P	239		5.0	6.0	20	11	15,943	7.56	1.83	0.14	46.67	2.17	0.30	0.93	0.03	0.65	0.16	2/3	5/3	5/3	3-4	6/03	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
5/3	P	203		5.0	6.0	20	7	9,538	7.37	1.47	0.00	47.02	2.40	0.30	0.80	0.01	0.53	0.15	2/3	5/3	5/3	4-5	6/03	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
6/3	P	167		5.0	8.0	20	15	28,841	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	5/3	8/3	8/3	6-7	9/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
7/3	P	185		5.0	7.0	20	25	41,712	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.30	0.74	0.06	0.55	0.20	5/3	8/3	8/3	7-8	9/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
8/3	P	149		5.0	8.0	20	22	41,589	3.53	0.77	0.20	50.51	1.82	0.20	0.50	0.01	0.34	0.10	5/3	10/3	10/3	9-10	11/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
9/3	P	167		5.0	7.0	20	18	28,916	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	5/3	12/3	12/3	10-11	13/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
10/3	P	185		5.0	7.0	20	15	24,498	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.30	0.74	0.06	0.55	0.20	5/3	12/3	12/3	11-12	13/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
11/3	P	167		5.0	7.0	20	13	21,990	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	12/3	15/3	15/3	13-14	16/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
12/3	P	185		5.0	7.0	20	21	34,948	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.30	0.74	0.06	0.55	0.20	12/3	15/3	15/3	14-15	16/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
13/3	P	185		5.0	7.0	20	14	22,493	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.30	0.74	0.06	0.55	0.20	12/3	17/3	17/3	15-16	18/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
สรุป	P						201	337,793	5.56	1.22	0.26	48.64	1.94	0.26	0.66	0.03	0.47	0.15						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....	.....	.....	.....	R-Q-PD-001 (03)
Mine Planning And Rehabilitation	Mine Operation Supervisor/Manager	Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager	Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor	9/10/68
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...มีนาคม...พ.ศ...2569...


แผนการใช้เดือนนี้	505,223	ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000	ตัน
สต๊อกปลายงวด	617,990	ตัน
หินที่ต้องระเบิด	287,233	ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ			จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ										วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัฒนาแท่นเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
				กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth			SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite						
14/3	P	167		5.0	7.0	20	18	30,037	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	12/3	17/3	17/3	16-17	18/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
15/3	P	185		5.0	7.0	20	14	22,523	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95	0.30	0.74	0.06	0.55	0.20	12/3	19/3	19/3	18-19	20/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
16/3	P	149		5.0	8.0	20	15	27,882	3.53	0.77	0.20	50.51	1.82	0.20	0.50	0.01	0.34	0.10	19/3	22/3	22/3	20-21	23/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
17/3	P	203		5.0	6.0	20	6	8,573	7.37	1.47	0.00	47.02	2.40	0.30	0.80	0.01	0.53	0.15	19/3	22/3	22/3	21-22	23/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
18/3	P	167		5.0	7.0	20	15	23,969	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90	0.20	0.57	0.01	0.38	0.11	19/3	24/3	24/3	23-24	25/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
19/3	P	239		5.0	6.0	20	14	20,236	7.56	1.83	0.14	46.67	2.17	0.30	0.93	0.03	0.65	0.16	19/3	26/3	26/3	24-25	27/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
20/3	P	257		5.0	6.0	20	13	18,030	7.67	2.56	0.12	45.89	1.89	0.35	1.43	0.01	0.95	0.14	19/3	26/3	26/3	25-26	27/3	คุณภาพเฉลี่ย
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
สรุป	F						296	489,043	5.58	1.26	0.24	48.59	1.95	0.25	0.69	0.03	0.48	0.15						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....	.....	.....	.....
Mine Planning And Rehabilitation	Mine Operation Supervisor/Manager	Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager	Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

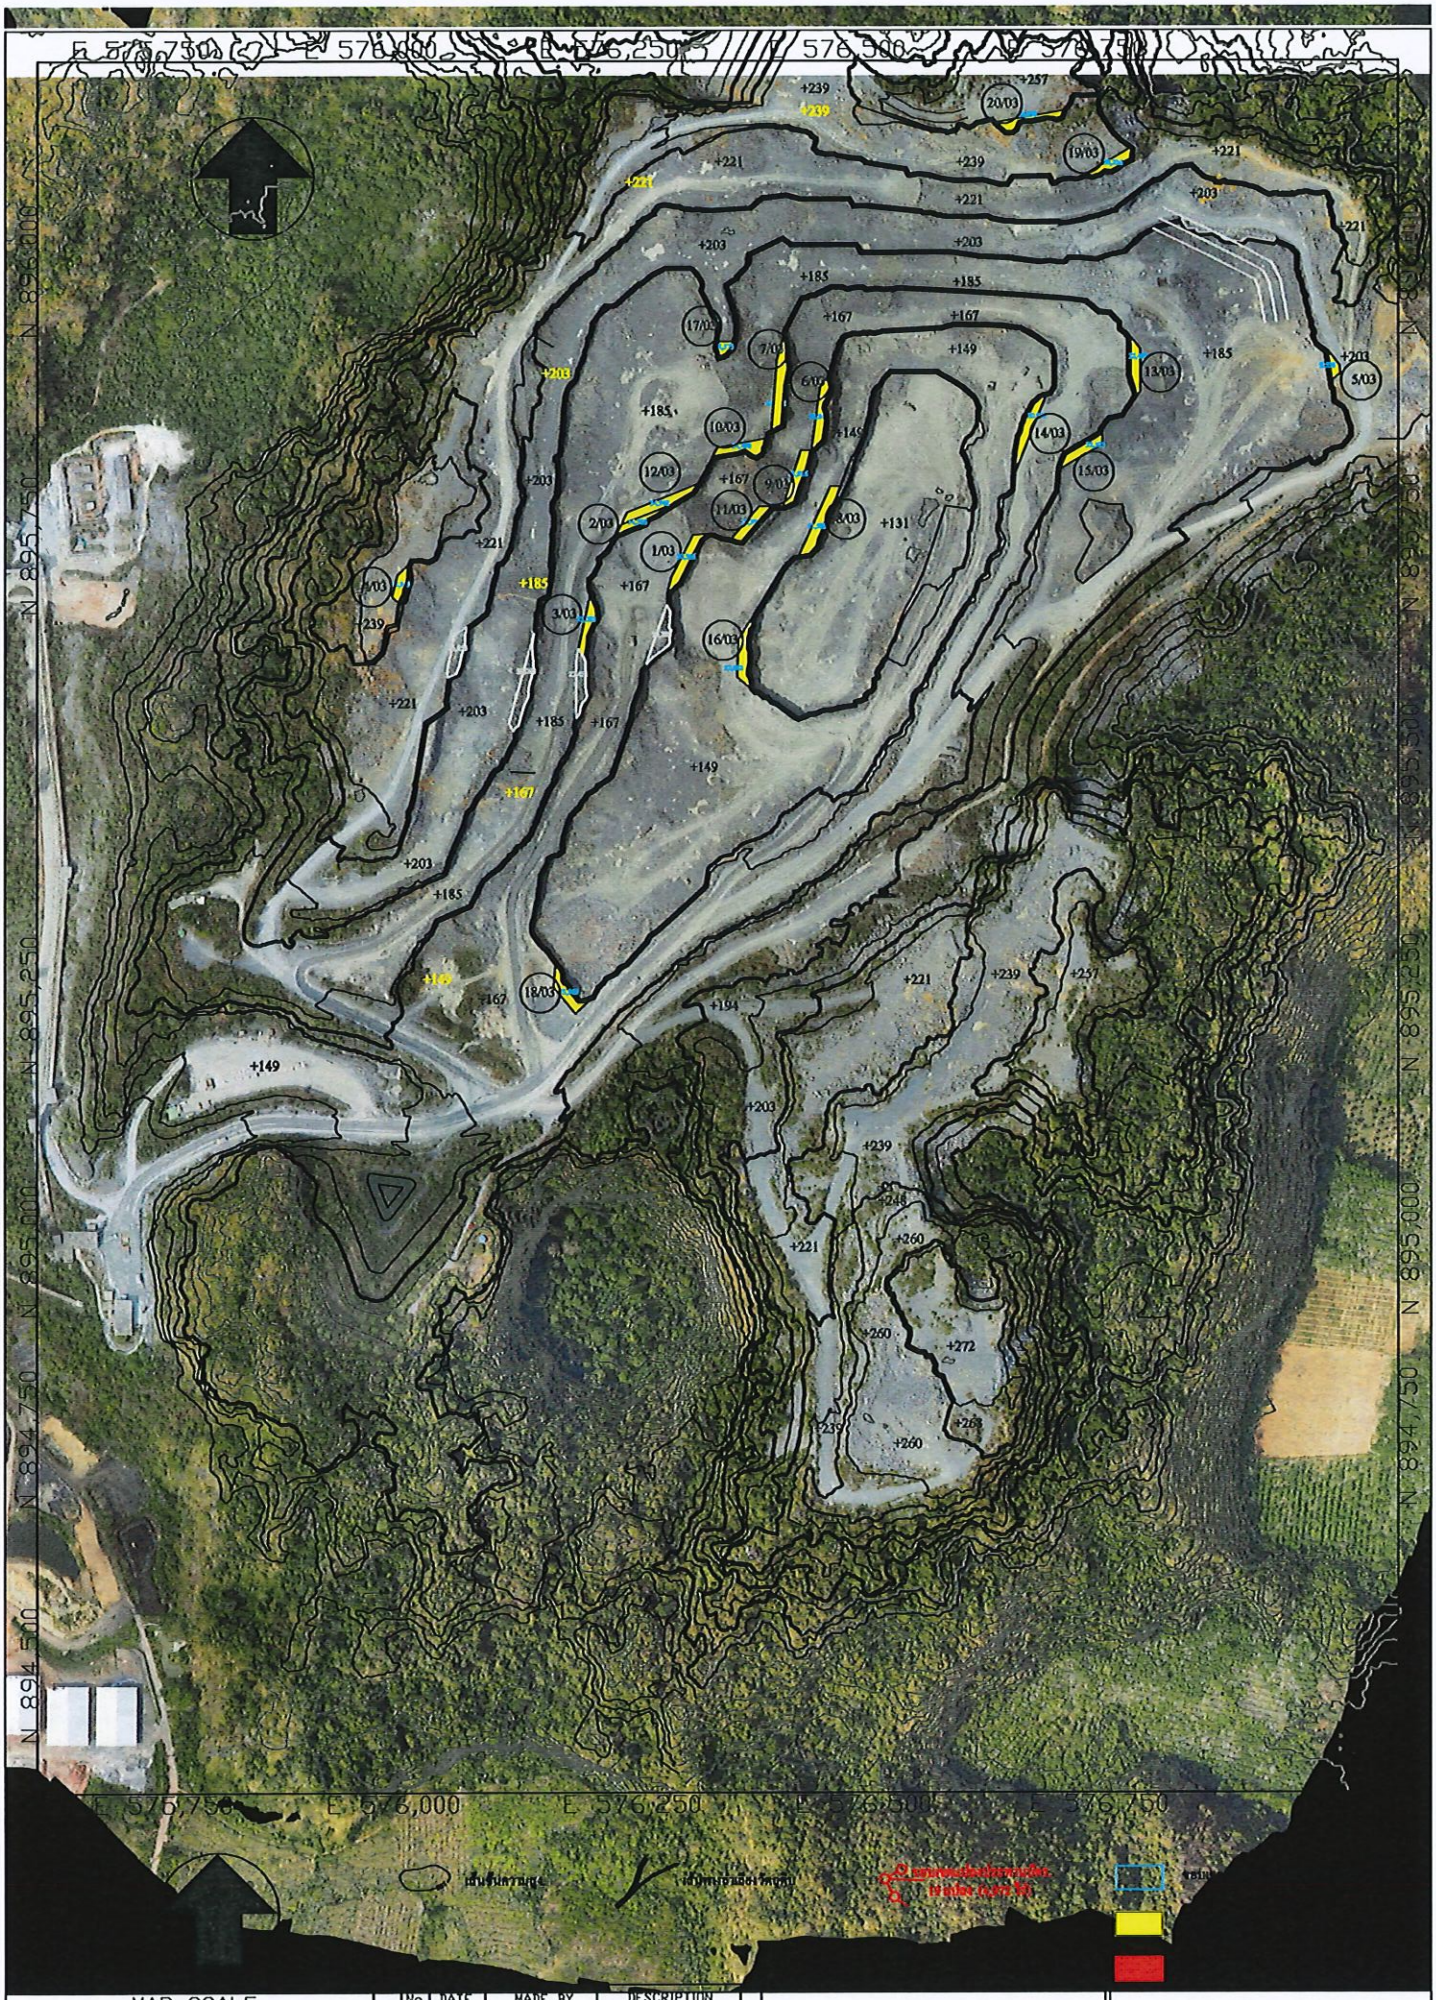

MAP SCALE

GRAPHIC SCALE IN METRES

REVISIONS	No.	DATE	MADE BY	DESCRIPTION
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			

DATE	DRAWN BY	CHECKED	APPROVED
06/12/2568	Teerachai P.		

MAP INDEX NUMBER	DIVISION
	MINERAL RESOURCES AND MINING

Plan March 2026

MAP INDEX NUMBER	SCALE	DRAWING NUMBER

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...เมษายน...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้	470,904	ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000	ตัน
สต๊อกปลายงวด	464,443	ตัน
หินที่ต้องระเบิด	406,461	ตัน

Blast ที่		ชั้นเฉลี่ย (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่เก็บเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
1/4	P	167		5.5	8.0	20	24	50,430											26/3	30/3	30/3	27-28	1/4	
	A																							
2/4	P	167		5.0	7.0	20	10	16,276											26/3	2/4	2/4	1-2	3/4	
	A																							
3/4	P	221		5.0	7.0	20	11	17,965											2/4	7/4	7/4	3-4	8/4	
	A																							
4/4	P	149		5.5	8.0	20	22	45,700											9/4	16/4	16/4	10-11	17/4	
	A																							
5/4	P	167		5.0	7.0	20	18	28,841											9/4	16/4	16/4	11-12	17/4	
	A																							
6/4	P	185		5.0	7.0	20	25	41,712											16/4	19/4	19/4	17-18	20/4	
	A																							
7/4	P	149		5.5	8.0	20	14	29,148											16/4	19/4	19/4	18-19	20/4	
	A																							
8/4	P	167		5.0	7.0	20	30	48,459											16/4	21/4	21/4	20-21	22/4	
	A																							
9/4	P	185		5.0	7.0	20	15	24,498											16/4	23/4	23/4	21-22	24/4	
	A																							
10/4	P	149		5.5	8.0	20	18	36,471											16/4	23/4	23/4	22-23	24/4	
	A																							
11/4	P	167		5.0	7.0	20	20	32,139											23/4	26/4	26/4	24-25	27/4	
	A																							
12/4	P	185		5.0	7.0	20	19	31,871											23/4	26/4	26/4	25-26	27/4	
	A																							
13/4	P	185		5.0	7.0	20	17	28,631											23/4	28/4	28/4	26-27	29/4	
	A																							
สรุป	P						244	432,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....	.....	.....	.....	
Mine Planning And Rehabilitation	Mine Operation Supervisor/Manager	Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager	Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor	R-Q-PD-001 (03)
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	9/10/68

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...เมษายน...พ.ศ...2569...


แผนการใช้เดือนนี้	470,904	ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000	ตัน
สต๊อกปลายงวด	464,443	ตัน
หินที่ต้องระเบิด	406,461	ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัดผนังแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
14/4	P	203		5.0	6.0	20	9	12,132											23-ม.ค.	28/4	28/4	27-28	29/4	
	A																							
20/4	P	212		5.0	6.0	9	11	6,000											2/3	7/4	7/4	4-5	8/4	
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P						244	432,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	A																							
สรุป	F						263	450,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....	.....	.....	.....	
Mine Planning And Rehabilitation	Mine Operation Supervisor/Manager	Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager	Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor	R-Q-PD-001 (03)
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	9/10/68

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

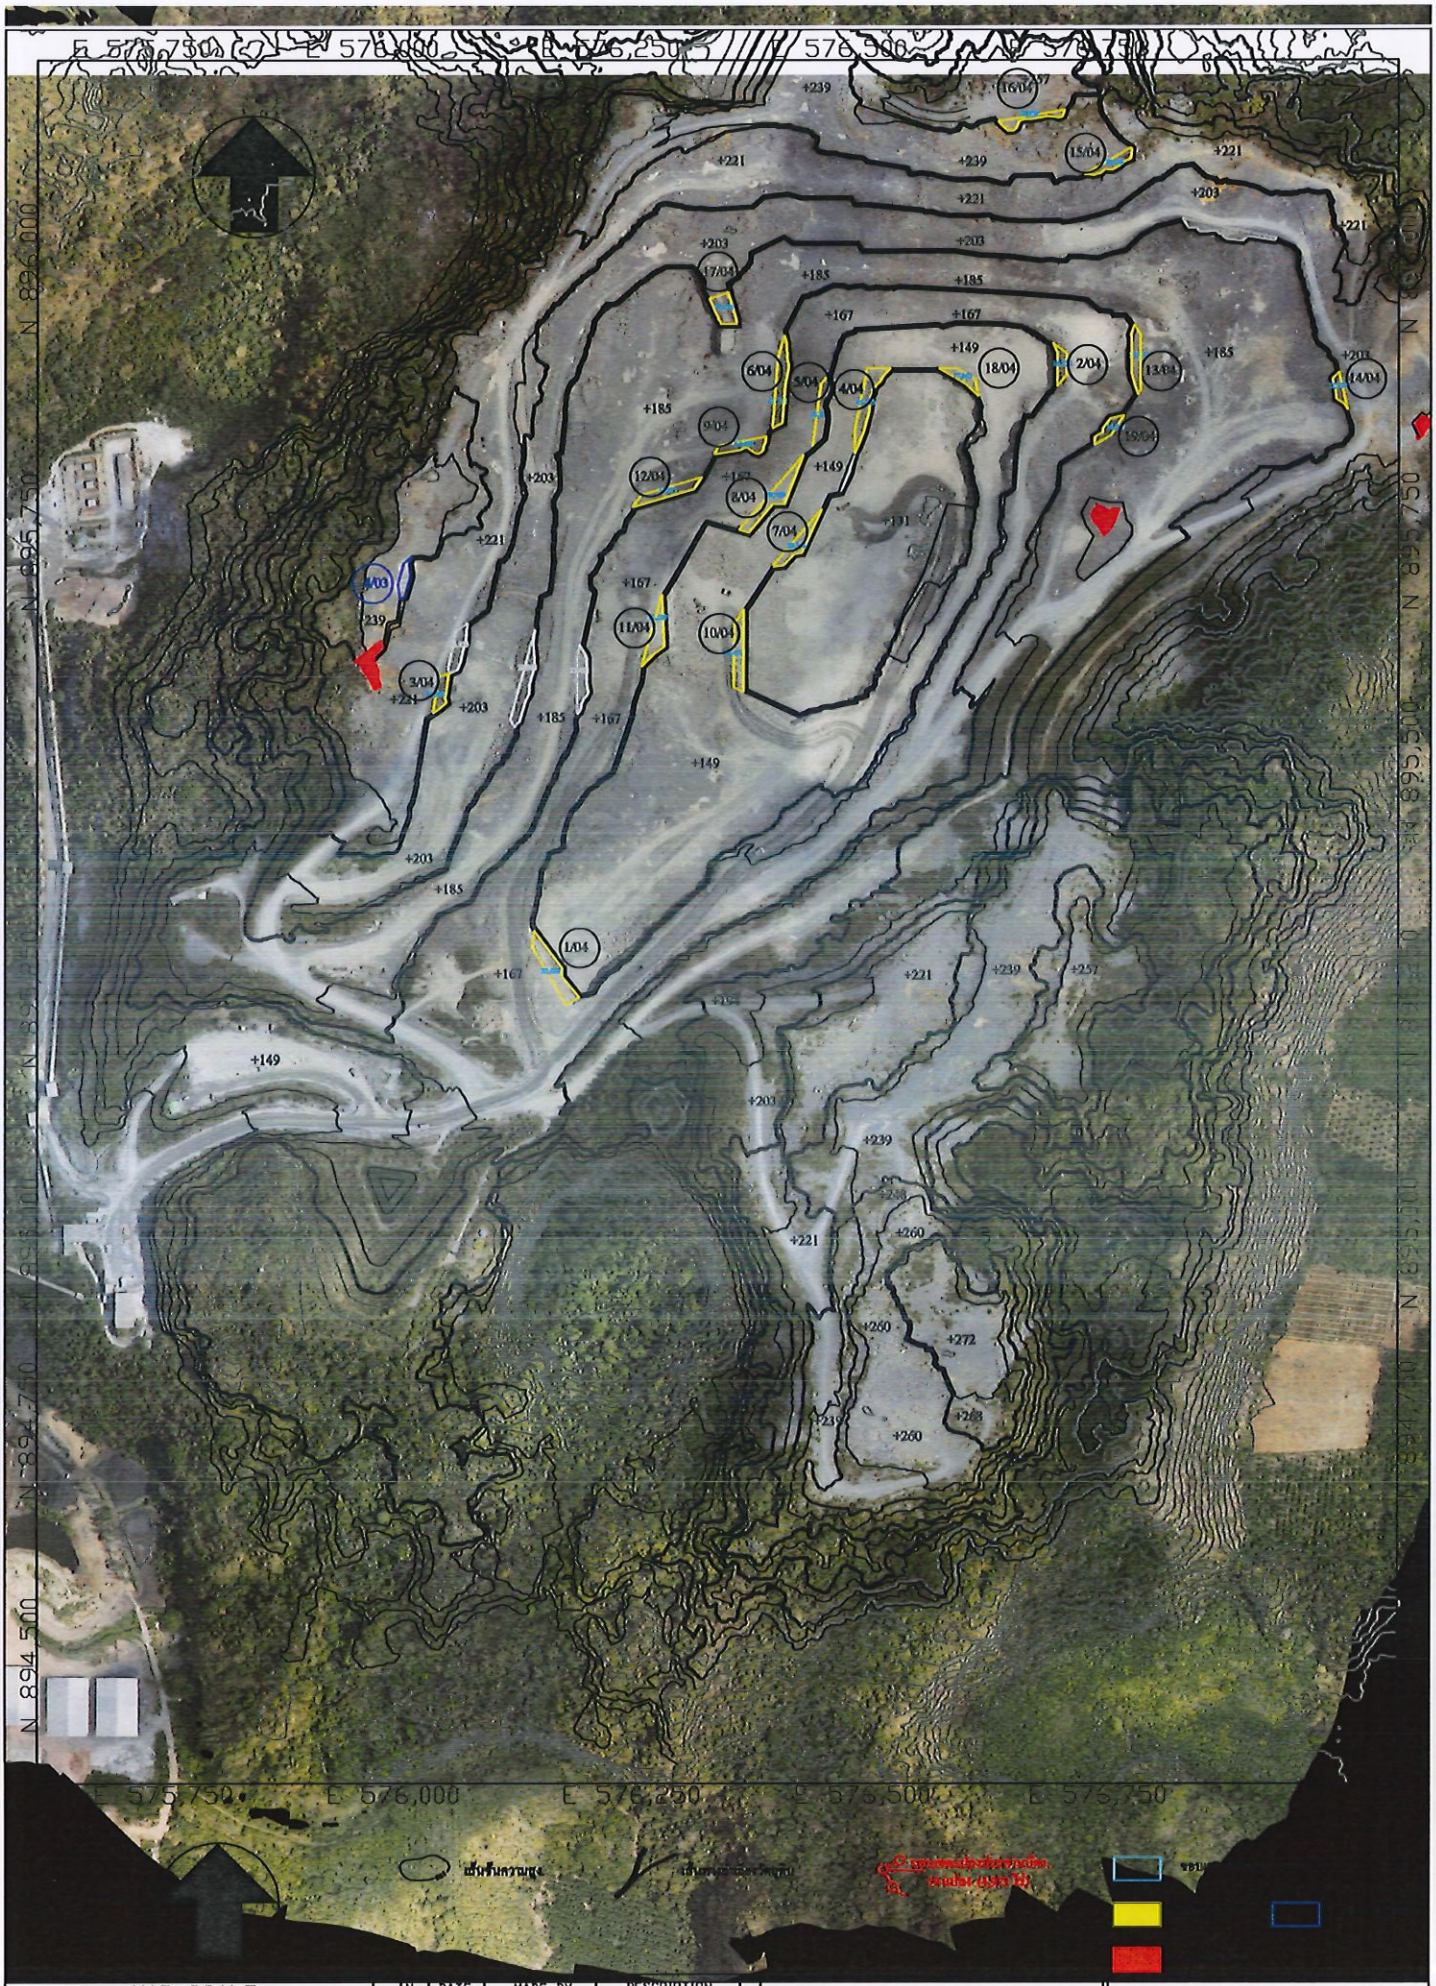

MAP SCALE	REVISIONS	No.	DATE	MADE BY	DESCRIPTION
GRAPHIC SCALE IN METRES		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			

DATE	DRAWN BY	CHECKED	APPROVED
05/12/2568	Teerachai P.		

MAP INDEX NUMBER	DIVISION
	MINERAL RESOURCES AND MINING

Plan April 2026

MAP INDEX NUMBER	SCALE	DRAWING NUMBER

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้	577,380 ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000 ตัน
สต๊อกปลายงวด	439,323 ตัน
หินที่ต้องระเบิด	538,057 ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
1/5	P	167		5.0	7.0	20	10	16,605											30/4	5/5	5/5	2/5	6/5	
	A																							
2/5	P	185		5.0	7.0	20	17	28,631											7/5	10/5	10/5	8-9	11/5	
	A																							
3/5	P	167		5.0	7.0	20	20	33,457											7/5	12/5	12/5	9-10	13/5	
	A																							
4/5	P	185		5.0	6.0	20	12	16,277											7/5	14/5	14/5	11-12	15/5	
	A																							
5/5	P	149		5.5	8.0	20	22	45,700											7/5	14/5	14/5	12-13	15/5	
	A																							
6/5	P	167		5.5	8.0	20	14	28,841											14/5	17/5	17/5	15-16	18/5	
	A																							
7/5	P	185		5.0	7.0	20	21	35,216											14/5	17/5	17/5	16-17	18/5	
	A																							
8/5	P	149		5.5	8.0	20	16	32,037											14/5	19/5	19/5	17-18	20/5	
	A																							
9/5	P	167		5.5	8.0	20	20	41,724											14/5	19/5	19/5	18-19	20/5	
	A																							
10/5	P	185		5.0	7.0	20	19	31,871											14/5	21/5	21/5	19-20	22/5	
	A																							
11/5	P	239		5.0	6.0	20	16	22,517											14/5	21/5	21/5	20-21	22/5	
	A																							
12/5	P	257		5.0	6.0	20	13	18,030											21/5	24/5	24/5	22-23	25/5	
	A																							
13/5	P	203		5.0	7.0	20	7	12,132											21/5	24/5	24/5	23/5	25/9	
	A																							
สรุป	P						209	363,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....	.....	.....	.....	
Mine Planning And Rehabilitation	Mine Operation Supervisor/Manager	Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager	Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor	R-Q-PD-001 (03)
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	9/10/68

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

แผนการใช้เดือนนี้ 577,380 ตัน
สต๊อกควบคุม 400,000 ตัน
สต๊อกปลายงวด 439,323 ตัน
หินที่ต้องระเบิด 538,057 ตัน

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...2569...

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
14/5	P	203		5.0	6.0	20	10	14,150											21/5	26/5	26/5	23-24	27/5	
	A																							
15/5	P	149		5.5	8.0	20	19	39,954											21/5	26/5	26/5	24/5	27/5	
	A																							
16/5	P	167		5.5	8.0	20	16	32,139											21/5	26/5	26/5	24-25	27/5	
	A																							
17/5	P	203		5.0	7.0	20	24	39,068											21/5	28/5	28/5	25-26	29/5	
	A																							
18/5	P	221		5.0	7.0	20	16	26,053											21/5	28/5	28/5	26-27	29/5	
	A																							
19/5	P	185		5.0	7.0	20	17	27,411											21/5	28/5	28/5	27-28	29/5	
	A																							
พัฒนา	P	203		5.0	6.0	9	12	6,400											30/4	5/5	5/5	3/5	6/5	
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P						209	363,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	A																							
สรุป	F						322	548,213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		48.0 - 50.0	≤ 1.95	-		-	≤ 0.48	≤ 0.17						

*เร่งผลิตหน้างานคุณภาพต่ำสำหรับผสมกับหิน Lowalkali

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning And Rehabilitation

...../...../.....

.....

Mine Operation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager


...../...../.....

.....

Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor

...../...../.....

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

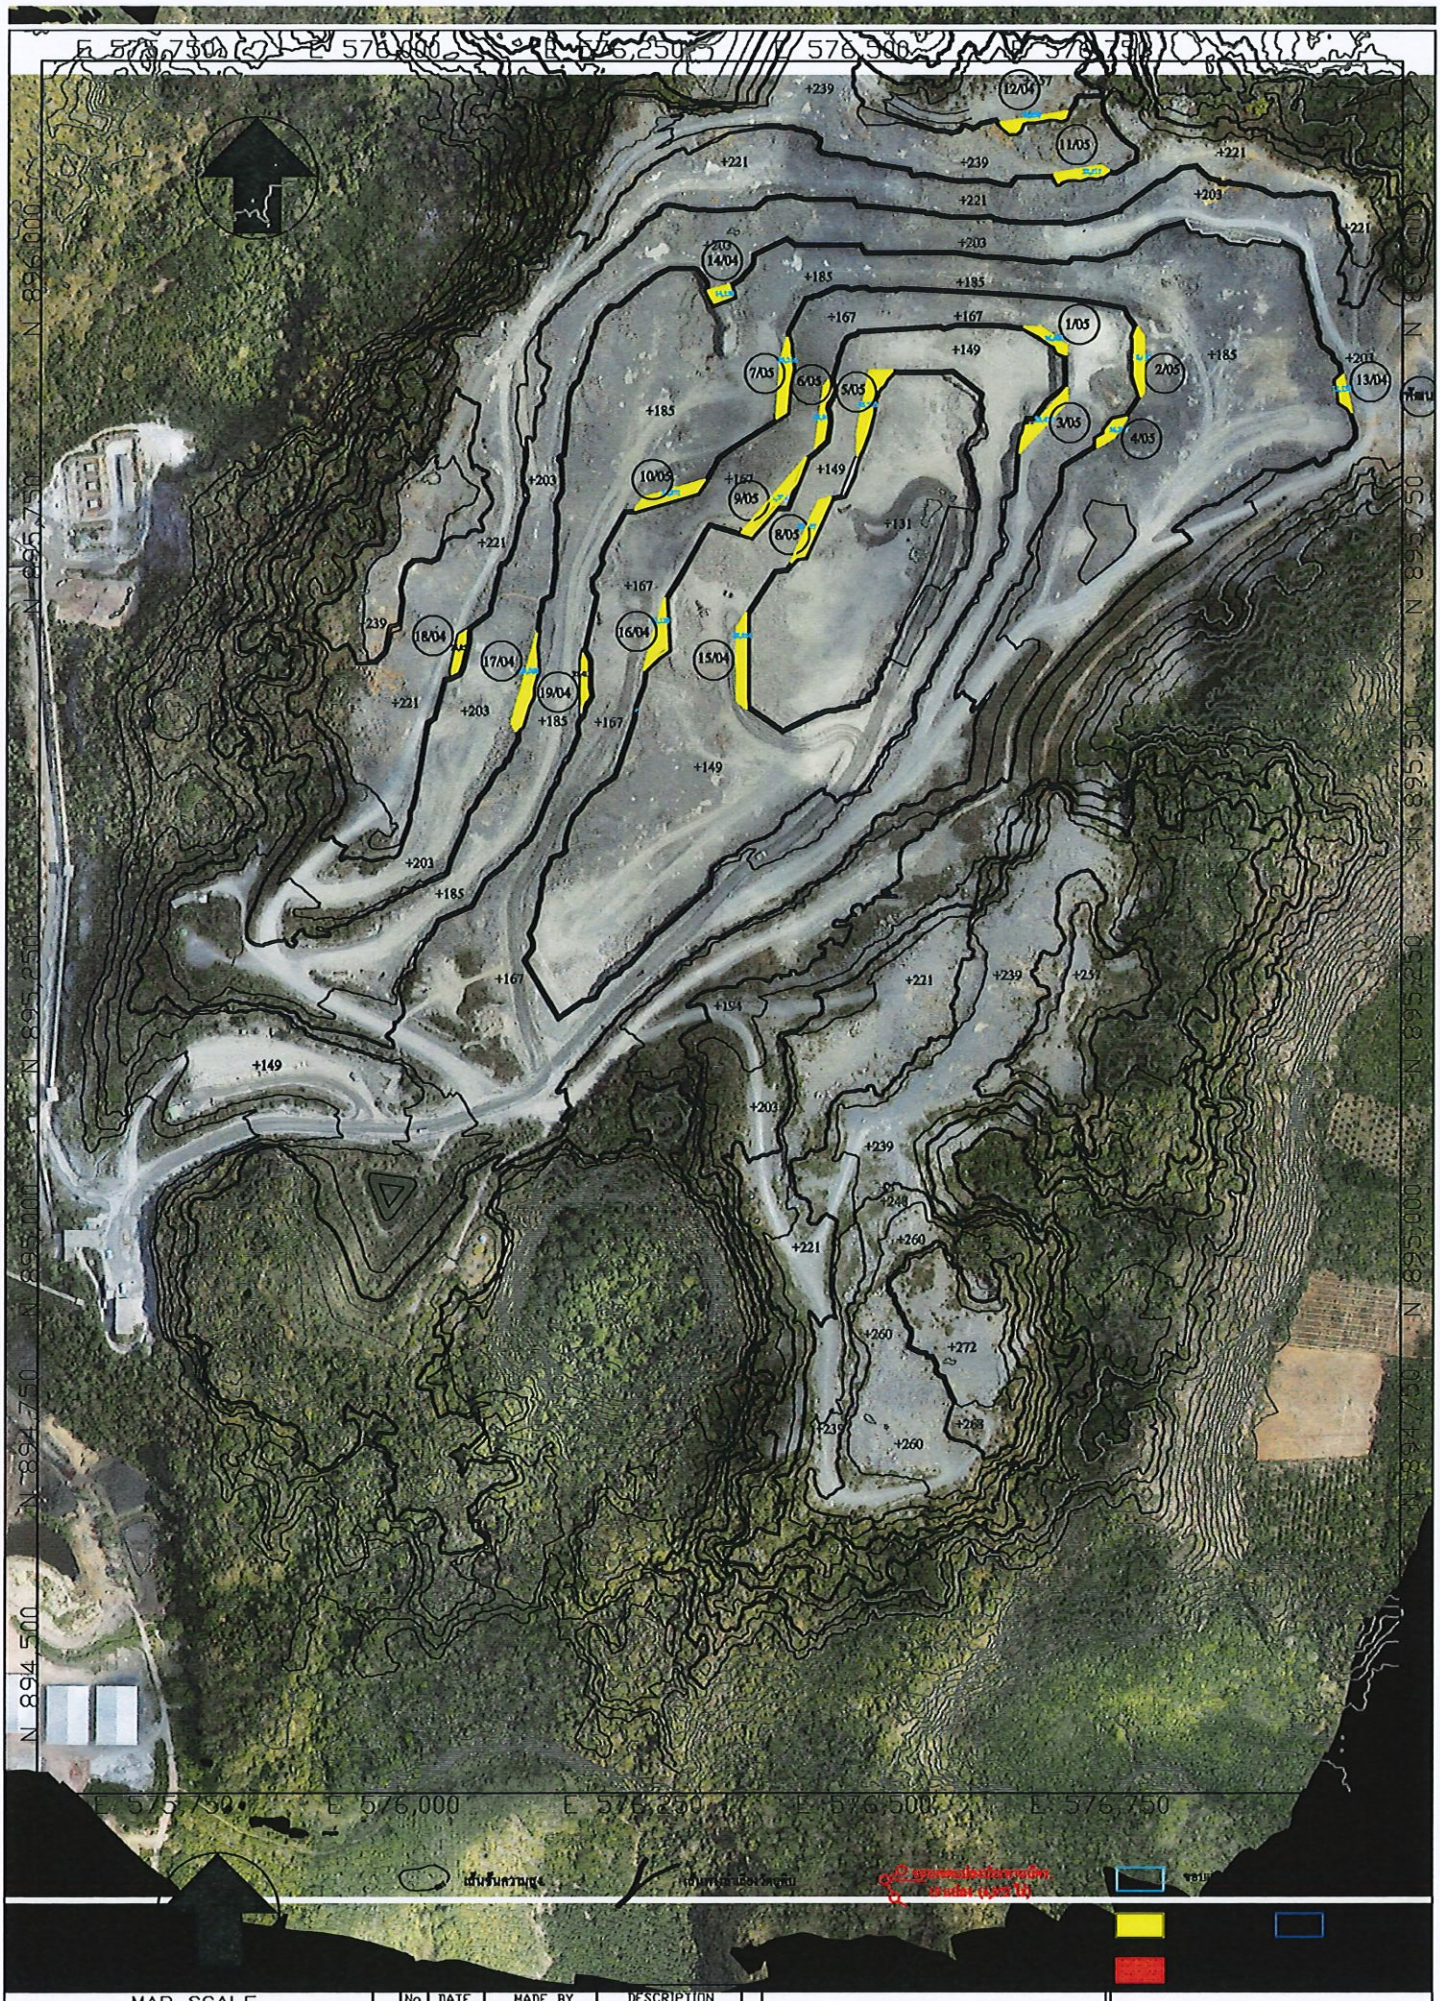

MAP SCALE

GRAPHIC SCALE IN METRES

REVISIONS	No.	DATE	MADE BY	DESCRIPTION
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			

DATE	DRAWN BY	CHECKED	APPROVED
05/12/2562	Teerachai P.		

MAP INDEX NUMBER	DIVISION
	MINERAL RESOURCES AND MINING

Plan May 2026

MAP INDEX NUMBER	SCALE	DRAWING NUMBER

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้	500,898 ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000 ตัน
สต๊อกปลายงวด	431,010 ตัน
หินที่ต้องระเบิด	469,888 ตัน

Blast ที่		ขั้นเฉลี่ย (MSL)	ชื่อ Block	Pattern การเจาะ: กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ: SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัฒนาแล้วเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
1/6	P	167	P-Q31	5.0	7.0	20	18	29,835	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90		0.01	0.57	0.38	0.11	28/5	31/5	31/5	. 29-30	1/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
2/6	P	167	N20-21	5.0	7.0	20	18	29,835	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90		0.01	0.57	0.38	0.11	28/5	4/6	4/6	31-1	5/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
3/6	P	167	P28,Q28-29	5.0	7.0	20	20	32,139	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90		0.01	0.57	0.38	0.11	28/5	4/6	4/6	1-2	5/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
4/6	P	221	Q37,R37-38,S38-39	5.0	7.0	20	24	39,258	5.94	1.90	0.00	47.66	2.16		0.08	0.90	0.65	0.20	4/6	7/6	7/6	5-6	8/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
5/6	P	185	S34-35,T35-36	5.0	7.0	20	18	28,891	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95		0.06	0.74	0.55	0.20	4/6	7/6	7/6	6-7	8/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
6/6	P	203	R35-36	5.0	6.0	20	15	20,706	7.37	1.47	0.00	47.02	2.40		0.01	0.80	0.53	0.15	4/6	9/6	9/6	7-8	10/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
7/6	P	203	N26-28	5.0	7.0	20	24	39,068	7.37	1.47	0.00	47.02	2.40		0.01	0.80	0.53	0.15	4/6	9/6	9/6	8-9	10/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
8/6	P	221	L27-28,M28	5.0	7.0	20	16	26,053	5.94	1.90	0.00	47.66	2.16		0.08	0.90	0.65	0.20	4/6	11/6	11/6	9-10	12/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
9/6	P	167	Y33-35,Z33-34	5.0	7.0	20	16	25,933	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90		0.01	0.57	0.38	0.11	4/6	11/6	11/6	10-11	12/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
10/6	P	185	AA33-34	5.0	7.0	20	20	32,411	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95		0.06	0.74	0.55	0.20	11/6	14/6	14/6	12-13	15/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
11/6	P	167	S31-32,T32-33	5.0	8.0	20	18	34,175	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90		0.01	0.57	0.38	0.11	11/6	16/6	16/6	14-15	17/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
12/6	P	185	S33-35	5.0	7.0	20	23	38,364	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95		0.06	0.74	0.55	0.20	11/6	18/6	18/6	16-17	19/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
13/6	P	149	R27-29	5.0	8.0	20	24	45,663	3.53	0.77	0.20	50.51	1.82		0.01	0.50	0.34	0.10	18/6	21/6	21/6	19-20	22/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
สรุป	P						254	422,331	5.54	1.29	0.18	48.59	2.02	0.00	0.03	0.69	0.48	0.15						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		47.0 - 51.0	≤ 2.05	-		-	≤ 0.52	≤ 0.17						

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning And Rehabilitation

...../...../.....

.....

Mine Operation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor

...../...../.....

R-Q-PD-002 (04)

1/06/69

\\172.31.51.51\iso_document\QR\Form

แผน - ผลการเจาะและระเบิดหินปูนประจำเดือน

ประจำเดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2569...

แผนการใช้เดือนนี้	500,898	ตัน
สต๊อกควบคุม	400,000	ตัน
สต๊อกปลายงวด	431,010	ตัน
หินที่ต้องระเบิด	469,888	ตัน

Blast ที่		ชั้นเหมือง (MSL)	รีอ Block	Pattern การเจาะ กว้าง Burden	ยาว Spacing	ลึก Depth	จำนวน รู	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	T-K2O	Pyrite	วันที่วางผังเสร็จ	วันที่ตักเสร็จ	วันที่พัฒนาแท่นเสร็จ	วันที่ทำการเจาะ	วันที่ทำการระเบิด	หมายเหตุ
14/6	P	167	X32,Y32-33	5.0	7.0	20	20	33,457	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90		0.01	0.57	0.38	0.11	18/6	23/6	23/6	21-22	24/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
15/6	P	185	Z32-33,AA33	5.0	7.0	20	10	16,277	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95		0.06	0.74	0.55	0.20	18/6	23/6	23/6	22-23	24/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
16/6	P	167	R-S31	5.0	8.0	20	17	31,352	4.72	1.08	0.25	49.49	1.90		0.01	0.57	0.38	0.11	18/6	25/6	25/6	24-25	26/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
17/6	P	185	R32-33,S33	5.0	7.0	20	15	25,199	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95		0.06	0.74	0.55	0.20	25/6	28/6	28/6	26-27	29/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
18/6	P	185	Q31-32,R31-33	5.0	7.0	20	22	36,659	6.35	1.36	0.30	47.87	1.95		0.06	0.74	0.55	0.20	25/6	28/6	28/6	27-282	29/6	คุณภาพ MineSight
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
	P																							
	A																							
สรุป	F						339	565,275	5.56	1.28	0.21	48.59	1.99	0.00	0.03	0.68	0.48	0.15						
	A																							
								ค่าควบคุม	-	-		47.0 - 51.0	≤ 2.05	-		-	≤ 0.52	≤ 0.17						

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning And Rehabilitation

...../...../.....

.....

Mine Operation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....


Mine Planning And Rehabilitation Supervisor/Manager

...../...../.....

.....

Mining and Circularity Operation Engineer/Supervisor

...../...../.....

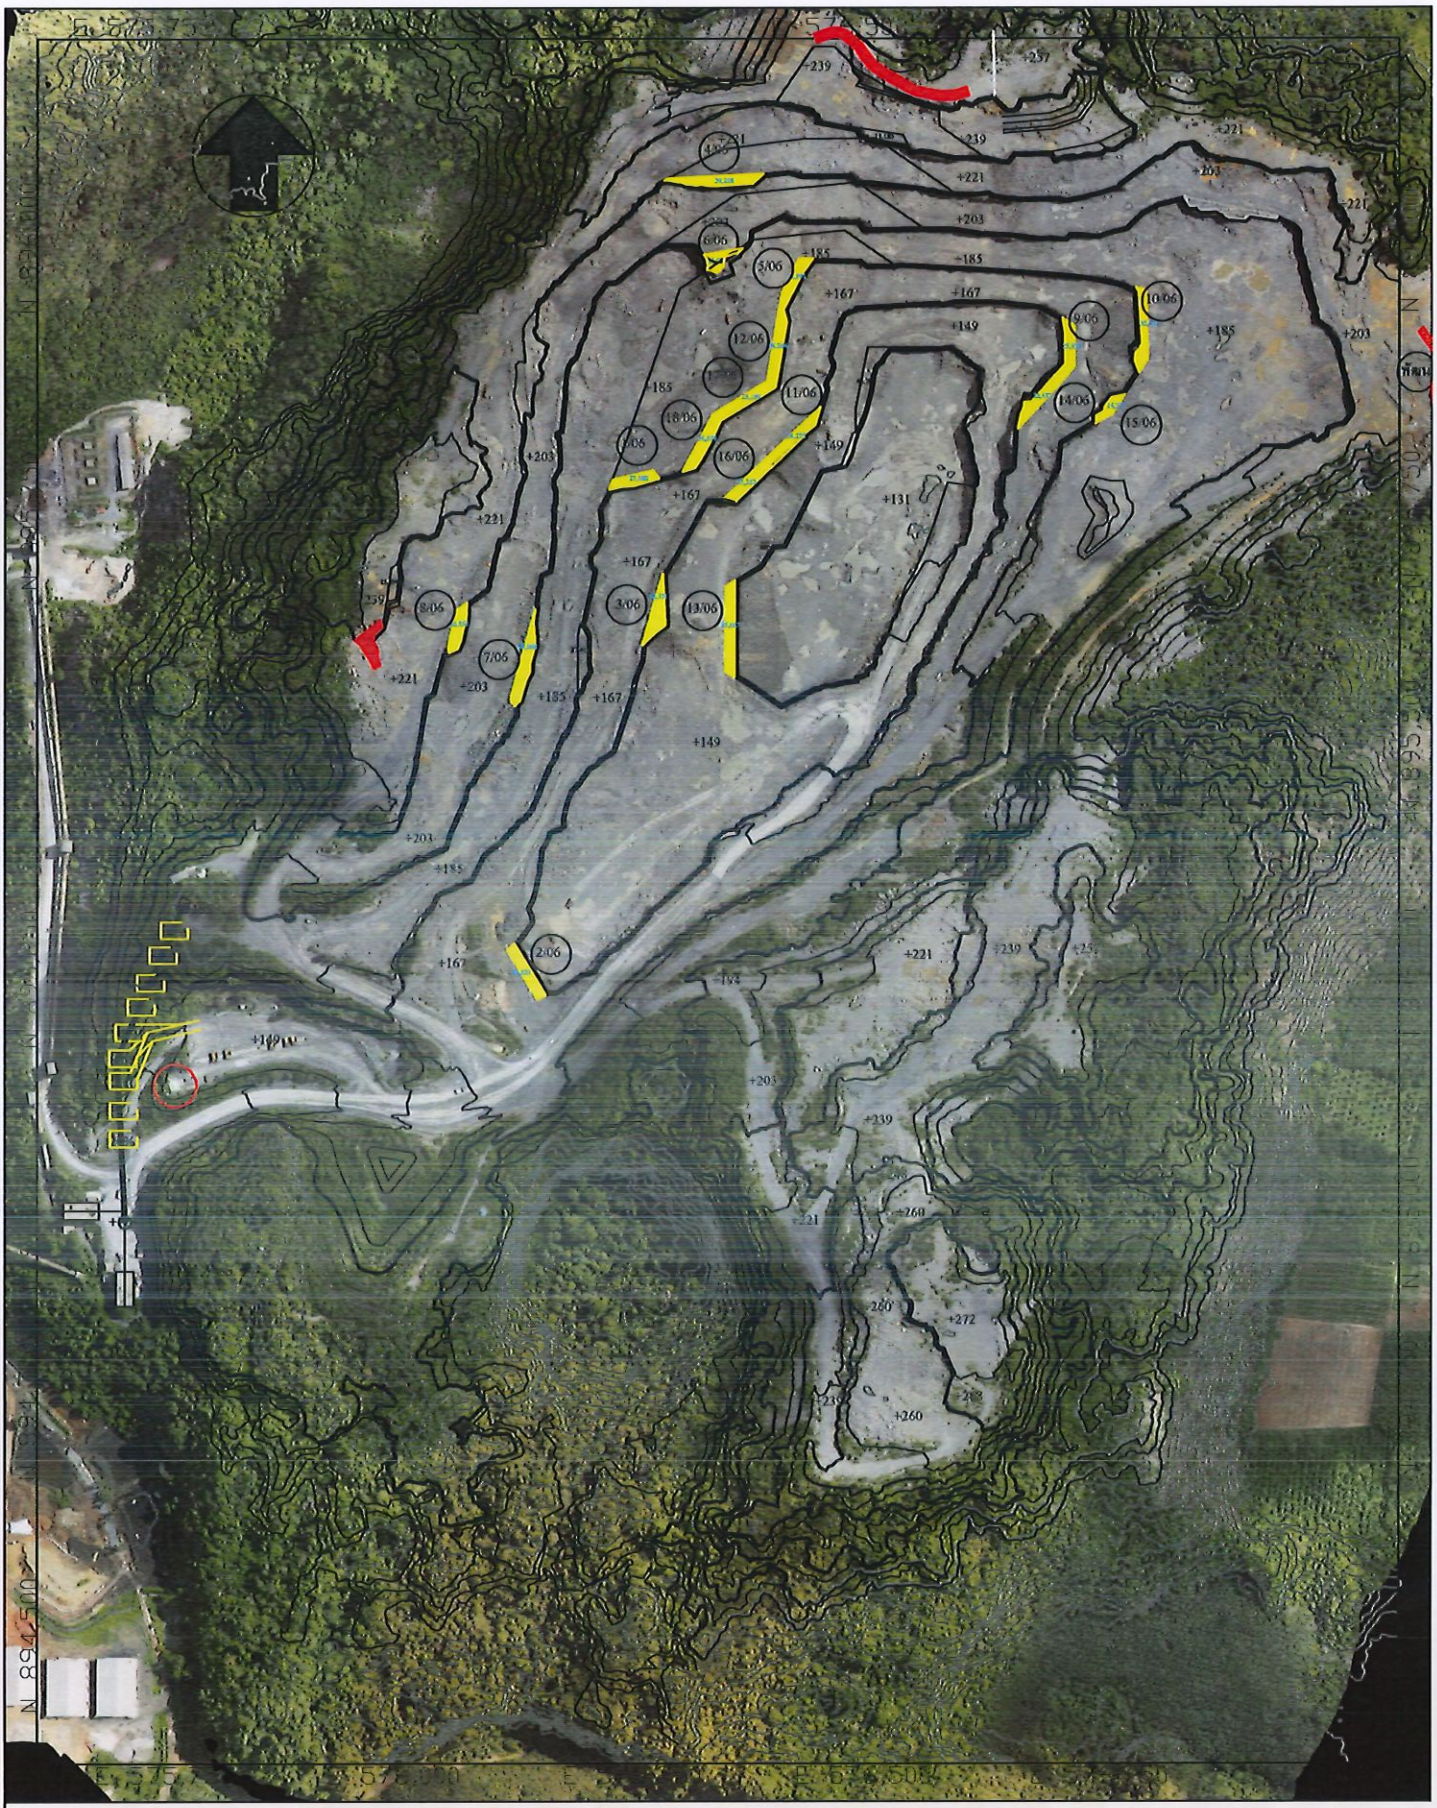

LEGEND

MAP SCALE

GRAPHIC SCALE IN METRES

เส้นรัศมีความสูง

เส้นทางลำเลียงวัตถุดิบ

ขอบเขตแปลงประทานบัตร. 19 แปลง (4,972 ไร่)

ขอบเขตพื้นที่การทำเหมือง PH1 871-0-16 ไร่

Blasting Plan

Blasting Sleep

Development

REVISIONS	No.	DATE	MADE BY	DESCRIPTION
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			

DATE	DRAWN BY	CHECKED	APPROVED
26/12/2562	Teanchai P.		

MAP INDEX NUMBER	DIVISION
	MINERAL RESOURCES AND MINING

Plan June 2026

MAP INDEX NUMBER	SCALE	DRAWING NUMBER
