ภาคผนวกที่ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๖๗๒

ใบอนุญาตเลขที่ ๒๐๖/๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด**
โดย นายวีรภัทร กาญจนาปิ่นโชติ และ นายประวิทย์ กาญจนาปิ่นโชติ

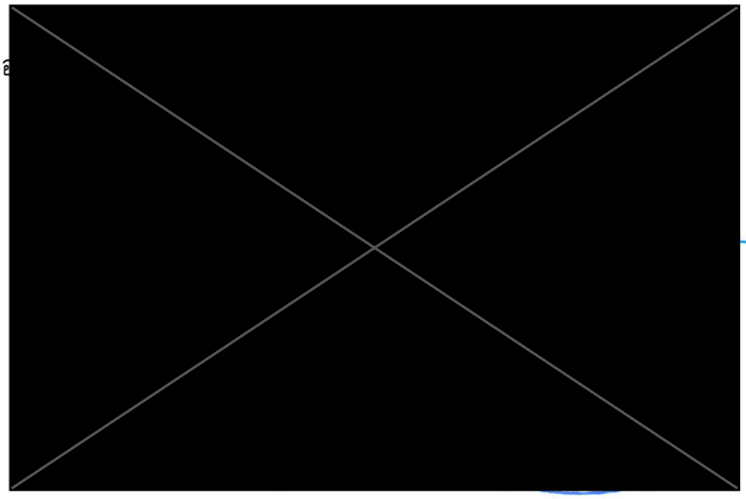
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๒๕๕ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๑๑๒๒ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง**
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐



สำหรับขอเอกสารประกอบการพิจารณาของกรมการสิ่งแวดล้อม EIA

ภาคผนวกที่ 3

สำเนาใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - สระว่ายน้ำ

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ลีจีโอแนลลา แบคทีเรีย

ภาคผนวกที่ 4

สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๗๑๕๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนาดล จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๖๔๖ ลงรับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านขอต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ของ บริษัท วนาดล จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒/๒๕ ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๔๔๐๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เลขทะเบียน บ.๑๐๐-๔๘-๐๑๙ โดยให้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้สิ้นอายุ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ และมีบุคลากรดังนี้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

[redacted]

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข. [redacted]


ค. ขอบขายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด เลขทะเบียน ว-๐๒๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒ ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
7	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[1]
10	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
12	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
13	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
15	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
16	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2] 2) Soxhlet Extraction Method[2]
17	pH	Electrometric Method[2]
18	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[2]

19 Selenium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
20	Sulfide	1) Iodometric Method[2] 2) Methylene Blue Method[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[2]
25	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
26	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

(Environment & Laboratory Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐

(Accreditation No. Testing 0240)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(Issue date : 15 January B.E. 2567 (2024))

ผู้อำนวยการสำ ชาติ

เลขาธิการสำ ม

9620e443

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (Environment and Laboratory Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0240 (Testing 0240)

ฉบับที่ 02 (Issue No. 02) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B
	- Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Copper (Cu) 0.030 mg/L to 5.00 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.)	- Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C
2. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical oxygen demand (COD) 40.0 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25CH546

Equipment :	pH Meter
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	Seven Compact S220
Serial No. :	C125985375
ID No. :	PHM-006
Condition As-Received:	Used Item
Received Date :	13 May 2025
Calibration Date :	14 May 2025
Reference :	2505-0324DC-2
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Ambient Temperature :	(25 ± 2.5) °C
Relative Humidity :	(50 ± 15) %
Calibration Procedure :	In - house method : - CP-CH5 by direct measurement with DC voltage standard and direct measurement with certified reference material (CRM) - CP-CH8 by comparison with temperature standard
Calibrated by :	Walalak Sirithean
Approved by :	Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Ponpan Paipim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 15 May 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	24E2759	25 Aug 2025
2) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	24I757	14 July 2025

- This measurement result is traceable to SI throught Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2. Certified Reference Materials :The measurement results are traceable to SI through Hach Lenge GmbH Ltd., Deutsche Akkreditierungsstelle, Accredited No.D-RM-15184-01-00
:The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd., ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.007	CPA chem	1066665	18 Jan 2027
pH 7.000	Hach Lenge GmbH	C03232	02 Dec 2026
pH 10.010	CPA chem	1066669	18 Jan 2026

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor *k*
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter	4.000	177.48	177.7	4.000	0.058	2.00
S/N.: C125985375	7.000	0.00	0.3	7.000	0.058	2.00
	10.000	-177.48	-177.1	10.000	0.058	2.00

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement (±)	Coverage factor *k*
pH Electrode	4.007	4.007	176.1	0.0044	2.00
S/N.: 1205515	7.000	6.999	3.7	0.0084	2.00
	10.010	10.010	-158.5	0.0065	2.00

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : InLabExpert Pro-ISM
- Serial No. : 1205515

Dimension of probe

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement (± °C)	Coverage factor *k*
25.0	25.001	24.9	-0.101	0.13	2.00

Remark - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25MM393

Equipment :	Electronic Balance
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	ML204T /00
Serial No. :	B647342339
ID No. :	ANB-003
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 304
Received order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	15 °C to 40 °C
Relative Humidity :	30 % to 90 %
Calibrated by :	Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Electronic Balance **Cert.No.:** 25MM393
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Procedure used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OB01 based on UKAS LAB 14 according to direct measurement method against standard weight.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instruments:-

Instruments	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due date
1) Standard Weight Set (E2)	24053	MM-0013-24	NIMT	25 Jan 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This result of calibration was made on requested at the point specified by customer.
4. This certificate is not certified for any commercial transaction.
5. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : NIMT : National Institute of Metrology Thailand

Result of calibration ( ) Without Adjustment (*) After Adjustment by Internal Calibration
Range capacity : 0 g to 220 g **Resolution** 0.0001 g

Before Adjustment :

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
100	99.9996	+0.0004	0.17	2
200	199.9998	+0.0002	0.30	2

After Adjustment :

1. **Determination of the standard deviation of weighing machine** (n = 10)

Applied Weight (g)	Standard Deviation of Reading (g)
100	0.00005
200	0.00004


Equipment : Electronic Balance
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Cert.No.: 25MM393

Result of calibration

2. Effect of off center loading

A mass of 100 g was placed to various position on the pan. The weighing machine reading error obtained is given in the table



Position 1 (g)	Position 2 (g)	Position 3 (g)	Position 4 (g)	Position 5 (g)	Maximum difference between off-center and central loading (g)
-0.0001	-0.0002	-0.0002	-0.0002	-0.0002	0.0001

3. Departure from nominal value

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
Unload	0.0000	0.0000	0.12	2.06
0.1	0.1000	0.0000	0.12	2.06
0.2	0.2000	0.0000	0.12	2.06
1	1.0000	0.0000	0.12	2.06
5	5.0000	0.0000	0.12	2.06
10	9.9999	+0.0001	0.12	2.06
20	19.9999	+0.0001	0.12	2.05
50	50.0001	-0.0001	0.14	2
100	100.0000	0.0000	0.17	2
150	150.0000	0.0000	0.29	2
200	200.0000	0.0000	0.30	2

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM977

Equipment :	Incubator
Manufacturer :	Sanden Intercool
Model :	SRC-680SRTM
Serial No. :	SRC680201-1107-00166
ID No. :	CHI-003
Submitted by :	EnvironMent & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 301
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	09 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V
Calibrated by :	Uthen Kankawi

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Incubator **Cert. No.:** 25TM977

Condition As-Received : Used Item **Page :** 2 of 3

Reference : 2507-0148OC-5

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA	27 Jul 2025
2) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA,	27 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

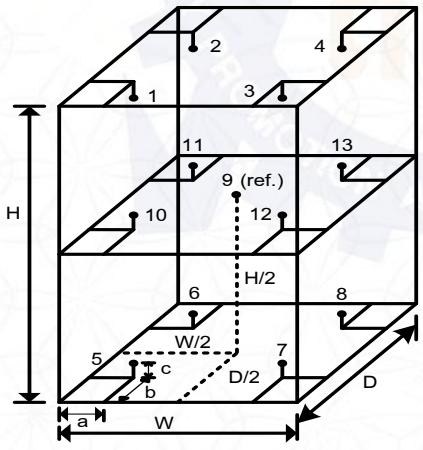
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	29
REL.Humi. (%)	54	55
AC Supply (Volt)	224	225

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	20-16RTD-01
2	20-16RTD-02
3	20-16RTD-03
4	20-16RTD-04
5	22-16RTD-05
6	20-16RTD-06
7	20-16RTD-07
8	22-16RTD-08
9 (ref.)	22-16RTD-09
10	20-16RTD-10
11	19-16RTD-01
12	19-16RTD-02
13	19-16RTD-03



Dimension of Chamber :

D = 0.60 m

Probe Installation Details :

a = 10 cm

Equipment : Incubator
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-5
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM977

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
20.0	20.0	20.0	0.21	0.43	0.80	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
20.0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 (ref.)**	0.35
	19.957	20.008	20.073	19.725	19.753	19.679	19.701	19.670	20.012	
	10	**11**	**12**	**13**						
	19.789	19.773	20.168	19.744						

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM974

Equipment :	Hot Air Oven
Manufacturer :	FRANCE ETUVES
Model :	XU058
Serial No. :	P790
ID No. :	CHO-004
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 303
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Hot Air Oven **Cert. No.:** 25TM974

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-2

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD) and Thermocouple Type T.

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013823	25LM75	TPA	06 May 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

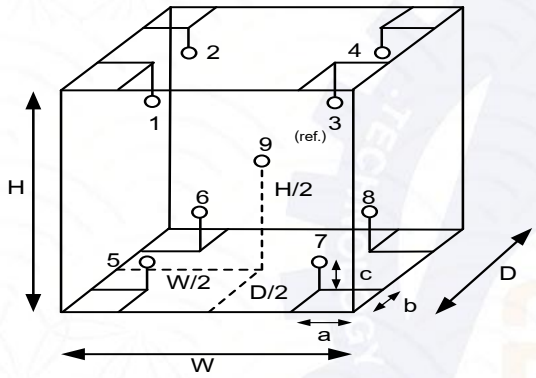
Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	26
REL.Humid. (%)	47	51
AC Supply (Volt)	220	221



Position :	Ref. Std. ID No.: @ Calibration Point (180) °C	(104) °C
1	21-17TC-01	25-17RTD-01
2	21-17TC-02	25-17RTD-02
3	21-17TC-03	25-17RTD-03
4	21-17TC-04	25-17RTD-04
5	21-17TC-05	25-17RTD-05
6	21-17TC-06	25-17RTD-06
7	21-17TC-07	25-17RTD-07
8	21-17TC-08	25-17RTD-08
9 (ref.)	21-17TC-09	25-17RTD-09

Probe Installation Details :

a =	5.0	cm
b =	5.0	cm
c =	5.0	cm

Dimension of Chamber :

D =	0.36	m
W =	0.40	m
H =	0.40	m
Capacity =	0.058	m^3

Equipment : Hot Air Oven
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-2
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM974

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
104.0	104.0	104.0	0.13	1.0	1.1	2
180.0	180.0	180.0	0.24	1.6	1.9	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (ref.)	
104.0	103.529	103.769	104.251	104.428	103.589	103.683	104.172	103.978	104.411	0.42
180.0	180.583	179.425	180.832	179.981	179.369	179.667	180.479	180.019	180.809	1.1

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity .

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM951

Equipment :	Water Bath
Manufacturer :	Memmert
Model :	WNE 14
Serial No. :	L418.1373
ID No. :	WAB-02
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd 40 Soi liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 4
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) °C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Preecha Hlahib

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Water Bath **Cert. No.:** 25TM951

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-3

Procedure Used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OT04 Based on ASTM E715 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Industrial Platinum Resistance Thermometer (IPRT).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013711	24LM115	TPA	13 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

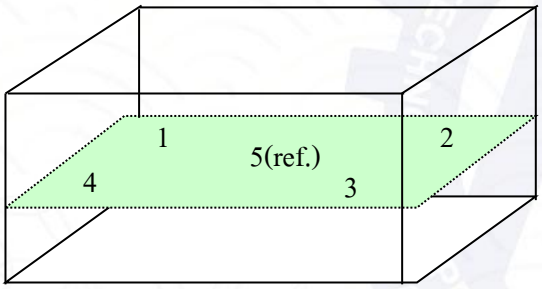
Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Heat transfer medium used : Water

	Environmental		AC Voltage Supply
	(°C)	(%R.H.)	(Volt)
Beginning of Calibration	24	55	221
Finished of Calibration	21	56	221



Front

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	4803988-001
2	4803988-002
3	4803988-003
4	4803988-004
5(ref.)	4803988-005

Equipment : Water Bath
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-3
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source

Cert. No.: 25TM951

Calibration point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Average* Standard Reading (°C) Position					Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5 (ref.)	
44.5	44.5	44.5	44.569	44.543	44.554	44.587	44.593	0.15
60.0	60.0	60.0	60.293	60.259	60.206	60.246	60.291	0.15

Calibration point (°C)	Uniformity (°C)	Stability (± °C)	Coverage Factor *k*
44.5	0.098	0.045	2
60.0	0.13	0.050	2

Average* : The average of 30 values in each position.
Uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one probe.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

ภาคผนวกที่ 5

สำเนาเอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

สำเนาแบบรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

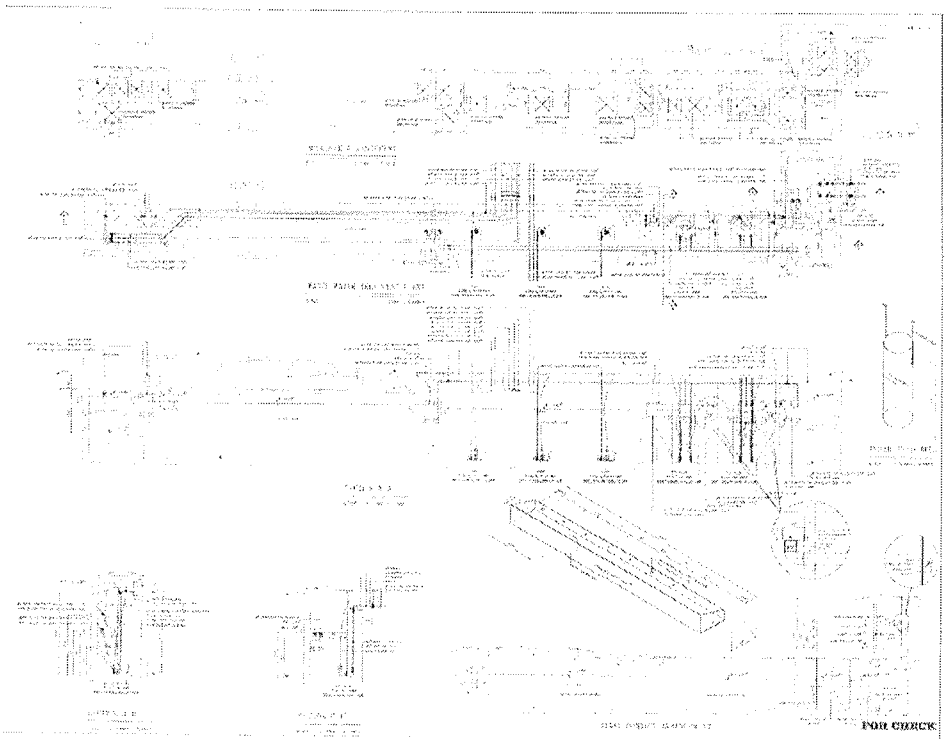
แบบ ทส ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....1122..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....พระโขนง..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย..... จังหวัด .....กรุงเทพ..... โทรศัพท์ .....02-0959888..... โทรสาร .....-..... มี .....นาย วีรภัทร กาญจนาปิ่นโชติ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....206/2565 ออกให้โดย .....กระทรวงมหาดไทย..... หมดอายุ .....26 ธันวาคม 2570.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ			
01/01/2026	250.00	109.00	87.20	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
02/01/2026	250.00	93.00	74.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
03/01/2026	250.00	90.00	72.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
04/01/2026	270.00	82.00	65.60	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
05/01/2026	230.00	76.00	60.80	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
06/01/2026	250.00	74.00	59.20	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
07/01/2026	250.00	75.00	60.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
08/01/2026	250.00	77.00	61.60	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
09/01/2026	250.00	65.00	52.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
10/01/2026	180.00	70.00	56.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
11/01/2026	230.00	94.00	75.20	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
12/01/2026	250.00	90.00	72.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
13/01/2026	250.00	104.00	83.20	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
14/01/2026	250.00	97.00	77.60	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
15/01/2026	250.00	82.00	65.60	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
16/01/2026	250.00	81.00	64.80	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ			
17/01/2026	250.00	84.00	67.20	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
18/01/2026	250.00	88.00	70.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
19/01/2026	260.00	86.00	68.80	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
20/01/2026	240.00	78.00	62.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
21/01/2026	250.00	90.00	72.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
22/01/2026	250.00	91.00	72.80	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
23/01/2026	280.00	100.00	80.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
24/01/2026	280.00	93.00	74.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
25/01/2026	300.00	95.00	76.00	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
26/01/2026	280.00	88.00	70.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
27/01/2026	280.00	97.00	77.60	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
28/01/2026	290.00	88.00	70.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
29/01/2026	300.00	88.00	70.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
30/01/2026	300.00	97.00	77.60	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์
31/01/2026	300.00	88.00	70.40	ระบาย	Nano zyme 1L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ทวีศักดิ์

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
  - ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

- ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
- ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
- (.....)
- ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- (.....)
- ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
- ออกให้โดย .....
- ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
- (.....)
- ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
- ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ibis styles phra khanong

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1122 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : พระโขนง เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 255

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 206/2565 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26/12/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายทวีศักดิ์ โศภาพิสิฐกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 168.49 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเอกชน มาดูดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,020.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,710.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,168.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. nano zyme	1.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำเนาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

ibis styles HOTELS
Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ						215 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[ ]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**					[ ]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**					psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**					psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**	/				[/]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						346 / 349 / 345 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						3.2 / 3.4 / 3.3 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						220 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 4 / 1 / 19 Time : 13 : 20 Check by : [illegible]

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ						220 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน๊อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[/]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**					[ ]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**					psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**	/				[/]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						342/345/341 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						44/43/43 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						240 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		13 : 30				13 : 40

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 02.

Date: 4 / 1 / 69 **Time :** 13 : 30 **Check by :** [illegible]

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

ใบรายงานช่าง

ครั้งที่ _____

ลูกค้า : _____ ประเภทของงาน : _____ วันที่ : ____ / ____ / ____
ติดต่อลูกค้า : _____ เบอร์โทร : _____
เครื่องยนต์ : _____ รุ่น : _____ หมายเลขเครื่องยนต์ : _____
ไดชาร์จเครื่องยนต์ : _____ แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ : _____ แบตเตอรี่ : _____
Alternator : _____ รุ่น : _____ หมายเลขอัลเทอร์เนเตอร์ : _____
AC. Volt : _____ kVA. : _____ kW. : _____ Amp. : _____ AVR. : _____
คอนโทรล : _____ รุ่น : _____ หมายเลขคอนโทรล : _____
Fire Pump : _____ Model : _____ S/N : _____
สถานะตู้คอนโทรล ก่อนทำงาน : _____ สถานะตู้คอนโทรล หลังเสร็จงาน : _____
กรองน้ำมันเครื่อง : _____ กรองบายพาส : _____ กรองเชื้อเพลิง.1 : _____
กรองเชื้อเพลิง.2 : _____ กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ : _____ กรองน้ำยาหม้อน้ำ : _____
กรองอากาศนอก (โตนอกxโตในxยาว) : _____ กรองอากาศใน (โตนอกxโตในxยาว) : _____
สายพานพัดลม : _____ สายพานไดชาร์จ : _____ ชั่วโมงการทำงาน : _____ Hrs.

GENERATOR SET

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
4. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
5. ตรวจเช็คสภาพภายนอกโดยรวม Alternator , Breaker switch และ จุดต่อสายไฟต่างๆ			
6. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรอง และ รอยรั่วซึมต่างๆของน้ำมันเชื้อเพลิง			
7. ตรวจเช็คสภาพโดยรวม และทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง			
8. ทดสอบสตาร์ทเช็คการทำงาน,ตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆและบันทึกค่าพารามิเตอร์			
9. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

FIRE PUMP SET

ต้นกำลัง : เครื่องยนต์ ☐ / Electric Motor ☑

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อน้ำ , ชุด Heat exchanger และ ชุด Cooling loop.			
4. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
5. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
6. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างของตัวปั๊มน้ำ , วาล์วควบคุมต่างๆ , เกจวัดค่า และ ท่อทางน้ำ			
7. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆของชุด Jockey Pump			
8. ตรวจเช็ค วัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ Electric Fire pump			
9. ทำความสะอาดโดยรวม Fire Pump Set			
9. ทดสอบการทำงาน Manual และ Auto Start พร้อมบันทึกค่าการทำงาน			
10. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : _____

ลูกค้า : _____ ช่างเทคนิค : _____
วันที่ : ____ / ____ / ____ วันที่ : ____ / ____ / ____ เวลา : _____

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 1

Diesel Engine Fire Pump : ___ **Electric Fire Pump :** ✓ **เครื่องที่ :** EFP-02

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
จั๊มปั๊ม	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : AUTO / AUTO	/		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า	/		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของปั๊มน้ำ	/		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของวาล์วควบคุมระบบต่างๆ , เกจวัดแรงดันต่างๆ	/		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมท่อทางน้ำ และรอยรั่วซึม	/		
	แรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ R-S.____ / R-T.____ / S-T.____ Vac.	/		
	กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน R.____ / S.____ / T.____ Amp.	/		
	ทดสอบการทำงาน Manual start และ Auto start ของ Jockey pump	/		
	แรงดันเริ่มทำงานอัตโนมัติ : 190 Psi.	/		
	แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ : 200 Psi.	/		
	Relief pressure : 225 Psi.	/		
เครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำมันเครื่อง และรอยรั่วซึมต่างๆ	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำหม้อน้ำ และ Heat Exchanger และท่อยางน้ำต่างๆ	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อน้ำมัน และถังน้ำมันสำรอง	-	-	มีน้ำมันอยู่____ลิตร
	ตรวจเช็คชุด Coupling ขับปั๊ม / Gear Pump ขับปั๊มน้ำ+ระดับน้ำมันเกียร์	/		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ท่อร่วมไอเสีย และเทอร์โบ	-	-	
	ตรวจเช็ค วัดค่าต่างๆของแบตเตอรี่	-	-	
	- ค่า CCA. Batt#1 :____ CCA Batt#2 :____ CCA	-	-	
	- ค่า CCA. Batt#3 :____ CCA Batt#4 :____ CCA	-	-	
	- ค่า ถพ. Batt#1 :____ ดีกรี Batt#2 :____ ดีกรี	-	-	
	- ค่า ถพ. Batt#3 :____ ดีกรี Batt#4 :____ ดีกรี	-	-	
	- ค่า แอมป์ ชาร์จ Batt#1 :____ A. Batt#2 :____ A.	-	-	
	- ค่า โวล์ท ชาร์จ Batt#1 :____ Vdc. Batt#2 :____ Vdc.	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง	/		
	- วัดค่าโวล์ทที่จ่ายให้มอเตอร์ R-S____ / R-T____ / S-T____	/		
	- วัดค่ากระแสขณะมอเตอร์ทำงาน R____ / S____ / T____	/		
	- วัดอุณหภูมิทำงานโดยรวมของมอเตอร์ ____ C°	/		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของสายไฟ , รางสายไฟ และซัฟพอร์ทต่างๆ	/		
	ทำการหล่อลื่น อัดจารบีจุดหมุนต่างๆ	/		
	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง , ยางรองแท่นเครื่อง หรือ สปริงซัฟพอร์ทต่างๆ	/		
	ทำความสะอาดโดยรวม ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์	/		
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ชนิดของปั๊มน้ำ : Horizantal ✓ / Vertical ☐	/		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม วาล์วควบคุมต่างๆของระบบ	/		
	ตรวจเช็คเกจวัดค่าแรงดันต่างๆของระบบ	/		
	ตรวจเช็คท่อทางน้ำ ปะเก็นหน้าแปลนท่อ และรอยรั่วซึมต่างๆ	/		
	ตรวจเช็คโดยรวมชุด Transfer gear และระดับน้ำมันเกียร์ (ปั๊มแบบ Vertical)	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของลูกปืนเพลาปั๊ม และ Packing seal	/		
	หล่อลื่น อัดจารบี จุดหมุนต่างๆ	/		
	ทำความสะอาดปั๊มน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆโดยรวม	/		

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 2

เครื่องยนต์ ☐ / ELECTRIC ☑

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค NO.2	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล และ ทดสอบการทำงาน	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : AUTO / AUTO	✓		
	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตู้ Controller	✓		
	ตรวจเช็คการทำงาน ของระบบสัญญาณเตือนต่างๆที่ตู้ Fire Pump.	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 หน้าตู้ Controller	-	-	
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 ที่ตู้ข้างเครื่องยนต์	-	-	
	ทดสอบการทำงานคันโยก Emergency Start (Electric Fire pump)	✓		
	ทดสอบการทำงาน แบบจำลองสถานการณ์ AUTO Start Fire pump	✓		
	เช็คแรงดันสตาร์ทอัตโนมัติของ Fire pump ทำงานที่ 1160 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง : _____ Bar./ Psi./ kPa.	-	-	
	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น : _____ C˚/F˚	-	-	
	ตรวจเช็คค่ารอบการทำงานของเครื่องยนต์ : _____ RPM.	✓		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ Cooling loop : _____ Psi.	-	-	
	ตรวจเช็ค Relief valve และค่า Relief pressure : _____ Psi.	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิตัวเรือนปั๊มน้ำ : _____ C˚/F˚	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกปืนเพลาปั๊มน้ำ ตัว1._____ C˚/ตัว2._____ C˚	✓		
	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำของ Cooling loop และ น้ำที่ระบายออก	-	-	

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่อรายการอะไหล่	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ

สรุปงาน PM. และข้อเสนอแนะ : _____

ลูกค้า : _____ ช่างเทคนิค : _____

วันที่ : 09 / 01 / 2566 วันที่ : 09 / 01 / 2024 เวลา : 17:00

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.

241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.

Suanluang District , Bangkok 10250

Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30

E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

ใบรายงานช่าง

ครั้งที่_____

ลูกค้า : _____ ประเภทของงาน : _____ วันที่ : ____ /____ /____

ติดต่อลูกค้า : _____ เบอร์โทร : _____

เครื่องยนต์ : _____ รุ่น : _____ หมายเลขเครื่องยนต์ : _____

ไดชาร์จเครื่องยนต์ : _____ แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ : _____ แบตเตอรี่ : _____

Alternator : _____ รุ่น : _____ หมายเลขอัลเทอร์เนเตอร์ : _____

AC. Volt : _____ kVA. : _____ kW. : _____ Amp. : _____ AVR. : _____

คอนโทรล : _____ รุ่น : _____ หมายเลขคอนโทรล : _____

Fire Pump : _____ Model : _____ S/N : _____

สถานะตู้คอนโทรล ก่อนทำงาน : _____ สถานะตู้คอนโทรล หลังเสร็จงาน : _____

กรองน้ำมันเครื่อง : _____ กรองบายพาส : _____ กรองเชื้อเพลิง.1 : _____

กรองเชื้อเพลิง.2 : _____ กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ : _____ กรองน้ำยาหม้อน้ำ : _____

งอากาศนอก (โตนอกxโตในxยาว) : _____ กรองอากาศใน (โตนอกxโตในxยาว) : _____

สายพานพัดลม : _____ สายพานไดชาร์จ : _____ ชั่วโมงการทำงาน : _____ Hrs.

GENERATOR SET

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
4. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
5. ตรวจเช็คสภาพภายนอกโดยรวม Alternator , Breaker switch และ จุดต่อสายไฟต่างๆ			
6. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรอง และ รอยรั่วซึมต่างๆของน้ำมันเชื้อเพลิง			
7. ตรวจเช็คสภาพโดยรวม และทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง			
8. ทดสอบสตาร์ทเช็คการทำงาน,ตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆและบันทึกค่าพารามิเตอร์			
9. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

FIRE PUMP SET ต้นกำลัง : เครื่องยนต์ ☐ / Electric Motor ☑

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อน้ำ , ชุด Heat exchanger และ ชุด Cooling loop.			
4. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
5. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
6. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างของตัวปั๊มน้ำ , วาล์วควบคุมต่างๆ , เกจวัดค่า และ ท่อทางน้ำ			
7. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆของชุด Jockey Pump			
8. ตรวจเช็ค วัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ Electric Fire pump			
9. ทำความสะอาดโดยรวม Fire Pump Set			
9. ทดสอบการทำงาน Manual และ Auto Start พร้อมบันทึกค่าการทำงาน			
10. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : _____

_____

_____

ลูกค้า : _____ ช่างเทคนิค : _____

วันที่ : ____ /____ /____ วันที่ : ____ /____ /____ เวลา : _____

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 1

Diesel Engine Fire Pump : ___ **Electric Fire Pump :** ✓ **เครื่องที่ :** EFP-01

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ตู้สั่งการปั๊ม	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : AUTO / AUTO	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของปั๊มน้ำ	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของวาล์วควบคุมระบบต่างๆ , เกจวัดแรงดันต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมท่อทางน้ำ และรอยรั่วซึม	✓		
	แรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ R-S.____ / R-T.____ / S-T.____ Vac.	✓		
	กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน R.____ / S.____ / T.____ Amp.	✓		
	ทดสอบการทำงาน Manual start และ Auto start ของ Jockey pump	✓		
	แรงดันเริ่มทำงานอัตโนมัติ : 190 Psi.	✓		
	แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ : 200 Psi.	✓		
	Relief pressure : 225 Psi.	✓		
เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำมันเครื่อง และรอยรั่วซึมต่างๆ	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำหม้อน้ำ และ Heat Exchanger และท่อยางน้ำต่างๆ	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อน้ำมัน และถังน้ำมันสำรอง	-	-	มีน้ำมันอยู่____ลิตร
	ตรวจเช็คชุด Coupling ขับปั๊ม / Gear Pump ขับปั๊มน้ำ+ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ท่อร่วมไอเสีย และเทอร์โบ	-	-	
	ตรวจเช็ค วัดค่าต่างๆของแบตเตอรี่	-	-	
	- ค่า CCA. Batt#1 :____ CCA Batt#2 :____ CCA	-	-	
	- ค่า CCA. Batt#3 :____ CCA Batt#4 :____ CCA	-	-	
	- ค่า ถพ. Batt#1 :____ ดีกรี Batt#2 :____ ดีกรี	-	-	
	- ค่า ถพ. Batt#3 :____ ดีกรี Batt#4 :____ ดีกรี	-	-	
	- ค่า แอมป์ ชาร์จ Batt#1 :____ A. Batt#2 :____ A.	-	-	
	- ค่า โวล์ท ชาร์จ Batt#1 :____ Vdc. Batt#2 :____ Vdc.	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง	✓		
	- วัดค่าโวล์ทที่จ่ายให้มอเตอร์ R-S____ / R-T____ / S-T____	✓		
	- วัดค่ากระแสขณะมอเตอร์ทำงาน R____ / S____ / T____	✓		
	- วัดอุณหภูมิทำงานโดยรวมของมอเตอร์ ____ C°	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของสายไฟ , รางสายไฟ และซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำการหล่อลื่น อัดจารบีจุดหมุนต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง , ยางรองแท่นเครื่อง หรือ สปริงซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดโดยรวม ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์	✓		
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ชนิดของปั๊มน้ำ : Horizantal ✓ / Vertical ☐	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม วาล์วควบคุมต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คเกจวัดค่าแรงดันต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คท่อทางน้ำ ปะเก็นหน้าแปลนท่อ และรอยรั่วซึมต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คโดยรวมชุด Transfer gear และระดับน้ำมันเกียร์ (ปั๊มแบบ Vertical)	-	-	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของลูกปืนเพลาปั๊ม และ Packing seal	✓		
	หล่อลื่น อัดจารบี จุดหมุนต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดปั๊มน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆโดยรวม	✓		

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 2

เครื่องยนต์ ☐ / ELECTRIC ☑

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค NO.1	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล และ ทดสอบการทำงาน	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : AUTO / AUTO	/		
	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตู้ Controller	/		
	ตรวจเช็คการทำงาน ของระบบสัญญาณเตือนต่างๆที่ตู้ Fire Pump.	/		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 หน้าตู้ Controller	-	-	
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 ที่ตู้ข้างเครื่องยนต์	-	-	
	ทดสอบการทำงานคันโยก Emergency Start (Electric Fire pump)	/		
	ทดสอบการทำงาน แบบจำลองสถานการณ์ AUTO Start Fire pump	/		
	เช็คแรงดันสตาร์ทอัตโนมัติของ Fire pump ทำงานที่ 130 Psi.	/		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง : ____ Bar./ Psi./ kPa.	-	-	
	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น : ____ C°/F°	-	-	
	ตรวจเช็คค่ารอบการทำงานของเครื่องยนต์ : ____ RPM.	/		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ Cooling loop : ____ Psi.	-	-	
	ตรวจเช็ค Relief valve และค่า Relief pressure : ____ Psi.	/		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิตัวเรือนปั๊มน้ำ : ____ C°/F°	/		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกปืนเพลาปั๊มน้ำ ตัว1. ____ C°/ตัว2. ____ C°	/		
	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำของ Cooling loop และ น้ำที่ระบายออก	-	-	

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่อรายการอะไหล่	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ

สรุปงาน PM. และข้อเสนอแนะ : _____

ลูกค้า : _____ ช่างเทคนิค : _____

วันที่ : 09 / 01 / 2026 วันที่ : 09 / 01 / 2026 เวลา : 14:00

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				200 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
ightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**	/				190 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**	/				200 psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				386 /389 /394 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				3.3 /3.4 /3.2 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				4.0 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				200 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 25 / 1 / 69 Time : 14 : 30 Check by : ธนากร

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				200 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน๊อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**	/				120 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				341/344/343 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				93.6/91.3/93.4 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				245 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		14 : 45				15 : 00

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 1

Date: 25 / 1 / 69 **Time :** 14 : 45 **Check by :** [illegible]

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				220 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**					[ ]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**					psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**					psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**	/				[/]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				389 /392 /389 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				3.3 /3.4 /3.8 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				3.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				220 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 1 / 2 / 69 Time : 13 : 45 Check by : [illegible]

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ						225 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						☑N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						☑N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						☑N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						☑N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						☑N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**					[ ]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**					psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**	/				☑N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						384 /388 /384 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						93 /92 /93 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						240 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						☑N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						☑N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						☑N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		14:00				14:15

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 2

Date: 1 / 2 / 69 **Time :** 14 : 00 **Check by :** [illegible]

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

ibis styles hotels
Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				200 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**	/				190 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**	/				200 psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				391 /382 /378 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				3.0 /3.2 / 3.1 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				3.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				200 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 8 / 3 / 69 Time : 13 : 30 Check by : [illegible]

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				205 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**	/				130 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				394 /398 /394 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				93 /92 /94 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				240 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		13 : 45				14 : 00

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 2.

Date: 8 / 3 / 69 **Time :** 13 : 45 **Check by :** [illegible]

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				220 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**					195 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**					200 psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				381 /384/382 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				3.1 /3.4/3.3 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				4 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				200 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 15 / 3 / 69 Time : 13 : 30 Check by : [illegible]

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ						220 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[/]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**	/				110 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						398/381/398 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						73 /72 /73 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						245 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		13 : 45				14 : 00

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 1

Date: 15 / 3 / 69 **Time :** 13 : 45 **Check by :** [illegible]

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				190 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**	/				190 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**	/				195 psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**	/				[/]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				393.0/396.6/392.9 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				3.465/3.663/ 0 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				2.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				195 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 22 / 3 / 69 Time : 13 : 40 Check by : พงศ์ศักดิ์

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ		/				225 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ		/				[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์		/				[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม		/				[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN		/				[/]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[/]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**	/				205 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**	/				[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า		/				388.5/392.6/388.5 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		/				71.41/72.52/0 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด		/				5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย		/				250 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน		/				[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน		/				[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE		/				[/]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		14:00				14:00

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 2

Date: 22/3/69 **Time :** 14 : 00 **Check by :** [illegible]

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

ibis styles HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ						240 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[ ]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**					200 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**					200 psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						386/392/388 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						3.3/3.5/3.4 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						3.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						190 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 29 / 3 / 19 Time : 15 : 00 Check by : [illegible]

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ						220 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[/]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[ ]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**	/				130 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						389/388/394 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						70/173/171 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						3 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						240 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		15 : 10				15 : 20

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 1

Date: 29 / 3 / 69 **Time :** 15 : 10 **Check by :** [illegible]

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

ibis Styles HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ						240 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[ ]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**					200 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**					psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						387.9 / 391.9 / 387.8 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						9.3 / 13.6 / 7.5 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						7.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						190 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 12 / 4 / 69 Time : 17 : 30 Check by : [illegible]

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ						225 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[✓]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[✓]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[✓]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[✓]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[✓]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[ ]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**					110 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						384 1387 1382 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						71.3 71.2 73 71.3 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						840 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[✓]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[✓]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[✓]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		19:40				13:50

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 2

Date: 12 / 4 / 67 **Time :** 19 : 40 **Check by :** [signature]

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

ibis Styles HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ						220 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[✓]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[✓]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[✓]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[✓]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[✓]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	✓				[ ]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**					190 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**					195 psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						388 / 390 / 389 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						13.3 / 13.5 / 13.3 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						195 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[✓]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[✓]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[✓]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 26 / 4 / 69 Time : 17 : 20 Check by : [illegible]

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ						230 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[✓]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[✓]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[✓]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[✓]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[✓]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[✓]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**					110 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						385 / 389 / 384 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						71 / 172 / 173 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						240 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[✓]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[✓]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[✓]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		14:30				14:40

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 2

Date: 26/4/69 **Time :** 14 : 40 **Check by :** [illegible]

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

ใบรายงานช่าง

ครั้งที่ 1/1

ลูกค้า : โรงแรมไอริส พัทยา ประเภทของงาน : PM. Electric Fire Pump วันที่ : 29 / 04 / 2026
ติดต่อลูกค้า : คุณ.ชวัลกร เบอร์โทร : 089 059 7222
เครื่องยนต์ : Motor ไฟฟ้า รุ่น : PU-DE 315 MA2 B3 หมายเลขเครื่องยนต์ : 16WC-0088
ไดชาร์จเครื่องยนต์ : - แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ : - แบตเตอรี่ : -
Alternator : - รุ่น : - หมายเลขอัลเทอร์เนเตอร์ : -
AC. Volt : 380 kVA. : - kW. : 132 Amp. : 236 AVR. : -
คอนโทรล : DENSO รุ่น : EM CP-B-01 หมายเลขคอนโทรล : -
Fire Pump : Grundfos X Model : 99235978SPM5PC0001 S/N : NK80-315/32891P2QE-SBAQE
สถานะตู้คอนโทรล ก่อนทำงาน : AUTO สถานะตู้คอนโทรล หลังเสร็จงาน : AUTO
กรองน้ำมันเครื่อง : - กรองบายพาส : - กรองเชื้อเพลิง.1 : -
กรองเชื้อเพลิง.2 : - กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ : - กรองน้ำยาหม้อน้ำ : -
กรองอากาศนอก (โตนอกxโตในxยาว) : - กรองอากาศใน (โตนอกxโตในxยาว) : -
สายพานพัดลม : - สายพานไดชาร์จ : - ชั่วโมงการทำงาน : - Hrs.

GENERATOR SET

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
4. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
5. ตรวจเช็คสภาพภายนอกโดยรวม Alternator , Breaker switch และ จุดต่อสายไฟต่างๆ			
6. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรอง และ รอยรั่วซึมต่างๆของน้ำมันเชื้อเพลิง			
7. ตรวจเช็คสภาพโดยรวม และทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง			
8. ทดสอบสตาร์ทเช็คการทำงาน,ตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆและบันทึกค่าพารามิเตอร์			
9. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

FIRE PUMP SET ต้นกำลัง : เครื่องยนต์ ☐ / Electric Motor ☑

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto	✓		
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์	✓		
3. ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อน้ำ , ชุด Heat exchanger และ ชุด Cooling loop.	-	-	
4. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์	-	-	
5. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller	✓		
6. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างของตัวปั๊มน้ำ , วาล์วควบคุมต่างๆ , เกจวัดค่า และ ท่อทางน้ำ	✓		ตรวจพบรั่วซึมบริเวณ
7. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆของชุด Jockey Pump	✓		เสื้อวาล์วน้ำ
8. ตรวจเช็ค วัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ Electric Fire pump	✓		
9. ทำความสะอาดโดยรวม Fire Pump Set	✓		
9. ทดสอบการทำงาน Manual และ Auto Start พร้อมบันทึกค่าการทำงาน	✓		
10. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน	✓		

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : -

ลูกค้า : วิศวกร ช่างเทคนิค : ปฏิภาณ, ทนทวี
วันที่ : 29 / 4 / 69 วันที่ : 29 / 04 / 2026 เวลา : 17:00

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 1

Diesel Engine Fire Pump : — | **Electric Fire Pump :** ✓ | **เครื่องที่ :** EFP-01

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ชุดปั๊มน้ำดับเพลิง	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : Auto / Auto	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของปั๊มน้ำ	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของวาล์วควบคุมระบบต่างๆ , เกจวัดแรงดันต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมท่อทางน้ำ และรอยรั่วซึม	✓		
	แรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ R-S. 389.1 / R-T. 390.3 / S-T. 393.7 Vac.	✓		
	กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน R. 4.5 / S. 5.6 / T. 5.8 Amp.	✓		
	ทดสอบการทำงาน Manual start และ Auto start ของ Jockey pump	✓		
	แรงดันเริ่มทำงานอัตโนมัติ : 190 Psi.	✓		
	แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ : 200 Psi.	✓		
	Relief pressure : 210 Psi.	✓		
เครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำมันเครื่อง และรอยรั่วซึมต่างๆ	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำหม้อน้ำ และ Heat Exchanger และท่อยางน้ำต่างๆ	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อน้ำมัน และถังน้ำมันสำรอง	—	—	มีน้ำมันอยู่ — ลิตร
	ตรวจเช็คชุด Coupling ขับปั๊ม / Gear Pump ขับปั๊มน้ำ+ระดับน้ำมันเกียร์	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ท่อร่วมไอเสีย และเทอร์โบ	—	—	
	ตรวจเช็ค วัดค่าต่างๆของแบตเตอรี่	—	—	
	- ค่า CCA. Batt#1 :_____ CCA Batt#2 :_____ CCA	—	—	
	- ค่า CCA. Batt#3 :_____ CCA Batt#4 :_____ CCA	—	—	
	- ค่า ถพ. Batt#1 :_____ ดีกรี Batt#2 :_____ ดีกรี	—	—	
	- ค่า ถพ. Batt#3 :_____ ดีกรี Batt#4 :_____ ดีกรี	—	—	
	- ค่า แอมป์ ชาร์จ Batt#1 :_____ A. Batt#2 :_____ A.	—	—	
	- ค่า โวล์ท ชาร์จ Batt#1 :_____ Vdc. Batt#2 :_____ Vdc.	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง	✓		
	- วัดค่าโวล์ทที่จ่ายให้มอเตอร์ R-S 389.1 / R-T 390.3 / S-T 393.7	✓		
	- วัดค่ากระแสขณะมอเตอร์ทำงาน R 4.5 / S 5.6 / T 5.8	✓		
	- วัดอุณหภูมิทำงานโดยรวมของมอเตอร์ 37.6 C°	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของสายไฟ , รางสายไฟ และซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำการหล่อลื่น อัดจารบีจุดหมุนต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง , ยางรองแท่นเครื่อง หรือ สปริงซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดโดยรวม ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ชนิดของปั๊มน้ำ : Horizantal ☑ / Vertical ☐	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม วาล์วควบคุมต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คเกจวัดค่าแรงดันต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คท่อทางน้ำ ปะเก็นหน้าแปลนท่อ และรอยรั่วซึมต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คโดยรวมชุด Transfer gear และระดับน้ำมันเกียร์ (ปั๊มแบบ Vertical)	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของลูกปืนเพลาปั๊ม และ Packing seal	✓		
	หล่อลื่น อัดจารบี จุดหมุนต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดปั๊มน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆโดยรวม	✓		

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 2

เครื่องยนต์ [ ] / ELECTRIC [/]

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล และ ระบบเครื่องยนต์	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : Auto / Auto	✓		
	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตู้ Controller	✓		
	ตรวจเช็คการทำงาน ของระบบสัญญาณเตือนต่างๆที่ตู้ Fire Pump.	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 หน้าตู้ Controller	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 ที่ตู้ข้างเครื่องยนต์	-	-	
	ทดสอบการทำงานคันโยก Emergency Start (Electric Fire pump)	✓		
	ทดสอบการทำงาน แบบจำลองสถานการณ์ AUTO Start Fire pump	✓		
	เช็คแรงดันสตาร์ทอัตโนมัติของ Fire pump ทำงานที่ 180 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง : - Bar./ Psi./ kPa.	-	-	
	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น : - C°/F°	-	-	
	ตรวจเช็คค่ารอบการทำงานของเครื่องยนต์ : - RPM.	-	-	
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ Cooling loop : - Psi.	-	-	
	ตรวจเช็ค Relief valve และค่า Relief pressure : 235 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิตัวเรือนปั๊มน้ำ : 35.2 C°/F°	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกปืนเพลาปั๊มน้ำ ตัว1. 36.6 C°/ตัว2. 35.1 C°	✓		
	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำของ Cooling loop และ น้ำที่ระบายออก	-	-	

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่อรายการอะไหล่	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ

สรุปงาน PM. และข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นก่อนใช้งาน ไม่พบข้อผิดปกติ

ลูกค้า : อินวิน ช่างเทคนิค : ภูมิพงศ์ , ปรเมศวร์

วันที่ : 29 / 4 / 69 วันที่ : 29 / 04 / 2026 เวลา : 14:00

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

ใบรายงานช่าง

ครั้งที่ 1/4

ลูกค้า : ไทยเดย์ไดร์ พวงไพบูลย์ ประเภทของงาน : PM. Electric Fire Pump. 2 วันที่ : 29 / 04 / 2026

ติดต่อลูกค้า : คุณ กฤษดา เบอร์โทร : 097 059 7022

เครื่องยนต์ : มอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น : EU-DP31C MA-2B3 หมายเลขเครื่องยนต์ : 16WC-00874

ไดชาร์จเครื่องยนต์ : - แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ : - แบตเตอรี่ : -

Alternator : - รุ่น : - หมายเลขอัลเทอร์เนเตอร์ : -

AC. Volt : 380 kVA. : - kW. : 132 Amp. : 236 AVR. : -

คอนโทรล : DENCO รุ่น : FMCP-B-01 หมายเลขคอนโทรล : -

Fire Pump : Grundfos Model : B5829953901153900004 S/N : NK80-315/323Y1E2DE-3DA0E

สถานะตู้คอนโทรล ก่อนทำงาน : AUTO สถานะตู้คอนโทรล หลังเสร็จงาน : AUTO

กรองน้ำมันเครื่อง : - กรองบายพาส : - กรองเชื้อเพลิง.1 : -

กรองเชื้อเพลิง.2 : - กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ : - กรองน้ำยาหม้อน้ำ : -

กรองอากาศนอก (โตนอกxโตในxยาว) : - กรองอากาศใน (โตนอกxโตในxยาว) : -

สายพานพัดลม : - สายพานไดชาร์จ : - ชั่วโมงการทำงาน : - Hrs.

GENERATOR SET

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
4. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
5. ตรวจเช็คสภาพภายนอกโดยรวม Alternator , Breaker switch และ จุดต่อสายไฟต่างๆ			
6. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรอง และ รอยรั่วซึมต่างๆของน้ำมันเชื้อเพลิง			
7. ตรวจเช็คสภาพโดยรวม และทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง			
8. ทดสอบสตาร์ทเช็คการทำงาน,ตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆและบันทึกค่าพารามิเตอร์			
9. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

FIRE PUMP SET ต้นกำลัง : เครื่องยนต์ ☐ / Electric Motor ☑

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto	✓		
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
3. ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อน้ำ , ชุด Heat exchanger และ ชุด Cooling loop.	-		
4. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์	-		
5. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller	✓		
6. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างของตัวปั๊มน้ำ , วาล์วควบคุมต่างๆ , เกจวัดค่า และ ท่อทางน้ำ	✓		วาล์วกริฟล้นน้ำรั่ว
7. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆของชุด Jockey Pump	✓		ของเสื่อมสภาพ
8. ตรวจเช็ค วัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ Electric Fire pump	✓		
9. ทำความสะอาดโดยรวม Fire Pump Set	✓		
9. ทดสอบการทำงาน Manual และ Auto Start พร้อมบันทึกค่าการทำงาน	✓		
10. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน	✓		

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : -

ลูกค้า : ชื่นวัน ช่างเทคนิค : ปฏิภาณ, ศันสนีย์

วันที่ : 29 / 4 / 69 วันที่ : 29 / 04 / 2026 เวลา : 17:00

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 1

Diesel Engine Fire Pump : — | **Electric Fire Pump :** ✓ | **เครื่องที่ :** EFP-02

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ชุดปั๊ม	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : _____ / _____			Jockey Pump
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า			
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของปั๊มน้ำ			
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของวาล์วควบคุมระบบต่างๆ , เกจวัดแรงดันต่างๆ			
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมท่อทางน้ำ และรอยรั่วซึม			
	แรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ R-S._____ / R-T._____ / S-T._____ Vac.			
	กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน R._____ / S._____ / T._____ Amp.			EFP-01
	ทดสอบการทำงาน Manual start และ Auto start ของ Jockey pump			
	แรงดันเริ่มทำงานอัตโนมัติ : _____ Psi.			
	แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ : _____ Psi.			
	Relief pressure : _____ Psi.			
เครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำมันเครื่อง และรอยรั่วซึมต่างๆ	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำหม้อน้ำ และ Heat Exchanger และท่อยางน้ำต่างๆ	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อน้ำมัน และถังน้ำมันสำรอง	—	—	มีน้ำมันอยู่ — ลิตร
	ตรวจเช็คชุด Coupling ขับปั๊ม / Gear Pump ขับปั๊มน้ำ+ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ท่อร่วมไอเสีย และเทอร์โบ	—	—	
	ตรวจเช็ค วัดค่าต่างๆของแบตเตอรี่	—	—	
	- ค่า CCA. Batt#1 :_____ CCA Batt#2 :_____ CCA	—	—	
	- ค่า CCA. Batt#3 :_____ CCA Batt#4 :_____ CCA	—	—	
	- ค่า ถพ. Batt#1 :_____ ดีกรี Batt#2 :_____ ดีกรี	—	—	
	- ค่า ถพ. Batt#3 :_____ ดีกรี Batt#4 :_____ ดีกรี	—	—	
	- ค่า แอมป์ ชาร์จ Batt#1 :_____ A. Batt#2 :_____ A.	—	—	
	- ค่า โวล์ท ชาร์จ Batt#1 :_____ Vdc. Batt#2 :_____ Vdc.	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง	✓		
	- วัดค่าโวล์ทที่จ่ายให้มอเตอร์ R-S 389.4 / R-T 390.3 / S-T 393.7	✓		
	- วัดค่ากระแสขณะมอเตอร์ทำงาน R 45 / S 45.6 / T 45.8	✓		
	- วัดอุณหภูมิทำงานโดยรวมของมอเตอร์ _____ C°	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของสายไฟ , รางสายไฟ และซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำการหล่อลื่น อัดจารบีจุดหมุนต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง , ยางรองแท่นเครื่อง หรือ สปริงซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดโดยรวม ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ชนิดของปั๊มน้ำ : Horizantal ✓ / Vertical ☐	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม วาล์วควบคุมต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คเกจวัดค่าแรงดันต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คท่อทางน้ำ ปะเก็นหน้าแปลนท่อ และรอยรั่วซึมต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คโดยรวมชุด Transfer gear และระดับน้ำมันเกียร์ (ปั๊มแบบ Vertical)	—	—	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของลูกปืนเพลาปั๊ม และ Packing seal	✓		
	หล่อลื่น อัดจารบี จุดหมุนต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดปั๊มน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆโดยรวม	✓		

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 2

เครื่องยนต์ ☐ / ELECTRIC ☑

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล และ ทดสอบการทำงาน	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : Auto / Auto	✓		
	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตู้ Controller	✓		
	ตรวจเช็คการทำงาน ของระบบสัญญาณเตือนต่างๆที่ตู้ Fire Pump.	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 หน้าตู้ Controller	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 ที่ตู้ข้างเครื่องยนต์	–	–	
	ทดสอบการทำงานคันโยก Emergency Start (Electric Fire pump)	✓		
	ทดสอบการทำงาน แบบจำลองสถานการณ์ AUTO Start Fire pump	✓		
	เช็คแรงดันสตาร์ทอัตโนมัติของ Fire pump ทำงานที่ 160 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง : – Bar./ Psi./ kPa.	–	–	
	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น : – C˚/F˚	–	–	
	ตรวจเช็คค่ารอบการทำงานของเครื่องยนต์ : – RPM.	–	–	
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ Cooling loop : – Psi.	–	–	
	ตรวจเช็ค Relief valve และค่า Relief pressure : 225 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิตัวเรือนปั๊มน้ำ : 33.3 C˚/F˚	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกปืนเพลาปั๊มน้ำ ตัว1. 30.6 C˚/ตัว2. 36.4 C˚	✓		
	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำของ Cooling loop และ น้ำที่ระบายออก	–	–	

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่อรายการอะไหล่	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ

สรุปงาน PM. และข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบและทดสอบการทำงาน ระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล ระบบสัญญาณเตือนต่างๆ ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ไฟ

ลูกค้า : วินาวิน ช่างเทคนิค : ปฏิพัทธ์, ปิยกฤษ์

วันที่ : 29 / 4 / 69 วันที่ : 29 / 04 / 2026 เวลา : 14:00

WEELKY JOCKY PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : AEG / Ebara

Pump Type/Model : Vertical Multistage / EVMS517N5/4.0

Pump Head/Flow rate : 86-153 M. / 40-130 L/Min

Motor Model / Rate : AMPE 112M AB2 / 4 Kw.

ibis Styles HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ						195 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[/]N [ ]AN
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[ ]N [ ]AN
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Start**					180 psi
Check System Pressure/ตรวจสอบแรงดันระบบ	**Stop**					200 psi
เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						385 /389 / 381 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						3.2 /3.4 / 3.1 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						4 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						200 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Remark:

Date: 24 / 5 / 19 Time : 13 : 30 Check by : Ehnnt

WEELKY ELECTRIC FIRE PUMP TEST RUN REPORT

Motor Brand /Pump Brand : Brook Crompton/Grundfos

Pump Type/Model : End-suction centrifugal pump / Nk-80/315

Pump Head/Flow rate : 140 M. / 3004 L/min

Motor Model/Rate : TS-DF315MA-2 / 132 Kw.

Control Model/Serial No. : DENCO FMCP-13-01

ibis STYLES HOTELS

Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Description		W	M	Q	Y	Data
Checking Before Testing/ตรวจสอบก่อนสตาร์ท						
Check System Pressure(Digital)/ตรวจสอบแรงดันระบบ						205 psi
Check for pipe Conditions&Leaks/ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำ						[/]N [ ]AN
Check Circuit breaker/ตรวจสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์						[/]N [ ]AN
Check Control System/ตรวจสอบระบบควบคุม						[/]N [ ]AN
Tightening of All Electrical Connections/ตรวจขันน็อต ขั้วสายไฟและจุดต่างๆ						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบข้อต่อเพลาขับ DRIVE SHAFT U-JOIN						[ ]N [ ]AN
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Auto**	/				[ ]N [ ]AN
Pressure start/แรงดันสตาร์ท	**Auto**					120 psi
Test run/เดินเครื่องเพื่อตรวจสอบ	**Manual**					[ ]N [ ]AN
Test Run Check/ตรวจสอบขณะเครื่องทำงาน						
Voltage AC Record/บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า						381/385/381 V
Ampare Record/บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า						92/93/91 A
Check Pressure Suction/ตรวจสอบแรงดันด้านดูด						3.5 in.Hg
Check Pressure Discharge/ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย						240 psi
Check Foundation&Vibration Isolations/ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน						[/]N [ ]AN
Check Rotation/ตรวจสอบทิศทางการหมุน						[/]N [ ]AN
ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE RELIEF VALVE						[/]N [ ]AN
Start Time Record/Stop Time Record		13 : 45				14 : 00

Remark N : Normal (ปกติ) AN : Abnormal (ผิดปกติ)

Fire pump No. 1

Date: 24 / 5 / 19 **Time :** 13 : 45 **Check by :** [illegible]

Service Report
Preventive Maintenance
Electric Fire pump 2 units. & Jockey pump 1 units.
ครั้งที่ 1/4
@ Ibis styles Bangkok Sukhumvit phra khanong



PM. วันที่ 29-04-2026

BY

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.

241/2 , Fl. 4, Soi Pattanakarn 20 Rd,. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Tel. (+66) 02 318 8238-9 Fax: 02 3194227 ext.9

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

ใบรายงานช่าง

ครั้งที่ 1/1

ลูกค้า : โรงแรม ไอริส พาราไดซ์ ประเภทของงาน : AM. Electric Fire Pump. วันที่ : 29 / 04 / 2026
ติดต่อลูกค้า : คุณ. ทวีศักดิ์ เบอร์โทร : 089 059 7222
เครื่องยนต์ : มิตซูบิชิ รุ่น : BU-DF315 MA2 B3 หมายเลขเครื่องยนต์ : 16WC-0088
ไดชาร์จเครื่องยนต์ : - แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ : - แบตเตอรี่ : -
Alternator : - รุ่น : - หมายเลขอัลเทอร์เนเตอร์ : -
AC. Volt : 380 kVA. : - kW. : 132 Amp. : 236 AVR. : -
คอนโทรล : DENSO รุ่น : FM CP-B-01 หมายเลขคอนโทรล : -
Fire Pump : Grundfos Model : 99885293SP119250001 S/N : NK80-315/32891F2DE-SBAQE
สถานะตู้คอนโทรล ก่อนทำงาน : AUTO สถานะตู้คอนโทรล หลังเสร็จงาน : AUTO
กรองน้ำมันเครื่อง : - กรองบายพาส : - กรองเชื้อเพลิง.1 : -
กรองเชื้อเพลิง.2 : - กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ : - กรองน้ำยาหม้อน้ำ : -
กรองอากาศนอก (โตนอกxโตในxยาว) : - กรองอากาศใน (โตนอกxโตในxยาว) : -
สายพานพัดลม : - สายพานไดชาร์จ : - ชั่วโมงการทำงาน : - Hrs.

GENERATOR SET

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
4. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
5. ตรวจเช็คสภาพภายนอกโดยรวม Alternator , Breaker switch และ จุดต่อสายไฟต่างๆ			
6. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรอง และ รอยรั่วซึมต่างๆของน้ำมันเชื้อเพลิง			
7. ตรวจเช็คสภาพโดยรวม และทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง			
8. ทดสอบสตาร์ทเช็คการทำงาน,ตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆและบันทึกค่าพารามิเตอร์			
9. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

FIRE PUMP SET ต้นกำลัง : เครื่องยนต์ ☐ / Electric Motor ☑

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto	✓		
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์	✓		
3. ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อน้ำ , ชุด Heat exchanger และ ชุด Cooling loop.	-	-	
4. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์	-	-	
5. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller	✓		
6. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างของตัวปั๊มน้ำ , วาล์วควบคุมต่างๆ , เกจวัดค่า และ ท่อทางน้ำ	✓		ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของอุปกรณ์
7. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆของชุด Jockey Pump	✓		เครื่องทำงาน
8. ตรวจเช็ค วัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ Electric Fire pump	✓		
9. ทำความสะอาดโดยรวม Fire Pump Set	✓		
9. ทดสอบการทำงาน Manual และ Auto Start พร้อมบันทึกค่าการทำงาน	✓		
10. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน	✓		

รายละเอียดงานเพิ่มเติม :

ลูกค้า : อินาวิน ช่างเทคนิค : ปฏิภาณ, หนิงฤทธิ์
วันที่ : 29 / 4 / 69 วันที่ : 29 / 04 / 2026 เวลา : 17:00

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 1

Diesel Engine Fire Pump : – | **Electric Fire Pump :** ✓ | **เครื่องที่ :** EFP-01

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
จ็อกกี้ ปั๊ม	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : Auto / Auto	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของปั๊มน้ำ	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของวาล์วควบคุมระบบต่างๆ , เกจวัดแรงดันต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมท่อทางน้ำ และรอยรั่วซึม	✓		
	แรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ R-S. 389.4 / R-T. 390.3 / S-T. 393.7 Vac.	✓		
	กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน R. 4.5 / S. 5.6 / T. 5.8 Amp.	✓		
	ทดสอบการทำงาน Manual start และ Auto start ของ Jockey pump	✓		
	แรงดันเริ่มทำงานอัตโนมัติ : 190 Psi.	✓		
	แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ : 200 Psi.	✓		
	Relief pressure : 210 Psi.	✓		
เครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำมันเครื่อง และรอยรั่วซึมต่างๆ	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำหม้อน้ำ และ Heat Exchanger และท่อยางน้ำต่างๆ	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อน้ำมัน และถังน้ำมันสำรอง	–	–	มีน้ำมันอยู่ – ลิตร
	ตรวจเช็คชุด Coupling ขับปั๊ม / Gear Pump ขับปั๊มน้ำ+ระดับน้ำมันเกียร์	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ท่อร่วมไอเสีย และเทอร์โบ	–	–	
	ตรวจเช็ค วัดค่าต่างๆของแบตเต่อรี่	–	–	
	- ค่า CCA. Batt#1 :_____ CCA Batt#2 :_____ CCA	–	–	
	- ค่า CCA. Batt#3 :_____ CCA Batt#4 :_____ CCA	–	–	
	- ค่า ถพ. Batt#1 :_____ ดีกรี Batt#2 :_____ ดีกรี	–	–	
	- ค่า ถพ. Batt#3 :_____ ดีกรี Batt#4 :_____ ดีกรี	–	–	
	- ค่า แอมป์ ชาร์จ Batt#1 :_____ A. Batt#2 :_____ A.	–	–	
	- ค่า โวล์ท ชาร์จ Batt#1 :_____ Vdc. Batt#2 :_____ Vdc.	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง	✓		
	- วัดค่าโวล์ทที่จ่ายให้มอเตอร์ R-S 389.4 / R-T 390.3 / S-T 393.7	✓		
	- วัดค่ากระแสขณะมอเตอร์ทำงาน R 4.5 / S 5.6 / T 5.8	✓		
	- วัดอุณหภูมิทำงานโดยรวมของมอเตอร์ 37.6 C°	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของสายไฟ , รางสายไฟ และซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำการหล่อลื่น อัดจารบีจุดหมุนต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง , ยางรองแท่นเครื่อง หรือ สปริงซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดโดยรวม ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ชนิดของปั๊มน้ำ : Horizantal ✓ / Vertical ☐	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม วาล์วควบคุมต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คเกจวัดค่าแรงดันต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คท่อทางน้ำ ปะเก็นหน้าแปลนท่อ และรอยรั่วซึมต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คโดยรวมชุด Transfer gear และระดับน้ำมันเกียร์ (ปั๊มแบบ Vertical)	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของลูกปืนเพลาปั๊ม และ Packing seal	✓		
	หล่อลื่น อัดจารบี จุดหมุนต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดปั๊มน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆโดยรวม	✓		

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 2

เครื่องยนต์ ☐ / ELECTRIC ☑

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล และ ทดสอบการทำงาน	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : Auto / Auto	✓		
	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตู้ Controller	✓		
	ตรวจเช็คการทำงาน ของระบบสัญญาณเตือนต่างๆที่ตู้ Fire Pump.	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 หน้าตู้ Controller	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 ที่ตู้ข้างเครื่องยนต์	-	-	
	ทดสอบการทำงานคันโยก Emergency Start (Electric Fire pump)	✓		
	ทดสอบการทำงาน แบบจำลองสถานการณ์ AUTO Start Fire pump	✓		
	เช็คแรงดันสตาร์ทอัตโนมัติของ Fire pump ทำงานที่ 180 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง : - Bar./ Psi./ kPa.	-	-	
	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น : - C°/F°	-	-	
	ตรวจเช็คค่ารอบการทำงานของเครื่องยนต์ : - RPM.	-	-	
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ Cooling loop : - Psi.	-	-	
	ตรวจเช็ค Relief valve และค่า Relief pressure : 235 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิตัวเรือนปั๊มน้ำ : 35.2 C°/F°	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกปืนเพลาปั๊มน้ำ ตัว1. 36.6 C°/ตัว2. 35.6 C°	✓		
	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำของ Cooling loop และ น้ำที่ระบายออก	-	-	

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่อรายการอะไหล่	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ

สรุปงาน PM. และข้อเสนอแนะ : อาคารหมายเลขสอดคล้องกับการทำงาน มีเสียงดังผิดปกติ
บริเวณลูกปืน ลูกปืนทำงานอยู่ในสภาพปกติ

ลูกค้า : อินาวิน
วันที่ : 29 / 4 / 69

ช่างเทคนิค : ณัฐพงศ์, ปรีชาญณ์
วันที่ : 29 / 01 / 2026 เวลา : 17:00

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

ใบรายงานช่าง

ครั้งที่ 1/4

ลูกค้า : โรงแรมไอบิส พระโขนง ประเภทของงาน : PM. Electric Fire Pump. 2 วันที่ : 29 / 04 / 2026

ติดต่อลูกค้า : คุณ.ทวีศักดิ์ เบอร์โทร : 097 059 7222

เครื่องยนต์ : มอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น : BU-DP315MA-2B3 หมายเลขเครื่องยนต์ : 16WC-0087

ไดชาร์จเครื่องยนต์ : - แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ : - แบตเตอรี่ : -

Alternator : - รุ่น : - หมายเลขอัลเทอร์เนเตอร์ : -

AC. Volt : 380 kVA. : - kW. : 132 Amp. : 236 AVR. : -

คอนโทรล : DENCO รุ่น : PMCP-B-01 หมายเลขคอนโทรล : -

Fire Pump : Grundfos X Model : BS8893539B115390004 S/N : NK80-315/328Y1F2BE-2DAQB

สถานะตู้คอนโทรล ก่อนทำงาน : AUTO สถานะตู้คอนโทรล หลังเสร็จงาน : AUTO

กรองน้ำมันเครื่อง : - กรองบายพาส : - กรองเชื้อเพลิง.1 : -

กรองเชื้อเพลิง.2 : - กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ : - กรองน้ำยาหม้อน้ำ : -

กรองอากาศนอก (โตนอกxโตในxยาว) : - กรองอากาศใน (โตนอกxโตในxยาว) : -

สายพานพัดลม : - สายพานไดชาร์จ : - ชั่วโมงการทำงาน : - Hrs.

GENERATOR SET

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
4. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
5. ตรวจเช็คสภาพภายนอกโดยรวม Alternator , Breaker switch และ จุดต่อสายไฟต่างๆ			
6. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรอง และ รอยรั่วซึมต่างๆของน้ำมันเชื้อเพลิง			
7. ตรวจเช็คสภาพโดยรวม และทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง			
8. ทดสอบสตาร์ทเช็คการทำงาน,ตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆและบันทึกค่าพารามิเตอร์			
9. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

FIRE PUMP SET ต้นกำลัง : เครื่องยนต์ ☐ / Electric Motor ☑

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto	✓		
2. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ - มอเตอร์ไฟฟ้า	✓		
3. ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อน้ำ , ชุด Heat exchanger และ ชุด Cooling loop.	-		
4. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์	-		
5. ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller	✓		
6. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างของตัวปั๊มน้ำ , วาล์วควบคุมต่างๆ , เกจวัดค่า และ ท่อทางน้ำ	✓		อาสีเทาสีน้ำเงิน
7. ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆของชุด Jockey Pump	✓		ของเดิมใช้งาน
8. ตรวจเช็ค วัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ Electric Fire pump	✓		
9. ทำความสะอาดโดยรวม Fire Pump Set	✓		
9. ทดสอบการทำงาน Manual และ Auto Start พร้อมบันทึกค่าการทำงาน	✓		
10. ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน	✓		

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : -

ลูกค้า : อิสาวิน ช่างเทคนิค : ปฏิพงษ์, ปรินทร์ปวี

วันที่ : 29 / 4 / 69 วันที่ : 29 / 04 / 2026 เวลา : 17:00

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 1

Diesel Engine Fire Pump : – | **Electric Fire Pump :** ✓ | **เครื่องที่ :** EFP-02

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
จ็อคกี้ ปั๊ม	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : _____ / _____			Jockey Pump
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า			
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของปั๊มน้ำ			มีชุดเดียว สำรอง
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของวาล์วควบคุมระบบต่างๆ , เกจวัดแรงดันต่างๆ			
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมท่อทางน้ำ และรอยรั่วซึม			สำหรับดับ
	แรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ R-S._____ / R-T._____ / S-T._____ Vac.			
	กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน R._____ / S._____ / T._____ Amp.			EFP-01
	ทดสอบการทำงาน Manual start และ Auto start ของ Jockey pump			
	แรงดันเริ่มทำงานอัตโนมัติ : _____ Psi.			
	แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ : _____ Psi.			
	Relief pressure : _____ Psi.			
เครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำมันเครื่อง และรอยรั่วซึมต่างๆ	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพ+ระดับน้ำหม้อน้ำ และ Heat Exchanger และท่อยางน้ำต่างๆ	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อน้ำมัน และถังน้ำมันสำรอง	–	–	มีน้ำมันอยู่ – ลิตร
	ตรวจเช็คชุด Coupling ขับปั๊ม / ~~Gear Pump~~ ขับปั๊มน้ำ+ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ท่อร่วมไอเสีย และเทอร์โบ	–	–	
	ตรวจเช็ค วัดค่าต่างๆของแบตเต่อรี่	–	–	
	- ค่า CCA. Batt#1 :_____ CCA Batt#2 :_____ CCA	–	–	
	- ค่า CCA. Batt#3 :_____ CCA Batt#4 :_____ CCA	–	–	
	- ค่า ถพ. Batt#1 :_____ ดีกรี Batt#2 :_____ ดีกรี	–	–	
	- ค่า ถพ. Batt#3 :_____ ดีกรี Batt#4 :_____ ดีกรี	–	–	
	- ค่า แอมป์ ชาร์จ Batt#1 :_____ A. Batt#2 :_____ A.	–	–	
	- ค่า โวล์ท ชาร์จ Batt#1 :_____ Vdc. Batt#2 :_____ Vdc.	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง	✓		
	- วัดค่าโวล์ทที่จ่ายให้มอเตอร์ R-S 389.4 / R-T 390.3 / S-T 393.7	✓		
	- วัดค่ากระแสขณะมอเตอร์ทำงาน R 4.5 / S 5.6 / T 5.8	✓		
	- วัดอุณหภูมิทำงานโดยรวมของมอเตอร์ _____ C°	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของสายไฟ , รางสายไฟ และซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำการหล่อลื่น อัดจารบีจุดหมุนต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง , ยางรองแท่นเครื่อง หรือ สปริงซัฟพอร์ทต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดโดยรวม ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ~~มอเตอร์~~ ไฟฟ้า	✓		
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม ชนิดของปั๊มน้ำ : Horizantal ✓ / Vertical ☐	✓		
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวม วาล์วควบคุมต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คเกจวัดค่าแรงดันต่างๆของระบบ	✓		
	ตรวจเช็คท่อทางน้ำ ปะเก็นหน้าแปลนท่อ และรอยรั่วซึมต่างๆ	✓		
	ตรวจเช็คโดยรวมชุด Transfer gear และระดับน้ำมันเกียร์ (ปั๊มแบบ Vertical)	–	–	
	ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของลูกปืนเพลาปั๊ม และ Packing seal	✓		
	หล่อลื่น อัดจารบี จุดหมุนต่างๆ	✓		
	ทำความสะอาดปั๊มน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆโดยรวม	✓		

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

FIRE PUMP CHECK SHEET # 2

เครื่องยนต์ ☐ / ELECTRIC ☑

ระบบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล และ มอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	สถานะการทำงาน ก่อน / หลัง : Auto / Auto	✓		
	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตู้ Controller	✓		
	ตรวจเช็คการทำงาน ของระบบสัญญาณเตือนต่างๆที่ตู้ Fire Pump.	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 หน้าตู้ Controller	✓		
	ทดสอบ Manual start/stop ที่Batt#1 และ Batt#2 ที่ตู้ข้างเครื่องยนต์	–	–	
	ทดสอบการทำงานคันโยก Emergency Start (Electric Fire pump)	✓		
	ทดสอบการทำงาน แบบจำลองสถานการณ์ AUTO Start Fire pump	✓		
	เช็คแรงดันสตาร์ทอัตโนมัติของ Fire pump ทำงานที่ 160 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง : – Bar./ Psi./ kPa.	–	–	
	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น : – C°/F°	–	–	
	ตรวจเช็คค่ารอบการทำงานของเครื่องยนต์ : – RPM.	–	–	
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ Cooling loop : – Psi.	–	–	
	ตรวจเช็ค Relief valve และค่า Relief pressure : 235 Psi.	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิตัวเรือนปั๊มน้ำ : 33.3 C°/F°	✓		
	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกปืนเพลาปั๊มน้ำ ตัว1. 34.6 C°/ตัว2. 36.4 C°	✓		
	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำของ Cooling loop และ น้ำที่ระบายออก	–	–	

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่อรายการอะไหล่	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ

สรุปงาน PM. และข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบชุดมอเตอร์ขับปั๊มทำงาน มีเสียงดังผิดปกติ บริเวณลูกปืน
ลูกที่ใช้ทำงานเสื่อมตรวจเช็ค และ แก้ไข

ลูกค้า : วินาวิน
วันที่ : 29 / 4 / 69

ช่างเทคนิค : ปฏิภาณ, ปรินทร์
วันที่ : 29 / 04 / 2026 เวลา : 14:00

สำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY JANUARY 2026						TYPE							
								CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE	Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d								
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงถูกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	Sarayut
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		Sarayut
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		Sarayut
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		Sarayut
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		Sarayut
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		Sarayut
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		Sarayut
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sarayut
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sarayut
TOTAL								29	31	2	2	3			



Checked by: _____ Verified by: _____






Position: Supervisor Security






Security Manager

Emergency Light


Mounthly | January | 2026




No.	Pictrue	Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	18/1/2026		
2		B	Women bethroom	Normal	18/1/2026		
3		B	Pump room	Normal	18/1/2026		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/1/2026		
5		B	Men bethroom	Normal	18/1/2026		
6		B	Server room	Normal	18/1/2026		
7		B	GM Office	Normal	18/1/2026		
8		B	Ac office	Normal	18/1/2026		
9		B	Office Sales+KT+IT	Normal	18/1/2026		
10		B	Inside office Sale	Normal	18/1/2026		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	18/1/2026		
12		G	Security control room 1	Normal	18/1/2026		
13		G	Security control room 2	Normal	18/1/2026		
14		G	Front office	Normal	18/1/2026		
15		G	Server room IT	Normal	18/1/2026		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/1/2026		
17		G	Metering room	Abnormal	18/1/2026		ถอดปลั๊กออก ไฟไม่ดิด




18		G	RMU room	Normal	18/1/2026		
19		2	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/1/2026		
20		2	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/1/2026		
21		2	Service Lifts	Normal	18/1/2026		
22		3	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/1/2026		
23		3	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/1/2026		
24		3	Service Lifts	Normal	18/1/2026		
25		4	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/1/2026		
26		4	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/1/2026		
27		4	Service Lifts	Normal	18/1/2026		
28		5	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/1/2026		
29		5	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/1/2026		
30		5	Service Lifts	Normal	18/1/2026		
31		6	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/1/2026		
32		6	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/1/2026		
33		6	Male locker room	Normal	18/1/2026		
34		6	Female locker room	Normal	18/1/2026		
35		6	Linen room	Normal	18/1/2026		






36		6	**Inside HK office**	Normal	18/1/2026		
37		6	**Service Lifts**	Normal	18/1/2026		
38		6	**Inside Food Store**	Normal	18/1/2026		
39		6	**Inside General Store**	Normal	18/1/2026		
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	18/1/2026		
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	18/1/2026		
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	18/1/2026		
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	18/1/2026		
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	18/1/2026		
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	18/1/2026		
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	18/1/2026		
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	18/1/2026		
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	18/1/2026		
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/1/2026		
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	17/1/2026		
51		7M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/1/2026		
52		7	**Main Kitchen 01**	Normal	17/1/2026		
53		7	**Main Kitchen 02**	Normal	17/1/2026		



54		7	Casher streets Café’	Normal	17/1/2026		
55		7	Inside streets café’ 01	Normal	17/1/2026		
56		7	Inside streets café’ 02	Normal	17/1/2026		
57		7	Inside streets café’ 03	Normal	17/1/2026		
58		7	Inside Electrical Room 1	Normal	17/1/2026		
59		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/1/2026		
60		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/1/2026		
61		8	Service Lifts	Normal	17/1/2026		
62		8	Front of room 0803	Normal	17/1/2026		
63		8	Front of room 0809	Normal	17/1/2026		
64		8	Front of room 0815	Normal	17/1/2026		
65		8	Electrical Room	Normal	17/1/2026		
66		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/1/2026		
67		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/1/2026		
68		9	Service Lifts	Normal	17/1/2026		
69		9	Front of room 0903	Normal	17/1/2026		
70		9	Front of room 0909	Abnormal	17/1/2026		ไฟไม่ติด
71		9	Front of room 0915	Normal	17/1/2026		

72		9	Electrical Room	Normal	17/1/2026		
73		10	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/1/2026		
74		10	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/1/2026		
75		10	Service Lifts	Normal	17/1/2026		
76		10	Front of room 1003	Normal	17/1/2026		
77		10	Front of room 1009	Normal	17/1/2026		
78		10	Front of room 1015	Normal	17/1/2026		
79		10	Electrical Room	Normal	17/1/2026		
80		11	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/1/2026		
81		11	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/1/2026		
82		11	Service Lifts	Normal	17/1/2026		
83		11	Front of room 1103	Normal	17/1/2026		
84		11	Front of room 1109	Normal	17/1/2026		
85		11	Front of room 1115	Normal	17/1/2026		
86		11	Electrical Room	Normal	17/1/2026		
87		12	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/1/2026		
88		12	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/1/2026		
89		12	Service Lifts	Normal	19/1/2026		

90		12	**Front of room 1203**	Normal	19/1/2026		
91		12	**Front of room 1209**	Normal	19/1/2026		
92		12	**Front of room 1215**	Normal	19/1/2026		
93		12	**Electrical Room**	Normal	19/1/2026		
94		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/1/2026		
95		14	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/1/2026		
96		14	**Service Lifts**	Normal	19/1/2026		
97		14	**Front of room 1403**	Normal	19/1/2026		
98		14	**Front of room 1409**	Normal	19/1/2026		
99		14	**Front of room 1415**	Normal	19/1/2026		
100		14	**Electrical Room**	Normal	19/1/2026		
101		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/1/2026		
102		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/1/2026		
103		15	**Service Lifts**	Normal	19/1/2026		
104		15	**Front of room 1503**	Normal	19/1/2026		
105		15	**Front of room 1509**	Normal	19/1/2026		
106		15	**Front of room 1515**	Normal	19/1/2026		
107		15	**Electrical Room**	Normal	19/1/2026		

108		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/1/2026		
109		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/1/2026		
110		16	**Service Lifts**	Normal	19/1/2026		
111		16	**Front of room 1603**	Normal	19/1/2026		
112		16	**Front of room 1609**	Normal	19/1/2026		
113		16	**Front of room 1615**	Normal	19/1/2026		
114		16	**Electrical Room**	Normal	19/1/2026		
115		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/1/2026		
116		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/1/2026		
117		17	**Service Lifts**	Normal	19/1/2026		
118		17	**Front of room 1703**	Normal	19/1/2026		
119		17	**Front of room 1709**	Normal	19/1/2026		
120		17	**Front of room 1715**	Normal	19/1/2026		
121		17	**Electrical Room**	Normal	19/1/2026		
122		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/1/2026		
123		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/1/2026		
124		18	**Service Lifts**	Normal	20/1/2026		
125		18	**Front of room 1803**	Normal	20/1/2026		

126		18	**Front of room 1809**	Normal	20/1/2026		
127		18	**Front of room 1815**	Normal	20/1/2026		
128		18	**Electrical Room**	Normal	20/1/2026		
129		19	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/1/2026		
130		19	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/1/2026		
131		19	**Service Lifts**	Normal	20/1/2026		
132		19	**Front of room 1903**	Normal	20/1/2026		
133		19	**Front of room 1909**	Normal	20/1/2026		
134		19	**Front of room 1915**	Normal	20/1/2026		
135		19	**Electrical Room**	Normal	20/1/2026		
136		20	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/1/2026		
137		20	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/1/2026		
138		20	**Service Lifts**	Normal	20/1/2026		
139		20	**Front of room 2003**	Normal	20/1/2026		
140		20	**Front of room 2009**	Normal	20/1/2026		
141		20	**Front of room 2015**	Normal	20/1/2026		
142		20	**Electrical Room**	Normal	20/1/2026		
143		21	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/1/2026		

144		21	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/1/2026		
145		21	Service Lifts	Normal	20/1/2026		
146		21	Front of room 2103	Normal	20/1/2026		
147		21	Front of room 2109	Normal	20/1/2026		
148		21	Front of room 2115	Normal	20/1/2026		
149		21	Electrical Room	Normal	20/1/2026		
150		22	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/1/2026		
151		22	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/1/2026		
152		22	Service Lifts	Normal	20/1/2026		
153		22	Front of room 2203	Normal	20/1/2026		
154		22	Front of room 2209	Normal	20/1/2026		
155		22	Front of room 2215	Normal	20/1/2026		
156		22	Electrical Room	Normal	20/1/2026		
157		23	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/1/2026		
158		23	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/1/2026		
159		23	Service Lifts	Normal	21/1/2026		
160		23	Front of room 2303	Normal	21/1/2026		
161		23	Front of room 2309	Normal	21/1/2026		

162		23	**Front of room 2315**	Normal	21/1/2026		

163		23	Electrical Room	Normal	21/1/2026		
164		24	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/1/2026		
165		24	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/1/2026		
166		24	Service Lifts	Normal	21/1/2026		
167		24	Front of room 2403	Abnormal	21/1/2026		แบตเสื่อมไม่สว่าง
168		24	Front of room 2409	Abnormal	21/1/2026		ไฟไม่ติด
169		24	Front of room 2415	Normal	21/1/2026		
170		24	Electrical Room	Normal	21/1/2026		
171		25	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/1/2026		
172		25	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/1/2026		
173		25	Service Lifts	Normal	21/1/2026		
174		25	Front of room 2503	Normal	21/1/2026		
175		25	Front of room 2509	Normal	21/1/2026		
176		25	Front of room 2515	Normal	21/1/2026		
177		25	Electrical Room	Normal	21/1/2026		
178		26	Service Lifts	Normal	21/1/2026		
179		26	Bathroom Male	Normal	21/1/2026		
180		26	Bathroom Female	Normal	21/1/2026		


181		26	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/1/2026		
182		26	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/1/2026		
183		26	Electrical Room Inside SIRIVIT I	Abnormal	21/1/2026		แบตเสื่อมไม่สว่าง ถอดปลั๊กไฟไม่ติด
184		26	Inside SIRIVIT I	Normal	21/1/2026		
185		26	Front of SIRIVIT I	Normal	21/1/2026		
186		26	Front of SIRIVIT II (2)	Normal	21/1/2026		
187		26	Inside SIRIVIT II	Normal	21/1/2026		
188		26	Inside SIRIVIT II (2)	Normal	21/1/2026		
189		RT	Service Lifts	Normal	21/1/2026		
190		RT	In Booster Pump Room	Normal	21/1/2026		
191		RT	Front Booster Pump Room	Normal	21/1/2026		
192		RT	In front of the guest elevator	Normal	21/1/2026		
193		RT	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/1/2026		
194		RT	Inside Pressurized room	Normal	21/1/2026		
195		RT	Front of cooling room	Normal	21/1/2026		
196		RT	Inside hall front of room	Normal	21/1/2026		

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

											22/มกราคม/2026
Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	หมายเหตุ
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	22/มกราคม/2026	

Equipment Inventory Checklist January 2026

No.	Pictures	Item	Quantity	Condition	Remark
1		Automated External Defibrillator (AED)	1	Normal	
2		First Aid Box	8	Normal	
3		Manual respirator	1	Normal	
4		Flashlight	1	Normal	
5		Gun handle fire sprinkler	1	Normal	
6		Fire Phone	1	Normal	
7		Stretcher	1	Normal	
8		Megaphone	1	Normal	
9		Fire Axe	1	Normal	

10		Fire Crowbar	1	Normal	
11		Fire Helmet	2	Normal	
12		Firefighting Gloves	2	Normal	
13		Firefighter Shirt	2	Normal	
14		Firefighter Pants	2	Normal	
15		Fire Shoes	2	Normal	
16		Fire Fighting Cabinet	1	Normal	
17		Fire Hose	27	Normal	
18		Fire Hose	27	Normal	
19		Fire Hose Cabinet	27	Normal	

20		Dry Chemical Fire Extinguishel	31	Normal	
21		CO2 Fire Extinguisher	29	Normal	
22		Water-Based Chemical Fire Extinguisher	2	Normal	
23		Foam Fire Extinguisher	2	Normal	
24		Fire Blanket	3	Normal	
25		Traffic Cone	47	Normal	
26		fiberglass lifebuoy	1	Normal	
27		Fire Hydrants	6	Normal	
28		Life-Saving Hook	1	Normal	

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: JANUARY MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ลูกเล็นชนิดดึงลง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ที่ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่คู่ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY FEBRUARY 2026						TYPE							
								CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE	Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d								
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		Soonthon
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		Soonthon
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		Soonthon
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		Soonthon
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	Soonthon
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		Soonthon
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		Soonthon
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
TOTAL								29	31	2	2	3			


Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Supervisor Security



Security Manager


Emergency Light



February 2026









No.		Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	16/2/2026		
2		B	Women bethroom	Normal	16/2/2026		
3		B	Pump room	Normal	16/2/2026		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/2/2026		
5		B	Men bethroom	Normal	16/2/2026		
6		B	Server room	Normal	16/2/2026		
7		B	GM Office	Normal	16/2/2026		
8		B	Ac office	Normal	16/2/2026		
9		B	Office Sales+KT+IT	Normal	16/2/2026		
10		B	Inside office Sale	Normal	16/2/2026		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	16/2/2026		
12		G	Security control room 1	Normal	16/2/2026		
13		G	Security control room 2	Normal	16/2/2026		
14		G	Front office	Normal	16/2/2026		
15		G	Server room IT	Normal	16/2/2026		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/2/2026		
17		G	Metering room	Normal	16/2/2026		









18		G	RMU room	Normal	16/2/2026		
19		2	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/2/2026		
20		2	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/2/2026		
21		2	Service Lifts	Normal	16/2/2026		
22		3	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/2/2026		
23		3	Fire Exit Stair ST2	AbNormal	16/2/2026	23/22026	Change
24		3	Service Lifts	Normal	16/2/2026		
25		4	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/2/2026		
26		4	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/2/2026		
27		4	Service Lifts	Normal	16/2/2026		
28		5	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/2/2026		
29		5	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/2/2026		
30		5	Service Lifts	Normal	16/2/2026		
31		6	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/2/2026		
32		6	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/2/2026		
33		6	Male locker room	Normal	16/2/2026		
34		6	Female locker room	Normal	16/2/2026		
35		6	Linen room	Normal	16/2/2026		






36		6	**Inside HK office**	Normal	16/2/2026		
37		6	**Service Lifts**	Normal	16/2/2026		
38		6	**Inside Food Store**	Normal	16/2/2026		
39		6	**Inside General Store**	Normal	16/2/2026		
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	16/2/2026		
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	16/2/2026		
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	16/2/2026		
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	16/2/2026		
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	16/2/2026		
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	16/2/2026		
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	16/2/2026		
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	16/2/2026		
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	16/2/2026		
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	04/2/2026		
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	04/2/2026		
51		7M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	04/2/2026		
52		7	**Main Kitchen 01**	Normal	04/2/2026		
53		7	**Main Kitchen 02**	Normal	04/2/2026		










54		7	Casher streets Café’	Normal	04/2/2026		
55		7	Inside streets café’ 01	Normal	04/2/2026		
56		7	Inside streets café’ 02	Normal	04/2/2026		
57		7	Inside streets café’ 03	Normal	04/2/2026		
58		7	Inside Electrical Room 1	Normal	04/2/2026		
59		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	04/2/2026		
60		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	04/2/2026		
61		8	Service Lifts	Normal	04/2/2026		
62		8	Front of room 0803	Normal	04/2/2026		
63		8	Front of room 0809	Normal	04/2/2026		
64		8	Front of room 0815	Normal	04/2/2026		
65		8	Electrical Room	Normal	04/2/2026		
66		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	04/2/2026		
67		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	04/2/2026		
68		9	Service Lifts	Normal	04/2/2026		
69		9	Front of room 0903	Normal	04/2/2026		
70		9	Front of room 0909	Normal	04/2/2026		
71		9	Front of room 0915	Normal	04/2/2026		






72		9	**Electrical Room**	Normal	04/2/2026		
73		10	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	04/2/2026		
74		10	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	04/2/2026		
75		10	**Service Lifts**	Normal	04/2/2026		
76		10	**Front of room 1003**	Normal	04/2/2026		
77		10	**Front of room 1009**	Normal	04/2/2026		
78		10	**Front of room 1015**	Normal	04/2/2026		
79		10	**Electrical Room**	Normal	04/2/2026		
80		11	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	04/2/2026		
81		11	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	04/2/2026		
82		11	**Service Lifts**	Normal	04/2/2026		
83		11	**Front of room 1103**	Normal	04/2/2026		
84		11	**Front of room 1109**	Normal	04/2/2026		
85		11	**Front of room 1115**	Normal	04/2/2026		
86		11	**Electrical Room**	Normal	04/2/2026		
87		12	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/1/2026		
88		12	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
89		12	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		





90		12	**Front of room 1203**	Normal	20/2/2026		
91		12	**Front of room 1209**	Normal	20/2/2026		
92		12	**Front of room 1215**	Normal	20/2/2026		
93		12	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		
94		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		
95		14	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
96		14	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		
97		14	**Front of room 1403**	Normal	20/2/2026		
98		14	**Front of room 1409**	Normal	20/2/2026		
99		14	**Front of room 1415**	Normal	20/2/2026		
100		14	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		
101		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		
102		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
103		15	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		
104		15	**Front of room 1503**	Normal	20/2/2026		
105		15	**Front of room 1509**	Normal	20/2/2026		
106		15	**Front of room 1515**	Normal	20/2/2026		
107		15	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		

108		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		
109		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
110		16	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		
111		16	**Front of room 1603**	Normal	20/2/2026		
112		16	**Front of room 1609**	Normal	20/2/2026		
113		16	**Front of room 1615**	Normal	20/2/2026		
114		16	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		
115		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		
116		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
117		17	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		
118		17	**Front of room 1703**	Normal	20/2/2026		
119		17	**Front of room 1709**	Normal	20/2/2026		
120		17	**Front of room 1715**	Normal	20/2/2026		
121		17	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		
122		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		
123		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
124		18	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		
125		18	**Front of room 1803**	Normal	20/2/2026		

126		18	**Front of room 1809**	AbNormal	20/2/2026		
127		18	**Front of room 1815**	Normal	20/2/2026		
128		18	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		
129		19	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		
130		19	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
131		19	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		
132		19	**Front of room 1903**	Normal	20/2/2026		
133		19	**Front of room 1909**	Normal	20/2/2026		
134		19	**Front of room 1915**	Normal	20/2/2026		
135		19	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		
136		20	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		
137		20	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/2/2026		
138		20	**Service Lifts**	Normal	20/2/2026		
139		20	**Front of room 2003**	Normal	20/2/2026		
140		20	**Front of room 2009**	Normal	20/2/2026		
141		20	**Front of room 2015**	Normal	20/2/2026		
142		20	**Electrical Room**	Normal	20/2/2026		
143		21	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/2/2026		

144		21	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/2/2026		
145		21	Service Lifts	Normal	20/2/2026		
146		21	Front of room 2103	Normal	20/2/2026		
147		21	Front of room 2109	Normal	20/2/2026		
148		21	Front of room 2115	Normal	20/2/2026		
149		21	Electrical Room	Normal	20/2/2026		
150		22	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/2/2026		
151		22	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/2/2026		
152		22	Service Lifts	Normal	20/2/2026		
153		22	Front of room 2203	Normal	20/2/2026		
154		22	Front of room 2209	Normal	20/2/2026		
155		22	Front of room 2215	Normal	20/2/2026		
156		22	Electrical Room	Normal	20/2/2026		
157		23	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/2/2026		
158		23	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/2/2026		
159		23	Service Lifts	Normal	21/2/2026		
160		23	Front of room 2303	Normal	21/2/2026		
161		23	Front of room 2309	Normal	21/2/2026		

162		23	**Front of room 2315**	Normal	21/2/2026		
163		23	**Electrical Room**	Normal	21/2/2026		
164		24	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	21/2/2026		
165		24	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	21/2/2026		
166		24	**Service Lifts**	Normal	21/2/2026		
167		24	**Front of room 2403**	Normal	21/2/2026		
168		24	**Front of room 2409**	Normal	21/2/2026		
169		24	**Front of room 2415**	Normal	21/2/2026		
170		24	**Electrical Room**	Normal	21/2/2026		
171		25	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	21/2/2026		
172		25	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	21/2/2026		
173		25	**Service Lifts**	Normal	21/2/2026		
174		25	**Front of room 2503**	Normal	21/2/2026		
175		25	**Front of room 2509**	Normal	21/2/2026		
176		25	**Front of room 2515**	Normal	21/2/2026		
177		25	**Electrical Room**	Normal	21/2/2026		
178		26	**Service Lifts**	Normal	21/2/2026		
179		26	**Bathroom Male**	Normal	21/2/2026		


180		26	Bathroom Female	Normal	21/2/2026		
181		26	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/2/2026		
182		26	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/2/2026		
183		26	Electrical Room Inside SIRIVIT I	Normal	21/2/2026		
184		26	Inside SIRIVIT I	Normal	21/2/2026		
185		26	Front of SIRIVIT I	Normal	21/2/2026		
186		26	Front of SIRIVIT II (2)	Normal	21/2/2026		
187		26	Inside SIRIVIT II	Normal	21/2/2026		
188		26	Frontlift Service	AbNormal	21/2/2026	23/2/2026	Repair
189		RT	Service Lifts	Normal	21/2/2026		
190		RT	In Booster Pump Room	Normal	21/2/2026		
191		RT	Front Booster Pump Room	Normal	21/2/2026		
192		RT	In front of the elevator	Normal	21/2/2026		
193		RT	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/2/2026		
194		RT	Inside Pressurized room	Normal	21/2/2026		
195		RT	Front of cooling room	Normal	21/2/2026		
196		RT	Inside hall front of room	Normal	21/2/2026		

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

											20/กุมภาพันธ์/2026
Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	หมายเหตุ
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/กุมภาพันธ์/2026	

Equipment Inventory Checklist Febuary 2026

No.	Pictures	Item	Quantity	Condition	Remark
1		Automated External Defibrillator (AED)	1	Normal	
2		First Aid Box	8	Normal	
3		Manual respirator	1	Normal	
4		Flashlight	1	Normal	
5		Gun handle fire sprinkler	1	Normal	
6		Fire Phone	1	Normal	
7		Stretcher	1	Normal	
8		Megaphone	1	Normal	
9		Fire Axe	1	Normal	

10		Fire Crowbar	1	Normal	
11		Fire Helmet	2	Normal	
12		Firefighting Gloves	2	Normal	
13		Firefighter Shirt	2	Normal	
14		Firefighter Pants	2	Normal	
15		Fire Shoes	2	Normal	
16		Fire Fighting Cabinet	1	Normal	
17		Fire Hose	27	Normal	
18		Fire Hose	27	Normal	
19		Fire Hose Cabinet	27	Normal	

20		Dry Chemical Fire Extinguishel	31	Normal	
21		CO2 Fire Extinguisher	29	Normal	
22		Water-Based Chemical Fire Extinguisher	2	Normal	
23		Foam Fire Extinguisher	2	Normal	
24		Fire Blanket	3	Normal	
25		Traffic Cone	47	Normal	
26		fiberglass lifebuoy	1	Normal	
27		Fire Hydrants	6	Normal	
28		Life-Saving Hook	1	Normal	

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: February MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ลูกเล็นชนิดดึงลง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ที่ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่ดู FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY FEBRUARY 2026						TYPE						Remark	by Inspection
								CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE		
		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d								
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		Sakdinon
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		Sakdinon
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		Sakdinon
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		Sakdinon
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		Sakdinon
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		Sakdinon
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
TOTAL								29	31	2	2	3			


Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Supervisor Security


Security Manager



Emergency Light






March 2026









No.		Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	03/3/2026		
2		B	Women bethroom	Normal	03/3/2026		
3		B	Pump room	Normal	03/3/2026		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	03/3/2026		
5		B	Men bethroom	Normal	03/3/2026		
6		B	Server room	Normal	03/3/2026		
7		B	GM Office	Normal	03/3/2026		
8		B	Ac office	Normal	03/3/2026		
9		B	Office Sales+KT+IT	Normal	03/3/2026		
10		B	Inside office Sale	Normal	03/3/2026		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	03/3/2026		
12		G	Security control room 1	Normal	03/3/2026		
13		G	Security control room 2	Normal	03/3/2026		
14		G	Front office	Normal	03/3/2026		
15		G	Server room IT	Normal	03/3/2026		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	03/3/2026		
17		G	Metering room	Normal	03/3/2026		









18		G	**RMU room**	Normal	03/3/2026		
19		2	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	03/3/2026		
20		2	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	03/3/2026		
21		2	**Service Lifts**	Normal	03/3/2026		
22		3	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	03/3/2026		
23		3	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	03/3/2026		
24		3	**Service Lifts**	Normal	03/3/2026		
25		4	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	03/3/2026		
26		4	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	03/3/2026		
27		4	**Service Lifts**	Normal	03/3/2026		
28		5	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	03/3/2026		
29		5	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	03/3/2026		
30		5	**Service Lifts**	Normal	03/3/2026		
31		6	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	03/3/2026		
32		6	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	03/3/2026		
33		6	**Male locker room**	Normal	03/3/2026		
34		6	**Female locker room**	Normal	03/3/2026		
35		6	**Linen room**	Normal	03/3/2026		





36		6	Inside HK office	Normal	03/3/2026		
37		6	Service Lifts	Normal	03/3/2026		
38		6	Inside Food Store	Normal	03/3/2026		
39		6	Inside General Store	Normal	03/3/2026		
40		6	Inside Engineer office	Normal	03/3/2026		
41		6	Inside Engineer office 2	Normal	03/3/2026		
42		6M	Staff canteen 01	Normal	03/3/2026		
43		6M	Inside Store Engineer	Normal	03/3/2026		
44		6M	Inside MDB room 01	Normal	03/3/2026		
45		6M	Inside MDB room 02	AbNormal	03/3/2026		
46		6M	Inside Generator room	Normal	03/3/2026		
47		6M	Inside Chiller Room	Normal	03/3/2026		
48		6M	Fire Exit Stair ST1	Normal	04/3/2026		
49		7	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/3/2026		
50		7	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/3/2026		
51		7M	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/3/2026		
52		7	Main Kitchen 01	Normal	21/3/2026		
53		7	Main Kitchen 02	Normal	21/3/2026		






54		7	Casher streets Café’	Normal	21/3/2026		
55		7	Inside streets café’ 01	Normal	21/3/2026		
56		7	Inside streets café’ 02	Normal	21/3/2026		
57		7	Inside streets café’ 03	Normal	21/3/2026		
58		7	Inside Electrical Room 1	Normal	21/3/2026		
59		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/3/2026		
60		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/3/2026		
61		8	Service Lifts	Normal	21/3/2026		
62		8	Front of room 0803	Normal	21/3/2026		
63		8	Front of room 0809	Normal	21/3/2026		
64		8	Front of room 0815	Normal	21/3/2026		
65		8	Electrical Room	Normal	21/3/2026		
66		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/3/2026		
67		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/3/2026		
68		9	Service Lifts	Normal	21/3/2026		
69		9	Front of room 0903	Normal	21/3/2026		
70		9	Front of room 0909	Normal	21/3/2026		
71		9	Front of room 0915	Normal	21/3/2026		






72		9	Electrical Room	Normal	21/3/2026		
73		10	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/3/2026		
74		10	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/3/2026		
75		10	Service Lifts	Normal	21/3/2026		
76		10	Front of room 1003	Normal	21/3/2026		
77		10	Front of room 1009	Normal	21/3/2026		
78		10	Front of room 1015	Normal	21/3/2026		
79		10	Electrical Room	Normal	21/3/2026		
80		11	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/3/2026		
81		11	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/3/2026		
82		11	Service Lifts	Normal	21/3/2026		
83		11	Front of room 1103	Normal	21/3/2026		
84		11	Front of room 1109	Normal	21/3/2026		
85		11	Front of room 1115	Normal	21/3/2026		
86		11	Electrical Room	Normal	21/3/2026		
87		12	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/3/2026		
88		12	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/3/2026		
89		12	Service Lifts	Normal	16/3/2026		





90		12	**Front of room 1203**	Normal	16/3/2026		
91		12	**Front of room 1209**	Normal	16/3/2026		
92		12	**Front of room 1215**	Normal	16/3/2026		
93		12	**Electrical Room**	Normal	16/3/2026		
94		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	16/3/2026		
95		14	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	16/3/2026		
96		14	**Service Lifts**	Normal	16/3/2026		
97		14	**Front of room 1403**	Normal	16/3/2026		
98		14	**Front of room 1409**	Normal	16/3/2026		
99		14	**Front of room 1415**	Normal	16/3/2026		
100		14	**Electrical Room**	Normal	16/3/2026		
101		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	16/3/2026		
102		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	16/3/2026		
103		15	**Service Lifts**	Normal	16/3/2026		
104		15	**Front of room 1503**	Normal	16/3/2026		
105		15	**Front of room 1509**	Normal	16/3/2026		
106		15	**Front of room 1515**	Normal	16/3/2026		
107		15	**Electrical Room**	Normal	16/3/2026		

108		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	16/3/2026		
109		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	16/3/2026		
110		16	**Service Lifts**	Normal	16/3/2026		
111		16	**Front of room 1603**	Normal	16/3/2026		
112		16	**Front of room 1609**	Normal	16/3/2026		
113		16	**Front of room 1615**	Normal	16/3/2026		
114		16	**Electrical Room**	Normal	16/3/2026		
115		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	16/3/2026		
116		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	16/3/2026		
117		17	**Service Lifts**	Normal	16/3/2026		
118		17	**Front of room 1703**	Normal	16/3/2026		
119		17	**Front of room 1709**	Normal	16/3/2026		
120		17	**Front of room 1715**	Normal	16/3/2026		
121		17	**Electrical Room**	Normal	16/3/2026		
122		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/3/2026		
123		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/3/2026		
124		18	**Service Lifts**	Normal	10/3/2026		
125		18	**Front of room 1803**	Normal	10/3/2026		


126		18	**Front of room 1809**	Normal	10/3/2026		
127		18	**Front of room 1815**	Normal	10/3/2026		
128		18	**Electrical Room**	Normal	10/3/2026		
129		19	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/3/2026		
130		19	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/3/2026		
131		19	**Service Lifts**	Normal	10/3/2026		
132		19	**Front of room 1903**	Normal	10/3/2026		
133		19	**Front of room 1909**	Normal	10/3/2026		
134		19	**Front of room 1915**	Normal	10/3/2026		
135		19	**Electrical Room**	Normal	10/3/2026		
136		20	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/3/2026		
137		20	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/3/2026		
138		20	**Service Lifts**	Normal	10/3/2026		
139		20	**Front of room 2003**	Normal	10/3/2026		
140		20	**Front of room 2009**	Normal	10/3/2026		
141		20	**Front of room 2015**	Normal	10/3/2026		
142		20	**Electrical Room**	Normal	10/3/2026		
143		21	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/3/2026		

144		21	Fire Exit Stair ST2	Normal	10/3/2026		
145		21	Service Lifts	Normal	10/3/2026		
146		21	Front of room 2103	Normal	10/3/2026		
147		21	Front of room 2109	Normal	10/3/2026		
148		21	Front of room 2115	Normal	10/3/2026		
149		21	Electrical Room	Normal	10/3/2026		
150		22	Fire Exit Stair ST1	Normal	10/3/2026		
151		22	Fire Exit Stair ST2	Normal	10/3/2026		
152		22	Service Lifts	Normal	10/3/2026		
153		22	Front of room 2203	Normal	10/3/2026		
154		22	Front of room 2209	Normal	10/3/2026		
155		22	Front of room 2215	Normal	10/3/2026		
156		22	Electrical Room	Normal	10/3/2026		
157		23	Fire Exit Stair ST1	Normal	6/3/2026		
158		23	Fire Exit Stair ST2	Normal	6/3/2026		
159		23	Service Lifts	Normal	6/3/2026		
160		23	Front of room 2303	Normal	6/3/2026		
161		23	Front of room 2309	Normal	6/3/2026		

162		23	**Front of room 2315**	Normal	6/3/2026		
163		23	**Electrical Room**	Normal	6/3/2026		
164		24	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	6/3/2026		
165		24	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	6/3/2026		
166		24	**Service Lifts**	Normal	6/3/2026		
167		24	**Front of room 2403**	Normal	6/3/2026		
168		24	**Front of room 2409**	Normal	6/3/2026		
169		24	**Front of room 2415**	Normal	6/3/2026		
170		24	**Electrical Room**	Normal	6/3/2026		
171		25	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	6/3/2026		
172		25	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	6/3/2026		
173		25	**Service Lifts**	Normal	6/3/2026		
174		25	**Front of room 2503**	Normal	6/3/2026		
175		25	**Front of room 2509**	Normal	6/3/2026		
176		25	**Front of room 2515**	Normal	6/3/2026		
177		25	**Electrical Room**	Normal	6/3/2026		
178		26	**Service Lifts**	Normal	6/3/2026		
179		26	**Bathroom Male**	Normal	6/3/2026		

180		26	Bathroom Female	Normal	6/3/2026		
181		26	Fire Exit Stair ST1	Normal	6/3/2026		
182		26	Fire Exit Stair ST2	Normal	6/3/2026		
183		26	Electrical Room Inside SIRIVIT I	Normal	6/3/2026		
184		26	Inside SIRIVIT I	Normal	6/3/2026		
185		26	Front of SIRIVIT I	Normal	6/3/2026		
186		26	Front of SIRIVIT II (2)	Normal	6/3/2026		
187		26	Inside SIRIVIT II	Normal	6/3/2026		
188		26	Frontlift Service	Normal	6/3/2026		
189		RT	Service Lifts	Normal	6/3/2026		
190		RT	In Booster Pump Room	Normal	4/3/2026		
191		RT	Front Booster Pump Room	Normal	6/3/2026		
192		RT	In front of the elevator	Normal	6/3/2026		
193		RT	Fire Exit Stair ST2	Normal	6/3/2026		
194		RT	Inside Pressurized room	Normal	6/3/2026		
195		RT	Front of cooling room	Normal	6/3/2026		
196		RT	Inside hall front of room	Normal	6/3/2026		

Equipment Inventory Checklist March 2026

No.	Pictures	Item	Quantity	Condition	Remark
1		Automated External Defibrillator (AED)	1	Normal	
2		First Aid Box	8	Normal	
3		Manual respirator	1	Normal	
4		Flashlight	1	Normal	
5		Gun handle fire sprinkler	1	Normal	
6		Fire Phone	1	Normal	
7		Stretcher	1	Normal	
8		Megaphone	1	Normal	
9		Fire Axe	1	Normal	

10		Fire Crowbar	1	Normal	
11		Fire Helmet	2	Normal	
12		Firefighting Gloves	2	Normal	
13		Firefighter Shirt	2	Normal	
14		Firefighter Pants	2	Normal	
15		Fire Shoes	2	Normal	
16		Fire Fighting Cabinet	1	Normal	
17		Fire Hose	27	Normal	
18		Fire Hose	27	Normal	
19		Fire Hose Cabinet	27	Normal	

20		Dry Chemical Fire Extinguishel	31	Normal	
21		CO2 Fire Extinguisher	29	Normal	
22		Water-Based Chemical Fire Extinguisher	2	Normal	
23		Foam Fire Extinguisher	2	Normal	
24		Fire Blanket	3	Normal	
25		Traffic Cone	47	Normal	
26		fiberglass lifebuoy	1	Normal	
27		Fire Hydrants	6	Normal	
28		Life-Saving Hook	1	Normal	

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: March MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / จุกเอ็นชนิดดึงข้างหน้า)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่ตู้ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY APRIL 206						TYPE						Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d	CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE		
Floor	Location							QUANTITY							
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		Kritsana
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		Kritsana
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		Kritsana
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		Kritsana
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		Kritsana
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		Kritsana
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Kritsana
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Kritsana
TOTAL								29	31	2	2	3			






Checked by: _____ Verified by: _____









Position: Supervisor Security







Security Manager











Emergency Light








April 2026






No.		Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	21/4/2026		
2		B	Women bethroom	Normal	21/4/2026		
3		B	Pump room	Normal	21/4/2026		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/4/2026		
5		B	Men bethroom	Normal	21/4/2026		
6		B	Server room	Normal	21/4/2026		
7		B	GM Office	Normal	21/4/2026		
8		B	Ac office	Normal	21/4/2026		
9		B	Office Sales+KT+FB	Normal	21/4/2026		
10		B	Inside office Sale	Normal	21/4/2026		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	21/4/2026		
12		G	Security control room 1	Normal	21/4/2026		
13		G	Security control room 2	Normal	21/4/2026		
14		G	Front office	Normal	21/4/2026		
15		G	Server room IT	Normal	21/4/2026		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/4/2026		
17		G	Metering room	Normal	21/4/2026		







18		G	RMU room	Normal	21/4/2026		
19		2	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/4/2026		
20		2	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/4/2026		
21		2	Service Lifts	Normal	21/4/2026		
22		3	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/4/2026		
23		3	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/4/2026		
24		3	Service Lifts	Normal	21/4/2026		
25		4	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/4/2026		
26		4	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/4/2026		
27		4	Service Lifts	Normal	21/4/2026		
28		5	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/4/2026		
29		5	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/4/2026		
30		5	Service Lifts	Normal	21/4/2026		
31		6	Fire Exit Stair ST1	Normal	21/4/2026		
32		6	Fire Exit Stair ST2	Normal	21/4/2026		
33		6	Male locker room	Normal	21/4/2026		
34		6	Female locker room	Normal	21/4/2026		
35		6	Linen room	Normal	21/4/2026		





36		6	**Inside HK office**	Normal	21/4/2026		
37		6	**Service Lifts**	Normal	21/4/2026		
38		6	**Inside Food Store**	Normal	21/4/2026		
39		6	**Inside General Store**	Normal	21/4/2026		
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	21/4/2026		
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	21/4/2026		
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	21/4/2026		
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	21/4/2026		
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	21/4/2026		
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	21/4/2026		
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	21/4/2026		
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	21/4/2026		
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	21/4/2026		
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	08/4/2026		
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	08/4/2026		
51		7M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	08/4/2026		
52		7	**Main Kitchen 01**	Normal	08/4/2026		
53		7	**Main Kitchen 02**	Normal	08/4/2026		












54		7	Casher streets Café’	Normal	08/4/2026		
55		7	Inside streets café’ 01	Normal	08/4/2026		
56		7	Inside streets café’ 02	Normal	08/4/2026		
57		7	Inside streets café’ 03	Normal	08/4/2026		
58		7	Inside Electrical Room 1	Normal	08/4/2026		
59		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	08/4/2026		
60		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	08/4/2026		
61		8	Service Lifts	Normal	08/4/2026		
62		8	Front of room 0803	Normal	08/4/2026		
63		8	Front of room 0809	Normal	08/4/2026		
64		8	Front of room 0815	Normal	08/4/2026		
65		8	Electrical Room	Normal	08/4/2026		
66		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	08/4/2026		
67		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	08/4/2026		
68		9	Service Lifts	Normal	08/4/2026		
69		9	Front of room 0903	Normal	08/4/2026		
70		9	Front of room 0909	Normal	08/4/2026		
71		9	Front of room 0915	Normal	08/4/2026		









72		9	**Electrical Room**	Normal	08/4/2026		
73		10	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	08/4/2026		
74		10	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	08/4/2026		
75		10	**Service Lifts**	Normal	08/4/2026		
76		10	**Front of room 1003**	Normal	08/4/2026		
77		10	**Front of room 1009**	Normal	08/4/2026		
78		10	**Front of room 1015**	Normal	08/4/2026		
79		10	**Electrical Room**	Normal	08/4/2026		
80		11	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	08/4/2026		
81		11	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	08/4/2026		
82		11	**Service Lifts**	Normal	08/4/2026		
83		11	**Front of room 1103**	Normal	08/4/2026		
84		11	**Front of room 1109**	Normal	08/4/2026		
85		11	**Front of room 1115**	Normal	08/4/2026		
86		11	**Electrical Room**	Normal	08/4/2026		
87		12	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	02/4/2026		
88		12	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	02/4/2026		
89		12	**Service Lifts**	Normal	02/4/2026		










90		12	**Front of room 1203**	Normal	02/4/2026		
91		12	**Front of room 1209**	Normal	02/4/2026		
92		12	**Front of room 1215**	AbNormal	02/4/2026		
93		12	**Electrical Room**	Normal	02/4/2026		
94		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	02/4/2026		
95		14	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	02/4/2026		
96		14	**Service Lifts**	Normal	02/4/2026		
97		14	**Front of room 1403**	Normal	02/4/2026		
98		14	**Front of room 1409**	Normal	02/4/2026		
99		14	**Front of room 1415**	Normal	02/4/2026		
100		14	**Electrical Room**	Normal	02/4/2026		
101		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	02/4/2026		
102		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	02/4/2026		
103		15	**Service Lifts**	Normal	02/4/2026		
104		15	**Front of room 1503**	Normal	02/4/2026		
105		15	**Front of room 1509**	Normal	02/4/2026		
106		15	**Front of room 1515**	Normal	02/4/2026		
107		15	**Electrical Room**	Normal	02/4/2026		

108		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	02/4/2026		
109		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	02/4/2026		
110		16	**Service Lifts**	Normal	02/4/2026		
111		16	**Front of room 1603**	Normal	02/4/2026		
112		16	**Front of room 1609**	Normal	02/4/2026		
113		16	**Front of room 1615**	Normal	02/4/2026		
114		16	**Electrical Room**	Normal	02/4/2026		
115		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	02/4/2026		
116		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	02/4/2026		
117		17	**Service Lifts**	Normal	02/4/2026		
118		17	**Front of room 1703**	Normal	02/4/2026		
119		17	**Front of room 1709**	Normal	02/4/2026		
120		17	**Front of room 1715**	AbNormal	02/4/2026		
121		17	**Electrical Room**	Normal	02/4/2026		
122		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/4/2026		
123		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/4/2026		
124		18	**Service Lifts**	Normal	19/4/2026		
125		18	**Front of room 1803**	Normal	19/4/2026		

126		18	**Front of room 1809**	Normal	19/4/2026		
127		18	**Front of room 1815**	Normal	19/4/2026		
128		18	**Electrical Room**	Normal	19/4/2026		
129		19	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/4/2026		
130		19	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/4/2026		
131		19	**Service Lifts**	Normal	19/4/2026		
132		19	**Front of room 1903**	Normal	19/4/2026		
133		19	**Front of room 1909**	Normal	19/4/2026		
134		19	**Front of room 1915**	Normal	19/4/2026		
135		19	**Electrical Room**	Normal	19/4/2026		
136		20	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/4/2026		
137		20	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/4/2026		
138		20	**Service Lifts**	Normal	19/4/2026		
139		20	**Front of room 2003**	Normal	19/4/2026		
140		20	**Front of room 2009**	Normal	19/4/2026		
141		20	**Front of room 2015**	Normal	19/4/2026		
142		20	**Electrical Room**	Normal	19/4/2026		
143		21	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/4/2026		

144		21	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/4/2026		
145		21	**Service Lifts**	Normal	19/4/2026		
146		21	**Front of room 2103**	Normal	19/4/2026		
147		21	**Front of room 2109**	Normal	19/4/2026		
148		21	**Front of room 2115**	Normal	19/4/2026		
149		21	**Electrical Room**	Normal	19/4/2026		
150		22	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/4/2026		
151		22	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/4/2026		
152		22	**Service Lifts**	Normal	19/4/2026		
153		22	**Front of room 2203**	Normal	19/4/2026		
154		22	**Front of room 2209**	Normal	19/4/2026		
155		22	**Front of room 2215**	Normal	19/4/2026		
156		22	**Electrical Room**	Normal	19/4/2026		
157		23	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/4/2026		
158		23	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/4/2026		
159		23	**Service Lifts**	Normal	10/4/2026		
160		23	**Front of room 2303**	Normal	10/4/2026		
161		23	**Front of room 2309**	Normal	10/4/2026		

162		23	**Front of room 2315**	Normal	10/4/2026		
163		23	**Electrical Room**	Normal	10/4/2026		
164		24	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/4/2026		
165		24	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/4/2026		
166		24	**Service Lifts**	Normal	10/4/2026		
167		24	**Front of room 2403**	Normal	10/4/2026		
168		24	**Front of room 2409**	Normal	10/4/2026		
169		24	**Front of room 2415**	Normal	10/4/2026		
170		24	**Electrical Room**	Normal	10/4/2026		
171		25	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/4/2026		
172		25	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/4/2026		
173		25	**Service Lifts**	Normal	10/4/2026		
174		25	**Front of room 2503**	Normal	10/4/2026		
175		25	**Front of room 2509**	Normal	10/4/2026		
176		25	**Front of room 2515**	AbNormal	10/4/2026		
177		25	**Electrical Room**	Normal	10/4/2026		
178		26	**Service Lifts**	Normal	10/4/2026		
179		26	**Bathroom Male**	Normal	10/4/2026		


180		26	**Bathroom Female**	Normal	10/4/2026		
181		26	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	10/4/2026		
182		26	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/4/2026		
183		26	**Electrical Room Inside SIRIVIT I**	Normal	10/4/2026		
184		26	**Inside SIRIVIT I**	Normal	10/4/2026		
185		26	**Front of SIRIVIT I**	Normal	10/4/2026		
186		26	**Front of SIRIVIT II (2)**	Normal	10/4/2026		
187		26	**Inside SIRIVIT II**	Normal	10/4/2026		
188		26	**Frontlift Service**	Normal	10/4/2026		
189		RT	**Service Lifts**	Normal	10/4/2026		
190		RT	**In Booster Pump Room**	Normal	10/4/2026		
191		RT	**Front Booster Pump Room**	Normal	10/4/2026		
192		RT	**In front of the elevator**	Normal	10/4/2026		
193		RT	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	10/4/2026		
194		RT	**Inside Pressurized room**	Normal	10/4/2026		
195		RT	**Front of cooling room**	Normal	10/4/2026		
196		RT	**Inside hall front of room**	Normal	10/4/2026		

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

											6/เมษายน/2026
Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	หมายเหตุ
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	6/เมษายน/2026	

Equipment Inventory Checklist March 2026

No.	Pictures	Item	Quantity	Condition	Remark
1		Automated External Defibrillator (AED)	1	Normal	
2		First Aid Box	8	Normal	
3		Manual respirator	1	Normal	
4		Flashlight	1	Normal	
5		Gun handle fire sprinkler	1	Normal	
6		Fire Phone	1	Normal	
7		Stretcher	1	Normal	
8		Megaphone	1	Normal	
9		Fire Axe	1	Normal	

10		Fire Crowbar	1	Normal	
11		Fire Helmet	2	Normal	
12		Firefighting Gloves	2	Normal	
13		Firefighter Shirt	2	Normal	
14		Firefighter Pants	2	Normal	
15		Fire Shoes	2	Normal	
16		Fire Fighting Cabinet	1	Normal	
17		Fire Hose	27	Normal	
18		Fire Hose	27	Normal	
19		Fire Hose Cabinet	27	Normal	

20		Dry Chemical Fire Extinguishel	31	Normal	
21		CO2 Fire Extinguisher	29	Normal	
22		Water-Based Chemical Fire Extinguisher	2	Normal	
23		Foam Fire Extinguisher	2	Normal	
24		Fire Blanket	3	Normal	
25		Traffic Cone	47	Normal	
26		fiberglass lifebuoy	1	Normal	
27		Fire Hydrants	6	Normal	
28		Life-Saving Hook	1	Normal	

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: April MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ลูกเล็นชนิดดึงลง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ที่ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่อยู่ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.



FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY May 2026						TYPE						Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d	CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE		
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		Supakson
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		Supakson
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		Supakson
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		Supakson
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		Supakson
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		Supakson
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Supakson
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Supakson
TOTAL								29	31	2	2	3			




Checked by: _____ Verified by: _____








Position: Supervisor Security








Security Manager









Emergency Light
May 2026









No.		Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	19/05/2026	
2		B	Women bethroom	Normal	19/05/2026	
3		B	Pump room	Normal	19/05/2026	
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/05/2026	
5		B	Men bethroom	Normal	19/05/2026	
6		B	Server room	Normal	19/05/2026	
7		B	GM Office	Normal	19/05/2026	
8		B	Ac office	Normal	19/05/2026	
9		B	Office Sales+KT+FB	Normal	19/05/2026	
10		B	Inside office Sale	Normal	19/05/2026	
11		B	Inside office FB+KC	Normal	19/05/2026	
12		G	Security control room 1	Normal	19/05/2026	
13		G	Security control room 2	Normal	19/05/2026	
14		G	Front office	Normal	19/05/2026	
15		G	Server room IT	Normal	19/05/2026	
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/05/2026	
17		G	Metering room	Normal	19/05/2026	
18		G	RMU room	Normal	19/05/2026	





19		2	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/05/2026	
20		2	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/05/2026	
21		2	Service Lifts	Normal	19/05/2026	
22		3	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/05/2026	
23		3	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/05/2026	
24		3	Service Lifts	Normal	19/05/2026	
25		4	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/05/2026	
26		4	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/05/2026	
27		4	Service Lifts	Normal	19/05/2026	
28		5	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/05/2026	
29		5	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/05/2026	
30		5	Service Lifts	Normal	19/05/2026	
31		6	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/05/2026	
32		6	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/05/2026	
33		6	Male locker room	Normal	19/05/2026	
34		6	Female locker room	Normal	19/05/2026	
35		6	Linen room	Normal	19/05/2026	
36		6	Inside HK office	Normal	19/05/2026	
37		6	Service Lifts	Normal	19/05/2026	



38		6	**Inside Food Store**	Normal	19/05/2026	
39		6	**Inside General Store**	Normal	19/05/2026	
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	19/05/2026	
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	19/05/2026	
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	19/05/2026	
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	19/05/2026	
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	19/05/2026	
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	19/05/2026	
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	19/05/2026	
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	19/05/2026	
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/05/2026	
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/05/2026	
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	17/05/2026	
51		7M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/05/2026	
52		7	**Main Kitchen 01**	Normal	17/05/2026	
53		7	**Main Kitchen 02**	Normal	17/05/2026	
54		7	**Casher streets Café'**	Normal	17/05/2026	
55		7	**Inside streets café' 01**	Normal	17/05/2026	
56		7	**Inside streets café' 02**	Normal	17/05/2026	






57		7	Inside streets café' 03	Normal	17/05/2026	
58		7	Inside Electrical Room 1	Normal	17/05/2026	
59		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/05/2026	
60		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/05/2026	
61		8	Service Lifts	Normal	17/05/2026	
62		8	Front of room 0803	Normal	17/05/2026	
63		8	Front of room 0809	Normal	17/05/2026	
64		8	Front of room 0815	Normal	17/05/2026	
65		8	Electrical Room	Normal	17/05/2026	
66		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/05/2026	
67		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/05/2026	
68		9	Service Lifts	Normal	17/05/2026	
69		9	Front of room 0903	Normal	17/05/2026	
70		9	Front of room 0909	Normal	17/05/2026	
71		9	Front of room 0915	Normal	17/05/2026	
72		9	Electrical Room	Normal	17/05/2026	
73		10	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/05/2026	
74		10	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/05/2026	
75		10	Service Lifts	Normal	17/05/2026	






76		10	Front of room 1003	Normal	17/05/2026	
77		10	Front of room 1009	Normal	17/05/2026	
78		10	Front of room 1015	Normal	17/05/2026	
79		10	Electrical Room	Normal	17/05/2026	
80		11	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/05/2026	
81		11	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/05/2026	
82		11	Service Lifts	Normal	17/05/2026	
83		11	Front of room 1103	Normal	17/05/2026	
84		11	Front of room 1109	Normal	17/05/2026	
85		11	Front of room 1115	Normal	17/05/2026	
86		11	Electrical Room	Normal	17/05/2026	
87		12	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/05/2026	
88		12	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/05/2026	
89		12	Service Lifts	Normal	18/05/2026	
90		12	Front of room 1203	Normal	18/05/2026	
91		12	Front of room 1209	Normal	18/05/2026	
92		12	Front of room 1215	AbNormal	18/05/2026	ไม่สามารถใช้งานได้
93		12	Electrical Room	Normal	18/05/2026	
94		14	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/05/2026	


95		14	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/05/2026	
96		14	Service Lifts	Normal	18/05/2026	
97		14	Front of room 1403	Normal	18/05/2026	
98		14	Front of room 1409	Normal	18/05/2026	
99		14	Front of room 1415	Normal	18/05/2026	
100		14	Electrical Room	Normal	18/05/2026	
101		15	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/05/2026	
102		15	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/05/2026	
103		15	Service Lifts	Normal	18/05/2026	
104		15	Front of room 1503	Normal	18/05/2026	
105		15	Front of room 1509	Normal	18/05/2026	
106		15	Front of room 1515	Normal	18/05/2026	
107		15	Electrical Room	Normal	18/05/2026	
108		16	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/05/2026	
109		16	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/05/2026	
110		16	Service Lifts	Normal	18/05/2026	
111		16	Front of room 1603	Normal	18/05/2026	
112		16	Front of room 1609	Normal	18/05/2026	
113		16	Front of room 1615	Normal	18/05/2026	

114		16	Electrical Room	Normal	18/05/2026	
115		17	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/05/2026	
116		17	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/05/2026	
117		17	Service Lifts	Normal	18/05/2026	
118		17	Front of room 1703	Normal	18/05/2026	
119		17	Front of room 1709	Normal	18/05/2026	
120		17	Front of room 1715	AbNormal	18/05/2026	ไม่สามารถใช้งานได้
121		17	Electrical Room	Normal	18/05/2026	
122		18	Fire Exit Stair ST1	Normal	05/12/2026	
123		18	Fire Exit Stair ST2	Normal	05/12/2026	
124		18	Service Lifts	Normal	05/12/2026	
125		18	Front of room 1803	Normal	05/12/2026	
126		18	Front of room 1809	Normal	05/12/2026	
127		18	Front of room 1815	Normal	05/12/2026	
128		18	Electrical Room	Normal	05/12/2026	
129		19	Fire Exit Stair ST1	Normal	05/12/2026	
130		19	Fire Exit Stair ST2	Normal	05/12/2026	
131		19	Service Lifts	Normal	05/12/2026	
132		19	Front of room 1903	Normal	05/12/2026	

133		19	Front of room 1909	Normal	05/12/2026	
134		19	Front of room 1915	Normal	05/12/2026	
135		19	Electrical Room	Normal	05/12/2026	
136		20	Fire Exit Stair ST1	Normal	05/12/2026	
137		20	Fire Exit Stair ST2	Normal	05/12/2026	
138		20	Service Lifts	Normal	05/12/2026	
139		20	Front of room 2003	Normal	05/12/2026	
140		20	Front of room 2009	Normal	05/12/2026	
141		20	Front of room 2015	Normal	05/12/2026	
142		20	Electrical Room	Normal	05/12/2026	
143		21	Fire Exit Stair ST1	Normal	05/12/2026	
144		21	Fire Exit Stair ST2	Normal	05/12/2026	
145		21	Service Lifts	Normal	05/12/2026	
146		21	Front of room 2103	Normal	05/12/2026	
147		21	Front of room 2109	Normal	05/12/2026	
148		21	Front of room 2115	Normal	05/12/2026	
149		21	Electrical Room	Normal	05/12/2026	
150		22	Fire Exit Stair ST1	Normal	05/12/2026	
151		22	Fire Exit Stair ST2	Normal	05/12/2026	

152		22	**Service Lifts**	Normal	05/12/2026	
153		22	**Front of room 2203**	Normal	05/12/2026	
154		22	**Front of room 2209**	Normal	05/12/2026	
155		22	**Front of room 2215**	Normal	05/12/2026	
156		22	**Electrical Room**	Normal	05/12/2026	
157		23	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	18/05/2026	
158		23	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	18/05/2026	
159		23	**Service Lifts**	Normal	18/05/2026	
160		23	**Front of room 2303**	Normal	18/05/2026	
161		23	**Front of room 2309**	Normal	18/05/2026	
162		23	**Front of room 2315**	Normal	18/05/2026	
163		23	**Electrical Room**	Normal	18/05/2026	
164		24	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	18/05/2026	
165		24	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	18/05/2026	
166		24	**Service Lifts**	Normal	18/05/2026	
167		24	**Front of room 2403**	Normal	18/05/2026	
168		24	**Front of room 2409**	Normal	18/05/2026	
169		24	**Front of room 2415**	Normal	18/05/2026	
170		24	**Electrical Room**	Normal	18/05/2026	

171		25	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/05/2026	
172		25	Fire Exit Stair ST2	Normal	18/05/2026	
173		25	Service Lifts	Normal	18/05/2026	
174		25	Front of room 2503	Normal	18/05/2026	
175		25	Front of room 2509	Normal	18/05/2026	
176		25	Front of room 2515	Normal	18/05/2026	
177		25	Electrical Room	Normal	18/05/2026	
178		26	Service Lifts	Normal	18/05/2026	
179		26	Bathroom Male	Normal	18/05/2026	
180		26	Bathroom Female	Normal	18/05/2026	
181		26	Fire Exit Stair ST1	Normal	18/05/2026	
182		26	Fire Exit Stair ST2	AbNormal	18/05/2026	ไม่สามารถใช้งานได้
183		26	Electrical Room Inside SIRIVIT I	Normal	18/05/2026	
184		26	Inside SIRIVIT I	Normal	18/05/2026	
185		26	Front of SIRIVIT I	Normal	18/05/2026	
186		26	Front of SIRIVIT II (2)	Normal	18/05/2026	
187		26	Inside SIRIVIT II	Normal	18/05/2026	
188		26	Frontlift Service	Normal	18/05/2026	
189		RT	Service Lifts	Normal	18/05/2026	

190		RT	**In Booster Pump Room**	Normal	18/05/2026	
191		RT	**Front Booster Pump Room**	Normal	18/05/2026	
192		RT	**In front of the elevator**	Normal	18/05/2026	
193		RT	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	18/05/2026	
194		RT	**Inside Pressurized room**	Normal	18/05/2026	
195		RT	**Front of cooling room**	Normal	18/05/2026	
196		RT	**Inside hall front of room**	Normal	18/05/2026	

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	20/พฤษภาคม/2569
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/พฤษภาคม/2569	

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: May MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / จุกเอ็นชนิดดึงช่างหมัง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่ตู้ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY JUNE 2026						TYPE						Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d	CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE		
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		SARAYUT
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		SARAYUT
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		SARAYUT
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		SARAYUT
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		SARAYUT
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		SARAYUT
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		SARAYUT
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		SARAYUT
TOTAL								29	31	2	2	3			

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Supervisor Security


Security Manager

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

											17/มิถุนายน/2569
Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	หมายเหตุ
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	17/มิถุนายน/2569	

Equipment Inventory Checklist JUNE 2026

No.	Pictures	Item	Quantity	Condition	Remark
1		Automated External Defibrillator (AED)	1	Normal	
2		First Aid Box	8	Normal	
3		Manual respirator	1	Normal	
4		Flashlight	1	Normal	
5		Gun handle fire sprinkler	1	Normal	
6		Fire Phone	1	Normal	
7		Stretcher	1	Normal	
8		Megaphone	1	Normal	
9		Fire Axe	1	Normal	

10		Fire Crowbar	1	Normal	
11		Fire Helmet	2	Normal	
12		Firefighting Gloves	2	Normal	
13		Firefighter Shirt	2	Normal	
14		Firefighter Pants	2	Normal	
15		Fire Shoes	2	Normal	
16		Fire Fighting Cabinet	1	Normal	
17		Fire Hose	27	Normal	
18		Fire Hose	27	Normal	
19		Fire Hose Cabinet	27	Normal	

20		Dry Chemical Fire Extinguishel	31	Normal	
21		CO2 Fire Extinguisher	29	Normal	
22		Water-Based Chemical Fire Extinguisher	2	Normal	
23		Foam Fire Extinguisher	2	Normal	
24		Fire Blanket	3	Normal	
25		Traffic Cone	47	Normal	
26		fiberglass lifebuoy	1	Normal	
27		Fire Hydrants	6	Normal	
28		Life-Saving Hook	1	Normal	

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: June MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / จุกเอ็นชนิดดึงช่างหมัง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ที่ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่ตู้ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

สำเนารับรองการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

สำเนาเอกสารการใช้น้ำ การล้างถังน้ำใช้ และการตรวจสอบระบบท่อน้ำประปา

Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

CLEANING ROOF TANK & UNDERGROUND TANK

REPORT

A	20/2/2026	AKE	Issue for Approval	AKE	TS	AKE SERVICE
REV	**DATE**	**BY**	**DESCRIPTION**	**CHECK**	**APPR**	**COMPANY**

TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION AND/OR UTILIZATION OF THIS DOCUMENT ARE FORBIDDEN WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION OF THE OWNER

AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

AKE SERVICE CO., LTD.

16/58 Moo.11 Khlong Sam Subdistrict, Khlong Luang District Pathum Thani Province 12120 Tel. 095-556-5781, E-Mail: akeservicecompany@gmail.com

DOCUMENT NO.	OWNER DOCUMENT NO.	REV	STATUS
AKE-RP-2026016		A	

AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

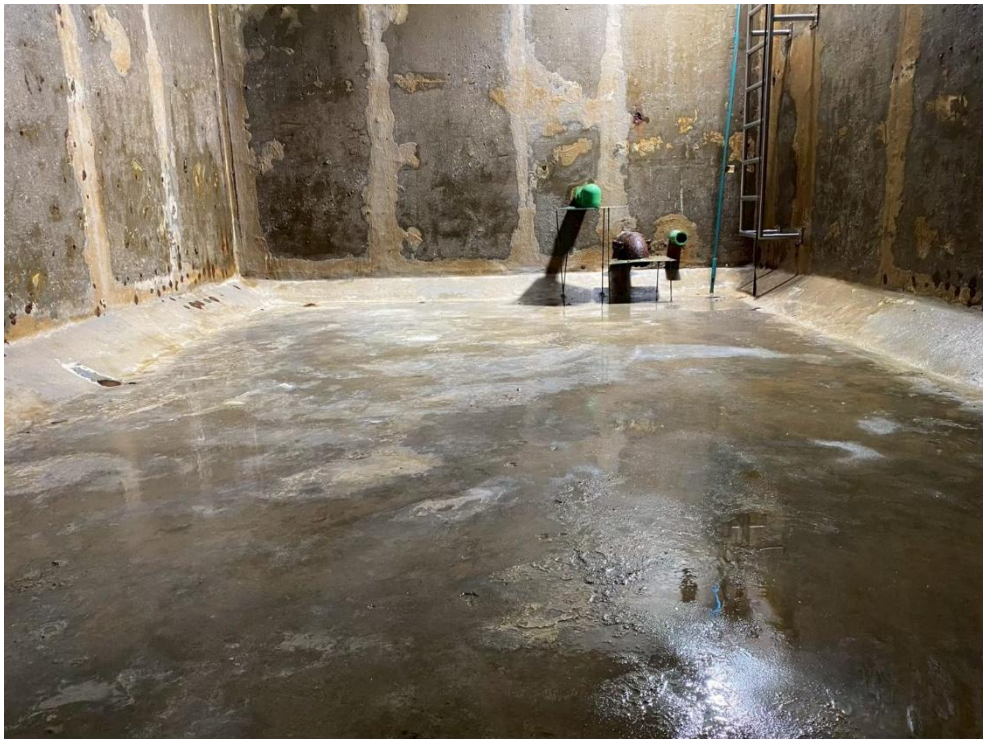
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

CLEANING ROOF TANK

AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

After Cleaning





AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

After Cleaning





AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

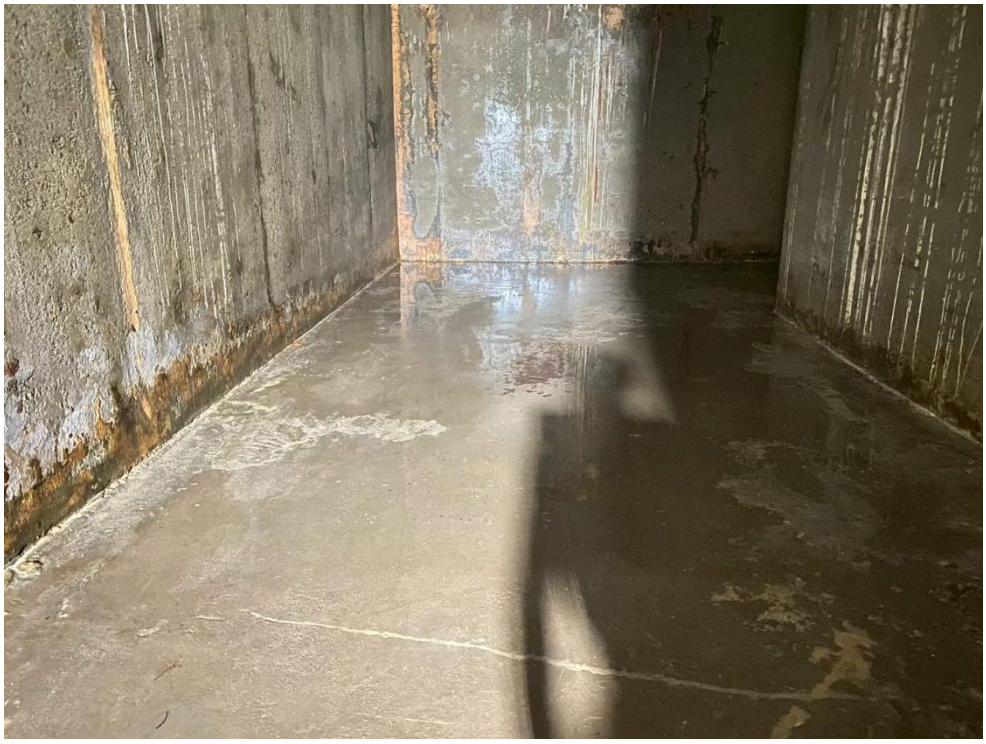
CLEANING UNDERGROUND TANK

AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

After Cleaning





AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

After Cleaning





AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

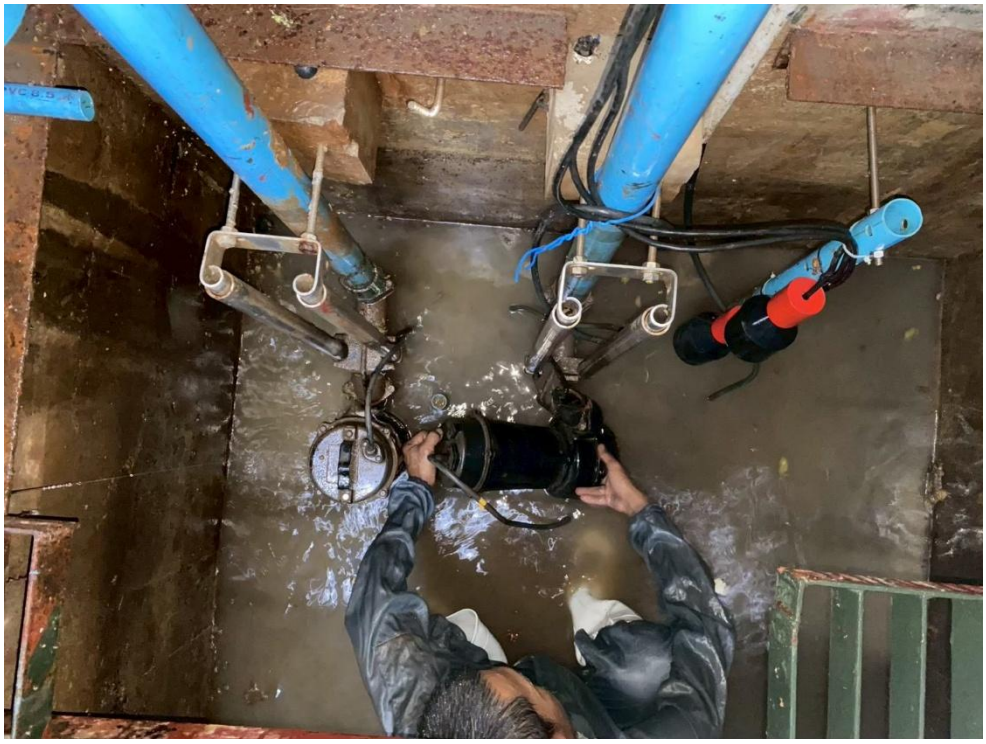
REMOVE SAND IN SUMP PUMP

AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

While working





AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

While working





AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

Calibration Gas Detector

electric saenchote instrument

Saenchote Electric Instrument Co., Ltd.

36/206 Moo 14, Tumbol Klongnueng, Amphur Klongluang, Pathumthani 12120
Tel. +66 2193-3433 Fax. +66 2193-2438 www.thaigassei.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 24C1835 Page 1 of 2

Submitted by : บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Equipment :	Portable Gas Detector		
ID No. :	n/a		
Model :	POLI MP400P		
Serial No. :	M00403003179	Calibration Laboratory :	Saenchote Electric Instruments Co., Ltd.
Manufacturer :	nPower Electronics Inc.	Detector Gas :	CO | H2S | O2 | LEL
Received Date :	25 Jul 24	Ambient Temperature :	(23 ± 5) °C
Calibration Date :	25 Jul 24	Relative Humidity :	(50 ± 20) %

Procedure used : Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-7.2-01 by comparing its reading with the Certified Reference Materials

Thailand Reference Material :

Instrument	Certificate No.	Due Date	Traceable to
Nitrogen	KBH-N2-1	10 Sep 27	GASCO
Oxygen	KBH-161-20.9-1	10 Sep 27	GASCO
Carbon Monoxide	KBH-174-100-6	1 Sep 26	GASCO
Mixtures 3 Gas	CG-6082-23	5 Jul 25	NIMT

Metrological Traceability :
This certificate provides traceability of certified values to recognized national standards, and to the realization of the International System of Units (SI).
*The reported measurement result related only to the measurement and applies only at the time of measurement.

Calibrated by : Kittisak Manoket
Issue Date : 26 Jul 24

Approved by : _____
Pornapong Chotisak
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced other than in full except with prior written approval of the Saenchote Electric Instrument Co., Ltd.

สำเนาบันทึก พีเอช และคลอรีน สระว่ายน้ำ Check List Swimming Pool

ibis STYLES
Bangkok Sukhumvit Pera Khaosan

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : JANUARY 2026

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]
2	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]
3	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	0.6	7.8	[illegible]
4	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
5	3.0	8.2	[illegible]	3.0	3.0	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]
6	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]
7	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]
8	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
9	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
10	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
11	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]
12	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
13	1.5	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	0.2	7.2	[illegible]
14	3.0	8.2	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
15	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
16	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	0.5	7.6	[illegible]
17	3.0	8.2	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	0.2	7.8	[illegible]
18	3.0	8.2	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]	0.2	7.8	[illegible]
19	1.5	7.8	[illegible]	1.0	7.4	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
20				1.0	7.4	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
21	3.0	8.2	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]			
22	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
23	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
24	3.0	8.2	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]
25	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	1.5	8.2	[illegible]
26	3.0	8.2	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]
27	3.0	8.2	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]
28				1.0	7.8	[illegible]	1.5	8.2	[illegible]
29				1.0	7.8	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
30				0.5	7.8	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
31				1.0	8.2	[illegible]	0.0	8.2	[illegible]

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : FEBRUARY 2026

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1				1.5	8.2	ธนากร	1.5	8.2	พัชรพล
2				1.5	8.2	ทีมงาน	1.5	8.2	พัชรพล
3				1.5	8.2	ทีมงาน	2.5	8.2	พัชรพล
4				1.5	8.2	ทีมงาน	2.5	8.2	พัชรพล
5				2.0	7.6	ธนากร	3.0	8.2	ทีมงาน
6				1.5	7.8	ธนากร	3.0	8.2	ทีมงาน
7				2.0	8.2	ธนากร	0.0	6.2	พัชรพล
8				1.0	7.8	ธนากร	0.2	7.8	พัชรพล
9				1.0	7.8	ทีมงาน	0.6	7.8	พัชรพล
10				1.0	7.8	ทีมงาน	1.0	7.2	พัชรพล
11				1.0	7.8	ทีมงาน	1.0	7.6	พัชรพล
12				0.5	7.8	ธนากร	3.0	7.8	ทีมงาน
13				1.5	7.8	ธนากร	3.0	7.8	ทีมงาน
14				2.0	7.8	ธนากร	0.2	8.2	พัชรพล
15				0.5	7.8	ธนากร	0.6	8.2	พัชรพล
16				1.0	7.8	ทีมงาน	1.0	8.2	พัชรพล
17				1.0	7.8	ทีมงาน	1.5	8.2	พัชรพล
18				1.0	7.8	ทีมงาน	1.5	8.2	พัชรพล
19				1.0	7.8	ธนากร	3.0	7.8	ทีมงาน
20				1.5	7.8	ธนากร	3.0	7.8	ทีมงาน
21				2.0	7.8	ธนากร	0.2	8.2	พัชรพล
22				1.0	7.8	ธนากร	1.5	8.2	พัชรพล
23				1.0	8.2	ธนากร	0.2	8.2	พัชรพล
24				1.0	8.2	ธนากร	1.5	8.2	พัชรพล
25							1.5	8.2	พัชรพล
26							1.0	8.2	ธนากร
27							1.5	8.2	ธนากร
28									
							0.0	8.2	พัชรพล

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ibis STYLES
Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : MARCH 2026

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1				0.5	8.2	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
2				1.0	7.8	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
3				1.0	7.8	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
4	1.5	8.2	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]	0.2	7.2	[illegible]
5				0.5	7.6	[illegible]	0.2	7.8	[illegible]
6				0.5	7.8	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
7				1.0	7.8	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
8				0.1	8.2	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
9				1.5	7.8	[illegible]	2.0	8.2	[illegible]
10	2.0	8.2	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]
11	3.0	8.2	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
12	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
13	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
14				2.0	7.8	[illegible]	0.1	7.6	[illegible]
15				1.0	7.6	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]
16				1.5	7.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
17	3.0	7.8	[illegible]	1.2	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
18	3.0	7.8	[illegible]	1.2	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
19	3.0	7.8	[illegible]	0.2	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
20				1.0	7.6	[illegible]	0.6	7.8	[illegible]
21				1.2	7.6	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
22				1.0	7.2	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]
23				1.0	7.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
24				1.2	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
25	1.5	7.8	[illegible]	1.5	78	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
26	3.0	7.8	[illegible]			[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
27				1.5	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
28	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
29	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
30	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	1.5	8.2	[illegible]
31				1.5	7.8	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : APRIL 2026

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	1.5	7.2		1.5	7.8		1.0	7.8	
2	1.5	7.2		1.0	7.6		3.0	7.8	
3				1.5	7.8		3.0	7.8	
4				1.0	7.6		0.2	7.8	
5							0.0	8.2	
6				1.0	7.6		0.6	8.2	
7				1.0	7.6		0.2	7.8	
8	1.5	7.2		1.0	7.6		0.6	7.8	
9	1.5	7.2		1.0	7.0		1.0	7.8	
10	1.5	7.2		0.5	7.6		1.0	7.8	
11	1.5	7.2		0.5	7.6		0.1	7.6	
12	1.5	7.2		1.0	7.6		3.0	7.6	
13	1.5	7.2		1.5	7.6		1.5	7.8	
14	1.5	7.2		1.5	7.6		1.5	7.6	
15				1.0	7.2		1.5	7.6	
16				1.2	7.6		1.5	7.6	
17	1.5	7.6		1.0	7.2		0.6	7.6	
18	1.5	7.6		1.0	7.6		0.1	7.6	
19	1.5	7.6		1.0	7.6		1.5	7.6	
20	1.5	7.6		1.0	7.6		1.6	7.6	
21	1.5	7.6		1.0	7.6		1.5	7.6	
22	1.5	7.6		1.0	7.6		1.5	7.6	
23	1.5	7.2		1.0	7.6		1.5	7.6	
24	1.5	7.6		0.5	7.2		1.5	7.6	
25	1.5	7.6		0.5	7.2		0.0	7.6	
26	1.5	7.6		0.5	7.6		1.5	7.2	
27				1.5	7.6		1.0	7.2	
28				1.0	7.2		1.0	7.2	
29	1.5	7.6		1.0	7.2		1.5	7.2	
30	1.5	7.2		1.0	7.2		1.5	7.8	

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ibis STYLES

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : MAY 2026

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	1.0	7.2	ฝน	1.0	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
2	1.0	7.2	ฝน				0.0	7.2	ศุภกิตติ์
3	1.0	7.2	ฝน				1.5	7.6	ศุภกิตติ์
4	1.0	7.2	ฝน				1.5	7.6	ก้องศักดิ์
5	1.0	7.2	ฝน				1.5	7.6	ก้องศักดิ์
6	1.0	7.2	ภัทร				1.5	7.6	ก้องศักดิ์
7	1.0	7.2	ภัทร	0.5	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
8	1.5	7.2	ภัทร	0.5	6.8	ศุภกิตติ์	1.5	7.6	ก้องศักดิ์
9	1.0	7.2	ฝน				1.5	7.2	ศุภกิตติ์
10	0.0	7.2	ฝน				1.0	7.2	ศุภกิตติ์
11	1.0	7.2	ฝน	0.6	7.2	ภัทร	1.5	7.6	ศุภกิตติ์
12	1.0	7.2	ฝน	1.5	7.2	ภัทร	1.0	7.6	ศุภกิตติ์
13	1.0	7.2	ฝน	1.5	7.2	ภัทร	1.5	7.6	ก้องศักดิ์
14				0.6	6.8	ภัทร	1.5	7.6	ก้องศักดิ์
15				0.5	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.6	ก้องศักดิ์
16	1.5	7.6	ฝน	1.0	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.6	ก้องศักดิ์
17	1.5	7.6	ฝน	1.0	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.6	ก้องศักดิ์
18	1.5	7.6	ฝน	0.6	7.6	ภัทร	0.5	7.2	ศุภกิตติ์
19	1.5	7.6	ฝน				1.0	7.6	ศุภกิตติ์
20	1.5	7.6	ฝน	1.0	7.2	ภัทร	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
21	1.5	7.6	อินทิน	1.0	7.6	ภัทร	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
22	1.5	7.6	อินทิน	0.2	7.6	ภัทร	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
23	1.5	7.2	ฝน	0.5	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.6	ก้องศักดิ์
24	1.5	7.2	ฝน	1.0	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
25	1.5	7.2	ฝน	0.2	7.2	ภัทร	0.2	7.2	ศุภกิตติ์
26	1.5	7.2	ฝน	0.6	7.2	ภัทร	1.0	7.2	ศุภกิตติ์
27	1.0	7.2	ฝน	0.6	7.2	ภัทร	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
28	1.5	7.6	อินทิน	0.6	7.2	ภัทร	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
29				1.0	7.2	ภัทร	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
30	1.5	7.2	ฝน	1.0	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.2	ก้องศักดิ์
31	1.5	7.2	ฝน	1.0	7.2	ศุภกิตติ์	1.5	7.2	ก้องศักดิ์

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : JUNE 2026

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
2	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	เกษตร
3	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	6.8	ณ	1.5	7.6	เกษตร
4	1.5	7.2	วินาวิน	1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	วิทย์.
5				1.5	7.6	ณ	1.5	7.6	วิทย์.
6	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
7	1.5	7.2	ฝ้า			เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
8	1.5	7.6	ฝ้า			เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
9	1.5	7.6	ฝ้า	1.5	7.2	ณ	1.5	7.6	เกษตร
10	1.5	7.6	ฝ้า	1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	เกษตร
11	1.5	7.6	วินาวิน	1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	วิทย์.
12	1.5	7.6	วินาวิน				1.5	7.6	วิทย์.
13	1.5	7.6	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
14	1.5	7.6	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
15	1.5	7.6	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
16	1.5	7.6	ฝ้า	1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	เกษตร
17	1.5	7.6	ฝ้า	1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	เกษตร
18				1.0	7.6	ณ	1.5	7.6	วิทย์.
19				1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	วิทย์.
20				1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
21				1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
22	1.5	7.6	ณ	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
23	1.5	7.2	ฝ้า	0.2	7.6	ณ	1.5	7.8	เกษตร
24	1.5	7.2	ฝ้า	1.5	7.6	ณ	1.5	7.8	เกษตร
25	1.5	7.6	ฝ้า	0.5	7.2	ณ	1.5	7.6	วิทย์.
26							1.5	7.6	วิทย์.
27	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.6	วิทย์.
28	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.2	วิทย์.
29	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	7.2	เกษตร	1.5	7.2	วิทย์.
30	1.5	7.2	ฝ้า	1.0	7.2	ณ	1.5	7.6	เกษตร

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการขนย้ายมูลฝอย



ที่ กท ๗๒๐๖/ ๓๙๐

สำนักงานเขตคลองเตย
๕๙๙ สามแยกกล้วยน้ำไท กทม.๑๐๑๑๐

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย

เรียน โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ดูแลอาคารสถานที่ เลขที่ 1122 ซอย ..... ถนน สุขุมวิท

แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าเช็คที่รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเช็คลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้นหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้ สำนักงานเขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอยจากบ้าน/อาคารเลขที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมูลฝอยไม่เกิน 1,000 ☑ลิตร/วัน ☐ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป อัตราเดือนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยทั่วไป อัตราเดือนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียมฯ เดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

ประจำเดือน ต.ค.68 - ก.ย.69 รวมเป็นเงิน 72,000 (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอให้ท่านชำระค่าธรรมตามรายการดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย

๒. เช็คขีดคร่อมและสั่งจ่ายในนาม " กรุงเทพมหานคร "

๓. ชำระผ่านระบบ Mobile Bankking

๔. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

๕. ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

828100 38000
Remote 6800
Prepaid 27,200

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทวน เพ็ชรตะกั่ว)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร.๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๖

098-990-9922

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900014509
วันที่ 17 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต คลองเตย โทร 0 2240 2121, 0 2249 9705
ที่อยู่สำนักงานเขต 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิทพระโขนง
ที่อยู่ เลขที่ 1122 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	36,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	36,000
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	72,000

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	6,000	เม.ย.	6,000
พ.ย.	6,000	พ.ค.	6,000
ธ.ค.	6,000	มิ.ย.	6,000
ม.ค.	6,000	ก.ค.	6,000
ก.พ.	6,000	ส.ค.	6,000
มี.ค.	6,000	ก.ย.	6,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

นาย ปัทเมธ สิงห์สุวรรณ
ผู้รับเงิน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 42752476
ธนาคาร (Bank) ธ. กรุงศรีอยุธยา - สาขา299-สาขาราชวงศ์

พิมพ์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 10:40 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900014509
วันที่ 17 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต คลองเตย โทร 0 2240 2121, 0 2249 9705
ที่อยู่สำนักงานเขต 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิทพระโขนง
ที่อยู่ เลขที่ 1122 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	36,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	36,000
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	72,000

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	6,000	เม.ย.	6,000
พ.ย.	6,000	พ.ค.	6,000
ธ.ค.	6,000	มิ.ย.	6,000
ม.ค.	6,000	ก.ค.	6,000
ก.พ.	6,000	ส.ค.	6,000
มี.ค.	6,000	ก.ย.	6,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

นาย ปัทเมธ สิงห์สุวรรณ
ผู้รับเงิน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 42752476
ธนาคาร (Bank) ธ. กรุงศรีอยุธยา - สาขา299-สาขาราชวงศ์

พิมพ์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 10:40 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน

AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)

16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)

Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480

LINE ID : 0924411480

E-mail : akeservicecompany@gmail.com

สำหรับลูกค้า

ไม่ใช่ใบกำกับภาษี	
เลขที่/NO.	202601008
วันที่/DATE	1/15/2026

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ORIGINAL RECEIPT

ลูกค้า / CUSTOMER : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.** 1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555001095 (Head Office)	สถานที่ส่งของ/DELIVERY TO : Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN	เงื่อนไข TERM	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
	PO202601-00122	เอก แก้วงาม	CASH	

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Pumping service/Stool pond and Grease Trap ต/2ล	1	3,000.00	3,000.00

Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong
RECEIVED
No. PO. .....
Dept. .....
Charge to A/C .....
Sign .....
Date 16/1/69

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	3,000.00
ส่วนลด DISCOUNT	-
รวม TOTAL	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX	210.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	3,210.00

หมายเหตุ
- เอกสารนี้จะสมบูรณ์ได้จะต้องมีลายเซ็นต์ผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับของบริษัทฯ เท่านั้น
- สินค้าตามรายการข้างต้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- หากชำระเงินเกินกว่ากำหนด จะต้องเสียดอกเบี้ย 1.50 % ต่อเดือน
- กรณีชำระโดยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ☐ เงินสด ☐
เลขที่ ..... วันที่.....
ธนาคาร..... สาขา.....
ผู้รับเงิน..... เอก แก้วงาม
วันที่...../...../.....

หัก ณ ที่จ่าย
☐ หัก เลขที่ .....
☐ ไม่หัก

ในนามบริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
เอก แก้วงาม
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
AKE SERVICE COMPANY LIMITED
AUTHORIZED SIGNATURE

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei,
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

ORIGINAL

Supplier AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel: 095 5565781
Fax:

PO No. PO202601-00122
PR No. i26-58802
Delivery to: Engineering
Order Date: 09.01.2026
Delivery Date: 12.01.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : Credit 30 Days

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	502008 Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	3,000.00	0%	3,000.00	3,000.000

Total Before Disc.	3,000.00
Total Discount	0.00
Sub Total	3,000.00
Total VAT	210.00
Total Amount	3,210.00

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.

Thanjira Srinakorn
(Assistant Purchasing Manager)

Areerat Panpram
(Finance Controller)

Piyada Anyoo
(General Manager)

AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 202601008

Order No.: PO202601-00122
Receipt No.: 000275

Date : 16.01.202(
Invoice Date : 16.01.202(

Deliv.Loc: Engineering

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	502008	Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	1.00	0%	3,000.00	3,000.00	210.00

Total: Engineering

Total Value Discount Per Item	*0.00*	THB
System Currency	3,000.00	THB
Supplier Currency	3,000.00	THB

Grand Total Net	**3,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**3,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**210.00**	**THB**
Grand Total Gross	**3,210.00**	**THB**

Received By :..... Department By :..... Cost Controller By :.....

Date : ..... Date : ..... Date : .....

Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, Pf-Deposit, Z-add. Position

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)

16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)

Mobile : 095-556-5781, 002-111-1480

LINE ID : 0924411480

E-mail : akeservicecompany@gmail.com

สำหรับลูกค้า

ไม่ใช่ใบกำกับภาษี	
เลขที่/NO.	202602026
วันที่/DATE	2/4/2026

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ORIGINAL RECEIPT

ลูกค้า / CUSTOMER : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.**
1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei,
Bangkok, Thailand 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555001095 (Head Office)

สถานที่ส่งของ/DELIVERY TO :
Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN	เงื่อนไข TERM	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
	PO202602-00607	เอก แก้วงาม	CASH	

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Pumping service/Stool pond and Grease Trap 02/26	1	3,000.00	3,000.00

ibis STYLES
Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong
RECEIVED
No. PO. .....
Dept. .....
Charge to A/C .....
Sign .....
Date 23/2/26

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

	รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	3,000.00
	ส่วนลด DISCOUNT	-
	รวม TOTAL	3,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX	210.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	3,210.00

หมายเหตุ
- เอกสารนี้จะสมบูรณ์ได้จะต้องมีลายเซ็นต์ผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับของบริษัทฯ เท่านั้น
- สินค้าตามรายการข้างต้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- หากชำระเงินเกินกว่ากำหนด จะต้องเสียดอกเบี้ย 1.50 % ต่อเดือน
- กรณีชำระโดยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

ระโดย ☐ เงินสด ☐
ขที่ ..... วันที่.....
าคาร..... สาขา.....
บเงิน..... เอก แก้วงาม .....
ที่...../...../.....

หัก ณ ที่จ่าย
☐ หัก เลขที่ .....
☐ ไม่หัก

ในนามบริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
เอก แก้วงาม
AKE SERVICE COMPANY LIMITED
AUTHORIZED SIGNATURE
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei.
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES HOTELS
Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล เวนเจอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

ORIGINAL

Supplier AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel: 095 5565781
Fax:

PO No. PO202602-00607
PR No. i26-59592
Delivery to: Engineering
Order Date: 02.02.2026
Delivery Date: 06.02.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : Credit 30 Days

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	502008 Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	3,000.00	0%	3,000.00	3,000.000

Total Before Disc.	3,000.00
Total Discount	0.00
Sub Total	3,000.00
Total VAT	210.00
Total Amount	3,210.00

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.

Thanjira Srinakorn
(Assistant Purchasing Manager)

Areerat Panpram
(Finance Controller)

Piyada Anyoo
(General Manager)

AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 202602026

Order No.: PO202602-00607
Receipt No.: 001043

Date : 23.02.2026
Invoice Date : 23.02.2026

Deliv.Loc: Engineering

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	502008	Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	1.00	0%	3,000.00	3,000.00	210.00

Total: Engineering

Total Value Discount Per Item	*0.00*	THB
System Currency	3,000.00	THB
Supplier Currency	3,000.00	THB

Grand Total Net	**3,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**3,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**210.00**	**THB**
Grand Total Gross	**3,210.00**	**THB**

Received By :.....
Date : .....

Department By :.....
Date : .....

Cost Controller By :.....
Date : .....

Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, Pf-Deposit, Z-add. Position

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
LINE ID : 0924411480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

สำหรับลูกค้า

ไม่ใช่ใบกำกับภาษี

เลขที่/NO.	202603081
วันที่/DATE	3/18/2026

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ORIGINAL RECEIPT

ลูกค้า / CUSTOMER : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.**
1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei,
Bangkok, Thailand 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555001095 (Head Office)

สถานที่ส่งของ/DELIVERY TO :
Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN	เงื่อนไข TERM	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
	PO202603-01291	เอก แก้วงาม	CASH	

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Pumping service/Stool pond and Grease Trap 03/26	1	3,000.00	3,000.00

ibis STYLES Bangkok Sukhumvit Phra Khanong
RECEIVED
No. PO. .....
Dept. .....
Charge to A/C .....
Sign .....
Date 31/3/26

ได้รับใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
จัดเก็บ..... Mar 21

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

	รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	3,000.00
	ส่วนลด DISCOUNT	-
	รวม TOTAL	3,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX	210.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	3,210.00

หมายเหตุ
- เอกสารนี้จะสมบูรณ์ได้จะต้องมีลายเซ็นต์ผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับของบริษัทฯ เท่านั้น
- สินค้าตามรายการข้างต้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- หากชำระเงินเกินกว่ากำหนด จะต้องเสียดอกเบี้ย 1.50 % ต่อเดือน
- กรณีชำระโดยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ☐ เงินสด ☐
เลขที่ ..... วันที่.....
ธนาคาร..... สาขา.....
ผู้รับเงิน..... ไอก แก้วงาม
วันที่...../...../.....

หัก ณ ที่จ่าย
☐ หัก เลขที่ .....
☐ ไม่หัก

ในนามบริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
AUTHORIZED SIGNATURE

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei,
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES HOTELS
Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล เวนเจอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

ORIGINAL

Supplier AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel: 095 5565781
Fax:

PO No. PO202603-01291
PR No. i26-60595
Delivery to: Engineering
Order Date: 04.03.2026
Delivery Date: 06.03.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : Credit 30 Days

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	502008 Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	3,000.00	0%	3,000.00	3,000.000

Total Before Disc.	3,000.00
Total Discount	0.00
Sub Total	3,000.00
Total VAT	210.00
Total Amount	3,210.00

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.

Thanjira Srinakorn
(Assistant Purchasing Manager)

Areerat Panpram
(Finance Controller)

Piyada Anyoo
(General Manager)

AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

RECEIVING RECORD

PAID

Invoice No.: 202603081

Order No.: PO202603-01291
Receipt No.: 001804

Date : 31.03.2026
Invoice Date : 31.03.2026

Deliv.Loc: Engineering

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	502008	Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	1.00	0%	3,000.00	3,000.00	210.00

Total:	Engineering	Total Value Discount Per Item	*0.00*
		System Currency	3,000.00 THB
		Supplier Currency	3,000.00 THB

Grand Total Net	**3,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**3,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**210.00**	**THB**
Grand Total Gross	**3,210.00**	**THB**

Received By :.....
Date : .....

Department By :.....
Date : .....

Cost Controller By :.....
Date : .....

Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, Pf-Deposit, Z-add. Position

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
LINE ID : 0924411480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

สำหรับลูกค้า

ไม่ใช่ใบกำกับภาษี	
เลขที่/NO.	202604120
วันที่/DATE	4/21/2026

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ORIGINAL RECEIPT

ลูกค้า / CUSTOMER : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.** 1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555001095 (Head Office)	สถานที่ส่งของ/DELIVERY TO : Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN	เงื่อนไข TERM	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
	PO202603-01291	เอก แก้วงาม	CASH	

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Pumping service/Stool pond and Grease Trap 04/26 ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong RECEIVED No. PO. ..... Dept. ..... Charge to A/C ..... Sign ..... Date 22/4/26	1	3,000.00	3,000.00

ได้รับใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
จัดเก็บ Apr'26

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	3,000.00
ส่วนลด DISCOUNT	-
รวม TOTAL	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX	210.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	3,210.00

หมายเหตุ
- เอกสารนี้จะสมบูรณ์ได้จะต้องมีลายเซ็นต์ผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับของบริษัทฯ เท่านั้น
- สินค้าตามรายการข้างต้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- หากชำระเงินเกินกว่ากำหนด จะต้องเสียดอกเบี้ย 1.50 % ต่อเดือน
- กรณีชำระโดยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ☐ เงินสด ☐
เลขที่ ..... วันที่.....
ธนาคาร..... สาขา.....
ผู้รับเงิน เอก แก้วงาม
วันที่...../...../.....

หัก ณ ที่จ่าย
☐ หัก เลขที่ .....
☐ ไม่หัก

ในนามบริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด
เอก แก้วงาม
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
AUTHORIZED SIGNATURE
AKE SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
LINE ID : 0924411480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

สำหรับลูกค้า

สำเนา/COPY

เลขที่/NO.	202604120
วันที่/DATE	21/04/2569

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / ADVICE OF PAYMENT /TAX INVOICE

ลูกค้า / CUSTOMER : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.** 1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : **0105555001095 (Head Office)**	สถานที่ส่งของ/DELIVERY TO : Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN	เงื่อนไข TERM	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
	PO202603-01291	เอก แก้วงาม	CASH	

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Pumping service/Stool pond and Grease Trap	1	3,000.00	3,000.00
	หัก ณ ที่จ่าย 3% = 90.00			

ibis styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong
RECEIVED
No. PO. .....
Dept. .....
Charge to A/C .....
Sign .....
Date 22/4/26

Apr'26

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	3,000.00
ส่วนลด DISCOUNT	
รวม TOTAL	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX	210.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	3,210.00

กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด หรือ
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดไท เลขที่ 156-8-88112-1
Please make A/C PAYEE NOLY AKE SERVICE COMPANY LIMITED
Or transfer to KASIKORN BANK account number 156-8-88112-1

ในนามบริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

ผู้รับของ	ผู้ส่งของ	ผู้ตรวจ	ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
	เอก แก้วงาม	วินวิน	เอก แก้วงาม
____/____/____	____/____/____	22/4/69	AUTHORIZED SIGNATURE

สำหรับ

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)

16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
LINE ID : 0924411480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

ต้นฉบับ/ORIGINAL

เอกสารส่งมอบงาน
Delivery Document

ชื่อลูกค้า : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.** 1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555001095 (Head Office)	เลขที่ **202604120** วันที่ **4/21/2026** Ref. No **PO202603-01291** สถานที่ทำงาน /Site To : **Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong** Contact Person Tel.

Description of Work	Amount
Pumping service/Stool pond and Grease Trap ibis styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong RECEIVED No. PO. Dept. Charge to Sign Date เข้าปฏิบัติงานวันที่ 22 / 04 / 2569	1 งาน Apr 26

ธนาวิน 22, 4, 69 ผู้รับมอบงาน วันที่ ธนาวิน	เอก แก้วสม __/__/__ ผู้ส่งมอบงาน วันที่

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei,
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES HOTELS
Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล เวนเจอร์ส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

ORIGINAL

Supplier AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel: 095 5565781
Fax:

PO No. PO202604-01823
PR No. i26-61391
Delivery to: Engineering
Order Date: 01.04.2026
Delivery Date: 03.04.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : Credit 30 Days

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	502008 Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	3,000.00	0%	3,000.00	3,000.000

Total Before Disc.	3,000.00
Total Discount	0.00
Sub Total	3,000.00
Total VAT	210.00
Total Amount	3,210.00

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.

Thanjira Srinakorn
(Assistant Purchasing Manager)

Areerat Panpram
(Finance Controller)

Piyada Anyoo
(General Manager)

AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 202604120

Order No.: PO202604-01823
Receipt No.: 002174

Date : 22.04.2026
Invoice Date : 22.04.2026

Deliv.Loc: Engineering

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	502008	Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	1.00	0%	3,000.00	3,000.00	210.00

Total: Engineering

Total Value Discount Per Item	*0.00*	THB
System Currency	3,000.00	THB
Supplier Currency	3,000.00	THB

Grand Total Net	**3,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**3,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**210.00**	**THB**
Grand Total Gross	**3,210.00**	**THB**

Received By :.....
Date : .....

Department By :.....
Date : .....

Cost Controller By :.....
Date : .....

Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, Pf-Deposit, Z-add. Position

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
LINE ID : 0924411480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

สำหรับลูกค้า

สำเนา/COPY	
เลขที่/NO.	202605183
วันที่/DATE	1/06/2569

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / ADVICE OF PAYMENT /TAX INVOICE

ลูกค้า / CUSTOMER : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.** 1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : **0105555001095 (Head Office)**	สถานที่ส่งของ/DELIVERY TO : Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN	เงื่อนไข TERM	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
	PO202605-02417	เอก แก้วงาม	CASH	

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Pumping service/Stool pond and Grease Trap 05/26	1	3,000.00	3,000.00
2	Deep Clean Septic Tank	1	28,000.00	28,000.00
	828100.			
	หัก ณ ที่จ่าย 3% = 930.00			

(สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	31,000.00
ส่วนลด DISCOUNT	
รวม TOTAL	31,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX	2,170.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	33,170.00

กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด หรือ
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดไท เลขที่ 156-8-88112-1
Please make A/C PAYEE NOLY **AKE SERVICE COMPANY LIMITED**
Or transfer to **KASIKORN BANK** account number 156-8-88112-1

ในนามบริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

ผู้รับของ	ผู้ส่งของ	ผู้ตรวจ	ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ AUTHORIZED SIGNATURE
____/____/____	เอก แก้วงาม ____/____/____	____/____/____	เอก แก้วงาม

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei,
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES

Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล เวนเจอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

ORIGINAL

Supplier AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel: 095 5565781
Fax:

PO No. PO202605-02417
PR No. i26-62186
Delivery to: Engineering
Order Date: 07.05.2026
Delivery Date: 11.05.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : Credit 30 Days

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	502008 Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	3,000.00	0%	3,000.00	3,000.000
2	502006 Deep Clean Septic Tank / งานสูบตะกอนหน้าลอย for waste water treatment plant.	1.00	Job	28,000.00	0%	28,000.00	28,000.000

Total Before Disc.	31,000.00
Total Discount	0.00
Sub Total	31,000.00
Total VAT	2,170.00
Total Amount	33,170.00

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.

Thanjira Srinakorn
(Assistant Purchasing Manager)

Areerat Panpram
(Finance Controller)

Piyada Anyoo
(General Manager)

AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 202605183

Order No.: PO202605-02417
Receipt No.: 003348

Date : 29.06.2026
Invoice Date : 29.06.2026

Deliv.Loc: Engineering

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	502008	Pumping service/Stool pond and Grease trap for waste water treatment plant.	1.00	Job	1.00	0%	3,000.00	3,000.00	210.00
--	502006	Deep Clean Septic Tank / งานสูบตะกอนหน้าลอย for waste water treatment plant.	1.00	Job	1.00	0%	28,000.00	28,000.00	1,960.00

Total:	Engineering	Total Value Discount Per Item	*0.00*	THB
		System Currency	31,000.00	THB
		Supplier Currency	31,000.00	THB

Grand Total Net	**31,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**31,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**2,170.00**	**THB**
Grand Total Gross	**33,170.00**	**THB**

Received By :..... Department By :..... Cost Controller By :.....

Date : ..... Date : ..... Date : .....

Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, Pf-Deposit, Z-add. Position

บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด (AKE SERVICE COMPANY LIMITED)
16/58 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135566013723 (สำนักงานใหญ่)
Mobile : 095-556-5781, 092-441-1480
LINE ID : 0924411480
E-mail : akeservicecompany@gmail.com

สำหรับลูกค้า

สำเนา/COPY	
เลขที่/NO.	202606218
วันที่/DATE	28/06/2569

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / ADVICE OF PAYMENT /TAX INVOICE

ลูกค้า / CUSTOMER : **Sirivit Apollo Ventures Co., Ltd.** 1122 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : **0105555001095 (Head Office)**	สถานที่ส่งของ/DELIVERY TO : Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN	เงื่อนไข TERM	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
	PO202606-03097	เอก แก้วงาม	CASH	

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Pumping service/Stool pond and Grease Trap 06/26	1	3,000.00	3,000.00
	หัก ณ ที่จ่าย 3% = 90.00			

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	3,000.00
ส่วนลด DISCOUNT	
รวม TOTAL	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX	210.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	3,210.00

กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด หรือ
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดไท เลขที่ 156-8-88112-1
Please make A/C PAYEE NOLY AKE SERVICE COMPANY LIMITED
Or transfer to KASIKORN BANK account number 156-8-88112-1

ในนามบริษัท เอเคอี เซอร์วิส จำกัด

ผู้รับของ	ผู้ส่งของ	ผู้ตรวจ	ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ AUTHORIZED SIGNATURE
____/____/____	เอก แก้วงาม ____/____/____	____/____/____	เอก แก้วงาม

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei,
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES HOTELS
Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล เวนเจอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

ORIGINAL

Supplier AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel: 095 5565781
Fax:

PO No. PO202606-02973
PR No. i26-62985
Delivery to: Engineering
Order Date: 05.06.2026
Delivery Date: 08.06.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : Credit 30 Days

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	502008 Pumping service/Stool pond and Grease trap	1.00	Job	3,000.00	0%	3,000.00	3,000.000
	use for waste water treatment plant.						

Total Before Disc.	3,000.00
Total Discount	0.00
Sub Total	3,000.00
Total VAT	210.00
Total Amount	3,210.00

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.

Thanjira Srinakorn
(Assistant Purchasing Manager)

Areerat Panpram
(Finance Controller)

Piyada Anyoo
(General Manager)

AKE Service Co., Ltd.
16/58 Moo 11 Soi 10/15 Khlong Sam,
Khlong Luang, Pathumthani 12120

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 202606218

Order No.: PO202606-02973
Receipt No.: 003347

Date : 29.06.2026
Invoice Date : 29.06.2026

Deliv.Loc: Engineering

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	502008	Pumping service/Stool pond and Grease trap	1.00	Job	1.00	0%	3,000.00	3,000.00	210.00
		use for waste water treatment plant.							

Total:	Engineering	Total Value Discount Per Item	*0.00*	THB
		System Currency	3,000.00	THB
		Supplier Currency	3,000.00	THB

Grand Total Net	**3,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**3,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**210.00**	**THB**
Grand Total Gross	**3,210.00**	**THB**

Received By :.....
Date : .....

Department By :.....
Date : .....

Cost Controller By :.....
Date : .....

Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, Pf-Deposit, Z-add. Position

สำเนาสัญญาการดูแลต้นไม้

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei,
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

Supplier LOVE NATURE GARDENS CO., LTD.
100/362 Lan Thong Village, Moo 8, Tiwanon Road, Bang Phut Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

Tel: 098-529-6362
Fax:


PO No. PO202603-01492
PR No. i26-60859
Delivery to: Engineering
Order Date: 13.03.2026
Delivery Date: 18.03.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : credit 30-day

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION		QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	701028	Mok tree / ต้นโมก 1.5ม. for the gaden around the hotel.	75.00	Each	80.00	0%	80.00	6,000.000
2	701045	Mok tree / ต้นโมก 1.8 - 2.00 ม. for the garden around the hotel.	65.00	Each	120.00	0%	120.00	7,800.000
3	701019	Tree Sai Korean - ต้นไทรเกาหลี	55.00	Each	400.00	0%	400.00	22,000.000
4	701017	Soil / ดิน ดินผสมปลูก	50.00	Sack	15.00	0%	15.00	750.000
5	480086	Transportation / ค่าขนส่ง ค่าขนส่ง+ค่าแรง	1.00	Time	6,500.00	0%	6,500.00	6,500.000

Total Before Disc.	43,050.00
Total Discount	0.00
Sub Total	43,050.00
Total VAT	3,013.50
Total Amount	46,063.50

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.



LOVE NATURE GARDENS
LOVE NATURE GARDENS CO.,LTD.
บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
100/362 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel.088-235-6264 E-mail : Graypinkgolf@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-62027-57-6

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เรื่อง ส่งมอบงานปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง

เรียน กรรมการตรวจรับงาน

เอกสารแนบ รูปปฏิบัติงาน
เอกสารส่งมอบงาน

ตามที่ทาง บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากท่าน เป็นผู้ดำเนินงานปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง อ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาเลขที่ LNG-K-69016 และใบสั่งจ้างเลขที่ PO202603-01492 ซึ่งทางผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตส่งมอบให้แก่ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ☑ ต้นโมก สูง 1.5 ม. จำนวน 75 ต้น
- ☑ ต้นโมก สูง 1.8 - 2.0 ม. จำนวน 65 ต้น
- ☑ ต้นไทรเกาหลี สูง 2.5 – 3.0 ม. จำนวน 55 ต้น
- ☑ ดินผสมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ถุง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับมอบงานให้กับทางบริษัท ฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริ

[redacted]

(...

Sirivit Apollo Ventures Co.,Ltd(Head Office)
1122 Sukhumvit Road,Phra Khanong,Khlong Toei,
Bangkok ,Thailand 10110
Tel : 02 - 095 9888 Fax : 02 - 095 9898
Tax ID 0-1055-55001-09-5

ibis STYLES Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

บริษัท ศิริวิหย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 095 9888 โทรสาร :02 - 095 9898
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-55001-09-5

PURCHASE ORDER

Supplier LOVE NATURE GARDENS CO., LTD.
100/362 Lan Thong Village, Moo 8, Tiwanon Road, Bang Phut Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

Tel: 098-529-6362
Fax:

PO No. PO202603-01803
PR No. i26-61355
Delivery to: Engineering
Order Date: 31.03.2026
Delivery Date: 03.04.2026
Page No : PAGE1 Of 0
Term of payment : credit 30-day

ITEM	ITEM NO./ DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	DISC. %	PRICE (DISC.)	TOTAL
1	701049 Concrete block - อิฐบล็อก for improving the garden.	140.00	Each	30.00	0%	30.00	4,200.000
2	701017 Soil / ดิน	130.00	Sack	15.00	0%	15.00	1,950.000
3	701050 Fertilizer - ปุ๋ย for planting trees.	3.00	Each	60.00	0%	60.00	180.000
4	480020 Installation / ค่าติดตั้ง	1.00	Job	5,500.00	0%	5,500.00	5,500.000

Total Before Disc.	11,830.00
Total Discount	0.00
Sub Total	11,830.00
Total VAT	828.10
Total Amount	12,658.10

Important :

1. All Deliveries must be made to the Receiving area of the hotel.
2. 3 Copies of invoice must accompany all deliverise
3. Acceptances of deliveries are subject to inspection, count , weight measure approval of the hotel.
4. The Hotel reserves the right to return all item of generally in correct decription or which are low in quantity or quality damaged or defective and damand full compensation for any losses and/or expense incurred.
5. If the supplier accepts this order he/she also accept all condition herein.

Thanjira Srinakorn
(Assistant Purchasing Manager)

Areerat Panpram
(Finance Controller)

Piyada Anyoo
(General Manager)

LOVE NATURE GARDENS CO.,LTD.
บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
100/362 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel.088-235-6264 E-mail : Graypinkgolf@gmail.com
เอชประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-62027-57-6

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ส่งมอบงานจัดส่งอิฐประสาน ดิน และปุ๋ย โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง

เรียน กรรมการตรวจรับงาน

เอกสารแนบ เอกสารส่งมอบงาน

ตามที่ทาง บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากท่าน เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งอิฐประสาน ดิน และปุ๋ย พร้อมจัดเรียงอิฐและตัดแต่งต้นไม้ โครงการ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง อ้างอิงเอกสาร ใบสั่งจ้างเลขที่ PO202603-01803 ซึ่งทางผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 4 เมษายน 2569 จึงขออนุญาตส่งมอบให้แก่ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ☑ อิฐบล็อกประสานสีเทา ขนาด 10*20*10 ซม. จำนวน 140 ก้อน
- ☑ ดินผสมปลูกต้นไม้ จำนวน 130 ถุง
- ☑ ปุ๋ย 16-16-16/8-24-24 จำนวน 3 กิโลกรัม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับมอบงานให้กับทางบริษัท ฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย สรรพคุณ)
บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด

..... (.....8/4/69.....) ผู้ตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ	..... (.....) ผู้ส่งมอบงาน บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด

สำเนาบันทึกการประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ข้อเสนอแนะของพนักงานและผู้มาใช้บริการ

Duty Manager Log book on 27 January 2026

No.	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				*Takky*
Afternoon Shift - Thaned (Tae)								
New Issue								
	Guest : Ms. Alisha Kaewsuree Room : 1514 Nationality : Thai POS : 27 - 29 Jan 2026	**21:30 Hrs.**	Guest found cockroach in room	DM immediate move to Room 2210 was offered, and the guest appreciated the quick arrangement.				*Tae*
Night Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
	Guest : Mr. Ang Lay Tong Room : 902 Nationality : Malaysian POS : 26 - 28 Jan 2026 Bkg. Source : CTRIP (B2B)	**00:50 Hrs.**	Guest got cut on his back by a sharp edge of shower head	• Guest informed that the shower head in the bathroom had a sharp edge, causing a cut on his back skin while showering. • DM immediately contacted the security (Khun Tum) to provide first aid to a guest, and technician to replace the shower head right away while the guest was receiving first aid at the lobby. • The technician successfully replaced the shower head. • Guest was very kind and no asking for any compensation.	**The guest may require first aid assistance again tomorrow morning.**	Shower head replacing	First Aid	*JR*

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 25 February 2026

No.	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Takky***
Afternoon Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
	Guest : Ms. Jun Guo Room : 2114 Nationality : Chinese POS : 23-26 Feb 2026 Bkg. Source : CTRIP (B2B) - Pre Buy	**12:15 hrs.**	Guest fell and got injured at the pool.	At approximately 12:15 PM, the guest's 5-year-old daughter was running and playing near the swimming pool when she slipped and fell. She sustained a cut injury caused by the stainless-steel edge of the pool. The wound was bleeding at the time of the incident. The guest requested that we arrange transportation to Sukhumvit Hospital for medical treatment and asked the company to take responsibility for the medical expenses incurred. Initially, the guest submitted a medical certificate and a receipt totaling THB 5,465 for further consideration by FOM and GM.	**FO/SEC**			***Pop***
	Guest : Ms. Dongrui Chai / Mr. Seokhwan Kim Room : 1815 Nationality : Chinese and Korean POS : 23-26 Feb 2026 Bkg. Source : Convergent(C.I.T)	**21:00hrs.**	2 Guests had a heated argument.	At approximately 9:00 PM, two guests were involved in a dispute in front of their room. The female guest claimed that she had been physically assaulted. However, the male guest denied the allegation, stating that the female guest had been unfaithful and that he could no longer stay in the same room with her. He requested the return of his clothes, but the female guest initially refused. The AFOM, together with Sec. Toey, attended the scene and mediated the situation. After some discussion, all of the male guest's clothes were successfully returned. The male guest then moved to stay with a friend in Room 1208.	**FO/SEC**	**Monitor at Room 1815**		
Night Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***JR***

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 18 March 2026

No.	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				*JR*
Afternoon Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
Guest : Ms. Huang Yirou Room : 1111 Nationality : Taiwanese POS : 16-20 Mar 2026 Bkg. Source : Ctrip (B2B)		**19:35 hrs.**	Guest found cockroach in room	Guest called to informed about they found cockroach in room 1111, we promptly apologized to the guest. However, the guest declined to change rooms and only requested housekeeping service.	**FO / HK / FB**		We arranged for housekeeping to clean the room and apply spray treatment. Additionally, we offered one complimentary breakfast (1 pax) until check-out.	*Pop*
Night Shift - Artitaya (Ann)								
New Issue								
Guest : Miss Xinyi Wang **Room** : 2512 **Nationality** : Chinese **POS** : 18 - 23 Mar. 2026 **Bkg. Source** : CTRIP (B2B)		**21:55 Hrs**	Cockroach in room	The guest has just checked into the room and came down to the front desk to report that they found a cockroach. - DM has apologized to a guest and immediately arranged a new room for them. **From 1514 moved to 2512. (upgrade to DLX)**	**FO / HK**		Move guest to the new room, The guest appreciated the gesture and felt happy with the service.	*Ann*
All operations went smooth, there was no any incident.								

Duty Manager Log book on 27 April 2026

No.	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Muntana (Pare)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				*Pare*
Afternoon Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
	Guest : Ms. Balabekov & Ms. Kaken **Room** : 913 **Nationality** : Kazakhs **POS** : 24 - 27 Apr. 2026 **Bkg. Source** : Hotelbeds	**13.35 Hrs**	Overdose	At approximately 13:35, the guest from room 913 called to report that she and her friend were experiencing shortness of breath and heart palpitations. She was asked whether the symptoms were caused by cannabis, and she confirmed that she had consumed one pack of cannabis-infused gummies, which led to unusual symptoms for both of them. She requested medical assistance. AFOM then contacted Security staff to arrange support and transportation. A shuttle was organized to take the guests to Sukhumvit Hospital. Later, an update was received from the guest's friend staying in room 915, confirming that they were safe and already on their way to the airport to return to their home country.	**FO/SEC**			*Pop*
	Guest : Khun Varissara Semeelung **Room** : 1615 **Nationality** : Thai **POS** : 27 - 30 Apr. 2026 **Bkg. Source** : Ctrip	**13.52 Hrs**	Elevator No.1 Stop working and trapped guest inside.	At approximately 13:52, Elevator No. 1 malfunctioned, causing a guest from Room 1615 to be trapped inside for about 7 minutes. After the guest was safely released and returned to her room, she called to request an inhaler, sweet and sour fruit juice, and a small portion of fruit to help relieve her anxiety. At the time of the call, she was experiencing trembling in her hands and legs, as she has a fear of confined spaces and this was her first such incident. She was very frightened. AFOM contacted the F&B department to arrange for fruit juice and fresh fruit to be delivered to the guest.	**FO/SEC/ENG**		Arrange for fruit juice and fresh fruit to be delivered to the guest. Approximately two hours later, the guest came down and informed us that she was feeling better.	*Pop*
Night Shift - Artitaya (Ann)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				*Ann*
All operations went smooth, there was no any incident.								

Duty Manager Log book on 23 May 2026

No.	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Artitaya (Ann)								
New Issue								
	Guest : Mr. Kuang Chen Shih **Room** : 2014 **Nationality** : Chinese **POS** : 23 - 27 May 2026 **Bkg. Source** : CTRIP (B2B)	**15.45 hrs.**	Guest found roaches	- Guest has call to front desk informed that there was found roaches in room - DM has apologized to a guest and immediately arranged a new room for him. - We prepared Room 2405 for the guest to change the room	**HK**		**2014 move to 2405**	*Ann*
Afternoon Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				*Pop*
Night Shift - Muntana Ratanavirotkul (Pare)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				*Pare*

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 15 June 2026

No.	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
	Guest : Ms.Chen Junhan **Room** : 2208 **Nationality** : Chinese **POS** : 14 - 27 June 2026 **Bkg. Source** : Agoda	**08:25 hrs**	Cockroaches in room	- Guest contact reception to shown the picture of cockroaches and inform that she found in the room. DM apologize to guest and offer to move to new room 2509	**FO /HK**			*Takky*
Afternoon Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
	Guest : Ms. Gibson Dayna **Room** : 1811 **Nationality** : British **POS** : 15 - 19 June 2026 **Bkg. Source** : Booking.com	**19:25 hrs**	Room not clean	- Guest contact reception after went to Room 1811 and said the room lot of dust, sticky floor and stained on the workign table. We offered room moved and deep clean but guest still unhappy as not same her expectation. Then she asked for cancel the reservation.	**FO /HK**	**Allowed guest to cancel as unhappy to stay with us**		*Takky*
Night Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				*JR*

All operations went smooth, there was no any incident.

ภาคผนวกที่ 6

สำเนามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
