ภาคผนวกที่ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๗/๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด
โดย น.ส.อัครวรรณ เจริญผล

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) InterContinental HuaHin Resort

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๑๑๙ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๓/๓๓ ซอยหมู่บ้านหนองแก ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ออก [redacted]

คำเตือน

(๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย

(๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

(๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าว ให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวกที่ 3

สำเนาใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - สระว่ายน้ำ

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ลีจีโอแนลลา แบคทีเรีย

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - Chiller Water

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - น้ำใช้ น้ำดื่น และน้ำแข็ง

ภาคผนวกที่ 4

สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๗๑๕๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนาดล จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๖๔๖ ลงรับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านขอต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ของ บริษัท วนาดล จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒/๒๕ ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๔๔๐๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เลขทะเบียน บ.๑๐๐-๔๘-๐๑๙ โดยให้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้สิ้นอายุ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ และมีบุคลากรดังนี้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ลำดับ	ชื่อ	ประเภทบุคคล
[redacted]		๔๒
		๔๑

ลง บุคลากร

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข [redacted]


ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น
ร
อธิ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด เลขทะเบียน ว-๐๒๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒ ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
7	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[1]
10	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
12	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
13	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
15	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
16	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2] 2) Soxhlet Extraction Method[2]
17	pH	Electrometric Method[2]
18	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[2]

19 Selenium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
20	Sulfide	1) Iodometric Method[2] 2) Methylene Blue Method[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[2]
25	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
26	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

(Environment & Laboratory Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐

(Accreditation No. Testing 0240)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(Issue date : 15 January B.E. 2567 (2024))

(นา
ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรฐานแห่งชาติ
ป
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลติภณฑ์อุตสาหกรรม

9620e443

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (Environment and Laboratory Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0240 (Testing 0240)

ฉบับที่ 02 (Issue No. 02) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B
	- Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Copper (Cu) 0.030 mg/L to 5.00 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.)	- Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C
2. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical oxygen demand (COD) 40.0 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25CH546

Equipment :	pH Meter
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	Seven Compact S220
Serial No. :	C125985375
ID No. :	PHM-006
Condition As-Received:	Used Item
Received Date :	13 May 2025
Calibration Date :	14 May 2025
Reference :	2505-0324DC-2
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Ambient Temperature :	(25 ± 2.5) °C
Relative Humidity :	(50 ± 15) %
Calibration Procedure :	In - house method : - CP-CH5 by direct measurement with DC voltage standard and direct measurement with certified reference material (CRM) - CP-CH8 by comparison with temperature standard
Calibrated by :	Walalak Sirithean
Approved by :	Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Ponpan Paipim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 15 May 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	24E2759	25 Aug 2025
2) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	24I757	14 July 2025

- This measurement result is traceable to SI throught Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2. Certified Reference Materials :The measurement results are traceable to SI through Hach Lenge GmbH Ltd., Deutsche Akkreditierungsstelle, Accredited No.D-RM-15184-01-00
:The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd., ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.007	CPA chem	1066665	18 Jan 2027
pH 7.000	Hach Lenge GmbH	C03232	02 Dec 2026
pH 10.010	CPA chem	1066669	18 Jan 2026

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor *k*
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter	4.000	177.48	177.7	4.000	0.058	2.00
S/N.: C125985375	7.000	0.00	0.3	7.000	0.058	2.00
	10.000	-177.48	-177.1	10.000	0.058	2.00

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement (±)	Coverage factor *k*
pH Electrode	4.007	4.007	176.1	0.0044	2.00
S/N.: 1205515	7.000	6.999	3.7	0.0084	2.00
	10.010	10.010	-158.5	0.0065	2.00

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : InLabExpert Pro-ISM
- Serial No. : 1205515

Dimension of probe

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement (± °C)	Coverage factor *k*
25.0	25.001	24.9	-0.101	0.13	2.00

Remark - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25MM393

Equipment :	Electronic Balance
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	ML204T /00
Serial No. :	B647342339
ID No. :	ANB-003
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 304
Received order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	15 °C to 40 °C
Relative Humidity :	30 % to 90 %
Calibrated by :	Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Electronic Balance **Cert.No.:** 25MM393
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Procedure used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OB01 based on UKAS LAB 14 according to direct measurement method against standard weight.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instruments:-

Instruments	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due date
1) Standard Weight Set (E2)	24053	MM-0013-24	NIMT	25 Jan 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This result of calibration was made on requested at the point specified by customer.
4. This certificate is not certified for any commercial transaction.
5. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : NIMT : National Institute of Metrology Thailand

Result of calibration ( ) Without Adjustment (*) After Adjustment by Internal Calibration
Range capacity : 0 g to 220 g **Resolution** 0.0001 g

Before Adjustment :

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
100	99.9996	+0.0004	0.17	2
200	199.9998	+0.0002	0.30	2

After Adjustment :

1. **Determination of the standard deviation of weighing machine** (n = 10)

Applied Weight (g)	Standard Deviation of Reading (g)
100	0.00005
200	0.00004


Equipment : Electronic Balance
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Cert.No.: 25MM393

Result of calibration

2. Effect of off center loading

A mass of 100 g was placed to various position on the pan. The weighing machine reading error obtained is given in the table



Position 1 (g)	Position 2 (g)	Position 3 (g)	Position 4 (g)	Position 5 (g)	Maximum difference between off-center and central loading (g)
-0.0001	-0.0002	-0.0002	-0.0002	-0.0002	0.0001

3. Departure from nominal value

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
Unload	0.0000	0.0000	0.12	2.06
0.1	0.1000	0.0000	0.12	2.06
0.2	0.2000	0.0000	0.12	2.06
1	1.0000	0.0000	0.12	2.06
5	5.0000	0.0000	0.12	2.06
10	9.9999	+0.0001	0.12	2.06
20	19.9999	+0.0001	0.12	2.05
50	50.0001	-0.0001	0.14	2
100	100.0000	0.0000	0.17	2
150	150.0000	0.0000	0.29	2
200	200.0000	0.0000	0.30	2

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM977

Equipment :	Incubator
Manufacturer :	Sanden Intercool
Model :	SRC-680SRTM
Serial No. :	SRC680201-1107-00166
ID No. :	CHI-003
Submitted by :	EnvironMent & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 301
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	09 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V
Calibrated by :	Uthen Kankawi

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Incubator **Cert. No.:** 25TM977

Condition As-Received : Used Item **Page :** 2 of 3

Reference : 2507-0148OC-5

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA	27 Jul 2025
2) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA,	27 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)


Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	29
REL.Humi. (%)	54	55
AC Supply (Volt)	224	225

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	20-16RTD-01
2	20-16RTD-02
3	20-16RTD-03
4	20-16RTD-04
5	22-16RTD-05
6	20-16RTD-06
7	20-16RTD-07
8	22-16RTD-08
9 (ref.)	22-16RTD-09
10	20-16RTD-10
11	19-16RTD-01
12	19-16RTD-02
13	19-16RTD-03

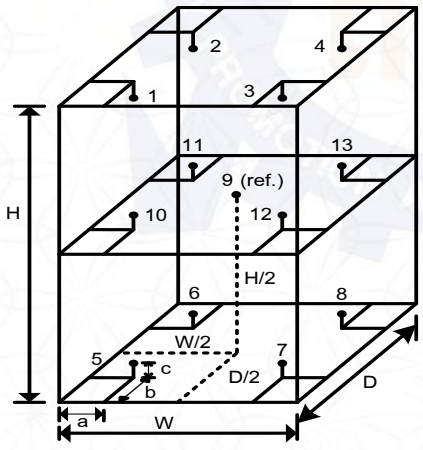

Dimension of Chamber :

D = 0.60 m

Probe Installation Details :

a = 10 cm

Equipment : Incubator
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-5
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM977

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
20.0	20.0	20.0	0.21	0.43	0.80	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
20.0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 (ref.)**	0.35
	19.957	20.008	20.073	19.725	19.753	19.679	19.701	19.670	20.012	
	10	**11**	**12**	**13**						
	19.789	19.773	20.168	19.744						

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM974

Equipment :	Hot Air Oven
Manufacturer :	FRANCE ETUVES
Model :	XU058
Serial No. :	P790
ID No. :	CHO-004
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 303
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Hot Air Oven **Cert. No.:** 25TM974

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-2

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD) and Thermocouple Type T.

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013823	25LM75	TPA	06 May 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :


Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	26
REL.Humid. (%)	47	51
AC Supply (Volt)	220	221

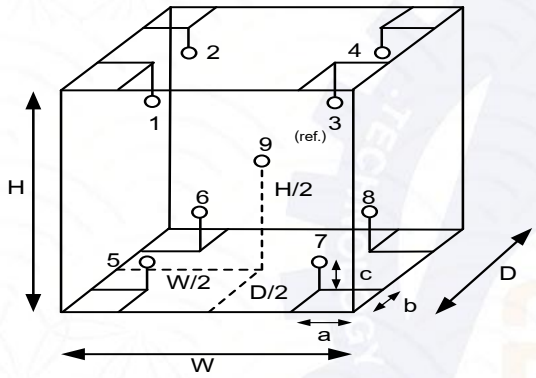

Position :	Ref. Std. ID No.: @ Calibration Point (180) °C	(104) °C
1	21-17TC-01	25-17RTD-01
2	21-17TC-02	25-17RTD-02
3	21-17TC-03	25-17RTD-03
4	21-17TC-04	25-17RTD-04
5	21-17TC-05	25-17RTD-05
6	21-17TC-06	25-17RTD-06
7	21-17TC-07	25-17RTD-07
8	21-17TC-08	25-17RTD-08
9 (ref.)	21-17TC-09	25-17RTD-09

Probe Installation Details :

a =	5.0	cm
b =	5.0	cm
c =	5.0	cm

Dimension of Chamber :

D =	0.36	m
W =	0.40	m
H =	0.40	m
Capacity =	0.058	m^3

Equipment : Hot Air Oven
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-2
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM974

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
104.0	104.0	104.0	0.13	1.0	1.1	2
180.0	180.0	180.0	0.24	1.6	1.9	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (ref.)	
104.0	103.529	103.769	104.251	104.428	103.589	103.683	104.172	103.978	104.411	0.42
180.0	180.583	179.425	180.832	179.981	179.369	179.667	180.479	180.019	180.809	1.1

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity .

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM951

Equipment :	Water Bath
Manufacturer :	Memmert
Model :	WNE 14
Serial No. :	L418.1373
ID No. :	WAB-02
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd 40 Soi liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 4
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) °C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Preecha Hlahib

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Water Bath **Cert. No.:** 25TM951

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-3

Procedure Used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OT04 Based on ASTM E715 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Industrial Platinum Resistance Thermometer (IPRT).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013711	24LM115	TPA	13 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :


Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Heat transfer medium used : Water

	Environmental		AC Voltage Supply
	(°C)	(%R.H.)	(Volt)
Beginning of Calibration	24	55	221
Finished of Calibration	21	56	221

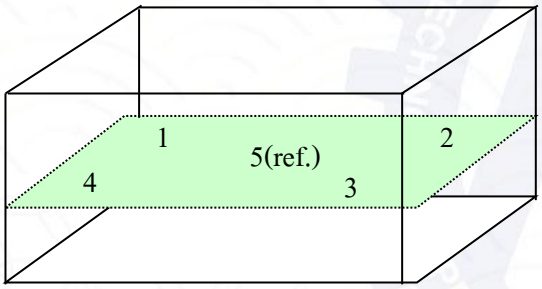

Front

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	4803988-001
2	4803988-002
3	4803988-003
4	4803988-004
5(ref.)	4803988-005

Equipment : Water Bath
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-3
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source

Cert. No.: 25TM951

Calibration point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Average* Standard Reading (°C) Position					Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5 (ref.)	
44.5	44.5	44.5	44.569	44.543	44.554	44.587	44.593	0.15
60.0	60.0	60.0	60.293	60.259	60.206	60.246	60.291	0.15

Calibration point (°C)	Uniformity (°C)	Stability (± °C)	Coverage Factor *k*
44.5	0.098	0.045	2
60.0	0.13	0.050	2

Average* : The average of 30 values in each position.
Uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one probe.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

ภาคผนวกที่ 5

สำเนาเอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

สำเนาแบบรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ ปข 52108/ว.05/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

19 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เลขที่ผู้ใช้น้ำ 333 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	7,847.00	3,138.80	5.75	18,048	18,048	เดือนพฤษภาคม
(หนึ่งหมื่นแปดพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)					18,048	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ที่ ปข 52108/ว.05/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

19 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เลขที่ผู้ใช้น้ำ 524 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,531.00	612.40	5.75	3,521	3,521	เดือนพฤษภาคม
(สามพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)					3,521	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ที่ ปข 52108/ว.05/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

19 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (สาขาที่ 00002) เลขที่ผู้ใช้น้ำ 521 เขต 12

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 33/33 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	0.00	0.00	5.75	0	0	เดือนพฤษภาคม
(ศูนย์บาทถ้วน)					0	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อย

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 93 เลขที่ 30

พนักงาน เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มี.ค.๖๑ - เม.ย. ๖๑

จาก บริษัท พราว วิสดอม ซิตี้ จำกัด

เป็นเงิน 44,643- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - สี่หมื่น สี่พัน หกร้อย สี่สิบสามบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 5 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๖๑

เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่ 0002108

เทศบาลนครหัวหิน
กองคลัง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.....ผู้รับเงิน

จ่านอก .....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปข 52108/ว.03/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

17 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เลขที่ผู้ใช้น้ำ 333 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	6,982.00	2,792.80	5.75	16,059	16,059	เดือนมีนาคม
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)					16,059	

A/P POSTED

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ที่ ปข 52108/ว.03/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

17 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เลขที่ผู้ใช้น้ำ 524 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,379.00	551.60	5.75	3,172	3,172	เดือนมีนาคม
(สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)					3,172	

A/P POSTED

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ที่ ปข 52108/ว.03/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

17 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (สาขาที่ 00002) เลขที่ผู้ใช้น้ำ 521 เขต 12

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 33/33 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	0.00	0.00	5.75	0	0	เดือนมีนาคม
(ศูนย์บาทถ้วน)					0	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ที่ ปข 52108/ว.04/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

20 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เลขที่ผู้ใช้น้ำ 333 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	9,471.00	3,788.40	5.75	21,783	21,783	เดือนเมษายน
(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)					21,783	

A/P POSTED

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ที่ ปข 52108/ว.04/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

20 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เลขที่ผู้ใช้น้ำ 524 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,578.00	631.20	5.75	3,629	3,629	เดือนเมษายน
(สามพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)					3,629	

A/P POSTED

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้



ที่ ปข 52108/ว.04/69

เทศบาลนครหัวหิน
114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

20 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (สาขาที่ 00002) เลขที่ผู้ใช้น้ำ 521 เขต 12

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 33/33 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/แหล่งกำเนิดมลพิษประเภท	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปาที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 40%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	0.00	✓ 0.00	5.75	0	0	เดือนเมษายน
(ศูนย์บาทถ้วน)					0	✓

A/P POSTED

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 **:Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สำเนาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ

INTERCONTINENTAL
HUA HIN RESORT

รายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Inspection Checklist)

1. ข้อมูลทั่วไป (General Information)

วันที่(Date) 31/5/2569	**สถานที่(Location)** Beach Wing	**พื้นที่ติดตั้ง(Area)** Building2
รุ่นของเครื่อง(Model)	**สถานที่จ่ายโหลด(Supply Location)** Emergency Power	**ชนิดเครื่องจักร(Type of Machine)** Engine & Alternator
ยี่ห้อเครื่อง(Brand) Cummins	**หมายเลขประจำเครื่อง(Serial No)**	**ผู้ตรวจสอบInspector** Thawandet Akkaramahasral

2. การตรวจสอบสถานะเครื่องก่อนสตาร์ท (Pre-Start Inspection)

รายการตรวจสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
ระดับน้ำหล่อเย็น (Coolant level)	80–100%	Normal
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant level)	80–100%	Normal
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel level)	≥ 50%	Normal
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาดและไร้การเสียหาย (Clean and free from damage)	Normal
สภาพสายพาน (Condition of belt)	ไม่มีรอยแตก (No cracks)	Normal
ท่อและจุดรองรับท่อ (Pipe & support)	แข็งแรง แน่นหนา (Securely fixed)	Normal
การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง (Engine oil leak)	ไม่มีการรั่วซึม (No leakage)	Normal

3. ระบบแบตเตอรี่ (Battery System)

รายการตรวจสอบระบบแบตเตอรี่	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
แรงดันแบตเตอรี่ (Battery voltage)	24–28 VDC (24 V system)	Normal
ขั้วแบตเตอรี่ (Battery terminal)	สะอาด ยึดแน่น (Clean and tight)	Normal
ระดับน้ำกลั่น (Distil water level)	สูงกว่าแผ่นธาตุประมาณ 10–15 มม. (10–15 mm above plates)	Normal
ความถ่วงจำเพาะน้ำกรด (Specific gravity)	สะอาดและไร้การเสียหาย (Clean and free from damage)	Normal

4. การทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ (Engine Operational Test)

เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ (Engine Starting Time)	16:11:28 น.	เวลาดับเครื่องยนต์ (Engine Shutdown Time)	16:11:28 น.
ชั่วโมงการทำงานรวม (Total Operating Hours)	241:01:00 ชั่วโมง	โหมดการทดสอบ (Timer/Manual)	Manual
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (RPM)	Normal	หมายเหตุความเร็วรอบ (Engine Speed)	

แรงดันน้ำมันเครื่อง (Oil Pressure)	97.00 Bar	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (Water Temp)	31.00
แรงดันแบตเตอรี่ขณะรันเครื่อง (Battery Voltage During Engine Operation)	27.60 VDC	เสียงสั่นสะเทือน (Noisy & Vibration)	Normal

5. ระบบไฟฟ้าและกำลังจ่าย (Electrical & Output Parameters)

กระแสไฟฟ้า (Current - Amp)	แรงดันไฟฟ้าเฟส (Voltage L-N)	แรงดันไฟฟ้าไลน์ (Voltage L-L)
Phase A: Normal	**Phase A:** 231 V	**Phase AB:** 400 V
Phase B: Normal	**Phase B:** 231 V	**Phase BC:** 400 V
Phase C: Normal	**Phase C:** 231 V	**Phase CA:** 400 V
	ความถี่ไฟฟ้า (Frequency):	Normal Hz

6. ระบบควบคุมและการตั้งค่าความปลอดภัย (Control Panel & Safety Settings)

กระแสไฟฟ้า (Current - Amp)	แรงดันไฟฟ้าเฟส (Voltage L-N)
หน้าปัดควบคุม (Control panel)	**Normal**
สัญญาณเตือนแผงควบคุม (Control Panel and Alarm)	**Normal**
ตำแหน่งสวิตช์เลือกโหมด (ต้องอยู่ในโหมด Auto)	**Auto**

7. ข้อเสนอแนะและหมายเหตุเพิ่มเติม (Remarks / Suggestions)

N/A

8. รูปภาพแนบประกอบรายงาน (Inspection Photos)

รูปภาพสภาวะปกติ (Photo Normal)	รูปภาพกรณีพบปัญหา (Photo Issue)
	

ผู้รายงานและทดสอบระบบ	ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
ลงชื่อ:	ลงชื่อ: .....
(.....)	(.....)
ตำแหน่ง: วิศวกรผู้ทดสอบระบบ	ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

สำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

Report of Checking for Fire Alarm System

Project

INTERCONTINENTAL HUA-HIN

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 15/06/2569-18/06/2569

Sevices by

Magpie Blazetech Co.,Ltd

Tel.02-9346267. www.magpiez.com

Authorized Distributors

"Notifier" Fire Alarm Product

"Ansul" Fire Suppression Product

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

INSPECTION AND TEST OF FIRE ALARM SYSTEM

TABLE OF CONTENTS

SECTION	DESCRIPTION
1	Summary Defect
2	Report Of Inspection & Testing
3	Device Tests Record & Inspection
4	Pictures

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

Summary Device Tests Record of Fire Alarm System

- SUMMARY THE PROBLEM OF TESTING RECORD

Item	FL.	Loop	Add.	Location	Type of Device	Result of Testing (Problem)	Recommendation	Status
1	1st. BL.1	L01	D019	RESORE CENTER	FSP-851	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
2	BASEMENT2 BL.1	L02	D028	DIRECTOR SALE	SDX-751	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
3	BASEMENT3 BL.1	L02	D048	PARKING	FST-851-R	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
4	BASEMENT3 BL.1	L02	D061	DUTY ENGINEER	SDX-751	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
5	BASEMENT3 BL.1	L02	D063	PLUMBER	SDX-751	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
6	BASEMENT3 BL.1	L02	D064	ELECTRICIAN	FSP-851	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
7	BASEMENT3 BL.1	L02	D078	EXHAUST FAN	FSP-851	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
8	BUILDING 1	L02	D084	PUMP ROOM	SDX-751	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

Summary Device Tests Record of Fire Alarm System

- SUMMARY THE PROBLEM OF TESTING RECORD

Item	FL.	Loop	Add.	Location	Type of Device	Result of Testing (Problem)	Recommendation	Status
9	BASEMENT4 BL.	L02	M026	SV FIRE WATER TANK1	FMM-1	Open Circuit	ไม่สามารถวัดค่าความต้านทานได	รอช่างอาคารทำการแก้ไข
10	MAZZANINE BL.1	L03	D001	AHU ROOM	FSP-851	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
11	ROOF BL.1	L04	D013	ROOF	FST-851-R	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
12	3rd.BL.2	L04	M053	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
13	1st.BL.4	L06	M084	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	No Answer	อุปกรณ์เสีย	รอการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์
14								
15								
16								

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

Report of Inspection & Testing
of Fire Alarm System

Name of project	: INTERCONTINENTAL HUA-HIN RESORT				
Name of proprety	: บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด				
Location	: HUA-HIN	**Tel.**		**Fax.**	
Name of authority	:	**Position.**			
		Tel.		**Fax.**	

Inspector name	: นายไกรลาศ เทพศรี	**Position.**	**ENGINEER**		
Name of company	: Magpie Blzetech Co.,Ltd.				
Address	: 526-528 Soi Ladprao 94, Ladprao Rd., Plabpla, Wangthonglang, Bangkok 10310				
		Tel.	02-934-6267	**Fax.**	02-934-6270
Date :	15/06/2569-18/06/2569	**Time.**			

Type of system :	Fire Alarm System			**Brand :**	"NOTIFIER"		**Model :**	NFS2-3030	
Type of wiring :	☑	**Class A :**	☐	**Class B :**	☐	**Other :**			
Number of circuit :	**6 Loop**								
Inspection freuecy:	☐	**Monthly :**	☐	**Quaterly :**	☐	**Annually :**	☑	**Other :**	**Preventive Maintenance**
									ทดสอบครั้งที่ 2 / 2569

Description	-ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel พร้อมทำความสะอาด
	-ทดสอบแหล่งกำลังจ่ายไฟฟ้าหลักและกำลังไฟฟ้าสำรองในระบบ
	-ทดสอบการทำงานของตู้ Graphic Annunciator And Computer Graphic
	-ทดสอบระบบสัญญาณอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector,Heat Detector พร้อมทำความสะอาด
	-ทดสอบระบบสัญญาณอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual Pull Station
	-ทดสอบสัญญาณเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้
Comment :	
ควรแก้ไขปัญหาตามที่แสดงในหน้า Summary Device Tests Record of Fire Alarm System	

Inspector ' s : Mr.Krailas Thepsri
Date : 18-06-69

Owner / Designated : .....
Date : .....

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

System Tests Record of Fire Alarm System

SYSTEM POWER SUPPLIES

Location (Panel Number) : SECURETY ROOM

Primary (Main): Nominal Voltage 220VAC. , Amps

Secondary (Standby) : 24VDC Storage Battery: 55AH

Type Battery ☐ Dry Cell ☐ Nickel-Cadmium ☑ Sealed Lead-Acid

☐ Other

SYSTEM TESTS AND INSPECTIONS

TYPE	VISUAL	FUNCTIONAL	COMMENT
Control Panel	☐	☑	
Lamps/LEDs	☐	☑	
Fuses	☐	☑	
Primary Power supply	☐	☑	
Trouble Singnals	☐	☑	
Disconnect Switches	☐	☑	
Ground Fault Monitoring	☐	☑	

Interface Eq.

TYPE	VISUAL	FUNCTIONAL	COMMENT
Access Control	☑	☐	
Lift	☑	☐	
Shut Off AHU	☑	☐	

SECONDARY POWER

TYPE	VISUAL	FUNCTIONAL	COMMENT
Battery Condition	☐	☑	
Load Voltege	☐	☑	
Discharge Test	☐	☑	
Charger Test	☐	☑	

TYPE	VISUAL	FUNCTIONAL	COMMENT
TRANSIENT SUPPRESSORS	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

System Tests Record of Fire Alarm System

SYSTEM POWER SUPPLIES

Location (Panel Number) : SECURETY ROOM

Primary (Main): Nominal Voltage 220VAC. , Amps

Secondary (Standby) : 24VDC Storage Battery: 55AH

Type Battery ☐ Dry Cell ☐ Nickel-Cadmium ☑ Sealed Lead-Acid

☐ Other

TYPE	VISUAL	FUNCTIONAL	COMMENT
REMOTE ANNUNCIATORS	☑	☐	

NOTIFICATION APPLIANCES

TYPE	VISUAL	FUNCTIONAL	COMMENT
Audible	☐	☑	
Visible	☐	☑	
Speakers	☐	☑	
Voice Clarity	☐	☑	
Telephone Command Center	☑	☐	

Remark :

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
LOOP 1										
1st. BL.1	1	D001	PANTRY STORE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D002	FUNCTION ROOM 1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D003	FUNCTION ROOM 1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D004	FUNCTION ROOM 1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D005	FUNCTION ROOM 1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D006	FUNCTION ROOM 2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D007	FUNCTION ROOM 2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D008	LOBBY RECEPTION	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
1st. BL.1	1	D009	LOBBY RECEPTION	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
1st. BL.1	1	D011	FRONT OFFICE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D012	OPERATOR ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D013	OFFICE MANAGER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D014	WEST ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D015	AFE DEPOSITE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
	1	D016	Detector L01D016	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D017	RESORE CENTER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D018	RESORE CENTER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D019	RESORE CENTER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
1st. BL.1	1	D020	RESORT CENTER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st. BL.1	1	D021	PANTRY ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.	1	D025	STAIR 2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.	1	D027	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.	1	D028	LIFT HALL	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D029	EE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D030	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D031	RECEIVING OFFICE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D032	WASHING AREA	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D033	RECYCLE BOLTLE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D034	RETURNBLE BOTTEL	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D035	RETURNBLE BOTTEL	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D036	PR OFFICE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D037	PR OFFICE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D038	DRY FOOD STORE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D039	SEA FOOD CHILLER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D040	MEAT CHILLER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D041	F&B SUPPORT	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D042	EXECUTIVE OFFICE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D043	EXECUTIVE OFFICE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D044	EXECUTIVE OFFICE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D045	GM OFFICE ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D046	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D047	SERVICE ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D048	CLINIC ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D049	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D051	STAIRS	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D052	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D053	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D054	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D055	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D056	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D058	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D059	SERVICE CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D060	SERVICE CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D062	SERVICE CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D063	UNIFORM ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
BASEMENT1 BL.1	1	D064	TOLLET-T2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D065	TOLLET-T2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D066	TOLLET-T2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D067	TOLLET-T2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D068	TOLLET-T2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D069	TOLLET-T3	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D070	TOLLET-T3	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D071	TOLLET-T1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D072	TOLLET-T1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D073	TOLLET-T1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D074	TOLLET-T1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D075	TOLLET-T1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D076	TOLLET-T1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D077	STORAGE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D078	STORAGE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 1	1	D079	PUMP ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D080	HOUSE KEEPING ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D081	OPERATE STORE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D082	EXEC HK OFFICE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D083	ADMIN OFFICE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D084	LINEN HOLDING ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D085	GENERAL STORE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D086	GENERAL STORE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D087	GENERAL STORE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D088	SECURITY PURCHASING	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	D089	SECURITY TIME KEEPER	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M001	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M002	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M003	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M004	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M005	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.1	1	M006	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M007	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M008	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M009	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M010	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M011	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M012	PABX ROOM DOOR	FMM-1	PABX DOOR	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M013	PABX ROOM DOOR	FMM-1	PABX DOOR	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M014	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M015	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M016	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M017	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M018	PABX DOOR	FRM-1	PABX DOOR	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.1	1	M022	Stair 02 Manual	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M023	Resort center Manual	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M024	Function 1 Manual	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M026	Stair 03	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.1	1	M027	Reception	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
STAIR BL.1	1	M028	Pressurize FAN	FRM-1	Pressurize FAN	☐	☐	☐	☐	
STAIR BL.1	1	M029	Pressurize FAN	FRM-1	Pressurize FAN	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M034	Shut Off GAS1	FRM-1	Shut Off GAS1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M035	Shut Off GAS2	FRM-1	Shut Off GAS2	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M036	GAS Station 1	FMM-1	GAS Station 1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M037	GAS Station 2	FMM-1	GAS Station 2	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M050	Corridor Manual	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
BASEMENT1 BL.1	1	M057	Corridor Manual	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.1	1	M061	Corridor Manual	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
Sound BL.1	1	M070	Background Music	FRM-1	Background Music	☐	☐	☐	☐	
	1	M125	L01M125		Power Monitr	☐	☐	☐	☐	
	1	M126	L01M126		Power Monitr	☐	☐	☐	☐	
	1	M127	L01M127		Power Monitr	☐	☐	☐	☐	
	1	M128	GROUND FAIL 220V		Power Monitr	☐	☐	☐	☐	
Loop 2										
BASEMENT2 BL.1	2	D001	STAFF CANTEEN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D002	STAFF CANTEEN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D003	STAFF CANTEEN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D004	STAFF CANTEEN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D005	STAFF CANTEEN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D006	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D007	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D008	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D009	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D010	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D011	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D012	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D013	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D014	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D015	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D016	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D017	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D018	CAR PARK	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D020	FRESH AIR FAN ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D021	FIANNCE&ACCOUNT ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D022	FIANNCE&ACCOUNT ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D023	Finace OFFICE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D024	IT/SERVER	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D025	ADDITION ADMIN	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D026	ADDITION ADMIN	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D027	ADDITION ADMIN	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D028	DIRECTOR SALE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
BASEMENT2 BL.1	2	D029	DIRECTOR SALE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D030	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D031	BEVERAGE STORE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D032	FLOWER PREPARATION	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D033	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D034	TOILET -T01(W)	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D035	TOILET -T02(M)	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D036	EXHAUST FAN ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D037	EXHAUST FAN ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	D039	STAFF KITCHEN	FST-851-R	Heat	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D040	TRAINING MANAGER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D043	STORAGE	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D044	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D045	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D046	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D047	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D048	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
BASEMENT3 BL.1	2	D049	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D050	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D051	PURPOSE HEAT PUMP	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D052	PURPOSE HEAT PUMP	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
BASEMENT3 BL.1	2	D053	PURPOSE HEAT PUMP	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D054	PURPOSE HEAT PUMP	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D055	FRESH AIR FAN ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D057	STORE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D058	ASSISTANT CHIEF ENG.	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D059	CHIEF ENGINEER	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D060	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D061	DUTY ENGINEER	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
BASEMENT3 BL.1	2	D062	REFRINGERATOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D063	PLUMBER	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
BASEMENT3 BL.1	2	D064	ELECTRICIAN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
BASEMENT3 BL.1	2	D065	GENERAL MAINTENANCE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D066	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D067	GENERAL MAINTENANCE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D068	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D070	GENERAL MAINTENANCE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D071	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
	2	D072	Detector L02D072	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D073	HANDY/PUMP	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D074	PAIN STORE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D075	SPRAY BOOTH	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D076	PARKING	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D077	EXHAUST FAN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D078	EXHAUST FAN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
BASEMENT3 BL.1	2	D080	BAKERY ROOM	FST-951-IV	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	D081	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 1	2	D082	PUMP ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 1	2	D084	PUMP ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
BASEMENT2 BL.1	2	D085	STAIR 2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M001	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M002	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M003	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M004	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M005	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M006	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M007	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M008	ANSUL HOOD	FMM-1	ANSUL HOOD	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M009	STAFF KITCHEN	FMM-1	STAFF KITCHEN	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M010	SHUT OFF LPG	FRM-1	SHUT OFF LPG	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M011	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M012	FRESHAIR FAN PANEL	FRM-1	FRESHAIR FAN	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M013	ANSUL HOOD	FMM-1	ANSUL HOOD	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M014	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M015	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M016	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M017	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M018	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M019	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M020	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
	2	M021	Module L02M021	FRM-1	Relay	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M022	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M023	FRESHAIR FAN PANEL	FRM-1	FRESHAIR FAN	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M024	PUMP ROOM FS	FMM-1	PUMP ROOM FS	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M025	PUMP ROOM SV	FMM-1	PUMP ROOM SV	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M026	SV FIRE WATER TANK1	FMM-1	SV WATER TANK1	☐	☐	☐	☑	ไม่สามารถวัดค่าความต้านได้
BASEMENT4 BL.1	2	M027	SV IN FIRE PUMP2	FMM-1	SV FIRE PUMP2	☐	☐	☐	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
BASEMENT4 BL.1	2	M028	SV IN JOCKY PUMP	FMM-1	SV JOCKY PUMP	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M029	SV IN FIRE PUMP1	FMM-1	SV FIRE PUMP1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M030	SV FIRE WATER TANK1	FMM-1	SV WATER TANK1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M031	SV FIRE B2-11	FMM-1	SV FIRE B2-11	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M032	SV BYPASS FIRE B2-11	FMM-1	SV BYPASS FIRE B2-11	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M033	SV FIRE B2-11	FMM-1	SV FIRE B2-11	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M034	SV FIRE B1	FMM-1	SV FIRE B1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M035	SV FIRE B1	FMM-1	SV FIRE B1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M036	SV BYPASS FIRE B1	FMM-1	SV BYPASS B1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M037	SV TEST FLOW FIRE	FMM-1	SV TEST FLOW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M038	SV TEST FLOW FIRE	FMM-1	SV TEST FLOW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M039	SV WATER TANK2	FMM-1	SV WATER TANK2	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M040	SV WATER TANK1	FMM-1	SV WATER TANK1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M041	SV OUT JOCKY PUMP	FMM-1	SV OUT JOCKY PUMP	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M042	SV OUT FIRE PUMP1	FMM-1	SV OUT PUMP1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M043	SV OUT FIRE PUMP2	FMM-1	SV OUT PUMP2	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M044	PUMP ROOM SV	FMM-1	PUMP ROOM SV	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M045	PUMP ROOM SV	FMM-1	PUMP ROOM SV	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M046	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M047	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M048	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M049	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M050	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M051	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M052	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M053	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M054	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M055	PUMP ROOM LEVEL SW	FMM-1	PUMP LEVEL SW	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M056	TEL. PUMP ROOM	FCM-1	TEL. PUMP ROOM	☐	☐	☐	☐	
	2	M057	Module L02M057	FCM-1	Control	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M058	FIRE PUMP 1	FRM-1	FIRE PUMP 1	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M059	FIRE PUMP 2	FRM-1	FIRE PUMP 2	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M060	JOCKY PUMP	FRM-1	JOCKY PUMP	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M062	CARPARK MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M063	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M064	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M065	MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT3 BL.1	2	M066	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT4 BL.1	2	M067	PUMP ROOM MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M068	SHUT OFF LPG	FRM-1	SHUT OFF LPG	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M069	STAFF CANTEEN	FMM-1	STAFF CANTEEN	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M070	FAN CONTROL	FRM-1	FAN CONTROL	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT2 BL.1	2	M071	FM-200 SERVER ROOM	FMM-1	FM-200 SERVER	☐	☐	☐	☐	
Loop 3										
MAZZANINE BL.1	3	D001	AHU ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
MAZZANINE BL.1	3	D002	AHU ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
MAZZANINE BL.1	3	D003	AHU ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D004	HALL LIFT	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D005	EE ROOM	FSP-951	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D006	MANAGER ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D007	PANTRY ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D008	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D009	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D010	VIP-3	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D011	VIP-2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D012	VIP-2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
2nd. BL.1	3	D013	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D015	SPA RECEPTION	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D016	VIP-1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D017	VIP-1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D018	TOLLET	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D019	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D020	FITNESS	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D021	FITNESS	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D022	FITNESS	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D026	LOCKER MEN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D028	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D029	TOLLET	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D030	TOLLET	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D031	PANTRY BOH	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D032	FRONT LOBBY SPA	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D033	STANDARD -1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D034	STANDARD -2	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D035	STANDARD -3	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D036	TOLLET	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D038	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd. BL.1	3	D039	STORAGE	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D041	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D042	LENIN	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D043	BALCONY	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D044	NO.1301	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D045	NO.1302	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D046	NO.1303	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D047	GM ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D048	GM ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D049	GM ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D050	NO.1304	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D051	NO.1308	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D052	NO.1309	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D053	NO.1310	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D055	MAID ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D057	CORRIDOR	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D058	LENIN	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D059	BALCONY	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D060	NO.1401	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D061	NO.1402	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D062	NO.1403	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D063	NO.1404	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D064	NO.1405	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D065	NO.1406	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D066	NO.1407	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D067	NO.1408	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D068	NO.1409	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D069	NO.1410	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D071	MAID ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D073	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D074	LENIN	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D075	BALCONY	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D076	NO.1501	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D077	NO.1502	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D078	NO.1503	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D079	NO.1504	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
5th.BL.1	3	D080	NO.1505	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D081	NO.1506	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D082	NO.1507	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D083	NO.1508	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D084	NO.1509	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D085	NO.1510	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D087	MAID ROOM	FSP-951	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D088	GM ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D089	GM ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D090	GM ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D091	STAIR 1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D092	STAIR 1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D093	STAIR 2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D094	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D095	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D096	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D097	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D098	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D099	Corridor	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	D100	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D101	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D102	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D103	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D104	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D105	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D106	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	D107	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D108	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D109	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D110	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D111	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D112	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D113	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	D114	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	D115	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	D116	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	D117	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	D118	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	D119	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	D120	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	D121	Corridor	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	M003	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.1	3	M004	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.1	3	M005	TEL.	FCM-1	TEL.	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.1	3	M006	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	M007	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	M008	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	M009	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.1	3	M010	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.1	3	M011	TEL.	FCM-1	TEL.	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.1	3	M012	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	M013	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	M014	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	M015	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	M016	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
4th.BL.1	3	M018	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
4th.BL.1	3	M019	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
4th.BL.1	3	M020	TEL.	FCM-1	TEL.	☐	☐	☐	☐	
4th.BL.1	3	M021	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	M022	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	M023	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	M024	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	M026	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
5th.BL.1	3	M027	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
5th.BL.1	3	M028	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
5th.BL.1	3	M029	DOOR	FMM-1	DOOR	☐	☐	☐	☐	
5th.BL.1	3	M030	DOOR	FMM-1	DOOR	☐	☐	☐	☐	
5th.BL.1	3	M031	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	M032	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	M033	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
5th.BL.1	3	M034	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	M035	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.1	3	M038	SPA MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	M039	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.1	3	M040	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	M041	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.1	3	M042	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	M043	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
4th.BL.1	3	M044	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	M045	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
5th.BL.1	3	M046	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
MAZZARIAU BL.1	3	M047	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
MAZZARIAU BL.1	3	M048	DUCT SMOKE 1	FZM-1	DUCT SMOKE 1	☐	☐	☐	☐	
MAZZARIAU BL.1	3	M050	DUCT SMOKE 3	FZM-1	DUCT SMOKE 3	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.1	3	M052	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.1	3	M053	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
MAZZARIAU BL.1	3	M054	AHU 3	FRM-1	AHU 3	☐	☐	☐	☐	
	3	M055	Module L03M055	FRM-1	Module L03M055	☐	☐	☐	☐	
MAZZARIAU BL.1	3	M056	AHU 1	FRM-1	AHU 1	☐	☐	☐	☐	
MEZZAINNE BL.1	3	M057	Lift	FRM-1	Lift	☐	☐	☐	☐	
BL.1	3	M058	AV SPA	FRM-1	AV SPA	☐	☐	☐	☐	
Loop 4										
ROOF BL.1	4	D001	ROOF	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D003	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D004	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D005	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D006	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D007	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D008	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D009	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D010	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D011	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D012	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D013	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
ROOF BL.1	4	D014	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D015	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D016	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D017	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D018	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D019	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D020	ROOF	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D023	KID CLUB	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
1st.BL.2	4	D024	KID CLUB	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D025	KID CLUB	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D026	RETAIL SHOP	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D028	INDO-CHINA	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D031	LOBBY BAR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D033	ITTALIAN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D034	ITTALIAN	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D035	MAIN KITCHEN	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D036	MAIN KITCHEN	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D037	MAIN KITCHEN	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D039	GOLD KITCHEN	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D040	ITTALIAN	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D042	ROOM SERVICE	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D043	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D046	SERVER RACK STORE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	D047	ICE PRODUCT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D048	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D050	NO. 2201	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D051	NO. 2202	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D052	NO. 2203	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D053	NO. 2204	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D054	NO. 2205	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D055	NO. 2206	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D056	NO. 2207	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D057	NO. 2208	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	D058	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D060	HALL	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D062	NO. 2301	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D063	NO. 2302	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D064	NO. 2303	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D065	NO. 2304	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D067	NO. 2305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D069	NO. 2306	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D070	NO. 2307	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D071	NO. 2308	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	D072	HALL	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.2	4	D075	AHU ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.2	4	D076	LIFT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.2	4	D077	LIFT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D079	LIFT H1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D080	LIFT H2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D081	LIFT L1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	D082	LIFT L2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	M001	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.1	4	M002	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.1	4	M003	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.1	4	M004	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	M005	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.1	4	M006	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.1	4	M007	SHUT DOWN LIFT 1	FRM-1	SHUT DOWN LIFT 1	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.1	4	M008	SHUT DOWN LIFT 2	FRM-1	SHUT DOWN LIFT 2	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.1	4	M009	AHU PANEL	FRM-1	AHU PANEL	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.1	4	M010	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M011	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M012	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M013	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
1st.BL.2	4	M014	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M015	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M016	SHUT OFF LPG	FCM-1	SHUT OFF LPG	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M017	ANSUL HOOD 4	FMM-1	ANSUL HOOD 4	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.2	4	M018	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.2	4	M019	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.2	4	M020	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.2	4	M021	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.2	4	M022	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.2	4	M023	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	M024	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	M027	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.2	4	M028	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.2	4	M029	SV BUILDING2	FMM-1	SV BUILDING2	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.2	4	M030	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.2	4	M031	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	M032	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	M033	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.2	4	M034	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.2	4	M036	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
ROOF BL.2	4	M038	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.2	4	M039	AHU PANEL	FRM-1	AHU PANEL	☐	☐	☐	☐	
3 FL. B2	4	M040	SHUT DOWN LIFT 1	FRM-1	SHUT DOWN LIFT 1	☐	☐	☐	☐	
3 FL. B2	4	M041	SHUT DOWN LIFT 2	FRM-1	SHUT DOWN LIFT 2	☐	☐	☐	☐	
ROOF BL.2	4	M042	Stair	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M043	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M045	HALL MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M046	ITALIAN MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M047	MAIN KITCHEN MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M048	ROOM SERVICE MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M049	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.2	4	M050	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	M051	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.2	4	M052	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.2	4	M053	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
3rd.BL.2	4	M054	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
Main Kic BL.2	4	M057	ANSUL HOOD 2	FMM-1	ANSUL HOOD 2	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M058	ANSUL HOOD 1	FMM-1	ANSUL HOOD 1	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M059	GAS MAIN KITCHEN	FMM-1	GAS MAIN KITCHEN	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M060	ANSUL HOOD 3	FMM-1	ANSUL HOOD 3	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M061	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN PANEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M062	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN PANEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M063	SHUTOFFLPG INDOCHINA	FRM-1	SHUTOFFLPG INDOCHINA	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M064	GAS INDO CHINA	FMM-1	GAS INDO CHINA	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M065	GAS MAIN KITCHEN	FMM-1	GAS MAIN KITCHEN	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M066	AV PANEL	FRM-1	AV PANEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M067	SHUTOFF LPG MAIN KIT	FRM-1	SHUTOFF LPG MAIN KIT	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.2	4	M068	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
Loop 5										
TOILET 1	5	D002	TOILET 1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
TOILET 1	5	D003	TOILET 1	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
TOILET 1	5	D004	TOILET 1	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	D006	GENERATOR ROOM	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	D007	GENERATOR ROOM	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	D008	GENERATOR ROOM	FST-851-R	Heat(Fixed)	☐	☑	☑	☐	
BUIDING 12	5	D009	PUMP ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
1st.BL.12	5	D010	TRANSFORMER ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	D011	TRANSFORMER ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.12	5	D013	MDB ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.12	5	D014	MDB ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D019	EE. ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D021	NO. 3101	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D022	NO. 3102	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D023	NO. 3103	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D024	NO. 3104	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D025	NO. 3105	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D026	NO. 3106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D027	NO. 3106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	D028	NO. 3106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D030	EE. ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D032	NO. 3201	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D033	NO. 3202	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.3	5	D034	NO. 3203	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D035	NO. 3204	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D036	NO. 3205	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D037	NO. 3206	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D038	STORAGE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	D039	NO. 3207	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D041	EE. ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D042	NO. 3301	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.3	5	D043	NO. 3302	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.3	5	D044	NO. 3303	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D045	NO. 3304	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D046	NO. 3305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D047	NO. 3306	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D048	NO. 3306	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D049	NO. 3306	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	D051	LIFT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	D053	EE. ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	D054	NO. 5106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	D055	NO. 5104	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	D056	NO. 5105	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	D057	NO. 5103	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	D058	NO. 5102	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	D059	NO. 5101	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	D063	NO. 5201	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	D064	NO. 5202	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	D065	NO. 5203	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	D066	NO. 5204	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	D067	NO. 5205	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	D068	STORAGE ROOM	SDX-751	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	D069	NO. 5206	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	D072	NO. 5301	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	D073	NO. 5302	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	D074	NO. 5303	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.5	5	D075	NO. 5304	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	D076	NO. 5305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	D077	NO. 5305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	D078	NO. 5305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.14	5	D081	GARDEN STORAGE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D082	GARBAGE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D084	WASHING AREA	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
1st.BL.10-11	5	D085	WASHING AREA	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D086	WASHING AREA	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D087	WASHING AREA	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D089	WINE DISPENSE BAR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D091	SALAN&DESERT SECTION	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D092	TOILET (W)	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D093	TOILET (M)	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D095	BEACH RESTAURANT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D096	BEACH RESTAURANT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D097	BEACH RESTAURANT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	D098	BEACH RESTAURANT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.VILLA	5	D100	PANTRY	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.VILLA	5	D101	DINING AREA	FST-851-R	Heat(Rate of Rise)	☐	☑	☑	☐	
1st.VILLA	5	D102	SITTING AREA	FST-851-R	Heat(Rate of Rise)	☐	☑	☑	☐	
1st.VILLA	5	D103	INNER HALL	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.VILLA	5	D104	LIVING AREA	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.VILLA	5	D105	THAI MASSAGE	FST-851-R	Heat(Rate of Rise)	☐	☑	☑	☐	
1st.VILLA	5	D106	CORRIDOR	FST-851-R	Heat(Rate of Rise)	☐	☑	☑	☐	
2nd.VILLA	5	D107	BEDROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.VILLA	5	D108	CORRIDOR	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.VILLA	5	D109	SITTING ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.VILLA	5	D110	MASTER BEDROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.VILLA	5	D111	MASTER BEDROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
TOILET 1	5	M001	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
TOILET 1	5	M002	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
TOILET 1	5	M003	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
TOILET 1	5	M004	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
TOILET 1	5	M005	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
TOILET 1	5	M006	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	M007	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.12	5	M008	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	M009	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT B3	5	M010	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT B3	5	M011	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
	5	M012	Module L05M012	FZM-1	ZONE MONITOR	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT B3	5	M013	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN PANEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.3	5	M014	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.3	5	M016	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.3	5	M018	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.3	5	M019	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	M020	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	M021	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.3	5	M022	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN PANEL	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.3	5	M024	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.3	5	M025	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.3	5	M026	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	M027	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	M029	FAN PANEL	FRM-1	FAN PANEL	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.3	5	M031	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.3	5	M032	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.3	5	M033	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	M034	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	M035	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.3	5	M036	FAN PANEL	FRM-1	RELAY	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.3	5	M037	SHUT DOWN LIFT	FRM-1	RELAY	☐	☐	☐	☐	
	5	M038	Module L05M038	FRM-1	RELAY	☐	☐	☐	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
1st.BL.5	5	M039	STORAGE FS	FMM-1	STORAGE FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.5	5	M041	STORAGE SV	FMM-1	STORAGE SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.5	5	M042	STORAGE SV	FMM-1	STORAGE SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.5	5	M043	STORAGE TEL	FCM-1	STORAGE TEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.5	5	M044	STORAGE SPEAKER	FCM-1	STORAGE SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	M045	STORAGE SPEAKER	FCM-1	STORAGE SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
	5	M046	Module L05M046	FZM-1	ZONE MONITOR	☐	☐	☐	☐	
	5	M047	Module L05M047	FRM-1	RELAY	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.5	5	M048	SHAFT EE FS	FMM-1	SHAFT EE FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.5	5	M049	SHAFT EE SV	FMM-1	SHAFT EE SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.5	5	M050	SHAFT EE SPEAKER	FCM-1	SHAFT EE SPEAKER	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.5	5	M051	SHAFT EE SPEAKER	FCM-1	SHAFT EE SPEAKER	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.5	5	M052	SHAFT EE DUCT SMOKE	FZM-1	SHAFT EE DUCTSMOKE	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.5	5	M053	FAN PANEL	FRM-1	FAN PANEL	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.5	5	M055	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.5	5	M056	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.5	5	M057	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	M058	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	M063	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M064	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M065	ANSUL HOOD	FMM-1	ANSUL HOOD	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M066	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M067	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M068	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M069	SHUT OFF LPG	FRM-1	SHUT OFF LPG	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M070	GAS BUILDING10	FMM-1	GAS BUILDING10	☐	☐	☐	☐	
TOILET 1	5	M071	TOILET 1 MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	M072	GENERATOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.12	5	M073	TRANSFORMER MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT B3	5	M074	PUMP ROOM MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	M075	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.3	5	M076	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	M077	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	M078	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	M079	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.3	5	M080	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	M081	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.5	5	M082	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	M083	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.5	5	M084	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	M085	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.5	5	M086	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.14	5	M087	GARDEN STORAGE MAN	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	M088	BEACH RESTAURANT MAN	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	M089	BEACH RESTAURANT MAN	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
1st.BL.10-11	5	M090	BEACH RESTAURANT MAN	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.3	5	M091	DUCTSMOKE	FZM-1	DUCTSMOKE	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.3	5	M092	AHU PANEL	FRM-1	AHU PANEL	☐	☐	☐	☐	
2 FL. B12	5	M093	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☐	☐	☐	
2 FL. B12	5	M094	STROBE LIGHT	FCM-1	STROBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.10-11	5	M095	FRESHAIR PANEL	FRM-1	FRESHAIR PANEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M096	EXHAUST FAN PANEL	FRM-1	EXHAUST FAN PANEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.10-11	5	M100	AV PANEL	FRM-1	AV PANEL	☐	☐	☐	☐	
1st.VILLA	5	M101	MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BEACH VILLA	5	M102	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
BEACH VILLA	5	M103	STROBE	FCM-1	STROBE	☐	☑	☑	☐	
Loop 6										
TOILET 2	6	D002	TOILET 2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
TOILET 2	6	D003	TOILET 2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
TOILET 2	6	D004	TOILET 2	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BL.13	6	D005	BUTLER ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 4	6	D006	PUMP ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 4	6	D007	PUMP ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 4	6	D008	PUMP ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 4	6	D009	PUMP ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
BUILDING 4	6	D010	PUMP ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D012	EE. ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D014	NO. 4101	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D015	NO. 4102	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D016	NO. 4103	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D017	NO. 4104	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D018	NO. 4105	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
1st..BL.4	6	D019	NO. 4106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D020	NO. 4106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st..BL.4	6	D021	NO 4106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D023	STORAGE	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D025	NO. 4201	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D026	NO. 4202	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D027	NO. 4203	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D028	NO. 4204	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D029	NO. 4205	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D030	NO. 4206	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	D031	STORAGE ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.4	6	D032	NO. 4207	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	D034	EE. ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	D036	NO. 4301	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	D037	NO. 4302	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	D038	NO. 4303	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	D039	NO. 4304	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	D040	NO. 4305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	D041	NO. 4306	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	D042	NO. 4306	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	D043	NO. 4306	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	D045	LIFT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	D053	EE. ROOM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	D055	NO. 6106	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	D056	NO. 6105	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	D057	NO. 6104	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	D058	NO. 6103	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	D059	NO. 6102	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	D060	NO. 6101	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
2nd.BL.6	6	D063	NO. 6201	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	D064	NO. 6202	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	D065	NO. 6203	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	D066	NO. 6204	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	D067	NO. 6205	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	D068	STORAGE ROM	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.6	6	D069	NO. 6206	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	D072	NO. 6301	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	D073	NO. 6302	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	D074	NO. 6303	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	D075	NO. 6304	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	D076	NO. 6305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	D077	NO. 6305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	D078	NO. 6305	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.7	6	D079	JARAT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.7	6	D080	JARAT	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.7	6	D081	ห้องครัว JARAT	FST-851	Heat (Fix)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.8	6	D082	BATH ROOM Villa 8	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.8	6	D083	MASTER BED ROOM Vil8	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.8	6	D084	LIVING Villa 8	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.9	6	D085	BATH ROOM Vil9	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.9	6	D086	MASTER BED ROOM Vi9	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.9	6	D087	LIVING Vil9	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.7	6	D088	Kitchen Room	FSP-851	Smoke(Photo)	☐	☐	☐	☐	
TOILET 2	6	M001	TOILET 2 FS	FMM-1	TOILET 2 FS	☐	☐	☐	☐	
TOILET 2	6	M002	TOILET 2 FS	FMM-1	TOILET 2 FS	☐	☐	☐	☐	
TOILET 2	6	M003	TOILET 2 SV	FMM-1	TOILET 2 SV	☐	☐	☐	☐	
TOILET 2	6	M004	TOILET 2 SV	FMM-1	TOILET 2 SV	☐	☐	☐	☐	
TOILET 2	6	M005	TOILET 2 SPEAKER	FCM-1	TOILET 2 SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
TOILET 2	6	M006	TOILET 2 STOBE LIGHT	FCM-1	TOILET 2 STOBE LIGHT	☐	☑	☑	☐	
BUTLER BL.13	6	M007	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT BL.4	6	M008	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT BL.4	6	M009	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
PUMP ROOM BL.4	6	M011	EXHAUST	FRM-1	EXHAUST	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.4	6	M012	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.4	6	M013	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.4	6	M014	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.4	6	M015	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.4	6	M016	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.4	6	M017	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.4	6	M018	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	M022	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.4	6	M023	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.4	6	M024	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.4	6	M025	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.4	6	M026	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	M027	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	M028	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.4	6	M029	AHU	FRM-1	AHU	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	M031	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	M032	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	M033	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	M034	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	M035	DUCT SMOKE	FZM-1	ZONE MONITOR	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.4	6	M036	SHUT DOWN LIFT	FRM-1	SHUT DOWN LIFT	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.6	6	M039	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.

526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : mpb-eng03@magpiez.com

Device Tests Record of Fire Alarm System for โครงการ Intercontinental Hua-Hin ครั้งที่ 2 ปี 2569

Floor	Loop No.	Add. No.	Location	Model	Device type	VISUAL	FUNCTIONAL	PASS	FAULT	Remark
BASEMENT1 BL.6	6	M040	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.6	6	M041	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.6	6	M042	EXHAUST	FRM-1	EXHAUST	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.6	6	M043	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
BASEMENT1 BL.6	6	M044	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	M045	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.6	6	M046	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.6	6	M047	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.6	6	M048	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.6	6	M049	TEL	FCM-1	TEL	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.6	6	M050	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	M051	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	M052	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.6	6	M054	AIR	FRM-1	RELAY	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.6	6	M056	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.6	6	M057	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.6	6	M058	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	M059	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	M060	DUCT SMOKE	FZM-1	DUCT SMOKE	☐	☐	☐	☐	
2nd.BL.6	6	M061	AHU PANEL	FRM-1	AHU PANEL	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.6	6	M063	FS	FMM-1	FS	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.6	6	M064	SV	FMM-1	SV	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.6	6	M065	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	M066	SPEAKER	FCM-1	SPEAKER	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.7	6	M070	BATH ROOM FS	FMM-1	BATH ROOM FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.7	6	M071	BATH ROOM SV	FMM-1	BATH ROOM SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.8	6	M074	BATH ROOM FS	FMM-1	BATH ROOM FS	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.8	6	M075	BATH ROOM SV	FMM-1	BATH ROOM SV	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.8	6	M076	BATH ROOM SPEAKER	FCM-1	BATH ROOM SPEAKER	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.9	6	M078	BATH ROOM FS	FMM-1	MONITOR	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.9	6	M079	BATH ROOM SV	FMM-1	MONITOR	☐	☐	☐	☐	
1st.BL.9	6	M080	BATH ROOM SPEAKER	FCM-1	CONTROL	☐	☐	☐	☐	
	6	M081	Module L06M081	FRM-1	RELAY	☐	☐	☐	☐	
TOILET T2	6	M082	TOILET 2 MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT BL.4	6	M083	PUMP ROOM MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.4	6	M084	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☐	☐	☑	อุปกรณ์เสีย
1st.BL.4	6	M085	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	M086	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.4	6	M087	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	M088	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.4	6	M089	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT1 BL.6	6	M090	PUMP ROOM 1 MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
BASEMENT2 BL.6	6	M091	PUMP ROOM 2 MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	M092	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
1st.BL.6	6	M093	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	M094	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
2nd.BL.6	6	M095	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
3rd.BL.6	6	M096	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
	6	M097	CORRIDOR MANUAL	NBG-12LX	MANUAL	☐	☑	☑	☐	
	6	M100	Shut Off Solenoi	FRM-1	RELAY	☐	☐	☐	☐	
	6	M101	Alarm Fire Suppressi	FMM-1	MONITOR	☐	☐	☐	☐	
3rd.BL.6	6	M102	Alarm Gas Leak	FMM-1	MONITOR	☐	☐	☐	☐	

Inspector 's by : Mr.Krailas Thepsri
Date : 18-06-69

Approved by :
Date :

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

ทดสอบการทำงานของตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel




MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com


ทดสอบการทำงานของตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel






MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

ทดสอบการทำงานของ Computer Graphic

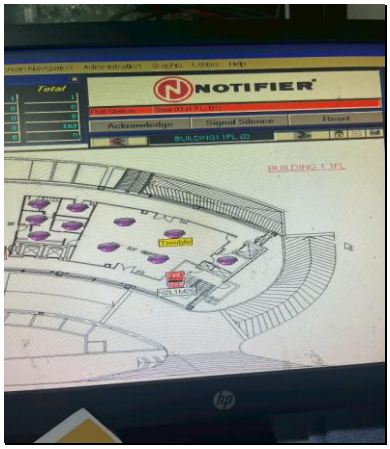

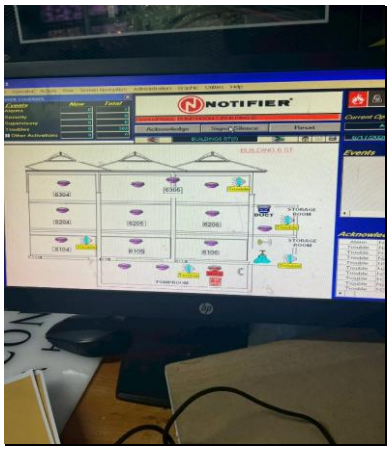


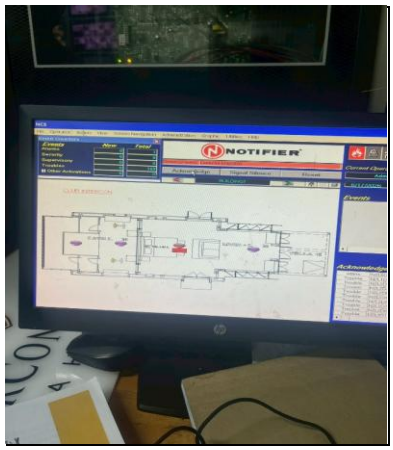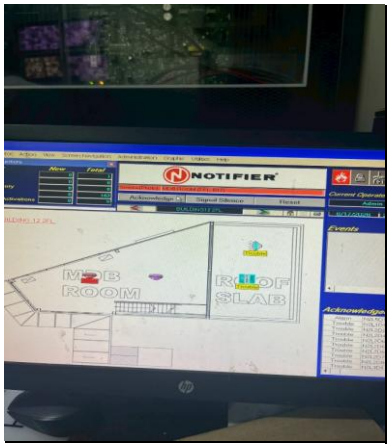

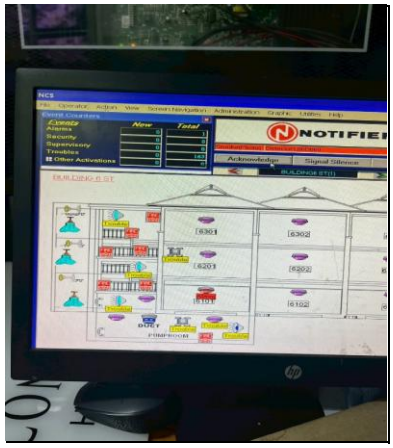
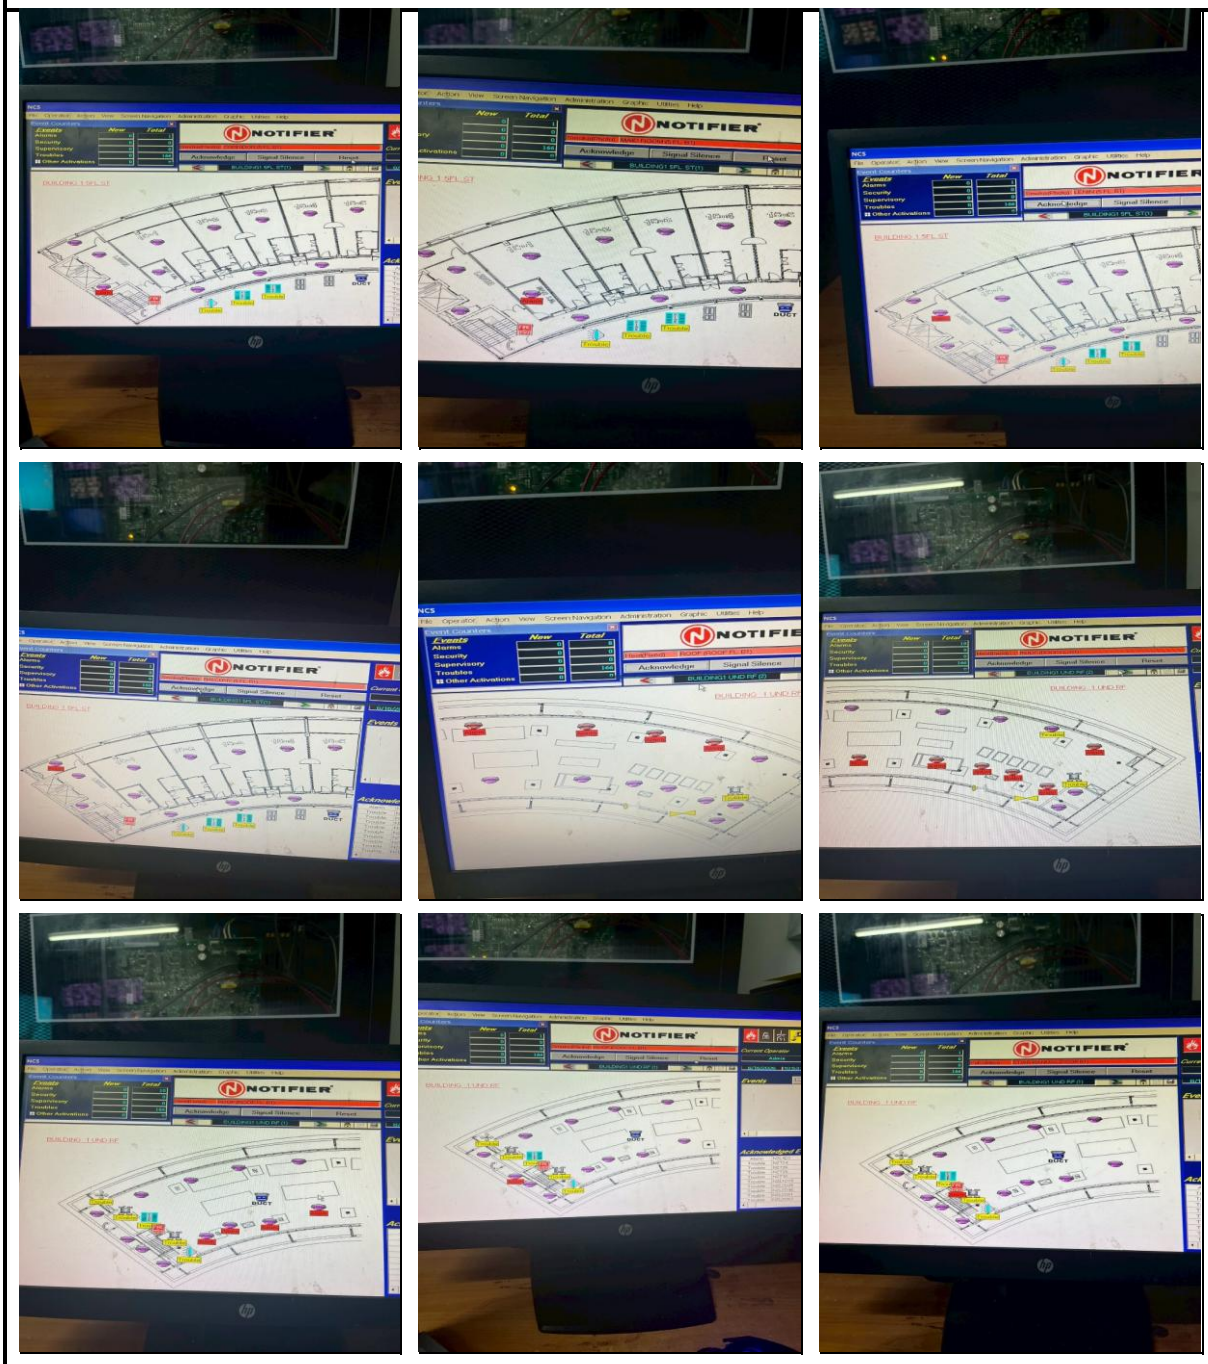
MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

ทดสอบการทำงานของ Computer Graphic

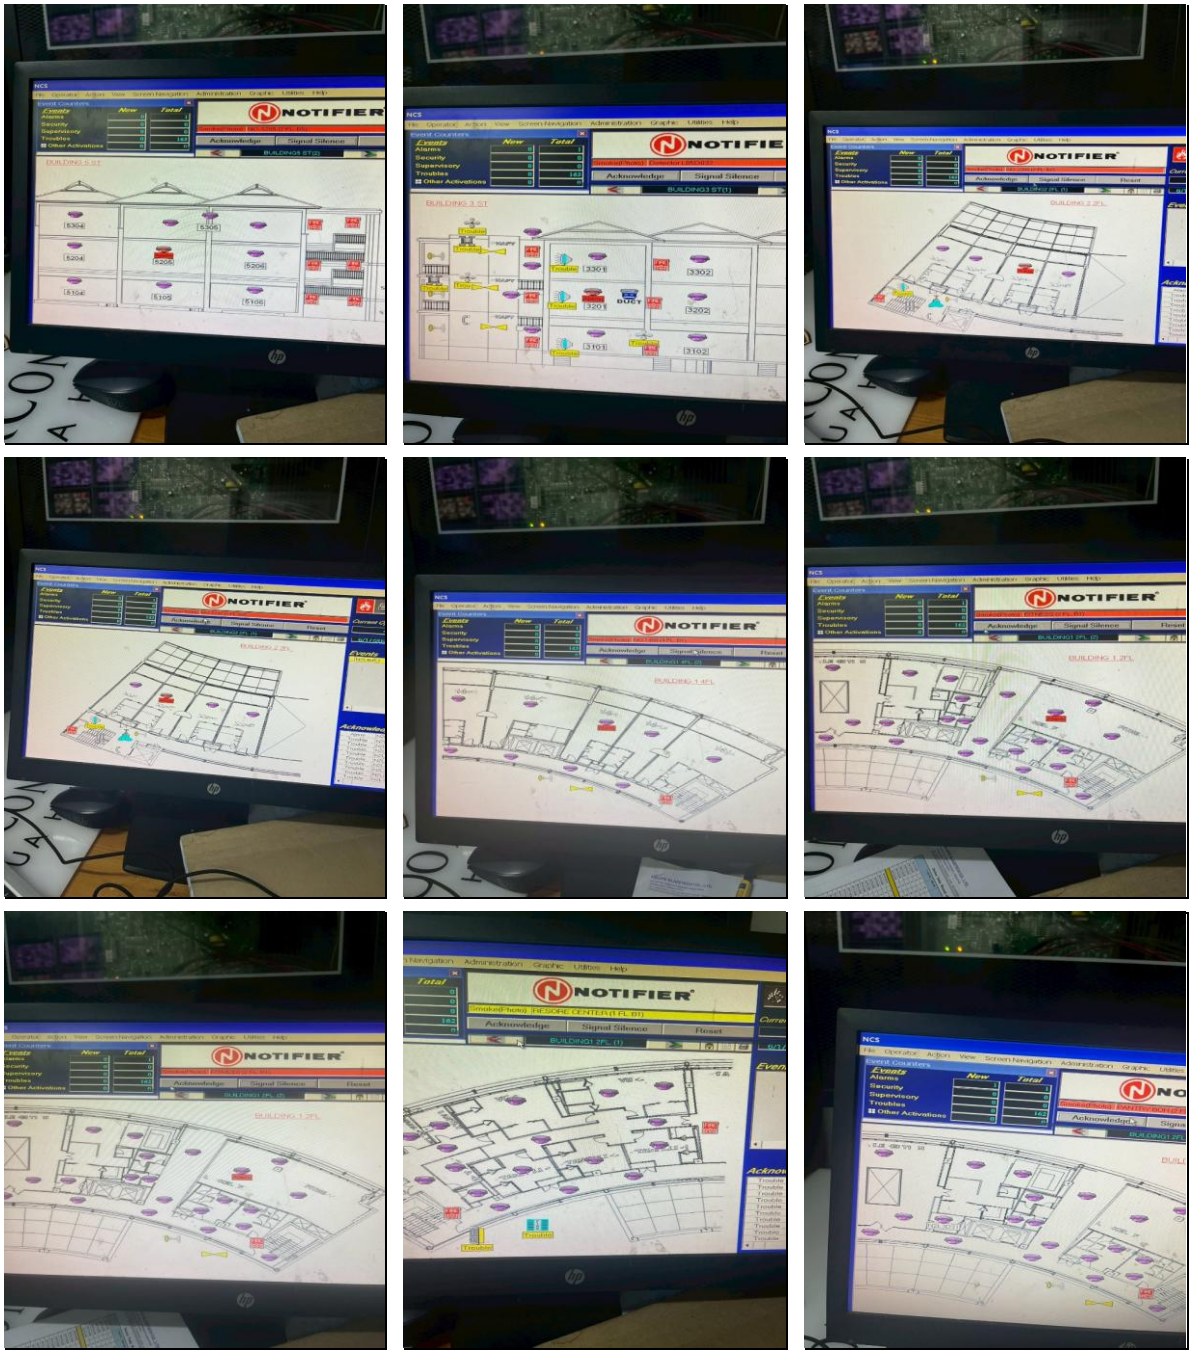


MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com


ทดสอบการทำงานของ Computer Graphic





MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com


ทดสอบการทำงานของ Graphic Annunciator

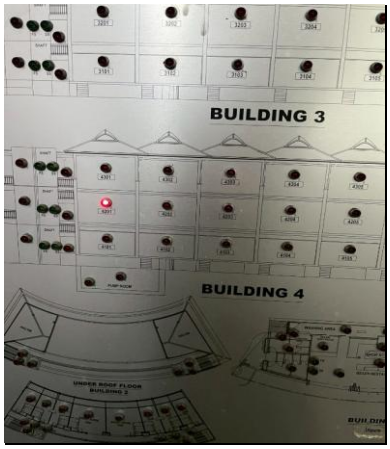


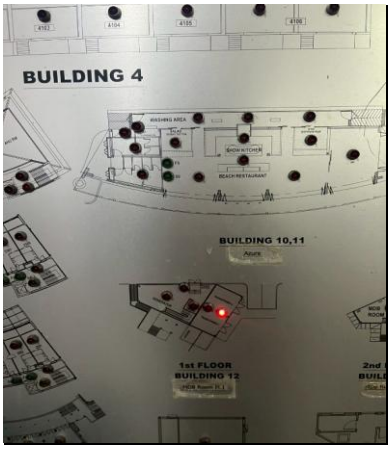


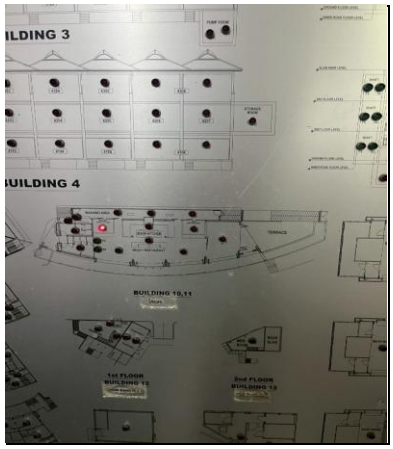


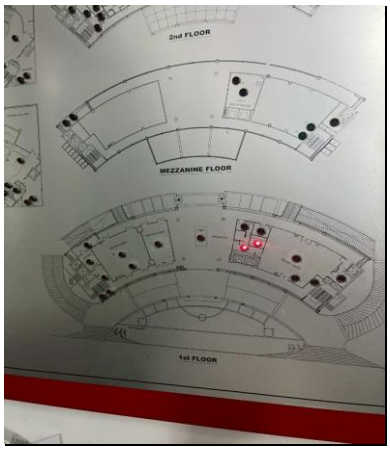


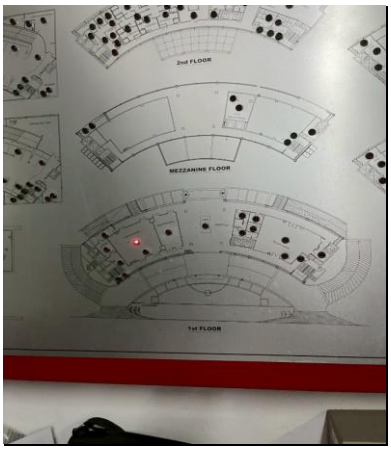

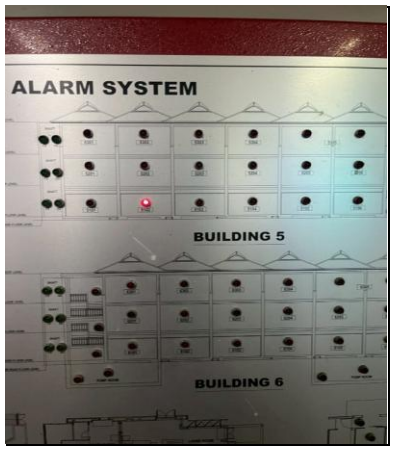

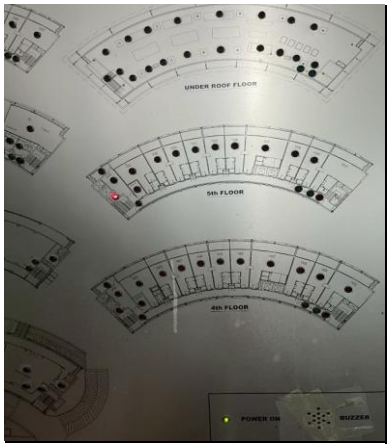

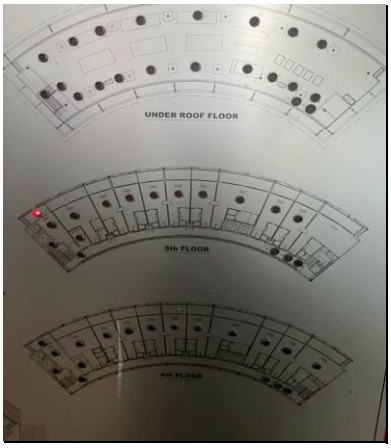

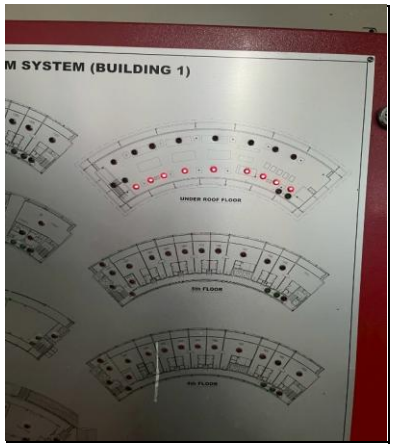

MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Detector , Heat Detector
















MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Detector , Heat Detector



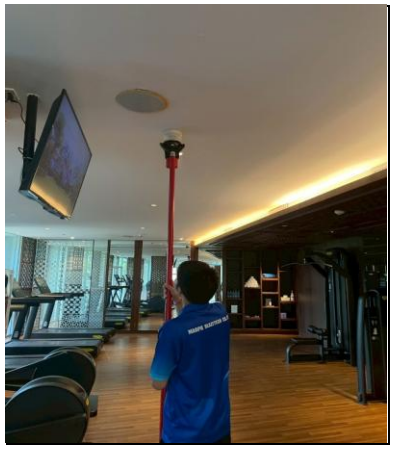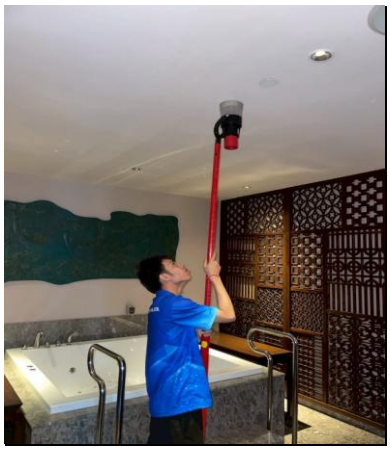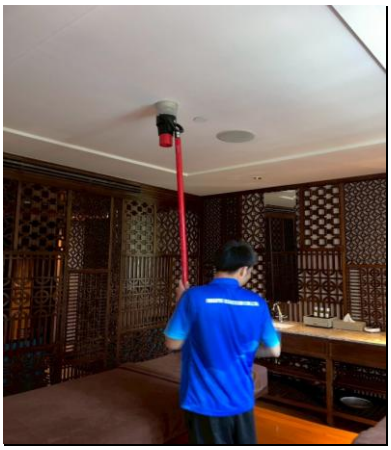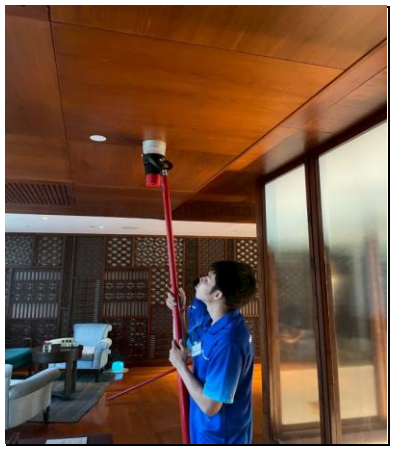


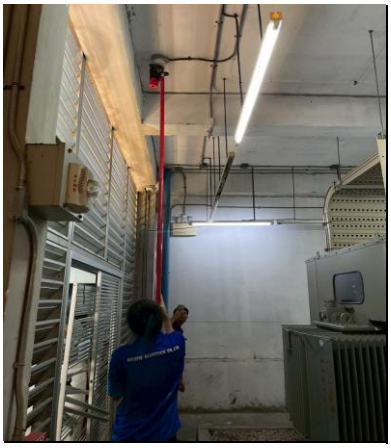



MAGPIE BLAZETECH CO., LTD.
526-528 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 0-2934-6267-9 Fax : 0-2934-6270 e-mail : magpiez@ksc.th.com

ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Station

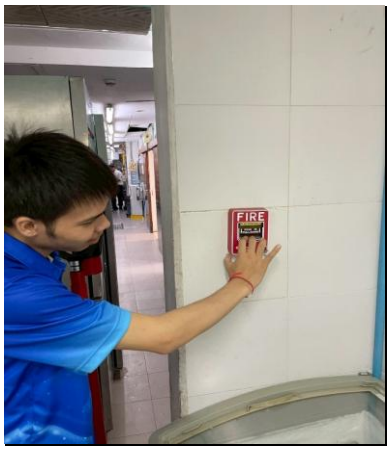






Inspector ' s : Mr.Krailas Thepsri

Date : 18-06-69

สำเนาสัญญาการดูแลต้นไม้

AGREEMENT FOR MAINTENANCE GARDEN

AT INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2569

THIS AGREEMENT IS DATED THE FIRST OF JANUARY 2026

ระหว่าง :

BETWEEN :

(1) หจก.ธนกรแลนด์สเคป์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703558000904 สำนักงานเลขที่ 550/45 หมู่ที่ 4 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

THANAKORN LANDSCAPE LIMITED PARTNERSHIP Tax payer Indentification Number 0703558000904 Whose registered branch office is at 550/45 Mou 4 Tumbol Wangpong Umpor Pranburi Prachuap Khiri Khan 77120

(2) บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (โดย โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท) สาขา 00002 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-49060-27-1 สำนักงานเลขที่ 33/33 หมู่บ้านหนองแก ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

PROUD RESORT HUA HIN CO.,LTD.(BY INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT) Branch 00002 Tax payer Identification Number 0-1055-49060-27-1 Whose registered branch office is at 33/33 soi Moobannongkae Petchkasem Road, Hua Hin, Prachuabkirikhan. 77110

เริ่มวันที่ : 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Commencement Date : 1 January 2026 to 31 December 2026

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

Partners agree on the contract according to these following objectives and conditions.

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดูแลรักษาสวน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "งานดูแลรักษาสวน" ภายในพื้นที่ INTERCONTINENTAL Hua Hin Resort, พื้นที่ INTERCONTINENTAL Hua Hin Resort – Bluport Wing และพื้นที่ 111 Social Club Huahin ซึ่งในสัญญานี้จะเรียกว่า "พื้นที่ดูแล"

Employer agrees to employ and employee agrees to be employed maintenance of gardens, which will be called "Caring Job" in the followings. And the area of INTERCONTINENTAL Hua Hin Resort and INTERCONTINENTAL Hua Hin Resort – Bluport Wing and 111 Social Club Huahin will be called "Cared Area".

ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินการ รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพมาตรฐานในการทำงานดูแลรักษาสวน ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น ส่วนการจัดหาน้ำ และกระแสไฟฟ้าสำหรับการทำงานดูแลรักษาสวน ตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ

Employee agrees to be the one who provide equipments for the process, including pesticides and chemical fertilizers that are qualified for gardening. For the expenses, employee will be the one who is in charge. For the providing of water supply and electricity using in maintenance of garden, employer will be the one who is responsible according to the contract.

ข้อ 3. ในการดูแลรักษาสวน ผู้ว่าจ้างจะอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถให้บริการดูแลได้ตามสัญญาดังนี้

In maintenance garden employer will provide followings in order for employee to be able to continue the process.

3.1 น้ำสำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์

Water supply for cleaning the equipment.

3.2 พื้นที่เท่าที่จำเป็นสำหรับเก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์ในการดูแล

Necessary area for keeping the equipments.

ข้อ 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)

The period of working process is from 7 AM to 4 PM (1 hour lunch break)

ข้อ 5. ขอบเขตของงาน

The scope of work.

ขอบเขตของงานดูแลรักษาสวน ดังนี้

5.1 ดูแลรักษาสวนให้เป็นไปตามรูปแบบสวนเดิม

Maintenance the garden to be in line with its original form.

5.2 งานปรับปรุงสวน เช่น ปลูกซ่อมต้นไม้/ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้เดิมที่ทรุดโทรม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าพรรณไม้ที่นำมาปลูกและในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้รับจ้างเห็นควรปรับปรุงรูปแบบสวนและ/หรือพันธุ์พืช ที่จะเปลี่ยนแปลงเสนอผ่านผู้จัดการโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

Gardens improving works such as cultivating and repairing plants/cultivating substitute plants. The declined former plants are in responsible of employee but employer will maintenance of the expenses for the plants that are brought to cultivate. In the event of the Employer and/or the Employee Considers to change any form and/or any kind of cultivated plants, the employee shall purpose a new design Of such form and/or plants to the Employer through the GM of Intercontinental Hua Hin Resort for the approval.

5.3 งานประจำ ได้แก่ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า สับขอบหญ้าและกำจัดวัชพืช

Routine works such as watering the plants, trimming the plants, cutting the grass, getting rid of weeds.

5.4 ตัดหญ้าเดือนละ 3 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม

Mow twice a month or any optimal time.

5.5 ใส่ปุ๋ย เดือนละ 2 ครั้ง

Fertilize twice a month.

5.6 ฉีดยาฆ่าแมลงเดือนละ 2 ครั้ง หรือ มากกว่านี้ตามความเหมาะสม หรือใส่สารเคมีรักษาโรคพืช กรณีมีโรคและแมลงมาทำลายต้นไม้

Use pesticide twice a month or more if the diseases or insects occur.

ข้อ 6. วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาสวน

Equipments

6.1 ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เคมี

Chemical fertilizers and Organo-chemical fertilizers.

6.2 ฮอร์โมนพืช, สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง

Plant hormones and pesticides.

6.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาสวน เช่น เลื่อย ขวาน มีด จอบ เสียม รถเข็นขยะ ฯลฯ

Equipments for maintenance of gardens such as saws, axes, knives, hoes, shovels, wheelbarrows.

6.4 เครื่องตัดหญ้าสามารถเก็บเศษหญ้าได้

Lawnmower that is able to keep the grass pieces.

6.5 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

The carry-on-the-shoulder lawnmower.

6.6 เครื่องตัดแต่งต้นไม้ทรงพุ่มต่างๆ

The shrub-form plants trimming with engine power.

6.7 เครื่องฉีดยาฆ่าแมลงแบบใช้แรงดันสูง

The pesticide spraying machine with high pressured power.

6.8 เครื่องฉีดยาแบบสะพายหลังใช้เครื่องยนต์

The carry-on-the-shoulder pesticide spraying machine with engine power.

6.9 กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดแต่งพุ่ม ด้วยมือ

Scissors for cutting the branch and trimming the bush by hand.

6.10 เลื่อยยนต์

Chainsaw.

6.11 สายยางรดน้ำ

Hose.

6.12 รถยนต์เพื่อขนเศษวัสดุใบไม้และหญ้านำไปทิ้ง

Car for discarding garbage (such as pieces of leaves and grass).

6.13 และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการดูแลรักษาสวนและต้นไม้

Other equipments using in gardening.

วัสดุอุปกรณ์ตามข้อ 6.1-6.13 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

The equipments from 6.1 to 6.13 employee will be provide for the caring job.

ข้อ 7. พนักงานที่รับผิดชอบ

Responsible workers

7.1 ผู้ตรวจงาน 1 คน (ตรวจงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

Examiner (come examining twice a week)

7.2 หัวหน้างาน 1 คน

Foreman

7.3 รองหัวหน้างาน - คน

Deputy Chief

7.4 คนสวน 8 คน

8 Gardeners

7.5 พนักงานที่รับผิดชอบดูแลสวนรวมต่อวันประมาณ 9 คน(พนักงานผลัดกันหยุดคนละ 1 วันต่อสัปดาห์)

9 workers who responsible in maintenance garden a day (Workers shift in taking break 1 day a week individually)

7.6 ชุดฟอร์ม เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเขียวมีชื่อ "ธนกรแลนด์สเคป" ที่ด้านหลัง กางเกงผ้ามันสวมรองเท้ายางหรือบูท

Uniform: Green long-sleeves T-shirt embedded "THANAKORN LANDSCAPE" In the back. Long pants. Galosshes or boots.

ข้อ 8. การรับประกัน

Guarantees.

8.1 ในการรับประกันผลงานได้แก่ ความเสียหายอันเนื่องจากความบกพร่องของพนักงานที่ดูแลสวน เช่น

Guaranteeing the works such as damages from worker's errors which are such followings.

8.1.1 มีโรคและแมลงเข้ามาทำลายจนทำให้ต้นไม้ต่างๆ ตายไป

Deceases and insects occur and damage the plants causing them to death.

8.1.2 ใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงมากเกินไปทำให้ต้นไม้ต่างๆ ตาย

Using too much fertilizers or pesticides causing plants to death.

8.1.3 รดน้ำมากเกินไปทำให้ต้นไม้ต่างๆ เน่าตาย

Too much watering causing plants to death.

8.1.4 ความบกพร่องอื่นๆ

Other errors.

ข้อ 9. การไม่รับประกันผลงานได้แก่

Apart from guarantees.

9.1 อุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น

Natural disasters such as

9.1.1 ฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ทำให้ต้นไม้ตาย

Continuing long-time heavy rain cause plants to death. ✓

9.1.2 น้ำท่วม

The flood

9.1.3 มีพายุทำให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้ต่างๆ

Storms damaging the plants.

9.1.4 ไฟไหม้

Fire.

9.2 ในการดูแลสวนถ้าผู้ว่าจ้างไม่สามารถหาน้ำที่จะมารดต้นไม้ได้ และไม่ได้รดน้ำทำให้ต้นไม้เกิดความเสียหายและตาย

In the process, if the employer can't find a water and didn't watering the plants so the plants withered and died.

ข้อ 10. งบประมาณในการดูแล

Budget.

การดูแลรักษาสวนของโรงแรม INTERCONTINENTAL hua hin resort, INTERCONTINENTAL hua hin resort – bluport wing และ 111 Social Club Huahin พื้นที่ทั้งหมด เดือนละ 175,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่ากับ 12,285 บาท รวมเป็นเงิน 187,785 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวทุกวันสิ้นเดือน

The whole-area gardening of INTERCONTINENTAL hua hin resort, INTERCONTINENTAL hua hin resort – bluport wing and 111 Social Club Huahin costs 175,500 bath a month taxes 7% = 12,285 bath Total 187,785 bath(one hundred and eighty seven thousand seven hundred and eighty five bath) and the wage will be paid at the last day of the month.

ข้อ 11. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ในสัญญานี้ถ้าถึงกำหนดสัญญาไม่มีการยกเลิกสัญญา สัญญาจะต่อโดยอัตโนมัติหรือถ้ายกเลิกสัญญาก่อนกำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าก่อน 1 เดือน

This contract inure for the period of 12 month , from 1 January 2025 I approaching the date of agreement, there will be no cancellation of the contract, the contract will automatically extend. If wishing to cancel the contract before the date of agreement, must inform employee a month ahead. ✓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอด และเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

This contract is copied in two which contain similarity in every single word. Both of the partners of contract have read it all and share same understanding. So there be signature in front of the witness and each will keep one copy of the contract.

เอกสารแนบท้ายสัญญา

Topic to add in contract

ข้อ 12. ผู้ตรวจงานเข้าตรวจงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 4 ครั้งและส่งรายงานทุกวันศุกร์

Have the meeting with hotel 4 time / week and have report on Friday

ข้อ 13. จัดให้มีระบบโรงเรือนเพาะชำเพื่อผลิตพันธุ์ไม้สำหรับใช้ตกแต่งพื้นที่โรงแรมฯ

Have Nursery at Dormitory for plants.

ข้อ 14. พันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่งพื้นที่โรงแรมฯ ประมาณ 90% ได้มาจากการจัดการในข้อ 13.

Hotel use 90% tree form plant.

ข้อ 15. ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน 10% จากผู้รับจ้างหากงานดูแลสวนมีความบกพร่อง

Deduct 10% from contract if garden not good condition.

ข้อ 16. แต่ละเดือนจะมีการตรวจสอบผลงานโดย EAM และ DENG

Once month have inspection with EAM and DENG and have report as well.

ข้อ 17. ผู้รับจ้างไม่รับประกันต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นขุดล้อมที่ปลูกใหม่ ได้แก่ ต้นเสม็ดแดงในพื้นที่วิลล่า 8 และต้นไม้ยืนต้นในงานภูมิทัศน์ที่จัดใหม่พื้นที่ฝั่งบลูพอท เนื่องจากเป็นไม้ขุดล้อมที่ปลูกใหม่เป็นระยะเวลาเพียง 4-5 เดือน

The contractor does not guarantee newly planted trees, such as The Red paper bark tree, in the Villa 8 and newly planted trees in the Bluport Wing area. Because it is a newly planted tree that has been planted for only 4-5 months.

Duly authorized for and on behalf of

INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT.

PROUD RESORT HUA HIN CO.,LTD.

บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด
PROUD RESORT HUA-HIN CO.,LTD.

ลงนาม .....ผู้ว่าจ้าง

(Khun. Sabrina Hofstetter)

General Manager

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารแลนด์สเคป THANAKORN LANDSCAPE LIMITED PARTNERSHIP

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(Mr. Boontum Usuwan)

Thanakorn Landscape Limited Partnership

ลงนาม..... พยาน

(Ms.Sarinya Keadsurat)

Cluster Director of Finance and Business Support

ลงนาม..... พยาน

(Mr.Chookiat Waharoo)

Director of Engineer

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการขนย้ายมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-17764/69

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เทศบาลนครหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับเงินจาก **บริษัทพราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,800.00	ประจำเดือน เมษายน2569 - พฤษภาคม2569
	ที่อยู่ 33/33 ม.หนองแก ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์		
	รวมเงิน	**7,800.00**	
ตัวอักษร (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางบุญยืน หญ้างวงช้าง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน : 7,800.00 บาท

เลขที่ 00021127 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

รวม : 7,800.00 บาท

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-17760/69

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เทศบาลนครหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับเงินจาก **บริษัทพราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	800.00	ประจำเดือนเมษายน2569 - พฤษภาคม2569
	ที่อยู่ 8/88 ม.หนองแก ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์		
	รวมเงิน	**800.00**	
ตัวอักษร (แปดร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางบุญยืน หญ้างวงช้าง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน : 800.00 บาท

เลขที่ 00021127 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

รวม : 800.00 บาท



ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๑๕๔๓ สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๒๑)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑.	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๒.	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๓.	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๔.	เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๕.	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๖.	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๗.	เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๘.	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๙.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๐.	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๑.	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๒.	เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
	รวม	**จำนวน**	**๔๖,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖
www.huahin.go.th



ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๑๖๗

สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๖๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๘๒)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑.	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๒.	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๓.	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๔.	เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๕.	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๖.	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๗.	เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๘.	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๙.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๐.	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๑.	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๒.	เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
	รวม	**จำนวน**	**๔,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖
www.huahin.go.th

ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๖๕๓

สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๖๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๒๑)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑.	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๒.	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๓.	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๔.	เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๕.	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๖.	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๗.	เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๘.	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๙.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๐.	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๑.	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๒.	เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
	รวม	**จำนวน**	**๔๖,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้

โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖

www.huahin.go.th



ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๑๖๘๗

สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๘๒)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑.	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๒.	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๓.	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๔.	เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๕.	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๖.	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๗.	เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๘.	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๙.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๐.	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๑.	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๒.	เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
	รวม	**จำนวน**	**๔,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖
www.huahin.go.th

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-07578/69

วันที่ 19 มกราคม 2569

เทศบาลนครหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับเงินจาก **บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด** สาขา 00002

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,800.00	ประจำเดือน ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
	ที่อยู่ 33/33 ช.หมู่บ้านหนองแก ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์		
	รวมเงิน	**7,800.00**	
ตัวอักษร (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางบุญยิน หญ้างวงช้าง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน : 7,800.00 บาท

เลขที่ 00020236 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569

รวม : 7,800.00 บาท

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-07580/69

วันที่ 19 มกราคม 2569

เทศบาลนครหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับเงินจาก **บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	800.00	ประจำเดือน ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
	ที่อยู่ 8/88 หมู่บ้านหนองแก ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์		
	รวมเงิน	**800.00**	
ตัวอักษร (แปดร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางบุญยืน หญ้างวงช้าง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน : 800.00 บาท

เลขที่ 00020236 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569

รวม : 800.00 บาท



ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๑๕๗

สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๒๑)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑.	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๒.	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๓.	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๔.	เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๕.	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๖.	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๗.	เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๘.	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๙.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๐.	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๑.	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๒.	เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
	รวม	**จำนวน**	**๔๖,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖
www.huahin.go.th



ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๑๖๘

สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๘๒)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑.	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๒.	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๓.	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๔.	เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๕.	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๖.	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๗.	เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๘.	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๙.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๐.	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๑.	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๒.	เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
	รวม	**จำนวน**	**๔,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖
www.huahin.go.th

ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๑๕๔๗

สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๒๑)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑.	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๒.	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๓.	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๔.	เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๕.	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๖.	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๗.	เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๘.	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๙.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๐.	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๑.	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
๑๒.	เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๓,๙๐๐	บาท
	รวม	**จำนวน**	**๔๖,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖
www.huahin.go.th

ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๑๖๘

สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๑๐

๖๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท พราวรีสอร์ท หัวหิน จำกัด (๘๒)

ตามที่เทศบาลนครหัวหินได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นั้น

สำหรับอาคาร หรือเคหะสถานของท่าน มีปริมาณขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

๑. เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๒. เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๓. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๔๐๐	บาท
๔. เดือน มกราคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๕. เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๖. เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๗. เดือน เมษายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๘. เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๙. เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๐. เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๑. เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
๑๒. เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน	๔๐๐	บาท
รวม	**จำนวน**	**๔,๘๐๐**	**บาท**

A/P POSTED

ขอให้ท่านนำเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามที่แจ้งไปชำระกับเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลนครหัวหิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจีรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๕๖
www.huahin.go.th

สำเนารับรองการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

สำเนาเอกสารการใช้น้ำ การล้างถังน้ำใช้ และการตรวจสอบระบบท่อน้ำประปา

SOUTH SIAM
POOL SERVICE

วันที่ 21 มีนาคม 2569

เรื่อง **ส่งงานล้างแท้งค์**

เรียน **หัวหน้าช่าง**

สำเนาเรียน **หัวหน้าแผนกจัดซื้อ**

โรงแรม อินเตอร์คอน หัวหิน

บริษัท เซ้าท์ สยามพูล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดส่งทีมงานเข้ามา**ล้างแท้งค์** ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

1.ทำการดูดตะกอนเบาออกทิ้ง ณ จุดท่อน้ำทิ้ง

2.ทำการตักตะกอนหนักใส่ถุงออกมาทิ้งด้านนอก

3.ทำการฉีดล้างทำความสะอาดและทำการฆ่าเชื้อ

4. เก็บงาน ส่งงาน

ทางบริษัท เซ้าท์ สยามพูล เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการ**ล้างแท้งค์** ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณารับงาน

....

(**หัวหน้าช่าง**) (นางสาววรรณภา ห่วงนาค)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เซ้าท์ สยามพูล เซอร์วิส จำกัด

SOUTH SIAM
POOL SERVICE













บริษัท เซ้าท์สยาม พูล เซอร์วิส จำกัด 23 หมู่ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Tel. 087-8277499,098-2613902,089-7445296,092-587595 fax 032-900577 E-Mail SOUTHSIAM POOL.2014 @Gmail

SOUTH SIAM
POOL SERVICE













บริษัท เซ้าท์สยาม พูล เซอร์วิส จำกัด 23 หมู่ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel. 087-8277499,098-2613902,089-7445296,092-587595 fax 032-900577 E-Mail SOUTHSIAM POOL.2014 @Gmail.

SOUTH SIAM
POOL SERVICE













บริษัท เซ้าท์สยาม พูล เซอร์วิส จำกัด 23 หมู่ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Tel. 087-8277499,098-2613902,089-7445296,092-587595 fax 032-900577 E-Mail SOUTHSIAM POOL.2014 @Gmail.

SOUTH SIAM
POOL SERVICE













บริษัท เซ้าท์สยาม พูล เซอร์วิส จำกัด 23 หมู่ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Tel. 087-8277499,098-2613902,089-7445296,092-587595 fax 032-900577 E-Mail SOUTHSIAM POOL.2014 @Gmail.

SOUTH SIAM
POOL SERVICE













บริษัท เซ้าท์สยาม พูล เซอร์วิส จำกัด 23 หมู่ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Tel. 087-8277499,098-2613902,089-7445296,092-587595 fax 032-900577 E-Mail SOUTHSIAM POOL.2014 @Gmail.

SOUTH SIAM
POOL SERVICE










บริษัท เซ้าท์สยาม พูล เซอร์วิส จำกัด 23 หมู่ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel. 087-8277499,098-2613902,089-7445296,092-587595 fax 032-900577 E-Mail SOUTHSIAM POOL.2014 @Gmail.

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน

ที่ .....

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 1387

สัมฤทธิ์ เทศทอง

เลขที่ 318/71 หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

081-9113305 , 089-2476265 , 081-3780129

รับสูบน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) เรียกใช้ได้ทุกเวลา

นาม.....ที่อยู่.....

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2569

INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT
Good Received

Receiving Dept	Department Sign
Date:	Date: 26/8/26

คิดเป็นเที่ยว เที่ยวละ 2,000 บาท

จำนวนรถ 1 รถ


A/P POSTED

จำนวนบ่อ - บ่อละ - บาท

งานหมา - บาท

รวมเงิน 2,000 บาท ตัวอักษร สองพันบาท-

ผู้รับเงิน สัมฤทธิ์ เทศทอง ผู้จ่ายเงิน.....



สัมฤทธิ์ เทศทอง

สำเนาถูกต้อง

INTERCONTINENTAL
HUA HIN RESORT

rder For:	**Samrit Tedthong Mr** 318/71 Moo.7 T. Hin Lek Fai Hua Hin Prachuap khiri khan 77110		
elephone:	+66 81-9113305,089-2476265	Fax:	
O Number:	**PO256809**	PR Number:	PR117894
onfirmation:	**Please contact Purchasing team Tel. 032-616-999**		
ccount Code:	61380 - Waste Removal	Cost Centre Code:	5400 - 5400 Property Op & Maintenance

rder Sent By:	**Saisan Klinmueang**		
mail:	**ichhph@ihg.com**		
elephone:	**6632616999**		
		Delivery Address:	Proud Resort Hua Hin Co Ltd (Branch 00002) Tax ID 0105549060271 33/33 Soi Mooban Nongkae Petchkasem Rd. T.Nongkae A.Hua Hin Prachuabkhirikhan 77110
elivery Date:	**15 Jun 2026**		

omment: **Remove grease water treatment pond at Bluport 2 times and beach wing 2 times.**

RDER BREAKDOWN BY OUTLET

rder for **ICHH** — Outlet: **5400 - 5400 Property Op & Maintenance**

Qty	Code	Description	Unit Size	Sell Unit	Unit Price (ex Tax)	Total (ex Tax)	Tax	Total
~~4~~ 1		Service Fee : Remove Grease Waste Tank Treatment	1each	each of 1	2,000.00 *	~~8,000~~.00 2,000	0.00	~~8,000~~.00 2,000

Order Value (Ex. Tax):	2,000	~~8,000~~.00
Delivery Charges (Ex. Tax):		0.00
Tax Total:		0.00
Total:	2,000	**~~8,000~~.00**

Partial service.

lote: Unit Price with * denotes purchaser price

ORDER ENDS HERE

RECEIVED

ที่.....

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 1448

สัมฤทธิ์ เทศทอง

เลขที่ 318/71 หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

081-9113305 , 089-2476265 , 081-3780129

รับสูบน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) เรียกใช้ได้ทุกเวลา

นาม.....ที่อยู่.....

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2569

INTERCONTINENTAL HUA HIN
Good Received

Receiving Dept	Department Sign
Date:	Date: 30/สค/25

คิดเงินเที่ยว เที่ยวละ 2000 บาท

จำนวนรถ 3 รถ

จำนวนบ่อ – บ่อละ..... บาท

A/P POSTED

ค่าแหมา 6000 บาท

รวมเงิน 6000 บาท ตัวอักษร หกพันบาทถ้วน

ผู้รับเงิน สัมฤทธิ์ ผู้จ่ายเงิน.....



สัมฤทธิ์ เทศทอง

สัญชาติ ญี่ปุ่น

INTERCONTINENTAL
HUA HIN RESORT

r For: **Samrit Tedthong Mr**
318/71 Moo.7 T. Hin Lek Fai
Hua Hin Prachuap khiri khan 77110

Telephone: +66 81-9113305,089-2476265
Fax:

PO Number: **PO256809**
PR Number: PR117894

Confirmation: **Please contact Purchasing team Tel. 032-616-999**

Account Code: 61380 - Waste Removal
Cost Centre Code: 5400 - 5400 Property Op & Maintenance

Order Sent By: **Saisan Klinmueang**
Email: **ichhph@ihg.com**
Telephone: **6632616999**

Delivery Address: Proud Resort Hua Hin Co Ltd (Branch 00002)
Tax ID 0105549060271
33/33 Soi Mooban Nongkae Petchkasem Rd.
T.Nongkae A.Hua Hin
Prachuabkhirikhan 77110

Delivery Date: **15 Jun 2026**

Sent Time: 23 Jun 2026 9:21am

Comment: **Remove grease water treatment pond at Bluport 2 times and beach wing 2 times.**

ORDER BREAKDOWN BY OUTLET

Order for **ICHH** Outlet: **5400 - 5400 Property Op & Maintenance**

Qty	Code	Description	Unit Size	Sell Unit	Unit Price (ex Tax)	Total (ex Tax)	Tax	Total
4 3		Service Fee : Remove Grease Waste Tank Treatment	1each	each of 1	2,000.00 *	8,000.00	0.00	8,000.00

Order Value (Ex. Tax):	6,000	~~8,000.00~~
Delivery Charges (Ex. Tax):		0.00
Tax Total:		0.00
Total:	6,000	~~**8,000.00**~~

Partial Delivery

Note: Unit Price with * denotes purchaser price

ORDER ENDS HERE

RECEIVED

ภาคผนวกที่ 6

สำเนามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
