ภาคผนวกที่ 4

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 4-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เอกสารแนบ 4-2 ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เอกสารแนบ 4-3 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

เอกสารแนบ 4-1

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A062(1)-A062(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	28	32	30	27	33	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	15	17	15	14	18	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.35	2.31	2.40	2.47	2.56	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A063(1)-A063(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	43	41	40	50	59	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	21	20	18	25	32	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.32	2.28	2.21	2.30	2.19	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A064(1)-A064(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	ชุมชนบริเวณสถานีวังศ์สว่าง เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	35	44	36	35	40	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	15	22	20	17	22	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.28	2.22	2.32	2.30	2.15	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา
(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A065(1)-A065(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	วัดไพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	30	28	26	31	29	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	16	15	15	18	16	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	1.96	1.91	1.90	2.02	2.07	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา
(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A066(1)-A066(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	โรงเรียนติวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
				1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate	($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	30	30	32	31	36	ไม่เกิน 200
PM_{10}	($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	15	16	17	16	19	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons	(ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.19	2.31	2.27	2.13	2.20	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัญญา
(นางสาววัญญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A067(1)-A067(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
				1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate	($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	48	49	40	38	40	ไม่เกิน 200
PM_{10}	($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	26	29	21	18	24	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons	(ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.31	2.38	2.43	2.32	2.27	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัญญา
(นางสาววัญญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A068(1)-A068(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวัดน้อยนอก เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	41	43	33	35	31	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	20	23	17	19	16	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.37	2.31	2.38	2.43	2.47	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัญนภา
(นางสาววัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

--------End of Report--------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A069(1)-A069(5)/05/26 Report No. 2605/075

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณสุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	46	34	44	36	41	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	24	15	23	19	22	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.01	1.96	1.91	1.97	2.07	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัญนภา
(นางสาววัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

--------End of Report--------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A070(1)-A070(5)/05/26
193/9/68

Report No. 2605/075

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	29	30	33	34	26	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	16	16	17	18	15	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	1.91	1.97	2.00	1.84	1.95	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัชญนภา
(นางสาววัชญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A071(1)-A071(5)/05/26
193/9/68

Report No. 2605/075

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	25	27	30	27	29	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	14	14	17	16	17	ไม่เกิน 100
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.13	2.05	2.08	2.17	2.24	-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัชญนภา
(นางสาววัชญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	0.77	0.80	0.83	0.66	0.65	-
12:00-13:00	0.84	0.72	0.97	0.62	0.62	-
13:00-14:00	0.76	0.70	1.14	0.61	0.67	-
14:00-15:00	0.78	0.66	1.11	0.64	0.65	-
15:00-16:00	0.79	0.64	***1.75***	0.74	0.70	-
16:00-17:00	0.85	0.60	1.52	0.77	0.68	-
17:00-18:00	0.73	0.85	1.06	0.94	0.83	-
18:00-19:00	0.75	***0.96***	1.15	***0.97***	0.84	-
19:00-20:00	0.86	0.88	0.89	0.87	0.88	-
20:00-21:00	0.90	0.91	0.84	0.85	0.90	-
21:00-22:00	***0.92***	0.89	0.89	0.79	0.88	-
22:00-23:00	0.91	0.90	0.78	0.78	0.87	-
23:00-00:00	0.89	0.75	0.77	0.86	***0.96***	-
00:00-01:00	0.87	0.88	0.76	0.87	0.90	-
01:00-02:00	0.85	0.95	0.69	0.85	0.80	-
02:00-03:00	0.65	0.86	0.71	0.86	0.79	-
03:00-04:00	0.82	0.94	0.73	0.83	0.74	-
04:00-05:00	0.66	0.87	0.76	0.75	0.78	-
05:00-06:00	0.65	0.60	0.85	0.75	0.85	-
06:00-07:00	0.76	0.61	0.77	0.64	0.74	-
07:00-08:00	0.69	0.68	0.82	0.65	0.76	-
08:00-09:00	0.60	0.66	0.78	0.62	0.73	-
09:00-10:00	0.55	0.64	0.69	0.73	0.72	-
10:00-11:00	0.63	0.71	0.63	0.69	0.66	-
Max 1 hr [ppm]	0.92	0.96	1.75	0.97	0.96	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.77	0.78	0.91	0.76	0.77	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07		Brand : Thermo			-
	Model : 48C		Serial No. : 0335203746			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	0.61	0.82	0.59	0.68	0.65	-
13:00-14:00	0.54	0.79	***1.32***	0.62	***1.31***	-
14:00-15:00	0.56	0.78	0.63	0.84	0.82	-
15:00-16:00	0.52	0.77	0.68	0.71	0.70	-
16:00-17:00	0.51	0.75	0.72	0.59	0.59	-
17:00-18:00	0.85	0.60	0.61	0.57	0.58	-
18:00-19:00	0.55	0.53	0.70	0.76	0.68	-
19:00-20:00	0.54	0.51	0.72	0.80	0.82	-
20:00-21:00	0.58	0.54	0.71	***1.12***	0.95	-
21:00-22:00	0.56	***1.17***	0.72	0.84	1.05	-
22:00-23:00	0.54	0.85	0.74	0.58	1.29	-
23:00-00:00	***1.07***	0.99	0.75	0.57	1.23	-
00:00-01:00	1.03	1.01	0.76	0.69	1.01	-
01:00-02:00	0.96	1.07	0.79	1.06	1.22	-
02:00-03:00	0.86	0.67	0.86	0.92	1.06	-
03:00-04:00	0.79	0.64	0.80	0.82	0.80	-
04:00-05:00	0.70	0.62	0.68	0.87	0.71	-
05:00-06:00	0.67	0.59	0.75	0.85	0.66	-
06:00-07:00	0.63	0.60	0.59	0.78	0.72	-
07:00-08:00	0.65	0.61	0.60	0.70	0.65	-
08:00-09:00	0.72	0.67	0.53	0.72	0.84	-
09:00-10:00	0.68	0.69	0.56	0.66	0.96	-
10:00-11:00	0.79	0.90	0.59	0.76	0.76	-
11:00-12:00	0.69	0.87	0.62	0.60	0.92	-
Max 1 hr [ppm]	1.07	1.17	1.32	1.12	1.31	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.69	0.75	0.71	0.75	0.87	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08		Brand : Thermo			-
	Model : 48C		Serial No. : 0508011067			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
16:00-17:00	0.51	0.51	0.81	0.60	0.87	-
17:00-18:00	0.67	0.55	1.03	0.56	0.77	-
18:00-19:00	0.72	0.59	1.03	0.59	0.70	-
19:00-20:00	***0.87***	0.70	0.84	0.54	0.74	-
20:00-21:00	0.75	0.77	0.77	0.72	0.83	-
21:00-22:00	0.73	***1.31***	0.88	0.71	***1.28***	-
22:00-23:00	0.69	0.74	1.00	0.74	0.75	-
23:00-00:00	0.80	0.59	***1.24***	0.73	0.62	-
00:00-01:00	0.81	0.51	1.04	0.71	1.01	-
01:00-02:00	0.81	0.85	0.91	0.73	0.64	-
02:00-03:00	0.71	0.88	0.65	0.79	0.51	-
03:00-04:00	0.68	1.30	0.85	0.77	0.85	-
04:00-05:00	0.75	0.64	0.65	0.64	0.52	-
05:00-06:00	0.79	0.67	0.64	0.87	0.55	-
06:00-07:00	0.82	0.59	0.66	0.76	0.85	-
07:00-08:00	0.80	0.51	0.71	***0.95***	0.82	-
08:00-09:00	0.73	0.73	0.81	0.82	0.61	-
09:00-10:00	0.69	0.87	0.73	0.83	0.74	-
10:00-11:00	0.77	0.83	0.67	0.68	0.81	-
11:00-12:00	0.73	0.80	0.68	0.78	0.79	-
12:00-13:00	0.69	0.76	0.64	0.76	0.76	-
13:00-14:00	0.66	0.51	0.69	0.75	0.74	-
14:00-15:00	0.71	0.78	0.66	0.52	0.73	-
15:00-16:00	0.64	0.79	0.78	0.55	0.84	-
Max 1 hr [ppm]	**0.87**	**1.31**	**1.24**	**0.95**	**1.28**	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.73**	**0.74**	**0.80**	**0.71**	**0.76**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B15		Brand : API			-
	Model : 300E		Serial No. : 226			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
15:00-16:00	0.76	0.76	0.80	0.71	0.65	-
16:00-17:00	0.80	0.87	1.00	0.73	0.83	-
17:00-18:00	0.80	0.93	***1.01***	0.83	0.75	-
18:00-19:00	0.86	0.89	0.95	0.85	0.84	-
19:00-20:00	0.98	***1.10***	1.00	0.83	0.83	-
20:00-21:00	0.74	0.88	0.87	***0.97***	***0.92***	-
21:00-22:00	0.89	0.94	0.93	0.91	0.91	-
22:00-23:00	0.93	0.91	0.85	0.68	0.89	-
23:00-00:00	***1.06***	0.89	0.91	0.83	0.91	-
00:00-01:00	0.62	1.09	0.82	0.67	0.83	-
01:00-02:00	0.84	0.65	0.73	0.65	0.83	-
02:00-03:00	0.67	0.79	0.81	0.81	0.81	-
03:00-04:00	0.82	0.73	0.70	0.80	0.80	-
04:00-05:00	0.73	0.76	0.58	0.79	0.90	-
05:00-06:00	0.91	0.62	0.60	0.67	0.73	-
06:00-07:00	0.65	0.77	0.58	0.65	0.72	-
07:00-08:00	0.61	0.63	0.56	0.82	0.83	-
08:00-09:00	0.57	0.65	0.76	0.76	0.75	-
09:00-10:00	0.71	0.68	0.71	0.62	0.70	-
10:00-11:00	0.78	0.65	0.71	0.64	0.67	-
11:00-12:00	0.62	0.61	0.60	0.61	0.70	-
12:00-13:00	0.63	0.67	0.78	0.74	0.67	-
13:00-14:00	0.60	0.65	0.85	0.80	0.64	-
14:00-15:00	0.69	0.82	0.62	0.63	0.79	-
Max 1 hr [ppm]	**1.06**	**1.10**	**1.01**	**0.97**	**0.92**	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.76**	**0.79**	**0.78**	**0.75**	**0.79**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B04		Brand : API			-
	Model : 300E		Serial No. : 3089			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
13:00-14:00	0.68	0.69	0.73	0.69	0.71	-
14:00-15:00	0.75	0.76	0.70	0.70	0.64	-
15:00-16:00	0.79	0.77	***0.96***	0.71	0.75	-
16:00-17:00	0.80	***0.82***	0.83	0.70	0.81	-
17:00-18:00	***0.84***	0.80	0.78	0.71	0.88	-
18:00-19:00	0.67	0.81	0.83	0.74	0.74	-
19:00-20:00	0.80	0.78	0.77	0.80	0.73	-
20:00-21:00	0.79	0.77	0.82	0.75	0.81	-
21:00-22:00	0.82	0.74	0.80	0.69	0.79	-
22:00-23:00	0.75	0.65	0.73	0.68	0.80	-
23:00-00:00	0.78	0.73	0.72	0.67	0.82	-
00:00-01:00	0.75	0.68	0.71	0.62	0.81	-
01:00-02:00	0.68	0.78	0.73	0.73	0.73	-
02:00-03:00	0.73	0.75	0.70	0.79	0.73	-
03:00-04:00	0.68	0.73	0.78	0.70	0.81	-
04:00-05:00	0.74	0.77	0.73	0.73	0.72	-
05:00-06:00	0.77	0.74	0.70	0.77	0.77	-
06:00-07:00	0.72	0.75	0.67	0.78	***0.95***	-
07:00-08:00	0.69	0.79	0.87	***0.83***	0.82	-
08:00-09:00	0.77	0.75	0.78	0.73	0.77	-
09:00-10:00	0.70	0.72	0.77	0.75	0.79	-
10:00-11:00	0.75	0.79	0.72	0.73	0.74	-
11:00-12:00	0.70	0.73	0.84	0.67	0.73	-
12:00-13:00	0.83	0.71	0.75	0.75	0.71	-
Max 1 hr [ppm]	0.84	0.82	0.96	0.83	0.95	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.75	0.75	0.77	0.72	0.77	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B12		Brand : Thermo			-
	Model : 48C		Serial No. : TL-65343-348			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
15:00-16:00	0.77	0.64	1.18	0.81	0.89	-
16:00-17:00	1.06	1.28	1.17	0.86	0.54	-
17:00-18:00	1.20	0.97	1.12	0.60	0.77	-
18:00-19:00	1.35	1.19	1.14	0.53	0.95	-
19:00-20:00	***1.93***	1.23	1.21	0.55	1.08	-
20:00-21:00	0.79	1.22	1.46	0.60	1.12	-
21:00-22:00	1.47	0.56	1.39	***1.94***	1.30	-
22:00-23:00	1.01	0.59	1.58	1.49	1.48	-
23:00-00:00	1.17	1.35	0.84	0.68	1.49	-
00:00-01:00	0.90	1.10	0.97	0.77	1.18	-
01:00-02:00	0.74	1.06	0.88	0.58	0.88	-
02:00-03:00	0.78	0.68	1.04	0.86	0.62	-
03:00-04:00	0.89	0.61	0.55	0.73	0.81	-
04:00-05:00	0.86	0.83	0.56	1.08	0.78	-
05:00-06:00	0.58	0.96	0.67	1.01	1.49	-
06:00-07:00	0.70	0.89	0.64	1.14	1.72	-
07:00-08:00	0.94	1.46	0.83	1.12	***1.83***	-
08:00-09:00	1.32	1.25	0.99	1.23	0.66	-
09:00-10:00	1.38	1.45	***1.62***	1.70	1.70	-
10:00-11:00	1.49	***1.58***	1.21	1.62	1.46	-
11:00-12:00	1.54	1.18	1.33	1.48	1.14	-
12:00-13:00	1.47	1.15	1.10	1.15	0.60	-
13:00-14:00	0.84	0.89	0.94	0.78	1.23	-
14:00-15:00	0.74	0.78	0.98	0.52	0.85	-
Max 1 hr [ppm]	1.93	1.58	1.62	1.94	1.83	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	1.08	1.04	1.06	0.99	1.11	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B06		Brand : API			-
	Model : 300E		Serial No. : 3117			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
13:00-14:00	0.86	1.04	1.05	0.85	0.81	-
14:00-15:00	1.15	1.02	1.03	0.86	0.75	-
15:00-16:00	***1.16***	1.12	1.08	0.85	0.77	-
16:00-17:00	1.14	0.97	***1.19***	0.84	0.82	-
17:00-18:00	1.06	0.70	0.90	0.94	0.97	-
18:00-19:00	1.08	0.86	0.87	0.98	1.03	-
19:00-20:00	1.02	0.75	0.77	0.95	1.01	-
20:00-21:00	0.90	0.73	0.81	1.01	0.98	-
21:00-22:00	0.85	0.86	0.86	1.08	0.86	-
22:00-23:00	0.87	0.98	0.84	0.83	0.90	-
23:00-00:00	0.81	0.77	0.80	0.81	0.88	-
00:00-01:00	0.76	0.97	0.79	0.83	0.77	-
01:00-02:00	0.79	0.87	0.75	0.79	0.74	-
02:00-03:00	0.78	0.82	0.78	0.67	0.64	-
03:00-04:00	0.82	0.87	0.72	0.71	0.62	-
04:00-05:00	0.86	0.79	0.84	0.97	0.53	-
05:00-06:00	0.98	0.75	0.75	0.98	0.73	-
06:00-07:00	0.95	0.71	0.74	1.06	1.07	-
07:00-08:00	0.84	0.97	0.77	1.07	1.04	-
08:00-09:00	0.81	***1.17***	1.06	1.01	1.05	-
09:00-10:00	0.82	1.05	1.12	0.98	1.09	-
10:00-11:00	0.87	1.09	1.15	0.86	***1.13***	-
11:00-12:00	1.06	1.13	1.03	***1.12***	1.05	-
12:00-13:00	1.05	1.06	0.90	1.10	1.04	-
Max 1 hr [ppm]	**1.16**	**1.17**	**1.19**	**1.12**	**1.13**	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.93**	**0.92**	**0.90**	**0.92**	**0.89**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B05		Brand : API			-
	Model : 300E		Serial No. : 3116			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	0.63	0.68	0.63	0.78	0.71	-
12:00-13:00	0.51	0.67	0.75	0.76	0.60	-
13:00-14:00	0.68	0.50	0.65	0.74	0.55	-
14:00-15:00	0.51	0.63	***1.39***	0.51	0.60	-
15:00-16:00	0.59	0.64	1.00	0.64	0.50	-
16:00-17:00	0.55	***0.93***	0.79	0.71	0.51	-
17:00-18:00	0.80	0.68	0.61	0.68	1.01	-
18:00-19:00	0.89	0.59	0.65	0.67	1.06	-
19:00-20:00	***0.97***	0.65	0.76	0.72	***1.52***	-
20:00-21:00	0.80	0.70	0.99	0.93	0.94	-
21:00-22:00	0.86	0.75	1.03	0.97	0.88	-
22:00-23:00	0.88	0.77	0.92	***1.05***	0.94	-
23:00-00:00	0.95	0.80	0.93	0.91	0.89	-
00:00-01:00	0.94	0.78	0.95	0.97	0.82	-
01:00-02:00	0.92	0.83	0.93	1.01	0.80	-
02:00-03:00	0.91	0.80	0.89	0.98	0.85	-
03:00-04:00	0.94	0.61	0.87	1.01	0.78	-
04:00-05:00	0.88	0.55	0.85	1.00	0.62	-
05:00-06:00	0.68	0.92	0.52	0.83	0.80	-
06:00-07:00	0.62	0.89	0.54	0.82	0.88	-
07:00-08:00	0.58	0.80	0.64	0.76	1.03	-
08:00-09:00	0.72	0.75	0.59	0.52	0.86	-
09:00-10:00	0.76	0.66	0.92	0.56	0.80	-
10:00-11:00	0.65	0.78	1.13	0.59	0.70	-
Max 1 hr [ppm]	**0.97**	**0.93**	**1.39**	**1.05**	**1.52**	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.76**	**0.72**	**0.83**	**0.80**	**0.82**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10		Brand : API			-
	Model : 300E		Serial No. : 199-S			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	0.64	0.72	0.55	0.59	0.56	-
13:00-14:00	0.55	0.54	0.61	0.54	0.64	-
14:00-15:00	0.51	0.63	0.55	0.63	0.65	-
15:00-16:00	0.83	0.59	0.56	0.85	0.52	-
16:00-17:00	0.98	0.57	0.58	***1.09***	0.56	-
17:00-18:00	0.95	0.53	0.66	0.72	0.55	-
18:00-19:00	0.60	0.65	0.60	0.86	0.52	-
19:00-20:00	0.58	0.67	0.57	0.65	0.71	-
20:00-21:00	0.63	0.73	***0.92***	0.74	0.61	-
21:00-22:00	***0.99***	***1.31***	0.55	0.79	0.74	-
22:00-23:00	0.67	0.81	0.64	0.75	0.76	-
23:00-00:00	0.72	0.83	0.66	0.78	0.79	-
00:00-01:00	0.83	0.77	0.77	0.75	0.71	-
01:00-02:00	0.67	0.73	0.63	0.80	0.72	-
02:00-03:00	0.66	0.76	0.65	0.68	0.76	-
03:00-04:00	0.65	0.58	0.78	0.75	0.56	-
04:00-05:00	0.60	0.76	0.69	0.78	0.82	-
05:00-06:00	0.61	0.75	0.68	0.73	0.74	-
06:00-07:00	0.64	0.70	0.81	0.63	***0.83***	-
07:00-08:00	0.63	0.57	0.75	0.65	0.75	-
08:00-09:00	0.56	0.52	0.73	0.60	0.72	-
09:00-10:00	0.66	0.66	0.74	0.52	0.52	-
10:00-11:00	0.70	0.64	0.72	0.57	0.56	-
11:00-12:00	0.67	0.55	0.65	0.54	0.66	-
Max 1 hr [ppm]	0.99	1.31	0.92	1.09	0.83	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.69	0.69	0.67	0.71	0.66	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B13		Brand : API			-
	Model : 300E		Serial No. : 176			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	0.66	0.92	0.90	0.64	0.57	-
13:00-14:00	0.67	1.00	***1.03***	0.66	0.61	-
14:00-15:00	0.74	0.77	0.82	0.72	0.60	-
15:00-16:00	0.76	0.84	0.84	0.73	0.64	-
16:00-17:00	0.77	0.99	0.76	0.77	0.70	-
17:00-18:00	0.55	0.96	0.74	***0.78***	0.76	-
18:00-19:00	0.80	0.79	0.73	0.69	0.77	-
19:00-20:00	0.92	0.86	0.78	0.67	0.79	-
20:00-21:00	0.87	0.99	0.88	0.66	0.82	-
21:00-22:00	0.84	***1.13***	0.94	0.64	0.84	-
22:00-23:00	0.78	0.83	0.91	0.61	***0.90***	-
23:00-00:00	0.70	0.78	0.88	0.62	0.74	-
00:00-01:00	0.74	0.84	0.63	0.72	0.69	-
01:00-02:00	0.71	0.83	0.66	0.65	0.64	-
02:00-03:00	0.59	0.76	0.65	0.64	0.63	-
03:00-04:00	0.54	0.74	0.55	0.61	0.56	-
04:00-05:00	0.56	0.66	0.57	0.66	0.66	-
05:00-06:00	0.51	0.71	0.55	0.64	0.61	-
06:00-07:00	0.52	0.57	0.67	0.63	0.63	-
07:00-08:00	0.58	0.56	0.60	0.60	0.59	-
08:00-09:00	0.55	0.62	0.55	0.57	0.57	-
09:00-10:00	0.72	0.68	0.64	0.54	0.55	-
10:00-11:00	***1.11***	0.56	0.52	0.52	0.50	-
11:00-12:00	0.86	0.57	0.51	0.56	0.59	-
Max 1 hr [ppm]	1.11	1.13	1.03	0.78	0.90	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.71	0.79	0.72	0.64	0.66	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B09		Brand : Thermo			-
	Model : 48C		Serial No. : 65433-348			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	14.56	18.60	15.48	11.34	11.89	-
12:00-13:00	21.21	16.10	18.23	11.11	17.81	-
13:00-14:00	***27.24***	16.29	***25.29***	11.02	***20.91***	-
14:00-15:00	25.29	17.82	24.28	15.11	9.85	-
15:00-16:00	11.13	13.94	20.11	17.29	10.47	-
16:00-17:00	14.42	17.96	12.21	17.01	11.21	-
17:00-18:00	11.50	***26.90***	18.31	13.69	16.17	-
18:00-19:00	12.43	21.02	14.51	19.34	17.85	-
19:00-20:00	10.13	18.34	13.13	***24.33***	18.59	-
20:00-21:00	13.09	16.07	11.99	16.35	14.06	-
21:00-22:00	16.42	15.14	8.91	9.47	12.79	-
22:00-23:00	18.24	12.13	8.41	11.98	12.17	-
23:00-00:00	9.07	8.53	11.23	12.64	18.23	-
00:00-01:00	9.39	8.35	9.92	13.04	12.87	-
01:00-02:00	9.83	9.81	10.02	8.82	10.90	-
02:00-03:00	9.99	8.71	10.35	6.89	9.21	-
03:00-04:00	6.54	7.12	8.54	9.37	12.96	-
04:00-05:00	7.49	8.66	6.69	7.76	6.51	-
05:00-06:00	5.17	6.48	8.23	6.12	6.93	-
06:00-07:00	5.24	5.95	8.37	5.71	6.64	-
07:00-08:00	7.77	5.72	8.94	7.58	7.53	-
08:00-09:00	7.56	6.40	10.19	9.07	7.14	-
09:00-10:00	9.47	7.23	11.11	9.11	7.26	-
10:00-11:00	12.94	10.67	11.66	11.09	7.97	-
Max 1 hr [ppb]	**27.24**	**26.90**	**25.29**	**24.33**	**20.91**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**12.34**	**12.66**	**12.75**	**11.89**	**12.00**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B09		Brand : API			-
	Model : 200E		Serial No. : 4412			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	9.73	16.80	14.88	16.79	8.62	-
13:00-14:00	9.31	***24.48***	***21.66***	14.93	9.23	-
14:00-15:00	8.56	14.11	17.14	13.98	13.70	-
15:00-16:00	12.63	11.19	10.12	8.25	***19.67***	-
16:00-17:00	11.77	7.54	12.57	6.72	9.56	-
17:00-18:00	17.53	4.98	18.43	9.83	4.24	-
18:00-19:00	20.33	6.48	14.08	14.45	5.90	-
19:00-20:00	17.54	9.13	16.20	9.84	8.56	-
20:00-21:00	20.28	13.58	16.17	12.60	12.49	-
21:00-22:00	***20.71***	16.42	14.88	8.98	13.88	-
22:00-23:00	19.55	22.01	14.78	5.89	18.26	-
23:00-00:00	20.68	17.08	12.71	8.24	19.45	-
00:00-01:00	15.26	14.29	8.39	10.02	12.94	-
01:00-02:00	12.57	9.72	8.76	8.71	11.22	-
02:00-03:00	10.69	7.86	7.94	7.35	8.75	-
03:00-04:00	7.91	9.08	7.54	8.08	5.64	-
04:00-05:00	5.51	5.21	8.82	9.80	6.59	-
05:00-06:00	6.65	7.57	10.96	8.46	8.14	-
06:00-07:00	9.60	9.06	15.88	10.03	8.33	-
07:00-08:00	14.26	13.52	17.22	10.74	12.24	-
08:00-09:00	13.51	13.07	17.52	8.06	12.97	-
09:00-10:00	16.69	15.56	15.47	11.91	19.09	-
10:00-11:00	15.76	19.05	12.38	***17.49***	18.73	-
11:00-12:00	17.40	16.68	11.23	12.10	7.84	-
Max 1 hr [ppb]	**20.71**	**24.48**	**21.66**	**17.49**	**19.67**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**13.93**	**12.69**	**13.57**	**10.55**	**11.50**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B19		Brand : API			-
	Model : 200E		Serial No. : 353			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
16:00-17:00	9.73	10.31	11.27	12.80	12.71	-
17:00-18:00	13.90	9.13	16.60	18.78	18.62	-
18:00-19:00	20.51	11.90	21.67	18.60	19.79	-
19:00-20:00	***25.14***	16.99	***24.75***	17.76	19.66	-
20:00-21:00	19.78	21.64	18.22	***25.88***	15.22	-
21:00-22:00	17.92	***25.79***	16.04	18.99	***22.59***	-
22:00-23:00	13.83	25.03	16.35	18.55	21.37	-
23:00-00:00	11.95	19.82	15.12	14.94	15.07	-
00:00-01:00	11.08	15.98	14.25	14.46	12.10	-
01:00-02:00	7.36	14.36	13.13	12.19	14.95	-
02:00-03:00	8.67	9.65	6.48	17.94	11.48	-
03:00-04:00	11.80	9.19	7.71	10.35	6.19	-
04:00-05:00	13.84	7.92	11.37	10.94	7.96	-
05:00-06:00	11.20	8.48	8.21	15.89	9.74	-
06:00-07:00	9.19	10.81	12.19	17.62	9.70	-
07:00-08:00	12.94	15.55	16.23	20.71	13.47	-
08:00-09:00	19.10	22.30	17.39	15.69	19.08	-
09:00-10:00	23.38	18.96	18.95	21.09	21.58	-
10:00-11:00	20.77	17.87	21.76	19.51	19.84	-
11:00-12:00	14.89	15.63	18.50	13.79	13.51	-
12:00-13:00	12.88	18.00	15.32	10.38	9.48	-
13:00-14:00	9.43	17.98	16.67	11.56	10.92	-
14:00-15:00	9.64	10.96	7.27	16.68	15.18	-
15:00-16:00	10.54	13.57	9.30	8.87	13.12	-
Max 1 hr [ppb]	**25.14**	**25.79**	**24.75**	**25.88**	**22.59**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**14.14**	**15.33**	**14.78**	**16.00**	**14.72**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_x-B12		Brand : API			-
	Model : 200A		Serial No. : 2675			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
15:00-16:00	12.01	10.15	10.57	11.45	10.75	-
16:00-17:00	15.09	14.28	15.02	8.26	13.24	-
17:00-18:00	14.25	***14.75***	14.68	8.32	***18.75***	-
18:00-19:00	13.03	14.23	15.29	12.10	14.87	-
19:00-20:00	15.39	9.83	14.53	15.01	17.45	-
20:00-21:00	15.11	14.35	16.99	20.31	12.03	-
21:00-22:00	13.71	13.16	16.27	***20.40***	16.01	-
22:00-23:00	12.54	13.86	***17.41***	13.14	12.46	-
23:00-00:00	12.84	10.19	12.73	9.93	11.35	-
00:00-01:00	11.13	13.35	10.87	8.06	10.13	-
01:00-02:00	8.59	8.11	5.27	10.49	8.34	-
02:00-03:00	12.62	6.96	7.83	9.03	4.99	-
03:00-04:00	10.48	6.97	10.50	8.56	7.08	-
04:00-05:00	11.57	8.94	8.45	6.30	8.23	-
05:00-06:00	12.87	9.35	8.61	7.75	11.72	-
06:00-07:00	10.82	9.85	11.14	7.68	12.93	-
07:00-08:00	14.15	9.64	12.19	10.94	15.07	-
08:00-09:00	13.79	9.70	16.61	16.36	11.69	-
09:00-10:00	***16.09***	9.71	15.37	15.32	9.84	-
10:00-11:00	12.39	12.50	9.48	16.39	14.40	-
11:00-12:00	9.22	8.55	8.23	16.43	14.87	-
12:00-13:00	7.84	7.98	8.92	15.25	14.98	-
13:00-14:00	8.17	8.79	6.66	10.56	13.69	-
14:00-15:00	9.29	12.51	8.06	7.56	5.78	-
Max 1 hr [ppb]	**16.09**	**14.75**	**17.41**	**20.40**	**18.75**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**12.21**	**10.74**	**11.74**	**11.90**	**12.11**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_x-B10		Brand : API			-
	Model : 200E		Serial No. : 4465			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนติวานนท์ศึกษา (ตลาดเวลี) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
13:00-14:00	14.43	13.46	20.03	9.71	12.87	-
14:00-15:00	13.66	19.57	13.90	13.95	18.59	-
15:00-16:00	19.78	16.05	16.39	19.83	10.94	-
16:00-17:00	18.73	10.33	22.72	19.07	13.16	-
17:00-18:00	10.84	8.85	18.38	16.77	19.45	-
18:00-19:00	15.85	9.43	***24.17***	12.73	20.11	-
19:00-20:00	***23.04***	13.86	15.81	14.98	17.34	-
20:00-21:00	22.79	19.96	19.07	***22.25***	25.79	-
21:00-22:00	20.86	18.38	16.77	18.08	***27.29***	-
22:00-23:00	8.92	18.31	15.51	16.31	5.06	-
23:00-00:00	12.64	16.21	13.56	13.06	5.81	-
00:00-01:00	18.42	22.24	11.67	8.96	8.22	-
01:00-02:00	11.16	12.87	12.71	13.03	11.77	-
02:00-03:00	16.31	6.63	11.35	18.13	17.09	-
03:00-04:00	12.47	6.64	9.87	22.24	14.79	-
04:00-05:00	9.43	5.57	14.28	20.37	10.52	-
05:00-06:00	10.55	8.32	16.37	15.94	11.15	-
06:00-07:00	15.68	8.42	19.81	11.64	9.06	-
07:00-08:00	22.76	12.53	9.76	15.35	7.03	-
08:00-09:00	6.37	17.86	11.81	20.61	6.15	-
09:00-10:00	7.19	19.24	13.51	15.86	8.95	-
10:00-11:00	6.94	22.69	19.06	10.64	13.25	-
11:00-12:00	9.14	***22.76***	20.50	8.42	18.71	-
12:00-13:00	9.56	20.61	20.86	8.91	19.47	-
Max 1 hr [ppb]	**23.04**	**22.76**	**24.17**	**22.25**	**27.29**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**14.06**	**14.62**	**16.16**	**15.29**	**13.86**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B22		Brand : API			-
	Model : TML-41M		Serial No. : NO1618			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
15:00-16:00	12.23	12.35	15.65	11.44	18.06	-
16:00-17:00	15.96	***18.44***	17.55	15.98	12.73	-
17:00-18:00	22.29	15.83	9.50	8.09	8.26	-
18:00-19:00	23.58	14.97	9.38	9.06	12.31	-
19:00-20:00	***23.72***	14.20	9.96	12.09	18.17	-
20:00-21:00	14.09	12.56	14.24	14.95	***20.89***	-
21:00-22:00	12.79	13.74	***21.23***	***22.41***	12.83	-
22:00-23:00	17.86	16.17	12.08	10.19	8.05	-
23:00-00:00	8.94	8.79	15.13	15.11	10.68	-
00:00-01:00	9.60	13.14	20.76	17.78	7.63	-
01:00-02:00	10.28	11.69	17.74	10.42	7.25	-
02:00-03:00	11.85	10.90	14.38	13.90	9.89	-
03:00-04:00	12.33	7.28	14.64	17.78	14.38	-
04:00-05:00	12.00	10.72	13.49	10.42	10.60	-
05:00-06:00	17.95	13.90	9.34	10.44	11.57	-
06:00-07:00	18.19	12.39	13.46	10.88	16.87	-
07:00-08:00	14.09	6.90	11.65	14.66	19.33	-
08:00-09:00	10.72	9.62	11.57	13.84	18.15	-
09:00-10:00	8.85	14.09	14.28	8.83	10.88	-
10:00-11:00	9.06	17.55	10.28	12.96	6.54	-
11:00-12:00	5.56	13.90	13.98	19.22	5.05	-
12:00-13:00	6.74	15.09	13.09	17.96	6.66	-
13:00-14:00	5.89	14.93	6.58	14.05	9.63	-
14:00-15:00	8.54	15.90	7.94	12.50	14.36	-
Max 1 hr [ppb]	**23.72**	**18.44**	**21.23**	**22.41**	**20.89**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**13.05**	**13.13**	**13.25**	**13.54**	**12.12**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B14		Brand : API			-
	Model : 200A		Serial No. : 212			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com,. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
13:00-14:00	13.77	17.54	17.65	14.99	18.49	-
14:00-15:00	10.62	9.30	16.28	13.51	18.16	-
15:00-16:00	6.02	10.35	17.42	14.45	10.62	-
16:00-17:00	8.84	10.51	5.13	13.50	13.12	-
17:00-18:00	12.98	15.00	7.56	7.86	11.95	-
18:00-19:00	***18.16***	8.83	10.84	10.82	7.07	-
19:00-20:00	7.89	12.18	16.08	***15.59***	5.09	-
20:00-21:00	10.35	16.39	16.20	11.95	6.16	-
21:00-22:00	8.93	17.80	16.87	7.03	7.23	-
22:00-23:00	13.04	16.18	13.50	6.95	10.48	-
23:00-00:00	14.72	14.45	10.41	10.35	11.92	-
00:00-01:00	17.74	9.05	9.83	6.63	13.46	-
01:00-02:00	8.06	8.90	12.73	7.85	18.33	-
02:00-03:00	4.97	5.97	14.72	6.99	16.44	-
03:00 04:00	6.76	6.53	18.00	7.59	12.63	-
04:00-05:00	8.84	7.26	15.97	8.06	9.66	-
05:00-06:00	12.63	10.74	16.44	4.97	5.33	-
06:00-07:00	17.47	15.82	11.24	6.76	6.68	-
07:00-08:00	8.96	***23.67***	16.11	9.90	8.84	-
08:00-09:00	12.92	22.30	***18.33***	9.56	12.63	-
09:00-10:00	15.65	14.96	16.15	8.12	18.15	-
10:00-11:00	15.59	13.47	14.98	8.27	***21.88***	-
11:00-12:00	13.51	12.23	16.15	10.34	17.14	-
12:00-13:00	12.02	17.46	11.76	15.44	19.58	-
Max 1 hr [ppb]	**18.16**	**23.67**	**18.33**	**15.59**	**21.88**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**11.69**	**13.20**	**14.18**	**9.90**	**12.54**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B17		Brand : API			-
	Model : 200A		Serial No. : 1977			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com,. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	16.21	15.74	17.05	7.92	15.83	-
12:00-13:00	15.64	11.78	17.93	7.37	15.64	-
13:00-14:00	***23.14***	15.53	19.39	10.77	17.72	-
14:00-15:00	23.05	19.89	14.85	15.99	***20.41***	-
15:00-16:00	12.83	***20.89***	14.20	18.64	18.87	-
16:00-17:00	12.35	18.94	12.70	***19.57***	13.29	-
17:00-18:00	12.79	19.71	16.42	18.89	15.62	-
18:00-19:00	15.97	15.21	23.24	11.37	16.78	-
19:00-20:00	19.58	13.55	17.13	12.31	16.33	-
20:00-21:00	19.40	10.31	14.68	18.25	12.99	-
21:00-22:00	14.07	10.01	13.94	13.59	13.07	-
22:00-23:00	13.95	9.58	13.10	11.92	13.36	-
23:00-00:00	20.15	11.22	11.54	10.71	12.23	-
00:00-01:00	16.77	10.27	10.93	10.49	11.04	-
01:00-02:00	18.51	9.41	10.27	10.47	9.40	-
02:00-03:00	9.66	8.87	7.74	11.01	10.73	-
03:00-04:00	10.03	11.10	9.13	11.20	11.47	-
04:00-05:00	11.08	11.22	12.56	12.86	12.41	-
05:00-06:00	11.98	12.08	14.30	18.23	9.74	-
06:00-07:00	14.67	15.82	14.01	18.36	11.74	-
07:00-08:00	17.72	18.39	17.93	18.62	16.35	-
08:00-09:00	16.37	15.59	***25.31***	13.03	19.85	-
09:00-10:00	11.20	17.25	23.86	12.48	19.07	-
10:00-11:00	10.67	20.66	19.19	11.17	18.78	-
Max 1 hr [ppb]	**23.14**	**20.89**	**25.31**	**19.57**	**20.41**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**15.32**	**14.29**	**15.48**	**13.55**	**14.70**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B18		Brand : API			-
	Model : TML-41M		Serial No. : N07543			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	12.06	10.89	18.56	10.91	13.68	-
13:00-14:00	12.62	13.11	15.44	11.78	13.50	-
14:00-15:00	14.84	13.79	12.84	13.72	9.93	-
15:00-16:00	14.28	***19.24***	15.52	12.56	12.36	-
16:00-17:00	16.45	9.89	***21.23***	16.90	14.76	-
17:00-18:00	15.25	11.07	12.43	16.77	17.39	-
18:00-19:00	13.39	13.02	13.64	14.37	16.44	-
19:00-20:00	19.42	13.07	19.60	19.82	16.62	-
20:00-21:00	***19.65***	12.50	16.39	14.59	12.66	-
21:00-22:00	17.32	16.67	13.59	***21.83***	11.49	-
22:00-23:00	15.96	14.21	11.95	19.87	9.69	-
23:00-00:00	19.13	15.66	11.58	16.67	8.43	-
00:00-01:00	17.11	10.94	15.35	13.02	10.82	-
01:00-02:00	15.13	12.33	14.66	14.68	8.95	-
02:00-03:00	13.69	12.82	14.96	16.42	11.89	-
03:00-04:00	13.27	13.95	13.25	13.57	16.84	-
04:00-05:00	11.80	18.93	10.67	12.33	11.28	-
05:00-06:00	10.44	14.09	8.94	12.10	8.57	-
06:00-07:00	6.46	9.92	7.85	8.64	9.45	-
07:00-08:00	6.03	8.05	10.82	9.28	11.89	-
08:00-09:00	8.93	10.36	11.83	8.75	***17.82***	-
09:00-10:00	12.69	7.32	8.11	9.16	11.28	-
10:00-11:00	13.34	10.94	8.02	8.56	14.31	-
11:00-12:00	12.87	12.98	10.74	10.52	14.96	-
Max 1 hr [ppb]	**19.65**	**19.24**	**21.23**	**21.83**	**17.82**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**13.84**	**12.74**	**13.25**	**13.62**	**12.71**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B21		Brand : API			-
	Model : TML-41M		Serial No. : N02374			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6) เดือนพฤษภาคม 2569					ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	13.16	13.34	14.23	12.79	15.91	-
13:00-14:00	15.22	16.01	20.36	16.80	17.36	-
14:00-15:00	13.75	19.78	20.84	20.87	17.57	-
15:00-16:00	19.89	***20.66***	14.32	16.58	16.29	-
16:00-17:00	18.73	13.79	13.30	***23.57***	***24.26***	-
17:00-18:00	14.27	14.73	17.13	19.67	14.50	-
18:00-19:00	19.31	11.65	***25.53***	10.08	19.58	-
19:00-20:00	15.26	8.66	23.44	7.71	18.42	-
20:00-21:00	17.78	10.13	15.16	8.79	20.73	-
21:00-22:00	14.54	9.28	22.65	9.02	15.05	-
22:00-23:00	15.23	8.98	17.54	10.97	14.34	-
23:00-00:00	16.72	11.58	18.40	11.70	14.45	-
00:00-01:00	10.94	16.10	12.72	16.56	12.34	-
01:00-02:00	16.28	14.14	11.02	9.36	10.48	-
02:00-03:00	11.96	13.39	10.82	9.10	15.48	-
03:00-04:00	10.44	13.55	8.56	10.50	12.04	-
04:00-05:00	14.63	10.94	11.30	13.15	17.74	-
05:00-06:00	***20.74***	12.11	9.16	11.37	19.11	-
06:00-07:00	17.79	12.32	10.51	14.16	14.16	-
07:00-08:00	18.85	12.76	10.39	13.32	13.32	-
08:00-09:00	18.12	12.32	10.92	13.38	13.38	-
09:00-10:00	16.85	11.75	7.53	14.75	14.75	-
10:00-11:00	14.57	13.82	10.34	13.56	13.56	-
11:00-12:00	10.72	14.97	10.86	16.61	16.58	-
Max 1 hr [ppb]	**20.74**	**20.66**	**25.53**	**23.57**	**24.26**	**ไม่เกิน 120 [ppb]**
Average 24 hr [ppb]	**15.66**	**13.20**	**14.46**	**13.52**	**15.89**	**-**
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B06		Brand : API			-
	Model : 200E		Serial No. : 2286			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	10.000	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	8.333	-	-	-	-
NE (34°-56°)	9.167	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	5.000	-	-	-	-
E (79°-102°)	8.333	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	4.167	-	-	-	-
SE (124°-146°)	8.333	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	2.500	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	1.667	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	15.000	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	13.333	-	-	-	-
NW (304°-326°)	10.833	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	3.333	-	-	-	-
Total	99.999	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม) เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	ESE
12:00-13:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	ESE
13:00-14:00	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	E
14:00-15:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE
15:00-16:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE
16:00-17:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE
17:00-18:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E
18:00-19:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	E
19:00-20:00	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	E
20:00-21:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	E	0.9	3.2	NE
21:00-22:00	0.4	1.6	N	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	NE
22:00-23:00	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NE
23:00-00:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	ENE
00:00-01:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	ENE
01:00-02:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	SE
02:00-03:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	SE
03:00-04:00	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	N	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ENE
04:00-05:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SW
05:00-06:00	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	E	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SW
06:00-07:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	WNW	1.3	4.8	WNW
07:00-08:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WNW
08:00-09:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NW
09:00-10:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NW
10:00-11:00	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.4			31.6			31.1			28.7			29.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.13			756.26			756.59			756.35			756.93		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

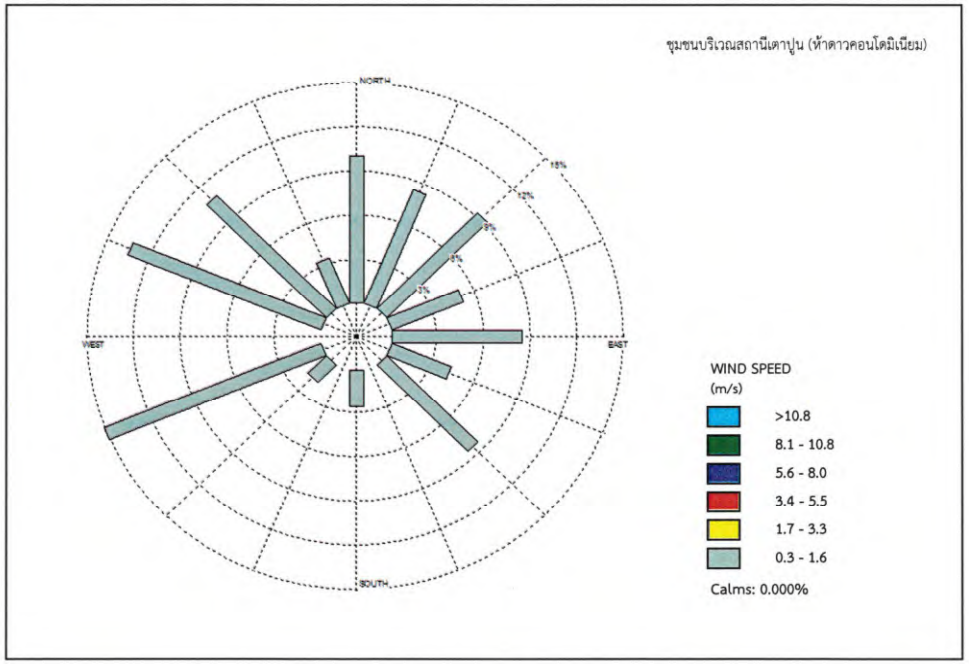

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	3.333	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	-	-	-	-
NE (34°-56°)	3.333	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.667	-	-	-	-
E (79°-102°)	5.000	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	10.000	-	-	-	-
SE (124°-146°)	8.333	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	24.167	-	-	-	-
S (169°-191°)	0.833	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	3.333	-	-	-	-
SW (214°-236°)	10.000	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	9.167	-	-	-	-
W (259°-281°)	5.000	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	10.833	-	-	-	-
NW (304°-326°)	3.333	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	0.833	-	-	-	-
Total	99.998	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง) เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE
13:00-14:00	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE
14:00-15:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	W
15:00-16:00	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	S
16:00-17:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SSE
17:00-18:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SSE
18:00-19:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	WSW
19:00-20:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	SSE
20:00-21:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	E
21:00-22:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW
22:00-23:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ESE
23:00-00:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSW
00:00-01:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE
01:00-02:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	W
02:00-03:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	WSW
03:00-04:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE
04:00-05:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE
05:00-06:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE
06:00-07:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SE
07:00-08:00	0.9	3.2	W	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SSW
08:00-09:00	0.9	3.2	W	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	WNW	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	ESE
09:00-10:00	0.9	3.2	E	0.4	1.6	N	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	ESE
10:00-11:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SE
11:00-12:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SSE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.1			30.6			31.2			33.3			35.1		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.76			759.17			758.87			756.88			756.33		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

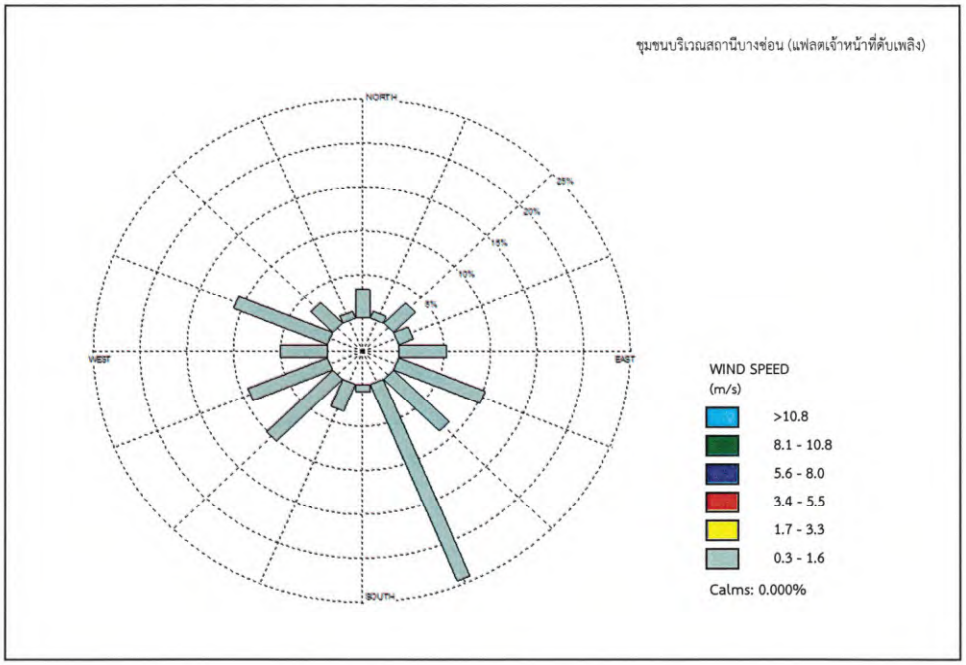

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	5.833	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	-	-	-	-
NE (34°-56°)	5.833	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	25.833	-	-	-	-
E (79°-102°)	8.333	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	19.167	0.833	-	-	-
SE (124°-146°)	0.833	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	4.167	-	-	-	-
S (169°-191°)	0.833	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	1.667	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	15.000	-	-	-	-
NW (304°-326°)	6.667	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	3.333	-	-	-	-
Total	98.332	0.833	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.833				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
16:00-17:00	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	N	1.3	4.8	WNW	0.9	3.2	NW
17:00-18:00	1.8	6.4	ESE	1.3	4.8	N	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	ENE
18:00-19:00	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	ENE	1.3	4.8	E	0.9	3.2	ESE
19:00-20:00	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	NNE
20:00-21:00	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	WNW	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	ESE
21:00-22:00	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	WNW	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	ENE
22:00-23:00	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	ENE	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	E
23:00-00:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ENE
00:00-01:00	1.3	4.8	ENE	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	ENE
01:00-02:00	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	E
02:00-03:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	N
03:00-04:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	WNW
04:00-05:00	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	WNW
05:00-06:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	WNW
06:00-07:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	N
07:00-08:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	WNW
08:00-09:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	N
09:00-10:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	ENE
10:00-11:00	0.4	1.6	E	1.3	4.8	WNW	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	ESE
11:00-12:00	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	NE	0.9	3.2	N	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	ENE
12:00-13:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	ESE
13:00-14:00	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	ESE
14:00-15:00	0.9	3.2	E	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	ESE
15:00-16:00	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	WNW	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	N	0.4	1.6	ENE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.4			32.9			32.9			28.6			32.8		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.78			757.38			757.55			758.55			757.67		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

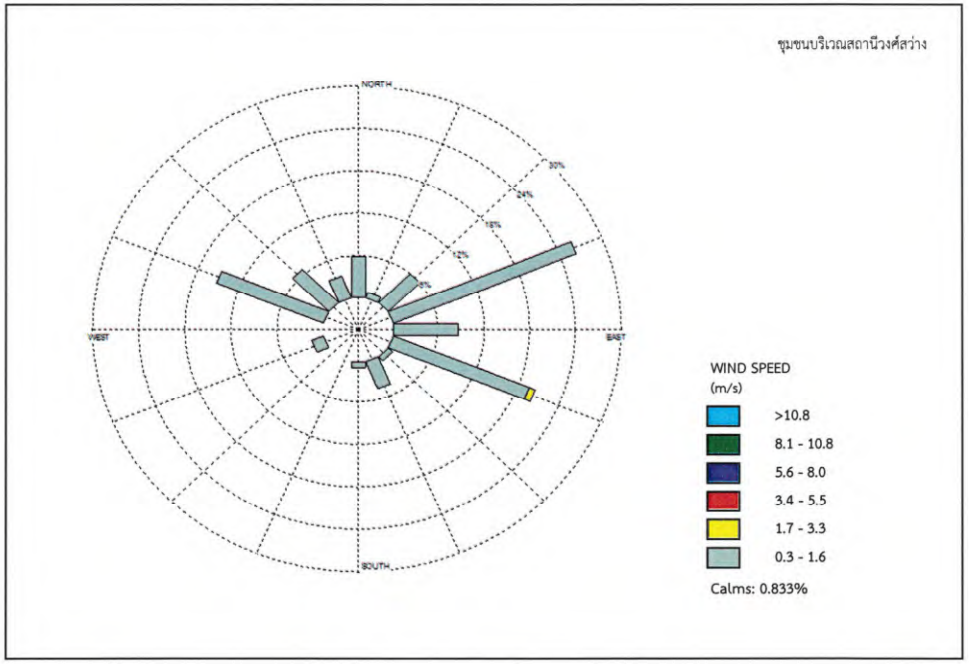

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	0.833	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	0.833	-	-	-
NE (34°-56°)	1.667	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	0.833	-	-	-	-
E (79°-102°)	0.833	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	20.000	1.667	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	18.333	5.000	-	-	-
S (169°-191°)	13.333	1.667	-	-	-
SSW (191°-214°)	5.000	0.833	-	-	-
SW (214°-236°)	2.500	0.833	-	-	-
WSW (236°-259°)	15.000	-	-	-	-
W (259°-281°)	0.833	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	0.833	-	-	-	-
NW (304°-326°)	0.833	0.833	-	-	-
NNW (326°-349°)	5.833	-	-	-	-
Total	87.497	11.666	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.833				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)														
	เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NNW	2.2	8.0	NW	0.4	1.6	NNE
16:00-17:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	ESE	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	WNW
17:00-18:00	1.3	4.8	S	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	ESE	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	WSW
18:00-19:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSW	1.8	6.4	S	0.4	1.6	WSW
19:00-20:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	WSW
20:00-21:00	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	S	0.9	3.2	S
21:00-22:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	ESE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE
22:00-23:00	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	S
23:00-00:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	WSW
00:00-01:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	WSW
01:00-02:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	S	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	WSW
02:00-03:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	WSW
03:00-04:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	S	0.0	0.0	SSE	0.4	1.6	SSW
04:00-05:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
05:00-06:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW
06:00-07:00	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW
07:00-08:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SW
08:00-09:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SW
09:00-10:00	0.4	1.6	ESE	1.8	6.4	SW	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	ESE
10:00-11:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	E
11:00-12:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSW
12:00-13:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	NNW	0.9	3.2	S
13:00-14:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	ESE
14:00-15:00	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	NNW	1.8	6.4	S	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	ESE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.0			32.6			32.3			28.8			32.8		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.95			754.54			754.73			755.72			754.70		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)

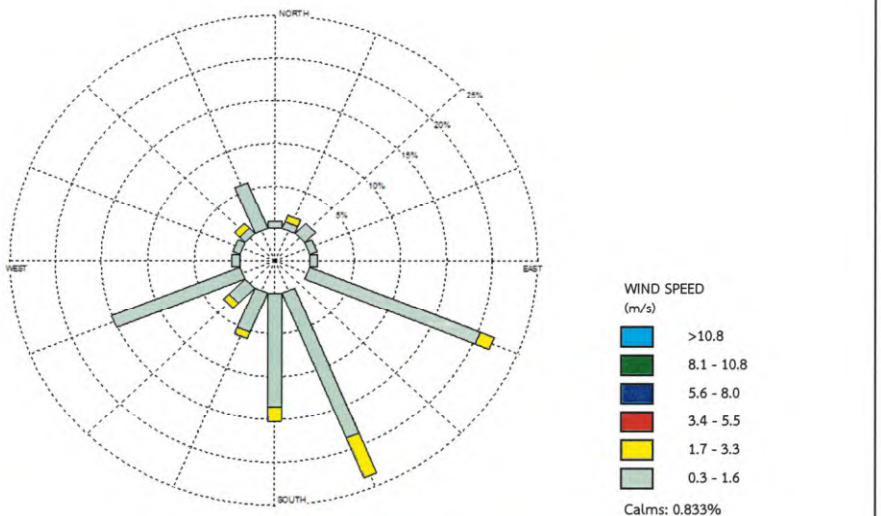

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี) Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.667	-	-	-	-
NE (34°-56°)	3.333	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.667	-	-	-	-
E (79°-102°)	5.000	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	10.000	-	-	-	-
SE (124°-146°)	12.500	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	-	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	0.833	-	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	19.167	-	-	-	-
W (259°-281°)	2.500	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	22.500	-	-	-	-
NW (304°-326°)	5.000	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	3.333	-	-	-	-
Total	87.500	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	12.500				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี) เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
13:00-14:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	WSW
14:00-15:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	SE
15:00-16:00	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	W	0.9	3.2	E	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW
16:00-17:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	WSW
17:00-18:00	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	NW	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	WSW
18:00-19:00	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	WSW
19:00-20:00	0.9	3.2	WNW	1.3	4.8	SE	1.3	4.8	WNW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	NNW
20:00-21:00	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NNW
21:00-22:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WNW
22:00-23:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	WNW
23:00-00:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	E	0.2	0.8	-	0.4	1.6	WNW
00:00-01:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ESE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	WSW
01:00-02:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ESE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	WSW	0.2	0.8	-
02:00-03:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	WNW	0.2	0.8	-
03:00-04:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SE
04:00-05:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ESE
05:00-06:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ENE
06:00-07:00	0.2	0.8	-	0.2	0.8	-	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SE
07:00-08:00	0.4	1.6	WNW	0.2	0.8	-	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	NW
08:00-09:00	0.4	1.6	WNW	0.2	0.8	-	0.9	3.2	ESE	0.2	0.8	-	0.9	3.2	W
09:00-10:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NE
10:00-11:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW
11:00-12:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WNW	1.3	4.8	WNW	0.9	3.2	WSW
12:00-13:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	NNW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.1			30.4			30.3			30.4			31.4		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.05			756.59			755.99			756.40			757.48		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com


BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี)

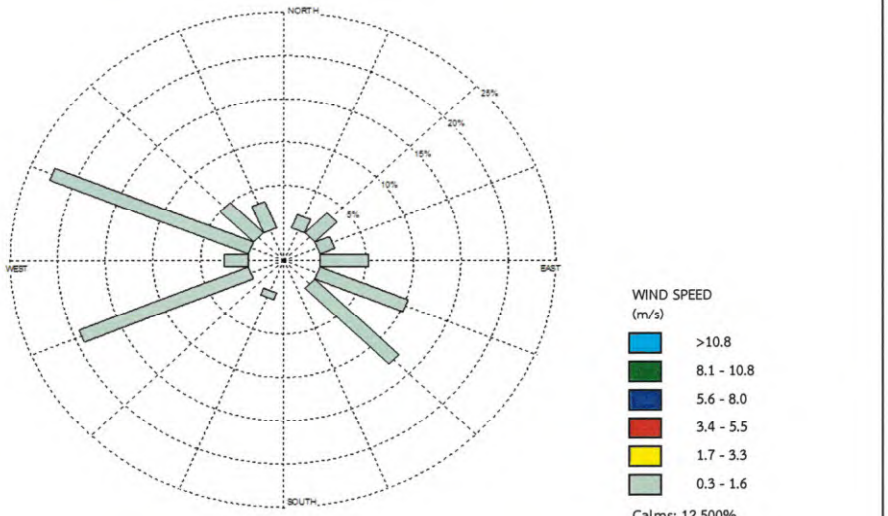

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	1.667	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	0.833	-	-	-
NE (34°-56°)	1.667	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.667	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.667	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	19.167	2.500	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	5.833	2.500	-	-	-
S (169°-191°)	18.333	2.500	-	-	-
SSW (191°-214°)	7.500	0.833	-	-	-
SW (214°-236°)	13.333	0.833	-	-	-
WSW (236°-259°)	2.500	-	-	-	-
W (259°-281°)	0.833	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	9.167	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	0.833	-	-	-
NNW (326°-349°)	4.167	-	-	-	-
Total	88.334	10.832	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.833				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	0.9	3.2	N	2.2	8.0	NW	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	WNW
16:00-17:00	1.3	4.8	NNW	1.3	4.8	WNW	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	W
17:00-18:00	1.3	4.8	NNW	1.8	6.4	NNE	1.8	6.4	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WNW
18:00-19:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	NNW
19:00-20:00	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	S	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	S
20:00-21:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	SW
21:00-22:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	E	0.9	3.2	WNW
22:00-23:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	E	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	WNW
23:00-00:00	1.8	6.4	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S	1.3	4.8	SSW
00:00-01:00	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE
01:00-02:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	WNW
02:00-03:00	1.3	4.8	S	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	WNW
03:00-04:00	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NNW
04:00-05:00	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	S	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ENE
05:00-06:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSW
06:00-07:00	0.4	1.6	S	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SW
07:00-08:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	S
08:00-09:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	ESE
09:00-10:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	WNW	1.3	4.8	ENE	1.3	4.8	SSE
10:00-11:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	WNW	1.3	4.8	NE	1.8	6.4	S
11:00-12:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	S	1.8	6.4	ESE
12:00-13:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	S	0.9	3.2	S	0.2	0.8	-	1.8	6.4	SSE
13:00-14:00	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	N	1.3	4.8	S
14:00-15:00	1.8	6.4	S	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	S
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	34.0			32.8			30.2			32.3			30.2		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.33			754.51			755.14			755.22			754.93		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี

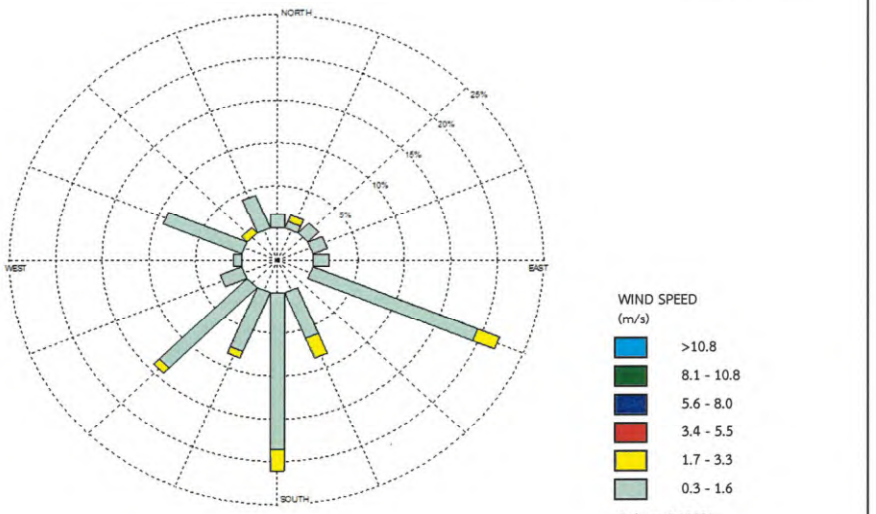

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	3.333	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	6.667	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.667	-	-	-	-
E (79°-102°)	4.167	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	4.167	-	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	5.000	-	-	-	-
S (169°-191°)	9.167	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	8.333	-	-	-	-
SW (214°-236°)	5.833	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	17.500	-	-	-	-
W (259°-281°)	12.500	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	0.833	-	-	-	-
NW (304°-326°)	0.833	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	1.667	-	-	-	-
Total	85.834	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	14.167				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์) เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
13:00-14:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S
14:00-15:00	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	S	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW
15:00-16:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	WSW
16:00-17:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	WSW
17:00-18:00	0.4	1.6	NNW	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	NE	0.2	0.8	-
18:00-19:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	W	0.2	0.8	-	0.2	0.8	-
19:00-20:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SSE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SSW
20:00-21:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	S	0.9	3.2	WSW	0.2	0.8	-	0.4	1.6	W
21:00-22:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	W	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW
22:00-23:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW
23:00-00:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	NE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	WSW
00:00-01:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	WSW
01:00-02:00	0.4	1.6	W	0.2	0.8	-	0.4	1.6	W	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	S
02:00-03:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	W	0.9	3.2	SSW	0.2	0.8	-
03:00-04:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	W	0.9	3.2	E	0.9	3.2	S
04:00-05:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	W	0.9	3.2	E	0.9	3.2	S
05:00-06:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	E	0.9	3.2	S
06:00-07:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	N	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	E	0.9	3.2	S
07:00-08:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	W	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE
08:00-09:00	0.4	1.6	SSW	0.2	0.8	-	0.2	0.8	-	0.4	1.6	E	0.2	0.8	-
09:00-10:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	0.2	0.8	-	0.4	1.6	NE
10:00-11:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE
11:00-12:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	N
12:00-13:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.6			30.6			31.5			30.6			31.1		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.10			756.61			756.04			755.54			755.18		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

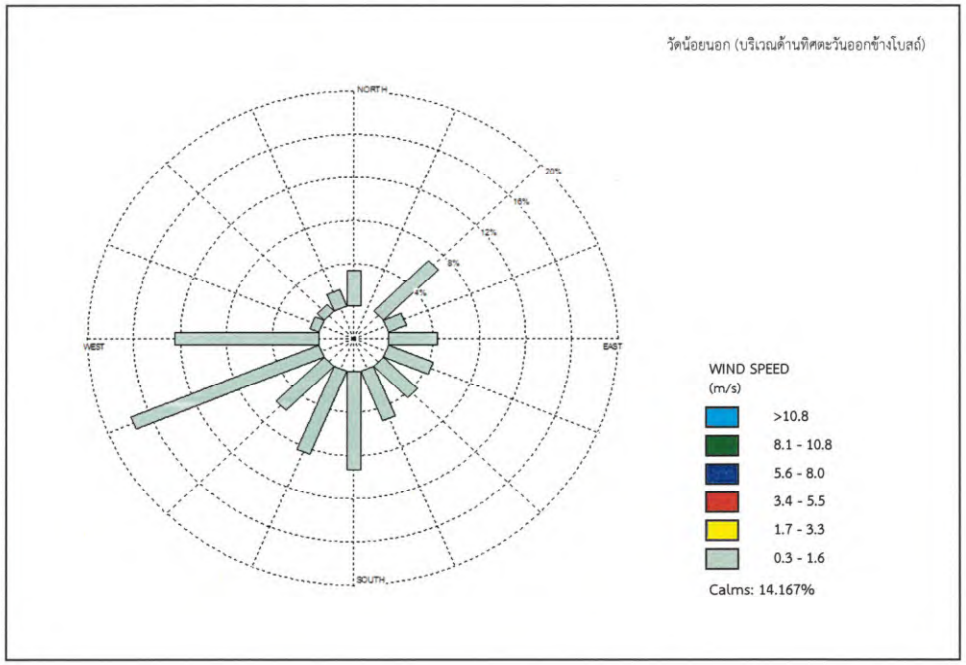

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	10.000	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	9.167	-	-	-	-
SE (124°-146°)	1.667	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	3.333	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	2.500	-	-	-	-
SW (214°-236°)	8.333	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	36.667	-	-	-	-
W (259°-281°)	26.667	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	98.334	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	1.667				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	0.4	1.6	E	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW
12:00-13:00	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW
13:00-14:00	0.4	1.6	E	0.9	3.2	E	0.9	3.2	W	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SW
14:00-15:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	E	0.4	1.6	E	0.4	1.6	S
15:00-16:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	W	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SW
16:00-17:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SW
17:00-18:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	W
18:00-19:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW	0.2	0.8	-
19:00-20:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	W	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW
20:00-21:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	W	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW
21:00-22:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	W	0.9	3.2	W	0.9	3.2	S
22:00-23:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSW
23:00-00:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SSW
00:00-01:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW
01:00-02:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	E	0.4	1.6	W	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SW
02:00-03:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SW
03:00-04:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW
04:00-05:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	W	0.4	1.6	WSW	0.2	0.8	-
05:00-06:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	W	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WSW
06:00-07:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	E	0.9	3.2	W	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WSW
07:00-08:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW
08:00-09:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	W	0.9	3.2	W	0.4	1.6	WSW
09:00-10:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	W
10:00-11:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	W
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	28.2			28.0			28.0			27.8			29.1		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.76			757.27			756.71			756.23			755.63		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

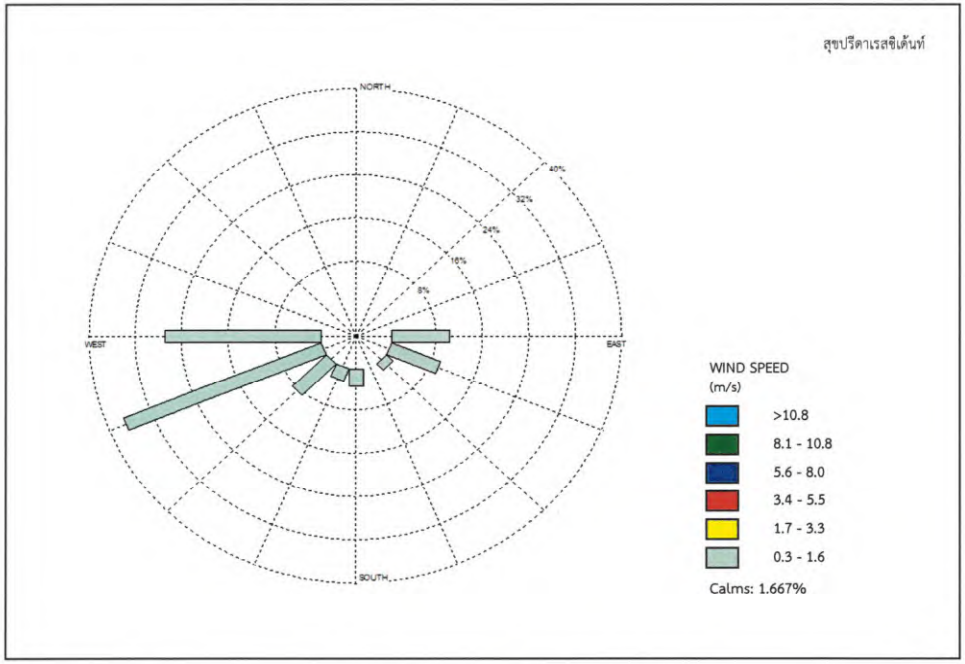

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	0.833	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	2.500	-	-	-	-
E (79°-102°)	5.833	0.833	-	-	-
ESE (102°-124°)	31.667	-	-	-	-
SE (124°-146°)	3.333	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	5.833	-	-	-	-
S (169°-191°)	10.000	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	4.167	-	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	9.167	-	-	-	-
W (259°-281°)	1.667	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	14.167	1.667	-	-	-
NW (304°-326°)	4.167	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	93.334	2.500	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	4.167				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WNW
13:00-14:00	1.8	6.4	WNW	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	ESE	1.8	6.4	WNW	1.3	4.8	WNW
14:00-15:00	1.3	4.8	WNW	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	NW	1.3	4.8	WNW
15:00-16:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	SSE	0.2	0.8	-	1.3	4.8	NW
16:00-17:00	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	S	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	WSW
17:00-18:00	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	E	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE
18:00-19:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE
19:00-20:00	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	E
20:00-21:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	E	0.9	3.2	ESE
21:00-22:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	E
22:00-23:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ESE
23:00-00:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE
00:00-01:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	ESE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	ESE
01:00-02:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	WSW	0.2	0.8	-
02:00-03:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	WNW	0.2	0.8	-
03:00-04:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ESE
04:00-05:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	ESE
05:00-06:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW
06:00-07:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	WSW
07:00-08:00	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SE
08:00-09:00	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	WSW
09:00-10:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	WSW
10:00-11:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	W
11:00-12:00	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	E
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	33.8			33.8			33.8			34.3			34.3		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	756.95			756.47			755.87			755.47			755.12		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

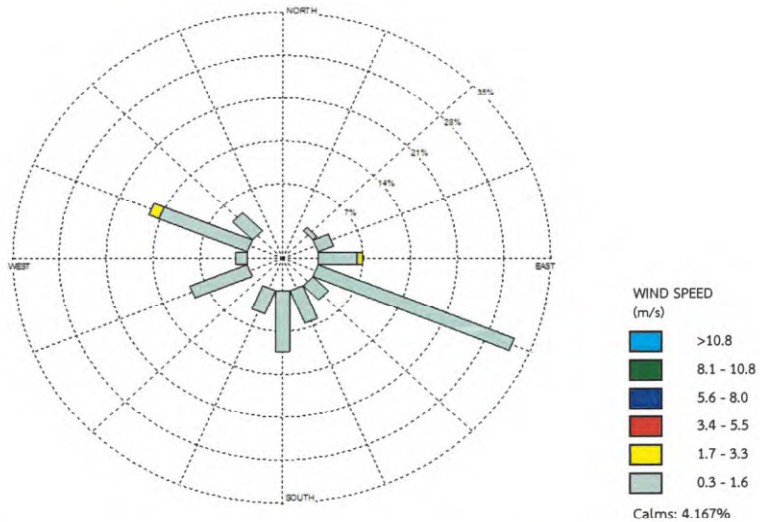

WIND SPEED
(m/s)

- >10.8
- 8.1 - 10.8
- 5.6 - 8.0
- 3.4 - 5.5
- 1.7 - 3.3
- 0.3 - 1.6

Calms: 4.167%

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

Wind Speed / Wind Direction	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	1.667	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	15.833	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	7.500	-	-	-	-
E (79°-102°)	2.500	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	21.667	-	-	-	-
SE (124°-146°)	2.500	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	14.167	-	-	-	-
S (169°-191°)	10.000	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	14.167	-	-	-	-
SW (214°-236°)	2.500	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	1.667	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	5.833	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	100.001	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6) เดือนพฤษภาคม 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	SSW
13:00-14:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	SSW
14:00-15:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	SSW
15:00-16:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SSW
16:00-17:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	WSW
17:00-18:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	WSW
18:00-19:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SW
19:00-20:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW
20:00-21:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW
21:00-22:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	N	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW
22:00-23:00	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSW
23:00-00:00	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSW
00:00-01:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SW
01:00-02:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW
02:00-03:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW
03:00-04:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SSW
04:00-05:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSW
05:00-06:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	S
06:00-07:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	S
07:00-08:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW
08:00-09:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S
09:00-10:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S
10:00-11:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	S
11:00-12:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.1			32.3			32.0			28.6			31.6		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	758.18			757.65			757.73			758.64			757.94		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com


BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	วันที่ออกรายงาน	:	11 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ข้างบ้านเลขที่ 102/6)

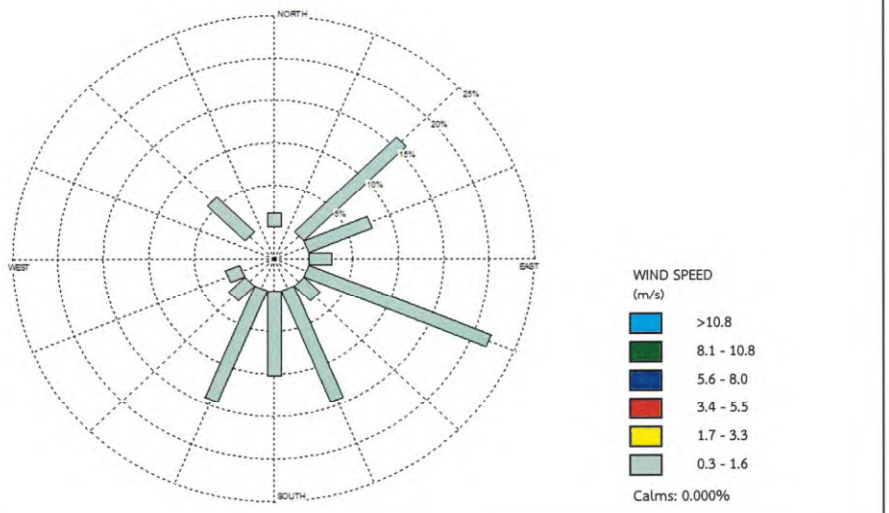

WIND SPEED
(m/s)

- >10.8
- 8.1 - 10.8
- 5.6 - 8.0
- 3.4 - 5.5
- 1.7 - 3.3
- 0.3 - 1.6

Calms: 0.000%

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

เอกสารแนบ 4-2

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	1-2			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	63.8	87.4	60.2	-
12:00-13:00	67.2	86.6	63.2	-
13:00-14:00	63.3	86.9	62.5	-
14:00-15:00	63.3	86.8	62.3	-
15:00-16:00	63.1	86.6	62.1	-
16:00-17:00	63.1	86.7	62.3	-
17:00-18:00	63.5	87.0	62.6	-
18:00-19:00	63.3	86.9	62.5	-
19:00-20:00	63.5	87.0	62.6	-
20:00-21:00	63.4	86.9	62.5	-
21:00-22:00	63.2	86.7	62.3	-
22:00-23:00	63.1	86.6	62.2	-
23:00-00:00	62.5	86.1	61.5	-
00:00-01:00	62.5	86.0	61.7	-
01:00-02:00	62.5	86.1	61.9	-
02:00-03:00	63.9	87.4	62.8	-
03:00-04:00	62.9	86.5	62.2	-
04:00-05:00	64.0	87.6	62.4	-
05:00-06:00	63.3	86.9	62.7	-
06:00-07:00	63.2	86.8	62.3	-
07:00-08:00	62.8	86.4	62.0	-
08:00-09:00	64.4	88.0	62.2	-
09:00-10:00	65.9	89.4	64.1	-
10:00-11:00	64.9	88.5	64.2	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	63.8	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	62.3	-
L_{max} [dB(A)]	-	89.4	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	69.7	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	2-3			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	65.0	91.6	62.3	-
12:00-13:00	65.4	91.9	64.8	-
13:00-14:00	65.1	91.7	64.7	-
14:00-15:00	64.8	91.4	64.4	-
15:00-16:00	64.9	91.4	64.4	-
16:00-17:00	65.0	91.5	64.5	-
17:00-18:00	64.6	91.1	64.1	-
18:00-19:00	64.6	91.1	64.1	-
19:00-20:00	64.4	90.9	63.9	-
20:00-21:00	64.4	91.0	63.9	-
21:00-22:00	64.1	90.7	63.7	-
22:00-23:00	64.3	90.9	63.9	-
23:00-00:00	64.3	90.9	63.8	-
00:00-01:00	63.9	90.4	63.5	-
01:00-02:00	63.8	90.4	63.5	-
02:00-03:00	64.2	90.7	63.7	-
03:00-04:00	64.3	90.9	64.0	-
04:00-05:00	64.4	90.9	64.0	-
05:00-06:00	64.5	91.0	64.0	-
06:00-07:00	64.5	91.1	64.1	-
07:00-08:00	64.7	91.2	64.2	-
08:00-09:00	64.3	90.1	54.3	-
09:00-10:00	54.6	79.5	49.6	-
10:00-11:00	52.6	79.1	49.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	64.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	63.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	91.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	70.7	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	57.6	83.2	54.7	-
12:00-13:00	60.8	86.3	55.6	-
13:00-14:00	60.0	85.5	55.6	-
14:00-15:00	58.4	84.0	55.1	-
15:00-16:00	58.2	83.7	54.9	-
16:00-17:00	58.8	84.3	55.4	-
17:00-18:00	58.8	84.4	55.6	-
18:00-19:00	59.1	84.7	55.8	-
19:00-20:00	58.8	84.4	56.0	-
20:00-21:00	58.5	84.1	55.8	-
21:00-22:00	58.6	84.2	55.3	-
22:00-23:00	58.1	83.7	54.8	-
23:00-00:00	57.6	83.1	53.9	-
00:00-01:00	55.4	81.0	52.1	-
01:00-02:00	54.4	79.9	51.0	-
02:00-03:00	53.2	78.8	49.7	-
03:00-04:00	53.0	78.5	48.7	-
04:00-05:00	54.0	79.6	50.5	-
05:00-06:00	56.1	81.7	52.0	-
06:00-07:00	57.6	83.1	53.8	-
07:00-08:00	57.7	83.2	54.4	-
08:00-09:00	57.9	83.4	54.6	-
09:00-10:00	58.1	83.7	54.9	-
10:00-11:00	58.7	84.3	54.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	57.9	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	54.8	-
L_{max} [dB(A)]	-	86.3	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	62.8	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	58.2	83.7	54.9	-
12:00-13:00	57.6	83.2	54.6	-
13:00-14:00	57.9	83.4	56.7	-
14:00-15:00	63.5	89.4	57.5	-
15:00-16:00	64.5	91.6	55.6	-
16:00-17:00	62.3	87.8	56.3	-
17:00-18:00	61.3	86.8	56.4	-
18:00-19:00	59.3	84.9	55.9	-
19:00-20:00	59.4	85.0	55.9	-
20:00-21:00	58.7	84.3	55.2	-
21:00-22:00	57.8	83.4	54.1	-
22:00-23:00	57.6	83.2	53.4	-
23:00-00:00	55.9	81.5	51.7	-
00:00-01:00	55.5	81.1	48.9	-
01:00-02:00	53.4	79.0	47.8	-
02:00-03:00	54.7	80.2	47.0	-
03:00-04:00	53.7	79.2	47.5	-
04:00-05:00	54.2	79.7	49.0	-
05:00-06:00	55.8	81.3	51.2	-
06:00-07:00	58.0	83.6	53.9	-
07:00-08:00	58.8	84.3	55.3	-
08:00-09:00	59.2	84.8	55.7	-
09:00-10:00	58.3	83.9	54.8	-
10:00-11:00	59.3	84.9	54.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	59.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	54.7	-
L_{max} [dB(A)]	-	91.6	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	63.3	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (ห้าดาวคอนโดมิเนียม)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	58.5	84.1	54.7	-
12:00-13:00	58.2	83.8	54.2	-
13:00-14:00	57.8	83.4	54.5	-
14:00-15:00	58.2	83.8	54.4	-
15:00-16:00	59.0	84.5	54.8	-
16:00-17:00	59.5	85.1	56.0	-
17:00-18:00	59.3	84.9	55.7	-
18:00-19:00	60.0	85.5	56.3	-
19:00-20:00	59.7	85.2	55.8	-
20:00-21:00	58.7	84.3	55.2	-
21:00-22:00	58.2	83.8	53.8	-
22:00-23:00	58.0	83.6	53.7	-
23:00-00:00	55.9	81.5	51.3	-
00:00-01:00	53.6	79.2	50.0	-
01:00-02:00	53.5	79.1	49.9	-
02:00-03:00	53.0	78.6	49.7	-
03:00-04:00	52.6	78.2	47.7	-
04:00-05:00	53.4	78.9	48.7	-
05:00-06:00	55.7	81.2	51.6	-
06:00-07:00	57.4	83.0	53.8	-
07:00-08:00	59.1	84.7	55.1	-
08:00-09:00	55.2	80.8	52.5	-
09:00-10:00	53.9	79.1	51.4	-
10:00-11:00	52.6	78.6	50.1	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	57.4	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	53.8	-
L_{max} [dB(A)]	-	85.5	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	62.4	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B09	SCARLET	ST-12D	10351478	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	1-2			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	62.9	93.5	59.9	-
13:00-14:00	66.8	96.8	56.8	-
14:00-15:00	58.0	93.5	55.3	-
15:00-16:00	59.3	94.9	55.5	-
16:00-17:00	59.0	94.6	55.4	-
17:00-18:00	60.0	95.5	56.3	-
18:00-19:00	58.9	94.5	56.2	-
19:00-20:00	62.1	97.7	56.6	-
20:00-21:00	60.2	95.7	56.1	-
21:00-22:00	57.9	93.5	53.9	-
22:00-23:00	57.4	93.0	52.4	-
23:00-00:00	56.5	92.1	51.4	-
00:00-01:00	54.7	90.3	50.3	-
01:00-02:00	56.9	92.5	50.3	-
02:00-03:00	54.5	90.1	49.8	-
03:00-04:00	53.6	89.1	50.6	-
04:00-05:00	55.2	90.8	52.3	-
05:00-06:00	59.2	96.2	52.7	-
06:00-07:00	57.9	93.4	54.0	-
07:00-08:00	59.3	94.8	55.5	-
08:00-09:00	59.5	95.0	56.0	-
09:00-10:00	59.4	95.0	56.1	-
10:00-11:00	59.1	94.7	56.0	-
11:00-12:00	58.4	94.0	55.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	59.7	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	55.4	-
L_{max} [dB(A)]	-	97.7	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	63.9	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	2-3			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	59.5	95.1	56.0	-
13:00-14:00	59.0	94.5	56.8	-
14:00-15:00	63.2	93.2	56.3	-
15:00-16:00	59.0	94.6	55.6	-
16:00-17:00	59.7	95.3	56.1	-
17:00-18:00	60.5	96.0	57.4	-
18:00-19:00	59.9	95.5	57.6	-
19:00-20:00	60.6	96.2	57.3	-
20:00-21:00	60.3	95.9	57.2	-
21:00-22:00	59.5	95.1	56.4	-
22:00-23:00	58.0	93.5	55.2	-
23:00-00:00	58.0	93.6	55.1	-
00:00-01:00	56.7	92.3	54.0	-
01:00-02:00	55.8	91.4	53.6	-
02:00-03:00	55.1	90.7	53.5	-
03:00-04:00	56.5	92.1	53.9	-
04:00-05:00	56.0	91.6	54.2	-
05:00-06:00	57.3	92.9	54.9	-
06:00-07:00	58.7	94.2	56.5	-
07:00-08:00	60.5	96.1	57.0	-
08:00-09:00	59.3	94.9	56.4	-
09:00-10:00	60.1	95.7	55.9	-
10:00-11:00	58.8	94.4	55.7	-
11:00-12:00	58.4	94.0	55.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	59.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	55.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	96.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	64.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	62.3	97.8	56.2	-
13:00-14:00	60.4	95.9	56.4	-
14:00-15:00	62.8	98.4	57.3	-
15:00-16:00	59.2	94.7	56.5	-
16:00-17:00	59.5	95.0	56.4	-
17:00-18:00	60.4	96.0	57.2	-
18:00-19:00	59.4	95.0	56.9	-
19:00-20:00	60.8	96.4	56.5	-
20:00-21:00	60.3	95.8	56.3	-
21:00-22:00	59.1	94.6	55.9	-
22:00-23:00	56.5	92.1	53.7	-
23:00-00:00	56.9	92.5	53.1	-
00:00-01:00	56.9	92.5	53.0	-
01:00-02:00	54.6	90.2	51.9	-
02:00-03:00	54.5	90.1	51.8	-
03:00-04:00	54.4	90.0	52.0	-
04:00-05:00	55.2	90.7	52.4	-
05:00-06:00	57.5	93.0	53.5	-
06:00-07:00	57.7	93.2	54.9	-
07:00-08:00	59.7	95.2	56.4	-
08:00-09:00	58.8	94.3	55.9	-
09:00-10:00	57.4	92.2	54.2	-
10:00-11:00	61.0	96.6	55.7	-
11:00-12:00	58.5	94.1	55.1	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	59.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	55.7	-
L_{max} [dB(A)]	-	98.4	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	63.5	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	58.8	94.3	55.0	-
13:00-14:00	58.0	93.5	54.9	-
14:00-15:00	58.0	93.6	55.4	-
15:00-16:00	59.4	95.0	56.1	-
16:00-17:00	59.1	94.7	57.1	-
17:00-18:00	63.8	96.8	59.0	-
18:00-19:00	65.1	93.7	57.1	-
19:00-20:00	59.9	95.5	56.7	-
20:00-21:00	61.4	97.0	56.2	-
21:00-22:00	59.3	94.8	55.8	-
22:00-23:00	58.0	93.5	54.7	-
23:00-00:00	57.5	93.0	54.2	-
00:00-01:00	57.0	92.6	52.8	-
01:00-02:00	56.1	91.6	52.9	-
02:00-03:00	55.1	90.6	52.6	-
03:00-04:00	54.2	89.8	52.3	-
04:00-05:00	55.1	90.7	53.0	-
05:00-06:00	57.2	92.7	54.1	-
06:00-07:00	58.5	94.1	55.6	-
07:00-08:00	60.0	95.5	56.8	-
08:00-09:00	60.9	96.5	57.2	-
09:00-10:00	59.7	95.2	56.0	-
10:00-11:00	58.6	94.2	56.3	-
11:00-12:00	58.8	94.4	55.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	59.5	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	55.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	97.0	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	64.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	58.5	94.1	55.5	-
13:00-14:00	60.9	96.4	55.8	-
14:00-15:00	59.0	94.6	55.5	-
15:00-16:00	59.3	94.9	55.9	-
16:00-17:00	59.5	95.1	56.4	-
17:00-18:00	60.5	96.1	57.5	-
18:00-19:00	60.2	95.7	58.0	-
19:00-20:00	61.2	96.8	58.0	-
20:00-21:00	60.4	95.9	57.7	-
21:00-22:00	59.0	94.5	56.9	-
22:00-23:00	59.1	94.7	54.6	-
23:00-00:00	57.5	93.0	54.2	-
00:00-01:00	58.7	94.2	53.4	-
01:00-02:00	58.2	93.8	53.0	-
02:00-03:00	56.9	92.4	53.1	-
03:00-04:00	57.9	93.5	54.2	-
04:00-05:00	57.2	92.8	54.2	-
05:00-06:00	56.8	92.3	54.3	-
06:00-07:00	58.1	93.6	55.6	-
07:00-08:00	59.5	95.0	56.8	-
08:00-09:00	60.0	95.5	56.7	-
09:00-10:00	59.5	95.0	56.4	-
10:00-11:00	57.9	91.6	54.1	-
11:00-12:00	56.3	90.7	52.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	59.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	55.5	-
L_{max} [dB(A)]	-	96.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	64.6	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com,. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง เดือนพฤษภาคม 2569 1-2			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
16:00-17:00	61.8	84.5	56.7	-
17:00-18:00	62.9	80.0	58.1	-
18:00-19:00	63.2	79.3	58.6	-
19:00-20:00	64.4	86.7	58.9	-
20:00-21:00	63.7	85.6	58.8	-
21:00-22:00	63.5	83.2	58.7	-
22:00-23:00	63.5	84.2	57.7	-
23:00-00:00	63.1	86.7	56.9	-
00:00-01:00	63.1	85.1	54.4	-
01:00-02:00	61.2	87.5	54.9	-
02:00-03:00	61.4	79.0	52.7	-
03:00-04:00	59.0	84.2	53.1	-
04:00-05:00	59.4	79.7	55.0	-
05:00-06:00	62.0	79.8	56.5	-
06:00-07:00	63.2	85.1	59.5	-
07:00-08:00	64.2	84.9	58.6	-
08:00-09:00	64.9	80.1	59.4	-
09:00-10:00	62.8	81.7	57.9	-
10:00-11:00	61.9	76.7	57.7	-
11:00-12:00	61.3	76.9	57.1	-
12:00-13:00	61.5	80.9	57.5	-
13:00-14:00	60.9	75.8	57.1	-
14:00-15:00	62.5	78.8	57.0	-
15:00-16:00	61.1	79.9	56.6	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	62.6	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	57.1	-
L_{max} [dB(A)]	-	87.5	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	68.6	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B15	ACO	6236	00222300
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com,. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง เดือนพฤษภาคม 2569 2-3			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
16:00-17:00	62.2	82.1	57.6	-
17:00-18:00	63.2	81.3	58.4	-
18:00-19:00	65.3	80.4	58.2	-
19:00-20:00	62.6	81.1	58.1	-
20:00-21:00	62.8	86.7	58.3	-
21:00-22:00	63.0	84.0	58.0	-
22:00-23:00	62.2	83.6	56.9	-
23:00-00:00	62.1	81.7	55.1	-
00:00-01:00	62.0	82.2	53.9	-
01:00-02:00	60.8	87.8	52.5	-
02:00-03:00	59.5	84.4	52.8	-
03:00-04:00	59.3	80.8	53.4	-
04:00-05:00	58.9	80.3	54.2	-
05:00-06:00	60.3	83.4	55.2	-
06:00-07:00	61.7	82.4	55.9	-
07:00-08:00	62.6	81.7	56.8	-
08:00-09:00	63.3	83.9	58.0	-
09:00-10:00	62.6	81.9	58.4	-
10:00-11:00	61.8	75.9	58.0	-
11:00-12:00	62.0	80.0	58.5	-
12:00-13:00	61.6	81.1	57.5	-
13:00-14:00	61.8	85.5	56.7	-
14:00-15:00	63.7	78.9	58.3	-
15:00-16:00	62.4	78.0	58.6	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	62.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	57.5	-
L_{max} [dB(A)]	-	87.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	67.7	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B15	ACO	6236	00222300
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com,. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
16:00-17:00	62.3	81.6	57.8	-
17:00-18:00	62.7	83.2	58.8	-
18:00-19:00	62.4	85.6	57.7	-
19:00-20:00	62.8	82.1	58.1	-
20:00-21:00	62.1	81.8	58.4	-
21:00-22:00	63.5	85.6	58.0	-
22:00-23:00	62.5	80.9	56.8	-
23:00-00:00	62.3	87.9	55.1	-
00:00-01:00	58.9	76.7	52.7	-
01:00-02:00	57.6	76.8	51.8	-
02:00-03:00	58.1	77.3	52.3	-
03:00-04:00	58.6	77.6	52.7	-
04:00-05:00	59.4	77.8	54.1	-
05:00-06:00	61.0	76.7	56.4	-
06:00-07:00	63.0	85.1	57.0	-
07:00-08:00	63.9	81.7	58.6	-
08:00-09:00	63.6	81.7	58.8	-
09:00-10:00	63.3	84.1	58.4	-
10:00-11:00	62.4	84.2	58.2	-
11:00-12:00	61.3	74.8	57.2	-
12:00-13:00	62.3	86.4	58.2	-
13:00-14:00	63.5	86.0	57.3	-
14:00-15:00	61.5	84.5	57.2	-
15:00-16:00	63.0	86.7	57.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	62.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	57.3	-
L_{max} [dB(A)]	-	87.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	67.4	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B15	ACO	6236	00222300
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com,. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
16:00-17:00	64.4	86.1	59.7	-
17:00-18:00	65.4	82.0	60.3	-
18:00-19:00	64.3	85.6	60.2	-
19:00-20:00	64.8	80.5	60.2	-
20:00-21:00	64.3	84.3	59.6	-
21:00-22:00	63.2	81.4	57.8	-
22:00-23:00	62.3	85.7	55.8	-
23:00-00:00	62.8	82.4	53.4	-
00:00-01:00	60.0	80.3	52.9	-
01:00-02:00	59.3	79.5	52.7	-
02:00-03:00	58.4	76.9	53.7	-
03:00-04:00	59.7	78.0	55.4	-
04:00-05:00	62.1	82.1	58.3	-
05:00-06:00	64.4	85.0	59.5	-
06:00-07:00	63.7	80.6	59.1	-
07:00-08:00	65.1	86.3	60.0	-
08:00 09:00	63.5	80.8	58.4	-
09:00-10:00	62.7	81.0	57.9	-
10:00-11:00	62.6	85.1	58.1	-
11:00-12:00	62.6	83.6	58.4	-
12:00-13:00	64.1	88.5	58.0	-
13:00-14:00	63.7	87.0	59.0	-
14:00-15:00	63.0	80.9	58.8	-
15:00-16:00	63.1	77.1	59.1	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	63.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	58.4	-
L_{max} [dB(A)]	-	88.5	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	68.6	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B15	ACO	6236	00222300
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
16:00-17:00	62.6	82.6	58.2	-
17:00-18:00	63.4	81.5	59.1	-
18:00-19:00	64.3	83.4	59.9	-
19:00-20:00	63.9	79.0	59.7	-
20:00-21:00	64.2	86.2	59.5	-
21:00-22:00	63.6	86.1	58.4	-
22:00-23:00	62.6	78.8	57.5	-
23:00-00:00	64.2	80.3	54.9	-
00:00-01:00	60.4	83.1	53.9	-
01:00-02:00	60.3	82.7	52.8	-
02:00-03:00	59.8	85.9	53.9	-
03:00-04:00	60.2	80.0	55.6	-
04:00-05:00	61.7	81.7	58.1	-
05:00-06:00	64.2	81.9	59.6	-
06:00-07:00	64.4	82.9	59.5	-
07:00-08:00	64.7	85.5	60.1	-
08:00-09:00	63.5	79.7	58.9	-
09:00-10:00	62.8	84.7	57.7	-
10:00-11:00	62.8	87.4	59.4	-
11:00-12:00	65.8	81.0	58.9	-
12:00-13:00	63.6	86.5	59.7	-
13:00-14:00	61.2	81.5	55.9	-
14:00-15:00	59.8	79.9	51.3	-
15:00-16:00	58.3	80.4	54.0	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	63.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	58.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	87.4	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	68.9	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B15	ACO	6236	00222300	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	1-2			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	54.1	78.3	46.9	-
16:00-17:00	53.9	73.5	46.9	-
17:00-18:00	51.6	70.0	46.3	-
18:00-19:00	52.4	69.8	46.3	-
19:00-20:00	51.3	75.6	47.2	-
20:00-21:00	52.8	63.1	48.1	-
21:00-22:00	53.6	67.3	51.7	-
22:00-23:00	52.1	67.5	48.4	-
23:00-00:00	51.4	64.2	47.7	-
00:00-01:00	49.5	60.0	45.2	-
01:00-02:00	47.9	65.7	43.9	-
02:00-03:00	46.6	64.9	41.9	-
03:00-04:00	47.7	63.4	42.8	-
04:00-05:00	49.2	68.6	44.7	-
05:00-06:00	51.1	68.6	48.3	-
06:00-07:00	54.9	80.0	46.5	-
07:00-08:00	52.9	73.4	46.7	-
08:00-09:00	51.2	72.0	46.0	-
09:00-10:00	50.3	71.4	46.8	-
10:00-11:00	52.8	76.7	44.4	-
11:00-12:00	51.2	67.5	47.0	-
12:00-13:00	51.0	81.6	46.9	-
13:00-14:00	50.5	65.3	47.0	-
14:00-15:00	51.5	63.0	47.3	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.7	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	46.8	-
L_{max} [dB(A)]	-	81.6	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	57.4	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B32	ACO	6236	00182014
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	2-3			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	54.8	66.7	53.6	-
16:00-17:00	54.5	59.7	51.3	-
17:00-18:00	51.4	63.2	48.2	-
18:00-19:00	50.6	57.6	48.5	-
19:00-20:00	50.8	70.1	47.6	-
20:00-21:00	51.7	66.4	44.9	-
21:00-22:00	51.5	69.6	45.7	-
22:00-23:00	50.8	66.1	43.5	-
23:00-00:00	50.1	62.6	43.3	-
00:00-01:00	49.4	59.1	43.1	-
01:00-02:00	49.1	63.7	41.7	-
02:00-03:00	45.8	61.1	41.2	-
03:00-04:00	46.4	61.5	41.7	-
04:00-05:00	47.0	60.0	43.2	-
05:00-06:00	49.6	67.3	45.8	-
06:00-07:00	52.2	74.6	47.0	-
07:00-08:00	54.0	81.9	45.9	-
08:00-09:00	50.3	72.8	44.1	-
09:00-10:00	50.1	67.9	46.7	-
10:00-11:00	53.7	72.2	46.4	-
11:00-12:00	51.6	75.0	46.7	-
12:00-13:00	53.6	77.9	47.1	-
13:00-14:00	54.1	81.8	48.8	-
14:00-15:00	55.4	85.4	46.0	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.9	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	45.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	85.4	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	56.5	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B32	ACO	6236	00182014
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	52.5	77.2	45.7	-
16:00-17:00	52.0	74.5	44.4	-
17:00-18:00	51.3	69.3	44.9	-
18:00-19:00	51.9	84.1	46.2	-
19:00-20:00	51.6	69.7	47.5	-
20:00-21:00	51.0	68.3	47.3	-
21:00-22:00	49.8	66.9	46.2	-
22:00-23:00	49.2	66.7	45.7	-
23:00-00:00	48.0	64.8	43.8	-
00:00-01:00	48.0	68.6	43.3	-
01:00-02:00	45.3	67.9	42.7	-
02:00-03:00	45.5	71.1	42.0	-
03:00-04:00	46.3	67.3	41.5	-
04:00-05:00	45.0	60.6	41.9	-
05:00-06:00	47.9	68.4	43.1	-
06:00-07:00	50.1	67.9	46.1	-
07:00-08:00	52.9	73.3	46.4	-
08:00-09:00	52.9	74.4	44.7	-
09:00-10:00	51.1	73.4	47.7	-
10:00-11:00	54.3	80.0	44.9	-
11:00-12:00	51.5	70.8	46.2	-
12:00-13:00	53.1	77.2	45.4	-
13:00-14:00	50.3	72.8	44.1	-
14:00-15:00	50.1	67.9	44.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.7	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	44.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	84.1	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	55.0	-	-	-

Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		-
SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
ACO-B32	ACO	6236	00182014	
Actual Reading [dB]				
Before Adjustment		After Adjustment		
93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	53.7	72.2	46.4	-
16:00-17:00	52.7	73.9	46.5	-
17:00-18:00	52.4	72.6	48.4	-
18:00-19:00	51.4	73.5	46.0	-
19:00-20:00	49.8	63.0	44.9	-
20:00-21:00	51.9	73.4	47.4	-
21:00-22:00	54.4	72.7	52.3	-
22:00-23:00	68.2	84.5	58.9	-
23:00-00:00	59.3	73.6	49.6	-
00:00-01:00	50.8	63.5	47.2	-
01:00-02:00	49.4	65.9	46.9	-
02:00-03:00	53.7	70.0	49.3	-
03:00-04:00	51.0	68.6	47.0	-
04:00-05:00	49.4	64.0	46.4	-
05:00-06:00	48.6	64.7	44.9	-
06:00-07:00	47.6	64.1	43.3	-
07:00-08:00	47.0	60.0	43.2	-
08:00-09:00	49.6	67.3	44.1	-
09:00-10:00	50.4	67.6	44.8	-
10:00-11:00	51.7	76.1	46.5	-
11:00-12:00	53.4	76.7	44.9	-
12:00-13:00	51.3	77.5	47.9	-
13:00-14:00	54.9	76.7	44.9	-
14:00-15:00	51.4	76.3	42.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.5	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	46.4	-
L_{max} [dB(A)]	-	84.5	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	65.5	-	-	-

Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		-
SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
ACO-B32	ACO	6236	00182014	
Actual Reading [dB]				
Before Adjustment		After Adjustment		
93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดโพธิ์ทองล่าง (ด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	49.1	67.3	44.9	-
16:00-17:00	51.7	74.0	45.0	-
17:00-18:00	51.7	66.9	47.2	-
18:00-19:00	54.2	71.2	45.1	-
19:00-20:00	51.3	67.0	47.0	-
20:00-21:00	50.4	67.6	45.9	-
21:00-22:00	48.7	68.9	45.2	-
22:00-23:00	48.4	63.1	44.7	-
23:00-00:00	48.0	65.3	44.0	-
00:00-01:00	46.9	66.3	43.4	-
01:00-02:00	45.4	69.4	41.1	-
02:00-03:00	43.0	54.6	40.6	-
03:00-04:00	46.4	79.9	42.4	-
04:00-05:00	45.2	62.3	42.8	-
05:00-06:00	49.8	70.0	46.0	-
06:00-07:00	52.9	73.3	45.9	-
07:00-08:00	52.8	76.1	45.6	-
08:00-09:00	51.2	75.1	44.9	-
09:00-10:00	50.9	71.5	45.1	-
10:00-11:00	51.2	70.1	44.9	-
11:00-12:00	51.2	75.2	45.7	-
12:00-13:00	51.3	68.5	44.2	-
13:00-14:00	50.8	70.8	45.1	-
14:00-15:00	52.1	72.3	45.3	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.5	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	45.0	-
L_{max} [dB(A)]	-	79.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	55.3	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B32	ACO	6236	00182014	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนกฤษณะวิทยา (แนวรั้วข้างฟลอร่า วงศ์สว่าง) เดือนพฤษภาคม 2569 1-2			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	64.2	92.8	59.1	-
15:00-16:00	63.7	92.3	59.8	-
16:00-17:00	64.5	93.1	60.1	-
17:00-18:00	65.3	93.8	60.5	-
18:00-19:00	64.6	93.2	60.4	-
19:00-20:00	64.7	93.3	60.4	-
20:00-21:00	64.8	93.3	59.9	-
21:00-22:00	65.0	93.6	59.9	-
22:00-23:00	64.5	93.1	57.8	-
23:00-00:00	63.3	91.6	56.4	-
00:00-01:00	63.1	91.5	56.9	-
01:00-02:00	63.2	91.8	53.4	-
02:00-03:00	59.3	92.8	53.3	-
03:00-04:00	60.1	93.7	54.9	-
04:00-05:00	61.9	90.7	56.8	-
05:00-06:00	62.9	92.5	58.4	-
06:00-07:00	64.5	89.6	60.1	-
07:00-08:00	65.0	90.3	59.8	-
08:00-09:00	65.1	93.4	60.3	-
09:00-10:00	64.3	91.6	59.9	-
10:00-11:00	63.6	92.8	59.6	-
11:00-12:00	63.8	93.2	59.7	-
12:00-13:00	64.3	92.8	60.0	-
13:00-14:00	64.9	91.4	59.4	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	64.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	59.7	-
L_{max} [dB(A)]	-	93.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	69.5	-	-	-
-	Sound Level Meter Data Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26 — 30 April 2026 SLM No. ST-C1-B21 — Brand SCARLET — Model ST-12D — Serial No. 10352325 Actual Reading [dB] Before Adjustment 93.9 — After Adjustment 93.9			-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนกฤษณะวิทยา (แนวรั้วข้างฟลอร่า วงศ์สว่าง) เดือนพฤษภาคม 2569 2-3			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	64.1	91.7	60.5	-
15:00-16:00	67.4	92.8	59.7	-
16:00-17:00	64.3	91.6	59.8	-
17:00-18:00	65.7	92.3	60.4	-
18:00-19:00	65.4	91.2	60.5	-
19:00-20:00	65.6	90.2	60.3	-
20:00-21:00	65.0	87.5	60.8	-
21:00-22:00	64.4	91.9	59.1	-
22:00-23:00	63.7	90.3	57.5	-
23:00-00:00	63.2	88.8	55.9	-
00:00-01:00	62.8	90.4	53.9	-
01:00-02:00	60.4	92.9	54.5	-
02:00-03:00	59.8	92.4	55.3	-
03:00-04:00	61.4	89.0	55.4	-
04:00-05:00	62.0	89.5	55.2	-
05:00-06:00	62.1	89.7	56.8	-
06:00-07:00	63.5	90.1	57.9	-
07:00-08:00	64.6	90.5	58.9	-
08:00-09:00	64.3	91.9	59.4	-
09:00-10:00	61.5	91.6	58.6	-
10:00-11:00	63.9	79.6	58.6	-
11:00-12:00	63.9	86.4	59.6	-
12:00-13:00	64.5	89.6	60.0	-
13:00-14:00	63.9	91.3	59.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	64.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	58.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	92.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	69.1	-	-	-
-	Sound Level Meter Data Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26 — 30 April 2026 SLM No. ST-C1-B21 — Brand SCARLET — Model ST-12D — Serial No. 10352325 Actual Reading [dB] Before Adjustment 93.9 — After Adjustment 93.9			-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนกฤษณะวิทยา (แนวรั้วข้างฟลอร่า วงศ์สว่าง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	64.1	94.6	60.3	-
15:00-16:00	65.0	95.6	60.4	-
16:00-17:00	64.6	95.2	60.5	-
17:00-18:00	65.1	95.6	60.8	-
18:00-19:00	66.4	95.9	62.7	-
19:00-20:00	65.8	95.3	60.2	-
20:00-21:00	65.2	95.7	59.9	-
21:00-22:00	64.7	95.2	58.2	-
22:00-23:00	63.9	94.5	56.7	-
23:00-00:00	63.1	93.6	54.8	-
00:00-01:00	61.3	90.9	55.8	-
01:00-02:00	62.3	90.7	55.3	-
02:00-03:00	59.7	90.3	53.2	-
03:00-04:00	59.7	91.3	54.9	-
04:00-05:00	61.3	90.9	56.3	-
05:00-06:00	63.1	94.1	58.3	-
06:00-07:00	64.8	95.4	59.6	-
07:00-08:00	64.9	95.5	60.1	-
08:00-09:00	64.1	94.6	59.7	-
09:00-10:00	64.7	95.2	59.9	-
10:00-11:00	63.9	94.4	59.7	-
11:00-12:00	64.3	94.8	60.0	-
12:00-13:00	65.3	95.9	60.3	-
13:00-14:00	64.3	94.9	59.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	64.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	59.7	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	69.3	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B21 / SCARLET		ST-12D / 10352325	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนกฤษณะวิทยา (แนวรั้วข้างฟลอร่า วงศ์สว่าง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	63.8	93.4	59.7	-
15:00-16:00	64.4	93.9	61.9	-
16:00-17:00	67.2	94.3	60.8	-
17:00-18:00	66.0	94.6	61.6	-
18:00-19:00	65.3	94.9	60.6	-
19:00-20:00	65.1	94.7	60.5	-
20:00-21:00	66.4	94.0	59.9	-
21:00-22:00	64.2	93.7	58.6	-
22:00-23:00	62.8	92.3	56.3	-
23:00-00:00	62.7	92.2	53.8	-
00:00-01:00	60.3	89.9	53.1	-
01:00-02:00	59.8	89.4	52.8	-
02:00-03:00	59.7	89.3	54.3	-
03:00-04:00	61.1	94.4	55.9	-
04:00-05:00	62.8	92.4	58.0	-
05:00-06:00	65.0	94.6	60.5	-
06:00-07:00	64.3	93.9	59.0	-
07:00-08:00	64.0	93.6	59.2	-
08:00-09:00	62.7	92.3	57.8	-
09:00-10:00	64.4	94.0	58.7	-
10:00-11:00	64.1	93.6	60.1	-
11:00-12:00	64.2	93.8	59.9	-
12:00-13:00	64.6	94.2	59.5	-
13:00-14:00	65.6	94.2	59.4	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	64.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	59.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	94.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	69.3	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B21 / SCARLET		ST-12D / 10352325	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com,. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนกฤษณะวิทยา (แนวรั้วข้างฟลอร่า วงศ์สว่าง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	65.1	93.6	60.9	-
15:00-16:00	64.5	93.1	60.5	-
16:00-17:00	65.5	94.1	60.0	-
17:00-18:00	65.0	93.5	60.0	-
18:00-19:00	67.0	95.5	61.6	-
19:00-20:00	65.6	94.2	59.7	-
20:00-21:00	64.6	93.2	60.1	-
21:00-22:00	65.2	93.8	58.9	-
22:00-23:00	63.5	92.1	56.1	-
23:00-00:00	62.8	91.4	56.4	-
00:00-01:00	60.1	88.6	54.9	-
01:00-02:00	58.9	87.5	53.3	-
02:00-03:00	59.9	88.5	53.4	-
03:00-04:00	60.2	89.4	55.4	-
04:00-05:00	62.2	91.4	58.9	-
05:00-06:00	64.8	93.3	59.9	-
06:00-07:00	64.3	92.8	60.3	-
07:00-08:00	65.4	92.4	59.6	-
08:00-09:00	63.5	92.1	58.5	-
09:00-10:00	64.3	92.8	59.6	-
10:00-11:00	65.1	93.6	60.3	-
11:00-12:00	62.5	91.0	58.3	-
12:00-13:00	61.9	89.4	56.7	-
13:00-14:00	63.4	92.9	57.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	64.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	58.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.5	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	69.2	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B21	SCARLET	ST-12D	10352325
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ (แนวรั้วติดเสาธง) เดือนพฤษภาคม 2569 1-2			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	59.7	95.2	53.0	-
15:00-16:00	58.5	94.1	53.2	-
16:00-17:00	57.1	92.6	52.9	-
17:00-18:00	58.1	93.7	52.6	-
18:00-19:00	57.5	93.0	52.5	-
19:00-20:00	55.9	91.5	51.6	-
20:00-21:00	55.9	91.5	51.4	-
21:00-22:00	54.8	90.4	51.2	-
22:00-23:00	54.6	90.1	50.0	-
23:00-00:00	55.9	91.5	48.5	-
00:00-01:00	52.7	88.3	47.4	-
01:00-02:00	52.0	87.5	46.1	-
02:00-03:00	49.3	84.9	45.9	-
03:00-04:00	52.1	89.8	46.9	-
04:00-05:00	52.5	88.0	46.0	-
05:00-06:00	53.0	88.6	49.6	-
06:00-07:00	56.4	92.0	51.4	-
07:00-08:00	57.8	93.4	52.1	-
08:00-09:00	56.4	92.0	52.4	-
09:00-10:00	56.6	92.1	52.0	-
10:00-11:00	57.3	92.9	52.1	-
11:00-12:00	56.7	92.3	51.7	-
12:00-13:00	57.4	93.0	52.3	-
13:00-14:00	56.1	91.7	52.0	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	51.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	60.8	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B22 / SCARLET		ST-12D / 10352327	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ (แนวรั้วติดเสาธง) เดือนพฤษภาคม 2569 2-3			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	56.4	91.9	51.5	-
15:00-16:00	58.2	93.8	52.3	-
16:00-17:00	56.4	92.0	51.5	-
17:00-18:00	57.4	93.0	52.4	-
18:00-19:00	57.2	92.7	51.9	-
19:00-20:00	57.3	92.9	52.2	-
20:00-21:00	54.9	90.4	51.3	-
21:00-22:00	55.9	91.5	50.9	-
22:00-23:00	54.8	90.4	49.7	-
23:00-00:00	54.2	89.7	48.8	-
00:00-01:00	52.7	88.3	46.7	-
01:00-02:00	51.5	87.1	46.0	-
02:00-03:00	52.3	87.9	45.9	-
03:00-04:00	52.6	88.1	46.4	-
04:00-05:00	52.6	88.2	47.7	-
05:00-06:00	54.1	90.7	49.2	-
06:00-07:00	56.0	91.6	50.5	-
07:00-08:00	57.3	92.9	51.1	-
08:00-09:00	56.6	92.2	51.6	-
09:00-10:00	55.8	91.4	52.5	-
10:00-11:00	59.2	92.4	51.1	-
11:00-12:00	56.9	92.5	51.9	-
12:00-13:00	55.7	91.2	52.8	-
13:00-14:00	59.4	92.9	52.4	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	51.1	-
L_{max} [dB(A)]	-	93.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	60.8	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B22 / SCARLET		ST-12D / 10352327	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ (แนวรั้วติดเสาธง) เดือนพฤษภาคม 2569 3-4			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	56.0	91.5	52.6	-
15:00-16:00	57.6	93.2	52.6	-
16:00-17:00	55.5	91.1	52.4	-
17:00-18:00	59.1	94.7	52.8	-
18:00-19:00	57.8	93.4	52.6	-
19:00-20:00	55.4	91.0	51.4	-
20:00-21:00	55.4	90.9	51.2	-
21:00-22:00	57.1	92.7	50.3	-
22:00-23:00	56.3	91.8	49.3	-
23:00-00:00	54.0	89.5	47.8	-
00:00-01:00	51.4	87.0	46.5	-
01:00-02:00	52.8	88.3	46.9	-
02:00-03:00	53.1	88.7	46.1	-
03:00-04:00	51.6	87.2	46.5	-
04:00-05:00	52.5	88.1	48.9	-
05:00-06:00	55.2	92.1	50.3	-
06:00-07:00	56.7	92.2	52.5	-
07:00-08:00	59.4	95.0	52.3	-
08:00-09:00	58.2	93.7	51.8	-
09:00-10:00	56.5	92.0	51.3	-
10:00-11:00	57.6	93.2	51.9	-
11:00-12:00	57.2	92.8	51.7	-
12:00-13:00	55.8	91.4	51.5	-
13:00-14:00	56.7	92.3	51.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.3	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	51.4	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.0	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	61.1	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B22 / SCARLET		ST-12D / 10352327	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ (แนวรั้วติดเสาธง) เดือนพฤษภาคม 2569 4-5			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	57.4	92.9	52.8	-
15:00-16:00	55.9	91.5	53.6	-
16:00-17:00	59.2	95.7	55.6	-
17:00-18:00	61.5	94.9	54.7	-
18:00-19:00	57.7	93.2	53.2	-
19:00-20:00	57.1	92.7	52.7	-
20:00-21:00	56.6	92.2	52.2	-
21:00-22:00	55.9	91.4	51.2	-
22:00-23:00	53.7	89.3	50.8	-
23:00-00:00	56.4	94.7	49.0	-
00:00-01:00	52.6	88.1	45.6	-
01:00-02:00	50.9	86.5	46.9	-
02:00-03:00	51.0	86.6	45.6	-
03:00-04:00	52.2	88.6	47.3	-
04:00-05:00	54.1	90.3	51.4	-
05:00-06:00	57.7	95.2	52.2	-
06:00-07:00	58.8	94.4	52.8	-
07:00-08:00	58.8	94.3	52.5	-
08:00-09:00	59.1	94.6	53.3	-
09:00-10:00	58.5	94.1	53.4	-
10:00-11:00	58.5	94.0	53.2	-
11:00-12:00	58.0	93.5	52.5	-
12:00-13:00	57.1	92.7	52.0	-
13:00-14:00	56.2	91.8	52.0	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	57.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	52.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.7	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	62.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B22 / SCARLET		ST-12D / 10352327	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ (แนวรั้วติดเสาธง)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	58.7	94.3	52.7	-
15:00-16:00	56.7	92.3	52.4	-
16:00-17:00	57.6	93.1	53.1	-
17:00-18:00	58.7	94.3	53.8	-
18:00-19:00	58.4	93.9	52.9	-
19:00-20:00	56.7	92.3	52.1	-
20:00-21:00	55.2	90.7	51.5	-
21:00-22:00	57.6	93.2	50.8	-
22:00-23:00	54.6	90.2	49.3	-
23:00-00:00	55.0	90.6	48.0	-
00:00-01:00	51.0	86.6	44.9	-
01:00-02:00	50.8	86.4	43.8	-
02:00-03:00	49.8	85.3	46.1	-
03:00-04:00	53.1	88.6	48.3	-
04:00-05:00	54.2	89.7	50.4	-
05:00-06:00	56.4	91.9	51.5	-
06:00-07:00	57.9	93.4	51.8	-
07:00-08:00	58.0	93.6	51.8	-
08:00-09:00	57.8	93.3	52.6	-
09:00-10:00	57.1	92.7	52.2	-
10:00-11:00	56.9	92.4	52.1	-
11:00-12:00	55.9	90.3	50.6	-
12:00-13:00	56.7	91.4	49.5	-
13:00-14:00	53.2	88.9	50.2	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.4	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	51.5	-
L_{max} [dB(A)]	-	94.3	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	61.3	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B22	SCARLET	ST-12D	10352327	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.7		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	1-2			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	66.1	87.7	61.6	-
14:00-15:00	64.5	86.1	59.9	-
15:00-16:00	64.8	86.3	60.5	-
16:00-17:00	63.9	85.5	60.2	-
17:00-18:00	65.1	86.7	60.3	-
18:00-19:00	67.3	88.9	62.8	-
19:00-20:00	67.2	88.7	63.7	-
20:00-21:00	66.9	88.4	63.0	-
21:00-22:00	67.4	88.9	62.8	-
22:00-23:00	66.3	87.8	61.3	-
23:00-00:00	65.8	87.3	59.7	-
00:00-01:00	65.0	86.5	57.2	-
01:00-02:00	63.4	84.9	56.3	-
02:00-03:00	63.2	84.8	55.5	-
03:00-04:00	61.2	82.7	56.3	-
04:00-05:00	62.5	84.1	57.8	-
05:00-06:00	64.3	85.8	58.2	-
06:00-07:00	65.2	86.7	59.6	-
07:00-08:00	66.5	88.1	62.0	-
08:00-09:00	67.0	88.6	62.7	-
09:00-10:00	65.3	86.9	61.5	-
10:00-11:00	64.2	85.8	60.4	-
11:00-12:00	63.6	85.1	59.7	-
12:00-13:00	64.7	86.3	60.2	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	65.3	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	60.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	88.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B16	SCARLET	ST-12D	10352274
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	2-3			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	64.9	86.5	60.2	-
14:00-15:00	63.6	85.1	60.1	-
15:00-16:00	64.3	85.9	60.4	-
16:00-17:00	64.5	86.0	60.0	-
17:00-18:00	65.1	86.7	60.3	-
18:00-19:00	66.3	87.8	61.9	-
19:00-20:00	68.2	89.8	64.6	-
20:00-21:00	67.7	89.3	62.9	-
21:00-22:00	68.6	90.1	64.4	-
22:00-23:00	68.5	90.1	62.7	-
23:00-00:00	65.1	86.7	59.9	-
00:00-01:00	64.8	86.4	58.3	-
01:00-02:00	63.4	84.9	55.9	-
02:00-03:00	62.9	84.5	55.7	-
03:00-04:00	62.6	84.1	56.6	-
04:00-05:00	62.5	84.1	55.9	-
05:00-06:00	62.9	84.5	57.9	-
06:00-07:00	64.6	86.2	59.3	-
07:00-08:00	66.0	87.6	60.9	-
08:00-09:00	65.7	87.2	61.5	-
09:00-10:00	65.8	87.4	61.8	-
10:00-11:00	64.6	86.2	60.7	-
11:00-12:00	63.9	85.5	60.0	-
12:00-13:00	63.5	85.1	59.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	65.4	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	60.1	-
L_{max} [dB(A)]	-	90.1	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.2	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B16	SCARLET	ST-12D	10352274
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี) เดือนพฤษภาคม 2569 3-4			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	69.2	90.8	60.8	-
14:00-15:00	64.8	86.4	60.7	-
15:00-16:00	67.2	88.8	61.9	-
16:00-17:00	65.6	87.2	61.5	-
17:00-18:00	66.0	87.6	62.2	-
18:00-19:00	66.3	87.9	61.9	-
19:00-20:00	66.3	87.9	61.8	-
20:00-21:00	66.8	88.4	62.1	-
21:00-22:00	66.0	87.5	61.7	-
22:00-23:00	66.7	88.2	59.9	-
23:00-00:00	65.7	87.2	57.8	-
00:00-01:00	64.1	85.7	57.4	-
01:00-02:00	62.7	84.3	57.8	-
02:00-03:00	61.8	83.4	56.2	-
03:00-04:00	62.3	83.9	55.7	-
04:00-05:00	62.4	84.0	58.2	-
05:00-06:00	64.3	85.9	60.5	-
06:00-07:00	66.2	87.8	60.5	-
07:00-08:00	66.7	88.3	62.2	-
08:00-09:00	66.3	87.9	61.9	-
09:00-10:00	65.7	87.2	61.4	-
10:00-11:00	64.2	83.4	58.9	-
11:00-12:00	65.5	87.1	60.9	-
12:00-13:00	64.6	86.1	60.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	65.6	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	60.8	-
L_{max} [dB(A)]	-	90.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.1	-	-	-
-	Sound Level Meter Data Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26 — 30 April 2026 SLM No. ST-C1-B16 — Brand SCARLET — Model ST-12D — Serial No. 10352274 Actual Reading [dB] Before Adjustment 93.8 — After Adjustment 93.9			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนดิวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี) เดือนพฤษภาคม 2569 4-5			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	65.3	86.8	61.2	-
14:00-15:00	68.1	89.7	61.6	-
15:00-16:00	66.3	87.9	62.2	-
16:00-17:00	66.8	88.4	63.0	-
17:00-18:00	69.9	88.5	64.2	-
18:00-19:00	66.6	88.2	63.1	-
19:00-20:00	66.5	88.1	62.5	-
20:00-21:00	67.3	88.8	62.6	-
21:00-22:00	65.9	87.5	62.4	-
22:00-23:00	66.7	88.2	60.8	-
23:00-00:00	64.6	86.1	58.6	-
00:00-01:00	62.8	84.3	57.3	-
01:00-02:00	61.7	83.3	54.8	-
02:00-03:00	61.0	82.6	54.9	-
03:00-04:00	61.9	83.5	57.6	-
04:00-05:00	63.9	85.5	58.3	-
05:00-06:00	65.2	86.8	59.9	-
06:00-07:00	66.5	88.1	62.7	-
07:00-08:00	66.9	88.5	62.0	-
08:00-09:00	66.4	87.9	61.4	-
09:00-10:00	64.3	85.8	59.8	-
10:00-11:00	63.1	84.6	59.3	-
11:00-12:00	63.8	85.3	59.6	-
12:00-13:00	63.7	85.3	59.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	65.7	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	60.8	-
L_{max} [dB(A)]	-	89.7	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26 — 30 April 2026 SLM No. ST-C1-B16 — Brand SCARLET — Model ST-12D — Serial No. 10352274 Actual Reading [dB] Before Adjustment 93.8 — After Adjustment 93.9			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงเรียนติวานนท์ศึกษา (ตลาดเรวดี)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	64.1	85.6	59.5	-
14:00-15:00	63.9	85.5	59.9	-
15:00-16:00	65.0	86.6	60.6	-
16:00-17:00	65.1	86.7	61.7	-
17:00-18:00	67.8	89.4	61.4	-
18:00-19:00	66.3	87.8	61.8	-
19:00-20:00	66.0	87.6	62.1	-
20:00-21:00	66.1	87.7	62.2	-
21:00-22:00	66.3	87.8	61.5	-
22:00-23:00	65.5	87.0	60.2	-
23.00-00.00	65.0	86.5	58.6	-
00:00-01:00	63.2	84.8	55.8	-
01:00-02:00	61.6	83.1	55.6	-
02:00-03:00	61.9	83.5	54.9	-
03:00-04:00	61.9	83.5	56.4	-
04:00-05:00	62.7	84.3	59.1	-
05:00-06:00	64.9	86.4	59.3	-
06:00-07:00	65.9	87.5	61.8	-
07:00-08:00	65.6	87.2	60.6	-
08:00-09:00	65.9	87.5	61.0	-
09:00-10:00	64.2	85.8	60.1	-
10:00-11:00	63.9	82.5	59.3	-
11:00-12:00	64.5	83.2	60.1	-
12:00-13:00	65.0	83.1	60.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	64.9	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	60.1	-
L_{max} [dB(A)]	-	89.4	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	70.6	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B16	SCARLET	ST-12D	10352274	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.8		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	1-2			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	74.0	97.2	69.8	-
16:00-17:00	74.4	94.5	71.5	-
17:00-18:00	74.4	99.4	71.3	-
18:00-19:00	76.7	100.5	73.3	-
19:00-20:00	76.1	98.4	73.8	-
20:00-21:00	76.6	95.7	73.6	-
21:00-22:00	76.3	96.3	73.4	-
22:00-23:00	76.2	100.8	73.1	-
23:00-00:00	75.7	93.2	71.4	-
00:00-01:00	74.8	95.8	69.6	-
01:00-02:00	73.4	96.0	66.8	-
02:00-03:00	71.4	99.0	63.9	-
03:00-04:00	70.5	98.1	65.4	-
04:00-05:00	72.4	99.9	66.8	-
05:00-06:00	73.3	100.9	69.8	-
06:00-07:00	75.4	93.4	70.8	-
07:00-08:00	76.7	94.3	73.7	-
08:00-09:00	77.2	94.7	74.9	-
09:00-10:00	74.9	92.4	71.8	-
10:00-11:00	73.8	91.4	71.1	-
11:00-12:00	73.7	91.2	70.7	-
12:00-13:00	73.5	91.0	70.7	-
13:00-14:00	73.4	96.9	70.7	-
14:00-15:00	73.5	97.0	70.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	74.8	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	70.8	-
L_{max} [dB(A)]	-	100.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	80.7	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B11	SCARLET	ST-12D	10351484
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	2-3			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	73.3	100.8	70.9	-
16:00-17:00	74.5	94.1	70.6	-
17:00-18:00	72.8	100.4	69.4	-
18:00-19:00	74.5	96.2	71.7	-
19:00-20:00	76.3	93.9	73.8	-
20:00-21:00	76.4	94.0	74.0	-
21:00-22:00	76.8	94.3	73.7	-
22:00-23:00	76.1	93.7	73.0	-
23:00-00:00	75.5	93.0	71.3	-
00:00-01:00	75.6	93.1	70.0	-
01:00-02:00	74.3	91.8	67.3	-
02:00-03:00	72.6	100.1	65.1	-
03:00-04:00	72.1	99.7	66.8	-
04:00-05:00	73.4	98.5	67.1	-
05:00-06:00	73.5	92.1	68.2	-
06:00-07:00	74.8	92.4	70.1	-
07:00-08:00	75.9	93.5	72.5	-
08:00-09:00	76.8	94.4	74.2	-
09:00-10:00	77.0	94.5	74.5	-
10:00-11:00	76.5	94.1	73.8	-
11:00-12:00	73.8	91.4	71.3	-
12:00-13:00	74.3	91.9	71.1	-
13:00-14:00	74.2	91.7	71.5	-
14:00-15:00	77.7	95.3	74.1	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	75.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	71.3	-
L_{max} [dB(A)]	-	100.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	81.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B11	SCARLET	ST-12D	10351484
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	76.5	92.3	72.1	-
16:00-17:00	76.2	93.7	73.4	-
17:00-18:00	76.9	94.4	73.6	-
18:00-19:00	76.3	93.8	73.3	-
19:00-20:00	75.8	93.4	72.0	-
20:00-21:00	75.2	92.8	69.7	-
21:00-22:00	76.7	94.3	74.0	-
22:00-23:00	76.2	93.8	72.3	-
23:00-00:00	75.1	92.6	70.1	-
00:00-01:00	74.4	94.6	67.5	-
01:00-02:00	71.7	99.3	64.6	-
02:00-03:00	71.4	98.9	65.0	-
03:00-04:00	71.3	98.8	67.4	-
04:00-05:00	73.6	101.2	67.8	-
05:00-06:00	74.0	101.5	67.4	-
06:00-07:00	71.6	99.2	64.2	-
07:00-08:00	70.6	98.1	64.8	-
08:00-09:00	71.7	99.3	66.0	-
09:00-10:00	73.0	100.6	65.9	-
10:00-11:00	76.4	94.7	74.5	-
11:00-12:00	76.7	94.3	74.0	-
12:00-13:00	76.2	93.8	72.3	-
13:00-14:00	75.5	100.3	71.5	-
14:00-15:00	74.0	95.5	70.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	74.9	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	70.1	-
L_{max} [dB(A)]	-	101.5	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	79.9	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B11 / SCARLET		ST-12D / 10351484	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	74.4	92.0	71.2	-
16:00-17:00	74.3	91.9	70.7	-
17:00-18:00	74.5	92.0	70.7	-
18:00-19:00	74.4	91.9	71.2	-
19:00-20:00	73.7	91.3	71.4	-
20:00-21:00	76.4	94.0	73.4	-
21:00-22:00	77.2	94.7	74.5	-
22:00-23:00	76.7	94.3	74.0	-
23:00-00:00	76.2	93.8	72.3	-
00:00-01:00	75.1	92.6	70.1	-
01:00-02:00	74.4	92.0	67.5	-
02:00-03:00	71.7	99.3	65.8	-
03:00-04:00	71.4	98.9	64.9	-
04:00-05:00	71.3	98.8	66.8	-
05:00-06:00	73.6	101.2	69.0	-
06:00-07:00	76.0	93.5	71.8	-
07:00-08:00	74.3	91.8	71.3	-
08:00-09:00	74.8	92.3	71.2	-
09:00-10:00	74.5	92.0	70.9	-
10:00-11:00	74.5	92.0	70.6	-
11:00-12:00	73.0	100.5	70.4	-
12:00-13:00	72.8	100.4	70.1	-
13:00-14:00	73.8	91.4	71.3	-
14:00-15:00	74.9	92.5	71.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	74.6	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	70.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	101.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	80.7	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B11 / SCARLET		ST-12D / 10351484	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	74.5	92.1	71.6	-
16:00-17:00	75.6	93.2	72.2	-
17:00-18:00	75.7	93.3	72.9	-
18:00-19:00	74.2	91.7	71.5	-
19:00-20:00	77.7	95.3	74.1	-
20:00-21:00	76.2	93.7	73.4	-
21:00-22:00	76.9	94.4	73.6	-
22:00-23:00	76.3	93.8	73.3	-
23:00-00:00	75.8	93.4	72.0	-
00:00-01:00	75.2	92.8	69.7	-
01:00-02:00	74.0	91.5	67.4	-
02:00-03:00	71.6	99.2	64.2	-
03:00-04:00	70.6	98.1	64.9	-
04:00-05:00	71.7	99.3	66.5	-
05:00-06:00	73.0	100.6	69.1	-
06:00-07:00	75.4	92.9	71.2	-
07:00-08:00	75.0	92.5	71.7	-
08:00-09:00	73.6	91.2	70.9	-
09:00-10:00	74.7	91.2	71.4	-
10:00-11:00	71.4	99.5	66.5	-
11:00-12:00	73.3	100.3	67.7	-
12:00-13:00	71.3	99.1	65.5	-
13:00-14:00	72.5	100.6	66.9	-
14:00-15:00	72.1	100.2	66.3	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	74.5	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	70.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	100.6	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	80.5	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B11	SCARLET	ST-12D	10351484	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์) เดือนพฤษภาคม 2569 1-2			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	56.6	76.9	53.1	-
14:00-15:00	57.1	73.5	53.5	-
15:00-16:00	56.3	72.3	53.2	-
16:00-17:00	56.2	72.7	53.2	-
17:00-18:00	56.3	73.2	53.6	-
18:00-19:00	57.9	77.9	53.8	-
19:00-20:00	57.2	80.4	53.6	-
20:00-21:00	56.1	72.9	53.6	-
21:00-22:00	60.6	82.8	56.1	-
22:00-23:00	69.3	82.3	62.5	-
23:00-00:00	68.4	80.1	59.1	-
00:00-01:00	59.2	74.3	54.9	-
01:00-02:00	56.8	74.9	54.0	-
02:00-03:00	56.6	76.1	53.6	-
03:00-04:00	55.7	71.6	53.3	-
04:00-05:00	55.6	71.1	53.4	-
05:00-06:00	55.6	68.8	53.6	-
06:00-07:00	55.9	71.7	53.2	-
07:00-08:00	55.5	76.3	52.7	-
08:00-09:00	55.2	73.6	52.5	-
09:00-10:00	54.9	71.0	52.7	-
10:00-11:00	54.8	67.9	52.2	-
11:00-12:00	55.6	81.3	52.4	-
12:00-13:00	56.6	78.6	52.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	60.3	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	53.4	-
L_{max} [dB(A)]	-	82.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	69.1	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์) เดือนพฤษภาคม 2569 2-3			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	55.8	75.1	52.6	-
14:00-15:00	54.3	71.8	51.2	-
15:00-16:00	54.9	78.4	50.6	-
16:00-17:00	53.1	74.5	50.6	-
17:00-18:00	53.1	74.9	51.4	-
18:00-19:00	51.6	75.0	49.8	-
19:00-20:00	51.8	65.0	50.0	-
20:00-21:00	52.4	73.6	50.2	-
21:00-22:00	52.8	75.2	50.5	-
22:00-23:00	56.2	76.4	51.6	-
23:00-00:00	57.2	79.5	52.4	-
00:00-01:00	57.9	80.4	53.5	-
01:00-02:00	57.1	76.9	53.8	-
02:00-03:00	57.9	76.0	54.5	-
03:00-04:00	56.9	81.4	54.5	-
04:00-05:00	58.3	75.3	55.0	-
05:00-06:00	56.8	68.5	54.6	-
06:00-07:00	55.8	74.5	53.4	-
07:00-08:00	55.9	73.2	53.0	-
08:00-09:00	56.3	72.0	53.3	-
09:00-10:00	55.6	69.7	53.0	-
10:00-11:00	59.8	82.9	52.9	-
11:00-12:00	59.9	80.9	54.1	-
12:00-13:00	56.6	83.1	52.1	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.3	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	52.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	83.1	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	63.4	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์) เดือนพฤษภาคม 2569 3-4			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	56.2	84.9	54.4	-
14:00-15:00	57.1	79.7	53.3	-
15:00-16:00	54.7	77.3	52.7	-
16:00-17:00	56.3	78.9	52.4	-
17:00-18:00	55.7	78.3	52.9	-
18:00-19:00	56.2	78.7	53.0	-
19:00-20:00	55.3	77.8	52.9	-
20:00-21:00	55.0	77.6	52.5	-
21:00-22:00	54.6	77.2	52.2	-
22:00-23:00	53.9	86.4	51.0	-
23:00-00:00	53.3	85.9	50.7	-
00:00-01:00	53.3	85.9	50.5	-
01:00-02:00	52.8	85.3	49.4	-
02:00-03:00	52.2	84.8	49.2	-
03:00-04:00	50.9	83.4	49.1	-
04:00-05:00	52.8	85.4	49.7	-
05:00-06:00	53.8	86.4	50.5	-
06:00-07:00	55.6	78.2	52.1	-
07:00-08:00	56.2	78.7	53.3	-
08:00-09:00	57.1	79.7	52.7	-
09:00-10:00	55.0	77.6	52.1	-
10:00-11:00	55.1	77.7	52.3	-
11:00-12:00	57.5	80.1	52.2	-
12:00-13:00	56.1	78.7	52.6	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	52.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	86.4	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	60.2	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B06 / SCARLET		ST-12D / 10351461	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์) เดือนพฤษภาคม 2569 4-5			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	55.6	78.2	52.6	-
14:00-15:00	56.7	79.3	53.0	-
15:00-16:00	56.0	78.6	53.9	-
16:00-17:00	60.3	83.2	58.1	-
17:00-18:00	64.2	86.7	54.6	-
18:00-19:00	56.0	78.6	53.1	-
19:00-20:00	54.9	77.4	52.6	-
20:00-21:00	54.9	77.5	52.6	-
21:00-22:00	54.6	77.2	51.8	-
22:00-23:00	53.9	86.5	51.4	-
23:00-00:00	55.5	78.1	51.5	-
00:00-01:00	54.4	77.0	50.6	-
01:00-02:00	53.1	85.7	49.7	-
02:00-03:00	51.1	83.7	49.2	-
03:00-04:00	51.3	83.9	49.3	-
04:00-05:00	54.2	86.8	52.6	-
05:00-06:00	57.2	77.5	52.1	-
06:00-07:00	56.9	77.6	53.3	-
07:00-08:00	57.1	79.7	54.1	-
08:00-09:00	55.7	78.3	53.3	-
09:00-10:00	55.8	80.6	52.8	-
10:00-11:00	57.6	80.4	52.6	-
11:00-12:00	58.2	80.7	52.2	-
12:00-13:00	55.5	78.1	52.3	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.9	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	52.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	86.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	61.7	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B06 / SCARLET		ST-12D / 10351461	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกข้างโบสถ์)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	56.3	78.9	52.6	-
14:00-15:00	56.1	78.7	52.7	-
15:00-16:00	56.7	79.2	52.5	-
16:00-17:00	56.3	78.9	52.9	-
17:00-18:00	56.7	79.3	53.3	-
18:00-19:00	55.7	78.3	52.9	-
19:00-20:00	55.6	78.1	52.7	-
20:00-21:00	55.6	78.2	52.4	-
21:00-22:00	54.9	77.5	52.2	-
22:00-23:00	53.6	84.2	51.2	-
23:00-00:00	52.1	84.6	49.9	-
00:00-01:00	50.7	83.3	49.1	-
01:00-02:00	54.4	82.9	48.9	-
02:00-03:00	52.2	81.7	49.0	-
03:00-04:00	51.8	81.9	49.4	-
04:00-05:00	53.1	80.7	50.9	-
05:00-06:00	57.2	79.8	51.1	-
06:00-07:00	55.5	78.1	52.8	-
07:00-08:00	56.4	78.9	53.8	-
08:00-09:00	53.9	85.2	49.9	-
09:00-10:00	55.7	85.4	50.3	-
10:00-11:00	53.4	84.9	51.6	-
11:00-12:00	54.9	85.7	52.1	-
12:00-13:00	52.5	84.3	49.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	51.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	85.7	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	60.5	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.8		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569 1-2			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	68.6	95.2	65.8	-
12:00-13:00	67.9	94.5	65.3	-
13:00-14:00	70.0	94.2	66.5	-
14:00-15:00	68.2	94.8	65.6	-
15:00-16:00	67.9	94.5	65.5	-
16:00-17:00	68.4	95.0	66.1	-
17:00-18:00	69.1	95.7	66.1	-
18:00-19:00	68.5	95.1	64.9	-
19:00-20:00	67.4	94.0	64.3	-
20:00-21:00	66.8	93.4	63.4	-
21:00-22:00	66.3	92.9	62.1	-
22:00-23:00	65.9	92.5	60.3	-
23:00-00:00	64.7	91.2	58.8	-
00:00-01:00	64.5	91.1	56.6	-
01:00-02:00	62.0	88.5	54.4	-
02:00-03:00	61.2	87.8	54.9	-
03:00-04:00	61.6	88.2	56.3	-
04:00-05:00	62.8	89.3	59.0	-
05:00-06:00	65.3	91.8	59.9	-
06:00-07:00	66.8	93.4	63.2	-
07:00-08:00	68.3	94.9	65.1	-
08:00-09:00	68.5	95.1	65.6	-
09:00-10:00	68.3	94.8	65.6	-
10:00-11:00	68.3	94.9	65.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	67.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	64.3	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.7	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.8	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569 2-3			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	68.2	94.8	65.4	-
12:00-13:00	67.5	94.0	65.0	-
13:00-14:00	67.5	94.0	65.0	-
14:00-15:00	67.6	94.2	65.0	-
15:00-16:00	67.6	94.2	64.9	-
16:00-17:00	68.5	95.0	65.3	-
17:00-18:00	68.3	94.8	65.4	-
18:00-19:00	67.7	94.3	64.7	-
19:00-20:00	67.2	93.8	63.7	-
20:00-21:00	67.0	93.6	63.2	-
21:00-22:00	66.3	92.8	62.2	-
22:00-23:00	65.9	92.4	60.4	-
23:00-00:00	65.5	92.0	59.0	-
00:00-01:00	65.4	92.0	57.2	-
01:00-02:00	62.6	89.2	54.8	-
02:00-03:00	61.7	88.2	58.1	-
03:00-04:00	63.5	90.1	56.9	-
04:00-05:00	63.1	89.7	59.0	-
05:00-06:00	64.5	91.0	59.2	-
06:00-07:00	66.1	92.6	62.1	-
07:00-08:00	67.4	93.9	63.8	-
08:00-09:00	67.7	94.3	64.6	-
09:00-10:00	67.7	94.2	65.2	-
10:00-11:00	66.3	88.4	58.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	66.6	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	63.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.0	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.7	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569 3-4			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	68.0	93.5	65.2	-
12:00-13:00	67.8	93.3	64.9	-
13:00-14:00	71.2	93.8	65.9	-
14:00-15:00	68.5	94.1	66.1	-
15:00-16:00	68.4	94.0	65.8	-
16:00-17:00	68.4	93.9	65.5	-
17:00-18:00	68.6	94.2	65.7	-
18:00-19:00	67.9	93.4	64.8	-
19:00-20:00	68.2	93.7	64.8	-
20:00-21:00	67.9	93.5	64.6	-
21:00-22:00	67.1	92.7	62.9	-
22:00-23:00	66.3	91.9	61.3	-
23:00-00:00	65.7	91.2	59.7	-
00:00-01:00	65.2	90.7	58.4	-
01:00-02:00	63.3	88.8	55.3	-
02:00-03:00	62.0	87.6	55.5	-
03:00-04:00	61.6	87.1	55.2	-
04:00-05:00	62.1	87.7	57.9	-
05:00-06:00	64.3	89.9	58.8	-
06:00-07:00	65.7	91.3	61.7	-
07:00-08:00	67.7	93.3	64.2	-
08:00-09:00	68.0	93.5	65.0	-
09:00-10:00	68.3	93.9	65.0	-
10:00-11:00	67.7	93.3	64.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	67.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	64.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	94.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.8	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ เดือนพฤษภาคม 2569 4-5			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	67.5	94.0	64.6	-
12:00-13:00	67.2	93.8	64.5	-
13:00-14:00	67.9	94.5	64.6	-
14:00-15:00	68.3	94.8	65.6	-
15:00-16:00	68.4	95.0	65.6	-
16:00-17:00	67.8	94.4	65.1	-
17:00-18:00	68.7	95.3	66.2	-
18:00-19:00	68.6	95.2	65.4	-
19:00-20:00	68.0	94.6	64.9	-
20:00-21:00	68.3	94.9	64.5	-
21:00-22:00	67.3	93.9	62.8	-
22:00-23:00	66.5	93.1	60.6	-
23:00-00:00	64.4	90.9	57.8	-
00:00-01:00	60.1	86.7	53.8	-
01:00-02:00	59.4	86.0	52.6	-
02:00-03:00	59.2	85.8	55.8	-
03:00-04:00	60.4	87.0	57.2	-
04:00-05:00	63.5	90.1	59.3	-
05:00-06:00	66.3	92.9	62.6	-
06:00-07:00	67.8	94.4	64.7	-
07:00-08:00	69.3	95.8	66.4	-
08:00-09:00	69.0	95.6	66.2	-
09:00-10:00	68.8	95.4	65.7	-
10:00-11:00	68.4	95.0	65.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	67.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	64.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.9	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	สุขปรีดาเรสซิเด้นท์			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	68.4	94.9	65.6	-
12:00-13:00	67.7	94.2	65.0	-
13:00-14:00	68.1	94.7	65.5	-
14:00-15:00	68.2	94.7	65.6	-
15:00-16:00	68.4	95.0	65.7	-
16:00-17:00	68.5	95.0	65.8	-
17:00-18:00	68.6	95.2	66.0	-
18:00-19:00	68.0	94.6	65.1	-
19:00-20:00	68.1	94.7	65.1	-
20:00-21:00	67.8	94.3	64.0	-
21:00-22:00	66.9	93.4	62.8	-
22:00-23:00	66.3	92.8	60.5	-
23:00-00:00	65.0	91.5	58.3	-
00:00-01:00	62.9	89.5	55.4	-
01:00-02:00	61.4	88.0	54.1	-
02:00-03:00	60.8	87.4	54.9	-
03:00-04:00	60.9	87.5	56.9	-
04:00-05:00	62.7	89.3	59.2	-
05:00-06:00	65.8	92.3	61.9	-
06:00-07:00	67.4	94.0	64.2	-
07:00-08:00	68.6	95.2	66.0	-
08:00-09:00	68.5	95.1	65.4	-
09:00-10:00	68.1	94.6	65.2	-
10:00-11:00	67.1	89.3	60.3	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	67.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	64.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	71.8	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.7		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เดือนพฤษภาคม 2569 1-2			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	67.9	93.5	65.9	-
13:00-14:00	68.4	94.0	65.0	-
14:00-15:00	67.6	93.1	65.5	-
15:00-16:00	67.5	93.0	65.9	-
16:00-17:00	67.7	93.3	66.1	-
17:00-18:00	68.4	94.0	66.4	-
18:00-19:00	68.4	94.0	66.4	-
19:00-20:00	68.9	94.4	66.5	-
20:00-21:00	68.9	94.5	66.4	-
21:00-22:00	69.1	94.7	66.0	-
22:00-23:00	68.5	94.1	65.2	-
23:00-00:00	67.4	93.0	63.5	-
00:00-01:00	67.2	92.7	62.7	-
01:00-02:00	66.3	91.8	61.4	-
02:00-03:00	65.2	90.8	60.3	-
03:00-04:00	66.1	91.7	61.7	-
04:00-05:00	66.8	92.4	63.1	-
05:00-06:00	68.6	94.2	65.8	-
06:00-07:00	69.4	95.0	67.1	-
07:00-08:00	70.2	95.7	68.1	-
08:00-09:00	69.2	94.7	67.0	-
09:00-10:00	67.2	92.8	65.4	-
10:00-11:00	67.0	92.6	65.1	-
11:00-12:00	67.7	93.2	65.6	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	68.0	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	65.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.7	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	74.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B30	SCARLET	ST-12D	10352344
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69
193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เดือนพฤษภาคม 2569 2-3			ค่ามาตรฐาน
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	67.3	92.9	65.6	-
13:00-14:00	67.3	92.8	65.7	-
14:00-15:00	67.7	93.2	65.9	-
15:00-16:00	67.3	92.9	65.6	-
16:00-17:00	68.6	94.2	66.8	-
17:00-18:00	67.8	93.4	65.8	-
18:00-19:00	68.5	94.0	66.4	-
19:00-20:00	68.9	94.4	66.8	-
20:00-21:00	69.3	94.8	66.7	-
21:00-22:00	68.8	94.4	66.4	-
22:00-23:00	68.1	93.7	65.1	-
23:00-00:00	68.1	93.6	64.5	-
00:00-01:00	67.6	93.1	63.9	-
01:00-02:00	66.8	92.3	62.1	-
02:00-03:00	65.9	91.5	61.7	-
03:00-04:00	66.1	91.7	61.7	-
04:00-05:00	66.7	92.3	63.1	-
05:00-06:00	67.9	93.4	64.4	-
06:00-07:00	68.5	94.1	66.1	-
07:00-08:00	69.5	95.0	67.1	-
08:00-09:00	69.6	95.2	67.5	-
09:00-10:00	68.6	94.2	66.8	-
10:00-11:00	68.4	94.0	66.6	-
11:00-12:00	67.5	93.2	61.9	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	68.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	65.7	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	74.0	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B30	SCARLET	ST-12D	10352344
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	68.3	93.8	66.3	-
13:00-14:00	68.2	93.8	66.1	-
14:00-15:00	67.4	92.9	65.4	-
15:00-16:00	67.8	93.4	66.0	-
16:00-17:00	67.8	93.4	66.0	-
17:00-18:00	68.7	94.3	66.7	-
18:00-19:00	68.5	94.1	66.6	-
19:00-20:00	69.0	94.5	66.4	-
20:00-21:00	68.7	94.2	66.5	-
21:00-22:00	68.8	94.4	66.4	-
22:00-23:00	68.5	94.1	66.0	-
23:00-00:00	67.9	93.5	64.4	-
00:00-01:00	67.2	92.7	63.5	-
01:00-02:00	66.3	91.8	62.1	-
02:00-03:00	66.1	91.7	60.9	-
03:00-04:00	65.5	91.0	60.9	-
04:00-05:00	66.7	92.3	62.3	-
05:00-06:00	67.6	93.2	64.5	-
06:00-07:00	69.0	94.6	66.8	-
07:00-08:00	69.6	95.1	67.7	-
08:00-09:00	69.6	95.2	67.8	-
09:00-10:00	69.0	94.6	67.1	-
10:00-11:00	68.5	94.1	66.6	-
11:00-12:00	68.1	93.7	66.3	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	68.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	66.1	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	73.9	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B30	SCARLET	ST-12D	10352344
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	67.8	93.3	65.6	-
13:00-14:00	67.8	93.3	65.6	-
14:00-15:00	67.2	92.8	65.1	-
15:00-16:00	66.6	92.2	64.9	-
16:00-17:00	67.3	92.8	65.3	-
17:00-18:00	68.7	94.3	66.5	-
18:00-19:00	68.0	93.5	66.1	-
19:00-20:00	68.5	94.0	66.4	-
20:00-21:00	68.4	94.0	66.2	-
21:00-22:00	68.4	94.0	65.8	-
22:00-23:00	68.1	93.7	65.1	-
23:00-00:00	67.6	93.1	63.9	-
00:00-01:00	66.7	92.2	62.3	-
01:00-02:00	65.5	91.0	61.4	-
02:00-03:00	65.1	90.6	61.1	-
03:00-04:00	65.1	90.7	60.7	-
04:00-05:00	67.0	92.6	63.2	-
05:00-06:00	68.9	94.5	66.2	-
06:00-07:00	69.5	95.0	67.7	-
07:00-08:00	69.5	95.1	67.4	-
08:00-09:00	67.7	93.3	65.0	-
09:00-10:00	67.0	92.5	64.7	-
10:00-11:00	68.2	93.7	66.3	-
11:00-12:00	69.0	94.6	66.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	67.8	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	65.3	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.1	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	73.8	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B30	SCARLET	ST-12D	10352344
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 05 / 69

RS/B002/26/MAY

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	68.4	94.0	66.6	-
13:00-14:00	68.4	94.0	66.6	-
14:00-15:00	68.5	94.1	66.5	-
15:00-16:00	68.3	93.8	66.7	-
16:00-17:00	68.4	93.9	66.4	-
17:00-18:00	69.0	94.5	67.1	-
18:00-19:00	68.9	94.5	66.8	-
19:00-20:00	68.9	94.4	66.3	-
20:00-21:00	68.8	94.4	66.3	-
21:00-22:00	68.8	94.3	66.2	-
22:00-23:00	68.5	94.1	65.1	-
23:00-00:00	67.2	92.8	63.9	-
00:00-01:00	67.4	93.0	63.2	-
01:00-02:00	66.1	91.7	61.8	-
02:00-03:00	65.5	91.1	61.4	-
03:00-04:00	65.6	91.2	61.4	-
04:00-05:00	67.4	92.9	63.6	-
05:00-06:00	68.7	94.3	65.8	-
06:00-07:00	69.8	95.3	67.7	-
07:00-08:00	69.3	94.9	67.3	-
08:00-09:00	69.1	94.7	65.9	-
09:00-10:00	67.2	92.8	65.6	-
10:00-11:00	68.4	94.0	66.3	-
11:00-12:00	66.4	91.5	61.7	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	68.2	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	66.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	95.3	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	74.1	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-830	SCARLET	ST-12D	10352344	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นัดดา มะโรงศรี
(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	1-2			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	47.7	67.5	43.9	-
12:00-13:00	50.6	68.8	47.5	-
13:00-14:00	53.9	77.0	48.3	-
14:00-15:00	54.9	69.7	48.0	-
15:00-16:00	54.3	70.2	47.8	-
16:00-17:00	54.7	74.4	49.0	-
17:00-18:00	56.0	73.2	50.1	-
18:00-19:00	50.1	78.1	44.7	-
19:00-20:00	51.6	70.9	43.8	-
20:00-21:00	49.4	70.0	43.0	-
21:00-22:00	49.4	73.8	42.5	-
22:00-23:00	47.4	73.4	43.7	-
23:00-00:00	46.6	65.2	44.2	-
00:00-01:00	46.8	65.0	44.6	-
01:00-02:00	44.7	66.2	42.5	-
02:00-03:00	43.5	63.4	41.4	-
03:00-04:00	43.9	70.3	40.8	-
04:00-05:00	43.2	61.4	40.6	-
05:00-06:00	44.4	55.4	40.9	-
06:00-07:00	47.8	75.9	43.1	-
07:00-08:00	49.9	79.6	45.3	-
08:00-09:00	49.3	71.8	45.0	-
09:00-10:00	50.0	63.4	44.7	-
10:00-11:00	47.3	63.7	43.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.6	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	43.9	-
L_{max} [dB(A)]	-	79.6	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	53.8	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B26 / SCARLET		ST-12D / 10352333	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	2-3			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	48.2	69.4	45.1	-
12:00-13:00	51.8	86.8	45.9	-
13:00-14:00	50.7	77.6	45.4	-
14:00-15:00	50.8	81.4	47.9	-
15:00-16:00	54.2	82.4	50.0	-
16:00-17:00	57.0	81.9	50.5	-
17:00-18:00	51.6	69.5	50.2	-
18:00-19:00	50.7	58.4	49.3	-
19:00-20:00	49.9	60.4	46.6	-
20:00-21:00	47.3	55.6	45.8	-
21:00-22:00	48.5	65.4	47.2	-
22:00-23:00	47.9	61.0	46.8	-
23:00-00:00	49.7	64.9	47.8	-
00:00-01:00	48.4	64.4	47.2	-
01:00-02:00	49.2	61.1	47.3	-
02:00-03:00	49.1	66.7	46.5	-
03:00-04:00	48.9	58.5	46.6	-
04:00-05:00	48.5	66.9	45.2	-
05:00-06:00	49.0	62.0	47.8	-
06:00-07:00	48.2	74.7	46.1	-
07:00-08:00	47.2	59.4	45.9	-
08:00-09:00	47.7	60.4	47.2	-
09:00-10:00	56.7	82.4	50.9	-
10:00-11:00	57.8	75.5	49.1	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.7	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	47.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	86.8	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	56.1	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No. / Brand		Model / Serial No.	
	ST-C1-B26 / SCARLET		ST-12D / 10352333	
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	3-4			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	51.8	85.3	47.8	-
12:00-13:00	54.5	79.1	50.2	-
13:00-14:00	55.6	79.2	47.8	-
14:00-15:00	53.6	85.2	44.1	-
15:00-16:00	49.3	82.9	43.0	-
16:00-17:00	49.0	82.5	43.5	-
17:00-18:00	49.8	83.4	45.0	-
18:00-19:00	48.0	81.6	44.1	-
19:00-20:00	47.1	80.7	44.2	-
20:00-21:00	46.7	80.2	43.9	-
21:00-22:00	44.6	78.2	42.1	-
22:00-23:00	43.3	76.8	40.9	-
23:00-00:00	42.4	76.0	40.6	-
00:00-01:00	45.5	74.3	40.2	-
01:00-02:00	44.8	74.2	44.3	-
02:00-03:00	50.7	81.3	45.9	-
03:00-04:00	52.1	83.4	46.3	-
04:00-05:00	53.1	84.3	45.3	-
05:00-06:00	48.7	82.3	42.8	-
06:00-07:00	49.7	83.2	41.5	-
07:00-08:00	48.4	81.9	42.5	-
08:00-09:00	47.3	80.9	40.0	-
09:00-10:00	45.9	79.5	43.6	-
10:00-11:00	49.4	83.0	41.2	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.1	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	43.6	-
L_{max} [dB(A)]	-	85.3	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	55.9	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B26	SCARLET	ST-12D	10352333
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ช้างบ้านเลขที่ 102/6)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	4-5			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	48.5	84.1	44.9	-
12:00-13:00	51.9	85.2	45.7	-
13:00-14:00	51.0	86.6	43.9	-
14:00-15:00	48.9	84.5	43.3	-
15:00-16:00	49.0	84.6	45.2	-
16:00-17:00	49.9	85.4	45.0	-
17:00-18:00	48.9	84.5	42.2	-
18:00-19:00	43.0	78.6	40.2	-
19:00-20:00	43.7	79.2	41.2	-
20:00-21:00	45.8	81.4	41.6	-
21:00-22:00	44.4	80.0	41.8	-
22:00-23:00	43.9	79.5	38.9	-
23:00-00:00	44.5	80.1	40.4	-
00:00-01:00	44.5	80.0	42.9	-
01:00-02:00	48.4	84.0	48.1	-
02:00-03:00	55.1	84.6	48.0	-
03:00-04:00	53.5	81.1	48.2	-
04:00-05:00	52.0	84.7	42.1	-
05:00-06:00	47.7	83.3	43.0	-
06:00-07:00	49.1	84.7	40.6	-
07:00-08:00	47.3	82.9	40.9	-
08:00-09:00	47.9	85.5	41.2	-
09:00-10:00	47.5	83.1	41.0	-
10:00-11:00	50.2	85.1	43.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	49.3	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	42.2	-
L_{max} [dB(A)]	-	86.6	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	56.6	-	-	-
-	Sound Level Meter Data			-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B26	SCARLET	ST-12D	10352333
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY022/05/69

193/9/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

เวลา	หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง ข้างบ้านเลขที่ 102/6)			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	5-6			
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	50.9	82.9	42.5	-
12:00-13:00	45.6	81.2	39.0	-
13:00-14:00	45.2	80.7	39.5	-
14:00-15:00	46.2	81.8	42.0	-
15:00-16:00	49.0	85.7	44.9	-
16:00-17:00	48.9	84.4	42.9	-
17:00-18:00	49.6	85.1	43.7	-
18:00-19:00	49.3	84.9	43.0	-
19:00-20:00	44.3	79.9	42.0	-
20:00-21:00	44.9	80.5	42.2	-
21:00-22:00	43.8	79.4	41.6	-
22:00-23:00	43.0	78.5	41.3	-
23:00-00:00	42.9	78.5	40.6	-
00:00-01:00	40.7	76.3	39.2	-
01:00-02:00	41.4	77.0	41.2	-
02:00-03:00	50.3	80.0	41.8	-
03:00-04:00	49.7	83.7	41.3	-
04:00-05:00	46.9	85.0	41.8	-
05:00-06:00	47.9	83.5	43.5	-
06:00-07:00	50.1	85.7	42.9	-
07:00-08:00	49.8	86.7	41.1	-
08:00-09:00	46.5	82.0	41.8	-
09:00-10:00	48.2	85.4	45.0	-
10:00-11:00	49.2	84.3	42.6	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	47.7	-	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	-	41.8	-
L_{max} [dB(A)]	-	86.7	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	53.8	-	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_215/26		30 April 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ST-C1-B26	SCARLET	ST-12D	10352333	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 05 / 69

เอกสารแนบ 4-3

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W017/05/26
193/9/68

Report No. 2605/002

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายกิตติ ช่วยวัน
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4-8 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา	ค่ามาตรฐาน
Depth	(m.)	Metering	8.0	-
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.0	ธ'
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.6	5.0-9.0
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	11.2	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.6	ไม่น้อยกว่า 4.0
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	2.2	ไม่เกินกว่า 2.0
Total Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.05	-
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	1.3	ไม่เกินกว่า 5.0
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	2,400	ไม่เกินกว่า 20,000

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
- ธ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W018/05/26
193/9/68

Report No. 2605/002

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายกิตติ ช่วยวัน
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4-8 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณคลองบางรักใหญ่	ค่ามาตรฐาน
Depth	(m.)	Metering	1.0	-
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.0	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.6	-
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	16.5	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.4	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	3.0	-
Total Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.19	-
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.17	-
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	24,000	-

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 05 / 69

-------- End of Report --------

F1201-14/21-01-23/JOB2601

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

Ref. No. W019/05/26
193/9/68

Report No. 2605/002

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายกิตติ ช่วยวัน
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4-8 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณคลองบางพลู	ค่ามาตรฐาน
Depth (m.)	Metering	1.0	-
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.0	-
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.5	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	18.0	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.1	-
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	4.9	-
Total Phosphorus (mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.16	-
Nitrate-Nitrogen (mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.21	-
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	7,900	-

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวชวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

Ref. No. W020/05/26
193/9/68

Report No. 2605/002

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายกิตติ ช่วยวัน
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4-8 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณคลองบางไผ่ (เหนือน้ำ)	ค่ามาตรฐาน
Depth (m.)	Metering	1.2	-
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.0	-
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.6	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	12.6	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	4.2	-
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	5.6	-
Total Phosphorus (mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.16	-
Nitrate-Nitrogen (mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.10	-
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	35,000	-

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวชวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W021/05/26 Report No. 2605/002

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายกิตติ ช่วยวัน
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4-8 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณคลองบางแพรก	ค่ามาตรฐาน
Depth	(m.)	Metering	1.0	-
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.0	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.4	-
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	16.8	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	4.0	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	4.9	-
Total Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.39	-
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.18	-
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	54,000	-

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวชวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 05 / 69

--------End of Report--------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W022/05/26 Report No. 2605/002

193/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายกิตติ ช่วยวัน
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4-8 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณคลองบางไผ่ (ท้ายน้ำ)	ค่ามาตรฐาน
Depth	(m.)	Metering	1.5	-
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.0	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.5	-
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	31.3	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.1	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	4.6	-
Total Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.19	-
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.23	-
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	33,000	-

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวชวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 05 / 69

--------End of Report--------
