ภาคผนวกที่ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ภาคผนวกที่ 3

สำเนาใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ลีจีโอแนลลา แบคทีเรีย

ภาคผนวกที่ 4

สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๗๑๕๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนาดล จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๖๔๖ ลงรับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านขอต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ของ บริษัท วนาดล จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒/๒๕ ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๔๔๐๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เลขทะเบียน บ.๑๐๐-๔๘-๐๑๙ โดยให้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้สิ้นอายุในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ และมีบุคลากรดังนี้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ทะเบียนผู้ควบคุมฯ ประเภทบุคคล
๑	[redacted]	
๒		

หมายเหตุ การรับจ้างเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษให้กับโรงงาน หรือการต่ออายุ/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากร ต้องส่งหนังสือฉบับนี้มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสา[redacted])
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด


อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

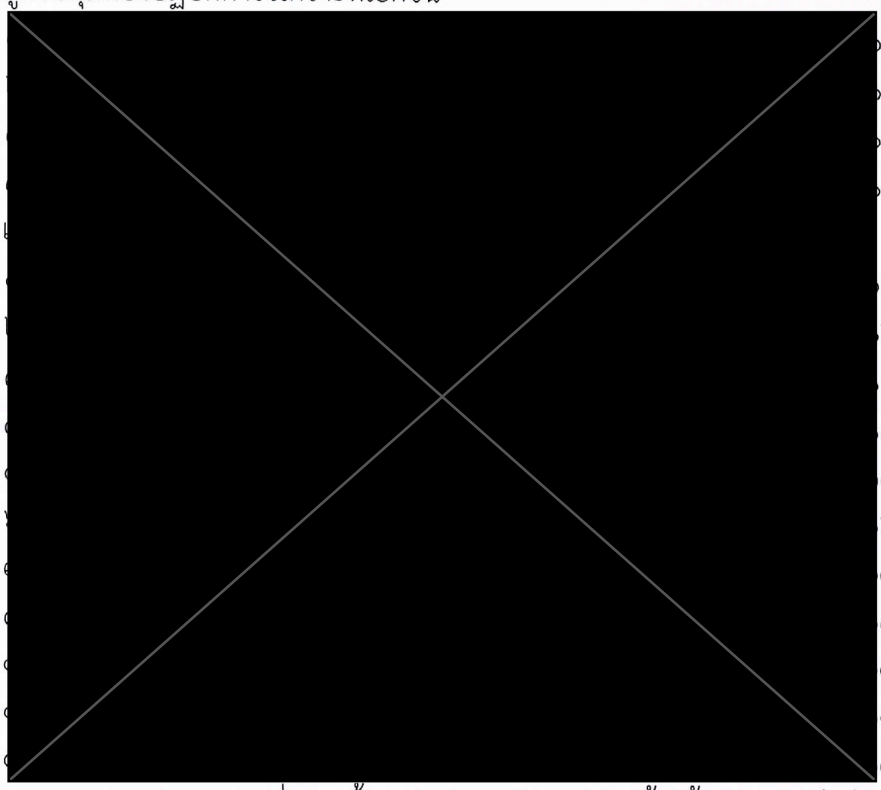

ข.


ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น[redacted])
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด เลขทะเบียน ว-๐๒๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒ ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
7	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[1]
10	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
12	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
13	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
15	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
16	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2] 2) Soxhlet Extraction Method[2]
17	pH	Electrometric Method[2]
18	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[2]

19 Selenium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
20	Sulfide	1) Iodometric Method[2] 2) Methylene Blue Method[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[2]
25	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
26	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

(Environment & Laboratory Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐

(Accreditation No. Testing 0240)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(Issue date : 15 January B.E. 2567 (2024))

([redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

9620e443

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (Environment and Laboratory Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0240 (Testing 0240)

ฉบับที่ 02 (Issue No. 02) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B
	- Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Copper (Cu) 0.030 mg/L to 5.00 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.)	- Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C
2. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical oxygen demand (COD) 40.0 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25CH546

Equipment :	pH Meter
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	Seven Compact S220
Serial No. :	C125985375
ID No. :	PHM-006
Condition As-Received:	Used Item
Received Date :	13 May 2025
Calibration Date :	14 May 2025
Reference :	2505-0324DC-2
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Ambient Temperature :	(25 ± 2.5) °C
Relative Humidity :	(50 ± 15) %
Calibration Procedure :	In - house method : - CP-CH5 by direct measurement with DC voltage standard and direct measurement with certified reference material (CRM) - CP-CH8 by comparison with temperature standard
Calibrated by :	Walalak Sirithean
Approved by :	Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Ponpan Paipim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 15 May 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	24E2759	25 Aug 2025
2) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	24I757	14 July 2025

- This measurement result is traceable to SI throught Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2. Certified Reference Materials :The measurement results are traceable to SI through Hach Lenge GmbH Ltd., Deutsche Akkreditierungsstelle, Accredited No.D-RM-15184-01-00
:The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd., ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.007	CPA chem	1066665	18 Jan 2027
pH 7.000	Hach Lenge GmbH	C03232	02 Dec 2026
pH 10.010	CPA chem	1066669	18 Jan 2026

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor *k*
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter	4.000	177.48	177.7	4.000	0.058	2.00
S/N.: C125985375	7.000	0.00	0.3	7.000	0.058	2.00
	10.000	-177.48	-177.1	10.000	0.058	2.00

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement (±)	Coverage factor *k*
pH Electrode	4.007	4.007	176.1	0.0044	2.00
S/N.: 1205515	7.000	6.999	3.7	0.0084	2.00
	10.010	10.010	-158.5	0.0065	2.00

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : InLabExpert Pro-ISM
- Serial No. : 1205515

Dimension of probe

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement (± °C)	Coverage factor *k*
25.0	25.001	24.9	-0.101	0.13	2.00

Remark - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25MM393

Equipment :	Electronic Balance
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	ML204T /00
Serial No. :	B647342339
ID No. :	ANB-003
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 304
Received order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	15 °C to 40 °C
Relative Humidity :	30 % to 90 %
Calibrated by :	Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Electronic Balance **Cert.No.:** 25MM393
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Procedure used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OB01 based on UKAS LAB 14 according to direct measurement method against standard weight.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instruments:-

Instruments	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due date
1) Standard Weight Set (E2)	24053	MM-0013-24	NIMT	25 Jan 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This result of calibration was made on requested at the point specified by customer.
4. This certificate is not certified for any commercial transaction.
5. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : NIMT : National Institute of Metrology Thailand

Result of calibration ( ) Without Adjustment (*) After Adjustment by Internal Calibration
Range capacity : 0 g to 220 g **Resolution** 0.0001 g

Before Adjustment :

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
100	99.9996	+0.0004	0.17	2
200	199.9998	+0.0002	0.30	2

After Adjustment :

1. **Determination of the standard deviation of weighing machine** (n = 10)

Applied Weight (g)	Standard Deviation of Reading (g)
100	0.00005
200	0.00004


Equipment : Electronic Balance
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Cert.No.: 25MM393

Result of calibration

2. Effect of off center loading

A mass of 100 g was placed to various position on the pan. The weighing machine reading error obtained is given in the table



Position 1 (g)	Position 2 (g)	Position 3 (g)	Position 4 (g)	Position 5 (g)	Maximum difference between off-center and central loading (g)
-0.0001	-0.0002	-0.0002	-0.0002	-0.0002	0.0001

3. Departure from nominal value

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
Unload	0.0000	0.0000	0.12	2.06
0.1	0.1000	0.0000	0.12	2.06
0.2	0.2000	0.0000	0.12	2.06
1	1.0000	0.0000	0.12	2.06
5	5.0000	0.0000	0.12	2.06
10	9.9999	+0.0001	0.12	2.06
20	19.9999	+0.0001	0.12	2.05
50	50.0001	-0.0001	0.14	2
100	100.0000	0.0000	0.17	2
150	150.0000	0.0000	0.29	2
200	200.0000	0.0000	0.30	2

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM977

Equipment :	Incubator
Manufacturer :	Sanden Intercool
Model :	SRC-680SRTM
Serial No. :	SRC680201-1107-00166
ID No. :	CHI-003
Submitted by :	EnvironMent & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 301
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	09 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V
Calibrated by :	Uthen Kankawi

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Incubator **Cert. No.:** 25TM977

Condition As-Received : Used Item **Page :** 2 of 3

Reference : 2507-0148OC-5

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA	27 Jul 2025
2) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA,	27 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)


Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	29
REL.Humi. (%)	54	55
AC Supply (Volt)	224	225

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	20-16RTD-01
2	20-16RTD-02
3	20-16RTD-03
4	20-16RTD-04
5	22-16RTD-05
6	20-16RTD-06
7	20-16RTD-07
8	22-16RTD-08
9 (ref.)	22-16RTD-09
10	20-16RTD-10
11	19-16RTD-01
12	19-16RTD-02
13	19-16RTD-03

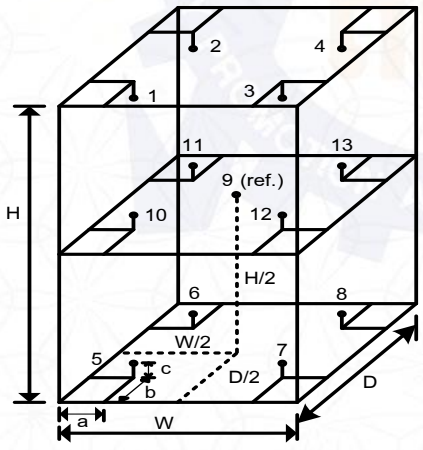

Dimension of Chamber :

D = 0.60 m

Probe Installation Details :

a = 10 cm

Equipment : Incubator
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-5
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM977

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
20.0	20.0	20.0	0.21	0.43	0.80	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
20.0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 (ref.)**	0.35
	19.957	20.008	20.073	19.725	19.753	19.679	19.701	19.670	20.012	
	10	**11**	**12**	**13**						
	19.789	19.773	20.168	19.744						

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM974

Equipment :	Hot Air Oven
Manufacturer :	FRANCE ETUVES
Model :	XU058
Serial No. :	P790
ID No. :	CHO-004
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 303
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Hot Air Oven **Cert. No.:** 25TM974

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-2

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD) and Thermocouple Type T.

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013823	25LM75	TPA	06 May 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :


Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	26
REL.Humid. (%)	47	51
AC Supply (Volt)	220	221

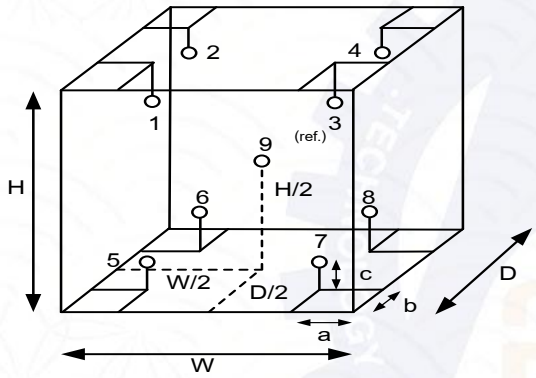

Position :	Ref. Std. ID No.: @ Calibration Point (180) °C	(104) °C
1	21-17TC-01	25-17RTD-01
2	21-17TC-02	25-17RTD-02
3	21-17TC-03	25-17RTD-03
4	21-17TC-04	25-17RTD-04
5	21-17TC-05	25-17RTD-05
6	21-17TC-06	25-17RTD-06
7	21-17TC-07	25-17RTD-07
8	21-17TC-08	25-17RTD-08
9 (ref.)	21-17TC-09	25-17RTD-09

Probe Installation Details :

a =	5.0	cm
b =	5.0	cm
c =	5.0	cm

Dimension of Chamber :

D =	0.36	m
W =	0.40	m
H =	0.40	m
Capacity =	0.058	m^3

Equipment : Hot Air Oven
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-2
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM974

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
104.0	104.0	104.0	0.13	1.0	1.1	2
180.0	180.0	180.0	0.24	1.6	1.9	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (ref.)	
104.0	103.529	103.769	104.251	104.428	103.589	103.683	104.172	103.978	104.411	0.42
180.0	180.583	179.425	180.832	179.981	179.369	179.667	180.479	180.019	180.809	1.1

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity .

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM951

Equipment :	Water Bath
Manufacturer :	Memmert
Model :	WNE 14
Serial No. :	L418.1373
ID No. :	WAB-02
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd 40 Soi liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 4
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) °C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Preecha Hlahib

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Water Bath **Cert. No.:** 25TM951

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-3

Procedure Used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OT04 Based on ASTM E715 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Industrial Platinum Resistance Thermometer (IPRT).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013711	24LM115	TPA	13 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :


Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Heat transfer medium used : Water

	Environmental		AC Voltage Supply
	(°C)	(%R.H.)	(Volt)
Beginning of Calibration	24	55	221
Finished of Calibration	21	56	221

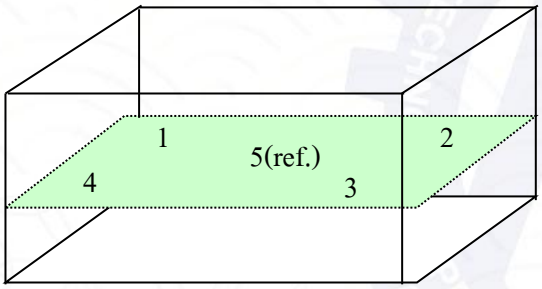

Front

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	4803988-001
2	4803988-002
3	4803988-003
4	4803988-004
5(ref.)	4803988-005

Equipment : Water Bath
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-3
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source

Cert. No.: 25TM951

Calibration point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Average* Standard Reading (°C) Position					Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5 (ref.)	
44.5	44.5	44.5	44.569	44.543	44.554	44.587	44.593	0.15
60.0	60.0	60.0	60.293	60.259	60.206	60.246	60.291	0.15

Calibration point (°C)	Uniformity (°C)	Stability (± °C)	Coverage Factor *k*
44.5	0.098	0.045	2
60.0	0.13	0.050	2

Average* : The average of 30 values in each position.
Uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one probe.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

ภาคผนวกที่ 5

สำเนาเอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

สำเนาแบบรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ม.ค. 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)- (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	158	94	75	ระบาย	ดูสัตยาไธ	/	/	/	/	/	/	/			
2	223	139	106	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
3	118	70	56	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
4	145	104	83	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
5	134	80	64	ระบาย	ดูสัตยาไธ	/	/	/	/	/	/	/			
6	165	98	78	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
7	257	153	122	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
8	190	119	90	ระบาย	ดูสัตยาไธ	/	/	/	/	/	/	/			
9	176	105	84	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
10	178	106	85	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
11	170	101	81	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
12	123	73	58	ระบาย	ดูสัตยาไธ	/	/	/	/	/	/	/			
13	131	79	62	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
14	139	93	66	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
15	146	87	70	ระบาย	ดูสัตยาไธ	/	/	/	/	/	/	/			
16	133	79	63	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			

ต.ค. 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)- (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	150	89	71	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
18	175	104	83	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
19	129	79	62	ระบาย	ลูกเสือ	/	/	/	/	/	/	/			
20	131	78	62	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
21	146	87	70	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
24	129	79	58	ระบาย	ลูกเสือ	/	/	/	/	/	/	/			
25	230	137	110	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
24	175	104	85	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
25	223	133	106	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
26	151	90	72	ระบาย	ลูกเสือ	/	/	/	/	/	/	/			
27	139	83	66	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
28	173	103	82	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
29	138	82	66	ระบาย	ลูกเสือ	/	/	/	/	/	/	/			
30	123	73	58	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			
31	151	90	72	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			

T2

ก.พ. 69.

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)- (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	202	120	96	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
2	168	100	80	ปกติ	คลอรีน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
3	215	128	102	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
4	213	127	102	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
5	99	59	47	ปกติ	คลอรีน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
6	197	117	94	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
7	197	117	94	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
8	212	126	101	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
9	141	84	67	ปกติ	คลอรีน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
10	168	100	80	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
11	129	77	62	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
12	146	87	70	ปกติ	คลอรีน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
13	131	76	62	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
14	141	84	67	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
15	280	137	110	ปกติ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปกติ
16	230	137	110	ปกติ	คลอรีน	✓									ปกติ

ก.พ. 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)- (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	190	113	90	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ยกก
18	176	69	55	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ยกก
19	212	126	101	ปกติ	คลินตี้	/	/	/	/	/	/	/			ปกติ
20	144	86	69	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ปกติ
21	165	98	79	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ปกติ
22	210	125	100	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ยกก
23	206	124	99	ปกติ	คลินตี้	/	/	/	/	/	/	/			ยกก
24	198	118	94	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ปกติ
25	202	120	96	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ปกติ
26	202	120	96	ปกติ	คลินตี้	/	/	/	/	/	/	/			ปกติ
27	203	121	97	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			ยกก
28	217	129	103	ปกติ		/	/	/	/	/	/	/			

มี.ค. 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)- (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/69	183	109	87	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
2/3/69	164	100	80	ราบาน	คลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
3/3/69	198	114	94	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
4/3/69	198	114	94	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
5/3/69	220	131	105	ราบาน	คลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
6/3/69	109	65	52	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชม.
7/3/69	156	93	74	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชม.
8/3/69	139	83	66	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชม
9/3/69	160	95	76	ราบาน	คลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชม.
10/3/69	133	79	63	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชม
11/3/69	129	77	62	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
12/3/69	139	83	66	ราบาน	คลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
13/3/69	139	83	66	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราชชม
14/3/69	239	142	114	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชม
15/3/69	200	119	95	ราบาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชม
16/3/69	146	70	56	ราบาน	คลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชม

มี.ค. 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)- (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/3/69	155	94	75	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
18/3/69	126	75	60	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
19/3/69	146	87	70	ราบาบ	คลอรีน 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
20/3/69	150	89	71	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
21/3/69	210	125	100	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
22/3/69	126	75	60	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
23/3/69	208	124	99	ราบาบ	คลอรีน 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
24/3/69	104	62	50	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
25/3/69	136	81	65	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
26/3/69	144	86	69	ราบาบ	คลอรีน 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
27/3/69	150	89	71	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
28/3/69	180	107	86	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
29/3/69	230	137	110	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
30/3/69	220	131	105	ราบาบ	คลอรีน 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ
31/3/69	82	49	39	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปราณ

มี.ค. 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	207	123	98	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/4/69	195	116	93	ระบาย	กลิ่นเหม็น 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/4/69	190	113	90	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/4/69	205	122	96	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/4/69	205	122	96	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/4/69	202	120	96	ระบาย	กลิ่นเหม็น 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/4/69	198	117	94	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/4/69	210	125	100	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/4/69	197	117	94	ระบาย	กลิ่นเหม็น 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/4/69	186	111	89	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/4/69	151	90	72	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/4/69	150	89	71	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/4/69	165	98	78	ระบาย	กลิ่นเหม็น 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/4/69	227	135	108	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/4/69	109	65	52	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/4/69	134	80	64	ระบาย	กลิ่นเหม็น 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/4/69	124	50	110	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
18/4/69	116	59	55	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
19/4/69	144	66	69	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
20/4/69	165	100	60	ราบาบ	กุลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
21/4/69	178	106	65	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
22/4/69	101	60	118	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
23/4/69	96	57	46	ราบาบ	กุลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
24/4/69	96	57	46	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
25/4/69	192	114	91	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
26/4/69	180	107	86	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
27/4/69	139	83	66	ราบาบ	กุลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
28/4/69	139	83	66	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
29/4/69	139	83	66	ราบาบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
30/4/69	131	78	62	ราบาบ	กุลินทรีย์ 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

T2.

พ.ค 2569.

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย. (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	151	90	92	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			สิทธิพงษ์
2	160	95	96	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			ปรีชาชัย
3	141	84	89	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			ปรีชาชัย
4	186	111	89	ระบาย	กุลิเนทร์	/	/	/	/	/	/	/			ปรีชาชัย
5	150	89	91	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
6	213	127	102	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
7	148	88	90	ระบาย	กุลิเนทร์	/	/	/	/	/	/	/			สิทธิพงษ์
8	129	99	92	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			สิทธิพงษ์
9	136	81	85	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
10	165	98	98	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
11	121	102	82	ระบาย	กุลิเนทร์	/	/	/	/	/	/	/			Nop
12	151	90	92	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
13	123	93	58	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			สิทธิพงษ์
14	126	95	60	ระบาย	กุลิเนทร์	/	/	/	/	/	/	/			สิทธิพงษ์
15	139	93	66	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			สิทธิพงษ์
16	161	96	99	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop

T2.

พ.ค 2569

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	160	95	76	ระบาย		/		/	/	/	/	/			Nop
18	156	93	74	ระบาย	ดูสิมลทิ้ย	/	/	/	/	/	/	/			Nop
19	161	96	77	ระบาย		/	/	/	/	/		/			Nop
20	144	86	69	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Chanok
21	138	82	66	ระบาย	ดูสิมลทิ้ย	/	/	/	/	/	/	/			Nop
22	149	88	70	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
23	138	82	66	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
24	153	91	73	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
25	170	101	81	ระบาย	ดูสิมลทิ้ย	/	/	/	/	/	/	/			Nop
26	139	83	66	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop
27	134	80	64	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			สิทธิ์
28	139	83	66	ระบาย	ดูสิมลทิ้ย	/	/	/	/	/	/	/			สิทธิ์
29	144	86	69	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			สิทธิ์
30	200	119	95	ระบาย		/	/	/	/	/	/				Nop
31	215	128	102	ระบาย		/	/	/	/	/	/	/			Nop

T2
มิ.ย. 2569

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย. (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	218	130	104	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Nop
2	223	133	106	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Nop
3	168	100	80	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Nop
4	160	95	76	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
5	165	98	78	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
6	156	93	74	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
7	99	59	47	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
8	170	101	81	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
9	175	104	83	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
10	176	105	84	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
11	168	100	80	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
12	133	79	63	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Panapan
13	218	130	104	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Panapan
14	217	129	103	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
15	217	129	103	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค
16	151	108	86	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปฏิภาค

T2
มิ.ย 2569

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17	163	94	78	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
18	173	79	63	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
19	148	88	70	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Chanan
20	161	96	77	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Chanan
21	134	80	64	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
22	227	135	108	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
23	207	123	98	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
24	188	112	90	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
25	192	114	91	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
26	186	111	89	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ
27	185	110	88	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Panapo
28	186	111	89	ระบาย	จุลินทรีย์ 1L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Chanan
29	208	124	99	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			สุดาพ
30	197	117	94	ระบาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ปนเปอ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/8 หมู่ที่ : ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตัน เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 75

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 44/2566 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 12/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกุลพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 180.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสูบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,972.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,960.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,368.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 8.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค์อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/8 หมู่ที่ : ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตัน เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 75

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 44/2566 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 12/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกุลพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 180.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสูบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,019.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,988.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,390.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 8.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/8 หมู่ที่ : ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตัน เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 75

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 44/2566 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 12/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกุลพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 180.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสูบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,919.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,928.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,342.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 8.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/8 หมู่ที่ : ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตัน เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 75

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 44/2566 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 12/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกุลพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 180.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสูบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,888.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,910.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,328.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 8.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค์อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/8 หมู่ที่ : ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตัน เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 75

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 44/2566 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 12/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกุลพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 180.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสูบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,824.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,872.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,297.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. จุลินทรีย์	8.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/8 หมู่ที่ : ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตัน เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 75

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 44/2566 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 12/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกุลพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 180.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสูบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,275.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,140.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,512.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 8.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำเนาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 1/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From...1.....	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From...2.....	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From...1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From...2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	43	43	
		P.2	37	38	38	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	41	
		P.2	44	45	41	
		P.3	42	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	276	359	203	
	- AMP-S	Amp	255	349	169	
	- AMP-T	Amp	246	334	193	
	- L1-L2	Volt	395	398	403	
	- L2-L3	Volt	397	403	404	
	- L1-L3	Volt	393	399	401	
	- kW-h	kW-h	6.2133	6.9149	62169	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	359	595	315	
	- AMP-S	Amp	303	598	278	
	- AMP-T	Amp	273	501	283	
	- L1-L2	Volt	393	398	401	
	- L2-L3	Volt	395	400	403	
	- L1-L3	Volt	393	399	404	
	- kW-h	kW-h	6.1763	6.1887	61916	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	0.98	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	Off	Off	Off	
		On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			Khomchan	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 9/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	off	Off	OFF	
	- Incoming From.....2	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	43	
		P.2	38	39	38	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	42	
		P.2	44	45	44	
		P.3	42	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	280	470	216	
	- AMP-S	Amp	263	466	228	
	- AMP-T	Amp	252	466	227	
	- L1-L2	Volt	396	396	400	
	- L2-L3	Volt	398	396	403	
	- L1-L3	Volt	395	396	399	
	- kW-h	kW-h	62148	6.2193	6.2213	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	098	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	415	649	416	
	- AMP-S	Amp	390	574	391	
	- AMP-T	Amp	347	516	392	
	- L1-L2	Volt	394	394	396	
	- L2-L3	Volt	396	397	398	
	- L1-L3	Volt	394	393	396	
	- kW-h	kW-h	61950	6.1952	6.1972	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	098	0.98	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	off	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	on	On	on	
	- Air3	On/Off	off	Off	OFF	
		On/Off	on	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 3/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From....1.....	On/Off	Off	Off	OFF	
	- Incoming From....2.....	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On.	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	43	
		P.2	38	39	38	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N.	N	
	- Temperature	P.1	41	44	42	
		P.2	44	46	44	
		P.3	41	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	294	449	216	
	- AMP-S	Amp	264	447	193	
	- AMP-T	Amp	263	436	190	
	- L1-L2	Volt	395	396	402	
	- L2-L3	Volt	397	399	404	
	- L1-L3	Volt	394	395	401	
	- kW-h	kW-h	6.2223	6.2239	6.2258	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	373	622	306	
	- AMP-S	Amp	310	566	276	
	- AMP-T	Amp	314	519	266	
	- L1-L2	Volt	394	394	401	
	- L2-L3	Volt	396	396	403	
	- L1-L3	Volt	394	395	400	
	- kW-h	kW-h	6.1996	6.2029	6.2049	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	0.96	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	Off	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	Off	Off	OFF	
		On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N.	N	
Record By			Khomchan	John.	ปอ.เพชร	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

John.
Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 04-07-26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	off	off	OFF	
	- Incoming From.....2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	49	43	43	
		P.2	38	36	39	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	41	
		P.2	44	46	44	
		P.3	41	43	46	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	246	433	180	
	- AMP-S	Amp	224	407	168	
	- AMP-T	Amp	229	411.	151	
	- L1-L2	Volt	396	400	400	
	- L2-L3	Volt	398	400	402	
	- L1-L3	Volt	396	397	400	
	- kW-h	kW-h	62269	6.2284	6.2300	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	414	679	289	
	- AMP-S	Amp	404	635	253	
	- AMP-T	Amp	377	587	226	
	- L1-L2	Volt	395	396	400	
	- L2-L3	Volt	397	400	402	
	- L1-L3	Volt	395	396	399	
	- kW-h	kW-h	62065	6.2089	6.2116	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	off	off	OFF	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	off	off	OFF	
		On/Off	on	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

[illegible]
Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 5-1-26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..... 1	On/Off	off	Off	OFF	
	- Incoming From..... 2	On/Off	on	On	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	on	On	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	on	On	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... 1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... 2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	43	
		P.2	38	39	38	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	44	41	
		P.2	44	46	44	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	250	373	152	
	- AMP-S	Amp	220	351	133	
	- AMP-T	Amp	222	347	142	
	- L1-L2	Volt	399	394	397	
	- L2-L3	Volt	400	398	399	
	- L1-L3	Volt	398	393	398	
	- kW-h	kW-h	6.2308	6.2313	6.2344	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	381	681	256	
	- AMP-S	Amp	326	570	186	
	- AMP-T	Amp	313	482	185	
	- L1-L2	Volt	397	399	396	
	- L2-L3	Volt	399	395	398	
	- L1-L3	Volt	397	393	396	
	- kW-h	kW-h	6.2129	6.2151	6.2186	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	off	OFF	OFF	
	- Air2	On/Off	on	On	ON	
	- Air3	On/Off	on	Off	ON	
		On/Off	on	On	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			NP	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date ...6/1/26.....

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From...1.....	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Incoming From...2.....	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From...1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From...2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	43	
		P.2	37	39	38	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	41	
		P.2	44	46	44	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	266	519	181	
	- AMP-S	Amp	246	494	163	
	- AMP-T	Amp	255	503	174	
	- L1-L2	Volt	399	391	399	
	- L2-L3	Volt	400	402	402	
	- L1-L3	Volt	400	399	398	
	- kW-h	kW-h	6.2351	6.2365	6.2389	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	431	670	267	
	- AMP-S	Amp	390	621	243	
	- AMP-T	Amp	367	555	204	
	- L1-L2	Volt	399	391	399	
	- L2-L3	Volt	400	399	401	
	- L1-L3	Volt	399	398	399	
	- kW-h	kW-h	6.2196	6.2216	6.2259	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.96	0.98	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	Off	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	Off	Off	OFF	
		On/Off	on	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			Khomchan			
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 7/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	Off	Off	On	
	- Incoming From.....2	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N		
	- Temperature	P.1	39	43	43	
		P.2	41	39	38	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	42	
		P.2	44	45	44	
		P.3	41	42	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	327	324	401	
	- AMP-S	Amp	291	296	404	
	- AMP-T	Amp	319	317	402	
	- L1-L2	Volt	400	399	401	
	- L2-L3	Volt	400	402	404	
	- L1-L3	Volt	399	397	402	
	- kW-h	kW-h	6.2397	6.2411	6.2499	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	472	478	382	
	- AMP-S	Amp	437	413	290	
	- AMP-T	Amp	431	444	296	
	- L1-L2	Volt	397	396	400	
	- L2-L3	Volt	399	399	403	
	- L1-L3	Volt	397	394	401	
	- kW-h	kW-h	6.2264	6.2296	6.2313	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.96	0.98	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	Off	Off	Off	
		On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan			
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 8/1/26.

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From...1.....	On/Off	OFF	off	OFF	
	- Incoming From...2.....	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From...1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From...2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	43	43	
		P.2	38	39	38	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N.	N	
	- Temperature	P.1	41	44	42	
		P.2	44	46	44	
		P.3	40	41	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	191	419	176	
	- AMP-S	Amp	173	370	155	
	- AMP-T	Amp	171	349	156	
	- L1-L2	Volt	393	397	398	
	- L2-L3	Volt	396	397	401	
	- L1-L3	Volt	394	395	398	
	- kW-h	kW-h	6.2439	6.2460	6.2467	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	389	616	288	
	- AMP-S	Amp	344	545	243	
	- AMP-T	Amp	338	453	231	
	- L1-L2	Volt	398	399	397	
	- L2-L3	Volt	394	396	400	
	- L1-L3	Volt	393	394	398	
	- kW-h	kW-h	6.2329	6.2347	6.2377	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.98	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	off	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	on	OFF	
	- Air3	On/Off	ON	off	ON	
		On/Off	OFF	on	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By				ธนา.		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

ธนา.

Check By

Date ...../...../.....

Duty Engineer

Date ...../...../.....

Engineering Manager

Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 9:1:68

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	OFF	off	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	40	43	38	
		P.2	42	38	36	
		P.3	38	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	41	
		P.2	44	45	44	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	180	314	157	
	- AMP-S	Amp	163	305	143	
	- AMP-T	Amp	161	304	145	
	- L1-L2	Volt	400	398	400	
	- L2-L3	Volt	403	400	401	
	- L1-L3	Volt	401	398	399	
	- kW-h	kW-h	6.2476	6.2489	6.2507	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	369	611	235	
	- AMP-S	Amp	333	490	189	
	- AMP-T	Amp	313	466	171	
	- L1-L2	Volt	399	398	399	
	- L2-L3	Volt	401	400	400	
	- L1-L3	Volt	400	398	398	
	- kW-h	kW-h	6.2390	6.2410	6.2423	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.98	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air3	On/Off	OFF	OFF	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date ...../...../.....

Duty Engineer

Date ...../...../.....

Engineering Manager

Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 16-1-26.

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..... 1	On/Off	Off	off	OFF	
	- Incoming From..... 2	On/Off	ON	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... 1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... 2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N.	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N.	N	
	- Temperature	P.1	42	43	43	
		P.2	38	39	38	
		P.3	38	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	43	46	44	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	209	383	224	
	- AMP-S	Amp	184	363	213	
	- AMP-T	Amp	185	367	204	
	- L1-L2	Volt	396	396	396	
	- L2-L3	Volt	398	401	398	
	- L1-L3	Volt	397	396	395	
	- kW-h	kW-h	62614	6.2527	6.2582	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	393	587	373	
	- AMP-S	Amp	317	524	386	
	- AMP-T	Amp	333	449	371	
	- L1-L2	Volt	395	396	396	
	- L2-L3	Volt	397	396	396	
	- L1-L3	Volt	396	396	398	
	- kW-h	kW-h	62953	6.2476	6.2603	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.99	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air2	On/Off	ORF	on	on	
	- Air3	On/Off	ON	OFF	OFF	
		On/Off	ON	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date ...../...../.....

Duty Engineer

Date ...../...../.....

Engineering Manager

Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 11/04/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Incoming From.....	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	43	43	
		P.2	39	39	38	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	41	
		P.2	44	45	44	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	217	397	162	
	- AMP-S	Amp	209	368	158	
	- AMP-T	Amp	236	368	160	
	- L1-L2	Volt	399	396	399	
	- L2-L3	Volt	396	397	401	
	- L1-L3	Volt	394	395	399	
	- kW-h	kW-h	62562	6.2563	6.2590	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	364	639	224	
	- AMP-S	Amp	321	554	207	
	- AMP-T	Amp	296	509	184	
	- L1-L2	Volt	392	393	399	
	- L2-L3	Volt	394	395	401	
	- L1-L3	Volt	393	394	398	
	- kW-h	kW-h	62618	6.2535	6.2567	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	0.98	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	OFF	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
		On/Off	ON	Off	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			ภัทร	Supar	ปฏิภาณ	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date ...../...../.....

Duty Engineer

Date ...../...../.....

Engineering Manager

Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 19-1-25

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Incoming From.....	On/Off	ON	On	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	43	43	
		P.2	39	39	39	
		P.3	41	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	41	
		P.2	44	45	43	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	263	354	154	
	- AMP-S	Amp	273	393	140	
	- AMP-T	Amp	277	331	142	
	- L1-L2	Volt	397	399	396	
	- L2-L3	Volt	399	399	398	
	- L1-L3	Volt	397	398	395	
	- kW-h	kW-h	62589	1.9599	6.2615	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.96	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	349	599	255	
	- AMP-S	Amp	340	545	208	
	- AMP-T	Amp	309	459	193	
	- L1-L2	Volt	396	396	395	
	- L2-L3	Volt	397	398	397	
	- L1-L3	Volt	396	397	395	
	- kW-h	kW-h	62590	6.2597	6.2631	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.92	0.97	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	On	On	
	- Air3	On/Off	OFF	on	OFF	
		On/Off	ON	Off	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date ...../...../.....

Duty Engineer

Date ...../...../.....

Engineering Manager

Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date **Tower2**

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	On	Off	Off	
	- Incoming From.....	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	43	
		P.2	39	39	39	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	41	
		P.2	43	45	41	
		P.3	41	41	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	196	380	203	
	- AMP-S	Amp	207	369	179	
	- AMP-T	Amp	200	362	176	
	- L1-L2	Volt	397	394	399	
	- L2-L3	Volt	396	398	400	
	- L1-L3	Volt	394	393	398	
	- kW-h	kW-h	6262	6.2636	6.2661	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.95	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	339	634	264	
	- AMP-S	Amp	333	581	212	
	- AMP-T	Amp	320	499	218	
	- L1-L2	Volt	392	399	397	
	- L2-L3	Volt	397	395	399	
	- L1-L3	Volt	393	393	397	
	- kW-h	kW-h	6291	6.2658	6.2695	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	0.97	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	On	Off	Off	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	Off	Off	
		On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N		N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 12/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From.....2	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	43	
		P.2	39	39	38	
		P.3	40	43	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	46	43	
		P.2	44	46	44	
		P.3	41	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	361	428	424	
	- AMP-S	Amp	299	391	210	
	- AMP-T	Amp	231	384	200	
	- L1-L2	Volt	399	400	401	
	- L2-L3	Volt	399	400	402	
	- L1-L3	Volt	398	401	402	
	- kW-h	kW-h	6.2667	6.2687	6.2701	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	378	610	378	
	- AMP-S	Amp	343	556	353	
	- AMP-T	Amp	300	466	317	
	- L1-L2	Volt	397	398	400	
	- L2-L3	Volt	399	401	402	
	- L1-L3	Volt	398	399	400	
	- kW-h	kW-h	6.2705	6.2732	6.2754	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	0.98	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	OFF	OFF	ON	
	- Air2	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air3	On/Off	ON	ON	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			Khonchan	ปอ:เวร		
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 15.1.69 **Tower2**

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..... 1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From..... 2	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... 1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... 2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	43	
		P.2	39	39	38	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	44	46	44	
		P.3	41	42	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	285	434	175	
	- AMP-S	Amp	314	432	182	
	- AMP-T	Amp	228	412	147	
	- L1-L2	Volt	396	395	396	
	- L2-L3	Volt	399	399	397	
	- L1-L3	Volt	391	395	395	
	- kW-h	kW-h	6.2713	6.2730	6.2756	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	388	397	192	
	- AMP-S	Amp	367	560	186	
	- AMP-T	Amp	392	475	189	
	- L1-L2	Volt	396	394	395	
	- L2-L3	Volt	398	397	397	
	- L1-L3	Volt	396	395	394	
	- kW-h	kW-h	6.2770	6.2792	6.2829	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.99	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Air2	On/Off	Off	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	Off	
		On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 16-1-69 **Tower2**

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	OFF	off	OFF	
	- Incoming From.....2	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	43	
		P.2	38	39	39	
		P.3	40	42	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	42	
		P.2	44	46	44	
		P.3	42	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	355	320	278	
	- AMP-S	Amp	319	493	253	
	- AMP-T	Amp	332	308	254	
	- L1-L2	Volt	398	398	398	
	- L2-L3	Volt	460	397	396	
	- L1-L3	Volt	397	399	398	
	- kW-h	kW-h	6.2763	6.2780	6.2803	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	441	423	364	
	- AMP-S	Amp	387	646	299	
	- AMP-T	Amp	390	608	283	
	- L1-L2	Volt	396	393	396	
	- L2-L3	Volt	398	398	399	
	- L1-L3	Volt	397	396	399	
	- kW-h	kW-h	6.2839	6.2861	6.2894	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	off	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	on	ON	
	- Air2	On/Off	ON	on	OFF	
	- Air3	On/Off	OFF	off	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 14-1-68

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Incoming From.....2	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	41	
		P.2	39	39	39	
		P.3	41	42	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	42	
		P.2	44	41	45	
		P.3	41	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	302	533	260	
	- AMP-S	Amp	285	594	248	
	- AMP-T	Amp	283	599	249	
	- L1-L2	Volt	399	398	399	
	- L2-L3	Volt	400	399	400	
	- L1-L3	Volt	398	401	398	
	- kW-h	kW-h	6.2816	6.2833	6.2852	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	406	662	347	
	- AMP-S	Amp	372	611	326	
	- AMP-T	Amp	350	566	296	
	- L1-L2	Volt	399	398	398	
	- L2-L3	Volt	399	399	400	
	- L1-L3	Volt	400	397	397	
	- kW-h	kW-h	6.2909	6.2932	6.2967	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	On	On	
	- Air3	On/Off	ON	On	On	
		On/Off	OFF	Off	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 18/01/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	Off	On	Off	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	43	
		P.2	38	39	38	
		P.3	40	42	42	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	44	42	
		P.2	44	46	44	
		P.3	41	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	278	450	200	
	- AMP-S	Amp	262	451	162	
	- AMP-T	Amp	264	495	167	
	- L1-L2	Volt	397	397	402	
	- L2-L3	Volt	400	409	404	
	- L1-L3	Volt	398	397	401	
	- kW-h	kW-h	6.2868	6.2881	6.2906	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	332	446	306	
	- AMP-S	Amp	315	569	279	
	- AMP-T	Amp	314	509	246	
	- L1-L2	Volt	397	397	401	
	- L2-L3	Volt	399	398	403	
	- L1-L3	Volt	377	347	401	
	- kW-h	kW-h	6.2981	6.3004	6.3035	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	Off	On	OFF	
	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	Off	Off	OFF	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 19.

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	ON	Off	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1...	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2...	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	43	
		P.2	38	39	36	
		P.3	39	40	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	44	42	
		P.2	43	46	44	
		P.3	41	43	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	300	535	178	
	- AMP-S	Amp	270	501	154	
	- AMP-T	Amp	216	524	162	
	- L1-L2	Volt	397	399	394	
	- L2-L3	Volt	397	398	396	
	- L1-L3	Volt	397	398	394	
	- kW-h	kW-h	6.2916	6.2934	6.2956	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	426	696	297	
	- AMP-S	Amp	370	637	267	
	- AMP-T	Amp	339	569	246	
	- L1-L2	Volt	399	395	393	
	- L2-L3	Volt	398	398	395	
	- L1-L3	Volt	398	396	393	
	- kW-h	kW-h	6.3063	6.3074	6.3108	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.97	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	ON	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	On	ON	
	- Air3	On/Off	OFF	Off	ON	
		On/Off	ON	On	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 20-1

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Incoming From.....	On/Off	ON	On	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	43	
		P.2	38	39	38	
		P.3	40	42	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	44	41	
		P.2	43	45	44	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	269	591	213	
	- AMP-S	Amp	239	477	217	
	- AMP-T	Amp	230	499	198	
	- L1-L2	Volt	395	403	401	
	- L2-L3	Volt	398	402	402	
	- L1-L3	Volt	395	400	400	
	- kW-h	kW-h	6.9961	6.9985	6.3010	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	339	630	252	
	- AMP-S	Amp	302	548	196	
	- AMP-T	Amp	280	502	185	
	- L1-L2	Volt	395	398	400	
	- L2-L3	Volt	396	401	402	
	- L1-L3	Volt	395	400	399	
	- kW-h	kW-h	6.3119	6.3143	6.3177	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.98	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	On	ON	
	- Air3	On/Off	OFF	Off	ON	
		On/Off	ON	On	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[signature]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 21/1/69

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From.....2	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	42	
		P.2	38	39	43	
		P.3	40	41	42	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	44	39	
		P.2	44	46	40	
		P.3	41	42	43	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	261	309	168	
	- AMP-S	Amp	222	489	179	
	- AMP-T	Amp	227	481	202	
	- L1-L2	Volt	398	399	400	
	- L2-L3	Volt	399	400	398	
	- L1-L3	Volt	397	397	399	
	- kW-h	kW-h	63018	6.3037	6.3060	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	209	646	221	
	- AMP-S	Amp	201	607	239	
	- AMP-T	Amp	361	519	199	
	- L1-L2	Volt	398	396	398	
	- L2-L3	Volt	391	398	394	
	- L1-L3	Volt	398	397	394	
	- kW-h	kW-h	63188	6.3910	6.3235	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.96	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	Off	Off	Off	
	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	Off	Off	On	
	- Air3	On/Off	On	On	Off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By				Tom		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date ...../...../.....

Duty Engineer

Date ...../...../.....

Engineering Manager

Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 22/01/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1...	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From.....2...	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	43	
		P.2	38	38	38	
		P.3	43	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	41	
		P.2	44	46	43	
		P.3	41	41	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	291	410	180	
	- AMP-S	Amp	279	377	160	
	- AMP-T	Amp	271	402	153	
	- L1-L2	Volt	399	393	396	
	- L2-L3	Volt	399	395	400	
	- L1-L3	Volt	397	396	400	
	- kW-h	kW-h	6.3077	6.3087	6.3115	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	360	612	241	
	- AMP-S	Amp	313	533	194	
	- AMP-T	Amp	293	506	185	
	- L1-L2	Volt	395	393	397	
	- L2-L3	Volt	397	395	399	
	- L1-L3	Volt	396	393	397	
	- kW-h	kW-h	6.3266	6.3275	6.3316	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.98	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air2	On/Off	OFF	ON	ON	
	- Air3	On/Off	ON	OFF	ON	
		On/Off	ON	ON	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 23/01/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	off	off	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N.	N	
	- Temperature	P.1	42	43	43	
		P.2	38	38	38	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N.	N	
	- Temperature	P.1	41	42	45	
		P.2	43	44	43	
		P.3	41	41	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	316	507	294	
	- AMP-S	Amp	291	461	280	
	- AMP-T	Amp	276	470	257	
	- L1-L2	Volt	393	397	400	
	- L2-L3	Volt	396	401	403	
	- L1-L3	Volt	394	399	399	
	- kW-h	kW-h	631122	6.3137	6.3156	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	441	653	414	
	- AMP-S	Amp	383	542	392	
	- AMP-T	Amp	381	542	358	
	- L1-L2	Volt	392	396	399	
	- L2-L3	Volt	393	399	400	
	- L1-L3	Volt	392	397	395	
	- kW-h	kW-h	65525	6.3346	6.3376	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.98	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	OFF	
	- Air1	On/Off	off	off	ON	
	- Air2	On/Off	on	on	OFF	
	- Air3	On/Off	on	on	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]		
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 24-1-59

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From.....2	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	43	
		P.2	38	38	36	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	42	45	44	
		P.3	41	41	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	292	438	261	
	- AMP-S	Amp	257	413	239	
	- AMP-T	Amp	271	401	234	
	- L1-L2	Volt	401	396	401	
	- L2-L3	Volt	402	401	404	
	- L1-L3	Volt	402	398	401	
	- kW-h	kW-h	6.3170	6.3185	6.3206	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	179	669	337	
	- AMP-S	Amp	137	574	288	
	- AMP-T	Amp	171	513	249	
	- L1-L2	Volt	398	395	400	
	- L2-L3	Volt	400	398	400	
	- L1-L3	Volt	399	396	402	
	- kW-h	kW-h	6.3395	6.3417	6.3446	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air3	On/Off	ON	ON	ON	
		On/Off	OFF	OFF	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 25/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From...1.....	On/Off	off	ON	OFF	
	- Incoming From...2.....	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	On	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From...1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From...2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	42	
		P.2	38	38	38	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	45	45	44	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	280	417	240	
	- AMP-S	Amp	254	399	210	
	- AMP-T	Amp	254	389	206	
	- L1-L2	Volt	397	399	401	
	- L2-L3	Volt	400	405	404	
	- L1-L3	Volt	398	401	401	
	- kW-h	kW-h	63217	6.3931	6.3252	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	397	651	378	
	- AMP-S	Amp	332	537	322	
	- AMP-T	Amp	312	461	308	
	- L1-L2	Volt	396	399	400	
	- L2-L3	Volt	398	401	403	
	- L1-L3	Volt	397	400	400	
	- kW-h	kW-h	63461	6.3481	6.3512	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	0.99	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	off	Off	off	
	- Air2	On/Off	on	On	on	
	- Air3	On/Off	off	Off	off	
		On/Off	on	On	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 26/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From...1.....	On/Off	off	Off	OFF	
	- Incoming From...2.....	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	On	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From...1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From...2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	42	
		P.2	37	38	36	
		P.3	39	40	39	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	40	43	41	
		P.2	43	45	43	
		P.3	40	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	258	468	213	
	- AMP-S	Amp	244	454	186	
	- AMP-T	Amp	227	498	178	
	- L1-L2	Volt	398	394	400	
	- L2-L3	Volt	400	398	399	
	- L1-L3	Volt	398	397	397	
	- kW-h	kW-h	63262	6.3279	6.3300	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	099	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	314	559	369	
	- AMP-S	Amp	260	487	302	
	- AMP-T	Amp	247	409	272	
	- L1-L2	Volt	396	394	399	
	- L2-L3	Volt	399	397	401	
	- L1-L3	Volt	398	395	399	
	- kW-h	kW-h	63527	6.3549	6.3579	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	098	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	Off	OFF	
	- Air1	On/Off	on	On	on	
	- Air2	On/Off	off	Off	OFF	
	- Air3	On/Off	on	On	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 27-1.....

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	ON	On	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	42	
		P.2	36	39	37	
		P.3	38	39	38	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	40	
		P.2	42	44	42	
		P.3	40	41	42	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	392	593	201	
	- AMP-S	Amp	327	506	188	
	- AMP-T	Amp	328	483	170	
	- L1-L2	Volt	399	397	396	
	- L2-L3	Volt	400	400	400	
	- L1-L3	Volt	399	400	400	
	- kW-h	kW-h	63311	6.3398	6.3355	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	409	629	288	
	- AMP-S	Amp	405	561	245	
	- AMP-T	Amp	367	495	207	
	- L1-L2	Volt	398	397	397	
	- L2-L3	Volt	399	399	399	
	- L1-L3	Volt	398	398	397	
	- kW-h	kW-h	63598	6.3617	6.3659	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.96	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Air2	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Air3	On/Off	ON	On	ON	
		On/Off	ON	On	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date **Tower2**

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From.....	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N.	N	
	- Temperature	P.1	42	43	42	
		P.2	38	36	38	
		P.3	40	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	41	
		P.2	42	43	43	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	329	517	215	
	- AMP-S	Amp	304	468	199	
	- AMP-T	Amp	290	490.	190	
	- L1-L2	Volt	398	395	396	
	- L2-L3	Volt	400	400	399	
	- L1-L3	Volt	399	393	396	
	- kW-h	kW-h	63362	6.3377	6.3405	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	399	621	217	
	- AMP-S	Amp	340	512	176	
	- AMP-T	Amp	393	443	164	
	- L1-L2	Volt	397	394	396	
	- L2-L3	Volt	399	397	398	
	- L1-L3	Volt	398	394	396	
	- kW-h	kW-h	63669	6.3681	6.3716	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	Off	off	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	On	On	
	- Air2	On/Off	ON	On	OFF	
	- Air3	On/Off	OFF	off	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 29/1/26 **Tower2**

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	OFF	off	OFF	
	- Incoming From.....	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N.	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N.	N	
	- Temperature	P.1	39	43	43	
		P.2	38	38	38	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	43	45	44	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	262	467	25A	
	- AMP-S	Amp	232	429	239	
	- AMP-T	Amp	227	431	230	
	- L1-L2	Volt	398	400	401	
	- L2-L3	Volt	399	399	404	
	- L1-L3	Volt	398	401	401	
	- kW-h	kW-h	63410	6.3426	6.3447	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N.	N	
	- AMP-R	Amp	418	641	396	
	- AMP-S	Amp	368	624	371	
	- AMP-T	Amp	310	394	332	
	- L1-L2	Volt	397	397	399	
	- L2-L3	Volt	399	400	401	
	- L1-L3	Volt	397	398	399	
	- kW-h	kW-h	63726	6.3748	6.3777	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.97	0.99	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	off	OFF	
	- Air1	On/Off	OFF	off	ON	
	- Air2	On/Off	ON	on	OFF	
	- Air3	On/Off	ON	on	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By	Duty Engineer	Engineering Manager
Date ...../...../.....	Date ...../...../.....	Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit

Engineer Department

Date 30/1/26

Tower2

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From....1.....	On/Off	off	off	ON	
	- Incoming From....2.....	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	45	
		P.2	38	38	41	
		P.3	40	41	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	43	43	44	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	293	486	300	
	- AMP-S	Amp	261	440	281	
	- AMP-T	Amp	276	456	292	
	- L1-L2	Volt	397	399	396	
	- L2-L3	Volt	398	399	401	
	- L1-L3	Volt	398	398	400	
	- kW-h	kW-h	63459	6.3497	6.3509	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	340	660	405	
	- AMP-S	Amp	284	562	330	
	- AMP-T	Amp	266	504	311	
	- L1-L2	Volt	396	396	397	
	- L2-L3	Volt	397	398	396	
	- L1-L3	Volt	396	396	396	
	- kW-h	kW-h	63793	6.3815	6.3826	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	OFF	
	- Air1	On/Off	on	on	ON	
	- Air2	On/Off	off	off	ON	
	- Air3	On/Off	on	on	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date ...../...../.....

Duty Engineer

Date ...../...../.....

Engineering Manager

Date ...../...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT

Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
Engineer Department
Date 31/1/11 **Tower2**

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....1...	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From.....2...	On/Off	ON	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1...	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2...	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	93	43	43	
		P.2	94	38	38	
		P.3	41	41	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	44	45	44	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	390	468	253	
	- AMP-S	Amp	425	440	222	
	- AMP-T	Amp	380	456	213	
	- L1-L2	Volt	398	399	400	
	- L2-L3	Volt	400	399	399	
	- L1-L3	Volt	397	398	398	
	- kW-h	kW-h	630714	6.3477	6.3555	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	429	660	383	
	- AMP-S	Amp	369	362	241	
	- AMP-T	Amp	399	340	302	
	- L1-L2	Volt	396	396	398	
	- L2-L3	Volt	398	398	401	
	- L1-L3	Volt	396	396	397	
	- kW-h	kW-h	638862	6.3815	6.3911	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air2	On/Off	ON	on	on	
	- Air3	On/Off	ON	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[signature]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By
Date ...../...../.....

Duty Engineer
Date ...../...../.....

Engineering Manager
Date ...../...../.....

สำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Tower 2

Check Sheet Generator

Engine : Cummins Model : SO47038 Serail No. : 41319266

Generator : Leroy-Somer Model : TAL-A49-B J 6S/4 Serail No. : 755570 002 Power : 750kVA

ITEM	DESCRIPTION		January 2026				
			วันที่ 7-1-69	วันที่ 14-1-69	วันที่ 21-1-69	วันที่ 28-1-69	วันที่
			เวลา 14.40	เวลา 14.40	เวลา 14.30	เวลา 14.30	เวลา
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ		/	/	/	/	
	ระดับน้ำระบายความร้อน		/	/	/	/	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (C)		30 C	29 C	29 C	29 C	 C
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press (PSI)		96 PSI	96 PSI	100 PSI	98 PSI	..... PSI
	ระดับน้ำมันเครื่อง		/	/	/	/	
	ความตึงสายพาน		/	/	/	/	
	ระดับน้ำมันดีเซล		1200 Liter	1200 Liter	1200 Liter	1199 Liter	..... Liter
ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	การสั่นสะเทือนและเสียง		/	/	/	/	
	จาระบีและลูกปืน		/	/	/	/	
	ความเร็วรอบ (RPM)		1500 RPM	1499 RPM	1500 RPM	1500 RPM	..... RPM
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่เฟส RS(380v)	401 V	401 V	401 V	401 V	 V
		คู่เฟส ST(380v)	400 V	401 V	401 V	401 V	 V
		คู่เฟส TR(380v)	401 V	401 V	401 V	402 V	 V
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	..... Hz
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่		/	/	/	/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/	/	/	/	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่		/	/	/	/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)		26.6 V	26.7 V	26.6 V	26.6 V	 V
	จำนวนเวลาในการทำงาน (Hrs)		23.23 Hrs	23.25 Hrs	23.26 Hrs	23.25 Hrs	..... Hrs
	ผู้ตรวจเช็ค		ธรรม	ปรเมศ	ธรรม	ธรรม	
	ผู้ตรวจสอบ		ธรรม	ธรรม.	ธรรม.	ธรรม	
	ผู้ทบทวน		[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	

/ ปกติ

X ผิดปกติ

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Tower 2

Check Sheet Jockey pump

JP : Pentair Aurora Model : PVM10-18-F-T-I2-50 Serail No. : 10318146-2/2
Motor : WEG 400Volt 50HZ 7.5KW 2910rpm

ITEM	DESCRIPTION	January 2026				
		วันที่ 7-1-69	วันที่ 14-1-69	วันที่ 21-1-69	วันที่ 28-1-69	วันที่.....
		เวลา 14.15	เวลา 14.17	เวลา 14.19	เวลา 14.15	เวลา.....
	ก่อนเดินเครื่อง					
1	ตรวจสอบ Jockey pump ต้องอยู่ใน Mode Automatic เท่านั้น	/	/	/	/	
2	ตรวจเช็คสายไฟและอุปกร์ต่างๆภายในตู้ Control	/	/	/	/	
3	ตรวจเช็ค และบันทึกค่าความดันของน้ำในระบบ(PSI)	266 PSI	260 PSI	275 PSI	245 PSI	..... PSI
4	ตรวจเช็ค และบันทึกการตั้งค่าความดันของน้ำ Start Run (PSI)	240 PSI	240 PSI	240 PSI	240 PSI	..... PSI
5	ตรวจเช็ค และบันทึกการตั้งค่าความดันของน้ำ Stop Run (PSI)	250 PSI	250 PSI	250 PSI	250 PSI	..... PSI
6	ตรวจสอบตำแหน่งวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	/	/	/	/	
	ขณะเดินเครื่อง (ทดสอบใน Mode Automatic โดยการระบายน้ำในระบบออก)	/	/	/	/	
7	ตรวจเช็ค และบันทึกค่าความดันของน้ำในระบบ ขณะที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	282 PSI	278 PSI	282 PSI	282 PSI	..... PSI
8	ตรวจเช็คแรงดันและกระแสทางไฟฟ้าของ Motor เฟส R	233 V/..... A	230 V/..... A	233 V/..... A	231 V/..... A	..... V/..... A
9	ตรวจเช็คแรงดันและกระแสทางไฟฟ้าของ Motor เฟส S	230 V/..... A	231 V/..... A	231 V/..... A	231 V/..... A	..... V/..... A
10	ตรวจเช็คแรงดันและกระแสทางไฟฟ้าของ Motor เฟส T	231 V/..... A	231 V/..... A	230 V/..... A	230 V/..... A	..... V/..... A
11	ตรวจสอบพร้อมทฟังเสียงเครื่องเวลาเริ่มทำงาน และกำลังทำงาน	/	/	/	/	
12	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำผ่านซีล และข้อต่อท่อต่าง ๆ ของระบบ	/	/	/	/	
	หลังการเดินเครื่อง					
13	ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันของน้ำในระบบ (PSI)	266 PSI	270 PSI	279 PSI	267 PSI	..... PSI
14	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำผ่านซีล และข้อต่อท่อต่าง ๆ ของระบบ	/	/	/	/	

/ ปกติ
X ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	ธรรม	ปอ:เทค	ธรรม	ธรรม	.....
ผู้ตรวจสอบ	ธรรม	ธรรม	ธรรม	ธรรม	.....
ผู้ทบทวน	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	.....

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Tower 2

Check Sheet Electrical Fire Pump

FP : Pentair Aurora Serail No. : 21-312102002-1 Flow rate : 1000GPM

Motor : TechTOP 380Volt 50HZ 185KW 2960rpm

ITEM	DESCRIPTION	January 2026				
		วันที่ 7-1-69	วันที่ 14-1-69	วันที่ 21-1-69	วันที่ 28-1ล-69	วันที่.....
		เวลา 14.25	เวลา 14.19	เวลา 14.20	เวลา 14.20	เวลา.....
	ก่อนเดินเครื่อง					
1	ตรวจสอบ Electrical Fire Pump ต้องอยู่ใน Mode Automatic เท่านั้น	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คสายไฟและอุปกร์ต่างๆภายในตู้ Control	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็ค และบันทึกค่าความดันของน้ำในระบบ(PSI)	263 PSI	260 PSI	273 PSI	243 PSI	..... PSI
4	ตรวจเช็ค และบันทึกการตั้งค่าความดันของน้ำ Start Run (PSI)	230 PSI	230 PSI	230 PSI	230 PSI	..... PSI
5	ตรวจสอบตำแหน่งวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	
	ขณะเดินเครื่อง (ทดสอบใน Mode Automatic โดยการระบายน้ำในระบบออก)					
6	ตรวจเช็ค และบันทึกค่าความดันของน้ำในระบบ ขณะที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	283 PSI	285 PSI	286 PSI	282 PSI	..... PSI
7	ตรวจเช็คแรงดันและกระแสทางไฟฟ้าของ Motor เฟส R	233 V/..... A	233 V/..... A	231 V/..... A	232 V/..... A	..... V/..... A
8	ตรวจเช็คแรงดันและกระแสทางไฟฟ้าของ Motor เฟส S	232 V/..... A	232 V/..... A	233 V/..... A	231 V/..... A	..... V/..... A
9	ตรวจเช็คแรงดันและกระแสทางไฟฟ้าของ Motor เฟส T	231 V/..... A	232 V/..... A	230 V/..... A	233 V/..... A	..... V/..... A
10	ตรวจสอบพร้อมทฟังเสียงเครื่องเวลาเริ่มทำงาน และกำลังทำงาน	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำผ่านซีล และข้อต่อท่อต่าง ๆ ของระบบ	✓	✓	✓	✓	
	หลังการเดินเครื่อง					
12	ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันของน้ำในระบบ (PSI)	266 PSI	268 PSI	277 PSI	267 PSI	..... PSI
13	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำผ่านซีล และข้อต่อท่อต่าง ๆ ของระบบ		✓	✓		

[/] ปกติ

[X] ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	.....	.....	.....	.....	.....
ผู้ตรวจสอบ	.....	.....	.....	.....	.....
ผู้ทบทวน	.....	.....	.....	.....	.....

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Tower 2

Check Sheet Diesel Engine Fire Pump

FP : Pentair Aurora Model : 5-491-18A Serail No. : 20-2578371 Flow rate : 1000GPM

Engine : Clarke Model : PU086TI Serail No. : DE08-OOQ00971036

ITEM	DESCRIPTION	January 2026				
		วันที่ 7-1-69	วันที่ 14-1-69	วันที่ 21-1-69	วันที่ 28-1-69	วันที่
		เวลา 14.35	เวลา 14.30	เวลา 14.30	เวลา 14.30.	เวลา
	ก่อนเดินเครื่อง					
1	ตรวจสอบ Diesel Engine Fire Pump ต้องอยู่ใน Mode Automatic เท่านั้น	/	/	/	/	
2	ตรวจเช็ค และบันทึกค่าความดันของน้ำในระบบ(PSI)	263 PSI	275 PSI	273 PSI	263 PSI	..... PSI
3	ตรวจเช็ค และบันทึกการตั้งค่าความดันของน้ำ Start Run (PSI)	220 PSI	220 PSI	220 PSI	220 PSI	..... PSI
4	ตรวจสอบตำแหน่งวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	/	/	/	/	
5	ตรวจเช็คระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
7	จาระบีและลูกบืน	/	/	/	/	
8	สภาพแบตเตอรีและน้ำกลั่นแบตเตอรี	/	/	/	/	
9	ชุดชาร์จแบตเตอรี	13.83 / 13.81 V	13.83 / 13.81 V	13.90 / 13.81 V	13.89 / 13.82 V	 V
	ขณะเดินเครื่อง (ทดสอบใน Mode Automatic โดยการระบายน้ำในระบบออก)					
10	ตรวจเช็ค และบันทึกค่าความดันของน้ำในระบบ ขณะที่ปั๊มทำงาน (PSI)	293 PSI	293 PSI	296 PSI	290 PSI	..... PSI
11	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C)	80 C	80 C	80 C	80 C	 C
13	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	..... PSI
14	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	3100 RPM	3100 RPM	3100 RPM	3100 RPM	..... RPM
15	วาล์วควบคุมแรงดัน	/	/	/	/	
16	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	
17	ตรวจสอบพร้อมฟังเสียงเครื่องเวลาเริ่มทำงาน และกำลังทำงาน	/	/	/	/	
18	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำผ่านซีล และข้อต่อท่อต่าง ๆ ของระบบ	/	/	/	/	
	หลังการเดินเครื่อง	/	/	/	/	
19	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์ (Liter)	3/4 Liter	3/4 Liter	3/4 Liter	3/4 Liter	..... Liter
20	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (Hrs)	6.7 Hrs	6.7 Hrs	6.7 Hrs	6.7 Hrs	..... Hrs
21	ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันของน้ำในระบบ (PSI)	265 PSI	286 PSI	276 PSI	276 PSI	..... PSI

/ ปกติ

X ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	.....	.....	.....	.....	.....
ผู้ตรวจสอบ	.....	.....	.....	.....	.....
ผู้ทบทวน	.....	.....	.....	.....	.....

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2

ประจำปี 2568

โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร B

วันที่ 16-29 เมษายน 2569



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 662 932 -0837

94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838

Preventive Maintenance Report

General Information			
Project : Staybridge Bangkok	**System :** Fire Alarm	**Model :** EST3	
Revision : -	**Manufacturer :** GE Security Co.,Ltd.		
PM No. : 2025 - 2/2	**Start :** 16/4/2026	**End** : 29/4/2026	
Parts / Devices Types			
Part/Dev. : FCP.	**Installed by :** -		
Location : Engineering Room	**Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.		

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
01	**Power Supplies**									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output)	/	/	/	-	-	-	-	/	
02	**3-CPU1**									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	
03	**3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller**									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	
04	**Battery Charger**									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@ 12 Amp. 1 S	/	/	/	-	-	-	-	/	
05	**Indicator Lamps (At 3-LCD)**									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.02 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	

Preventive Maintenance Report

General Information		
Project : Staybridge Bangkok	**System :** Fire Alarm	**Model :** EST3
Revision : -	**Manufacturer :** GE Security Co.,Ltd.	
PM No. : 2025 - 2/2	**Start :** 16/4/2026	**End** : 29/4/2026

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : FCP.	**Installed by :** -
Location : Engineering Room	**Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	
06	**Control Switches (At 3-LCD)**									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.06 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.11 > DEL.	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/	
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/	
07	**3-FTCU Controller (Control Switches)**	/	/	/	-	-	-	-	/	
	7.01 > Connect sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	
	7.02 > Review Pending sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	
	7.03 > ACK SW	/	/	/	-	-	-	-	/	
	7.04 > Disconnect	/	/	/	-	-	-	-	/	
	7.05 > Review Connected.	/	/	/	-	-	-	-	/	
08	**LCD Display**	/	/	/	-	-	-	-	/	
09	**Trouble,Alarm Buzzer**	/	/	/	-	-	-	-	/	
10	**Computer Graphic at Operator Engineering Room**	/	/	/	-	-	-	-	/	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
01020001	IM-IN-B2FL_PP	-	X	-	X	อุปกรณ์เสีย
01020002	IM-OUT-4FL_PP	✓	-	-	-	
01020003	HEAT-ADD-1-B2FL_PP7	✓	-	-	-	
01020004	HEAT-ADD-2-B2FL_PP6	✓	-	-	-	
01020005	HEAT-ADD-3-B2FL_PP4	✓	-	-	-	
01020006	HEAT-ADD-4-B2FL_PP3	✓	-	-	-	
01020007	HEAT-ADD-5-B2FL_PP2	✓	-	-	-	
01020008	HEAT-ADD-6-B2FL_PP1	-	X	-	-	อุปกรณ์เสีย
01020009	DUCT-SMOKE-ADD-1-1FL_PP70	✓	-	-	-	
01020010	SMOKE-ADD-1-1FL_PP	-	X	-	-	อุปกรณ์เสีย
01020126	DZ-ST1-B2FL_PP66	✓	-	-	-	
01020127	KZ-01-B2FL_PP5	✓	-	-	-	
01020128	MZ-01-B2FL_PP5	✓	-	-	-	
01020129	DFP-MON-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020130	DFP-TBL-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020131	EFP-MON-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020132	EFP-TBL-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020133	JP-MON-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020134	JP-TBL-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020135	SV-01-B2FL_PP1	-	-	-	-	
01020136	SV-02-B2FL_PP3	-	-	-	-	
01020137	SV-03-B2FL_PP6	-	-	-	-	
01020138	SV-04-B2FL_PP10	-	-	-	-	
01020139	SV-05-B2FL_PP7	-	-	-	-	
01020140	SV-06-B2FL_PP4	-	-	-	-	
01020141	SV-07-B2FL_PP2	-	-	-	-	
01020142	SV-08-B2FL_PP8	-	-	-	-	
01020143	SV-09-B2FL_PP11	-	-	-	-	
01020144	SV-10-B2FL_PP5	-	-	-	-	
01020145	SV-11-B2FL_PP9	-	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020146	SV-12-B2FL_PP12	-	-	-	-	
01020147	SV-13-B2FL_PP14	-	-	-	-	
01020148	SV-14-B2FL_PP13	-	-	-	-	
01020149	STZ-FML-1FL_PP	-	-	-	-	
01020150	DZ-01-2FL_PP106	✓	-	-	-	
01020151	STZ-01-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020152	STZ-ST1-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020153	SPZ-01-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020154	SPZ-ST1-B2FL_PP	-	-	-	-	
01020155	TZ-ST1-B2FL_PP	✓	-	-	-	
01020156	DZ-01-B1FL_PP36	✓	-	-	-	
01020157	DZ-02-B1FL_PP38	✓	-	-	-	
01020158	DZ-03-B1FL_PP34	✓	-	-	-	
01020159	KZ-01-B1FL_PP39	✓	-	-	-	
01020160	MZ-01-B1FL_PP39	✓	-	-	-	
01020161	FS-01-B1FL_PP20	✓	-	-	-	
01020162	SV-01-B1FL_PP19	✓	-	-	-	
01020163	SV-02-B1FL_PP	✓	-	-	-	
01020164	SV-03-B1FL_PP	✓	-	-	-	
01020165	STZ-01-B1FL_PP	-	-	-	-	
01020166	STZ-02-B1FL_PP	-	-	-	-	
01020167	SPZ-01-B1FL_PP	-	-	-	-	
01020168	SPZ-02-B1FL_PP	-	-	-	-	
01020169	RZ-01-B1FL_PP	-	-	-	-	
01020170	DZ-01-1FL_PP71	✓	-	-	-	
01020171	DZ-02-1FL_PP73	-	-	-	-	
01020172	DZ-03-1FL_PP74	-	-	-	-	
01020173	DZ-04-1FL_PP77	-	-	-	-	
01020174	DZ-ST2-1FL_PP68	✓	-	-	-	
01020175	DZ-FML-1FL_PP67	✓	-	-	-	
01020176	KZ-01-1FL_PP69	-	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020177	MZ-01-1FL_PP69	-	-	-	-	
01020178	KZ-02-1FL_PP72	-	-	-	-	
01020179	MZ-02-1FL_PP72	-	-	-	-	
01020180	KZ-03-1FL_PP76	-	-	-	-	
01020181	MZ-03-1FL_PP76	-	-	-	-	
01020182	FS-01-1FL_PP22	✓	-	-	-	
01020183	SV-01-1FL_PP21	✓	-	-	-	
01020184	GAS-01-1FL_PP	✓	-	-	-	
01020185	STZ-01-1FL_PP	-	-	-	-	
01020186	STZ-02-1FL_PP	-	-	-	-	
01020187	STZ-03-1FL_PP	-	-	-	-	
01020188	STZ-ST2-1FL_PP	-	-	-	-	
01020189	SPZ-01-1FL_PP	-	-	-	-	
01020190	SPZ-02-1FL_PP	-	-	-	-	
01020191	SPZ-03-1FL_PP	-	-	-	-	
01020192	SPZ-ST2-1FL_PP	-	-	-	-	
01020193	SPZ-FML-1FL_PP	-	-	-	-	
01020194	TZ-01-1FL_PP	✓	-	-	-	
01020195	TZ-ST2-1FL_PP	✓	-	-	-	
01020196	TZ-FML-1FL_PP	✓	-	-	-	
01020197	RZ-01-1FL_PP	-	-	-	-	
01020198	RZ-02-1FL_PP	-	-	-	-	
01020199	RZ-03-1FL_PP	-	-	-	-	
01020200	RZ-04-1FL_PP	-	-	-	-	
01020201	DZ-02-2FL_PP104	✓	-	-	-	
01020202	DZ-03-2FL_PP105	✓	-	-	-	
01020203	DZ-04-2FL_PP108	✓	-	-	-	
01020204	DZ-05-2FL_PP109	✓	-	-	-	
01020205	DZ-06-2FL_PP110	✓	-	-	-	
01020206	DZ-07-2FL_PP111	✓	-	-	-	
01020207	KZ-01-2FL_PP107	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020208	MZ-01-2FL_PP107	✓	-	-	-	
01020209	FS-01-2FL_PP24	✓	-	-	-	
01020210	SV-01-2FL_PP23	✓	-	-	-	
01020211	STZ-01-2FL_PP	-	-	-	-	
01020212	DZ-01-3FL_PP139	✓	-	-	-	
01020213	SPZ-01-2FL_PP	-	-	-	-	
01020214	DZ-02-3FL_PP138	✓	-	-	-	
01020215	RZ-01-2FL_PP	-	-	-	-	
01020216	RZ-02-2FL_PP	-	-	-	-	
01020217	DZ-03-3FL_PP142	✓	-	-	-	
01020218	DZ-04-3FL_PP143	✓	-	-	-	
01020219	DZ-05-3FL_PP144	✓	-	-	-	
01020220	DZ-06-3FL_PP141	✓	-	-	-	
01020221	KZ-01-3FL_PP140	✓	-	-	-	
01020222	MZ-01-3FL_PP140	✓	-	-	-	
01020223	FS-01-3FL_PP26	✓	-	-	-	
01020224	SV-01-3FL_PP25	✓	-	-	-	
01020225	STZ-01-3FL_PP	-	-	-	-	
01020226	SPZ-01-3FL_PP	-	-	-	-	
01020227	RZ-01-3FL_PP	-	-	-	-	
01020228	RZ-02-3FL_PP	-	-	-	-	
01020229	DZ-01-4FL_PP175	✓	-	-	-	
01020230	DZ-02-4FL_PP174	✓	-	-	-	
01020231	DZ-03-4FL_PP178	✓	-	-	-	
01020232	DZ-04-4FL_PP179	✓	-	-	-	
01020233	DZ-05-4FL_PP180	✓	-	-	-	
01020234	DZ-06-4FL_PP177	✓	-	-	-	
01020235	KZ-01-4FL_PP176	✓	-	-	-	
01020236	MZ-01-4FL_PP176	✓	-	-	-	
01020237	FS-01-4FL_PP28	✓	-	-	-	
01020238	SV-01-4FL_PP27	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020239	STZ-01-4FL_PP	-	-	-	-	
01020240	SPZ-01-4FL_PP	-	-	-	-	
01020241	RZ-01-4FL_PP	-	-	-	-	
01020242	RZ-02-4FL_PP	-	-	-	-	
01020243	KZ-02-B1FL_PP35	✓	-	-	-	
01020244	MZ-02-B1FL_PP35	✓	-	-	-	
01020245	SV-15-B2FL_PP16	✓	-	-	-	
01020246	SV-16-B2FL_PP15	✓	-	-	-	
01020247	SV-17-B2FL_PP17	✓	-	-	-	
01020248	FS-01-B2FL_PP18	✓	-	-	-	
01020251	IM-IN-5FL_PP	✓	-	-	-	
01020252	IM-OUT-14FL_PP	✓	-	-	-	
01020253	SMOKE-ADD-1-8FL_PP297	✓	-	-	-	
01020254	SMOKE-ADD-2-8FL_PP296	✓	-	-	-	
01020255	SMOKE-ADD-3-8FL_PP295	✓	-	-	-	
01020256	SMOKE-ADD-4-8FL_PP294	✓	-	-	-	
01020257	HEAT-ADD-5-8FL_PP291	✓	-	-	-	
01020258	HEAT-ADD-6-8FL_PP293	✓	-	-	-	
01020259	DUCT-SMOKE-ADD-7-8FL_PP292	✓	-	-	-	
01020260	SMOKE-ADD-1-10FL_PP10	-	-	✓	-	
01020261	SMOKE-ADD-2-10FL_PP10	-	-	✓	-	
01020262	SMOKE-ADD-3-10FL_PP9	-	-	✓	-	
01020263	SMOKE-ADD-4-10FL_PP8	-	-	✓	-	
01020264	SMOKE-ADD-5-10FL_PP8	-	-	✓	-	
01020265	SMOKE-ADD-6-10FL_PP15	-	-	✓	-	
01020266	SMOKE-ADD-7-10FL_PP15	-	-	✓	-	
01020267	SMOKE-ADD-8-10FL_PP16	-	-	✓	-	
01020268	SMOKE-ADD-9-10FL_PP16	-	-	✓	-	
01020269	SMOKE-ADD-10-10FL_PP17	-	-	✓	-	
01020270	SMOKE-ADD-11-10FL_PP17	-	-	✓	-	
01020271	SMOKE-ADD-12-10FL_PP18	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020272	SMOKE-ADD-13-10FL_PP19	-	-	✓	-	
01020273	SMOKE-ADD-14-10FL_PP20	-	-	✓	-	
01020274	SMOKE-ADD-15-10FL_PP20	-	-	✓	-	
01020275	SMOKE-ADD-16-10FL_PP21	-	-	✓	-	
01020276	SMOKE-ADD-17-10FL_PP21	-	-	✓	-	
01020277	SMOKE-ADD-18-10FL_PP22	-	-	-	-	
01020278	SMOKE-ADD-19-10FL_PP22	-	-	-	-	
01020279	SMOKE-ADD-20-10FL_PP14	-	-	✓	-	
01020280	SMOKE-ADD-21-10FL_PP13	-	-	✓	-	
01020281	DUCT-SMOKE-ADD-1-9FL_PP322	✓	-	-	-	
01020282	SMOKE-ADD-1-11FL_PP42	✓	-	-	-	
01020283	SMOKE-ADD-2-11FL_PP42	✓	-	-	-	
01020284	SMOKE-ADD-3-11FL_PP41	✓	-	-	-	
01020285	SMOKE-ADD-4-11FL_PP40	✓	-	-	-	
01020286	SMOKE-ADD-5-11FL_PP40	✓	-	-	-	
01020287	SMOKE-ADD-6-11FL_PP47	✓	-	✓	-	
01020288	SMOKE-ADD-7-11FL_PP47	✓	-	✓	-	
01020289	SMOKE-ADD-8-11FL_PP48	✓	-	-	-	
01020290	SMOKE-ADD-9-11FL_PP48	✓	-	-	-	
01020291	SMOKE-ADD-10-11FL_PP49	✓	-	-	-	
01020292	SMOKE-ADD-11-11FL_PP49	✓	-	-	-	
01020293	SMOKE-ADD-12-11FL_PP50	✓	-	-	-	
01020294	SMOKE-ADD-13-11FL_PP51	✓	-	-	-	
01020295	SMOKE-ADD-14-11FL_PP52	✓	-	-	-	
01020296	SMOKE-ADD-15-11FL_PP52	✓	-	-	-	
01020297	SMOKE-ADD-16-11FL_PP53	✓	-	✓	-	
01020298	SMOKE-ADD-17-11FL_PP53	✓	-	✓	-	
01020299	SMOKE-ADD-18-11FL_PP54	✓	-	✓	-	
01020300	SMOKE-ADD-19-11FL_PP54	✓	-	✓	-	
01020301	SMOKE-ADD-20-11FL_PP46	✓	-	-	-	
01020302	SMOKE-ADD-21-11FL_PP45	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ **Staybridge Bangkok**						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020303	DUCT-SMOKE-ADD-2-9FL_PP321	✓	-	-	-	
01020304	SMOKE-ADD-1-12FL_PP80	-	-	✓	-	
01020305	SMOKE-ADD-2-12FL_PP80	-	-	✓	-	
01020306	SMOKE-ADD-3-12FL_PP79	✓	-	-	-	
01020307	SMOKE-ADD-4-12FL_PP78	-	-	-	-	
01020308	SMOKE-ADD-5-12FL_PP78	-	-	-	-	
01020309	SMOKE-ADD-6-12FL_PP85	-	-	✓	-	
01020310	SMOKE-ADD-7-12FL_PP85	-	-	✓	-	
01020311	SMOKE-ADD-8-12FL_PP86	✓	-	✓	-	
01020312	SMOKE-ADD-9-12FL_PP86	✓	-	✓	-	
01020313	SMOKE-ADD-10-12FL_PP87	✓	-	-	-	
01020314	SMOKE-ADD-11-12FL_PP87	✓	-	-	-	
01020315	SMOKE-ADD-12-12FL_PP88	✓	-	-	-	
01020316	SMOKE-ADD-13-12FL_PP89	✓	-	-	-	
01020317	SMOKE-ADD-14-12FL_PP90	✓	-	-	-	
01020318	SMOKE-ADD-15-12FL_PP90	✓	-	-	-	
01020319	SMOKE-ADD-16-12FL_PP91	✓	-	-	-	
01020320	SMOKE-ADD-17-12FL_PP91	✓	-	-	-	
01020321	SMOKE-ADD-18-12FL_PP92	✓	-	-	-	
01020322	SMOKE-ADD-19-12FL_PP92	✓	-	-	-	
01020323	SMOKE-ADD-20-12FL_PP84	✓	-	-	-	
01020324	SMOKE-ADD-21-12FL_PP83	✓	-	-	-	
01020325	DUCT-SMOKE-ADD-3-9FL_PP	✓	-	-	-	
01020326	SMOKE-ADD-1-14FL_PP114	-	-	✓	-	
01020327	SMOKE-ADD-2-14FL_PP114	-	-	✓	-	
01020328	SMOKE-ADD-3-14FL_PP113	-	-	✓	-	
01020329	SMOKE-ADD-4-14FL_PP112	✓	-	-	-	
01020330	SMOKE-ADD-5-14FL_PP112	✓	-	-	-	
01020331	SMOKE-ADD-6-14FL_PP119	-	-	-	-	
01020332	SMOKE-ADD-7-14FL_PP119	-	-	-	-	
01020333	SMOKE-ADD-8-14FL_PP120	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020334	SMOKE-ADD-9-14FL_PP120	✓	-	-	-	
01020335	SMOKE-ADD-10-14FL_PP121	✓	-	-	-	
01020336	SMOKE-ADD-11-14FL_PP121	✓	-	-	-	
01020337	SMOKE-ADD-12-14FL_PP122	✓	-	-	-	
01020338	SMOKE-ADD-13-14FL_PP123	✓	-	-	-	
01020339	SMOKE-ADD-14-14FL_PP124	✓	-	-	-	
01020340	SMOKE-ADD-15-14FL_PP124	✓	-	-	-	
01020341	SMOKE-ADD-16-14FL_PP125	✓	-	-	-	
01020342	SMOKE-ADD-17-14FL_PP125	✓	-	-	-	
01020343	SMOKE-ADD-18-14FL_PP126	✓	-	-	-	
01020344	SMOKE-ADD-19-14FL_PP126	✓	-	-	-	
01020345	SMOKE-ADD-20-14FL_PP118	✓	-	-	-	
01020346	SMOKE-ADD-21-14FL_PP117	✓	-	-	-	
01020347	DUCT-SMOKE-ADD-4-9FL_PP	✓	-	-	-	
01020376	DZ-01-8FL_PP298	✓	-	-	-	
01020377	DZ-02-8FL_PP	✓	-	-	-	
01020378	KZ-01-8FL_PP300	✓	-	-	-	
01020379	MZ-01-8FL_PP300	✓	-	-	-	
01020380	FS-01-8FL_PP37	✓	-	-	-	
01020381	SV-01-8FL_PP36	✓	-	-	-	
01020382	MON-ALARM-8FL_PP	✓	-	-	-	
01020383	MON-TBL-8FL_PP	✓	-	-	-	
01020384	STZ-01-8FL_PP	-	-	-	-	
01020385	SPZ-01-8FL_PP	-	-	-	-	
01020386	RZ-01-8FL_PP	-	-	-	-	
01020387	RZ-02-8FL_PP	-	-	-	-	
01020388	RZ-03-8FL_PP	-	-	-	-	
01020389	DZ-01-9FL_PP323	✓	-	-	-	
01020390	DZ-02-9FL_PP325	✓	-	-	-	
01020391	DZ-03-9FL_PP326	✓	-	-	-	
01020392	KZ-01-9FL_PP324	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020393	MZ-01-9FL_PP324	✓	-	-	-	
01020394	FS-01-9FL_PP45	✓	-	-	-	
01020395	SV-01-9FL_PP44	✓	-	-	-	
01020396	SV-02-9FL_PP39	✓	-	-	-	
01020397	SV-03-9FL_PP38	✓	-	-	-	
01020398	SV-04-9FL_PP41	✓	-	-	-	
01020399	SV-05-9FL_PP40	✓	-	-	-	
01020400	SV-06-9FL_PP43	✓	-	-	-	
01020401	SV-07-9FL_PP42	-	-	-	-	
01020402	STZ-01-9FL_PP	✓	-	-	-	
01020403	DZ-01-5FL_PP206	✓	-	-	-	
01020404	DZ-02-5FL_PP205	✓	-	-	-	
01020405	DZ-03-5FL_PP209	✓	-	-	-	
01020406	DZ-04-5FL_PP210	✓	-	-	-	
01020407	DZ-05-5FL_PP208	✓	-	-	-	
01020408	KZ-01-5FL_PP207	✓	-	-	-	
01020409	MZ-01-5FL_PP207	✓	-	-	-	
01020410	FS-01-5FL_PP30	✓	-	-	-	
01020411	SV-01-5FL_PP29	✓	-	-	-	
01020412	SME-01-5FL_PP	✓	-	-	-	
01020413	SME-02-5FL_PP	✓	-	-	-	
01020414	STZ-01-5FL_PP	-	-	-	-	
01020415	SPZ-01-5FL_PP	-	-	-	-	
01020416	RZ-01-5FL_PP	-	-	-	-	
01020417	RZ-02-5FL_PP	-	-	-	-	
01020418	RZ-03-5FL_PP	-	-	-	-	
01020419	RZ-04-5FL_PP	-	-	-	-	
01020420	DZ-01-6FL_PP235	✓	-	-	-	
01020421	DZ-02-6FL_PP238	✓	-	-	-	
01020422	DZ-03-6FL_PP239	✓	-	-	-	
01020423	DZ-04-6FL_PP235	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020424	DZ-05-6FL_PP237	✓	-	-	-	
01020425	KZ-01-6FL_PP236	✓	-	-	-	
01020426	MZ-01-6FL_PP236	✓	-	-	-	
01020427	FS-01-6FL_PP32	✓	-	-	-	
01020428	SV-01-6FL_PP31	✓	-	-	-	
01020429	STZ-01-6FL_PP	-	-	-	-	
01020430	SPZ-01-6FL_PP	-	-	-	-	
01020431	RZ-01-6FL_PP	-	-	-	-	
01020432	DZ-01-7FL_PP265	✓	-	-	-	
01020433	DZ-02-7FL_PP269	✓	-	-	-	
01020434	DZ-03-7FL_PP270	✓	-	-	-	
01020435	DZ-04-7FL_PP264	✓	-	-	-	
01020436	DZ-05-7FL_PP268	✓	-	-	-	
01020437	KZ-01-7FL_PP266	✓	-	-	-	
01020438	MZ-01-7FL_PP266	✓	-	-	-	
01020439	FS-01-7FL_PP34	✓	-	-	-	
01020440	SV-01-7FL_PP33	✓	-	-	-	
01020441	STZ-01-7FL_PP	-	-	-	-	
01020442	SPZ-01-7FL_PP	-	-	-	-	
01020443	RZ-01-7FL_PP	-	-	-	-	
01020444	SPZ-01-9FL_PP	-	-	-	-	
01020445	RZ-01-9FL_PP	-	-	-	-	
01020446	RZ-02-9FL_PP	-	-	-	-	
01020447	RZ-03-9FL_PP	-	-	-	-	
01020448	RZ-04-9FL_PP	-	-	-	-	
01020449	RZ-05-9FL_PP	-	-	-	-	
01020450	DZ-01-10FL_PP11	✓	-	-	-	
01020451	DZ-ST1-10FL_PP171	✓	-	-	-	
01020452	DZ-ST2-10FL_PP173	✓	-	-	-	
01020453	DZ-FML-10FL_PP172	✓	-	-	-	
01020454	STZ-01-10FL_PP	-	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020455	STZ-ST1-10FL_PP	-	-	-	-	
01020456	STZ-ST2-10FL_PP	-	-	-	-	
01020457	STZ-FML-10FL_PP	-	-	-	-	
01020458	SPZ-01-10FL_PP	-	-	-	-	
01020459	SPZ-ST1-10FL_PP	-	-	-	-	
01020460	SPZ-ST2-10FL_PP	-	-	-	-	
01020461	SPZ-FML-10FL_PP	-	-	-	-	
01020462	DZ-01-11FL_PP43	✓	-	-	-	
01020463	STZ-01-11FL_PP	-	-	-	-	
01020464	SPZ-01-11FL_PP	-	-	-	-	
01020465	DZ-01-12FL_PP81	✓	-	-	-	
01020466	STZ-01-12FL_PP	-	-	-	-	
01020467	SPZ-01-12FL_PP	-	-	-	-	
01020468	DZ-01-14FL_PP115	✓	-	-	-	
01020469	STZ-01-14FL_PP	-	-	-	-	
01020470	SPZ-01-14FL_PP	-	-	-	-	
01020471	MZ-01-10FL_PP12	✓	-	-	-	
01020472	KZ-01-10FL_PP12	✓	-	-	-	
01020473	MZ-02-10FL_PP12	✓	-	-	-	
01020474	KZ-02-10FL_PP12	✓	-	-	-	
01020475	MZ-01-11FL_PP44	✓	-	-	-	
01020476	KZ-01-11FL_PP44	✓	-	-	-	
01020477	MZ-02-11FL_PP44	✓	-	-	-	
01020478	KZ-02-11FL_PP44	✓	-	-	-	
01020479	MZ-01-12FL_PP82	✓	-	-	-	
01020480	KZ-01-12FL_PP82	✓	-	-	-	
01020481	MZ-02-12FL_PP82	✓	-	-	-	
01020482	KZ-02-12FL_PP82	✓	-	-	-	
01020483	MZ-01-14FL_PP116	✓	-	-	-	
01020484	KZ-01-14FL_PP116	✓	-	-	-	
01020485	MZ-02-14FL_PP116	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020486	KZ-02-14FL_PP116	✓	-	-	-	
01020487	FS-01-10FL_PP47	✓	-	-	-	
01020488	SV-01-10FL_PP46	✓	-	-	-	
01020489	FS-01-11FL_PP49	✓	-	-	-	
01020490	SV-01-11FL_PP48	✓	-	-	-	
01020491	FS-01-12FL_PP51	✓	-	-	-	
01020492	SV-01-12FL_PP50	✓	-	-	-	
01020493	FS-01-14FL_PP53	✓	-	-	-	
01020494	SV-01-14FL_PP52	✓	-	-	-	
01020495	KZ-02-9FL_PP327	✓	-	-	-	
01020496	MZ-02-9FL_PP327	✓	-	-	-	
01030001	IM-IN-15FL	✓	-	-	-	
01030002	IM-IN-19FL	✓	-	-	-	
01030003	SMOKE-ADD-1-15FL_PP147	✓	-	-	-	
01030004	SMOKE-ADD-2-15FL_PP147	✓	-	-	-	
01030005	SMOKE-ADD-3-15FL_PP146	✓	-	-	-	
01030006	SMOKE-ADD-4-15FL_PP145	✓	-	-	-	
01030007	SMOKE-ADD-5-15FL_PP145	✓	-	-	-	
01030008	SMOKE-ADD-6-15FL_PP152	✓	-	-	-	
01030009	SMOKE-ADD-7-15FL_PP152	✓	-	-	-	
01030010	SMOKE-ADD-8-15FL_PP153	✓	-	-	-	
01030011	SMOKE-ADD-9-15FL_PP153	✓	-	-	-	
01030012	SMOKE-ADD-10-15FL_PP154	✓	-	-	-	
01030013	SMOKE-ADD-11-15FL_PP154	✓	-	-	-	
01030014	SMOKE-ADD-12-15FL_PP155	-	-	✓	-	
01030015	SMOKE-ADD-13-15FL_PP156	✓	-	-	-	
01030016	SMOKE-ADD-14-15FL_PP157	✓	-	-	-	
01030017	SMOKE-ADD-15-15FL_PP157	✓	-	-	-	
01030018	SMOKE-ADD-16-15FL_PP158	✓	-	-	-	
01030019	SMOKE-ADD-17-15FL_PP158	✓	-	-	-	
01030020	SMOKE-ADD-18-15FL_PP159	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030021	SMOKE-ADD-19-15FL_PP159	✓	-	-	-	
01030022	SMOKE-ADD-20-15FL_PP151	✓	-	-	-	
01030023	SMOKE-ADD-21-15FL_PP150	✓	-	-	-	
01030024	SMOKE-ADD-1-16FL_PP182	✓	-	✓	-	
01030025	SMOKE-ADD-2-16FL_PP182	✓	-	✓	-	
01030026	SMOKE-ADD-3-16FL_PP181	-	-	✓	-	
01030027	SMOKE-ADD-4-16FL_PP181	-	-	✓	-	
01030028	SMOKE-ADD-5-16FL_PP181	-	-	✓	-	
01030029	SMOKE-ADD-6-16FL_PP186	✓	-	-	-	
01030030	SMOKE-ADD-7-16FL_PP186	✓	-	-	-	
01030031	SMOKE-ADD-8-16FL_PP187	✓	-	✓	-	
01030032	SMOKE-ADD-9-16FL_PP187	✓	-	✓	-	
01030033	SMOKE-ADD-10-16FL_PP188	✓	-	✓	-	
01030034	SMOKE-ADD-11-16FL_PP188	✓	-	✓	-	
01030035	SMOKE-ADD-12-16FL_PP189	✓	-	-	-	
01030036	SMOKE-ADD-13-16FL_PP189	✓	-	✓	-	
01030037	SMOKE-ADD-14-16FL_PP190	-	-	✓	-	
01030038	SMOKE-ADD-15-16FL_PP190	-	-	✓	-	
01030039	SMOKE-ADD-16-16FL_PP191	✓	-	✓	-	
01030040	SMOKE-ADD-17-16FL_PP191	✓	-	✓	-	
01030041	SMOKE-ADD-18-16FL_PP192	✓	-	✓	-	
01030042	SMOKE-ADD-19-16FL_PP192	✓	-	✓	-	
01030043	SMOKE-ADD-20-16FL_PP193	✓	-	✓	-	
01030044	SMOKE-ADD-21-16FL_PP193	✓	-	✓	-	
01030045	SMOKE-ADD-1-17FL_PP212	-	-	✓	-	
01030046	SMOKE-ADD-2-17FL_PP212	-	-	✓	-	
01030047	SMOKE-ADD-3-17FL_PP211	-	-	✓	-	
01030048	SMOKE-ADD-4-17FL_PP211	-	-	✓	-	
01030049	SMOKE-ADD-5-17FL_PP211	-	-	-	-	
01030050	SMOKE-ADD-6-17FL_PP216	-	-	✓	-	
01030051	SMOKE-ADD-7-17FL_PP216	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030052	SMOKE-ADD-8-17FL_PP217	-	-	✓	-	
01030053	SMOKE-ADD-9-17FL_PP217	-	-	✓	-	
01030054	SMOKE-ADD-10-17FL_PP218	-	-	✓	-	
01030055	SMOKE-ADD-11-17FL_PP218	-	-	✓	-	
01030056	SMOKE-ADD-12-17FL_PP219	-	-	-	-	
01030057	SMOKE-ADD-13-17FL_PP219	-	-	-	-	
01030058	SMOKE-ADD-14-17FL_PP220	-	-	✓	-	
01030059	SMOKE-ADD-15-17FL_PP220	-	-	✓	-	
01030060	SMOKE-ADD-16-17FL_PP221	-	-	✓	-	
01030061	SMOKE-ADD-17-17FL_PP221	-	-	✓	-	
01030062	SMOKE-ADD-18-17FL_PP222	-	-	✓	-	
01030063	SMOKE-ADD-19-17FL_PP222	-	-	✓	-	
01030064	SMOKE-ADD-20-17FL_PP223	-	-	✓	-	
01030065	SMOKE-ADD-21-17FL_PP223	-	-	✓	-	
01030066	SMOKE-ADD-1-18FL_PP241	-	-	✓	-	
01030067	SMOKE-ADD-2-18FL_PP241	-	-	✓	-	
01030068	SMOKE-ADD-3-18FL_PP240	-	-	✓	-	
01030069	SMOKE-ADD-4-18FL_PP240	-	-	✓	-	
01030070	SMOKE-ADD-5-18FL_PP240	-	-	✓	-	
01030071	SMOKE-ADD-6-18FL_PP245	-	-	✓	-	
01030072	SMOKE-ADD-7-18FL_PP245	-	-	✓	-	
01030073	SMOKE-ADD-8-18FL_PP246	-	-	✓	-	
01030074	SMOKE-ADD-9-18FL_PP246	-	-	✓	-	
01030075	SMOKE-ADD-10-18FL_PP247	-	-	✓	-	
01030076	SMOKE-ADD-11-18FL_PP247	-	-	✓	-	
01030077	SMOKE-ADD-12-18FL_PP248	-	-	✓	-	
01030078	SMOKE-ADD-13-18FL_PP248	-	-	✓	-	
01030079	SMOKE-ADD-14-18FL_PP249	-	-	✓	-	
01030080	SMOKE-ADD-15-18FL_PP249	-	-	✓	-	
01030081	SMOKE-ADD-16-18FL_PP250	-	-	✓	-	
01030082	SMOKE-ADD-17-18FL_PP250	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030083	SMOKE-ADD-18-18FL_PP251	-	-	✓	-	
01030084	SMOKE-ADD-19-18FL_PP251	-	-	-	-	
01030085	SMOKE-ADD-20-18FL_PP252	-	-	✓	-	
01030086	SMOKE-ADD-21-18FL_PP252	-	-	✓	-	
01030087	SMOKE-ADD-1-19FL_PP272	-	-	✓	-	
01030088	SMOKE-ADD-2-19FL_PP272	-	-	✓	-	
01030089	SMOKE-ADD-3-19FL_PP271	-	-	✓	-	
01030090	SMOKE-ADD-4-19FL_PP271	-	-	✓	-	
01030091	SMOKE-ADD-5-19FL_PP271	-	-	✓	-	
01030092	SMOKE-ADD-6-19FL_PP276	-	-	✓	-	
01030093	SMOKE-ADD-7-19FL_PP276	-	-	✓	-	
01030094	SMOKE-ADD-8-19FL_PP277	-	-	✓	-	
01030095	SMOKE-ADD-9-19FL_PP277	-	-	✓	-	
01030096	SMOKE-ADD-10-19FL_PP278	-	-	✓	-	
01030097	SMOKE-ADD-11-19FL_PP278	-	-	✓	-	
01030098	SMOKE-ADD-12-19FL_PP279	-	-	✓	-	
01030099	SMOKE-ADD-13-19FL_PP279	-	-	✓	-	
01030100	SMOKE-ADD-14-19FL_PP280	-	-	✓	-	
01030101	SMOKE-ADD-15-19FL_PP280	-	-	✓	-	
01030102	SMOKE-ADD-16-19FL_PP281	-	-	✓	-	
01030103	SMOKE-ADD-17-19FL_PP281	-	-	✓	-	
01030104	SMOKE-ADD-18-19FL_PP282	-	-	✓	-	
01030105	SMOKE-ADD-19-19FL_PP282	-	-	✓	-	
01030106	SMOKE-ADD-20-19FL_PP283	-	-	✓	-	
01030107	SMOKE-ADD-21-19FL_PP283	-	-	✓	-	
01030109	SMOKE-ADD-22-16FL_PP185	✓	-	✓	-	
01030110	SMOKE-ADD-22-17FL_PP215	-	-	✓	-	
01030111	SMOKE-ADD-22-18FL_PP244	-	-	-	-	
01030112	SMOKE-ADD-22-19FL_PP275	-	-	-	-	
01030113	SMOKE-ADD-23-16FL_PP185	✓	-	-	-	
01030114	SMOKE-ADD-23-17FL_PP215	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030115	SMOKE-ADD-23-18FL_PP244	-	-	✓	-	
01030116	SMOKE-ADD-23-19FL_PP275	-	-	-	-	
01030126	DZ-01-15FL_PP148	✓	-	-	-	
01030127	STZ-01-15FL_PP	-	-	-	-	
01030128	SPZ-01-15FL_PP	-	-	-	-	
01030129	DZ-01-16FL_PP183	✓	-	-	-	
01030130	STZ-01-16FL_PP	-	-	-	-	
01030131	SPZ-01-16FL_PP	-	-	-	-	
01030132	DZ-01-17FL_PP213	✓	-	-	-	
01030133	STZ-01-17FL_PP	-	-	-	-	
01030134	SPZ-01-17FL_PP	-	-	-	-	
01030135	DZ-01-18FL_PP242	✓	-	-	-	
01030136	STZ-01-18FL_PP	-	-	-	-	
01030137	SPZ-01-18FL_PP	-	-	-	-	
01030138	DZ-01-19FL_PP273	✓	-	-	-	
01030139	STZ-01-19FL_PP	-	-	-	-	
01030140	SPZ-01-19FL_PP	-	-	-	-	
01030141	MZ-01-15FL_PP149	✓	-	-	-	
01030142	KZ-01-15FL_PP149	✓	-	-	-	
01030143	MZ-02-15FL_PP149	✓	-	-	-	
01030144	KZ-02-15FL_PP149	✓	-	-	-	
01030145	MZ-01-16FL_PP184	✓	-	-	-	
01030146	KZ-01-16FL_PP184	✓	-	-	-	
01030147	MZ-02-16FL_PP184	✓	-	-	-	
01030148	KZ-02-16FL_PP184	✓	-	-	-	
01030149	MZ-01-17FL_PP214	✓	-	-	-	
01030150	KZ-01-17FL_PP214	✓	-	-	-	
01030151	MZ-02-17FL_PP214	✓	-	-	-	
01030152	KZ-02-17FL_PP214	✓	-	-	-	
01030153	MZ-01-18FL_PP243	✓	-	-	-	
01030154	KZ-01-18FL_PP243	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030155	MZ-02-18FL_PP243	✓	-	-	-	
01030156	KZ-02-18FL_PP243	✓	-	-	-	
01030157	MZ-01-19FL_PP274	✓	-	-	-	
01030158	KZ-01-19FL_PP274	✓	-	-	-	
01030159	MZ-02-19FL_PP274	✓	-	-	-	
01030160	KZ-02-19FL_PP274	✓	-	-	-	
01030161	FS-01-15FL_PP55	✓	-	-	-	
01030162	SV-01-15FL_PP54	✓	-	-	-	
01030163	FS-01-16FL_PP57	✓	-	-	-	
01030164	SV-01-16FL_PP56	✓	-	-	-	
01030165	FS-01-17FL_PP59	✓	-	-	-	
01030166	SV-01-17FL_PP58	✓	-	-	-	
01030167	FS-01-18FL_PP61	✓	-	-	-	
01030168	SV-01-18FL_PP60	✓	-	-	-	
01030169	FS-01-19FL_PP63	✓	-	-	-	
01030170	SV-01-19FL_PP62	✓	-	-	-	
01030251	IM-IN-20FL	✓	-	-	-	
01030252	IM-OUT-25FL	✓	-	-	-	
01030253	SMOKE-ADD-1-20FL_PP302	-	-	✓	-	
01030254	SMOKE-ADD-2-20FL_PP302	-	-	✓	-	
01030255	SMOKE-ADD-3-20FL_PP301	-	-	✓	-	
01030256	SMOKE-ADD-4-20FL_PP301	-	-	✓	-	
01030257	SMOKE-ADD-5-20FL_PP301	-	-	✓	-	
01030258	SMOKE-ADD-6-20FL_PP306	✓	-	-	-	
01030259	SMOKE-ADD-7-20FL_PP306	✓	-	-	-	
01030260	SMOKE-ADD-8-20FL_PP307	-	-	✓	-	
01030261	SMOKE-ADD-9-20FL_PP307	-	-	✓	-	
01030262	SMOKE-ADD-10-20FL_PP308	-	-	✓	-	
01030263	SMOKE-ADD-11-20FL_PP308	-	-	✓	-	
01030264	SMOKE-ADD-12-20FL_PP309	✓	-	-	-	
01030265	SMOKE-ADD-13-20FL_PP309	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030266	SMOKE-ADD-14-20FL_PP310	✓	-	-	-	
01030267	SMOKE-ADD-15-20FL_PP310	✓	-	-	-	
01030268	SMOKE-ADD-16-20FL_PP311	-	-	✓	-	
01030269	SMOKE-ADD-17-20FL_PP311	-	-	✓	-	
01030270	SMOKE-ADD-18-20FL_PP312	-	-	-	-	
01030271	SMOKE-ADD-19-20FL_PP312	-	-	-	-	
01030272	SMOKE-ADD-20-20FL_PP313	✓	-	-	-	
01030273	SMOKE-ADD-21-20FL_PP313	✓	-	-	-	
01030274	SMOKE-ADD-22-20FL_PP305	-	-	✓	-	
01030275	SMOKE-ADD-23-20FL_PP305	-	-	✓	-	
01030276	SMOKE-ADD-1-21FL_PP331	-	-	✓	-	
01030277	SMOKE-ADD-2-21FL_PP331	-	-	✓	-	
01030278	SMOKE-ADD-3-21FL_PP330	-	-	✓	-	
01030279	SMOKE-ADD-4-21FL_PP330	-	-	✓	-	
01030280	SMOKE-ADD-5-21FL_PP330	-	-	✓	-	
01030281	SMOKE-ADD-6-21FL_PP335	-	-	✓	-	
01030282	SMOKE-ADD-7-21FL_PP335	-	-	✓	-	
01030283	SMOKE-ADD-8-21FL_PP336	✓	-	-	-	
01030284	SMOKE-ADD-9-21FL_PP336	✓	-	-	-	
01030285	SMOKE-ADD-10-21FL_PP337	-	-	✓	-	
01030286	SMOKE-ADD-11-21FL_PP337	-	-	✓	-	
01030287	SMOKE-ADD-12-21FL_PP338	-	-	✓	-	
01030288	SMOKE-ADD-13-21FL_PP338	-	-	✓	-	
01030289	SMOKE-ADD-14-21FL_PP339	-	-	✓	-	
01030290	SMOKE-ADD-15-21FL_PP339	-	-	✓	-	
01030291	SMOKE-ADD-16-21FL_PP340	-	-	✓	-	
01030292	SMOKE-ADD-17-21FL_PP340	-	-	✓	-	
01030293	SMOKE-ADD-18-21FL_PP334	-	-	✓	-	
01030294	SMOKE-ADD-19-21FL_PP334	-	-	✓	-	
01030295	SMOKE-ADD-1-22FL_PP24	-	-	✓	-	
01030296	SMOKE-ADD-2-22FL_PP24	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030297	SMOKE-ADD-3-22FL_PP23	-	-	✓	-	
01030298	SMOKE-ADD-4-22FL_PP23	-	-	✓	-	
01030299	SMOKE-ADD-5-22FL_PP23	-	-	✓	-	
01030300	SMOKE-ADD-6-22FL_PP28	✓	-	-	-	
01030301	SMOKE-ADD-7-22FL_PP28	✓	-	-	-	
01030302	SMOKE-ADD-8-22FL_PP29	-	-	✓	-	
01030303	SMOKE-ADD-9-22FL_PP29	-	-	✓	-	
01030304	SMOKE-ADD-10-22FL_PP30	-	-	✓	-	
01030305	SMOKE-ADD-11-22FL_PP30	-	-	✓	-	
01030306	SMOKE-ADD-12-22FL_PP31	-	-	✓	-	
01030307	SMOKE-ADD-13-22FL_PP31	-	-	✓	-	
01030308	SMOKE-ADD-14-22FL_PP32	-	-	✓	-	
01030309	SMOKE-ADD-15-22FL_PP32	-	-	✓	-	
01030310	SMOKE-ADD-16-22FL_PP33	✓	-	-	-	
01030311	SMOKE-ADD-17-22FL_PP33	✓	-	-	-	
01030312	SMOKE-ADD-18-22FL_PP27	-	-	✓	-	
01030313	SMOKE-ADD-19-22FL_PP27	-	-	✓	-	
01030314	SMOKE-ADD-1-23FL_PP56	-	-	✓	-	
01030315	SMOKE-ADD-2-23FL_PP56	-	-	✓	-	
01030316	SMOKE-ADD-3-23FL_PP55	-	-	✓	-	
01030317	SMOKE-ADD-4-23FL_PP55	-	-	✓	-	
01030318	SMOKE-ADD-5-23FL_PP55	-	-	✓	-	
01030319	SMOKE-ADD-6-23FL_PP60	-	-	✓	-	
01030320	SMOKE-ADD-7-23FL_PP60	-	-	✓	-	
01030321	SMOKE-ADD-8-23FL_PP61	✓	-	-	-	
01030322	SMOKE-ADD-9-23FL_PP61	✓	-	-	-	
01030323	SMOKE-ADD-10-23FL_PP62	-	-	✓	-	
01030324	SMOKE-ADD-11-23FL_PP62	-	-	✓	-	
01030325	SMOKE-ADD-12-23FL_PP63	-	-	✓	-	
01030326	SMOKE-ADD-13-23FL_PP63	-	-	✓	-	
01030327	SMOKE-ADD-14-23FL_PP64	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030328	SMOKE-ADD-15-23FL_PP64	-	-	✓	-	
01030329	SMOKE-ADD-16-23FL_PP65	✓	-	-	-	
01030330	SMOKE-ADD-17-23FL_PP65	✓	-	-	-	
01030331	SMOKE-ADD-18-23FL_PP59	-	-	✓	-	
01030332	SMOKE-ADD-19-23FL_PP59	-	-	✓	-	
01030333	SMOKE-ADD-1-24FL_PP94	✓	-	✓	-	
01030334	SMOKE-ADD-2-24FL_PP94	✓	-	✓	-	
01030335	SMOKE-ADD-3-24FL_PP93	-	-	✓	-	
01030336	SMOKE-ADD-4-24FL_PP93	-	-	✓	-	
01030337	SMOKE-ADD-5-24FL_PP93	-	-	✓	-	
01030338	SMOKE-ADD-6-24FL_PP98	✓	-	✓	-	
01030339	SMOKE-ADD-7-24FL_PP98	✓	-	✓	-	
01030340	SMOKE-ADD-8-24FL_PP99	-	-	✓	-	
01030341	SMOKE-ADD-9-24FL_PP99	-	-	✓	-	
01030342	SMOKE-ADD-10-24FL_PP100	✓	-	✓	-	
01030343	SMOKE-ADD-11-24FL_PP100	✓	-	✓	-	
01030344	SMOKE-ADD-12-24FL_PP101	-	-	✓	-	
01030345	SMOKE-ADD-13-24FL_PP101	-	-	✓	-	
01030346	SMOKE-ADD-14-24FL_PP102	-	-	✓	-	
01030347	SMOKE-ADD-15-24FL_PP102	-	-	✓	-	
01030348	SMOKE-ADD-16-24FL_PP103	-	-	✓	-	
01030349	SMOKE-ADD-17-24FL_PP103	-	-	✓	-	
01030350	SMOKE-ADD-18-24FL_PP97	-	-	✓	-	
01030351	SMOKE-ADD-19-24FL_PP97	-	-	✓	-	
01030376	DZ-01-20FL_PP303	✓	-	-	-	
01030377	STZ-01-20FL_PP	-	-	-	-	
01030378	SPZ-01-20FL_PP	-	-	-	-	
01030379	MZ-01-20FL_PP304	✓	-	-	-	
01030380	KZ-01-20FL_PP304	✓	-	-	-	
01030381	MZ-02-20FL_PP304	✓	-	-	-	
01030382	KZ-02-20FL_PP304	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030383	DZ-01-21FL_PP332	✓	-	-	-	
01030384	STZ-01-21FL_PP	-	-	-	-	
01030385	SPZ-01-21FL_PP	-	-	-	-	
01030386	MZ-01-21FL_PP333	✓	-	-	-	
01030387	KZ-01-21FL_PP333	✓	-	-	-	
01030388	MZ-02-21FL_PP333	✓	-	-	-	
01030389	KZ-02-21FL_PP333	✓	-	-	-	
01030390	DZ-01-22FL_PP25	✓	-	-	-	
01030391	STZ-01-22FL_PP	-	-	-	-	
01030392	SPZ-01-22FL_PP	-	-	-	-	
01030393	MZ-01-22FL_PP26	✓	-	-	-	
01030394	KZ-01-22FL_PP26	✓	-	-	-	
01030395	MZ-02-22FL_PP26	✓	-	-	-	
01030396	KZ-02-22FL_PP26	✓	-	-	-	
01030397	DZ-01-23FL_PP57	✓	-	-	-	
01030398	STZ-01-23FL_PP	-	-	-	-	
01030399	SPZ-01-23FL_PP	-	-	-	-	
01030400	MZ-01-23FL_PP58	✓	-	-	-	
01030401	KZ-01-23FL_PP58	✓	-	-	-	
01030402	MZ-02-23FL_PP58	✓	-	-	-	
01030403	KZ-02-23FL_PP58	✓	-	-	-	
01030404	DZ-01-24FL_PP95	✓	-	-	-	
01030405	STZ-01-24FL_PP	-	-	-	-	
01030406	SPZ-01-24FL_PP	-	-	-	-	
01030407	MZ-01-24FL_PP96	✓	-	-	-	
01030408	KZ-01-24FL_PP96	✓	-	-	-	
01030409	MZ-02-24FL_PP96	✓	-	-	-	
01030410	KZ-02-24FL_PP96	✓	-	-	-	
01030411	FS-01-20FL_PP65	✓	-	-	-	
01030412	SV-01-20FL_PP64	✓	-	-	-	
01030413	FS-01-21FL_PP67	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030414	SV-01-21FL_PP66	✓	-	-	-	
01030415	FS-01-22FL_PP69	✓	-	-	-	
01030416	SV-01-22FL_PP68	✓	-	-	-	
01030417	FS-01-23FL_PP71	✓	-	-	-	
01030418	SV-01-23FL_PP70	✓	-	-	-	
01030419	FS-01-24FL_PP73	✓	-	-	-	
01030420	SV-01-24FL_PP72	✓	-	-	-	
01030421	DZ-ST1-21FL_PP288	✓	-	-	-	
01030422	DZ-ST2-21FL_PP290	✓	-	-	-	
01030423	DZ-FML-21FL_PP289	✓	-	-	-	
01030424	STZ-ST1-21FL_PP	-	-	-	-	
01030425	STZ-ST2-21FL_PP	-	-	-	-	
01030426	STZ-FML-21FL_PP	-	-	-	-	
01030427	SPZ-ST1-21FL_PP	-	-	-	-	
01030428	SPZ-ST2-21FL_PP	-	-	-	-	
01030429	SPZ-FML-21FL_PP	-	-	-	-	
01040001	IM-IN-25FL	✓	-	-	-	
01040002	IM-OUT-31FL	✓	-	-	-	
01040003	SMOKE-ADD-1-25FL_PP128	-	-	✓	-	
01040004	SMOKE-ADD-2-25FL_PP128	-	-	✓	-	
01040005	SMOKE-ADD-3-25FL_PP127	-	-	✓	-	
01040006	SMOKE-ADD-4-25FL_PP127	-	-	✓	-	
01040007	SMOKE-ADD-5-25FL_PP127	-	-	✓	-	
01040008	SMOKE-ADD-6-25FL_PP132	-	-	✓	-	
01040009	SMOKE-ADD-7-25FL_PP132	-	-	✓	-	
01040010	SMOKE-ADD-8-25FL_PP133	-	-	✓	-	
01040011	SMOKE-ADD-9-25FL_PP133	-	-	✓	-	
01040012	SMOKE-ADD-10-25FL_PP134	-	-	✓	-	
01040013	SMOKE-ADD-11-25FL_PP134	-	-	✓	-	
01040014	SMOKE-ADD-12-25FL_PP135	-	-	✓	-	
01040015	SMOKE-ADD-13-25FL_PP135	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040016	SMOKE-ADD-14-25FL_PP136	-	-	✓	-	
01040017	SMOKE-ADD-15-25FL_PP136	-	-	✓	-	
01040018	SMOKE-ADD-16-25FL_PP137	-	-	✓	-	
01040019	SMOKE-ADD-17-25FL_PP137	-	-	✓	-	
01040020	SMOKE-ADD-18-25FL_PP131	-	-	✓	-	
01040021	SMOKE-ADD-19-25FL_PP131	-	-	✓	-	
01040022	SMOKE-ADD-1-26FL_PP161	-	-	✓	-	
01040023	SMOKE-ADD-2-26FL_PP161	-	-	✓	-	
01040024	SMOKE-ADD-3-26FL_PP160	-	-	✓	-	
01040025	SMOKE-ADD-4-26FL_PP160	-	-	✓	-	
01040026	SMOKE-ADD-5-26FL_PP160	-	-	✓	-	
01040027	SMOKE-ADD-6-26FL_PP165	-	-	✓	-	
01040028	SMOKE-ADD-7-26FL_PP165	-	-	✓	-	
01040029	SMOKE-ADD-8-26FL_PP166	-	-	✓	-	
01040030	SMOKE-ADD-9-26FL_PP166	-	-	✓	-	
01040031	SMOKE-ADD-10-26FL_PP167	-	-	✓	-	
01040032	SMOKE-ADD-11-26FL_PP167	-	-	✓	-	
01040033	SMOKE-ADD-12-26FL_PP168	-	-	✓	-	
01040034	SMOKE-ADD-13-26FL_PP168	-	-	✓	-	
01040035	SMOKE-ADD-14-26FL_PP169	-	-	✓	-	
01040036	SMOKE-ADD-15-26FL_PP169	-	-	✓	-	
01040037	SMOKE-ADD-16-26FL_PP170	✓	-	-	-	
01040038	SMOKE-ADD-17-26FL_PP170	✓	-	-	-	
01040039	SMOKE-ADD-18-26FL_PP164	-	-	✓	-	
01040040	SMOKE-ADD-19-26FL_PP164	-	-	✓	-	
01040041	SMOKE-ADD-1-27FL_PP195	-	-	✓	-	
01040042	SMOKE-ADD-2-27FL_PP195	-	-	✓	-	
01040043	SMOKE-ADD-3-27FL_PP194	-	-	✓	-	
01040044	SMOKE-ADD-4-27FL_PP194	-	-	✓	-	
01040045	SMOKE-ADD-5-27FL_PP194	-	-	✓	-	
01040046	SMOKE-ADD-6-27FL_PP199	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040047	SMOKE-ADD-7-27FL_PP199	-	-	✓	-	
01040048	SMOKE-ADD-8-27FL_PP200	-	-	✓	-	
01040049	SMOKE-ADD-9-27FL_PP200	-	-	✓	-	
01040050	SMOKE-ADD-10-27FL_PP201	-	-	✓	-	
01040051	SMOKE-ADD-11-27FL_PP201	-	-	✓	-	
01040052	SMOKE-ADD-12-27FL_PP202	-	-	✓	-	
01040053	SMOKE-ADD-13-27FL_PP202	-	-	✓	-	
01040054	SMOKE-ADD-14-27FL_PP203	-	-	✓	-	
01040055	SMOKE-ADD-15-27FL_PP203	-	-	✓	-	
01040056	SMOKE-ADD-16-27FL_PP204	-	-	✓	-	
01040057	SMOKE-ADD-17-27FL_PP204	-	-	✓	-	
01040058	SMOKE-ADD-18-27FL_PP198	-	-	✓	-	
01040059	SMOKE-ADD-19-27FL_PP198	-	-	✓	-	
01040060	SMOKE-ADD-1-28FL_PP225	-	-	✓	-	
01040061	SMOKE-ADD-2-28FL_PP225	-	-	✓	-	
01040062	SMOKE-ADD-3-28FL_PP224	-	-	✓	-	
01040063	SMOKE-ADD-4-28FL_PP224	-	-	✓	-	
01040064	SMOKE-ADD-5-28FL_PP224	-	-	-	-	
01040065	SMOKE-ADD-6-28FL_PP229	✓	-	-	-	
01040066	SMOKE-ADD-7-28FL_PP229	✓	-	-	-	
01040067	SMOKE-ADD-8-28FL_PP230	✓	-	-	-	
01040068	SMOKE-ADD-9-28FL_PP230	✓	-	-	-	
01040069	SMOKE-ADD-10-28FL_PP231	-	-	-	-	
01040070	SMOKE-ADD-11-28FL_PP231	-	-	-	-	
01040071	SMOKE-ADD-12-28FL_PP232	-	-	-	-	
01040072	SMOKE-ADD-13-28FL_PP232	-	-	-	-	
01040073	SMOKE-ADD-14-28FL_PP233	-	-	✓	-	
01040074	SMOKE-ADD-15-28FL_PP233	-	-	✓	-	
01040075	SMOKE-ADD-16-28FL_PP234	-	-	✓	-	
01040076	SMOKE-ADD-17-28FL_PP234	-	-	✓	-	
01040077	SMOKE-ADD-18-28FL_PP228	-	-	✓	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040078	SMOKE-ADD-19-28FL_PP228	-	-	✓	-	
01040079	HEAT-ADD-1-M&EFL_PP318	✓	-	-	-	
01040080	HEAT-ADD-2-M&EFL_PP314	✓	-	-	-	
01040081	HEAT-ADD-3-M&EFL_PP316	✓	-	-	-	
01040082	HEAT-ADD-1-RFL_PP342	✓	-	-	-	
01040083	DUCT-SMOKE-ADD-1-M&EFL_PP320	✓	-	-	-	
01040084	DUCT-SMOKE-ADD-2-M&EFL_PP315	✓	-	-	-	
01040085	DUCT-SMOKE-ADD-1-RFL_PP341	✓	-	-	-	
01040086	SMOKE-ADD-1-29FL_PP254	-	-	✓	-	
01040087	SMOKE-ADD-2-29FL_PP254	-	-	✓	-	
01040088	SMOKE-ADD-3-29FL_PP253	-	-	✓	-	
01040089	SMOKE-ADD-4-29FL_PP253	-	-	✓	-	
01040090	SMOKE-ADD-5-29FL_PP253	-	-	✓	-	
01040091	SMOKE-ADD-6-29FL_PP258	-	-	✓	-	
01040092	SMOKE-ADD-7-29FL_PP258	-	-	✓	-	
01040093	SMOKE-ADD-8-29FL_PP259	-	-	✓	-	
01040094	SMOKE-ADD-9-29FL_PP259	-	-	✓	-	
01040095	SMOKE-ADD-10-29FL_PP260	-	-	✓	-	
01040096	SMOKE-ADD-11-29FL_PP260	-	-	✓	-	
01040097	SMOKE-ADD-12-29FL_PP261	-	-	✓	-	
01040098	SMOKE-ADD-13-29FL_PP261	-	-	✓	-	
01040099	SMOKE-ADD-14-29FL_PP262	-	-	✓	-	
01040100	SMOKE-ADD-15-29FL_PP262	-	-	✓	-	
01040101	SMOKE-ADD-16-29FL_PP263	-	-	✓	-	
01040102	SMOKE-ADD-17-29FL_PP263	-	-	✓	-	
01040103	SMOKE-ADD-18-29FL_PP257	✓	-	✓	-	
01040104	SMOKE-ADD-19-29FL_PP257	✓	-	✓	-	
01040126	DZ-01-25FL_PP129	✓	-	-	-	
01040127	STZ-01-25FL_PP	-	-	-	-	
01040128	SPZ-01-25FL_PP	-	-	-	-	
01040129	MZ-01-25FL_PP130	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040130	KZ-01-25FL_PP130	✓	-	-	-	
01040131	MZ-02-25FL_PP130	✓	-	-	-	
01040132	KZ-02-25FL_PP130	✓	-	-	-	
01040133	FS-01-25FL_PP75	✓	-	-	-	
01040134	SV-01-25FL_PP74	✓	-	-	-	
01040135	DZ-01-26FL_PP162	✓	-	-	-	
01040136	STZ-01-26FL_PP	-	-	-	-	
01040137	SPZ-01-26FL_PP	-	-	-	-	
01040138	MZ-01-26FL_PP163	✓	-	-	-	
01040139	KZ-01-26FL_PP163	✓	-	-	-	
01040140	MZ-02-26FL_PP163	✓	-	-	-	
01040141	KZ-02-26FL_PP163	✓	-	-	-	
01040142	FS-01-26FL_PP77	✓	-	-	-	
01040143	SV-01-26FL_PP76	✓	-	-	-	
01040144	DZ-01-27FL_PP196	✓	-	-	-	
01040145	STZ-01-27FL_PP	-	-	-	-	
01040146	SPZ-01-27FL_PP	-	-	-	-	
01040147	MZ-01-27FL_PP197	✓	-	-	-	
01040148	KZ-01-27FL_PP197	✓	-	-	-	
01040149	MZ-02-27FL_PP197	✓	-	-	-	
01040150	KZ-02-27FL_PP197	✓	-	-	-	
01040151	FS-01-27FL_PP79	✓	-	-	-	
01040152	SV-01-27FL_PP78	✓	-	-	-	
01040153	DZ-01-28FL_PP226	✓	-	-	-	
01040154	STZ-01-28FL_PP	-	-	-	-	
01040155	SPZ-01-28FL_PP	-	-	-	-	
01040156	MZ-01-28FL_PP227	✓	-	-	-	
01040157	KZ-01-28FL_PP227	✓	-	-	-	
01040158	MZ-02-28FL_PP227	✓	-	-	-	
01040159	KZ-02-28FL_PP227	✓	-	-	-	
01040160	FS-01-28FL_PP81	✓	-	-	-	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ **Staybridge Bangkok**						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040161	SV-01-28FL_PP80	✓	-	-	-	
01040162	DZ-01-29FL_PP255	✓	-	-	-	
01040163	STZ-01-29FL_PP	-	-	-	-	
01040164	SPZ-01-29FL_PP	-	-	-	-	
01040165	MZ-01-29FL_PP256	✓	-	-	-	
01040166	KZ-01-29FL_PP256	✓	-	-	-	
01040167	MZ-02-29FL_PP256	✓	-	-	-	
01040168	KZ-02-29FL_PP256	✓	-	-	-	
01040169	FS-01-29FL_PP83	✓	-	-	-	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568

โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร B

สรุปผลการทดสอบ

Item	Floor	Descriptions	Remarks
1	FL.B2	Heat AD6 หัวเสีย 1 ตัว พร้อมฐาน ห้อง Fire Pump	อุปกรณ์เสีย
2	FL.B2	IM-IN Module เสีย 1 ตัว SIGA-IM	อุปกรณ์เสีย
3	FL.1	Smoke AD1 หัวเสีย 1 ตัว ห้อง Control รุ่น SIGA-OSD	อุปกรณ์เสีย
4	FL.1	เสนอเปลี่ยน Battery ตู้ FCP ขนาด 12V. 65AH. 2 ก้อน	เสนอเปลี่ยนใหม่
5	FL.1	เสนอเปลี่ยน Battery ตู้ Amp ขนาด 12V. 40AH. 2 ก้อน	เสนอเปลี่ยนใหม่
6	FL.1	เสนอเปลี่ยน Battery ตู้ Power Supply ขนาด 12V. 17AH. 2 ก้อน	เสนอเปลี่ยนใหม่
7	FL.11	ห้อง 1144 ตู้ FCP และ Fire Works โซว์เป็นห้อง 1146 ต้องแก้ไขชื่อใหม่ 01020301 S/N6889 แก้เป็น ห้อง 1144	แก้ไขโปรแกรม

อุปกรณ์เสีย ที่ต้องเสนอราคา ดังนี้

- Module SIGA-IM จำนวน 1 ตัว
- Heat Add จำนวน 1 ตัว พร้อมฐาน
- Smoke Add จำนวน 1 ตัว
- Battery ใหม่ ขนาด 12V. 65AH. จำนวน 2 ก้อน
- Battery ใหม่ ขนาด 12V. 40AH. จำนวน 2 ก้อน
- Battery ใหม่ ขนาด 12V. 17AH. จำนวน 2 ก้อน

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568

โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร B

ก่อนทำ Trouble ที่ตู้มี 17 Point

หลังทำ Trouble ที่ตู้มี 12 Point

Item	Descriptions	Remarks
1	01020001 IM-IN FL.B2 - Com Fault	อุปกรณ์เสีย
2	01020008 Heat Add.6 FL.B2 - Com Fault	อุปกรณ์เสีย
3	01020010 Smoke Add.1 FL.1 - Com Fault	อุปกรณ์เสีย
4	DZ.1 FL.8 Open	สายขาดช่วงต้องเดินสายใหม่
5	01010615 Battery Trouble Disable	Battery FCP เสื่อมสภาพ

*** ทางลูกค้า Disable Relay Lift FL.R เอาไว้ 7 Point**

สำเนาสัญญาการดูแลต้นไม้

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD

วันที่ 6/10/68
ครั้งที่ _____

- [x] ตัดต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น
- [x] ตัดแต่ง
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [x] อื่นๆ ฉีดยาฆ่าหญ้า

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [x] ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 5/11/68
ครั้งที่ _____

- [x] ตัดต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น
- [x] ตัดแต่ง
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [x] เติมดิน พรวนดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [x] อื่นๆ ฉีดยาฆ่าหญ้า

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [ ] ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 9/12/68
ครั้งที่ _____

- [x] ตัดต้นไม้ใหญ่ 4 ต้น
- [x] ตัดแต่ง
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [x] เติมดิน พรวนดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [x] อื่นๆ ฉีดยาฆ่าหญ้า

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [ ] ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 7/1/69
ครั้งที่ _____

- [x] ตัดต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น
- [x] ตัดแต่ง
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [x] เติมดิน พรวนดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [x] อื่นๆ ฉีดยาฆ่าหญ้า

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [ ] ดีมาก

ลายเซ็น

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD

วันที่ 5/2/69
ครั้งที่ _____

- ✓ ตัดต้นไม้ใหญ่ 3ต้น
- ✓ ตัดแต่ง+ตัดหญ้า
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ✓ รดน้ำ
- ✓ เติมดิน
- ✓ เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
✓ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ตัดแต่ง
- ใส่ปุ๋ย
- เก็บขยะ
- รดน้ำ
- เติมดิน
- เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ตัดแต่ง
- ใส่ปุ๋ย
- เก็บขยะ
- รดน้ำ
- เติมดิน
- เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ตัดแต่ง
- ใส่ปุ๋ย
- เก็บขยะ
- รดน้ำ
- เติมดิน
- เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD



วันที่ 6/2/69
ครั้งที่ _____

- [x] ตัดต้นไม้ใหญ่ 3ต้น
- [x] ตัดแต่ง + ตัดหญ้า
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [x] รดน้ำ
- [x] เติมดิน
- [x] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [x] อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [x] ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 10/9/69
ครั้งที่ _____

- [x] ตัดต้นไม้ใหญ่ 1ต้น
- [x] ตัดแต่ง
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [x] รดน้ำพรมดิน
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [x] อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [x] ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 10/9/69
ครั้งที่ _____

- [ ] ตัดต้นไม้ใหญ่
- [x] ตัดแต่ง
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [x] อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [ ] ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

- [ ] ตัดต้นไม้ใหญ่
- [ ] ตัดแต่ง
- [ ] ใส่ปุ๋ย
- [ ] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [ ] อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- [ ] ควรปรับปรุง
- [ ] ปานกลาง
- [ ] ดีมาก

ลายเซ็น

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD

วันที่ 6/2/69
ครั้งที่ _____

- ✓ ตัดต้นไม้ใหญ่ 3ต้น
- ✓ ตัดแต่ง + ตัดหญ้า
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ✓ รดน้ำ
- ✓ เติมดิน
- ✓ เติมต้นไม้
- ○ ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ○ ควรปรับปรุง
- ○ ปานกลาง
- ✓ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 10/9/69
ครั้งที่ _____

- ✓ ตัดต้นไม้ใหญ่ 1ต้น
- ✓ ตัดแต่ง
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ✓ รดน้ำ ผสมดิน
- ○ เติมดิน
- ○ เติมต้นไม้
- ○ ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ○ ควรปรับปรุง
- ○ ปานกลาง
- ✓ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 10/9/69
ครั้งที่ _____

- ○ ตัดต้นไม้ใหญ่
- ✓ ตัดแต่ง
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ○ รดน้ำ
- ○ เติมดิน
- ○ เติมต้นไม้
- ○ ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ○ ควรปรับปรุง
- ○ ปานกลาง
- ○ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 08/05/69
ครั้งที่ _____

- ○ ตัดต้นไม้ใหญ่
- ✓ ตัดแต่ง
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ✓ รดน้ำ ผสมดิน
- ○ เติมดิน
- ○ เติมต้นไม้
- ○ ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ○ ควรปรับปรุง
- ○ ปานกลาง
- ○ ดีมาก

ลายเซ็น

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD

วันที่ 6/2/69
ครั้งที่ _____

- ✓ ตัดต้นไม้ใหญ่ 3ต้น
- ✓ ตัดแต่ง+ตัดหญ้า
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ✓ รดน้ำ
- ✓ เติมดิน
- ✓ เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
✓ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 10/9/69
ครั้งที่ _____

- ✓ ตัดต้นไม้ใหญ่ 1ต้น
- ✓ ตัดแต่ง
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ✓ รดน้ำพรวนดิน
- เติมดิน
- เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
✓ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 10/9/69
ครั้งที่ _____

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ✓ ตัดแต่ง
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- รดน้ำ
- เติมดิน
- เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ 08/05/69
ครั้งที่ _____

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ✓ ตัดแต่ง
- ✓ ใส่ปุ๋ย
- ✓ เก็บขยะ
- ✓ รดน้ำ พรวนดิน
- เติมดิน
- เติมต้นไม้
- ล้างบ่อปลา
- ✓ อื่นๆ ตัดหญ้า/ฉีดยา

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD

วันที่ 11/6/65
ครั้งที่ _____

- [x] ตัดต้นไม้ใหญ่
- [x] ตัดแต่ง
- [x] ใส่ปุ๋ย
- [x] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [ ] อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ควรปรับปรุง
- ปานกลาง
- ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

- [ ] ตัดต้นไม้ใหญ่
- [ ] ตัดแต่ง
- [ ] ใส่ปุ๋ย
- [ ] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [ ] อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ควรปรับปรุง
- ปานกลาง
- ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

- [ ] ตัดต้นไม้ใหญ่
- [ ] ตัดแต่ง
- [ ] ใส่ปุ๋ย
- [ ] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [ ] อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ควรปรับปรุง
- ปานกลาง
- ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

- [ ] ตัดต้นไม้ใหญ่
- [ ] ตัดแต่ง
- [ ] ใส่ปุ๋ย
- [ ] เก็บขยะ
- [ ] รดน้ำ
- [ ] เติมดิน
- [ ] เติมต้นไม้
- [ ] ล้างบ่อปลา
- [ ] อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
- ควรปรับปรุง
- ปานกลาง
- ดีมาก

ลายเซ็น

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการขนย้ายมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900006228
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานเขต คลองเตย โทร 0 2240 2121, 0 2249 9705
ที่อยู่สำนักงานเขต 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท24 จำกัด สาขา1
ที่อยู่ เลขที่ 89/9 อาคารบริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 จำกัด ซอยสุขุมวิท 24
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน72,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	36,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	36,000
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	72,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	6,000	เม.ย.	6,000
พ.ย.	6,000	พ.ค.	6,000
ธ.ค.	6,000	มิ.ย.	6,000
ม.ค.	6,000	ก.ค.	6,000
ก.พ.	6,000	ส.ค.	6,000
มี.ค.	6,000	ก.ย.	6,000

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 10000147
ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาเอ็มควอเทียร์

นาย ปัญญา สิงห์สุวรรณ
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:43 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

สำเนารับรองการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

สำเนาบันทึก พีเอช และคลอรีน สระว่ายน้ำ Check List Swimming Pool

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน





ttb

โอนเงินสำเร็จ

24 ก.พ. 69, 13:46 น.


17,460.00

ค่าธรรมเนียม 0.00

นาย สิชล ศรีวิลัย
XXX-X-XX423-5
ttb

นาย อุดร บุตรา
XXX-X-XX119-7
SCB

รหัสอ้างอิง: 202602241302425412

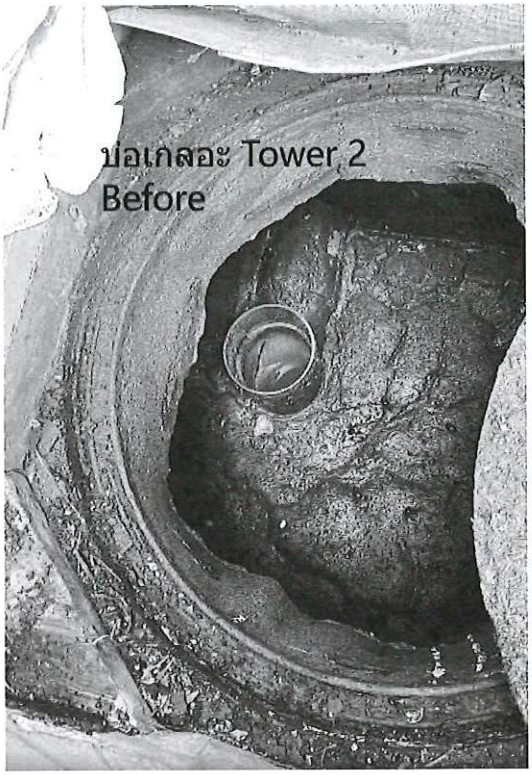



โอนเงินสำเร็จ
19 พ.ค. 69 11:51 น.

K+

นาย ธนวัฒน์ ว
ธ.กสิกรไทย
xxx-x-x6996-x

↓

Prompt Pay
นายอุดร บุตรา
รหัสพร้อมเพย์
xxx-xxx-9398

เลขที่รายการ:
016139115158CPP06512

จำนวน:
17,460.00 บาท

ค่าธรรมเนียม:
0.00 บาท

สแกนตรวจสอบสลิป

บันทึกช่วยจำ: ค่าสูบบ่อบำบัดSBS

สำเนาเอกสารการใช้น้ำ การล้างถังน้ำใช้ และการตรวจสอบระบบท่อน้ำประปา

BRIDGE
ITES
G HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

TOWER 2

เลขที่มิเตอร์ 66455106

เดือน/ปี มกราคม 2569

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	73767	۲5	khomchan		
2	9.00	73861	94			
3	9.00	73994	133	khomchan		
4	9.00	74064	70			
5	9.00	74168	104			
6	9.00	74224	۲0	khomchan		
7	9.00	74346	9۲	khomchan		
8	9.00	74499	153	khomchan		
9	9.00	74612	113			
10	9.00	74717	105			
11	9.00	74823	106			
12	9.00	74924	101			
13	9.00	74997	73			
14	9.00	75075	78			
15	9.00	75158	۲3			
16	9.00	75245	۲7	khomchan		
17	9.00	75324	79	khomchan		
18	9.00	75413	89			
19	9.00	75517	104			
20	9.00	75599	77			
21	9.00	75672	7۲	khomchan		
22	9.00	75759	87			
23	9.00	75832	۲3			
24	9.00	75969	137			
25	9.00	76073	101			
26	9.00	76206	133			
27	9.00	76296	90			
28	9.00	76379	83			
29	9.00	76482	103			
30	10.00	76564	82			
31	9.00	76637	73			
1	9.00					

- เดือนปัจจุบัน
- เดือนที่ผ่านมา

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

TOWER 2 เลขที่มิเตอร์ 66455106 เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2569

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	76757	120			
2	9.00	76857	100			
3	9.00	76969	128			
4	9.00	77097	127			
5	9.00	77214	59.			
6	9.00	77283	117			
7	9.00	77400	117			
8	9.00	77526	126			
9	9.00	77610	84			
10	9.00	77701	100			
11	9.00	77778	77			
12	9.00	77865	87			
13	9.00	77945	78	khomchan		
14	9.00	78027	84	khomchan		
15	9.00	78164	137			
16	9.00	78301	137			
17	9.00	78414	113			
18	9.00	78483	69			
19	9.00	78609	126			
20	9.00	78695	86.			
21	9.00	78793	98.			
22	9.00	78918	125.			
23	9.00	79042	124			
24	9.00	79160	118			
25	9.00	79280	120			
26	9.00	79405	120	khomchan		
27	9.00	79526	121	khomchan		
28	9.00	79655	129			
1	9.00	79727	72.			

	◉ เดือนปัจจุบัน
	◉ เดือนที่ผ่านมา

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

TOWER 2 เลขที่มิเตอร์ 66455106 เดือน/ปี มีนาคม 2569

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	79727	109			
2	9.00	79831	100			
3	9.00	79906	116			
4	9.00	80054	118			
5	9.00	80175	121	khomchan		
6	9.00	80240	65	khomchan		
7	9.00	80333	93			
8	9.00	80416	83			
9	9.00	80511	95			
10	9.00	80590	79			
11	9.00	80667	77			
12	9.00	80750	83			
13	9.00	80833	83	khomchan		
14	9.00	80975	142			
15	9.00	81094	119			
16	9.00	81164	70			
17	9.00	81258	94			
18	9.00	81333	75			
19	9.00	81420	87			
20	9.00	81509	89			
21	9.00	81634	125			
22	9.00	81709	75			
23	9.00	81833	124			
24	9.00	81895	62			
25	9.00	81976	81			
26	9.00	82062	86			
27	9.00	82151	89			
28	9.00	82258	107			
29	9.00	82395	137			
30	10.00	82526	131			
31	9.00	82545	49			
1	9.00	82661	* 116			

	◉ เดือนปัจจุบัน
	◉ เดือนที่ผ่านมา

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

TOWER 2

เลขที่มิเตอร์ 66455106 เดือน/ปี เมษายน 2569

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	82691	123	[illegible]	[illegible]	
2	9.00	82814	116.	khomchan	[illegible]	
3	9.00	82930	113	[illegible]	[illegible]	
4	9.00	83043	122	[illegible]	[illegible]	
5	9.00	83165	122	[illegible]	[illegible]	
6	9.00	83287	120	[illegible]	[illegible]	
7	9.00	83407	118.	[illegible]	[illegible]	
8	9.00	83525	125	[illegible]	[illegible]	
9	9.00	83650	117	[illegible]	[illegible]	
10	9.00	83767	111	[illegible]	[illegible]	
11	9.00	83878	90	[illegible]	[illegible]	
12	9.00	83968	89	[illegible]	[illegible]	
13	9.00	84057	98	[illegible]	[illegible]	
14	9.00	84155	135	[illegible]	[illegible]	
15	9.00	84290	65	[illegible]	[illegible]	
16	9.00	84355	80.	[illegible]	[illegible]	
17	9.00	84435	80	[illegible]	[illegible]	
18	9.00	84495	60	[illegible]	[illegible]	
19	9.00	84554	86	[illegible]	[illegible]	
20	9.00	84640	100	[illegible]	[illegible]	
21	9.00	84740	106	[illegible]	null	
22	9.00	84846	60	[illegible]	null	
23	9.00	84906	57.	[illegible]	null	
24	9.00	84963.	57	[illegible]	null	
25	9.00	85077	114	[illegible]	null	
26	9.00	85164	107	[illegible]	null	
27	9.00	85267	83	[illegible]	null	
28	9.00	85352	83.	[illegible]	null	
29	9.00	85440.	83	[illegible]	null	
30	9.00	85518	78	[illegible]	null	
1	9.00	85608	90	[illegible]	null	

◉ เดือนปัจจุบัน

◉ เดือนที่ผ่านมา

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

TOWER 2

เลขที่มิเตอร์ 66455106 เดือน/ปี พฤษภาคม 2569

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	85609	90	[illegible]	[illegible]	
2	9.00	85703	95	[illegible]	[illegible]	
3	9.00	85787	84	[illegible]	[illegible]	
4	9.00	85898	111	khonchan	[illegible]	
5	9.00	86987	89	[illegible]	[illegible]	
6	9.00	86114	127	[illegible]	[illegible]	
7	9.00	86202	88	[illegible]	[illegible]	
8	9.00	86279	77	[illegible]	[illegible]	
9	9.00	86368	89	[illegible]	[illegible]	
10	9.00	86461	93	[illegible]	[illegible]	
11	9.00	86563	102	[illegible]	[illegible]	
12	9.00	86653	90	[illegible]	[illegible]	
13	9.00	86726	73	[illegible]	[illegible]	
14	9.00	86801	75	[illegible]	[illegible]	
15	9.00	86884	83	[illegible]	[illegible]	
16	9.00	86980	96	[illegible]	[illegible]	
17	9.00	87075	95	[illegible]	[illegible]	
18	9.00	87168	93	[illegible]	[illegible]	
19	9.00	87260	92	[illegible]	[illegible]	
20	9.00	87350	86	[illegible]	[illegible]	
21	9.00	87432	82	[illegible]	[illegible]	
22	9.00	87520	88	[illegible]	[illegible]	
23	9.00	87602	82	[illegible]	[illegible]	
24	9.00	87693	91	[illegible]	[illegible]	
25	9.00	87794	101	[illegible]	[illegible]	
26	9.00	87877	83	[illegible]	[illegible]	
27	9.00	87957	80	khonchan	[illegible]	
28	9.00	88040	83	[illegible]	[illegible]	
29	9.00	88126	86	[illegible]	[illegible]	
30	10.00	88226	119	[illegible]	[illegible]	
31	9.00	88400	122	khonchan	[illegible]	
1	9.00					

- ◉ เดือนปัจจุบัน
- ◉ เดือนที่ผ่านมา

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK SUKHUMVIT

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

TOWER 2

เลขที่มิเตอร์ 66455106

เดือน/ปี มิถุนายน 2569

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	88530	130	khomchan	[illegible]	
2	9.00	88663	133	[illegible]	[illegible]	
3	9.00	88763	100	Sarayut	[illegible]	
4	9.00	88858	95	[illegible]	[illegible]	
5	9.00	88956	98	[illegible]	[illegible]	
6	9.00	89049	93.	[illegible]	[illegible]	
7	9.00	89108	59.	[illegible]	[illegible]	
8	9.00	89209	101	[illegible]	[illegible]	
9	9.00	89313	104	[illegible]	[illegible]	
10	9.00	89418	105	[illegible]	[illegible]	
11	9.00	89518	100	Chaiwat.	[illegible]	
12	9.00	89591	73.	[illegible]	[illegible]	
13	9.00	89727	136.	[illegible]	[illegible]	
14	9.00	89856	129	[illegible]	[illegible]	
15	9.00	89985	129	[illegible]	[illegible]	
16	9.00	90093	108	[illegible]	[illegible]	
17	9.00	90190	97	[illegible]	[illegible]	
18	9.00	90269	79	[illegible]	[illegible]	
19	9.00	90357	88.	[illegible]	[illegible]	
20	9.00	90453	96	[illegible]	[illegible]	
21	9.00	90533	80	[illegible]	[illegible]	
22	9.00	90668	135	[illegible]	[illegible]	
23	9.00	90791	123	Chaiwat.	[illegible]	
24	9.00	90903	112	[illegible]	[illegible]	
25	9.00	91017	114	Chaiwat.	[illegible]	
26	9.00	91128	111	Sarayut	[illegible]	
27	9.00	91238	110	khomchan	[illegible]	
28	9.00	91349	111	[illegible]	[illegible]	
29	9.00	91473	124	[illegible]	[illegible]	
30	10.00	91590	117	[illegible]	[illegible]	
1	9.00					

◉ เดือนปัจจุบัน

◉ เดือนที่ผ่านมา

ภาคผนวกที่ 6

สำเนามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
