รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
เจ้าของ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



จัดทำโดย

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

เจ้าของ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

จัดทำโดย

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

20 กรกฎาคม 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567
( ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567
( ) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางกฤติกา ปัจฉิม	กฤติกา ปัจฉิม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวผกาพรรณ วิศาล	ผกาพรรณ วิศาล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชนันญา อาจมังกร	Chanunya	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายอุกฤษ ปัจฉิม)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

1. ชื่อโครงการ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
   ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : โรมแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท
   : โรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล
2. สถานที่ตั้ง : 155 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
   โทรศัพท์ 075 628 044 โทรสาร 075 628 041
   E-mail : -
5. จัดทำโดย : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 27 กรกฎาคม 2544
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ
   - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : บริการชุมชนและที่พักอาศัย (โรงแรม)
   - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง : 68 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (110,164 ตารางเมตร)
   - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

   * การบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละอาคารหลังจากผ่านระบบบำบัดขั้นต้นโดยถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) น้ำที่ล้นจะถูกรวบรวมผ่านท่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบแยกกับท่อระบายน้ำฝน มีบ่อตรวจระบายทุกระยะไม่เกิน 20 เมตร น้ำเสียจะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบตะกอนเร่งแบบ Extended Activated Sludge Process

   * อาชีวอนามัย : โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย สอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA (National Fire Protection Association) และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) โครงการมีการอบรมการใช้อุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ และยามของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   * การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : การรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในโรงแรม ได้แก่ อาคารต่างๆ ห้องพัก ห้องครัวและห้องอาหาร สำนักงานและร้านค้าภายในโรงแรม พนักงานทำความสะอาดจะขนย้ายถุงบรรจุขยะจากจุดรับขยะต่างๆ มายังห้องพักขยะมูลฝอยของโรงแรมโดยใช้รถเข็น จากนั้นพนักงานจะทำการแยกขยะมูลฝอยตามประเภทต่างๆ การจัดเก็บขยะมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอยสามารถเก็บพักขยะได้ 3 วัน ประกอบด้วยพักขยะมูลฝอยเปียกและห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5 x 4.0 เมตร จำนวน 2 ห้อง ทั้งนี้ภายในห้องพักขยะมูลฝอยเปียกจะมี

การปรับอากาศให้มีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส เพื่อลดการย่อยสลายของขยะ ในพื้นที่โครงการมีการติดตั้งถังขยะขนาด 200 ลิตร ตามแหล่งกำเนิดต่างๆ จำนวนประมาณ 26-30 ใบ การกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลกระบี่ โดยอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ซึ่งยังไม่มีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการจะดำเนินการโดยการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากบริเวณต่างๆ ของโรงแรมทุกวันเพื่อนำมาเก็บพักยังห้องพักขยะมูลฝอย ซึ่งจะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นโครงการจะนำรถเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัดยังพื้นที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ 1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ 1-2
1.3 ข้อจำกัดด้านการออกแบบอาคาร 1-2
1.4 องค์ประกอบของโครงการ 1-3
1.5 ระบบสาธารณูปโภค 1-7

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1
3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3-3

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-2

ภาคผนวก

ก ผลพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ค ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล
จ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด
ฉ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
ช ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
ซ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม
ฌ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ IR
ญ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
ฏ ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย
ฏ ใบเสร็จรับเงินค่าสูบตะกอน

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล 3-3

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินคลองปากเปลว 3-4

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 3-5

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ย้อนหลัง 3-8

ตารางที่ 3.6 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 3-15

ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ 3-17

ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-18

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

สารบัญรูป

บทที่ 1 บทนำ

รูปที่ 1.1 แผนผังโครงการ 1-2
รูปที่ 1.2 สภาพภายในโครงการ 1-3
รูปที่ 1.3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ 1-7
รูปที่ 1.4 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย 1-9
รูปที่ 1.5 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1-9
รูปที่ 1.6 ระบบการจัดการมูลฝอย 1-10
รูปที่ 1.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 1-12
รูปที่ 1.8 ระบบความปลอดภัย 1-14
รูปที่ 1.9 ระบบจราจร / จอดรถ 1-14

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.1 ค่าบีโอดีน้ำทิ้งผ่านการบำบัด 3-7
รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี 3-11
รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าบีโอดี ย้อนหลัง 3 ปี 3-11
รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอย ย้อนหลัง 3 ปี 3-12
รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าของแข็งละลาย ย้อนหลัง 3 ปี 3-12
รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี 3-13
รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน ย้อนหลัง 3 ปี 3-13
รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี 3-14
รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ย้อนหลัง 3 ปี 3-14
รูปที่ 3.10 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 3-16

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

บทที่ 1
บทนำ

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
เจ้าของ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

1.1 บทนำ
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน


โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด เป็นโครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ขนาดพื้นที่ 68 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (110,164 ตารางเมตร) จำนวนห้องพัก 240 ห้อง ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เขตควบคุมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2540 และต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/10117 ลงวันที่ 10 กันยายน 2544

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เจ้าของโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาให้ความเป็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
เจ้าของโครงการ	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ชื่อโครงการเดิม	โรมแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท
เจ้าของโครงการเดิม	บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ประเภทโครงการ	บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ขนาดพื้นที่โครงการ	68 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (110,164 ตารางเมตร)
อาณาเขต	ทิศเหนือ เป็นเนินเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 20 เมตรและทางสาธารณะหมู่บ้านสาย บ้านคลองม่วง – บ้านทับแขก
	ทิศใต้ ติดกับชายหาดบ้านคลองม่วง
	ทิศตะวันออก ติดที่ดินส่วนบุคคล และลำห้วยธรรมชาติ
	ทิศตะวันตก ติดลำห้วยธรรมชาติ

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/10117 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

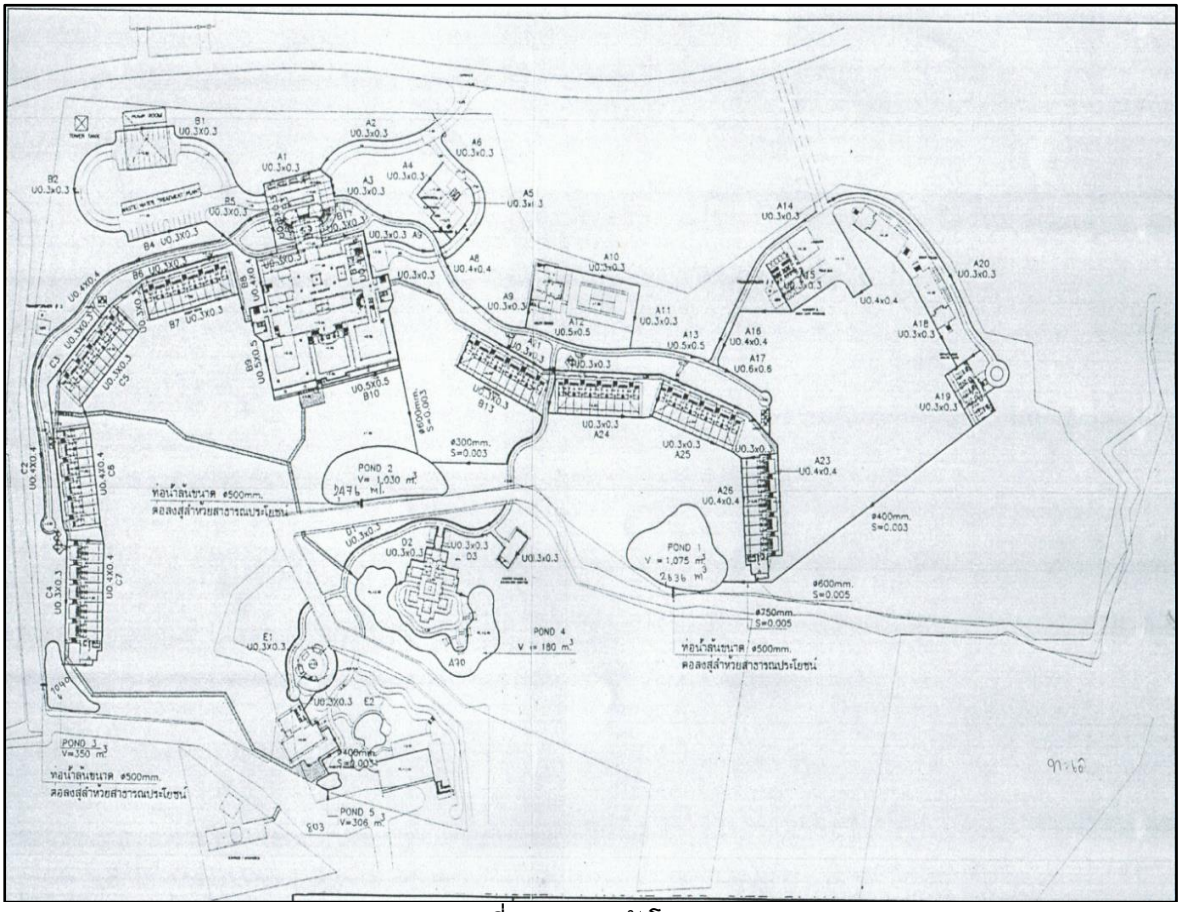

รูปที่ 1.1 แผนผังโครงการ

1.3 ข้อจำกัดด้านการออกแบบอาคาร

ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2540 กำหนดพื้นที่ห้ามทำการก่อสร้างอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โรงฆ่าสัตว์ และสุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน ตามประกาศข้อที่ 2 และข้อกำหนดการก่อสร้างอาคารเกี่ยวกับความสูง และสิ่งปกคลุมพื้นที่ ตามแนวชายฝั่งทะเลออกเป็น 4 บริเวณตามประกาศข้อที่ 3 พื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในแนวเขตพื้นที่บริเวณที่ 2 ซึ่งห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร และต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ลักษณะโครงการเป็นสถานที่พักตากอากาศ จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศข้อที่ 1 และอาคารต่างๆ มีขนาดความสูงไม่เกิน 12 เมตร

นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับตำบลหนองทะเล เนื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539 กำหนดบริเวณพื้นที่ออกเป็น4 พื้นที่ ตามข้อบังคับข้อที่ 3 และการห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท ตามข้อบังคับข้อที่ 4 ซึ่งโครงการซึ่งเป็นการก่อสร้างสถานที่พักตากอากาศซึ่งมิได้เข้าข่ายข้อบังคับการห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท และโครงสร้างอาคารก็มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร



รูปที่ 1.2 สภาพภายในโครงการ

1.4 องค์ประกอบของโครงการ

1. อาคารต้อนรับ (Main Building)

อาคารต้อนรับ จะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบลหนองทะเล ซึ่งสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร การออกแบบอาคารจะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 5,010 ตารางเมตร รูปทรงอาคารเป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์พื้นถิ่นในแต่ละชั้นจะมีพื้นที่ใช้สอยดังนี้

1.1 ชั้นบน (Main Building Upper Ground Floor) ใช้เป็นส่วนต้อนรับแขกที่มาพักมีพื้นที่ใช้สอย รวม 2,446 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ

- พื้นที่ต้อนรับ (Lobby) มีพื้นที่ 256 ตารางเมตร
- สำนักงานติดต่อห้องพัก (Office) มีพื้นที่ประมาณ 131 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับวางสัมภาระกระเป๋าเดินทาง (Luggage) ประมาณ 24 ตารางเมตร และพื้นที่ศูนย์

ธุรกิจ (Business Center) ขนาดพื้นที่ 48 ตารางเมตร พื้นที่ทั้งหมด 203 ตารางเมตร

- ร้านค้า (Shop) มีพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 2 ร้านค้า รวมพื้นที่ 80 ตารางเมตร
- ร้านอาหาร (Casual Restaurant) มีขนาดพื้นที่ 225 ตารางเมตร และที่พักแขกในช่วงกลางวัน (Lounge) มีพื้นที่ 196 ตารางเมตร มีโต๊ะอาหารประมาณ 16 โต๊ะ
- ห้องน้ำห้องส้วมแยกหญิงและชาย มีขนาดพื้นที่ 64 ตารางเมตร มีห้องส้วม 8 ห้อง
- ที่ว่างทางสัญจร (Circulation) มีพื้นที่ประมาณ 1,422 ตารางเมตร

1.2 ชั้นล่าง (Main Building Lower Ground Floor) ใช้เป็นที่ทำงานที่ให้บริการต่างๆ มีพื้นที่รวม 2,564 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- สำนักงานบริหาร (Admin office) มีพื้นที่ประมาณ 525 ตารางเมตร
- ครัว (Main Kitchen) มีพื้นที่ 140 ตารางเมตร
- ร้านอาหาร (Casual Restaurant) ขนาด 400 ตารางเมตร มีโต๊ะอาหาร 33 โต๊ะ
- ห้องทานอาหารพนักงานขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร
- ห้องประชุม (Meeting Room) มีพื้นที่ 190 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องย่อย 2 ห้อง
- ห้องเก็บของ (Storage Room) ใช้เก็บของทั่วไป มีพื้นที่ 130 ตารางเมตร
- ห้องแม่บ้าน (House Keeping) มีพื้นที่ 130 ตารางเมตร
- ห้องน้ำพนักงานและห้องแต่งตัว (Changing Room) ทีพื้นที่ 42 ตารางเมตร
- ห้องครัว (Commisary Ktichen) มีพื้นที่ 254 ตารางเมตร
- ห้องฝึกอบรม (Training Room) มีพื้นที่ 24 ตารางเมตร
- ห้องพยาบาล (Nurse Station) มีพื้นที่ 14 ตารางเมตร
- ห้องฝ่ายบุคคล มีพื้นที่ 55 ตารางเมตร
- ห้องยามรักษาความปลอดภัย มีพื้นที่ 40 ตารางเมตร
- บริเวณรับของ (Receiving Area) มีพื้นที่ 58 ตารางเมตร
- บริเวณทางเข้าพนักงาน (Staff Entrance) มีพื้นที่ 24 ตารางเมตร
- โถงทางเดินและบันได มีพื้นที่ 701 ตารางเมตร

2. กลุ่มอาคารบริการเริงรมย์เป็นอาคารชั้นเดียว

พื้นที่อาคารจะอยู่บริเวณที่ 2 ของบังคับตำบล ซึ่งสามารถก่อสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร การออกแบบจึงเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้น ประกอบด้วยอาคารร้านอาหาร และ Pub & Bar มีโต๊ะรับประทานอาหาร 65 - 70 โต๊ะ และเคาท์เตอร์บาร์ 20 – 25 ที่นั่ง ดังนี้

- ร้านอาหาร (Pasta and Prawns Restaurant) อาคารชั้นเดียวทรงไทยพื้นถิ่น ขนาดพื้นที่ 243 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนทำอาหาร (Kitchen) มีพื้นที่ 68 ตารางเมตร ห้องเก็บของ ขนาด 7 ตารางเมตร ที่รับประทาน

อาหาร (Indoor Dinning Area) ขนาด 135 ตารางเมตร และห้องส้วมจำนวน 5 ห้อง มีพื้นที่รวม 18 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับทานอาหารนอกตัวอาคารมีขนาดพื้นที่ 188 ตารางเมตร

- ร้านอาหารเครื่องดื่ม (Fun Pub and Bar) เป็นอาคารชั้นเดียวทรงกลมรูปโดมมีพื้นที่ 154 ตารางเมตร และพื้นที่นอกอาคารซึ่งจัดให้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารเย็นระหว่างตัวอาคารมีขนาดพื้นที่ 113 ตารางเมตร

3. กลุ่มอาคารการศึกษาสำหรับเด็ก (Indoor Games and Education Center)

กลุ่มอาคารนี้อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 2 และ บริเวณที่ 3 ของข้อบังคับตำบล เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยพื้นถิ่นยกพื้น ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่อเนกประสงค์มีพื้นที่ 78 ตารงเมตร มีห้องน้ำขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร

4. กลุ่มอาคารสุขภาพและความงาม (Health and Spa)

- อาคารหลัก 1 หลัง เป็นส่วนต้อนรับแขกที่ใช้บริการ มีพื้นที่ ดังนี้

1. ห้องเสริมสวย (Beauty salon) มีขนาดพื้นที่ 7.5 ตารางเมตร
2. ห้องเจ้าหน้าที่ (Staff Room) มีขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร
3. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอบซาวน์น่าแยกหญิงและชาย (Changing room) ขนาด28 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
4. ห้องอบนวด (Treatment Room) ขนาด 20 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องขนาด 16 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
5. พื้นที่นั่งคอย (Sitting Area) ขนาดพื้นที่ 75 ตารางเมตร
6. ห้องเก็บของ (Storage Room) มีพื้นที่ 3.5 ตารางเมตร

- อาคารนวด (Treatment Building) ขนาดเล็ก 5 อาคาร มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน แต่ละอาคารมีพื้นที่ประมาณ 9 ตารางเมตร
- อาคารอาบน้ำวน (Jacuzzi Building) ขนาด 9 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร

5. กลุ่มอาคารห้องพัก (Typical Guestroom Block)

กลุ่มอาคารห้องพักจะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล เป็นอาคารสูงขนาด 3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร ประกอบด้วยอาคารที่มีห้องพักขนาดมาตรฐาน 4 เมตร x 10.2 เมตร แต่ละชั้นมีห้องพัก 11 ห้อง จำนวน 6 อาคาร และอาคารที่มีห้องพักสูทและห้องมาตรฐาน ขนาด 8 เมตร x 10.2 เมตร แต่ละชั้นมีห้องพัก 10 ห้อง จำนวน 2 อาคาร รวมมีห้องพักทั้งหมดประมาณ 246 ห้อง แต่ละอาคารจะมีทางเดินเชื่อมติดต่อถึงกัน

6. อาคารพนักงาน (Staff Housing)

อาคารพักพนักงานจะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล ประกอบด้วยอาคารพักพนักงานทั่วไปและอาคารพักพนักงานบริหาร เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น พังนี้

- อาคารพักพนักงานทั่วไป แยกหญิงและชาย เป็นอาคาร 3 ชั้น 2 อาคาร ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นห้องพักรวม ขนาดห้องละประมาณ 3 เมตร x 4 เมตร จำนวน 14

ห้อง แต่ละห้องจะมีเตียงนอน 2 ชั้น 1 เตียง ให้พนักงานพักอยู่ได้ 2 คน และมีห้องน้ำรวมขนาด 6 เมตร x 4 เมตร สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่พักอาศัยอยู่ได้ประมาณ 112 คน สำหรับชั้นล่างจัดเป็นห้องดูทีวีรวม (TV Room) ขนาดพื้นที่ 52 ตารางเมตร พื้นที่อเนกประสงค์พื้นที่ 171 ตารางเมตร พื้นที่ทานอาหาร (Staff dinning) พื้นที่ 165 ตารางเมตร และห้องครัว (Kitchen & Service line) ขนาด 60 ตารางเมตร

- อาคารพักพนักงานบริหาร เป็นอาคาร 2 ชั้น 1 อาคาร มีห้องพักขนาด 8.2 เมตร x 10 เมตร จำนวน 5 ห้อง ในห้องพักจะมีบริเวณห้องนอน ส่วนรับประทานอาหารรับแขก และห้องน้ำในแต่ละห้อง

7. อาคารศูนย์ออกกำลังกาย (Tennis court and Exercise room)

จะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล เป็นอาคารชั้นเดียวประกอบด้วยห้องกายบริหาร (Aerobic room) ขนาด 96 ตารางเมตร แยกเป็นหญิง และชาย จำนวน 2 ห้อง มีห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแยกหญิงและชาย ขนาด 30 ตารางเมตร และมีสนามเทนนิส 1 สนาม ขนาด 19 เมตร x 34 เมตร

8. อาคารวิศวกรรม (Engineering)

อาคารวิศวกรรมจะอยู่ในบริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล เป็นอาคารชั้นเดียวประกอบด้วยพื้นที่ห้องเครื่องกลและไฟฟ้า (M & E Plant) ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร ห้องซ่อมบำรุง (Workshop) ขนาด 60 ตารางเมตร ห้องเก็บอุปกรณ์ (Storage room) ขนาด 40 ตารางเมตร และห้องควบคุม (Control room) มีพื้นที่ 20 ตารางเมตร

9. อาคารอื่นๆ

อาคารอื่นๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ของข้อบังคับตำบล มีอาคารต่างๆ ดังนี้

- อาคารเก็บรถ (Golf cart storage charger) เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม 60 ตารางเมตร เก็บรถ Golf cart ได้ 6 คัน และเก็บอุปกรณ์ตัดหญ้า(Gardening) มีขนาดพื้นที่ 24 ตารางเมตร
- บริเวณบำรุงดูแลดอกไม้ (Nursery) มีพื้นที่ ประมาณ 100 ตารางเมตร
- อาคารเก็บเรือและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม 72 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอย คือ พื้นที่เรียนฝึกดำน้ำ (Dive School) มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ห้องทำงาน 10 ตารางเมตร ห้องเก็บของ 14 ตารางเมตร และห้องน้ำ 2 ห้อง พื้นที่ 6 ตารางเมตร และที่เก็บวินเซิร์บ (Windsurf racks) ขนาด ตารางเมตร เก็บวินเซิร์บได้ 6 ลำ
- อาคารหอถังสูง เป็นอาคารหอถังเก็บน้ำสูงประมาณ 12 เมตร มีพื้นที่ขนาด 36 ตารางเมตร
- อาคารห้องเครื่องปั๊มน้ำ เป็นอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่รวม 120 ตารางเมตร

1.5 ระบบสาธารณูปโภค

1.5.1 ระบบน้ำใช้

ในช่วงเปิดดำเนินการจะมีกิจกรรมการใช้น้ำของบรรดาผู้มาพัก ผู้ใช้บริการ ตลอดจนพนักงานของทางโรงแรม ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำใช้ของโครงการจะใช้น้ำจากการซื้อน้ำเอกชนและนำมาผลิตเป็นน้ำใช้ในโครงการ วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ จะมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การตกตะกอนขั้นต้น เพื่อกำจัดตะกอนขนาดใหญ่ออกจากน้ำ ต่อจากนั้นจะผสมคลอรีนเพื่อทำปฏิกิริยากับเหล็กที่ละลายอยู่ในน้ำ กลายเป็นตะกอนสนิมเหล็ก จากนั้นน้ำที่ผ่านการตกตะกอนเหล็กจะผ่านเข้าถัง Softener เพื่อกำจัดความกระด้าง ผ่านการกรองทรายเพื่อกำจัดตะกอนละเอียด กำจัดกลิ่นโดยการกรองผ่านผงคาร์บอนและฆ่าเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนจากนั้นจึงนำน้ำที่ผลิตเข้าไปเก็บในถังเก็บน้ำขนาดความจุ 160.50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง รวมความจุ 321.10 ลูกบาศก์เมตร

ระบบทำน้ำร้อนสำหรับห้องพักจะใช้ระบบทำน้ำร้อนส่วนกลาง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำน้ำให้ร้อน น้ำร้อนที่ได้จะมีถังเก็บน้ำร้อน และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน เพื่อช่วยลดพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้ในการผลิตน้ำร้อน อัตราการใช้น้ำร้อนของแขกที่มาพักประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน ส่วนน้ำร้อนที่ใช้สำหรับการซักผ้า (Laundry) จะใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากไอน้ำโดยใช้ระบบขนาดเล็กเพียงพอกับงานซักผ้าเท่านั้น ซึ่งอัตราการใช้น้ำร้อนสำหรับการซักผ้าประมาณ 30ลิตร/คน/วัน

การจ่ายน้ำทางโครงการจะสูบน้ำขึ้นถังสูงขนาดความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร และส่งไปตามเส้นท่อโดยระบบแรงโน้มถ่วงไปยังอาคารต่างๆ ส่วนระบบจ่ายน้ำร้อนจะสูบจ่ายไปตามแนวเส้นท่อ



รูปที่ 1.3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

1.5.2 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล


ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละอาคารหลังจากผ่านระบบบำบัดขั้นต้นโดยถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) น้ำที่ล้นจะถูกรวบรวมผ่านท่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบแยกกับท่อระบายน้ำฝน มีบ่อตรวจระบายทุกระยะไม่เกิน 20 เมตร น้ำเสียจะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งมีบ่อสูบน้ำเสียจำนวน 6 แห่ง

น้ำเสียจะผ่านการบำบัดขั้นต้นโดยถังบำบัดสำเร็จรูปซึ่งใช้ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) จะทำหน้าที่ดักเอาขยะที่มากับน้ำเสียออกและบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นโดยแบคทีเรียประเภทไม่ใช้อากาศที่เกาะอยู่บนตัวกลาง (Media) บริเวณห้องครัวจะมีบ่อดักไขมัน (Grease Trap) เพื่อดักไขมัน

ออกจากน้ำเสีย หลังจากนั้นน้ำเสียจะถูกรวบรวมไปยังบ่อสูบส่ง (Sewage Sump) สูบส่งน้ำเสียทั้งหมดไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Central Wastewater Treatment Plant) เป็นระบบตะกอนเร่งแบบ Extended Activated Sludge Process

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะประกอบด้วย

- ถังตะกอนขั้นต้น (Pre-sedimentation tank) จะทำหน้าที่ดักเศษตะกอนขนาดใหญ่ หรือขยะไม่ให้ไปสู่ระบบเพื่อป้องกันการอุดตัน โดยถังนี้มีขนาดความจุ 42 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 250^{L} x 4.20^{D}) ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
- ถังปรับสมดุล (Equalizing tank) ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน และกวนน้ำเสียภายในถังให้มีสภาพเป็นเนื้อเดียวกัน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียเพื่อสูบน้ำเสียเข้าไปยังถังเติมอากาศ ถังนี้มีขนาดความจุ 78.72 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 4.80^{L} x 4.10^{D}) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
- ถังเติมอากาศ (Aeration tank) เป็นถังเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ เพื่อใช้ย่อยสลายความสกปรกในน้ำเสียออกไป มีความจุ 240 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 15.00^{L} x 4.00^{D}) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่น้อยกว่า 19 ชั่วโมง
- ถังตกตะกอน (Sedimentation tank) มีขนาดพื้นที่ผิว 32 ตารางเมตร และความยาวรางน้ำล้น 4 เมตร ขนาดความจุ 91.20 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 6.00^{L} x 3.80^{D}) จะแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำ ตะกอนจุลินทรีย์จะมีการหมุนเวียนตะกอนนำกลับไปในถังเติมอากาศด้วยอัตรา 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน และอัตราการสูบตะกอนส่วนเกินประมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไปที่ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน
- ถังเก็บตะกอน (Sludge tank) จะมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 5.00^{L} x 4.00^{D}) มีระยะเวลาเก็บกักตะกอน 45 วัน เมื่อตะกอนเต็มทางโครงการจะให้ทางเทศบาลเมืองกระบี่มาสูบและนำไปกำจัดต่อไป
- ถังเติมคลอรีน (Chlorination tank) น้ำทิ้งจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยมีระยะเวลาสัมผัสนาน 30 นาที มีขนาดความจุ 28.80 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 2.00^{L} x 3.60^{D}) ก่อนที่จะนำน้ำไปเก็บในถังเก็บน้ำทิ้งเพื่อนำไปใช้รดน้ำต้นไม้
- ถังเก็บน้ำทิ้ง (Effluent tank) มีขนาดความจุ 302.40 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 18.00^{L} x 4.20^{D}) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำทิ้ง 24 ชั่วโมง โดยน้ำทิ้งจะไม่มีการปล่อยระบายลงสู่คลองธรรมชาติทางโครงการจะนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการทั้งหมด เพื่อเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำใช้ในโครงการ

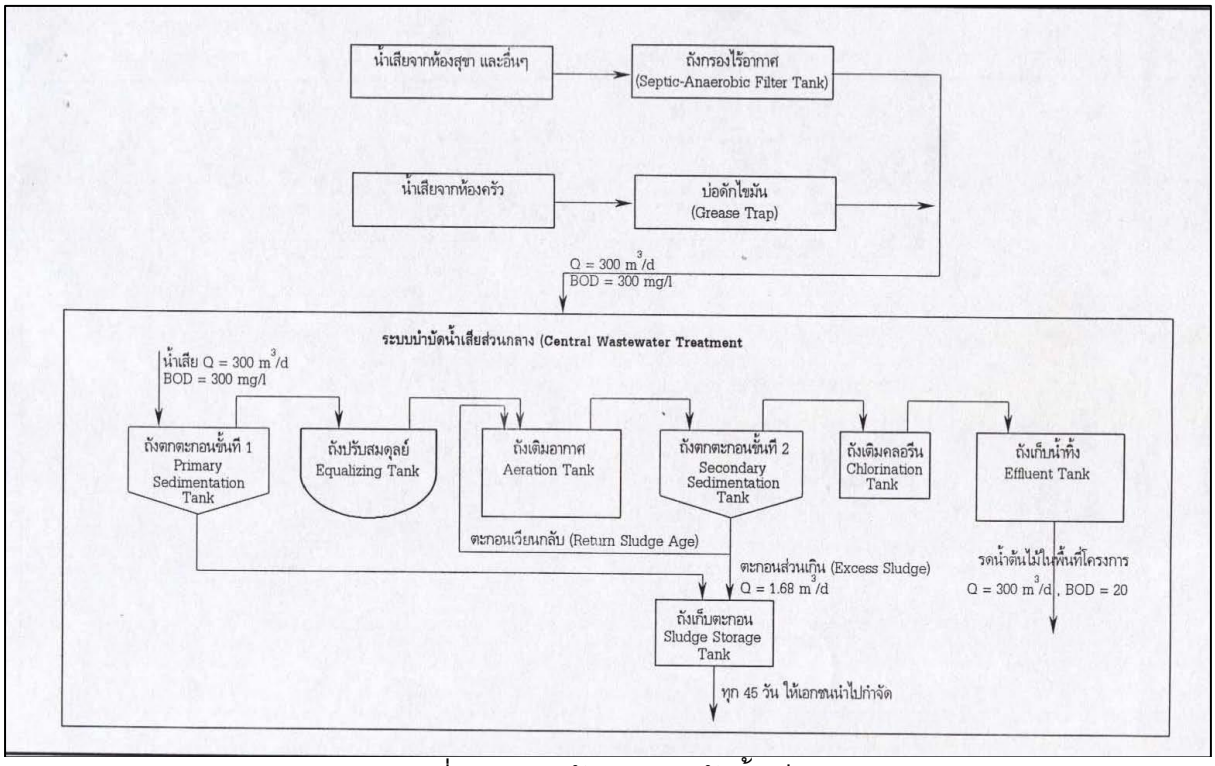

รูปที่ 1.4 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 1.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย

1.5.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ในการระบายปริมาณน้ำฝนที่อาคารต่างๆ ทางโครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำ (Roof Drain) เพื่อรับน้ำจากหลังคาและจุดที่ต้องการระบายน้ำฝน โดยจะระบายลงสู่ท่อรายน้ำฝน (Drain Pipe) ซึ่งจะระบายจากตัวอาคารไปยังรางระบายน้ำฝน ซึ่งเป็นรางรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 และ 0.70 เมตร ด้วยความลาดไปตามผิวดิน ซึ่งวางอยู่ในแนวพื้นที่เขตโครงการแต่ละพื้นที่ และจะถูกระบายไปยังบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาดความจุ 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ก่อนระบายออกสู่ลำห้วย

1.5.4 ระบบจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป กล่าวคือ เป็นกระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง แก้ว ภาชนะบรรจุอาหาร เศษอาหาร เป็นต้น โดยมีแหล่งกำเนิดมาจาก

ห้องพักต่างๆ ในโรงแรม พนักงาน พื้นที่ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ และบริเวณชายหาด ซึ่งมีปริมาณประมาณ 7,000 ลิตร/วัน

การรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในโรงแรม ได้แก่ อาคารต่างๆ ห้องพัก ห้องครัวและห้องอาหาร สำนักงานและร้านค้าภายในโรงแรม พนักงานทำความสะอาดจะขนย้ายถุงบรรจุขยะจากจุดรับขยะต่างๆ มายังห้องพักขยะมูลฝอยของโรงแรมโดยใช้รถเข็น จากนั้นพนักงานจะทำการแยกขยะมูลฝอยตามประเภทต่างๆ ดังนี้

- ขยะที่ส่งขายเพื่อเข้ากระบวนการใหม่ได้ (Recycleable) ประเภทกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋อง โลหะต่างๆ
- ขยะสด ประเภทเศษอาหารจากห้องครัวและห้องอาหาร จะมีผู้มารับไปเป็นอาหารสัตว์
- น้ำมันทอดซ้ำ นำไปแลกเป็นไบโอดีเซลเพื่อนำมาใช้ในโครงการ
- ขยะทั่วไปที่เปียกชื้น และไม่สามารถคัดแยกได้

การจัดเก็บขยะมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอยสามารถเก็บพักขยะได้ 3 วัน ประกอบด้วยพักขยะมูลฝอยเปียกและห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 2.5x2.5x4.0 เมตร จำนวน 2 ห้อง ทั้งนี้ภายในห้องพักขยะมูลฝอยเปียกจะมีการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส เพื่อลดการย่อยสลายของขยะ ในพื้นที่โครงการมีการติดตั้งถังขยะขนาด 200 ลิตร ตามแหล่งกำเนิดต่างๆ จำนวนประมาณ 26-30 ใบ

การกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลกระบี่ โดยอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ซึ่งยังไม่มีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการจะดำเนินการโดยการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากบริเวณต่างๆ ของโรงแรมทุกวันเพื่อนำมาเก็บพักยังห้องพักขยะมูลฝอย ซึ่งจะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นโครงการจะนำรถเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัดยังพื้นที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



รูปที่ 1.6 ระบบการจัดการมูลฝอย


1.5.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1. **ระบบป้องกันอัคคีภัย** เป็นระบบที่ได้จัดเตรียมไว้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA (National Fire Protection Association) และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) โดยระบบจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- แหล่งน้ำสำรองสำหรับการดับเพลิง ใช้น้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งสำรองไว้สำหรับการดับเพลิงประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร
- ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) อัตราการสูบ 95 ลิตร/นาที และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) โดยเครื่องสูบน้ำทั้งสองทำหน้าที่สูบน้ำในขณะที่เกิดอัคคีภัย และทำหน้าที่รักษาความดันในระบบท่อไว้ขณะที่ไม่มีอัคคีภัย ตามลำดับ
- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้ำ พร้อมหัวฉีด สำหรับผู้ใช้อาคารทั่วไป หัวต่อแบบสวมเร็วสำหรับเจ้าพนักงานดับเพลิง เครื่องดับเพลิงมือถือแบบใช้ผงเคมีแห้ง ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณห้องครัว อาคารวิศวกรรม และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณละ 2 จุด เป็นถังเคมีชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์
- หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ชนิด 2 ทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จำนวน 17 จุด ซึ่งติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร เพื่อให้เจ้าพนักงานดับเพลิงสามารถนำสายนำสายดับเพลิงมาต่อได้ ในกรณีที่มาสามารถเข้าถึงตัวอาคารได้
- ท่อดับเพลิง (Fire Pipe) จะใช่ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 – 200 มิลลิเมตร สำหรับท่อภายนอกอาคาร และจะใช้ท่อขนาด 100 – 150 มิลลิเมตร สำหรับท่อดับเพลิงภายในอาคาร
- ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ซึ่งติดตั้งไว้ภายในห้องพัก และในพื้นที่ป้องกันตามมาตรฐานข้างต้น
- หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ชนิด 2 ทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด ซึ่งติดตั้งได้บริเวณทางเข้าโครงการ เพื่อรับน้ำสำหรับดับเพลิงจากรถดับเพลิง ในกรณีที่มาสามารถใช้แหล่งน้ำสำรองจากถังเก็บน้ำใต้ดินได้

2. **ระบบตรวจจับและสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้** (Fire Alarm System) เป็นระบบที่ได้จัดเตรียมไว้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA และเป็นระบบที่มีอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ และยังทำหน้าที่แจ้งเตือนการทำงานของระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Water Sprinkler System) โดยระบบมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- แผงควบคุม (Fire alarm control panel) กำหนดให้เป็นระบบ Microprocessing control และระบบสัญญาณ การควบคุมทั้งหมดใช้ระบบ Multiplexing Technique พร้อมด้วย Graphic aunumciator และแบตเตอรี่สำรองพลังงานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ตรวจจับ (Initiating Devices) ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detectors) และสถานีแจ้งเตือน (Manual Station) กำหนดให้ใช้เป็นชนิดระบุหมายเลขประจำตัว (Addressable) เพื่อให้สามารถตรวจทราบสถานีเกิดเหตุได้ละเอียดขึ้น
- อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเตือน (Audible Alarm) กำหนดให้ใช้ Bell ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเสียงได้อย่างทั่วถึง

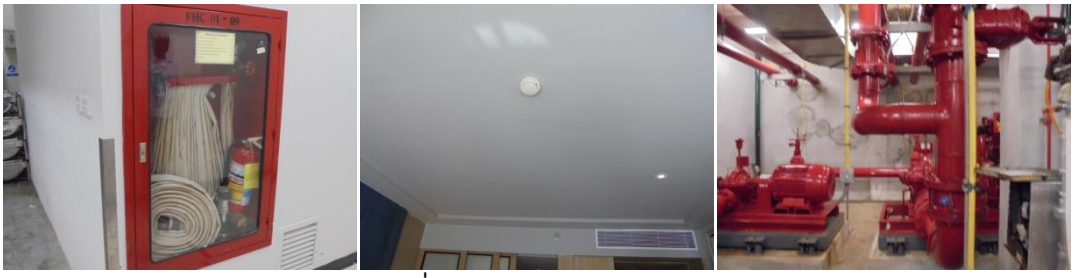

รูปที่ 1.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1.5.6 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1. ระบบปรับอากาศในโครงการ

ลักษณะของอาคารห้องพัก และอาคารประเภทต่างๆ มีลักษณะกระจัดกระจาย ระบบปรับอากาศในโครงการจะใช้ระบบ Split System Direct Expansion (DX-COIL) โดยหลักการทั่วไปประกอบด้วย เครื่องเป่าลมเย็น (AHU หรือ FCU) ติดตั้งภายในห้องปรับอากาศ และเครื่องระบายความร้อน Condensing Unit จะติดตั้งในบริเวณใต้ถุนอาคาร ซึ่งมีการระบายความร้อนที่ดี หรือติดตั้งโดยมีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ และช่วยดูดซับเสียงดังของเครื่องทำความเย็น ขนาดของเครื่องปรับอากาศจะมีขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับห้องที่ปรับอากาศ ในแต่ละพื้นที่จะมีอัตราความต้องการความเย็น

2. ระบบระบายอากาศ

การระบายอากาศในส่วนต่างๆ ที่ไม่มีการระบายอากาศจะพิจารณา โดยให้มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โยอาศัยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโยใช้พัดลมระบายอากาศ ส่วนห้องที่มีการปรับอากาศ จะพิจารณาให้มีระบบระบายอากาศ เช่นกัน เพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) เข้าไปแทนที่ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการระบายอากาศจะใช้ตามหลักเกณฑ์

3. ระบบระบายอากาศจากห้องครัว

ระบบระบายอากาศจากห้องครัว โยเฉพาะบริเวณเตา จะประกอบด้วย Kitchen Hood ซึ่งจะมี Air Filter แบบ Grease Filter ติดตั้งอยู่ภายใน Hood เพื่อดักจับไอน้ำมันจากการทำอาหาร โดยน้ำมันที่ดักได้จะมีการรวบรวมไว้ในขวดบริเวณปลาย Hood เพื่อนำไปกำจัด พัดลม Exhaust Fan จะถูกติดตั้งพร้อม Make up fan โดยปริมาณลมของ Make up fan มีปริมาณ 80% ของ Exhaust

1.5.7 ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และสื่อสาร

1. ระบบไฟฟ้าของโครงการ

โครงการจะได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ด้วนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 kV 3-phase จากนั้นจะผ่านมายังหมอแปลงแบบ oil immersed type จำนวน 3 ชุด ในโครงการมีปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมประมาณ 3,500 kV แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันต่ำขนาด 380 V . 3-phase 4 wire 50 Hz. มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเกณฑ์ข้อกำหนดในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการ จะเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ทางโครงการมีการเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินแบบเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Generator Set) จำนวน 1 ชุด ขนาด 500 kVA 380/220 V, 3-phase , 4 wire, 50 Hz เพื่อใช้ในกรณีกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดขัดข้อง โดยสำรองไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25-30 ของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสำนักงาน ห้องรับแขก ทางเดน บันได ทางหนีไฟ และภายในห้องพัก พัดลมระบายอากาศบ้างส่วน เครื่องสูบน้ำในระบบสุขาภิบาล ระบบเตือนไฟไหม้ ระบบเสียงและโทรศัพท์ ห้องเย็น นอกจากนี้ยังมีไฟฉุกเฉินชนิดที่มีแบตเตอรี่ในตัว ติดตั้งอยู่ในบริเวณทางเดิน และทางหนีไฟ

ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก จะถูกควบคุม โดยแถบป้ายลูกกุญแจ โดยเป็นชนิดถ่วงเวลา เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพัก ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง โทรทัศน์ ปลั๊กไฟฟ้ายกเว้นปลั๊กสำหรับตู้เย็น ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ

2. ระบบโทรศัพท์

โครงการจะได้รับบริการด้านโทรศัพท์และการสื่อสาร จากองค์การโทรศัพท์ โดยมีคู่สายจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จำนวน 50 คู่สาย โดยโครงการจะจัดตั้ง PABX เพื่อใช้เป็นระบบในการติดตั้งภายใน

3. ระบบสัญญาณโทรทัศน์

โครงการจะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม และจานรับสัญญาณรอง Cable TV เพื่อใช้กระจายสัญญาณโทรทัศน์ในโครงการ

1.5.8 ระบบความปลอดภัย

1. การรักษาความปลอดภัย

โครงการจะดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจความสงบอยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริเวณส่วนต้อนรับจะมีตู้นิรภัย สำหรับให้แขกผู้มาพักเก็บรักษาของมีค่าไว้โดยใช้ระบบรหัสควบคุม

2. การป้องกันอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน

ทางโครงการจะจัดให้มีการป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย

- แผนผังตำแหน่งคณะองศ์กรในการป้องกันภัย
- หน่วยสืบสวนเมื่อเกิดอัคคีภัย
- หน่วยดับเพลิง
- ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเห็นอัคคีภัย
- หมายเลยโทรศัพท์เพื่อติดต่อในภาวะฉุกเฉิน
- คู่มือการปฏิบัติของพนักงานรับโทรศัพท์เมื่อเกิดเพลิงไหม้
- ระเบียบการอพยพเคลื่อนย้ายและแผนผังการอพยพ/บัตรอพยพ
- ข้อความที่ใช้ประกาศในภาวะฉุกเฉิน

- สถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับแขกของโครงการ

นอกจากนี้จะจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับหน่วยดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น



รูปที่ 1.8 ระบบความปลอดภัย

1.5.9 ระบบจราจร / การจอดรถ

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะบ้านคลองม่วง- บ้านทับแขก ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องทางจราจร ความกว้างประมาณ 7 เมตร ซึ่งจะเชื่อมต่อกับถนนกรมโยธาธิการ บ้านหนองทะเล-บ้านคลองม่วง ถนนทางเข้าพื้นที่โครงการจะมี 2 เส้นทาง คือ ทางเข้าบริเวณอาคารที่พักอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ มีขนาดความกว้างเส้นทางประมาณ 6 เมตร มีที่จอดรถบัส 6 ล้อ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ของพนักงาน 48 คัน และทางเข้าบริเวณอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวมีความกว้างประมาณ 10 เมตร โดยจัดให้เป็นลักษณะวงเวียนเพื่อให้รถเข้ามาจอดส่งและวนออกไปยังพื้นที่จอดรถ มีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล (4 ล้อ) การจัดเส้นทางเป็นเส้นทางเดียวกัน



รูปที่ 1.9 ระบบการจราจร / จอดรถ


บทที่ 2
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 ลักษณะภูมิประเทศ** - ไม่มีผลกระทบมีการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์	- บริเวณพื้นที่ว่าง และพื้นที่ที่ไม่มีอาคาร จะปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม และป้องกันการชะล้างหน้าดิน และบริเวณที่เป็นที่ลุ่มจะรักษาให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด 	- ปฏิบัติตามมาตรการ พื้นที่ว่างของโครงการและพื้นที่ที่ไม่มีอาคาร โครงการมีการปลูกหญ้า ปลูกต้นไว้ จัดสวนเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สำหรับพื้นที่ลุ่มภายในโครงการมีการรักษาเพื่อให้คงสภาพเดิม 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1.2 ภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ และเสียง - ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ แต่จะมีผลกระทบจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่อาจขัดข้อง และแผ่นกรองอน้ำมันจากห้องครัวอาจอุดตัน	- ตรวจสอบดูแลและรักษาแผ่นกรองไอน้ำมันจากปล่องระบายควัน	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการตรวจสอบดูแลและรักษาแผ่นกรองไอน้ำมันจากปล่องระบายควัน หากพบว่าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่เสมอปีละ 1 ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่เสมอปีละ 1 ครั้ง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.3 ทรัพยากรดิน - การชะล่างผิวหน้าดินจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากมีการปลูกหญ้า และปลูกต้นไม้	- ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำผลให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการก่อสร้างรางระบายน้ำฝนโดยรอบโครงการ และมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝนก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

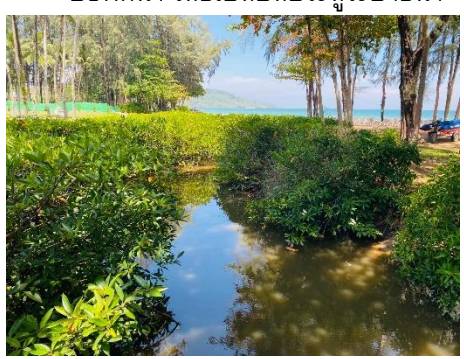องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	- บริเวณปากท่อระบายน้ำ และท่อน้ำล้นจากบ่อพักน้ำ จะมีการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะ และควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบ	- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณปลายท่อระบายน้ำมีการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะ และควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิดปิดประตูระบายน้ำ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม และป้องกันการชะล้างหน้าดิน 	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากท่อระบายน้ำให้สวยงามและเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค  
1.4 ลักษณะทางอุทกวิทยา - ไม่มีผลกระทบ	- ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการก่อสร้างรางระบายน้ำฝนโดยรอบโครงการ และมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝน ก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบ	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบเส้นท่อจ่ายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบเส้นท่อจ่ายน้ำอยู่เสมอ หากพบว่ามีการรั่วซึมหรือชำรุดจะดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบรางระบายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบรางระบายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม หากพบว่ามีการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบรางระบายน้ำ โดยเก็บขยะและลอกดินออก 2 เดือน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมและคนสวนของโครงการตรวจสอบรางระบายน้ำ และมีการเก็บขยะและลอกดินออก 2 เดือน/ครั้ง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.5 คุณภาพน้ำ			
1.5.1 คุณภาพน้ำผิวดิน	- ควบคุมให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย โดยให้มีจุด	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 297.84 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตราเกิดน้ำเสียที่ 100%ของน้ำใช้ โครงการออกแบบระบบรองรับน้ำเสียที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน - น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดจำนะไปรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ปล่อยลงทางน้ำสาธารณะ โครงการจะมีเส้นท่อสำหรับนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่งไปตามพื้นที่และมีจุดปล่อยน้ำในสนามเป็นระยะๆ	ปล่อยน้ำให้น้อยที่สุด - ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ - น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย 	ติดป้ายเพื่อรณรงค์ - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกระบบรวบรวมน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกัน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง โครงการจะใช้น้ำทิ้งผ่านการบำบัดทั้งหมดมารดน้ำต้นไม้ โดยไม่ปล่อยทิ้งออกนอกโครงการ - ปฏิบัติตามมาตรการ น้ำฝนภายในโครงการจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำฝนแต่ละบ่อ ก่อนปล่อยลงสู่ลำห้วย 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งเบื้องต้นและส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังเอกสารแสดงภาคผนวก จ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.5.2 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- ไม่มีผลกระทบแต่ควรดำเนินการตามมาตรการคุณภาพน้ำผิวดิน	- โครงการดูแลแหล่งน้ำผิวดินให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ **2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ** - ไม่มีผลกระทบ โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำไปรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ระบายลงลำห้วย	- ติดตั้งป้ายประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเก็บซากปะการัง	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ควบคุมให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย โดยให้มีจุดปล่อยน้ำให้น้อยที่สุด	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีการติดป้ายเพื่อรณรงค์	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกระบบ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	แยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ 	รวบรวมน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกัน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง โครงการจะใช้น้ำทิ้งผ่านการบำบัดทั้งหมดมารดน้ำต้นไม้ โดยไม่ปล่อยทิ้งออกนอกโครงการ 	
	- น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย 	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝน ก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งเบื้องต้นและส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังเอกสารแสดงภาคผนวก จ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2.2 นิเวศวิทยาทางบก - ไม่มีผลกระทบ	- บำรุงดูแลรักษาต้นไม้อยู่เสมอ	- ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนดูแลต้นไม้พันธุ์ไม้ภายในโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- บริเวณที่เป็นที่ลุ่มที่พันธุ์ไม้ป่าชายเลน โครงการจะรักษาให้คงสภาพเดิมและปลูกเพิ่มเติมให้เป็นที่อยู่ของสัตว์	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลรักษาป่าชายเลนภายในโครงการให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

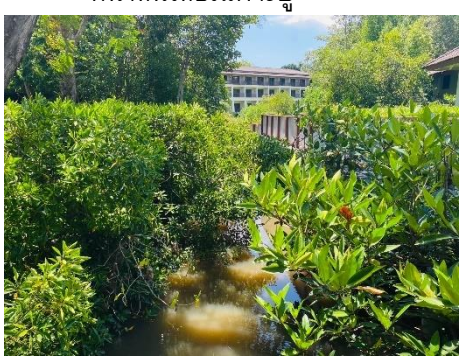องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	หน้าดินโดยเฉพาะปู  - ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว	 - ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน** - พื้นของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมไปเป็นย่านพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อชุมชน	- พื้นที่บริเวณหลุมฝังศพบรรพบุรุษเป็นของเจ้าของที่ดินเดิม โครงการปล่อยให้คงสภาพเดิม ญาติเจ้าของสุสานสามารถเข้ามายังสุสานได้ดังเดิม และโครงการไม่มีแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว	- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณพื้นที่ฝังศพบรรพบุรุษ เป็นของเจ้าของที่ดินเดิม โครงการปล่อยให้คงสภาพเดิม ญาติเจ้าของสุสานสามารถเข้ามายังสุสานได้ดังเดิม และโครงการไม่มีแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

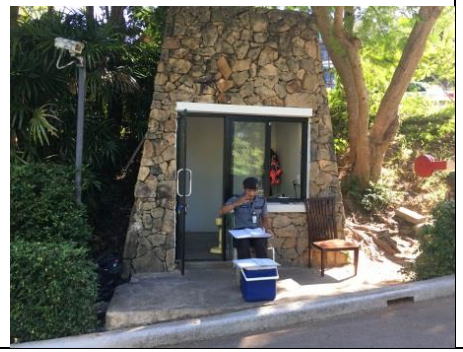
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
3.2 เกษตรกรรม - ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การคมนาคมขนส่ง - อาจเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า - ออกบริเวณทางเข้า - อุบัติเหตุจากพนักงาน จากการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อก	- จัดพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออกโรงแรม 	- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณทางเข้า – ออก โครงการ มีเจ้าหน้าที่ รปภ.อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ติดตั้งป้ายจราจร และป้ายเตือนในบริเวณ 1. ปากทางเข้า-ออก ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายโครงการ และติดตั้งไฟส่องสว่าง 2. ระยะ 200 เมตร จากทางเข้า-ออก ติดตั้งป้ายเตือนพื้นที่โครงการ 3. ที่สามแยกติดกับถนนโยธาธิการบ้านหนองทะเล-บ้านคลองม่วง ติดตั้งป้ายโครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ออกข้อบังคับให้พนักงานที่ใช้รถมอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับรถมอเตอร์ไซด์เข้ามาทำงาน	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้พนักงานของโครงการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับรถมอเตอร์ไซด์	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.4 สาธารณูปโภค - ไฟฟ้า : ไม่มีผลกระทบ - น้ำใช้ : ความต้องการใช้น้ำประมาณ 255.84 ลบ.ม./วัน (1) น้ำใช้สำหรับอาคารโรงแรม 42 ลบ.ม./วัน	- ควบคุมใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ โดยกำหนดให้มีจุดใช้น้ำน้อยที่สุด	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการนำนำทิ้งที่	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
(2) น้ำใช้ในอาคารพักพนักงาน 50 ลบ.ม./วัน (3) น้ำใช้ในสระว่ายน้ำ 250 ลบ.ม./วัน (น้ำใช้หมุนเวียนในสระ) (4) น้ำใช้รดน้ำต้นไม้ 250 ลบ.ม./วัน (ใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด) ซื้อน้ำจากเอกชน มาเก็บในถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม และทำการปรับปรุงคุณภาพ สูบจ่ายไปตามเส้นท่อต่อไป - โทรศัพท์ : ไม่มีผลกระทบ	ประโยชน์ให้มากที่สุด - ตรวจสอบเมื่อพบว่ามีการรั่วซึมของเส้นท่อต้องซ่อมแซมทันที	ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ - ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบเส้นท่อส่งน้ำเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีการชำรุด จะซ่อมแซมทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย - การประเมินตามเกณฑ์ขั้นต่ำฯ สผ. 1 กิโลกรัม/คน/วัน มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 642 กิโลกรัม/วัน (1.93 ลบ.ม./วัน) ผู้ออกแบบห้องพักขยะให้รองรับได้สูงสุด 7.83 ลบ.ม./วัน หรือ 22,349 กิโลกรัม/วัน - โครงการจะทำการเก็บจากแหล่งกำเนิดต่างๆ มาเก็บพักใน	- โครงการจะมีการคัดแยกชนิดของขยะมูลฝอย ตามลักษณะขยะมูลฝอย เพื่อนำส่วนที่ขายได้ไปขายต่อให้เป็นรายได้ของพนักงาน	- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกแม่บ้านจะคัดแยกมูลฝอยตามชนิดของมูลฝอย และมูลฝอยบางส่วนที่ขายได้ จะถูกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจกรรมของพนักงาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ห้องพักขยะมูลฝอยเปียกขนาด 9 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง และขยะมูลฝอยแห้งขนาด 90 ตร.ม. จำนวน 1 ห้อง สามารถเก็บพักได้ 3 วัน และจะเก็บขนส่งไปกำจัดยังพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่			
	- จัดซื้อรถขนขยะมูลฝอย 4 ล้อเล็ก ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์หลา ถังบรรจุขยะเป็นแบบเปิดข้างเทท้ายปิดมิดชิด	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีรถขนขยะมูลฝอย 4 ล้อเล็ก เพื่อใช้สำหรับขนถ่ายมูลฝอย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ทำการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัดที่เทศบาลเมืองกระบี่ทุกวัน วันละ 3 เวลา คือ 8.00-9.00 น./ 11.00-12.00 น. และ 15.30-16.00 น. หรือตามปริมาณของมูลฝอยที่เกิดขึ้น	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการส่งขยะที่เกิดขึ้นในโครงการไปกำจัดที่เทศบาลเมืองกระบี่เป็นประจำทุกวัน โดยมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ทำความสะอาดห้องพักขยะ และรถบรรทุกขยะมูลฝอยทุกครั้งหลังการจัดเก็บ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการทำความสะอาดห้องพักขยะ และรถบรรทุกขยะมูลฝอยทุกครั้งหลังการจัดเก็บ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันสัตว์นำโรค	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
3.6 การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล - น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 294.84 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตราเกิดน้ำเสียที่ 100%ของโครงการ โครงการออกแบบระบบรองรับน้ำเสียที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน - น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะนำไปรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำลงทางน้ำสาธารณะ โดยโครงการจะมีเส้นท่อสำหรับนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่งไปตามพื้นที่ และมีจุดปล่อยในสนามเป็นระยะๆ	- ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ - น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกระบบรวบรวมน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกัน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง โครงการจะใช้น้ำทิ้งผ่านการบำบัดทั้งหมดมารดน้ำต้นไม้ โดยไม่ปล่อยทิ้งออกนอกโครงการ - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝน ก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

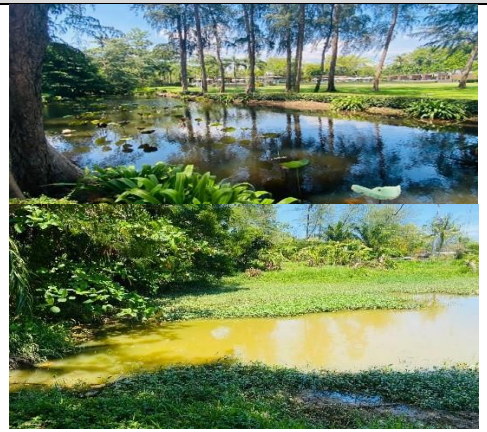องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสำเสมอ ดังนี้ ถังบำบัดสำเร็จรูป/ถังเกรอะ 1. ทำการดักตะกอน (Night soil) ทุก 45 วัน 2. ฉีดน้ำล้างหรือใช้ไม้แซะตะกอนจุลชีพที่แผ่นกรองที่มีจุลชีพ (Bacterial) เกาะติดอยู่หนาทุก 6-8 เดือน/ครั้ง		- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งเบื้องต้นและส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 1. ปฏิบัติตามมาตรการ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	3. ถังดักไขมันที่ติดกับอ่างล้างจานกำจัดไขมันออกทุก 1-2 วัน/ครั้ง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. บ่อดักไขมันให้กำจัดไขมันและตะกอนออกทุก 45 วัน	4. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	ระบบบำบัดส่วนกลาง		
	1. ช้อนขยะที่ถังตกตะกอนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ทำความสะอาดรางรับน้ำในถังตกตะกอน	2. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. นำตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 45 วัน	3. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม			
- ปริมาณน้ำฝน 3 ชั่วโมง ที่เกิดขึ้นก่อนมีโครงการมีปริมาณน้ำฝน 14,872.14 ลบ.ม. ในกรณีที่มีโครงการ สภาพพื้นที่เปลี่ยนเป็นอาคารปกคุลมมีพื้นที่ 18,845 ตารางเมตร จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 19,845 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,972.86 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้	- ตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ โดยนำเศษขยะ เศษใบไม้ และขุดลอกเมื่อมีตะกอนดินทับถม	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมและคนสวนของโครงการดูแลรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ โดยมีการนำเศษขยะออกจากรางระบายน้ำ แล้วขุดลอกเมื่อมีตะกอนดินตกค้างในรางระบายน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ติดตั้งตะแกรงดักขยะและประตู	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้ง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ก่อสร้างบ่อพัก 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,616 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมการระบายน้ำให้มีสภาพเท่าเดิมก่อนมีโครงการ	ระบายน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้าย	ตะแกรงดักขยะและประตูระบายน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้าย	
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝน ก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิด – ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบดังนี้	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยการเปิด – ปิด ประตูระบายน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	1. ช่วงเวลาปกติ (ก่อนฝนตก) เปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด หรือจะเปิดตามที่ออกแบบไว้ของแต่ละบ่อ คือ บ่อที่ 1 เปิด 12 ชม. บ่อที่ 2 เปิด 11 ชม. บ่อที่ 3 เปิด 6 ชม. บ่อที่ 4 เปิด 3 ชม. บ่อที่ 5 เปิด 5 ชม.	1. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. เมื่อฝนตกระดับในทางน้ำสูงขึ้นแต่ยังไม่สูงกว่าระดับในบ่อพักให้เปิดประตู	2. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ระบายน้ำที่ออกแบบไว้ คือ บ่อที่ 1 เปิด 12 ชม. บ่อที่ 2 เปิด 11 ชม. บ่อที่ 3 เปิด 6 ชม. บ่อที่ 4 เปิด 3 ชม. บ่อที่ 5 เปิด 5 ชม.		
	3. เมื่อระดับภายนอกสูงกว่าระดับในบ่อพัก ให้เปิดประตูระบายน้ำ	3. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. เมื่อระดับในบ่อพักสูงจนถึงท่อน้ำล้นน้ำจะระบายออกท่อน้ำล้น	4. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. เมื่อฝนหยุดตกระดับน้ำในทางน้ำลดลงให้เปิดประตูระบายน้ำเท่าที่คำนวณไว้จนถึงระดับน้ำในบ่อพักก่อนฝนตก	5. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 เศรษฐกิจและสังคม** - มีความต้องการจ้างพนักงานประมาณ 300 คน โดยทำงานเป็นกะๆ ละ 150 คน	- ควรพิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นให้เข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการพิจารณารับพนักงานเข้าทำงาน โดยคัดเลือกคนในพื้นที่ก่อน ซึ่งอัตราพนักงาน คนในพื้นที่ จ.กระบี่ : คนต่างจังหวัด คิดเป็น 80 : 20	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อร้าน และธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น การเช่าเรือประมงขนาดเล็ก			
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมใช้อุปกรณ์และการป้องกันอัคคีภัยทุกปี 	- ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง  - ถังก๊าซ LPG ตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ โดยวางบนพื้นคอนกรีตเรียบ ผนังเป็นรั้วโปร่งมีโซ่รัดถังยึดติดผนังและติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้งชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์ และติดตั้งวาล์วอัตโนมัติ เพื่อตัดก๊าซกรณีที่มีการรั่วไหล	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2567 โรงแรมมีแผนดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม และจะรายงานให้ทราบในฉบับถัดไป - ปฏิบัติตามมาตรการ การเก็บก๊าซ LPG เป็นไปตามข้อข้อบังคับของกรมโยธาธิการและติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้งชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์ และติดตั้งวาล์วอัตโนมัติ เพื่อตัดก๊าซกรณีที่มีการรั่วไหล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
4.3 สาธารณสุข - ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข	- ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข	- ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข	- ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข
4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว - ทางโครงการได้ออกแบบโรงแรมให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร และข้อบังคับตำบลหนองทะเล รวมทั้งพื้นที่โครงการที่ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้าง จะทำการปลูกต้นไม้เพิ่ม และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม	- ทำความสะอาดชายหาด โดยเก็บขยะมูลฝอยที่พัดพามากับคลื่นหรือที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนในท้องถิ่นทิ้งไว้ - เก็บเศษไม้ ขยะมูลฝอยในลำห้วยทุกวัน - ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าให้มี	- ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของโครงการทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะ เป็นประจำทุกวัน - ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของโครงการ เก็บเศษไม้ ขยะมูลฝอยในลำห้วยทุกวัน - ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	สภาพสมบูรณ์สวยงามตลอดเวลา	โครงการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงามตลอดเวลา	
	- รักษาสภาพพื้นที่บริเวณที่ลุ่มที่มีไม้ป่าชายเลนขึ้นให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าดิน เช่น ปูก้ามดาบ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลรักษาป่าชายเลนภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ปลูกต้นไม้เสริม โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ที่เป็นแหล่งอาหารของนก	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับ ไม้ดอก บริเวณลำห้วยให้สวยงาม	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
			

บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพน้ำ	**1. น้ำทะเลหน้าพื้นที่โครงการ** - ความเป็นกรด – ด่าง - ของแข็งแขวนลอย - ออกซิเจนละลายน้ำ - บีโอดี - ไขมันและน้ำมัน - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ปีละ 1 ครั้ง ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว	- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.2	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. น้ำผิวดินคลองปากเปลว - ความเป็นกรด – ด่าง - ของแข็งแขวนลอย - ออกซิเจนละลายน้ำ - บีโอดี - ไขมันและน้ำมัน - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ปีละ 1 ครั้ง ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว	- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.3	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย			
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. ตรวจสอบการตกตะกอน	1-2 สัปดาห์ / ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คค่าต่างๆ เพื่อควบคุมระบบ ตรวจสอบการตกตะกอนและระดับความสูงของตะกอน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ตรวจสอบความสูงของชั้นตะกอนในถังเติมอากาศ	3-4 สัปดาห์ / ครั้ง		
	3. วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด - บีโอดี - ของแข็งแขวนลอย	ทุกเดือน	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.4	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	มาตรฐาน
ความเป็นกรด – ด่าง	-	-	7.9	-	-	-	-	7.0 - 8.5
บีโอดี	มก./ล.	-	4.2	-	-	-	-	-
ของแข็งแขวนลอย	มก./ล.	-	19.00	-	-	-	-	A
ไขมันและน้ำมัน	มก./ล.	-	< 5	-	-	-	-	-
ออกซิเจนละลายน้ำ	มก./ล.	-	7.85	-	-	-	-	≥ 4
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	< 1.8	-	-	-	-	< 1,000
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	< 1.8	-	-	-	-	< 100
ลักษณะทางกายภาพ		-	ใส ไม่มีตะกอน	-	-	-	-	

มาตรฐาน ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่เพื่อการว่ายน้ำหรือประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 124 ตอนที่ 11 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

A พิจารณาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ

ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินคลองปากเปลว

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	มาตรฐาน
ความเป็นกรด – ด่าง	-	-	7.6	-	-	-	-	5.0 – 9.0
บีโอดี	มก./ล.	-	3.8	-	-	-	-	< 1.5
ของแข็งแขวนลอย	มก./ล.	-	8.0	-	-	-	-	-
ไขมันและน้ำมัน	มก./ล.	-	< 5	-	-	-	-	-
ออกซิเจนละลายน้ำ	มก./ล.	-	7.10	-	-	-	-	≥ 6
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	790	-	-	-	-	< 5,000
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	790	-	-	-	-	< 1,000
ลักษณะทางกายภาพ		-	เหลืองใส มีตะกอน	-	-	-	-	

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ (3) การประมง (4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179


ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD mg/l	SS mg/l	TDS mg/l	Se mg/l	Fat, O&G mg/l	S mg/l	TKN ml/l	ลักษณะทางกายภาพ
มกราคม 67	7.4	**104**	**1344**	406	**1000**	< 5	**2.8**	**109**	เหลืองขุ่น
กุมภาพันธ์ 67	7.6	9.2	**42**	468	< 0.5	< 5	< 0.5	4.76	เหลืองขุ่น
มีนาคม 67	7.4	**24.9**	**45.5**	508	**60**	< 5	< 0.5	2.03	เหลืองขุ่น
เมษายน 67	8.2	**23**	**56**	442	**60**	< 5	< 0.5	4.99	เหลืองขุ่น
พฤษภาคม 67	7.3	**25.9**	**60**	505	< 0.5	< 5	< 0.5	5.27	เหลืองขุ่น
มิถุนายน 67	7.6	17.2	**36.5**	455	< 0.5	< 5	< 0.5	4.1	เหลืองขุ่น
****ค่าต่ำสุด**	7.3	9.2	36.5	406	< 0.5	< 5	< 0.5	2.03	
****ค่าสูงสุด**	8.2	104	1344	508	1000	< 5	2.8	109	
ค่ามาตรฐาน	5.0 - 90	≤ 20	≤ 30	≤ 500*	≤ 0.5	≤ 20	≤ 1	≤ 35	

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

***** : เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง -
ชื่อผู้ควบคุม Piyaporn Aunsiam เลขทะเบียน ว-179-จ-0001
ชื่อผู้วิเคราะห์ Orasa Chaiwong เลขทะเบียน ว-179-ค-0001
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179 เบอร์โทรศัพท์ 02-906-3729-31

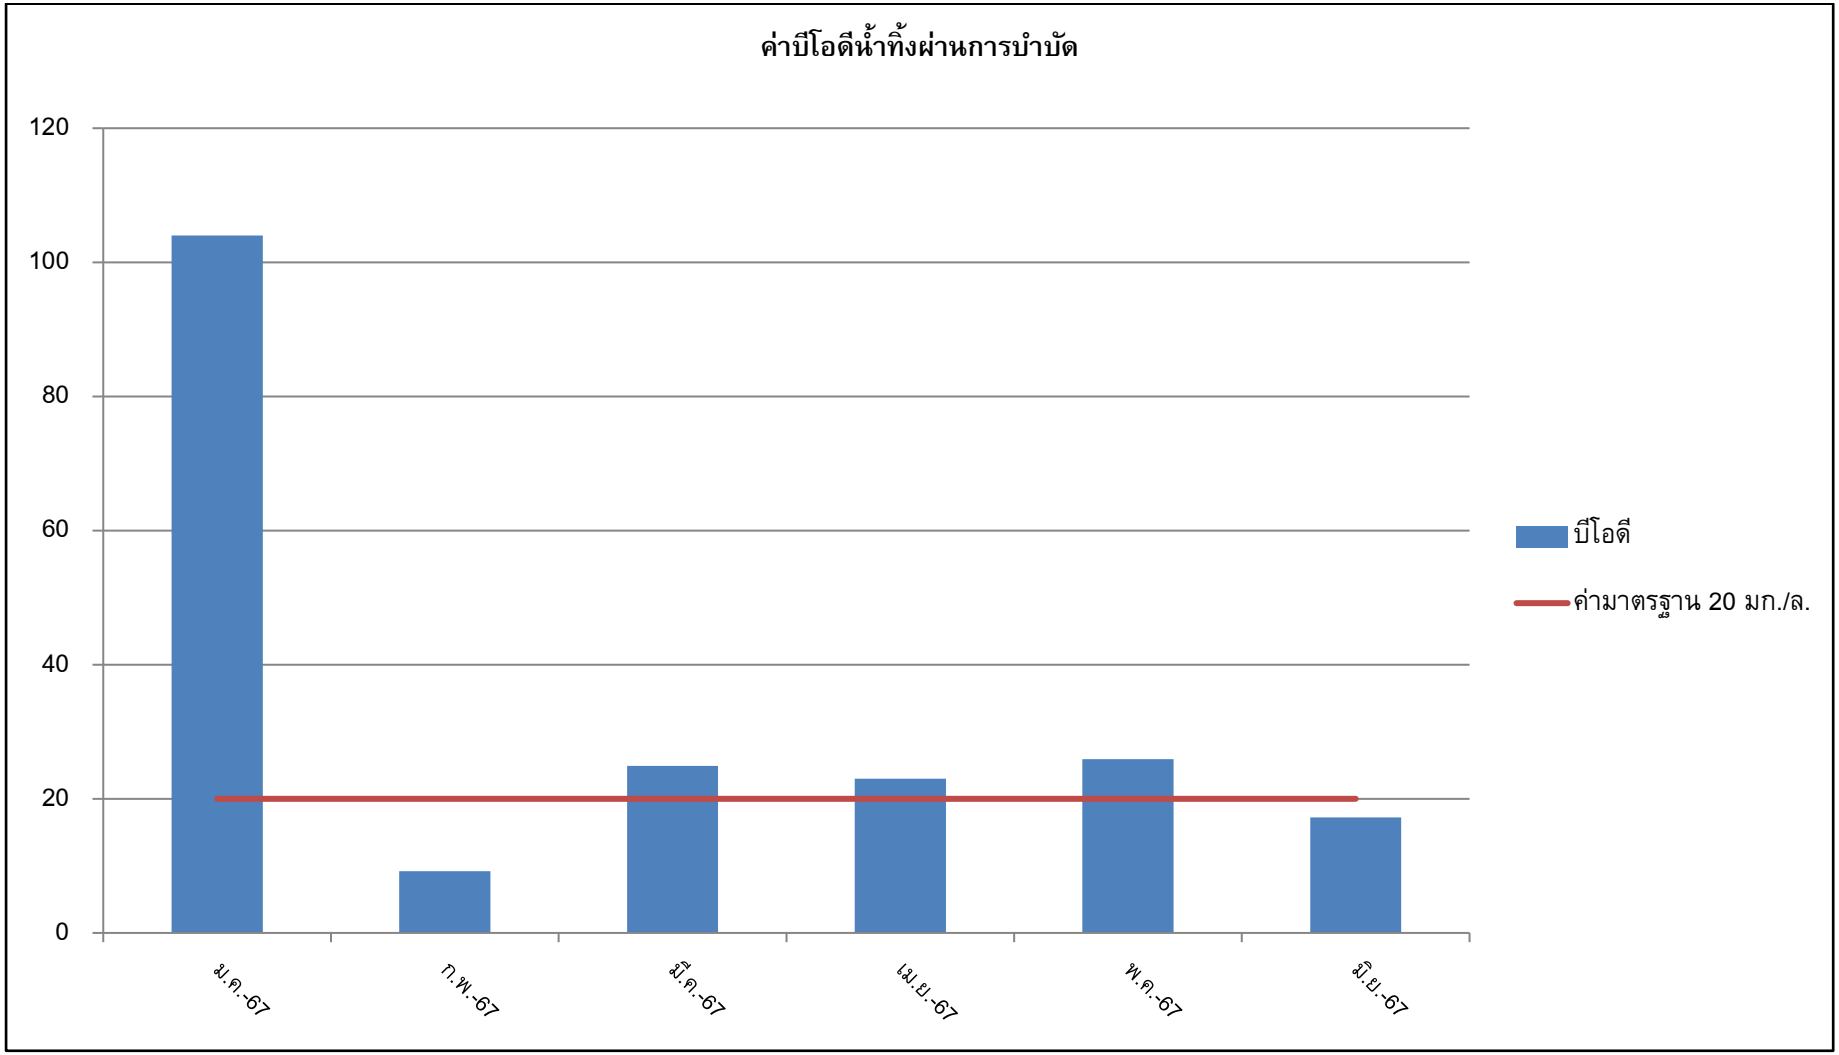

รูปที่ 3.1 ค่าบีโอดีน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ย้อนหลัง


พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD mg/l	SS mg/l	TDS mg/l	Se mg/l	Fat, O&G mg/l	S mg/l	TKN ml/l	ลักษณะทางกายภาพ
ปี 2564									
มกราคม 64	7.2	1.6	< 2.5	419	< 0.5	< 5	< 0.01	1.18	เหลืองใส
กุมภาพันธ์ 64	6.9	1.2	14.5	458	< 0.5	< 5	< 0.01	5.6	เหลืองขุ่น
มีนาคม 64	6.8	6	11	435	< 0.5	< 5	< 0.01	1.48	เหลืองขุ่น
เมษายน 64	8	7.4	8.7	339	< 0.5	< 5	< 0.01	16	เหลืองใส มีตะกอน
พฤษภาคม 64	7.9	5.8	2.7	378	< 0.5	< 5	< 0.01	0.84	เหลืองขุ่น
มิถุนายน 64	8.2	3.6	7.7	430	< 0.5	< 5	< 0.01	0.78	เหลืองใส มีตะกอน
กรกฎาคม 64	7.9	3.1	9.7	266	< 0.5	< 5	< 0.01	1.03	ใส
สิงหาคม 64	8	2.2	8.3	436	< 0.5	< 5	< 0.01	0.72	เหลืองใส มีตะกอน
กันยายน 64	7.8	3.9	6	**646**	< 0.5	< 5	< 0.01	1.18	เหลืองใส มีตะกอน
ตุลาคม 64	8.1	2	7.3	272	< 0.5	< 5	< 0.01	0.84	เหลืองใส มีตะกอน
พฤศจิกายน 64	7.8	1.6	5.3	354	< 0.5	< 5	< 0.01	0.56	เหลืองใส มีตะกอน
ธันวาคม 64	7.4	4.2	13	425	< 0.5	< 5	< 0.01	5.81	เหลืองใส มีตะกอน
ปี 2565									
มกราคม 65	7.7	4.2	10.3	598	< 0.5	< 5	< 0.01	0.84	เหลืองใส มีตะกอน
กุมภาพันธ์ 65	8.4	2.4	2.7	576	< 0.5	< 5	< 0.01	1.16	ใส มีตะกอน
มีนาคม 65	7.3	4.6	5.4	346	< 0.5	< 5	< 0.5	1.14	เหลืองใส มีตะกอน

พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD mg/l	SS mg/l	TDS mg/l	Se mg/l	Fat, O&G mg/l	S mg/l	TKN ml/l	ลักษณะทางกายภาพ
เมษายน 65	7.5	1.5	**50**	192	< 0.5	< 5	< 0.5	16	เหลืองขุ่น
พฤษภาคม 65	7.6	8.2	7	380	< 0.5	< 5	< 0.5	2.45	เหลืองใส มีตะกอน
มิถุนายน 65	8.2	2.2	9	472	< 0.5	< 5	< 0.5	2.1	เหลืองใส มีตะกอน
กรกฎาคม 65	7.4	8.2	41.3	222	< 0.5	< 5	< 0.5	6.16	เหลืองขุ่น
สิงหาคม 65	7.7	2.2	23	360	< 0.5	< 5	< 0.5	2.43	เหลืองใส ตะกอน
กันยายน 65	8	< 1.0	11	222	< 0.5	< 5	< 0.5	0.77	เหลืองใส มีตะกอน
ตุลาคม 65	8	2.2	23.5	255	< 0.5	< 5	< 0.5	6.63	เหลืองใส มีตะกอน
พฤศจิกายน 65	7.4	7.6	15	264	< 0.5	< 5	< 0.5	7.56	เหลืองใส มีตะกอน
ธันวาคม 65	7.3	12.7	202	268	20	< 5	< 0.5	28	เหลืองขุ่น
ปี 2566									
มกราคม 66	8.0	8.7	26.0	260	< 0.5	< 5	< 0.5	24	เหลืองใส มีตะกอน
กุมภาพันธ์ 66	7.5	13.4	25.3	270	< 0.5	< 5	< 0.5	30	เหลืองใส มีตะกอน
มีนาคม 66	7.9	12.0	28.7	372	< 0.5	< 5	< 0.5	31	เหลืองใส มีตะกอน
เมษายน 66	7.9	37.8	**46.0**	404	< 0.5	< 5	< 0.5	26	เหลืองขุ่น
พฤษภาคม 66	7.9	41.2	**52**.0	330	< 0.5	< 5	< 0.5	12	เหลืองขุ่น
มิถุนายน 66	7.4	17.2	27.5	548	< 0.5	< 5	< 0.5	1.57	เหลืองใส มีตะกอน
กรกฎาคม 66	7.2	16.2	80.0	368	< 0.5	< 5	< 0.5	1.12	เหลืองขุ่น
สิงหาคม 66	8.1	3.9	40.0	392	5	< 5	< 0.5	11	เหลืองขุ่น


พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD mg/l	SS mg/l	TDS mg/l	Se mg/l	Fat, O&G mg/l	S mg/l	TKN ml/l	ลักษณะทางกายภาพ
กันยายน 66	7.6	15.6	**52.7**	360	12	< 5	< 0.5	5.1	เหลืองขุ่น
ตุลาคม 66	7.7	4.1	33.4	378	< 0.5	< 5	< 0.5	3.45	เหลืองขุ่น
พฤศจิกายน 66	7.5	2.3	**58.8**	416	< 0.5	< 5	< 0.5	3.22	เหลืองขุ่น
ธันวาคม 66	7.7	**23.1**	**58.0**	508	2	< 5	< 0.5	3.15	เหลืองขุ่น
ปี 2567									
มกราคม 67	7.4	**104**	**1344**	406	1000	< 5	2.8	109	เหลืองขุ่น
กุมภาพันธ์ 67	7.6	**9.2**	**42**	468	< 0.5	< 5	< 0.5	4.76	เหลืองขุ่น
มีนาคม 67	7.4	**24.9**	**45.5**	508	60	< 5	< 0.5	2.03	เหลืองขุ่น
เมษายน 67	8.2	**23**	**56**	442	60	< 5	< 0.5	4.99	เหลืองขุ่น
พฤษภาคม 67	7.3	**25.9**	**60**	505	< 0.5	< 5	< 0.5	5.27	เหลืองขุ่น
มิถุนายน 67	7.6	**17.2**	**36.5**	455	< 0.5	< 5	< 0.5	4.1	เหลืองขุ่น
ค่ามาตรฐาน	5.0 – 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 500*	≤ 0.5	≤ 20	≤ 1	≤ 35	

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


* : เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

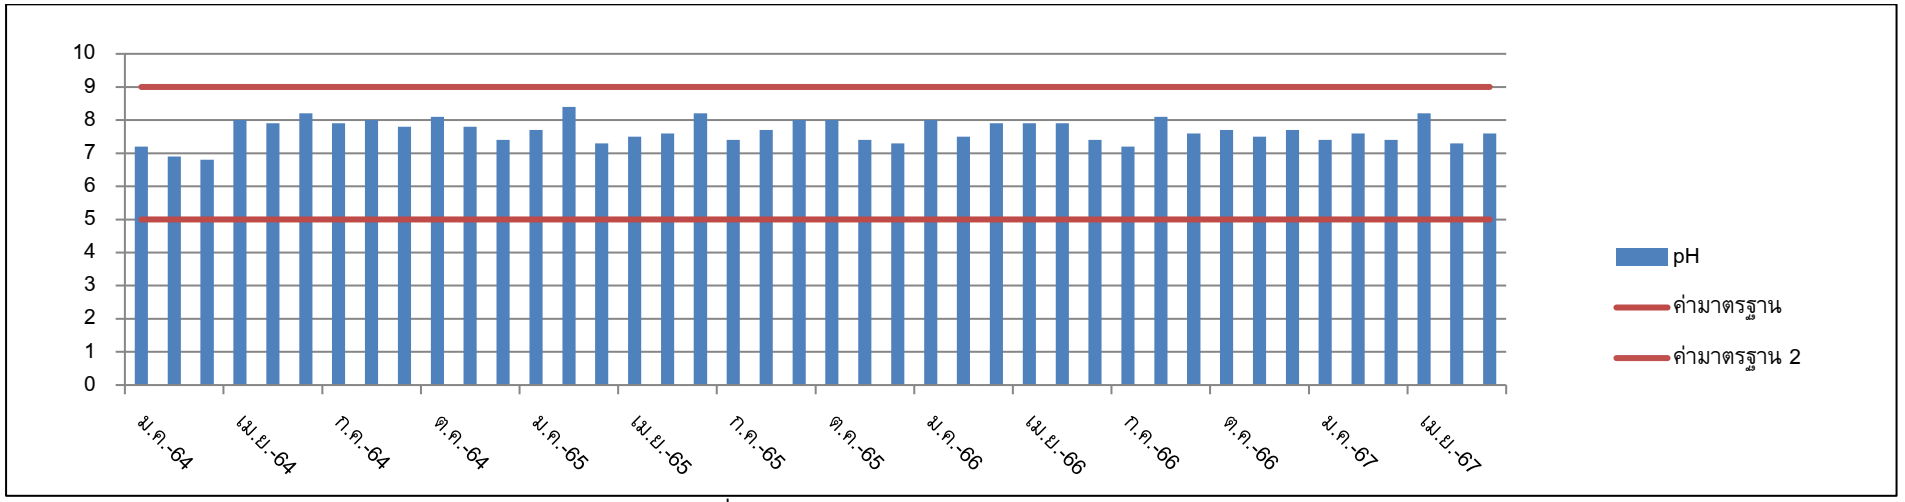


รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี

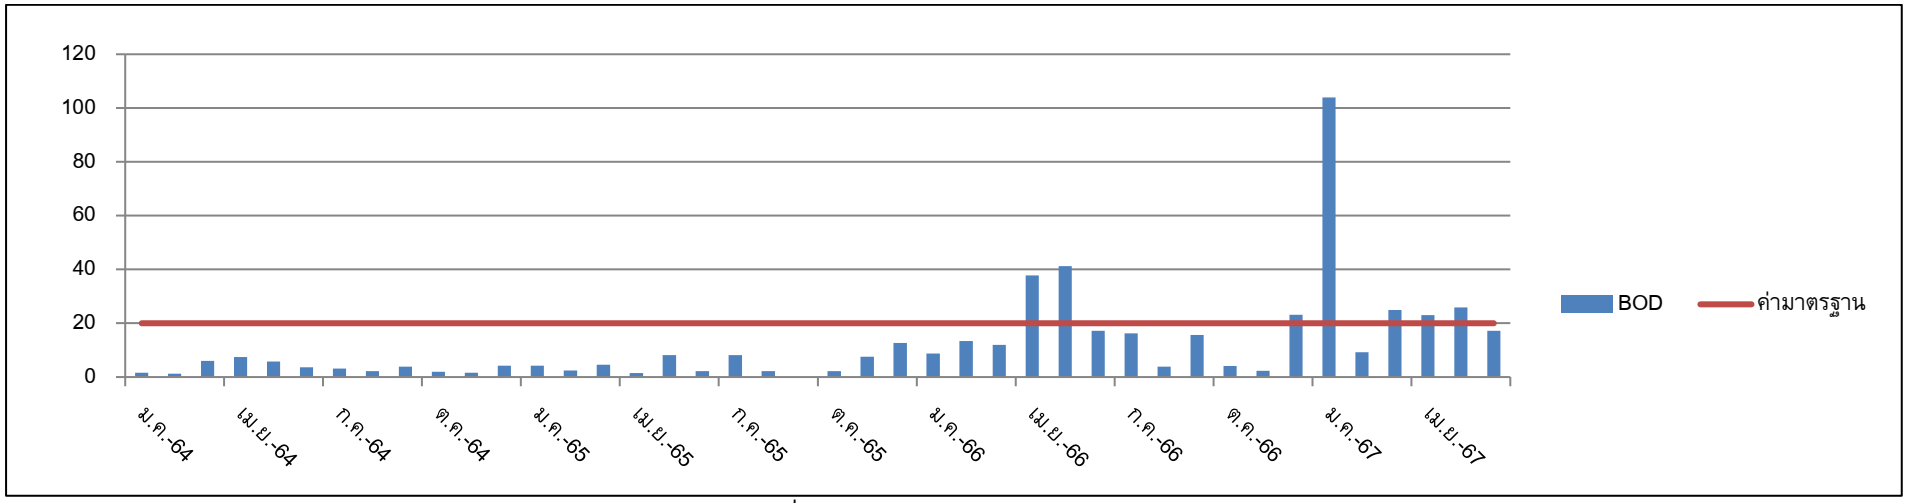


รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าบีโอดี ย้อนหลัง 3 ปี

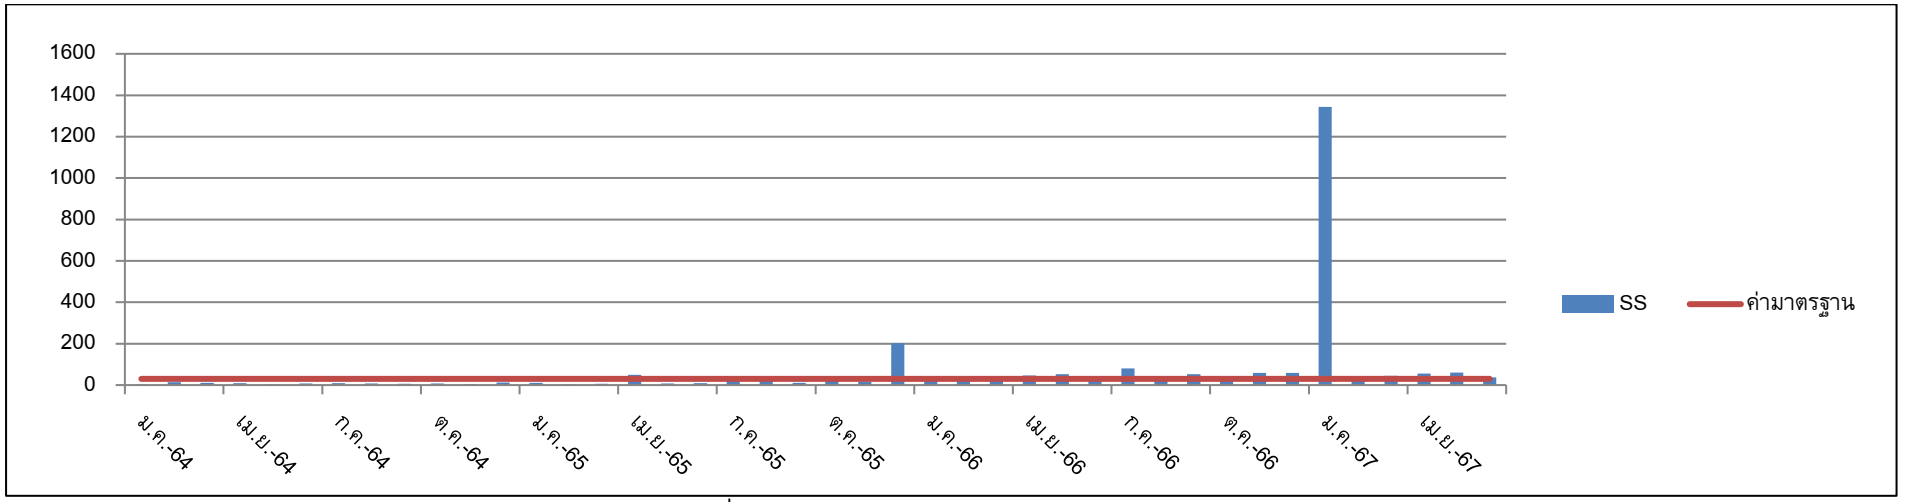


รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอย ย้อนหลัง 3 ปี

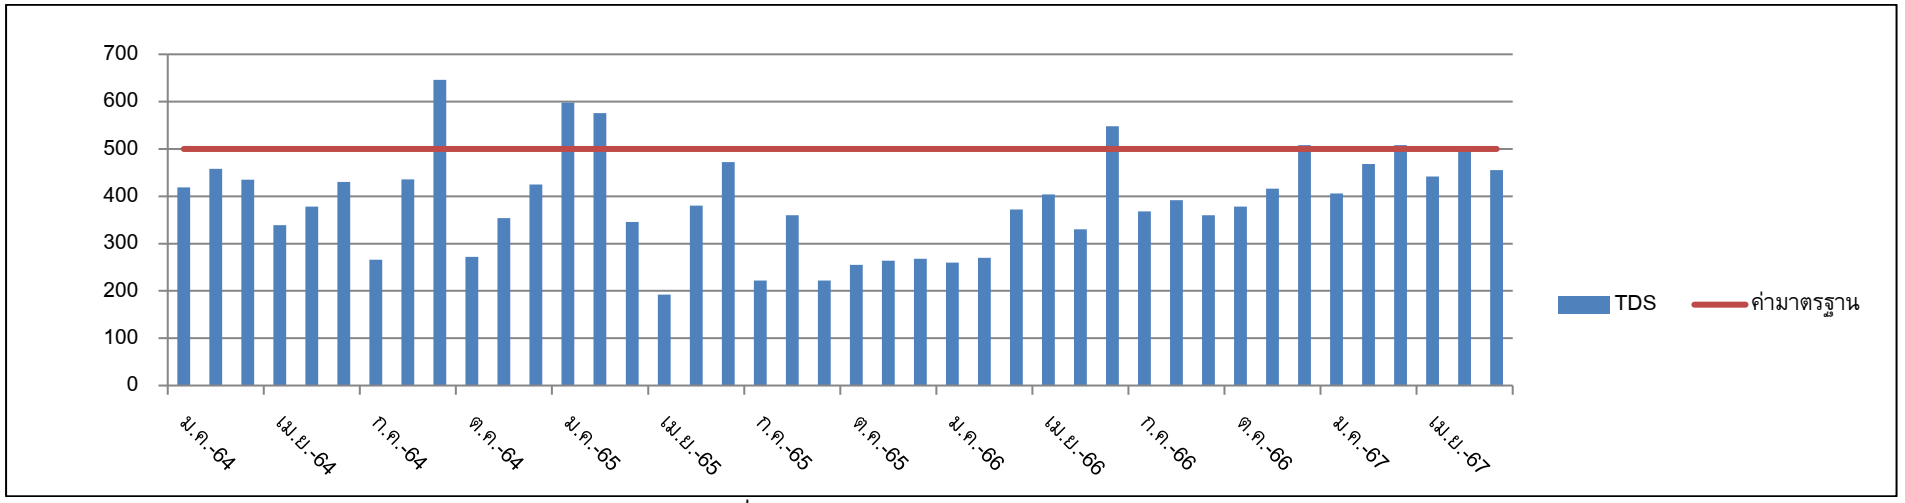


รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าของแข็งละลาย ย้อนหลัง 3 ปี

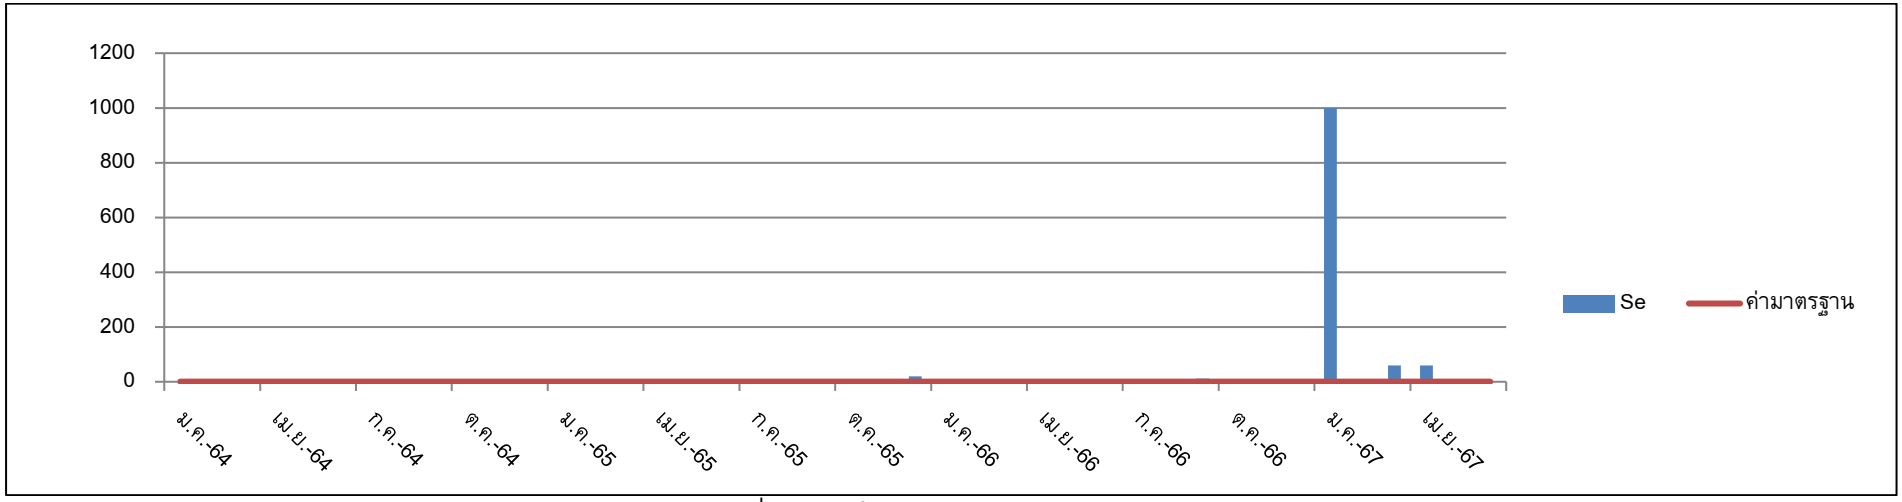


รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี

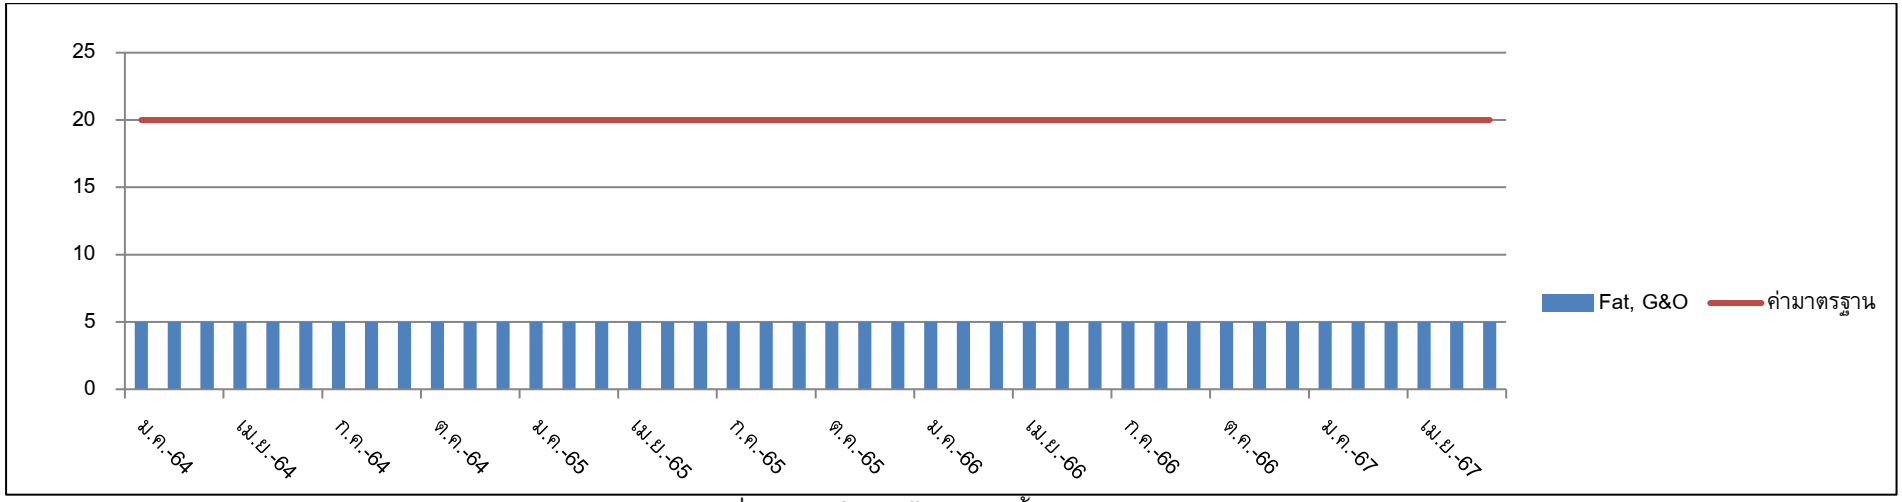

รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน ย้อนหลัง 3 ปี

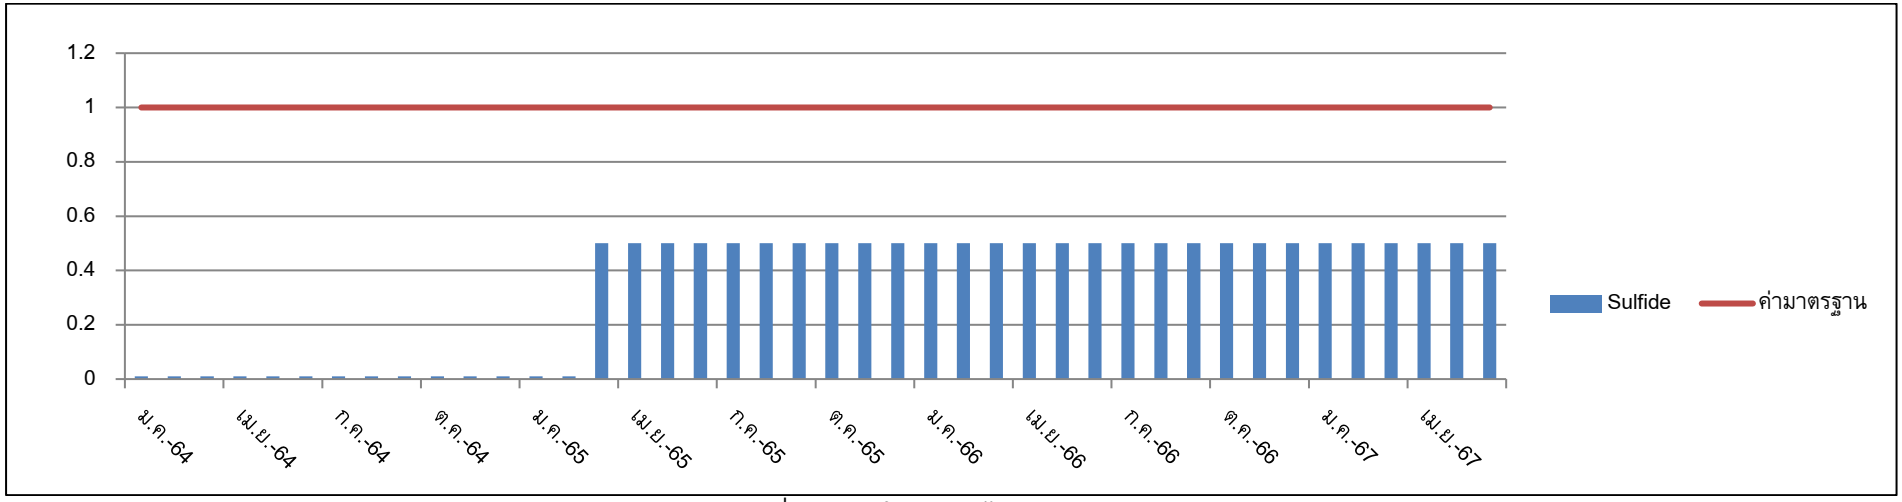


รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี

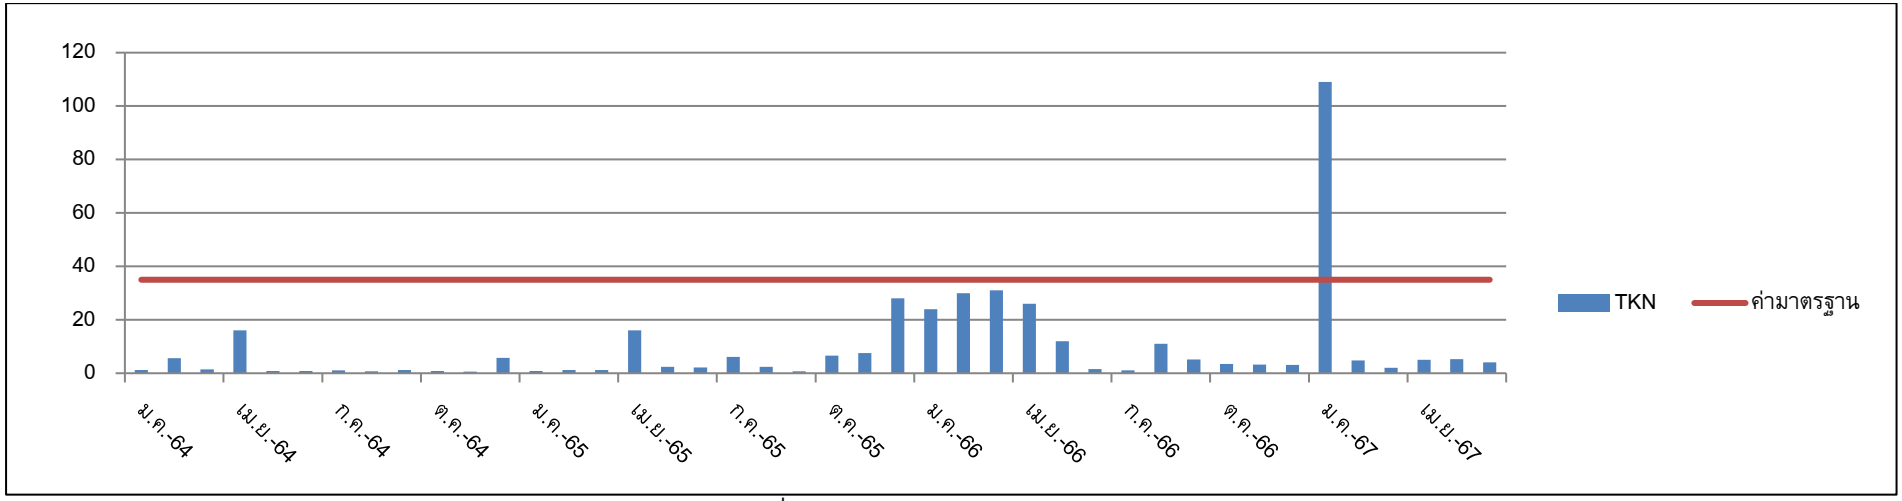

รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ 3.6 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เดือน – ปี	บีโอดี (มก./ล)		ประสิทธิภาพของระบบ (%)
	น้ำเสียเข้าระบบ	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	
มกราคม 2567	132	104	21.21
กุมภาพันธ์ 2567	86	9.2	89.30
มีนาคม 2567	142	24.9	82.46
เมษายน 2567	205	23	88.78
พฤษภาคม 2567	118	25.9	78.05
มิถุนายน 2567	103	17.2	83.30

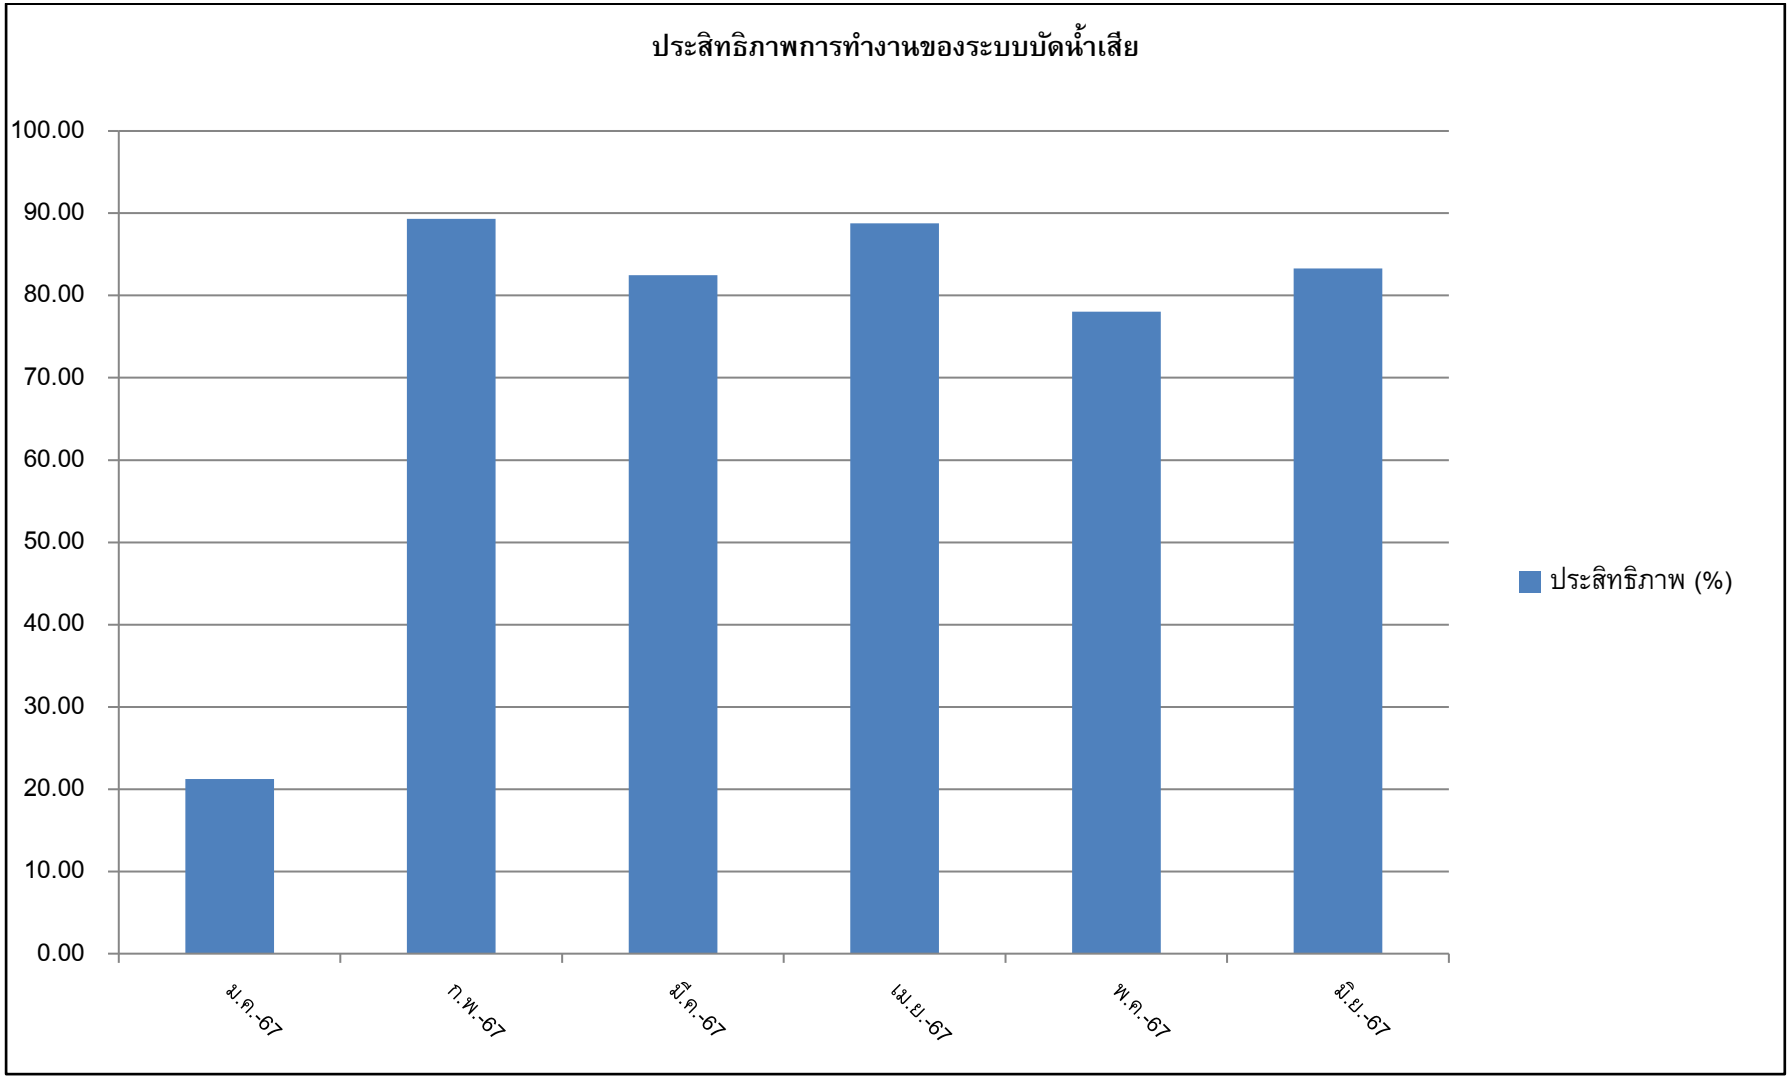

รูปที่ 3.10 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	มาตรฐาน
ความเป็นกรด – ด่าง	-	-	7.9	-	-	7.8	-	6.5 – 8.5
ของแข็งทั้งหมด	มก./ล.	-	260	-	-	296	-	< 1,000
ความกระด้างทั้งหมด	มก./ล.	-	250	-	-	272	-	< 500
สนิมเหล็กทั้งหมด	มก./ล.	-	0.01	-	-	0.07	-	< 0.3
คลอไรด์	มก./ล.	-	14	-	-	14	-	-
ซัลเฟต	มก./ล.	-	< 0.01	-	-	4.35	-	-
แมงกานีส	มก./ล.	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	มก./ล.	-	< 1.1	-	-	< 1.1	-	-
ลักษณะทางกายภาพ		-	ใส	-	-	ใส	-	

มาตรฐาน Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) Standard of Water Supply

ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179

ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	ม.ค. 67		ก.พ. 67		มี.ค. 67		เม.ย. 67		พ.ค. 67		มิ.ย. 67		มาตรฐาน
		Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	
pH	-	8.2	8.1	-	-	-	-	-	-	8.4	8.3	-	-	7.2 – 8.4
Total Hardness	mg/l	236	200	-	-	-	-	-	-	330	320	-	-	50 - 500
Chloride	mg/l	340	1470	-	-	-	-	-	-	890	1360	-	-	-
Turbidity	mg/l	0.49	0.35	-	-	-	-	-	-	0.97	0.94	-	-	-
Total Dissolve Solids	mg/l	838	2646	-	-	-	-	-	-	1798	2607	-	-	-
M-Alkalinity	mg/l	190	140	-	-	-	-	-	-	285	240	-	-	80 – 200
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	< 1.1	< 1.1	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	-	-	< 10
ลักษณะทางกายภาพ		ใส	ใส	-	-	-	-	-	-	ใส	ใส	-	-	

มาตรฐาน Thailand Industrial Standard of Drink Water

ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ/คุณภาพอากาศและเสียง ทรัพยากรดิน ลักษณะอุทกวิทยา คุณภาพน้ำ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุในมาตรการ

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ครอบคลุมในส่วนของนิเวศวิทยาทางน้ำ นิเวศวิทยาทางบก มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุในมาตรการ ยกเว้นการติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีแผนที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ครอบคลุมในส่วนของการใช้ประโยชน์ของที่ดิน การเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค การจัดการขยะมูลฝอย การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

การเกษตร ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การคมนาคมขนส่ง โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

สาธารณูปโภค โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการขยะมูลฝอย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

4.1.4 คุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งครอบคลุมด้าน เศรษฐกิจสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสาธารณสุข สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 คุณภาพน้ำ โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลหน้าพื้นที่โครงการและน้ำผิวดินภายในโครงการตามที่ระบุในมาตรการครบถ้วน

4.2.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงานและมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

คุณภาพน้ำทิ้งผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ทางโรงแรมได้ดำเนินการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่สม่ำเสมอและสามารถบำบัดน้ำเสียได้ดังนี้

- มีการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การทำงานของเครื่องเติมอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานเป็นปกติ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจเช็คพารามิเตอร์ต่างๆในบ่อเติมอากาศ เช่น ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกิน และมีการสูบตะกอนส่วนเกินทิ้งเมื่อมีปริมาณที่มากเกินความจำเป็น
- มีการตรวจสอบลักษณะของตะกอนจุลินทรีย์ในระบบ

4.3 การดำเนินการเพิ่มเติม

- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ดังเอกสารแสดงภาคผนวก ฉ
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ดังเอกสารแสดงภาคผนวก ช
- การวิเคราะห์ Legionella Spp. ดังเอกสารแสดงภาคผนวก ซ
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ IR ดังเอกสารแสดงภาคผนวก ฌ



ที่ วว 0804/ 10117

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๔ กันยายน 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6725 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 017/2544 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 019/2544 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2544
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ขนาดพื้นที่ 68 - 3 - 41 ไร่ โฉนดที่ดิน นส 3 ก. เลขที่ 267, 268, 475, 476 และ 655 จำนวนห้องพัก 246 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานโดยบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานพิจารณาดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/สำนักงาน ...

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และประเด็นหลุมฝังศพ/สุสานที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ซึ่งบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมให้สำนักงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำนักงานได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง สำนักงานขอความร่วมมือจังหวัดกระบี่ในการกำกับ และควบคุมดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 152
โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ที่ วว 0804/ 10117

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 กันยายน 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6725 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 017/2544 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 019/2544 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2544
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ขนาดพื้นที่ 68 - 3 - 41 ไร่ โฉนดที่ดิน นส 3 ก. เลขที่ 267, 268, 475, 476 และ 655 จำนวนห้องพัก 246 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานโดยบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานพิจารณาดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/สำนักงาน ...

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และประเด็นหลุมฝังศพ/สุสานที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ซึ่งบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมให้สำนักงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำนักงานได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานขอความร่วมมือจังหวัดกระบี่ในการกำกับ และควบคุมดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 152
โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ผู้ตรวจ
ผู้ทาน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ไฟล์.....แผ่น.....
แสดงความคิดเห็นของกรรมการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ขนาดพื้นที่ 68 - 3 – 41 ไร่ โฉนดที่ดิน นส 3 ก. เลขที่ 267, 268, 475, 476 และ 655 จำนวนห้องพัก 246 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานโดยบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแบบถังเกรอะ–กรองไร้อากาศ จากนั้นระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบ Extended Activated Sludge โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาดและที่ตั้ง ตามที่เสนอไว้ในรายงาน

3. โครงการต้องควบคุม บำรุง ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ และทำการสูบกากตะกอนออกไปกำจัดทุก 45 วัน รวมทั้งกำจัดกากไขมันตามระยะเวลาที่กำหนด

4. โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำอย่างน้อยขนาด 4,972.86 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน และต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้มากกว่า 1.377 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีรายละเอียดขนาดและที่ตั้งของบ่อหน่วงน้ำ และวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำตามที่เสนอไว้ในรายงาน

5. โครงการต้องทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

6. โครงการต้องไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล และ/หรือไม่กระทำการใด ๆ ล่วงล้ำ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง ปิดกั้น ลำรางสาธารณประโยชน์ที่มีภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากโครงการจะกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงลำรางสาธารณประโยชน์ โครงการจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. โครงการจะต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีขนาดและจำนวนเพียงพอ โดยแยกประเภทมูลฝอยเปียกและแห้ง ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่วางภาชนะรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

2/ 8. โครงการ...

8. โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้งมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ วิธีการติดตามตรวจสอบต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ

9. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

10. หากได้รับการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้นโดยไม่ชักช้า

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	ระยะก่อสร้าง - สภาพพื้นที่เปลี่ยนไปเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระยะก่อสร้าง - ไม่มีผลกระทบมีการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์	ระยะก่อสร้าง - ล้อมรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ไม่มีการใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร โครงการจะคงรักษาสภาพเดิม และที่เป็นที่ลุ่มมีการล้อมรั้วป้องกันคนงานก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่ - เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ - พื้นที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร จะมีการทำคันดิน และรางระบายน้ำชั่วคราวรวบรวมน้ำจากการก่อสร้างลงบ่อพักน้ำจำนวน 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, 2,636 ลูกบาศก์เมตร ระยะดำเนินการ - บริเวณพื้นที่ว่าง และพื้นที่ที่ไม่มีอาคาร จะปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม และป้องกันการชะล้างหน้าดิน และบริเวณที่เป็นที่ลุ่มจะรักษาให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด	
1.2 ภูมิอากาศ/คุณภาพอากาศ และเสียง	ระยะก่อสร้าง - มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง - ระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรกล และรถบรรทุกอยู่ในช่วงประมาณ 76-101 เดซิเบล (เอ) ในระยะห่าง 50 ฟุต จากแหล่งกำเนิด	ระยะก่อสร้าง - ใช้ผ้าใบปิดล้อมอาคารใหม่เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของของฝุ่นจากการก่อสร้าง - ฉีดพรมน้ำบนพื้นบริเวณที่มีรถบรรทุกเข้า-ออกเพื่อป้องกันฝุ่น - ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกที่ขนวัสดุเข้า-ออกโครงการ - ล้างเศษดินที่ติดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - จำกัดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างโดยให้อยู่ในระหว่าง 09.00-17.00 น. ถ้าจำเป็นในการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง เช่น การเท่คอนกรีต ไม่ควรเกิน 22.00 น. - ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุกให้อยู่ในสภาพใช้งาน	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ แต่จะมีผลกระทบจากระบบปรับอากาศ และระบายอากาศที่อาจขัดข้อง และแผ่นกรองไอน้ำมันจากห้องครัวอาจอุดตัน	ระยะดำเนินการ - ตรวจสอบดูแลและรักษาเปลี่ยนแผ่นกรองไอน้ำมันจากปล่องระบายควัน - ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่เสมอปีละ 1 ครั้ง	
1.3 ทรัพยากรดิน	ระยะก่อสร้าง - เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินลงสู่ทางน้ำ ระยะดำเนินการ - การชะล้างผิวหน้าดินจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากมีการปลูกหญ้า และปลูกต้นไม้	ระยะก่อสร้าง - บริเวณที่เปิดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ต้องทำแนวคันดิน รางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, 2,636 ลูกบาศก์เมตร ป้องกันน้ำชะล้างพื้นที่ก่อสร้างลงลำห้วย ระยะดำเนินการ - ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย - บริเวณปากท่อระบายน้ำ และท่อน้ำล้นจากบ่อพักน้ำ จะมีการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะ และควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิด-ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบ - ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม และป้องกันการชะล้างหน้าดิน	
1.4 ลักษณะทางอุทกวิทยา	ระยะก่อสร้าง - เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินลงสู่ทางน้ำ	ระยะก่อสร้าง - ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย - ควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด - ตรวจสอบเส้นท่อจ่ายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม - ตรวจสอบรางระบายน้ำชั่วคราว โดยเก็บขยะ และลอกดินออก	-

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบ	ระยะดำเนินการ - ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย - ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิด-ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบ - ตรวจสอบเส้นท่อจ่ายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม - ตรวจสอบรางระบายน้ำ โดยเก็บขยะ และลอกดินออก 2 เดือน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	
1.5 คุณภาพน้ำ 1.5.1 คุณภาพน้ำผิวดิน	ระยะก่อสร้าง - การชะล้างตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างไหลลงสู่ลำห้วยและออกสู่ทะเล - น้ำเสียจากที่พักคนงานก่อสร้างและการก่อสร้างอาจไหลลงสู่ลำห้วย ระยะดำเนินการ - น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 297.84 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตราเกิดน้ำเสียที่ 100%ของน้ำใช้ โครงการออกแบบระบบรองรับน้ำเสียที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน	ระยะก่อสร้าง - ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย - ก่อสร้างห้องส้วมที่มีระบบบ่อเกรอะบ่อซึมให้เพียงพอกับคนงาน (คนงาน 15 คน/ห้องส้วม) และต้องแยกห้องน้ำหญิง-ชาย - ตรวจสอบบ่อเกรอะบ่อซึม เมื่อมีปริมาณมากจนใกล้เต็มบ่อ โดยใช้รถดูดส้วมดูดตะกอนไปกำจัดทุก 3 เดือน - ห้ามคนงานก่อสร้างนำภาชนะในการก่อสร้างไปล้างในแหล่งน้ำ ระยะดำเนินการ - ควบคุมให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย โดยให้มีจุดปล่อยน้ำให้น้อยที่สุด	ระยะก่อสร้าง จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ - น้ำทะเลหน้าพื้นที่โครงการใกล้เกาะกวาง - น้ำผิวดินปากคลองเปลว ดัชนีที่ตรวจวัด - ความเป็นกรด-ด่าง/ของแข็งแขวนลอย/ออกซิเจนละลายน้ำ/บีโอดี/ไขมัน และน้ำมัน/แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มชนิดฟีคอล/แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ความถี่ในการตรวจวัด - ทุก 3 เดือน ระยะดำเนินการ จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ - น้ำทะเลหน้าพื้นที่โครงการใกล้เกาะกวาง - น้ำผิวดินปากคลองเปลว

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะนำไปรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำลงทางน้ำสาธารณะ โครงการจะมีเส้นท่อสำหรับนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่งไปตามพื้นที่ และมีจุดปล่อยน้ำในสนามเป็นระยะๆ	- ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ - น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย - ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดัชนีที่ตรวจวัด - ความเป็นกรด-ด่าง/ของแข็งแขวนลอย/ออกซิเจนละลายน้ำ/บีโอดี/ไขมัน และน้ำมัน/แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มชนิดฟีคอล/แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ความถี่ในการตรวจวัด - ปีละ 1 ครั้ง ช่วงฤดูการท่องเที่ยว
1.5.2 คุณภาพน้ำใต้ดิน	ระยะก่อสร้าง - น้ำเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึมอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน แต่อย่างไรก็ตามจุดติดตั้งบ่อเกรอะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำใต้ดินมากกว่า 30 เมตร ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบ	ระยะก่อสร้าง - ควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำ - ก่อสร้างห้องส้วมที่มีระบบบ่อเกรอะบ่อซึมให้เพียงพอกับคนงาน คนงาน 15 คน/ห้องส้วม และต้องแยกห้องน้ำหญิง-ชาย - ตรวจสอบบ่อเกรอะให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถดูดตะกอนในบ่อเกรอะออกอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบแต่ควรดำเนินการตามมาตรการคุณภาพน้ำผิวดิน	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ	ระยะก่อสร้าง - ความขุ่นของน้ำจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยเฉพาะลำห้วย แต่คาดว่ามีผลกระทบน้อย	ระยะก่อสร้าง - ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย - ก่อสร้างห้องส้วมที่มีระบบบ่อเกรอะบ่อซึมให้เพียงพอกับคนงาน (คนงาน 15 คน/ห้องส้วม) และต้องแยกห้องน้ำหญิง-ชาย - ตรวจสอบบ่อเกรอะบ่อซึม เมื่อมีปริมาณมากจนใกล้เต็มบ่อ โดยใช้รถดูดส้วมดูดตะกอนไปกำจัดทุก 3 เดือน - ห้ามคนงานก่อสร้างนำภาชนะในการก่อสร้างไปล้างในแหล่งน้ำ	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบ โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำไปรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ระบายลงลำห้วย	ระยะดำเนินการ - ติดตั้งป้ายประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเก็บชากปะการัง - ควบคุมให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสียโดยให้มีจุดปล่อยน้ำให้น้อยที่สุด - ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ - น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย - ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	
2.2 นิเวศวิทยาบนบก	ระยะก่อสร้าง - สูญเสียพื้นที่สีเขียว และพืชพรรณในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบ	ระยะก่อสร้าง - โครงการจะทำเครื่องหมายที่ต้นไม้ที่ต้องตัดฟัน และกั้นล้อมต้นไม้ที่ต้องรักษาไว้ และขุดล้อมต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นอาคารออกนำไปปลูกในบริเวณที่เหมาะสม - บริเวณที่เป็นที่ลุ่มที่พันธุ์ไม้ป่าชายเลน จะล้อมรั้วป้องกันคนงานเข้าไปในพื้นที่ ระยะดำเนินการ - บำรุงดูแลรักษาต้นไม้อยู่เสมอ - บริเวณที่เป็นที่ลุ่มที่พันธุ์ไม้ป่าชายเลน โครงการจะรักษาให้คงสภาพเดิม และปลูกเพิ่มเติมให้เป็นที่อยู่ของสัตว์หน้าดินโดยเฉพาะปู - ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<u>ระยะก่อสร้าง</u> - พื้นที่โครงการอยู่นอกเขตผังเมืองรวมกระบี่ จึงไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ตั้งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตำบลเกี่ยวกับขนาดความสูงของอาคาร - พื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมไปเป็นพาณิชยกรรม	<u>ระยะก่อสร้าง</u> - การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามข้อบังคับตำบลนหองทะเล พื้นที่ (ต...) และประกาศกำหนดขอบเขตพื้นที่ควบคุมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พื้นที่ (ว..) แต่ละอาคารจะมีความสูงดังนี้ 1. อาคารต้อนรับ มีความสูง 16 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.3/ต.4 ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 16 เมตร 2. อาคารพักอาศัย มีความสูง 11.85 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.2/ต.3 จำนวน 6 อาคาร ก่อสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร และอยู่ในพื้น ว.3/ต.4 จำนวน 2 อาคาร 3. อาคารพักพนักงานทั่วไป 2 อาคาร สูง 11.9 เมตร และอาคารพักพนักงานระดับบริหาร 1 อาคารสูง 8.70 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.3/ต.4 4. อาคารร้านอาหาร (Pasta & Prawns) สูง 9.6 เมตร และร้านFun Pub & Bar สูง 11.5 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ว.2/ต.3 5. อาคารศึกษาสำหรับเด็ก สูง 7.1 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.2/ต.3 6. อาคารสุขภาพและความงามสูง 9.0 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.2/ต.3 7. อาคารศูนย์ออกกำลังกายสูง 9.0 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.3/ต.4 8. อาคารวิศวกรรมสูง 7.2 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.3/ต.4 9. อาคารเก็บรถกอล์ฟสูง 6.2 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.3/ต.4 10.อาคารเก็บเรือและอุปกรณ์ทางน้ำสูง 5.7 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.1/ต.2 ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 6 เมตร 11.อาคารห้องเครื่องปั๊มน้ำสูง 16 เมตร อยู่ในพื้นที่ ว.3/ต.4	-

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระยะดำเนินการ - พื้นของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมไปเป็นย่านพานิชกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อชุมชน	ระยะดำเนินการ - พื้นที่บริเวณหลุมฝังศพบรรพบุรุษ เป็นของเจ้าของที่ดินเดิม โครงการปล่อยให้คงสภาพเดิม ญาติเจ้าของสุสานสามารถเข้ามายังสุสานได้ดังเดิม และโครงการไม่มีแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว	
3.2 เกษตรกรรม	ระยะก่อสร้าง/ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบ พื้นที่โครงการไม่ได้ทำประโยชน์ที่รกร้าง	ระยะก่อสร้าง/ระยะดำเนินการ - ไม่มีมาตรการ	
3.3 การคมนาคมขนส่ง	ระยะก่อสร้าง - รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้ถนนบ้านคลองม่วง-บ้านทับแขก และถนนกรมโยธาธิการ บ้านหนองทะเล-บ้านคลองม่วง เป็นถนนสายหลักมีสภาพความคล่องตัวดี - อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างอาจเพิ่มขึ้น - ถนนสายบ้านคลองม่วง-บ้านทับแขกอาจได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ ระยะดำเนินการ - อาจเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออกบริเวณทางเข้า - อุบัติเหตุจากพนักงานจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อก	ระยะก่อสร้าง - ควบคุมมิให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างบรรทุกเกินพิกัด - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกมิให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณ 1. ปากทางเข้า-ออก ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายโครงการ และติดตั้งไฟส่องสว่าง 2. ระยะ 200 เมตร จากทางเข้า-ออกติดตั้งป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง - 3. ที่สามแยกตัดกับถนนโยธาธิการบ้านหนองทะล-บ้านคลองม่วง ติดตั้งป้ายโครงการ - จัดให้มีเวรยามรักษาการและอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ควบคุมให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ระยะดำเนินการ - จัดพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออกโรงแรม - ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายเตือนในบริเวณ 1. ปากทางเข้า-ออก ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายโครงการ และไฟส่องสว่าง 2. ระยะ 200 เมตร จากปากทางเข้าออกติดตั้งป้ายบอกระยะทาง	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ที่สามแยกตัดกับถนนโยธาธิการบ้านหนองทะล-บ้านคลองม่วง ติดตั้งป้ายโครงการ - ออกข้อบังคับให้พนักงานที่ใช้รถมอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับรถมอเตอร์เข้ามาทำงาน	
3.4 สาธารณูปโภค	ระยะก่อสร้าง - ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ - น้ำใช้อาจจะมีผลกระทบบางในกรณีที่โครงการจะใช้น้ำจากการประปาหมู่บ้านทับแขกเป็นแหล่งน้ำสำรอง - ในกรณีซื้อน้ำจากเอกชนไม่สามารถจัดส่งให้โครงการได้ ระยะดำเนินการ - ไฟฟ้า : ไม่มีผลกระทบ - น้ำใช้ : ความต้องการใช้น้ำประมาณ 597.84 ลบ.ม./วัน ดังนี้ (1) น้ำใช้สำหรับอาคารโรงแรม 255.84 ลบ.ม./วัน (2) น้ำใช้ในอาคารพักพนักงาน 42 ลบ.ม./วัน (3) น้ำใช้ในสระว่ายน้ำ 50 ลบ.ม./วัน (น้ำใช้หมุนเวียนในสระ) (4) น้ำใช้รดน้ำต้นไม้ 250 ลบ.ม./วัน (ใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด) ซื้อน้ำจากเอกชน มาเก็บในถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม. และทำการปรับปรุงคุณภาพ สูบจ่ายไปตามเส้นท่อต่อไป - โทรศัพท์ : ไม่มีผลกระทบ	ระยะก่อสร้าง - ควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำโดยกำหนดให้มีจุดใช้น้ำให้น้อยที่สุด - กรณีที่ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านทับแขกควรนำน้ำมาใช้ในช่วงที่ชุมชนใช้น้ำน้อย เช่นในช่วงกลางคืนเก็บน้ำไว้ในถังเก็บน้ำ - เก็บน้ำสำรองในถังเก็บน้ำขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถังอยู่ตลอดเวลา ระยะดำเนินการ - ควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำโดยกำหนดให้มีจุดใช้น้ำให้น้อยที่สุด - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด - ตรวจสอบเมื่อพบว่ามีการรั่วซึมของเส้นท่อต้องซ่อมแซมทันที	
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	ระยะก่อสร้าง - มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 324 กิโลกรัม/วัน (980 ลิตร/วัน)	ระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณอาคารที่พักคนงาน สำนักงาน และพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมไปกำจัดตามความเหมาะสมของปริมาณ	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระยะดำเนินการ - การประเมินตามเกณฑ์ขั้นต่ำฯ สผ. 1 กิโลกรัม/คน/วัน มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 642 กิโลกรัม/วัน (1.93 ลบ.ม./วัน) ผู้ออกแบบห้องพักขยะให้รองรับได้สูงสุด 7.83 ลบ.ม/วัน หรือ 2,2349 กิโลกรัม/วัน - โครงการจะทำการเก็บจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ มาเก็บพักในห้องพักขยะมูลฝอยเปียกขนาด 9 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง และขยะมูลฝอยแห้ง ขนาด 90 ตร.ม. จำนวน 1 ห้อง สามารถเก็บพักได้ 3 วัน และจะเก็บขนส่งไปกำจัดยังพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่	ระยะดำเนินการ - โครงการจะมีการคัดแยกชนิดของขยะมูลฝอย ตามลักษณะขยะมูลฝอย เพื่อนำส่วนที่ขายได้ไปขายต่อให้เป็นรายได้ของพนักงาน - จัดซื้อรถขนขยะมูลฝอย 4 ล้อเล็ก ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์หลา ถังบรรทุกขยะเป็นแบบเปิดข้างเทท้ายปิดมิดชิด - ทำการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัดที่เทศบาลเมืองกระบี่ทุกวัน วันละ 3 เวลา คือ 8.00-9.00 น. / 11.00-12.00 น. และ 15.30-16.00 น. หรือตามปริมาณของมูลฝอยที่เกิดขึ้น - ทำความสะอาดห้องพักขยะ และรถบรรทุกขยะมูลฝอยทุกครั้งหลังการจัดเก็บ	
3.6 การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ระยะก่อสร้าง - มีปริมาณน้ำเสียจากการขับถ่ายและชำระล้างของคนงานประมาณ 30 ลบ.ม./วัน ซึ่งมีบ่อเกรอะ-บ่อซึมเป็นระบบบำบัดเบื้องต้น	ระยะก่อสร้าง - ควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยกำหนดให้มีจุดที่ใช้น้ำน้อยที่สุด และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์จ่ายน้ำ - ก่อสร้างห้องส้วมที่มีระบบบ่อเกรอะบ่อซึมให้เพียงพอกับคนงาน (คนงาน 15 คน/ห้องส้วม) และต้องแยกห้องน้ำหญิง-ชาย - ห้องน้ำห้องส้วมให้อยู่ห่างจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 30 เมตร และ ตรวจสอบบ่อเกรอะให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถดูดตะกอนในบ่อเกรอะออกอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ต้องทำคันดิน และรางระบายน้ำป้องกันน้ำเสียจากการก่อสร้างไหลลงทางน้ำสาธารณะ และน้ำฝนที่ชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลบ.ม. ควบคุมการระบายน้ำ ออกจากบ่อพัก และทำการเก็บรวบขยะออกจากบ่อพักน้ำ ก่อนระบายน้ำลงลำห้วย - บริเวณที่มีการจ่ายน้ำ ห้องน้ำห้องส้วม จะต้องมีขอบคัน และรางระบายน้ำชั่วคราวป้องกันไหลลงทางน้ำสาธารณะ	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<u>ระยะดำเนินการ</u> - น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 297.84 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตราเกิดน้ำเสียที่ 100%ของน้ำใช้ โครงการออกแบบระบบรองรับน้ำเสียที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน - น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะนำไปรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำลงทางน้ำสาธารณะ โดยโครงการจะมีเส้นท่อสำหรับนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่งไปตามพื้นที่ และมีจุดปล่อยน้ำในสนามเป็นระยะๆ	- ประกาศห้ามคนงานก่อสร้างล้างอุปกรณ์เครื่องมือในทางน้ำลำห้วย <u>ระยะดำเนินการ</u> - ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ - น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย - ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ <u>*ถังบำบัดสำเร็จรูป/ถังเกรอะ*</u> 1. ทำการดักตะกอน (Night soil) ทุก 45 วัน 2. ฉีดน้ำล้างหรือใช้ไม้แซะตะกอนจุลชีพที่แผ่นกรองที่มีจุลชีพ (Bacterial) เกาะติดอยู่หนาทุก 6-8 เดือน/ครั้ง 3. ถังดักไขมันที่ติดกับอ่างล้างจานกำจัดไขมันออกทุก 1-2 วัน/ครั้ง 4. บ่อดักไขมันให้กำจัดไขมันและตะกอนออกทุก 45 วัน <u>*ระบบบำบัดส่วนกลาง*</u> 1. ช้อนขยะที่ถังตกตะกอนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 2. ทำความสะอาดรางรับน้ำในถังตกตะกอน 3. นำตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 45 วัน	<u>ระยะดำเนินการ</u> - ตรวจสอบการตกตะกอน (30-minute setting test) 1-2 สัปดาห์/ครั้ง - ตรวจวัดความสูงชั้นตะกอนในถังเติมอากาศ 3-4 สัปดาห์/ครั้ง - วิเคราะห์ค่า BOD, SS น้ำที่ผ่านการบำบัดทุกเดือน
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<u>ระยะก่อสร้าง</u> - การชะล้างตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างไหลลงลำห้วยและออกสู่ทะเล - เศษขยะ ใบไม้ และตะกอนดิน ทับถมในรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	<u>ระยะก่อสร้าง</u> - ทำคันดิน รางระบายน้ำชั่วคราว รวบรวมน้ำจากการก่อสร้างและน้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ก่อสร้างให้ไหลลงบ่อพักน้ำจำนวน 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร - ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักน้ำ โดยนำเศษขยะ เศษใบไม้ และขุดลอกเมื่อมีตะกอนดินทับถม	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระยะดำเนินการ - ปริมาณน้ำฝน 3 ชั่วโมง ที่เกิดขึ้นก่อนมีโครงการมีปริมาณน้ำฝน 14,872.14 ลบ.ม. ในกรณีที่มีโครงการ สภาพพื้นที่เปลี่ยนเป็นอาคารปกคลุมมีพื้นที่ 18,418 ตารางเมตร จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 19,845 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,972.86 ลูกบาศก์ก์เมตร โครงการได้ก่อสร้างบ่อพัก 5 บ่อขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,616 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมการระบายน้ำให้มีสภาพเท่าเดิมก่อนมีโครงการ	ระยะดำเนินการ - ตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ โดยนำเศษขยะ เศษใบไม้ และขุดลอกเมื่อมีตะกอนดินทับถม - ติดตั้งตะแกรงดักขยะและประตูระบายน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้าย - ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย - ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิด-ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบดังนี้ 1. ช่วงเวลาปกติ (ก่อนฝนตก) เปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดหรือจะเปิดตามที่ออกแบบไว้ของแต่ละบ่อ คือ บ่อที่ 1 เปิด 12 ซม. บ่อที่ 2 เปิด 11 ซม. บ่อที่ 3 เปิด 6 ซม. บ่อที่ 4 เปิด 3 ซม. บ่อที่ 5 เปิด 5 ซม. 2. เมื่อฝนตกระดับในทางน้ำสูงขึ้นแต่ยังไม่สูงกว่าระดับในบ่อพัก ให้เปิดประตูระบายน้ำที่ออกแบบไว้ คือ บ่อที่ 1 เปิด 12 ซม. บ่อที่ 2 เปิด 11 ซม. บ่อที่ 3 เปิด 6 ซม. บ่อที่ 4 เปิด 3 ซม. บ่อที่ 5 เปิด 5 ซม. 3. เมื่อระดับภายนอกสูงกว่าระดับในบ่อพัก ให้ปิดประตูระบายน้ำ 4. เมื่อระดับในบ่อพักสูงจนถึงท่อน้ำล้นน้ำจะระบายออกท่อน้ำล้น 5. เมื่อฝนหยุดตกระดับในทางน้ำลดลงให้เปิดประตูระบายน้ำเท่าที่คำนวณไว้จนถึงระดับน้ำในบ่อพักก่อนฝนตก	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจสังคม	ระยะก่อสร้าง - มีความต้องการแรงงานก่อสร้างโครงการประมาณ 300 คน - ร้านค้าในชุมชนมีรายได้จากการขายของให้คนงานเพิ่มขึ้น	ระยะก่อสร้าง - ควรพิจารณาเลือกแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ปัญหาระหว่างคนงานต่างถิ่นกับชุมชน เช่น การทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด เป็นต้น <u>ระยะดำเนินการ</u> - มีความต้องการจ้างพนักงานประมาณ 300 คน โดยทำงานเป็นกะ ๆ ละ 150 คน - จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อร้านค้า และธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น การเช่าเรือประมงขนาดเล็ก	- ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมลภาวะจากการก่อสร้างมิให้รบกวนต่อนักท่องเที่ยว และชุมชนรอบข้าง <u>ระยะดำเนินการ</u> - ควรพิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นให้เข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<u>ระยะก่อสร้าง</u> - อาจเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักร หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือเครื่องมืออยู่ในสภาพชำรุด - มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เนื่องจากรถบรรทุกขนวัสดุก่อสร้าง หากประมาณและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร <u>ระยะดำเนินการ</u> - โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมใช้อุปกรณ์ และการป้องกันอัคคีภัยทุกปี	<u>ระยะก่อสร้าง</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นตามลักษณะงานให้คนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน - ควบคุมคนขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎจราจร - ล้อมรั้วพื้นที่ก่อสร้าง และควบคุมการเข้า-ออก โดยห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ก่อสร้าง - ติดตั้งป้ายแสดงเขตห้ามเข้า ป้ายหรือสัญญาณไฟบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง <u>ระยะดำเนินการ</u> - ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง - เก็บถังก๊าซ LPG ตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ โดยวางบนพื้นคอนกรีตเรียบ ผนังเป็นรั้วโปร่งมีโซ่รัดถังยึดติดผนัง และติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้งชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์ และติดตั้งวาล์วอัตโนมัติ เพื่อตัดก๊าซกรณีที่มีการรั่วไหล	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข	ระยะก่อสร้าง - คนงานต่างถิ่นอาจนำโรคต่างถิ่นเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน - การจัดการด้านสุขาภิบาลพื้นที่พักอาศัยคนงานก่อสร้าง เช่น การจัดหาน้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม และการจัดการขยะมูลฝอยไม่ดีพอแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน และอาจเป็นแหล่งสะสมแพร่เชื้อโรคสู่ชุมชนได้ - อุบัติเหตุจากกิจกรรมก่อสร้าง และจากรถบรรทุก - การฟุ้งกระจายฝุ่นละอองจากรถบรรทุกมีผลต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางและพื้นที่ก่อสร้าง ระยะดำเนินการ - ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข	ระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้คนงานต่างถิ่นได้รับการตรวจร่างกายก่อนเข้ามาทำงาน - ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่คนงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ - ประสานกับสถานีอนามัยบ้านคลองม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย - ป้องกันลดผลกระทบฝุ่นละอองให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ และการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด	
4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	ระยะก่อสร้าง - การจัดการก่อสร้างที่ไม่เรียบร้อยอาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่สวยงาม และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - การแพร่กระจายของตะกอนดินไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะมีผลความขุ่นของน้ำทะเล ที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเล่นน้ำได้	ระยะก่อสร้าง - จะต้องมีการปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพน้ำ จัดการน้ำเสีย และขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำทะเล และความสะอาดเรียบร้อยพื้นที่ชายหาดหน้าโครงการ - โครงการจะทำเครื่องหมายที่ต้นไม้ที่ต้องตัดฟัน และกั้นล้อมต้นไม้ที่ต้องรักษาไว้ และขุดล้อมต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นอาคารออกนำไปปลูกในบริเวณที่เหมาะสม - บริเวณที่เป็นที่ลุ่มที่พันธุ์ไม้ป่าชายเลน จะล้อมรั้วป้องกันคนงานเข้าไปในพื้นที่	

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล (KRABI RESORT HOTEL)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระยะดำเนินการ - ทางโครงการได้ออกแบบโรงแรมให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร และข้อบังคับตำบลหนองทะเล รวมทั้งพื้นที่โครงการที่ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้าง จะทำการปลูกต้นไม้เพิ่ม และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม	ระยะดำเนินการ - ทำความสะอาดชายหาด โดยเก็บขยะมูลฝอยที่พัดพามากับคลื่นหรือที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนในท้องถิ่นทิ้งไว้ - เก็บเศษไม้ ขยะมูลฝอยในลำห้วยทุกวัน - ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงามตลอดเวลา - รักษาสภาพพื้นที่บริเวณที่ลุ่มที่มีไม้ป่าชายเลนขึ้นให้มีสภาพสมบูรณ์เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าดิน เช่น ปูก้ามดาบ - ปลูกต้นไม้เสริม โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ที่เป็นแหล่งอาหารของนก - ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับ ไม้ดอกบริเวณลำห้วยให้สวยงาม	

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๘๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๓/๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด**
โดย น.ส.อาทร วนาสันตกุล และ นายอภิชาติ กมลธรรม

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **ดุสิต ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Dusit Thani Krabi Beach Resort

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๒๔๐ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล**
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **๒๕๖๔**

พันตำรวจโท
(หม่อมหลวงกิตติ ประวิตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

17/8/21

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400508 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 13/02/67 **Analyzed Date:** 13/02/67 - 22/02/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Surface water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 12/02/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400510-1 Canel Water	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	7.6	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	3.8	≤ 1.5
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	8.0	-
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	-
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Azide Modification	7.10	≥ 6.0
6	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	790	≤ 5000
7	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	790	≤ 1000
	Sampling Time:	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H^{+}B

Source : Notification of the National Environmental Board, No.8,B.E.2537 (1994), issued under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act B.E.2535 (1992) , published in the Royal Government Gazette, Vol.111, Part 16, dated February 24, B.E.2537 (1994).

- : None

< : Less than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
22/02/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
22/02/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400509 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 13/02/67 **Analyzed Date:** 13/02/67 - 22/02/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Sea Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 12/02/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400511-1 Sea Water	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	7.9	7.0 - 8.5
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	4.2	-
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	19.0	-
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	≤ 0.5
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Azide Modification	7.85	≥ 4
6	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	<1.8	≤ 1000
7	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	<1.8	-
	Sampling Time:	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใสมีตะกอน	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H^{+}B

*Source : Notification of the National Environmental Board No.27, date December 26, B.E.2549 (2006), Issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Qulity Act B.E.2535(1992), published in the Royal Government Gazette Vol.124, Part 11, dated February B.E.2550 (2007)

Total Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 ml mean not found

Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 ml mean not found

- : None

< : Less than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
22/02/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
22/02/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400226 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 16/01/67 **Analyzed Date:** 16/01/67 - 29/01/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 15/01/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400203-1 Influent	St2400203-2 Effluent	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	[2] 7.5	[2] 7.4	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	132	104	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	68.0	1344	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	-	406	≤ 500**
5	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	1000	≤ 0.5
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	8	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric	-	2.8	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	-	109	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองขุ่น	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 $H^{+}B$

[2] รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*Source : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Volume 122, Special Section 125ง, dated November 7, B.E. 2548 (2005) : Building Class A

**These values are in addition to the TDS of the water for normal use.

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
30/01/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
30/01/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400506 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 13/02/67 **Analyzed Date:** 13/02/67 - 22/02/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 12/02/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400508-1 Influent	St2400508-2 Effluent	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	[2] 7.5	[2] 7.6	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	86	9.2	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	50.0	42.0	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	-	468	≤ 500**
5	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	≤ 0.5
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	14	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	-	4.76	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองขุ่น	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 $H^{+}B$

[2] รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*Source : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Volume 122, Special Section 125ง, dated November 7, B.E. 2548 (2005) : Building Class A

**These values are in addition to the TDS of the water for normal use.

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
22/02/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
22/02/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400996 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 20/03/67 **Analyzed Date:** 20/03/67 - 04/04/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 19/03/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400966-1 Influent	St2400966-2 Effluent	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	[2] 7.3	[2] 7.4	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	142	24.9	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	66.0	45.5	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	-	508	≤ 500**
5	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	60	≤ 0.5
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	13	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	-	2.03	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองขุ่น	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 $H^{+}B$

[2] รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*Source : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Volume 122, Special Section 125ง, dated November 7, B.E. 2548 (2005) : Building Class A

**These values are in addition to the TDS of the water for normal use.

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
04/04/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
04/04/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0083

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2401372 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 23/04/67 **Analyzed Date:** 23/04/67 - 06/05/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 22/04/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401377-1 Influent	St2401377-2 Effluent	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	[2] 7.4	[2] 8.2	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	205	23.0	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	65.0	56.0	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	-	442	≤ 500**
5	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	60	≤ 0.5
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	23	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	-	4.99	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองขุ่น	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 $H^{+}B$

[2] รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*Source : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Volume 122, Special Section 125ง, dated November 7, B.E. 2548 (2005) : Building Class A

**These values are in addition to the TDS of the water for normal use.

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
06/05/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
06/05/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2401624 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 08/05/67 **Analyzed Date:** 08/05/67 - 24/05/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 07/05/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401575-1 Influent	St2401575-2 Effluent	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	[2] 7.2	[2] 7.3	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	118	25.9	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	66.0	60.0	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	-	505	≤ 500**
5	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	≤ 0.5
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	8	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	-	5.27	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองขุ่น	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 $H^{+}B$

[2] รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*Source : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Volume 122, Special Section 125ง, dated November 7, B.E. 2548 (2005) : Building Class A

**These values are in addition to the TDS of the water for normal use.

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
24/05/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
24/05/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2402197 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 25/06/67 **Analyzed Date:** 25/06/67 - 08/07/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 24/06/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2402194-1 Influent	St2402194-2 Effluent	Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	[2] 7.0	[2] 7.6	5.0 - 9.0*
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	103	17.2	≤ 20*
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	51.5	36.5	≤ 30*
4	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	-	455	≤ 500**
5	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	≤ 0.5*
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	7	<5	≤ 20*
7	Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0*
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	-	4.10	≤ 35*
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองขุ่น	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H^{+}B

[2] รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*Source : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Volume 122, Special Section 125ง, dated November 7, B.E. 2548 (2005) : Building Class A

**These values are in addition to the TDS of the water for normal use.

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
08/07/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
08/07/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400228 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 16/01/67 **Analyzed Date:** 16/01/67 - 29/01/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Supply water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 15/01/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400205-1 Swimming Pool จุด Cocovida Pool	St2400205-2 Swimming Pool จุด Breeze Pool	* Standard
1	pH (at 25 ^{o}C)	-	[1]In house method : St-T01-01	8.2	8.1	7.2 - 8.4
2	Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	236	200	50 - 500
3	Chloride	mg/l as Cl^-	Argentometric	340	1470	-
4	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.49	0.35	-
5	Total Dissolved Solids	mg/l as NaCl	Electrometric	838	2646	-
6	M - Alkalinity	mg/l as $CaCO_3$	Titration	190	140	80 - 100
7	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	<1.1	<1.1	< 10
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	ใส	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H^+B

*Source : Referring to the advice of the Public Health Commission NO. 1/2550 on Controlling the operation of Swimming pool or orther businesses in kewise

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 ml mean not found

- : None

< : Less Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
30/01/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
30/01/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2401626 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 08/05/67 **Analyzed Date:** 08/05/67 - 24/05/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Supply water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 07/05/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401577-1 Swimming Pool จุด Cocovida Pool	St2401577-2 Swimming Pool จุด Breeze Pool	* Standard
1	pH (at 25 ^{o}C)	-	[1]In house method : St-T01-01	8.4	8.3	7.2 - 8.4
2	Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	330	320	50 - 500
3	Chloride	mg/l as Cl^-	Argentometric	890	1360	-
4	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.97	0.94	-
5	Total Dissolved Solids	mg/l as NaCl	Electrometric	1798	2607	-
6	M - Alkalinity	mg/l as $CaCO_3$	Titration	285	240	80 - 100
7	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	<1.1	<1.1	< 10
	Sampling Time:	-	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	ใส	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H^+B

*Source : Referring to the advice of the Public Health Commission NO. 1/2550 on Controlling the operation of Swimming pool or orther businesses in kewise

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 ml mean not found

- : None

< : Less Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
24/05/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
24/05/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400507 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 13/02/67 **Analyzed Date:** 13/02/67 - 22/02/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Supply Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 12/02/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400509-1 Domestic Water	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	7.9	6.5 - 8.5
2	Total Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	260	< 1000
3	Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	250	< 500
4	Total Iron	mg/l as Fe	Phenanthroline	0.01	< 0.3
5	Chloride	mg/l as Cl^-	Argentometric	14	-
6	Sulfate	mg/l as SO_4^{2-}	Turbidimetric	<0.10	-
7	Manganese	mg/l as Mn^{2+}	Persulfate	<0.02	-
8	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	<1.1	-
	Sampling Time:	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H^+B

*Source : Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) standard of water supply.

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 ml mean not found

- : None

< : Less than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
22/02/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
22/02/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2401625 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 08/05/67 **Analyzed Date:** 08/05/67 - 24/05/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Supply Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 07/05/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401576-1 Domestic Water	* Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	[1]In house method : St-T01-01	7.8	6.5 - 8.5
2	Total Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	296	< 1000
3	Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	272	< 500
4	Total Iron	mg/l as Fe	Phenanthroline	0.07	< 0.3
5	Chloride	mg/l as Cl^-	Argentometric	14	-
6	Sulfate	mg/l as SO_4^{2-}	Turbidimetric	4.35	-
7	Manganese	mg/l as Mn^{2+}	Persulfate	<0.02	-
8	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	<1.1	-
	Sampling Time:	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark

[1] In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H^+B

*Source : Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) standard of water supply.

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 ml mean not found

- : None

< : Less than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
24/05/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
24/05/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67012501231 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	18/01/2567	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	18/01/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67007174001	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	15/01/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	2 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Incoming Supply St2400200-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ
1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 18/01/2567
วันที่ออกรายงาน 25/01/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67012501230

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 18/01/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 18/01/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67007174002	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 15/01/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 2 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Cooling Tower St2400201-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 18/01/2567
วันที่ออกรายงาน 25/01/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67012501229

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 18/01/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 18/01/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67007174003	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 15/01/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Drain air ตึก F ห้อง 255 St2400202-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3. ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 18/01/2567
วันที่ออกรายงาน 25/01/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67022200313

หนังสือนำส่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	14/02/2567	ที่อยู่	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	14/02/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67018446001	วันที่เก็บตัวอย่าง	12/02/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Guest Room St2400507-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ	นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์ นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
ผู้ตรวจสอบ	นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ	15/02/2567
วันที่ออกรายงาน	22/02/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032800335 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 21/03/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 21/03/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67034577001	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 19/03/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Spa ห้อง 1 St2400961-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 21/03/2567
วันที่ออกรายงาน 28/03/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032800333

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	21/03/2567	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	21/03/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67034577002	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	19/03/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Water Storage Tank St2400962-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ	นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์ นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ	นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ	21/03/2567
วันที่ออกรายงาน	28/03/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032800332

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	21/03/2567	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	21/03/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67034577003	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	19/03/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Room Hot Water (Shower) ตึก F ห้อง 359 St2400963-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 21/03/2567
วันที่ออกรายงาน 28/03/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032800331

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 21/03/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 21/03/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67034577004	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 19/03/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Room Hot Water (Sink) ตึก F ห้อง 359 St2400964-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 21/03/2567
วันที่ออกรายงาน 28/03/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032800330

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 21/03/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 21/03/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67034577005	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 19/03/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Drain air (ถาดแอร์ห้องรับแขก) ตึก G ห้อง 269 St2400965-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 21/03/2567
วันที่ออกรายงาน 28/03/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67050300998

หนังสือนำส่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	24/04/2567	ที่อยู่	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	24/04/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67048120001	วันที่เก็บตัวอย่าง	22/04/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	2 ขวด ขวดละ 250 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Spa (Jucuzzi ห้อง 4) St2401372-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ	นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์ นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ	นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ	24/04/2567
วันที่ออกรายงาน	03/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67050300997

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	24/04/2567	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	24/04/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67048120002	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	22/04/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	2 ขวด ขวดละ 250 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Heater Tank (Spa ห้อง 4) St2401373-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 24/04/2567
วันที่ออกรายงาน 03/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67050300996 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	24/04/2567	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	24/04/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67048120003	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	22/04/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	2 ขวด ขวดละ 250 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Received St2401374-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 24/04/2567
วันที่ออกรายงาน 03/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67050300995 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	24/04/2567	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	24/04/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67048120004	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	22/04/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	2 ขวด ขวดละ 250 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Swimming Pool (Cocovida) St2401375-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ
1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 24/04/2567
วันที่ออกรายงาน 03/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67050300994

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 24/04/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 24/04/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67048120005	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 22/04/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 2 ขวด ขวดละ 250 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Swimming Pool (Breeze) St2401376-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 24/04/2567
วันที่ออกรายงาน 03/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67051700622

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 09/05/2567	ที่อยู่ 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 09/05/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67053977001	วันที่เก็บตัวอย่าง 07/05/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Incoming Supply St2401572-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 09/05/2567
วันที่ออกรายงาน 17/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67051700620

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 09/05/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 09/05/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67053977002	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 07/05/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Cooling Tower St2401573-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ
1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 09/05/2567
วันที่ออกรายงาน 17/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67051700618

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 09/05/2567	**ที่อยู่** 30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง 09/05/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67053977003	**วันที่เก็บตัวอย่าง** 07/05/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Drain air (ถาดแอร์ห้องรับแขก) ตึก G ห้อง 163 St2401574-1	
ลักษณะตัวอย่าง -	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

หมายเหตุ
1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
วันที่ทดสอบ 09/05/2567
วันที่ออกรายงาน 17/05/2567

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2400227 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 16/01/67 **Analyzed Date:** 16/01/67 - 29/01/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 15/01/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400204-1 Irrigation	* Standatd
1	Residual Chlorine	mg/l as Cl_2	DPD Colorimetric	<0.01	1.0
2	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	700	≤4000**
	Sampling Time:	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	-

Remark

*Source : Summarized from Royal Irrigation Deparment Order No. 883/2532 (1989) , dated 19 December B.E. 2532 (1989) 2532

**Standard (By The National Environmental Committee) of surface water quality class 3 (The source that receives effluent of some activity and may be used for agriculture and utilization after usual qualifying and disinfection)

- : None

< : Less than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
30/01/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
30/01/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 **Report No.** 2401373 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthala , Maung , Krabi 81000

Received Date: 23/04/67 **Analyzed Date:** 23/04/67 - 06/05/67 **Sampling by:** Customer

Sampling Type: Waste Water **Sampling Site:** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date: 22/04/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401378-1 Irrigation	* Standatd
1	Residual Chlorine	mg/l as Cl_2	DPD Colorimetric	0.10	1.0
2	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	68	≤4000**
	Sampling Time:	-	-	-	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	-

Remark

*Source : Summarized from Royal Irrigation Deparment Order No. 883/2532 (1989) , dated 19 December B.E. 2532 (1989) 2532

**Standard (By The National Environmental Committee) of surface water quality class 3 (The source that receives effluent of some activity and may be used for agriculture and utilization after usual qualifying and disinfection)

- : None

< : Less than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
ว-179-จ-0001
06/05/2567

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
ว-179-ค-0001
06/05/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,277.250 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,565.030 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,508.540 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	240.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,573.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,560.080 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,048.410 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. คลอรีนน้ำ 200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,277.250 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,669.860 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,864.050 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	300.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,042.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,374.680 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,187.810 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	300.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,277.250 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,716.760 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,866.900 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	120.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,042.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,644.490 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,307.100 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	100.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6701028
วันที่ (DATE)	31/01/2024
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV24010065

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน มกราคม 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			28.43	ตัน	400.00	11,372.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	11,372.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	743.96
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	10,628.04

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6701028
วันที่ (DATE)	31/01/2024
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV24010065

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน มกราคม 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			28.43	ตัน	400.00	11,372.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	11,372.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	743.96
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	10,628.04

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2024-01-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2024-01-31 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2024-02-01 09:45:17

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/670100011	560-670000011	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	1/1/2024	3:40:17	1/1/2024	3:49:53	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,420	1,780	640
กระบี่(MSW)	560/670100150	560-670000150	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	2/1/2024	2:24:00	2/1/2024	2:41:30	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,760	1,670	1,090
กระบี่(MSW)	560/670100159	560-670000159	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	2/1/2024	4:50:46	2/1/2024	4:58:59	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,390	1,700	690
กระบี่(MSW)	560/670100351	560-670000351	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	3/1/2024	10:52:59	3/1/2024	11:09:50	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,640	1,030
กระบี่(MSW)	560/670100420	560-670000420	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	4/1/2024	2:59:33	4/1/2024	3:11:05	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,580	1,630	950
กระบี่(MSW)	560/670100582	560-670000582	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	5/1/2024	7:21:39	5/1/2024	7:56:57	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,900	1,690	1,210
กระบี่(MSW)	560/670100706	560-670000706	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	6/1/2024	6:15:38	6/1/2024	6:34:42	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,750	920
กระบี่(MSW)	560/670100839	560-670000839	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	7/1/2024	6:20:20	7/1/2024	6:48:41	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,860	1,650	1,210
กระบี่(MSW)	560/670100999	560-670000999	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	8/1/2024	7:47:38	8/1/2024	8:04:23	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,610	1,640	970
กระบี่(MSW)	560/670101109	560-670001109	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	9/1/2024	6:17:39	9/1/2024	6:47:11	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,640	950
กระบี่(MSW)	560/670101220	560-670001220	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/1/2024	6:26:17	10/1/2024	6:35:03	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,550	1,720	830
กระบี่(MSW)	560/670101358	560-670001358	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/1/2024	4:38:12	11/1/2024	5:13:37	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,390	1,650	740
กระบี่(MSW)	560/670101489	560-670001489	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/1/2024	2:11:32	12/1/2024	2:34:42	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,460	1,640	820
กระบี่(MSW)	560/670101646	560-670001646	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/1/2024	6:50:54	13/1/2024	7:15:22	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,490	1,680	810
กระบี่(MSW)	560/670101775	560-670001775	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/1/2024	6:23:35	14/1/2024	6:46:53	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,360	1,660	700
กระบี่(MSW)	560/670101924	560-670001924	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/1/2024	9:42:23	15/1/2024	10:00:17	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,410	1,630	780
กระบี่(MSW)	560/670102043	560-670002043	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/1/2024	6:09:13	16/1/2024	6:21:35	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,710	960
กระบี่(MSW)	560/670102150	560-670002150	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/1/2024	5:43:04	17/1/2024	6:37:58	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,480	1,640	840

กระบี่(MSW)	560/670102274	560-670002274	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/1/2024	5:14:23	18/1/2024	5:46:46	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,490	1,630	860
กระบี่(MSW)	560/670102385	560-670002385	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/1/2024	3:21:06	19/1/2024	3:30:00	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,710	960
กระบี่(MSW)	560/670102512	560-670002512	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/1/2024	6:34:15	20/1/2024	6:45:36	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,560	1,730	830
กระบี่(MSW)	560/670102628	560-670002628	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/1/2024	6:27:05	21/1/2024	6:40:08	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,610	1,730	880
กระบี่(MSW)	560/670102743	560-670002743	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/1/2024	6:32:36	22/1/2024	6:44:33	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,610	1,720	890
กระบี่(MSW)	560/670102880	560-670002880	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/1/2024	4:08:57	23/1/2024	4:17:57	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,480	1,640	840
กระบี่(MSW)	560/670103021	560-670003021	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/1/2024	7:10:58	24/1/2024	7:31:06	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,760	1,640	1,120
กระบี่(MSW)	560/670103155	560-670003155	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/1/2024	6:00:15	25/1/2024	6:12:20	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,730	800
กระบี่(MSW)	560/670103289	560-670003289	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/1/2024	6:34:06	26/1/2024	6:53:10	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,510	1,740	770
กระบี่(MSW)	560/670103421	560-670003421	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/1/2024	4:59:51	27/1/2024	5:13:06	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,640	1,750	890
กระบี่(MSW)	560/670103524	560-670003524	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/1/2024	6:19:41	28/1/2024	6:31:11	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,710	1,730	980
กระบี่(MSW)	560/670103651	560-670003651	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/1/2024	6:27:14	29/1/2024	6:37:03	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,490	1,710	780
กระบี่(MSW)	560/670103779	560-670003779	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/1/2024	5:53:43	30/1/2024	6:07:30	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,550	1,720	830
กระบี่(MSW)	560/670103917	560-670003917	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	31/1/2024	5:14:15	31/1/2024	5:34:16	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,730	860
รวมทั้งหมด		**32**											**82,460**	**54,030**	**28,430**
รวมรถบริษัทหั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**32**											**82,460**	**54,030**	**28,430**

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด	**เลขที่ (NO.)**	KAINV6702027
ที่อยู่	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่	**วันที่ (DATE)**	29/02/2024
(ADDRESS)	จ.กระบี่ 81180	**Purchase Order No.**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608	**เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)**	30 วัน
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01	**เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)**	ARV24020036

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			24.67	ตัน	400.00	9,868.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	9,868.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	645.57
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,222.43

เก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด	**เลขที่ (NO.)**	KAINV6702027
ที่อยู่	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่	**วันที่ (DATE)**	29/02/2024
(ADDRESS)	จ.กระบี่ 81180	**Purchase Order No.**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608	**เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)**	30 วัน
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01	**เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)**	ARV24020036

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			24.67	ตัน	400.00	9,868.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	9,868.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	645.57
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,222.43

เก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2024-02-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2024-02-29 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2024-03-01 09:00:05

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/670200026	560-670004089	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	1/2/2024	6:34:19	1/2/2024	6:50:02	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,280	1,760	520
กระบี่(MSW)	560/670200156	560-670004219	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	2/2/2024	4:54:26	2/2/2024	5:08:15	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,420	1,690	730
กระบี่(MSW)	560/670200276	560-670004339	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	3/2/2024	6:14:31	3/2/2024	6:27:52	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,650	1,760	890
กระบี่(MSW)	560/670200382	560-670004445	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	4/2/2024	4:42:54	4/2/2024	4:52:00	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,400	1,640	760
กระบี่(MSW)	560/670200478	560-670004541	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	5/2/2024	3:59:36	5/2/2024	4:11:47	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,660	1,730	930
กระบี่(MSW)	560/670200611	560-670004674	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	6/2/2024	5:11:33	6/2/2024	5:31:34	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,470	1,710	760
กระบี่(MSW)	560/670200732	560-670004795	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	7/2/2024	5:29:34	7/2/2024	5:44:22	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,720	730
กระบี่(MSW)	560/670200846	560-670004909	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	8/2/2024	4:19:27	8/2/2024	4:33:02	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,360	1,660	700
กระบี่(MSW)	560/670200970	560-670005033	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	9/2/2024	6:29:54	9/2/2024	6:42:43	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,600	1,740	860
กระบี่(MSW)	560/670200985	560-670005048	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	9/2/2024	8:25:15	9/2/2024	8:32:01	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,430	2,240	190
กระบี่(MSW)	560/670201057	560-670005120	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/2/2024	4:50:03	10/2/2024	4:58:48	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,320	1,720	600
กระบี่(MSW)	560/670201152	560-670005215	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/2/2024	6:46:56	11/2/2024	7:05:14	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,700	1,790	910
กระบี่(MSW)	560/670201257	560-670005320	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/2/2024	5:20:53	12/2/2024	5:37:21	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,520	1,740	780
กระบี่(MSW)	560/670201391	560-670005454	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/2/2024	9:35:40	13/2/2024	9:48:18	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,630	1,660	970
กระบี่(MSW)	560/670201480	560-670005543	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/2/2024	5:21:04	14/2/2024	5:37:28	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,720	820
กระบี่(MSW)	560/670201628	560-670005691	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/2/2024	8:18:32	15/2/2024	8:41:39	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,380	1,600	780
กระบี่(MSW)	560/670201721	560-670005784	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/2/2024	5:00:14	16/2/2024	5:11:39	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,630	1,700	930
กระบี่(MSW)	560/670201835	560-670005898	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/2/2024	5:05:54	17/2/2024	5:16:13	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,690	850

กระบี่(MSW)	560/670201949	560-670006012	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/2/2024	5:23:07	18/2/2024	5:35:36	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,640	1,690	950
กระบี่(MSW)	560/670202054	560-670006117	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/2/2024	3:40:24	19/2/2024	3:49:17	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,420	1,690	730
กระบี่(MSW)	560/670202071	560-670006134	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/2/2024	6:42:10	19/2/2024	6:51:10	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,080	1,620	460
กระบี่(MSW)	560/670202178	560-670006241	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/2/2024	3:05:47	20/2/2024	3:22:28	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,570	1,740	830
กระบี่(MSW)	560/670202281	560-670006344	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/2/2024	23:57:45	21/2/2024	0:07:50	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,310	1,710	600
กระบี่(MSW)	560/670202430	560-670006493	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/2/2024	6:54:59	22/2/2024	7:03:54	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,640	1,740	900
กระบี่(MSW)	560/670202534	560-670006597	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/2/2024	6:35:04	23/2/2024	6:43:22	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,640	1,730	910
กระบี่(MSW)	560/670202640	560-670006703	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/2/2024	5:56:19	24/2/2024	6:07:30	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,730	860
กระบี่(MSW)	560/670202653	560-670006716	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/2/2024	8:15:29	24/2/2024	8:22:47	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,390	2,080	310
กระบี่(MSW)	560/670202740	560-670006803	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/2/2024	6:32:50	25/2/2024	6:47:39	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,690	1,740	950
กระบี่(MSW)	560/670202839	560-670006902	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/2/2024	5:05:23	26/2/2024	5:23:04	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,730	800
กระบี่(MSW)	560/670202966	560-670007029	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/2/2024	5:37:51	27/2/2024	5:50:58	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,790	1,710	1,080
กระบี่(MSW)	560/670203101	560-670007164	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/2/2024	6:24:21	28/2/2024	6:39:32	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,700	890
กระบี่(MSW)	560/670203230	560-670007293	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/2/2024	5:51:51	29/2/2024	6:09:23	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,380	1,690	690
รวมทั้งหมด		**32**											**80,240**	**55,570**	**24,670**
รวมรถบริษัททั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**32**											**80,240**	**55,570**	**24,670**

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6703027
วันที่ (DATE)	31/03/2024
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV24030066

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			25.75	ตัน	400.00	10,300.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	10,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	673.83
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,626.17

หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด	**เลขที่ (NO.)**	KAINV6703027
ที่อยู่	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่	**วันที่ (DATE)**	31/03/2024
(ADDRESS)	จ.กระบี่ 81180	**Purchase Order No.**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608	**เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)**	30 วัน
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01	**เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)**	ARV24030066

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			25.75	ตัน	400.00	10,300.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	10,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	673.83
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,626.17

หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2024-03-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2024-03-31 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2024-04-01 13:07:43

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/670300019	560-670007386	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	1/3/2024	5:11:49	1/3/2024	5:29:05	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,700	1,700	1,000
กระบี่(MSW)	560/670300118	560-670007485	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	2/3/2024	2:03:18	2/3/2024	2:14:46	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,500	1,700	800
กระบี่(MSW)	560/670300223	560-670007590	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	3/3/2024	7:12:42	3/3/2024	7:36:03	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,300	1,680	620
กระบี่(MSW)	560/670300327	560-670007694	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	4/3/2024	6:53:51	4/3/2024	7:06:05	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,570	1,650	920
กระบี่(MSW)	560/670300442	560-670007809	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	5/3/2024	3:46:57	5/3/2024	3:58:49	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,400	1,770	630
กระบี่(MSW)	560/670300568	560-670007935	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	6/3/2024	5:37:34	6/3/2024	6:02:29	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,660	1,700	960
กระบี่(MSW)	560/670300709	560-670008076	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	7/3/2024	7:13:43	7/3/2024	7:27:28	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,510	1,690	820
กระบี่(MSW)	560/670300826	560-670008193	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	8/3/2024	6:58:20	8/3/2024	7:11:35	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,700	1,690	1,010
กระบี่(MSW)	560/670300918	560-670008285	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	9/3/2024	6:46:42	9/3/2024	7:00:44	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,730	1,750	980
กระบี่(MSW)	560/670301017	560-670008384	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/3/2024	5:39:15	10/3/2024	5:52:49	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,620	1,710	910
กระบี่(MSW)	560/670301135	560-670008502	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/3/2024	7:40:35	11/3/2024	7:54:18	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,380	1,650	730
กระบี่(MSW)	560/670301220	560-670008587	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/3/2024	3:42:48	12/3/2024	4:00:44	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,520	1,700	820
กระบี่(MSW)	560/670301314	560-670008681	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/3/2024	2:13:04	13/3/2024	2:32:59	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,160	1,650	510
กระบี่(MSW)	560/670301433	560-670008800	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/3/2024	6:52:04	14/3/2024	7:02:41	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,580	1,700	880
กระบี่(MSW)	560/670301582	560-670008949	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/3/2024	10:42:57	15/3/2024	11:00:10	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,730	1,720	1,010
กระบี่(MSW)	560/670301664	560-670009031	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/3/2024	7:30:37	16/3/2024	7:41:16	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,670	920
กระบี่(MSW)	560/670301774	560-670009141	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/3/2024	6:38:07	17/3/2024	6:51:05	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,740	710
กระบี่(MSW)	560/670301894	560-670009261	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/3/2024	7:24:12	18/3/2024	7:33:36	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,430	1,670	760

กระบี่(MSW)	560/670302016	560-670009383	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/3/2024	6:40:01	19/3/2024	6:50:18	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,650	800
กระบี่(MSW)	560/670302136	560-670009503	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/3/2024	5:18:49	20/3/2024	5:37:06	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,750	1,690	1,060
กระบี่(MSW)	560/670302260	560-670009627	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/3/2024	6:43:17	21/3/2024	6:57:32	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,620	830
กระบี่(MSW)	560/670302380	560-670009747	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/3/2024	7:01:53	22/3/2024	7:13:09	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,520	1,690	830
กระบี่(MSW)	560/670302478	560-670009845	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/3/2024	7:25:42	23/3/2024	7:38:56	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,400	1,690	710
กระบี่(MSW)	560/670302581	560-670009948	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/3/2024	8:14:10	24/3/2024	8:26:52	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,650	1,710	940
กระบี่(MSW)	560/670302681	560-670010048	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/3/2024	7:05:15	25/3/2024	7:09:16	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,320	1,810	510
กระบี่(MSW)	560/670302772	560-670010139	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/3/2024	5:14:14	26/3/2024	5:29:40	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,680	1,690	990
กระบี่(MSW)	560/670302865	560-670010232	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/3/2024	2:02:48	27/3/2024	2:15:41	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,340	1,690	650
กระบี่(MSW)	560/670302981	560-670010348	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/3/2024	5:30:24	28/3/2024	5:40:16	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,460	1,690	770
กระบี่(MSW)	560/670303125	560-670010492	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/3/2024	7:23:46	29/3/2024	7:38:56	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,560	1,680	880
กระบี่(MSW)	560/670303141	560-670010508	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/3/2024	9:13:48	29/3/2024	9:21:58	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,240	1,960	280
กระบี่(MSW)	560/670303227	560-670010594	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/3/2024	6:39:47	30/3/2024	6:52:07	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,380	1,710	670
กระบี่(MSW)	560/670303335	560-670010702	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	31/3/2024	7:02:28	31/3/2024	7:14:43	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,600	1,760	840
รวมทั้งหมด		**32**											**80,330**	**54,580**	**25,750**
รวมรถบริษัทหั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**32**											**80,330**	**54,580**	**25,750**

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด	**เลขที่ (NO.)**	KAINV6704027
ที่อยู่	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่	**วันที่ (DATE)**	30/04/2024
(ADDRESS)	จ.กระบี่ 81180	**Purchase Order No.**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID):	0105545109608	**เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)**	30 วัน
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01	**เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)**	ARV24040063

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน เมษายน 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			24.79	ตัน	400.00	9,916.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	9,916.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	648.71
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,267.29

เก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด	**เลขที่ (NO.)**	KAINV6704027
ที่อยู่	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่	**วันที่ (DATE)**	30/04/2024
(ADDRESS)	จ.กระบี่ 81180	**Purchase Order No.**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID):	0105545109608	**เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)**	30 วัน
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01	**เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)**	ARV24040063

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน เมษายน 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			24.79	ตัน	400.00	9,916.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	9,916.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	648.71
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,267.29

เก้าพันแก้ร้อยสิบหกบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2024-04-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2024-04-30 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2024-05-02 09:27:21

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ในตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ร้านค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	กลุ่มสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักในโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ประกอบการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/670400031	560-670010793	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	1/4/2024	7:15:13	1/4/2024	7:22:21	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,500	1,730	770
กระบี่(MSW)	560/670400115	560-670010877	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	2/4/2024	5:02:58	2/4/2024	5:13:54	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,340	1,700	640
กระบี่(MSW)	560/670400207	560-670010969	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	3/4/2024	6:58:39	3/4/2024	7:20:18	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,610	1,720	890
กระบี่(MSW)	560/670400293	560-670011055	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	4/4/2024	7:56:13	4/4/2024	8:06:10	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,570	1,710	860
กระบี่(MSW)	560/670400392	560-670011154	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	5/4/2024	10:21:29	5/4/2024	10:30:06	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,700	830
กระบี่(MSW)	560/670400459	560-670011221	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	6/4/2024	6:56:31	6/4/2024	7:08:40	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,440	1,730	710
กระบี่(MSW)	560/670400542	560-670011304	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	7/4/2024	7:48:45	7/4/2024	7:56:31	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,740	800
กระบี่(MSW)	560/670400600	560-670011362	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	8/4/2024	2:17:33	8/4/2024	2:33:43	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,550	1,700	850
กระบี่(MSW)	560/670400710	560-670011472	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	9/4/2024	7:20:29	9/4/2024	7:29:12	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,480	1,730	750
กระบี่(MSW)	560/670400803	560-670011565	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/4/2024	6:51:13	10/4/2024	7:02:06	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,470	1,740	730
กระบี่(MSW)	560/670400883	560-670011645	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/4/2024	7:07:12	11/4/2024	7:14:47	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,710	820
กระบี่(MSW)	560/670400977	560-670011739	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/4/2024	6:53:38	12/4/2024	7:08:50	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,700	890
กระบี่(MSW)	560/670401102	560-670011864	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/4/2024	7:26:44	13/4/2024	7:40:40	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,700	1,710	990
กระบี่(MSW)	560/670401167	560-670011929	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/4/2024	0:16:18	14/4/2024	0:40:59	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,750	920
กระบี่(MSW)	560/670401192	560-670011954	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/4/2024	6:34:10	14/4/2024	6:41:49	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,560	2,210	350
กระบี่(MSW)	560/670401297	560-670012059	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/4/2024	7:23:14	15/4/2024	7:38:04	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,940	1,720	1,220
กระบี่(MSW)	560/670401409	560-670012171	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/4/2024	6:29:59	16/4/2024	6:40:18	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,410	1,720	690
กระบี่(MSW)	560/670401534	560-670012296	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/4/2024	7:29:05	17/4/2024	7:38:08	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,610	1,740	870

กระบี่(MSW)	560/670401640	560-670012402	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/4/2024	5:29:01	18/4/2024	5:40:17	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,370	1,700	670
กระบี่(MSW)	560/670401768	560-670012530	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/4/2024	7:33:14	19/4/2024	7:47:27	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,770	760
กระบี่(MSW)	560/670401890	560-670012652	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/4/2024	7:32:58	20/4/2024	7:46:37	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,730	800
กระบี่(MSW)	560/670401919	560-670012681	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/4/2024	10:19:32	20/4/2024	10:26:41	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,310	1,990	320
กระบี่(MSW)	560/670401988	560-670012750	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/4/2024	5:57:17	21/4/2024	6:07:43	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,580	1,720	860
กระบี่(MSW)	560/670402056	560-670012818	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/4/2024	0:33:49	22/4/2024	0:51:59	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,710	740
กระบี่(MSW)	560/670402188	560-670012950	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/4/2024	7:23:26	23/4/2024	7:34:35	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,700	830
กระบี่(MSW)	560/670402265	560-670013027	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/4/2024	2:24:23	24/4/2024	2:43:28	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,360	1,700	660
กระบี่(MSW)	560/670402402	560-670013164	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/4/2024	6:57:59	25/4/2024	7:16:28	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,500	1,720	780
กระบี่(MSW)	560/670402499	560-670013261	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/4/2024	7:37:44	26/4/2024	7:49:12	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,620	1,770	850
กระบี่(MSW)	560/670402590	560-670013352	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/4/2024	6:00:15	27/4/2024	6:09:18	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,310	1,690	620
กระบี่(MSW)	560/670402675	560-670013437	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/4/2024	7:18:10	28/4/2024	7:28:57	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,430	1,740	690
กระบี่(MSW)	560/670402781	560-670013543	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/4/2024	5:44:11	29/4/2024	5:54:12	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,400	1,680	720
กระบี่(MSW)	560/670402931	560-670013693	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/4/2024	6:51:03	30/4/2024	7:00:33	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,640	1,730	910
รวมทั้งหมด		**32**											**80,600**	**55,810**	**24,790**
รวมรถบริษัททั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถรวมทั้งหมด		**32**											**80,600**	**55,810**	**24,790**

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด	**เลขที่ (NO.)**	KAINV6705026
ที่อยู่	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่	**วันที่ (DATE)**	31/05/2024
(ADDRESS)	จ.กระบี่ 81180	**Purchase Order No.**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608	**เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)**	30 วัน
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01	**เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)**	ARV24050062

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			21.40	ตัน	400.00	8,560.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	8,560.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	560.00
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	8,000.00

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6705026
วันที่ (DATE)	31/05/2024
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV24050062

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			21.40	ตัน	400.00	8,560.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	8,560.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	560.00
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	8,000.00

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2024-05-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2024-05-31 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2024-06-04 09:27:10

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/670500029	560-670013819	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	1/5/2024	6:30:44	1/5/2024	6:39:57	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,330	1,700	630
กระบี่(MSW)	560/670500154	560-670013944	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	2/5/2024	6:29:56	2/5/2024	6:47:47	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,300	1,700	600
กระบี่(MSW)	560/670500296	560-670014086	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	3/5/2024	7:14:21	3/5/2024	7:27:21	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,560	1,750	810
กระบี่(MSW)	560/670500413	560-670014203	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	4/5/2024	7:22:23	4/5/2024	7:32:52	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,300	1,720	580
กระบี่(MSW)	560/670500532	560-670014322	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	5/5/2024	7:43:50	5/5/2024	7:57:11	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,420	1,710	710
กระบี่(MSW)	560/670500640	560-670014430	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	6/5/2024	6:10:07	6/5/2024	6:17:47	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,270	1,710	560
กระบี่(MSW)	560/670500756	560-670014546	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	7/5/2024	5:04:51	7/5/2024	5:16:47	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,650	1,700	950
กระบี่(MSW)	560/670500868	560-670014658	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	8/5/2024	7:24:19	8/5/2024	7:33:39	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,400	1,720	680
กระบี่(MSW)	560/670500975	560-670014765	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	9/5/2024	4:39:21	9/5/2024	4:48:16	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,700	750
กระบี่(MSW)	560/670501078	560-670014868	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/5/2024	2:38:45	10/5/2024	2:47:42	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,370	1,700	670
กระบี่(MSW)	560/670501214	560-670015004	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/5/2024	6:47:03	11/5/2024	6:58:47	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,710	830
กระบี่(MSW)	560/670501311	560-670015101	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/5/2024	6:41:51	12/5/2024	6:55:54	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,730	800
กระบี่(MSW)	560/670501409	560-670015199	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/5/2024	7:09:44	13/5/2024	7:20:16	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,340	1,660	680
กระบี่(MSW)	560/670501478	560-670015268	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/5/2024	0:39:22	14/5/2024	0:56:31	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,700	750
กระบี่(MSW)	560/670501612	560-670015402	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/5/2024	7:03:17	15/5/2024	7:14:55	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,380	1,710	670
กระบี่(MSW)	560/670501703	560-670015493	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/5/2024	7:12:32	16/5/2024	7:21:28	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,440	1,640	800
กระบี่(MSW)	560/670501806	560-670015596	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/5/2024	7:28:12	17/5/2024	7:43:35	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,310	1,660	650
กระบี่(MSW)	560/670501881	560-670015671	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/5/2024	1:48:43	18/5/2024	1:57:40	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,290	1,710	580

กระบี่(MSW)	560/670501979	560-670015769	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/5/2024	4:29:48	19/5/2024	4:42:53	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,480	1,700	780
กระบี่(MSW)	560/670502055	560-670015845	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/5/2024	0:47:52	20/5/2024	1:02:20	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,300	1,710	590
กระบี่(MSW)	560/670502177	560-670015967	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/5/2024	6:55:07	21/5/2024	7:04:25	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,490	1,720	770
กระบี่(MSW)	560/670502261	560-670016051	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/5/2024	7:17:14	22/5/2024	7:44:48	จินดนา_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,390	1,720	670
กระบี่(MSW)	560/670502350	560-670016140	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/5/2024	5:00:26	23/5/2024	5:11:15	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,690	850
กระบี่(MSW)	560/670502464	560-670016254	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/5/2024	6:50:09	24/5/2024	7:13:05	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,320	1,650	670
กระบี่(MSW)	560/670502561	560-670016351	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/5/2024	7:01:12	25/5/2024	7:17:45	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,390	1,730	660
กระบี่(MSW)	560/670502644	560-670016434	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/5/2024	6:41:17	26/5/2024	7:10:49	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,340	1,750	590
กระบี่(MSW)	560/670502754	560-670016544	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/5/2024	7:08:11	27/5/2024	7:24:15	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,190	1,670	520
กระบี่(MSW)	560/670502856	560-670016646	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/5/2024	6:32:01	28/5/2024	6:42:36	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,730	720
กระบี่(MSW)	560/670502967	560-670016757	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/5/2024	6:27:56	29/5/2024	6:47:07	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,370	1,720	650
กระบี่(MSW)	560/670503058	560-670016848	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/5/2024	23:48:24	29/5/2024	23:57:40	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,190	1,680	510
กระบี่(MSW)	560/670503201	560-670016991	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	31/5/2024	6:29:00	31/5/2024	6:44:47	ณเรนทร์ฤทธิ์_20-013	นายสมนึก ภักดี	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,420	1,700	720
รวมทั้งหมด		**31**											**74,200**	**52,800**	**21,400**
รวมรถบริษัททั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**31**											**74,200**	**52,800**	**21,400**

เล่ม/本號. 1

ใบที่ No./單號. 8

บิลส่งของ

INVOICE / 臨時送貨單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม 實號 Customer ____ วันที่ 日期 Date 3/10/67

ที่อยู่ 住址 Address 155 ม.3 ต.หนองหาม อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額
10	ค่าบริการล้างสระว่ายน้ำ	1850	18500

Dusit Thani
KRABI BEACH RESORT

Date Received	8/3/24
Received By	
Item Checked By	สุรพงษ์ 11/3/24
P.O.Number	1846
Invoice No.	178
Issue to Dept.	Engineering

บาท Baht 銀	หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共 銀	18500

หมายเหตุ สินค้าขาดหรือชำรุดโปรดแจ้งภายใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง
กรณีเมื่อชำระเงินแล้ว ขอออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ / Received By/ 收貨人 สุรพงษ์ 3/10/67 ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人 หวน พรวิบูลแสง

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

สำเนาถูกต้อง

เล่มที่ /Book No./本號. 1

เลขที่ /Bill No./單號. 13

บิลส่งของ

INVOICE / 臨時送貨單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม 實號 Customer _____ วันที่ 日期 Date 8 พค 67

ที่อยู่ 住址 Address 155 ม.9 ต.หนองทุเลา อ.เมือง จ.กระบี่ 81160

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
5	ค่าบริการสรุปสิ่งปฏิกูล	1,850	9,250	
	12.a-77160			
บาท Baht 泰	สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共 銀	9,250	

Busit Thani
Date Received
Issue to Dept.

หมายเหตุ สินค้าชำรุดหรือส่งผิดโปรดแจ้งภายใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง กรณีเสียชำระเงินแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ / Received By/ 收貨人 _____ ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人 _____

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

ประเทศไทย THAILAND

JC3—1559690—66
