4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้นการนำเสนอรายงานฯในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2568 ซึ่งจะรายงานผลในรายงานฉบับ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2568) ทั้งนี้

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

ลำดับ	พารามิเตอร์	ความถี่	เดือนที่ตรวจสอบ
1	pH	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
2	Suspened Solids	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
3	Dissolved Solids	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
4	Settleable Solids	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
5	Oil&Grease	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
6	TKN	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
7	BOD	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
8	Sulfide	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
9	Total Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568
10	Fecal Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568

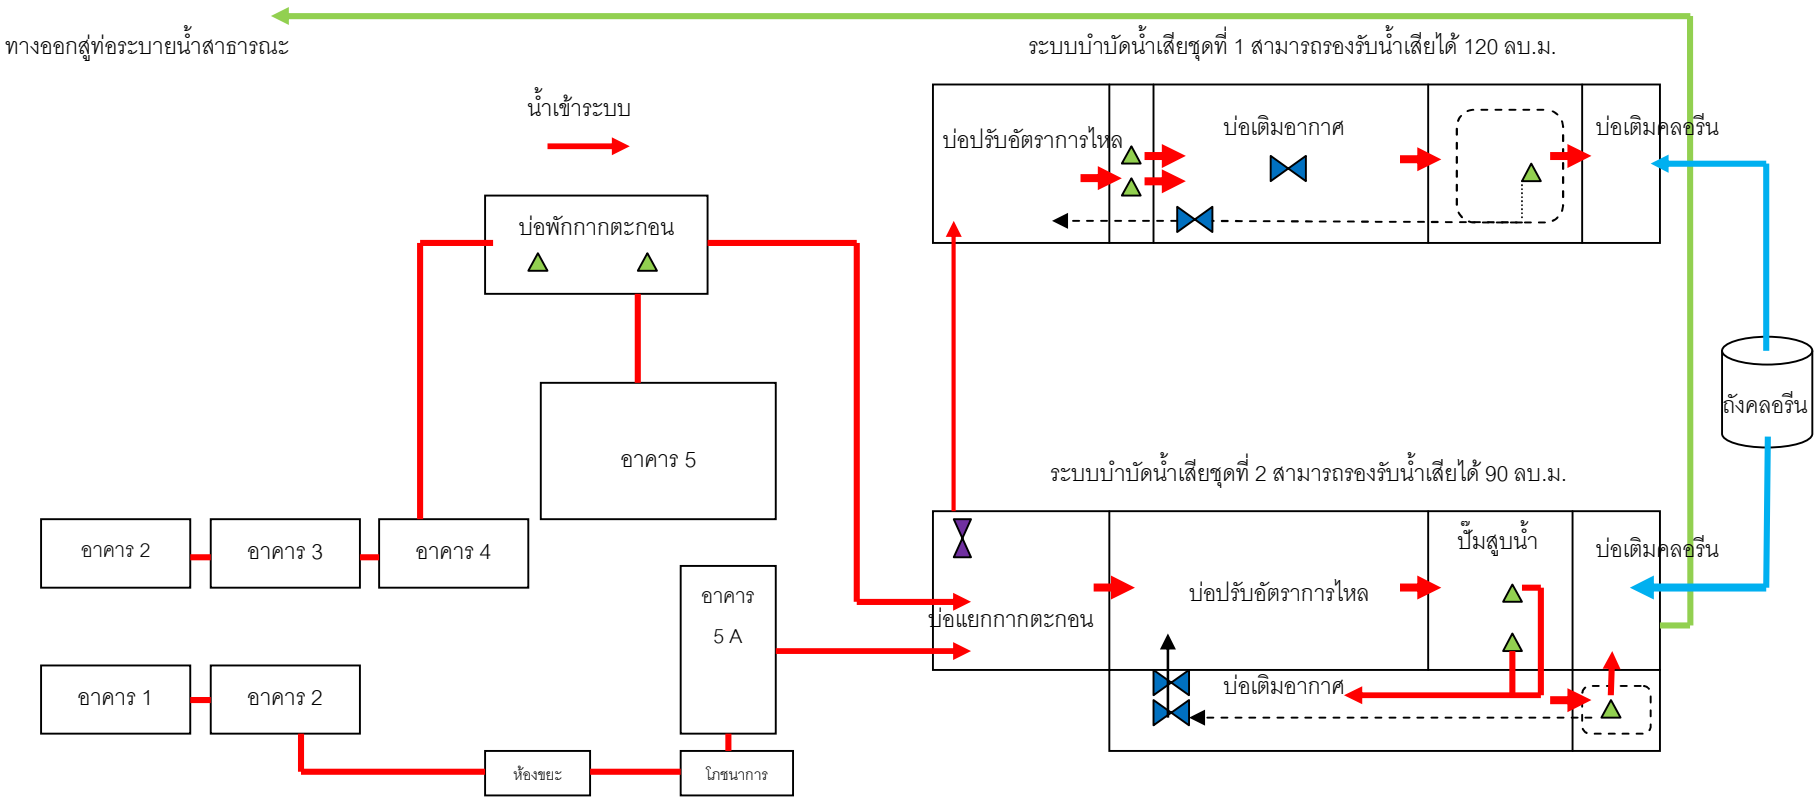

ภาพที่ 4 ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
